

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	% completado
1	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y CICLO INFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES**	**162 días?**	**lun 14/02/22**	**vie 23/12/22**		**$703.126.342,61**	**76%**
2	**FIRMA DE ACTA DE INICIO**	**0 días**	**lun 14/02/22**	**lun 14/02/22**		**$0,00**	**100%**
3	**ETAPA DE DIAGNÓSTICO**	**52 días**	**lun 14/02/22**	**lun 18/04/22**		**$9.040.112,43**	**100%**
4	Revisión de diseños iniciales	35 días	lun 14/02/22	sáb 26/03/22	2CC+1 día	$0,00	100%
5	Radicación de requisitos para PMT	20 días	mié 23/03/22	lun 18/04/22	4FC-3 días	$0,00	100%
6	Apropiación de diseños	1 día	sáb 26/03/22	lun 28/03/22	4	$0,00	100%
7	Elaboración de diagnósticos	30 días	lun 14/02/22	sáb 19/03/22	4CC	$9.040.112,43	100%
8	**INICIO DE OBRA**	**89 días?**	**mar 10/05/22**	**vie 23/12/22**	**6;7;5;4**	**$498.147.066,03**	**56%**
9	**CIV'S MALLA VIAL**	**89 días**	**mar 10/05/22**	**vie 23/12/22**		**$208.164.072,77**	**0%**
10	**CIV 14000567**	**83 días**	**mar 17/05/22**	**vie 23/12/22**		**$134.555.059,97**	**0%**
11	Socialización y preliminares de componentes	2 días	mar 17/05/22	jue 19/05/22	7FC+48 días	$0,00	0%
12	REPLANTEO GENERAL	1 día	mar 7/06/22	mié 8/06/22	11CC+18 días	$1.860.993,30	0%
13	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	3 días	mar 7/06/22	jue 9/06/22	21CF	$6.701.319,96	0%
14	PROTECCION A SUMIDEROS	1 día	mar 7/06/22	mié 8/06/22	12CC	$60.237,64	0%
15	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PARA CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE CON RETROEXCAVADORA	3 días	lun 13/06/22	jue 16/06/22	21	$33.394,68	0%
16	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANT	2 días	mié 15/06/22	vie 17/06/22	15CC+2 días	$1.439.345,06	0%
17	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	3 días	jue 16/06/22	mar 21/06/22	16CC+1 día	$210.324,30	0%
18	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	14	$113.804,29	0%
19	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CR	2 días	mar 21/06/22	jue 23/06/22	17	$2.409.015,57	0%
20	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100)	3 días	mar 21/06/22	vie 24/06/22	19CC	$108.834.571,17	0%
21	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE)	3 días	jue 9/06/22	lun 13/06/22	18	$12.254.765,85	0%
22	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	5 días	lun 19/12/22	vie 23/12/22	23FC+13 días	$637.288,15	0%
23	ACTIVIDADES CONTRALORIA	20 días	mié 9/11/22	vie 2/12/22	20FC+13 días	$0,00	0%
24	**CIV 14001505**	**89 días**	**mar 10/05/22**	**vie 23/12/22**		**$73.609.012,80**	**0%**
25	Socialización y preliminares de componentes	1 día	mar 10/05/22	mié 11/05/22	7FC+42 días	$0,00	0%
26	REPLANTEO GENERAL	1 día	mié 18/05/22	jue 19/05/22	25CC+7 días	$729.634,44	0%
27	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.	2 días	mar 17/05/22	jue 19/05/22	35CF	$4.439.704,23	0%
28	PROTECCION A SUMIDEROS.	1 día	mié 18/05/22	jue 19/05/22	26CC	$60.237,64	0%
29	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PARA CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE CON RETROEXCAVADORA	1 día	sáb 21/05/22	lun 23/05/22	35	$303.536,28	0%
30	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANT	1 día	sáb 21/05/22	lun 23/05/22	29CC	$730.003,90	0%
31	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	1 día	lun 23/05/22	mar 24/05/22	30	$79.207,23	0%
32	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	1 día	jue 19/05/22	vie 20/05/22	28	$0,00	0%
33	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CR	1 día	mar 24/05/22	mié 25/05/22	31	$1.451.430,09	0%
34	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100).	2 días	mié 25/05/22	jue 26/05/22	33	$60.274.211,96	0%
35	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE).	2 días	jue 19/05/22	sáb 21/05/22	28	$5.298.717,06	0%
36	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	5 días	lun 19/12/22	vie 23/12/22	37FC+13 días	$242.329,97	0%
37	ACTIVIDADES CONTRALORIA	20 días	mié 9/11/22	vie 2/12/22	34FC+36 días	$0,00	0%
38	**CIV'S CICLORUTAS**	**81 días?**	**jue 19/05/22**	**vie 23/12/22**		**$289.982.993,26**	**73%**
39	**CIV 14000009**	**71 días?**	**mar 31/05/22**	**jue 22/12/22**		**$61.033.059,19**	**64%**
40	Socialización y preliminares de componentes	1 día	mar 31/05/22	mié 1/06/22	7FC+59 días	$0,00	100%
41	REPLANTEO GENERAL	3 días	mié 22/06/22	sáb 25/06/22	40FC+18 días	$404.494,93	100%
42	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	3 días	jue 23/06/22	mar 28/06/22	49CF	$1.208.244,57	33%

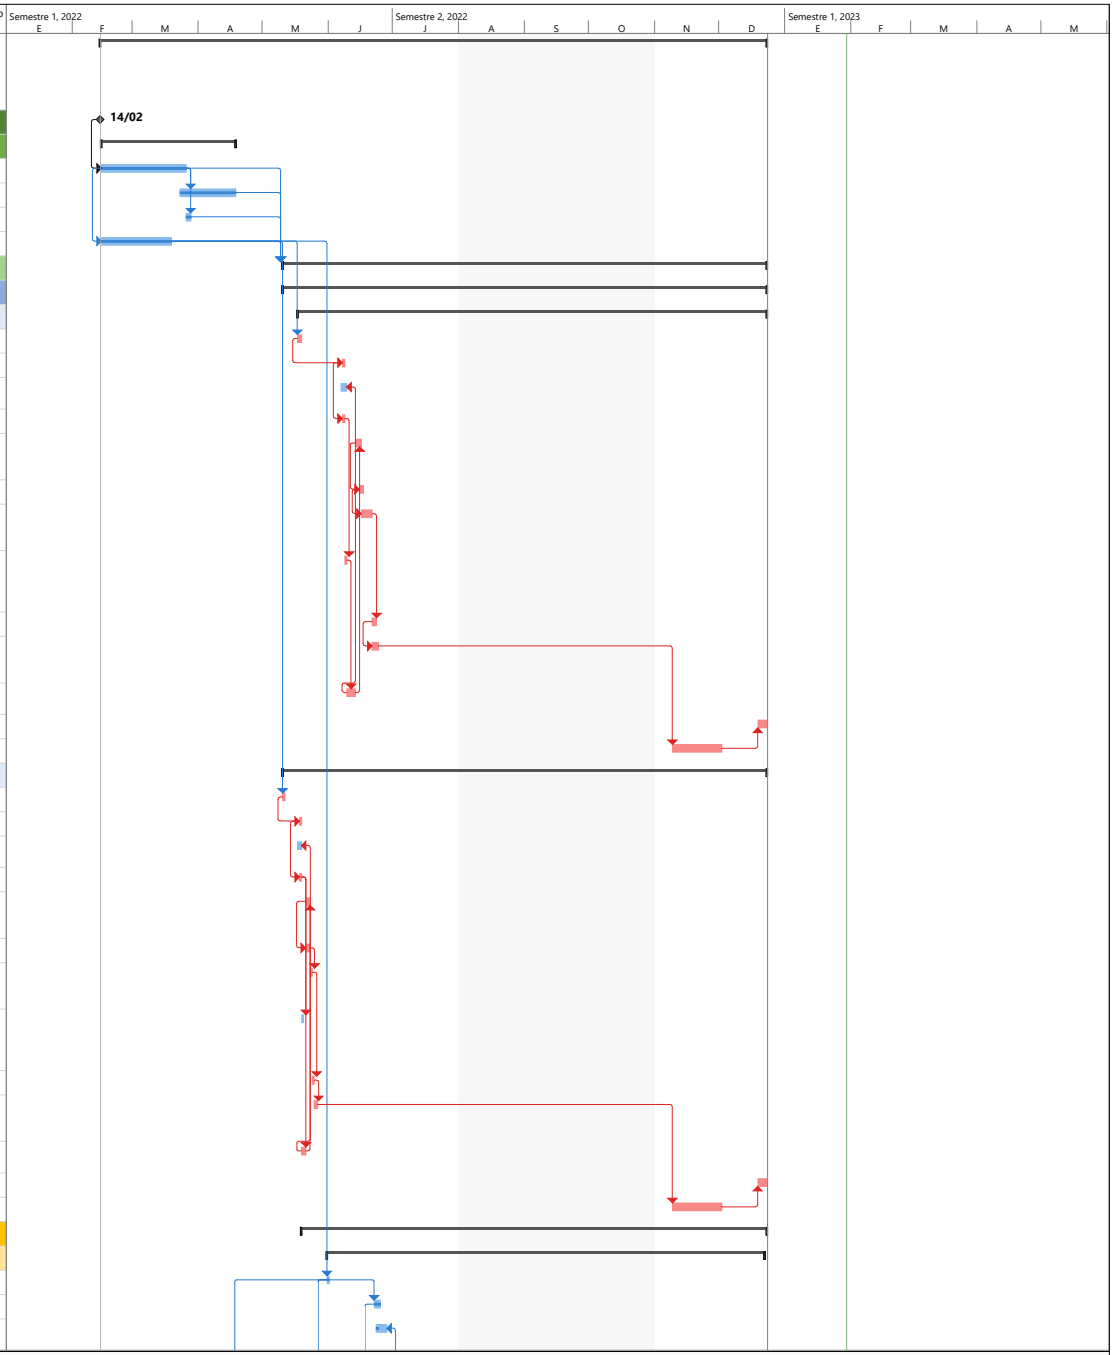

Proyecto: PROGRAMACIÓN BO
Fecha: lun 30/01/23

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	% completado
43	PROTECCION A SUMIDEROS.	1 día	mié 22/06/22	jue 23/06/22	41CC	$0,00	100%
44	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANT	1 día	jue 23/06/22	vie 24/06/22	49	$419.001,41	100%
45	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	1 día	jue 23/06/22	vie 24/06/22	43	$167.512,09	0%
46	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CR	1 día	mar 28/06/22	mié 29/06/22	44	$1.528.188,10	100%
47	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO CONVENCIONAL (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	2 días	mar 28/06/22	jue 30/06/22	46	$41.843.189,12	50%
48	CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4")	1 día?	mié 21/12/22	jue 22/12/22	47FC+45 días	$1.055.194,09	0%
49	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	3 días	jue 23/06/22	mar 28/06/22	45	$1.728.498,87	67%
50	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	1 día	lun 19/12/22	lun 19/12/22	53FC+13 días	$1.249.098,01	0%
51	AFOROS DE TRANSITO	1 día	jue 7/07/22	jue 7/07/22	47FC+5 días	$3.822.910,00	0%
52	BARRERAS RELLENABLES	6 días	mié 22/06/22	jue 30/06/22	43CC	$7.606.728,00	0%
53	ACTIVIDADES CONTRALORIA	20 días	mié 9/11/22	vie 2/12/22	47FC+10 días	$0,00	88%
54	**CIV 14000018**	**72 días**	**mar 31/05/22**	**vie 23/12/22**		**$6.312.700,88**	**0%**
55	Socialización y preliminares de componentes	1 día	mar 31/05/22	mié 1/06/22	40CC	$0,00	0%
56	REPLANTEO GENERAL	1 día	sáb 26/11/22	lun 28/11/22	55FC+48 días	$109.831,06	0%
57	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	2 días	mié 14/12/22	jue 15/12/22	62CF	$220.999,13	0%
58	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANT	1 día	lun 19/12/22	lun 19/12/22	62	$76.739,45	0%
59	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	1 día	jue 15/12/22	vie 16/12/22	56FC+15 días	$170.813,43	0%
60	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CR	1 día	lun 19/12/22	lun 19/12/22	58CC	$136.607,10	0%
61	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO CONVENCIONAL (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	1 día	mar 20/12/22	mar 20/12/22	60	$4.854.523,46	0%
62	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	2 días	jue 15/12/22	lun 19/12/22	59CC	$315.938,97	0%
63	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	1 día	jue 22/12/22	vie 23/12/22	61FC+2 días	$427.248,28	0%
64	**CIV 14000025**	**72 días**	**mar 31/05/22**	**vie 23/12/22**		**$8.123.985,67**	**0%**
65	Socialización y preliminares de componentes	1 día	mar 31/05/22	mié 1/06/22	40CC	$0,00	0%
66	REPLANTEO GENERAL	1 día	sáb 26/11/22	lun 28/11/22	65FC+48 días	$131.401,48	0%
67	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	2 días	mié 14/12/22	jue 15/12/22	72CF	$287.704,90	0%
68	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANT	1 día	lun 19/12/22	lun 19/12/22	72	$99.708,21	0%
69	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	1 día	jue 15/12/22	vie 16/12/22	66FC+15 días	$236.595,55	0%
70	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CR	1 día	lun 19/12/22	lun 19/12/22	68CC	$177.494,75	0%
71	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO CONVENCIONAL (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	1 día	mar 20/12/22	mar 20/12/22	70	$6.319.799,57	0%
72	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	2 días	jue 15/12/22	lun 19/12/22	69CC	$411.906,78	0%
73	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	1 día	jue 22/12/22	vie 23/12/22	71FC+2 días	$459.374,43	0%
74	**CIV 14000048**	**69 días**	**mar 31/05/22**	**mar 20/12/22**		**$12.763.113,19**	**85%**
75	Socialización y preliminares de componentes	1 día	mar 31/05/22	mié 1/06/22	65CC	$0,00	100%
76	REPLANTEO GENERAL	1 día	vie 3/06/22	lun 6/06/22	75FC+3 días	$123.353,35	100%
77	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	1 día	lun 6/06/22	lun 6/06/22	81CC	$592.242,90	100%
78	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANT	1 día	mar 7/06/22	mar 7/06/22	81	$205.346,20	100%
79	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CR	1 día	mar 7/06/22	mar 7/06/22	78CC	$365.545,36	100%
80	MEZCLA ASFÁLTICA	1 día	mar 7/06/22	mié 8/06/22	79	$10.106.350,42	100%
81	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	1 día	lun 6/06/22	lun 6/06/22	76	$848.671,07	100%
82	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	2 días	lun 19/12/22	mar 20/12/22	83FC+13 días	$290.632,58	0%

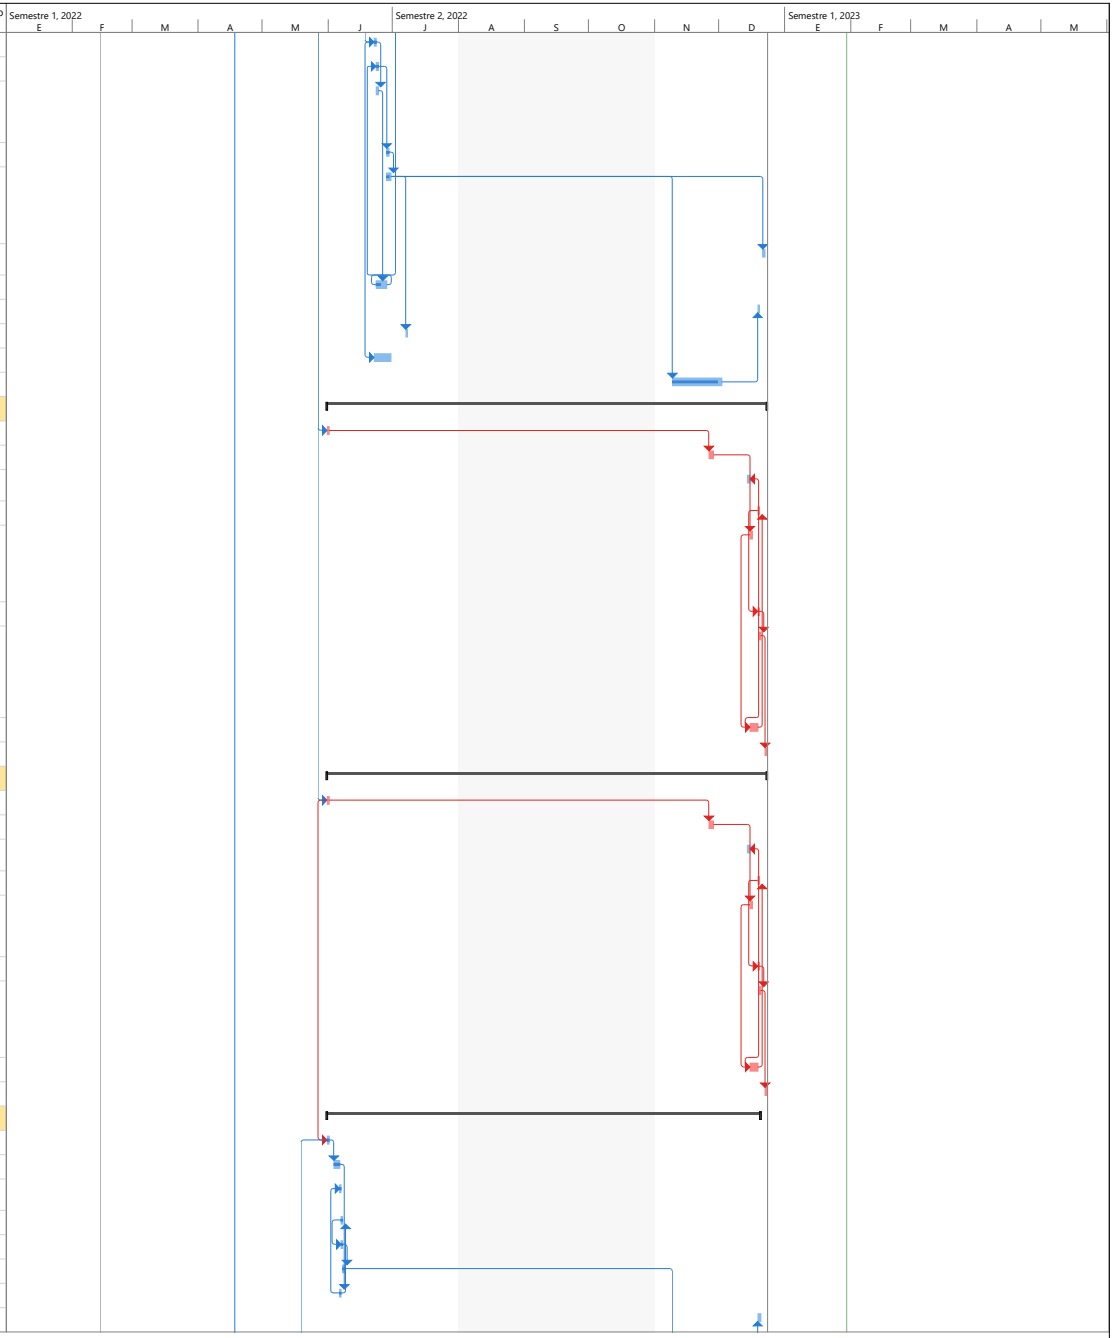

Proyecto: PROGRAMACIÓN BO
Fecha: lun 30/01/23

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	% completado
83	ACTIVIDADES CONTRALORIA	20 días	mié 9/11/22	vie 2/12/22	80FC+26 días	$230.971,31	88%
84	**CIV 14000091**	**76 días**	**lun 23/05/22**	**mié 21/12/22**		**$18.061.416,30**	**83%**
85	Socialización y preliminares de componentes	1 día	lun 23/05/22	mar 24/05/22	75CC-6 días	$0,00	100%
86	Semaforización	1 día	jue 2/06/22	vie 3/06/22	85FC+8 días	$0,00	100%
87	REPLANTEO GENERAL	1 día	vie 3/06/22	lun 6/06/22	86	$183.842,67	100%
88	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	1 día	vie 3/06/22	lun 6/06/22	89CC	$882.663,61	100%
89	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANT	1 día	vie 3/06/22	lun 6/06/22	87CC	$306.042,70	100%
90	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CR	1 día	vie 3/06/22	lun 6/06/22	89CC	$544.799,42	100%
91	MEZCLA ASFÁLTICA	1 día	vie 3/06/22	lun 6/06/22	90CC	$14.357.626,43	100%
92	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	2 días	vie 3/06/22	lun 6/06/22	87CC	$1.264.837,58	100%
93	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	2 días	mar 20/12/22	mié 21/12/22	94FC+13 días	$290.632,58	0%
94	ACTIVIDADES CONTRALORIA	20 días	jue 10/11/22	sáb 3/12/22	91FC+30 días	$230.971,31	83%
95	**CIV 14000102**	**76 días**	**lun 23/05/22**	**mié 21/12/22**		**$34.393.416,33**	**83%**
96	Socialización y preliminares de componentes	1 día	lun 23/05/22	mar 24/05/22	85CC	$0,00	100%
97	Semaforización	1 día	jue 2/06/22	vie 3/06/22	96FC+8 días	$0,00	100%
98	REPLANTEO GENERAL	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	97FC+4 días	$252.995,31	100%
99	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	101CC	$1.735.255,10	100%
100	PROTECCION A SUMIDEROS.	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	98CC	$0,00	100%
101	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANT	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	100CC	$421.161,02	100%
102	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CR	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	101CC	$749.726,36	100%
103	MEZCLA ASFÁLTICA	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	102CC	$28.226.092,19	100%
104	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	100CC	$2.486.582,46	100%
105	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	2 días	mar 20/12/22	mié 21/12/22	106FC+13 días	$290.632,58	0%
106	ACTIVIDADES CONTRALORIA	20 días	jue 10/11/22	sáb 3/12/22	104FC+26 días	$230.971,31	83%
107	**CIV 14000118**	**76 días**	**lun 23/05/22**	**mié 21/12/22**		**$54.279.049,31**	**83%**
108	Socialización y preliminares de componentes	1 día	lun 23/05/22	mar 24/05/22	96CC	$0,00	100%
109	Semaforización	1 día	jue 2/06/22	vie 3/06/22	108FC+8 días	$0,00	100%
110	REPLANTEO GENERAL	1 día	vie 10/06/22	sáb 11/06/22	109FC+6 días	$401.525,06	100%
111	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	1 día	sáb 11/06/22	lun 13/06/22	116CC	$2.753.997,33	100%
112	PROTECCION A SUMIDEROS.	1 día	vie 10/06/22	sáb 11/06/22	110CC	$0,00	100%
113	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANT	1 día	lun 13/06/22	mar 14/06/22	116	$668.418,34	100%
114	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CR	1 día	lun 13/06/22	mar 14/06/22	113CC	$1.189.879,46	100%
115	MEZCLA ASFÁLTICA	1 día	mar 14/06/22	mié 15/06/22	114	$44.797.207,50	100%
116	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	1 día	sáb 11/06/22	lun 13/06/22	112	$3.946.417,73	100%
117	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	2 días	mar 20/12/22	mié 21/12/22	118FC+13 días	$290.632,58	0%
118	ACTIVIDADES CONTRALORIA	20 días	jue 10/11/22	sáb 3/12/22	115FC+21 días	$230.971,31	83%
119	**CIV 14000145**	**76 días**	**lun 23/05/22**	**mié 21/12/22**		**$54.279.049,31**	**84%**
120	Socialización y preliminares de componentes	1 día	lun 23/05/22	mar 24/05/22	108CC	$0,00	100%
121	Semaforización	1 día	jue 2/06/22	vie 3/06/22	120FC+8 días	$0,00	100%
122	REPLANTEO GENERAL	1 día	vie 10/06/22	sáb 11/06/22	121FC+6 días	$401.525,06	100%
123	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	2 días	sáb 11/06/22	mar 14/06/22	128CC	$2.753.997,33	100%
124	PROTECCION A SUMIDEROS.	1 día	vie 10/06/22	sáb 11/06/22	122CC	$0,00	100%
125	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANT	2 días	lun 13/06/22	mié 15/06/22	128	$668.418,34	100%
126	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CR	2 días	lun 13/06/22	mié 15/06/22	125CC	$1.189.879,46	100%
127	MEZCLA ASFÁLTICA	2 días	mié 15/06/22	vie 17/06/22	126	$44.797.207,50	100%
128	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	1 día	sáb 11/06/22	lun 13/06/22	124	$3.946.417,73	100%
129	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	2 días	mar 20/12/22	mié 21/12/22	130FC+13 días	$290.632,58	0%
130	ACTIVIDADES CONTRALORIA	19 días	jue 10/11/22	sáb 3/12/22	127FC+20 días	$230.971,31	82%
131	**Componentes (SST, Ambiental, PMT)**	**79 días**	**jue 19/05/22**	**mié 21/12/22**	**120CC**	**$40.737.203,08**	**77%**
132	**CIV'S ESPACIO PÚBLICO**	**101 días**	**vie 8/04/22**	**vie 9/12/22**		**$115.017.493,51**	**96%**
133	**CIV 14001393**	**92 días**	**vie 22/04/22**	**vie 9/12/22**		**$96.065.205,49**	**97%**
134	Socialización y preliminares de componentes	1 día	vie 22/04/22	sáb 23/04/22	40CC-33 días	$0,00	100%
135	REPLANTEO GENERAL	4 días	jue 28/04/22	mar 3/05/22	134FC+4 días	$448.559,28	100%

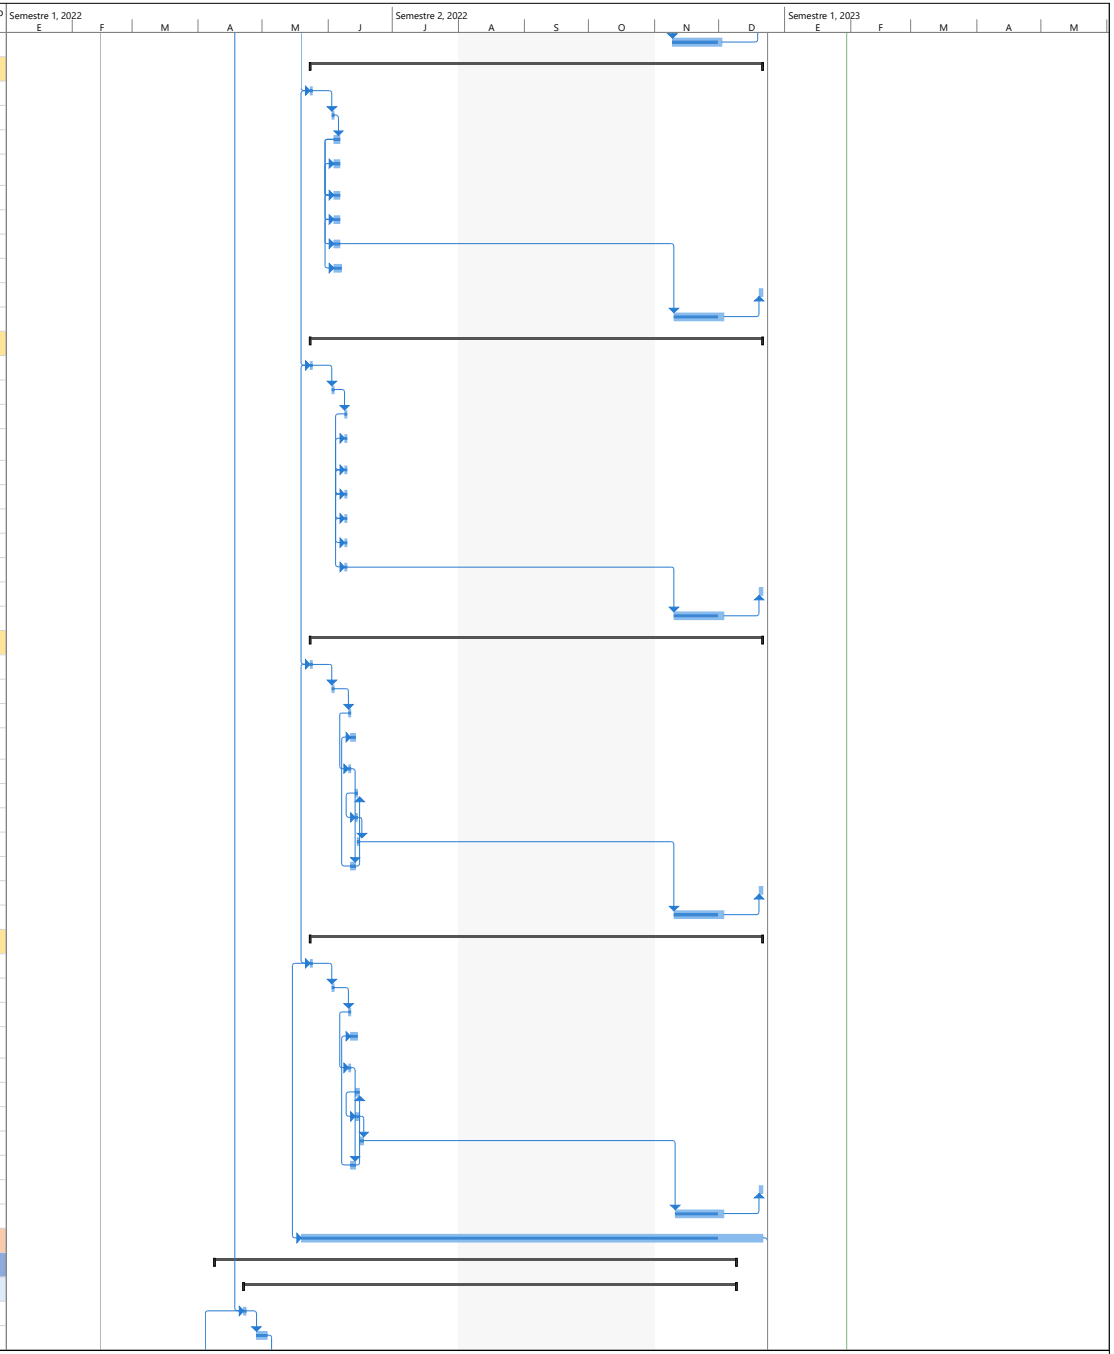

Proyecto: PROGRAMACIÓN BO
Fecha: lun 30/01/23

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	% completado
136	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO	10 días	mar 3/05/22	vie 13/05/22	135	$4.604.202,48	100%
137	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	20 días	mar 3/05/22	mié 25/05/22	136CC	$3.076.586,26	100%
138	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE	10 días	mar 3/05/22	vie 13/05/22	136CC	$806.505,35	100%
139	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	10 días	vie 13/05/22	mié 25/05/22	136	$1.000.437,22	100%
140	PROTECCION A SUMIDEROS	4 días	mar 3/05/22	vie 6/05/22	138CC	$75.297,00	100%
141	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	6 días	mié 25/05/22	mié 1/06/22	139	$746.713,44	100%
142	SARDINEL H=0.20M, E=0.15M CONCRETO 3000 P	20 días	vie 3/06/22	mié 29/06/22	147CC	$175.002,85	100%
143	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B)	6 días	mié 25/05/22	mié 1/06/22	141CC	$4.272.048,25	100%
144	LOSETA ACHURADO TIPO A20	10 días	vie 3/06/22	mié 15/06/22	142CC	$16.715.856,22	100%
145	CONCRETO MR41 COLOR OCRE PARA RAMPAS Y ESCALERAS	10 días	vie 3/06/22	mié 15/06/22	146CC+2 días	$12.721.204,57	100%
146	CONCRETO 3000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PARA ANDENES	15 días	jue 2/06/22	sáb 18/06/22	143	$27.677.209,20	100%
147	SARDINEL TIPO A10	20 días	vie 3/06/22	mié 29/06/22	149CC	$0,00	100%
148	CANECA TIPO M120	4 días	mié 22/06/22	mar 28/06/22	151	$1.469.864,28	100%
149	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS	20 días	vie 3/06/22	mié 29/06/22	145CC	$1.184.508,00	100%
150	ACCESO TEMPORAL A VIVIENDA EN MADERA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN.	20 días	mar 10/05/22	jue 2/06/22	140FC+3 días	$948.087,84	100%
151	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR	4 días	jue 16/06/22	mié 22/06/22	154	$5.418.036,26	100%
152	RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2"	6 días	mar 7/06/22	lun 13/06/22	153CC	$8.052.249,48	100%
153	REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA HACIA EL PREDIO	6 días	mar 7/06/22	lun 13/06/22	145CC+2 días	$199.327,35	100%
154	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M	3 días	lun 13/06/22	jue 16/06/22	152	$6.473.510,16	100%
155	ACTIVIDADES CONTRALORIA	20 días	mié 16/11/22	vie 9/12/22	151FC+20 días	$0,00	63%
156	**Componentes (SST, Ambiental, PMT)**	**101 días**	**vie 8/04/22**	**vie 9/12/22**	**134CC**	**$18.952.288,02**	**93%**
157	**PROGRAMACIÓN ADICION**	**35 días**	**mié 9/11/22**	**mar 20/12/22**		**$80.921.670,64**	**45%**
1	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y CICLO INFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES**	**35 días**	**mié 9/11/22**	**mar 20/12/22**		**$80.921.670,64**	**45%**
2	**FIRMA DE ADICION Y PRORROGA**	**35 días**	**mié 9/11/22**	**mar 20/12/22**		**$80.921.670,64**	**45%**
3	**ETAPA DE DIAGNÓSTICO**	**8 días**	**mié 9/11/22**	**vie 18/11/22**		**$0,00**	**78%**
4	Revisión de diseños iniciales	8 días	mié 9/11/22	vie 18/11/22		$0,00	78%
5	Radicación de requisitos para PMT	8 días	mié 9/11/22	vie 18/11/22		$0,00	78%
6	Elaboración de diagnósticos	8 días	mié 9/11/22	vie 18/11/22		$0,00	78%
7	**CIV'S MALLA VIAL**	**28 días**	**jue 17/11/22**	**mar 20/12/22**		**$80.921.670,64**	**0%**
8	**CIV 14001416**	**28 días**	**jue 17/11/22**	**mar 20/12/22**		**$80.921.670,64**	**0%**
9	Socialización y preliminares de component	3 días	jue 17/11/22	lun 21/11/22	5CC+7 días	$0,00	0%
10	REPLANTEO GENERAL	1 día	lun 21/11/22	mar 22/11/22	9	$403.142,65	0%
11	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.	2 días	mar 22/11/22	jue 24/11/22	15CC	$15.682.817,26	0%
12	PROTECCION A SUMIDEROS.	1 día	lun 21/11/22	mar 22/11/22	10CC	$45.178,20	0%
13	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	2 días	jue 24/11/22	sáb 26/11/22	15	$1.148.437,95	0%
14	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100).	2 días	jue 24/11/22	sáb 26/11/22	13CC	$55.220.501,14	0%
15	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE).	2 días	mar 22/11/22	jue 24/11/22	10	$1.921.046,44	0%
16	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	5 días	mié 14/12/22	mar 20/12/22	14FC+15 días	$6.500.547,00	0%
17	FIN DE ACTIVIDADES DE OBRA	0 días	mar 20/12/22	mar 20/12/22	16	$0,00	0%
158	**FIN DEL CONTRATO**	**0 días**	**mié 21/12/22**	**mié 21/12/22**	**131;156**	**$0,00**	**0%**

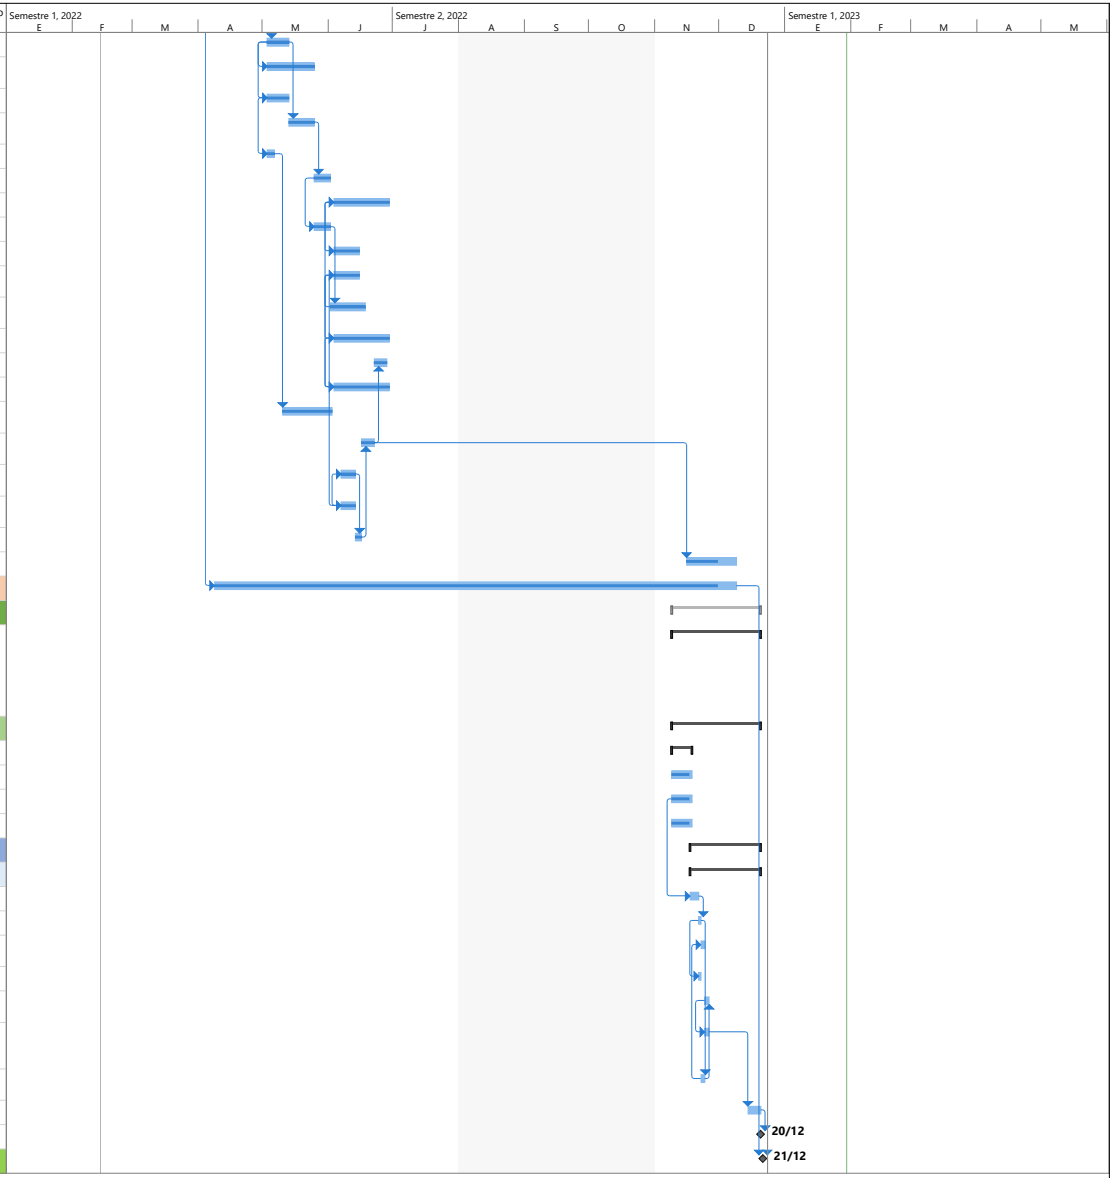

Proyecto: PROGRAMACIÓN BO
Fecha: lun 30/01/23

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual
