
Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	% trabajo completado
1	**1**	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y CICLO INFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE LOS**	**162 días?**	**lun 14/02/22**	**vie 23/12/22**		**$622.204.671,97**	**0%**
2	**1.1**	**FIRMA DE ACTA DE INICIO**	**0 días**	**lun 14/02/22**	**lun 14/02/22**		**$0,00**	**100%**
3	**1.2**	**ETAPA DE DIAGNÓSTICO**	**52 días**	**lun 14/02/22**	**lun 18/04/22**		**$9.040.112,43**	**100%**
4	1.2.1	Revisión de diseños iniciales	35 días	lun 14/02/22	sáb 26/03/22	2CC+1 día	$0,00	100%
5	1.2.2	Radicación de requisitos para PMT	20 días	mié 23/03/22	lun 18/04/22	4FC-3 días	$0,00	100%
6	1.2.3	Apropiación de diseños	1 día	sáb 26/03/22	lun 28/03/22	4	$0,00	100%
7	1.2.4	Elaboración de diagnósticos	30 días	lun 14/02/22	sáb 19/03/22	4CC	$9.040.112,43	100%
8	**1.3**	**INICIO DE OBRA**	**0 días**	**lun 18/04/22**	**lun 18/04/22**	**6;7;5;4**	**$0,00**	**100%**
9	**1.4**	**CIV'S MALLA VIAL**	**89 días**	**mar 10/05/22**	**vie 23/12/22**		**$208.164.072,77**	**0%**
10	**1.4.1**	**CIV 14000567**	**83 días**	**mar 17/05/22**	**vie 23/12/22**		**$134.555.059,97**	**0%**
11	1.4.1.14	Socialización y preliminares de componentes	2 días	mar 17/05/22	jue 19/05/22	7FC+48 días	$0,00	100%
12	1.4.1.15	REPLANTEO GENERAL	1 día	mar 7/06/22	mié 8/06/22	11CC+18 día	$1.860.993,30	100%
13	1.4.1.16	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	3 días	mar 7/06/22	jue 9/06/22	21CF	$6.701.319,96	100%
14	1.4.1.17	PROTECCION A SUMIDEROS	1 día	mar 7/06/22	mié 8/06/22	12CC	$60.237,64	100%
15	1.4.1.18	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PARA CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE CON RETROEXCAVADORA	3 días	lun 13/06/22	jue 16/06/22	21	$33.394,68	100%
16	1.4.1.19	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	mié 15/06/22	vie 17/06/22	15CC+2 días	$1.439.345,06	100%
17	1.4.1.20	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	3 días	jue 16/06/22	mar 21/06/22	16CC+1 día	$210.324,30	100%
18	1.4.1.21	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	14	$113.804,29	100%
19	1.4.1.22	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	2 días	mar 21/06/22	jue 23/06/22	17	$2.409.015,57	100%
20	1.4.1.23	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD	3 días	mar 21/06/22	vie 24/06/22	19CC	$108.834.571,17	100%
21	1.4.1.24	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARC	3 días	jue 9/06/22	lun 13/06/22	18	$12.254.765,85	100%
22	1.4.1.25	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	5 días	lun 19/12/22	vie 23/12/22	23FC+13 días	$637.288,15	0%
23	1.4.1.26	ACTIVIDADES CONTRALORIA	20 días	mié 9/11/22	vie 2/12/22	20FC+13 días	$0,00	100%
24	**1.4.2**	**CIV 14001505**	**89 días**	**mar 10/05/22**	**vie 23/12/22**		**$73.609.012,80**	**0%**
25	1.4.2.14	Socialización y preliminares de componentes	1 día	mar 10/05/22	mié 11/05/22	7FC+42 días	$0,00	100%
26	1.4.2.15	REPLANTEO GENERAL	1 día	mié 18/05/22	jue 19/05/22	25CC+7 días	$729.634,44	100%
27	1.4.2.16	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBR	2 días	mar 17/05/22	jue 19/05/22	35CF	$4.439.704,23	100%
28	1.4.2.17	PROTECCION A SUMIDEROS.	1 día	mié 18/05/22	jue 19/05/22	26CC	$60.237,64	100%
29	1.4.2.18	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PA	1 día	sáb 21/05/22	lun 23/05/22	35	$303.536,28	100%
30	1.4.2.19	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	sáb 21/05/22	lun 23/05/22	29CC	$730.003,90	100%
31	1.4.2.20	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENII	1 día	lun 23/05/22	mar 24/05/22	30	$79.207,23	100%
32	1.4.2.21	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTA	1 día	jue 19/05/22	vie 20/05/22	28	$0,00	100%
33	1.4.2.22	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	1 día	mar 24/05/22	mié 25/05/22	31	$1.451.430,09	100%
34	1.4.2.23	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD	2 días	mié 25/05/22	jue 26/05/22	33	$60.274.211,96	100%
35	1.4.2.24	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARC	2 días	jue 19/05/22	sáb 21/05/22	28	$5.298.717,06	100%
36	1.4.2.25	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	5 días	lun 19/12/22	vie 23/12/22	37FC+13 días	$242.329,97	0%
37	1.4.2.26	ACTIVIDADES CONTRALORIA	20 días	mié 9/11/22	vie 2/12/22	34FC+36 días	$0,00	100%
38	**1.5**	**CIV'S CICLORUTAS**	**78 días?**	**lun 23/05/22**	**vie 23/12/22**		**$249.245.790,18**	**0%**
39	**1.5.1**	**CIV 14000009**	**71 días?**	**mar 31/05/22**	**jue 22/12/22**		**$61.033.059,19**	**0%**
40	1.5.1.15	Socialización y preliminares de componentes	1 día	mar 31/05/22	mié 1/06/22	7FC+59 días	$0,00	100%
41	1.5.1.16	REPLANTEO GENERAL	3 días	mié 22/06/22	sáb 25/06/22	40FC+18 días	$404.494,93	100%
42	1.5.1.17	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBR	3 días	jue 23/06/22	mar 28/06/22	49CF	$1.208.244,57	100%
43	1.5.1.18	PROTECCION A SUMIDEROS.	1 día	mié 22/06/22	jue 23/06/22	41CC	$0,00	100%
44	1.5.1.19	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	jue 23/06/22	vie 24/06/22	49	$419.001,41	100%
45	1.5.1.20	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTA	1 día	jue 23/06/22	vie 24/06/22	43	$167.512,09	100%
46	1.5.1.21	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	1 día	mar 28/06/22	mié 29/06/22	44	$1.528.188,10	100%
47	1.5.1.22	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD	2 días	mar 28/06/22	jue 30/06/22	46	$41.843.189,12	100%
48	1.5.1.23	CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON	1 día?	mié 21/12/22	jue 22/12/22	47FC+45 días	$1.055.194,09	0%
49	1.5.1.24	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	3 días	jue 23/06/22	mar 28/06/22	45	$1.728.498,87	100%
50	1.5.1.25	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	1 día	lun 19/12/22	lun 19/12/22	53FC+13 días	$1.249.098,01	0%
51	1.5.1.26	AFOROS DE TRANSITO	1 día	jue 7/07/22	jue 7/07/22	47FC+5 días	$3.822.910,00	100%
52	1.5.1.27	BARRERAS RELLENABLES	6 días	mié 22/06/22	jue 30/06/22	43CC	$7.606.728,00	100%
53	1.5.1.28	ACTIVIDADES CONTRALORIA	20 días	mié 9/11/22	vie 2/12/22	47FC+10 días	$0,00	100%
54	**1.5.2**	**CIV 14000018**	**72 días**	**mar 31/05/22**	**vie 23/12/22**		**$6.312.700,88**	**0%**
55	1.5.2.10	Socialización y preliminares de componentes	1 día	mar 31/05/22	mié 1/06/22	40CC	$0,00	100%
56	1.5.2.11	REPLANTEO GENERAL	1 día	sáb 26/11/22	lun 28/11/22	55FC+48 días	$109.831,06	100%
57	1.5.2.12	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBR	2 días	mié 14/12/22	jue 15/12/22	62CF	$220.999,13	100%
58	1.5.2.13	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	lun 19/12/22	lun 19/12/22	62	$76.739,45	100%
59	1.5.2.14	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTA	1 día	jue 15/12/22	vie 16/12/22	56FC+15 días	$170.813,43	100%
60	1.5.2.15	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	1 día	lun 19/12/22	lun 19/12/22	58CC	$136.607,10	100%
61	1.5.2.16	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD	1 día	mar 20/12/22	mar 20/12/22	60	$4.854.523,46	100%
62	1.5.2.17	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	2 días	jue 15/12/22	lun 19/12/22	59CC	$315.938,97	100%
63	1.5.2.18	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	1 día	jue 22/12/22	vie 23/12/22	61FC+2 días	$427.248,28	0%
64	**1.5.3**	**CIV 14000025**	**72 días**	**mar 31/05/22**	**vie 23/12/22**		**$8.123.985,67**	**0%**
65	1.5.3.11	Socialización y preliminares de componentes	1 día	mar 31/05/22	mié 1/06/22	40CC	$0,00	100%
66	1.5.3.12	REPLANTEO GENERAL	1 día	sáb 26/11/22	lun 28/11/22	65FC+48 días	$131.401,48	100%
67	1.5.3.13	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBR	2 días	mié 14/12/22	jue 15/12/22	72CF	$287.704,90	100%
68	1.5.3.14	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	lun 19/12/22	lun 19/12/22	72	$99.708,21	100%
69	1.5.3.15	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTA	1 día	jue 15/12/22	vie 16/12/22	66FC+15 días	$236.595,55	100%
70	1.5.3.16	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	1 día	lun 19/12/22	lun 19/12/22	68CC	$177.494,75	100%
71	1.5.3.17	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD	1 día	mar 20/12/22	mar 20/12/22	70	$6.319.799,57	100%
72	1.5.3.18	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	2 días	jue 15/12/22	lun 19/12/22	69CC	$411.906,78	100%
73	1.5.3.19	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	1 día	jue 22/12/22	vie 23/12/22	71FC+2 días	$459.374,43	0%
74	**1.5.4**	**CIV 14000048**	**69 días**	**mar 31/05/22**	**mar 20/12/22**		**$12.763.113,19**	**0%**
75	1.5.4.10	Socialización y preliminares de componentes	1 día	mar 31/05/22	mié 1/06/22	65CC	$0,00	100%
76	1.5.4.11	REPLANTEO GENERAL	1 día	vie 3/06/22	lun 6/06/22	75FC+3 días	$123.353,35	100%
77	1.5.4.12	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBR	1 día	lun 6/06/22	lun 6/06/22	81CC	$592.242,90	100%
78	1.5.4.13	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	mar 7/06/22	mar 7/06/22	81	$205.346,20	100%
79	1.5.4.14	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	1 día	mar 7/06/22	mar 7/06/22	78CC	$365.545,36	100%
80	1.5.4.15	MEZCLA ASFÁLTICA	1 día	mar 7/06/22	mié 8/06/22	79	$10.106.350,42	100%
81	1.5.4.16	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	1 día	lun 6/06/22	lun 6/06/22	76	$848.671,07	100%
82	1.5.4.17	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	2 días	lun 19/12/22	mar 20/12/22	83FC+13 días	$290.632,58	0%
83	1.5.4.18	ACTIVIDADES CONTRALORIA	20 días	mié 9/11/22	vie 2/12/22	80FC+26 días	$230.971,31	100%
84	**1.5.5**	**CIV 14000091**	**76 días**	**lun 23/05/22**	**mié 21/12/22**		**$18.061.416,30**	**0%**
85	1.5.5.11	Socialización y preliminares de componentes	1 día	lun 23/05/22	mar 24/05/22	75CC-6 días	$0,00	100%
86	1.5.5.12	Semaforización	1 día	jue 2/06/22	vie 3/06/22	85FC+8 días	$0,00	100%
87	1.5.5.13	REPLANTEO GENERAL	1 día	vie 3/06/22	lun 6/06/22	86	$183.842,67	100%
88	1.5.5.14	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBR	1 día	vie 3/06/22	lun 6/06/22	89CC	$882.663,61	100%
89	1.5.5.15	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	vie 3/06/22	lun 6/06/22	87CC	$306.042,70	100%
90	1.5.5.16	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	1 día	vie 3/06/22	lun 6/06/22	89CC	$544.799,42	100%
91	1.5.5.17	MEZCLA ASFÁLTICA	1 día	vie 3/06/22	lun 6/06/22	90CC	$14.357.626,43	100%
92	1.5.5.18	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	2 días	vie 3/06/22	lun 6/06/22	87CC	$1.264.837,58	100%
93	1.5.5.19	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	2 días	mar 20/12/22	mié 21/12/22	94FC+13 días	$290.632,58	0%
94	1.5.5.20	ACTIVIDADES CONTRALORIA	20 días	jue 10/11/22	sáb 3/12/22	91FC+30 días	$230.971,31	100%
95	**1.5.6**	**CIV 14000102**	**76 días**	**lun 23/05/22**	**mié 21/12/22**		**$34.393.416,33**	**0%**
96	1.5.6.12	Socialización y preliminares de componentes	1 día	lun 23/05/22	mar 24/05/22	85CC	$0,00	100%
97	1.5.6.13	Semaforización	1 día	jue 2/06/22	vie 3/06/22	96FC+8 días	$0,00	100%
98	1.5.6.14	REPLANTEO GENERAL	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	97FC+4 días	$252.995,31	100%
99	1.5.6.15	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBR	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	101CC	$1.735.255,10	100%
100	1.5.6.16	PROTECCION A SUMIDEROS.	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	98CC	$0,00	100%
101	1.5.6.17	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	100CC	$421.161,02	100%
102	1.5.6.18	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	101CC	$749.726,36	100%
103	1.5.6.19	MEZCLA ASFÁLTICA	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	102CC	$28.226.092,19	100%
104	1.5.6.20	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	100CC	$2.486.582,46	100%
105	1.5.6.21	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	2 días	mar 20/12/22	mié 21/12/22	106FC+13 día	$290.632,58	0%
106	1.5.6.22	ACTIVIDADES CONTRALORIA	20 días	jue 10/11/22	sáb 3/12/22	104FC+26 día	$230.971,31	100%
107	**1.5.7**	**CIV 14000118**	**76 días**	**lun 23/05/22**	**mié 21/12/22**		**$54.279.049,31**	**0%**
108	1.5.7.12	Socialización y preliminares de componentes	1 día	lun 23/05/22	mar 24/05/22	96CC	$0,00	100%
109	1.5.7.13	Semaforización	1 día	jue 2/06/22	vie 3/06/22	108FC+8 días	$0,00	100%
110	1.5.7.14	REPLANTEO GENERAL	1 día	vie 10/06/22	sáb 11/06/22	109FC+6 días	$401.525,06	100%
111	1.5.7.15	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBR	1 día	sáb 11/06/22	lun 13/06/22	116CC	$2.753.997,33	100%
112	1.5.7.16	PROTECCION A SUMIDEROS.	1 día	vie 10/06/22	sáb 11/06/22	110CC	$0,00	100%
113	1.5.7.17	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	lun 13/06/22	mar 14/06/22	116	$668.418,34	100%
114	1.5.7.18	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	1 día	lun 13/06/22	mar 14/06/22	113CC	$1.189.879,46	100%
115	1.5.7.19	MEZCLA ASFÁLTICA	1 día	mar 14/06/22	mié 15/06/22	114	$44.797.207,50	100%
116	1.5.7.20	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	1 día	sáb 11/06/22	lun 13/06/22	112	$3.946.417,73	100%
117	1.5.7.21	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	2 días	mar 20/12/22	mié 21/12/22	118FC+13 día	$290.632,58	0%
118	1.5.7.22	ACTIVIDADES CONTRALORIA	20 días	jue 10/11/22	sáb 3/12/22	115FC+21 día	$230.971,31	100%
119	**1.5.8**	**CIV 14000145**	**76 días**	**lun 23/05/22**	**mié 21/12/22**		**$54.279.049,31**	**0%**
120	1.5.8.12	Socialización y preliminares de componentes	1 día	lun 23/05/22	mar 24/05/22	108CC	$0,00	100%
121	1.5.8.13	Semaforización	1 día	jue 2/06/22	vie 3/06/22	120FC+8 días	$0,00	100%
122	1.5.8.14	REPLANTEO GENERAL	1 día	vie 10/06/22	sáb 11/06/22	121FC+6 días	$401.525,06	100%
123	1.5.8.15	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBR	2 días	sáb 11/06/22	mar 14/06/22	128CC	$2.753.997,33	100%
124	1.5.8.16	PROTECCION A SUMIDEROS.	1 día	vie 10/06/22	sáb 11/06/22	122CC	$0,00	100%
125	1.5.8.17	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	lun 13/06/22	mié 15/06/22	128	$668.418,34	100%
126	1.5.8.18	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	2 días	lun 13/06/22	mié 15/06/22	125CC	$1.189.879,46	100%
127	1.5.8.19	MEZCLA ASFÁLTICA	2 días	mié 15/06/22	vie 17/06/22	126	$44.797.207,50	100%
128	1.5.8.20	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	1 día	sáb 11/06/22	lun 13/06/22	124	$3.946.417,73	100%
129	1.5.8.21	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	2 días	mar 20/12/22	mié 21/12/22	130FC+13 día	$290.632,58	0%
130	1.5.8.22	ACTIVIDADES CONTRALORIA	19 días	jue 10/11/22	sáb 3/12/22	127FC+20 día	$230.971,31	100%
131	**1.6**	**CIV'S ESPACIO PÚBLICO**	**92 días**	**vie 22/04/22**	**vie 9/12/22**		**$96.065.205,49**	**100%**
132	**1.6.1**	**CIV 14001393**	**92 días**	**vie 22/04/22**	**vie 9/12/22**		**$96.065.205,49**	**100%**
133	1.6.1.1	Socialización y preliminares de componentes	1 día	vie 22/04/22	sáb 23/04/22	40CC-33 días	$0,00	100%
134	1.6.1.2	REPLANTEO GENERAL	4 días	jue 28/04/22	mar 3/05/22	133FC+4 días	$448.559,28	100%
135	1.6.1.3	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO	10 días	mar 3/05/22	vie 13/05/22	134	$4.604.202,48	100%
136	1.6.1.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBR	20 días	mar 3/05/22	mié 25/05/22	135CC	$3.076.586,26	100%
137	1.6.1.5	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE	10 días	mar 3/05/22	vie 13/05/22	135CC	$806.505,35	100%
138	1.6.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INC	10 días	vie 13/05/22	mié 25/05/22	135	$1.000.437,22	100%
139	1.6.1.7	PROTECCION A SUMIDEROS	4 días	mar 3/05/22	vie 6/05/22	137CC	$75.297,00	100%
140	1.6.1.8	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	6 días	mié 25/05/22	mié 1/06/22	138	$746.713,44	100%
141	1.6.1.11	SARDINEL H=0.20M, E=0.15M CONCRETO 3000 P	20 días	vie 3/06/22	mié 29/06/22	146CC	$175.002,85	100%
142	1.6.1.12	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B)	6 días	mié 25/05/22	mié 1/06/22	140CC	$4.272.048,25	100%
143	1.6.1.13	LOSETA ACHURADO TIPO A20	10 días	vie 3/06/22	mié 15/06/22	141CC	$16.715.856,22	100%
144	1.6.1.14	CONCRETO MR41 COLOR OCRE PARA RAMPAS Y E	10 días	vie 3/06/22	mié 15/06/22	145CC+2 días	$12.721.204,57	100%
145	1.6.1.15	CONCRETO 3000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PA	15 días	jue 2/06/22	sáb 18/06/22	142	$27.677.209,20	100%
146	1.6.1.17	SARDINEL TIPO A10	20 días	vie 3/06/22	mié 29/06/22	148CC	$0,00	100%
147	1.6.1.18	CANECA TIPO M120	4 días	mié 22/06/22	mar 28/06/22	150	$1.469.864,28	100%
148	1.6.1.19	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS	20 días	vie 3/06/22	mié 29/06/22	144CC	$1.184.508,00	100%
149	1.6.1.20	ACCESO TEMPORAL A VIVIENDA EN MADERA. SUM	20 días	mar 10/05/22	jue 2/06/22	139FC+3 días	$948.087,84	100%
150	1.6.1.22	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PAI	4 días	jue 16/06/22	mié 22/06/22	153	$5.418.036,26	100%
151	1.6.1.23	RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D	6 días	mar 7/06/22	lun 13/06/22	152CC	$8.052.249,48	100%
152	1.6.1.24	REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA	6 días	mar 7/06/22	lun 13/06/22	144CC+2 días	$199.327,35	100%
153	1.6.1.25	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M	3 días	lun 13/06/22	jue 16/06/22	151	$6.473.510,16	100%
154	1.6.1.26	ACTIVIDADES CONTRALORIA	20 días	mié 16/11/22	vie 9/12/22	150FC+20 día	$0,00	100%
155	**1.7**	**Componentes (SST, Ambiental, PMT)**	**162 días**	**lun 14/02/22**	**vie 23/12/22**	**2CC**	**$59.689.491,10**	**0%**
156	**2**	**ADICION**	**39 días?**	**mar 8/11/22**	**vie 23/12/22**		**$80.921.670,64**	**0%**
157	**2.1**	**FIRMA DE ADICION Y PRORROGA**	**1 día?**	**mar 8/11/22**	**mar 8/11/22**		**$0,00**	**100%**
158	**2.2**	**ETAPA DE DIAGNÓSTICO**	**8 días**	**mar 8/11/22**	**jue 17/11/22**		**$0,00**	**100%**
159	2.2.1	Revisión de diseños iniciales	8 días	mar 8/11/22	jue 17/11/22		$0,00	100%
160	2.2.2	Radicación de requisitos para PMT	8 días	mar 8/11/22	jue 17/11/22		$0,00	100%
161	2.2.3	Elaboración de diagnósticos	8 días	mar 8/11/22	jue 17/11/22		$0,00	100%
162	**2.3**	**CIV'S MALLA VIAL**	**9,38 días**	**jue 17/11/22**	**jue 22/12/22**		**$80.921.670,64**	**0%**
163	**2.3.1**	**CIV 14001416**	**9,38 días**	**jue 17/11/22**	**jue 22/12/22**		**$80.921.670,64**	**0%**
164	2.3.1.1	Socialización y preliminares de componentes	3 días	jue 17/11/22	lun 21/11/22	160FC-1 día	$0,00	100%
165	2.3.1.2	REPLANTEO GENERAL	1 día	mar 22/11/22	mar 22/11/22	164	$403.142,65	0%
166	2.3.1.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBR	2 días	mié 23/11/22	jue 24/11/22	170CC	$15.682.817,26	0%
167	2.3.1.4	PROTECCION A SUMIDEROS.	1 día	mar 22/11/22	mar 22/11/22	165CC	$45.178,20	0%
168	2.3.1.5	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	2 días	vie 25/11/22	lun 28/11/22	170	$1.148.437,95	0%
169	2.3.1.6	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD	2 días	vie 25/11/22	lun 28/11/22	168CC	$55.220.501,14	0%
170	2.3.1.7	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARC	2 días	mié 23/11/22	jue 24/11/22	165	$1.921.046,44	0%
171	2.3.1.8	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	5 días	jue 15/12/22	mié 21/12/22	169FC+15 día	$6.500.547,00	0%
172	2.3.1.9	FIN DE ACTIVIDADES DE OBRA	1 día	mié 21/12/22	jue 22/12/22	171	$0,00	0%
173	**2.4**	**Componentes (SST, Ambiental, PMT)**	**1 día?**	**mar 8/11/22**	**mar 8/11/22**	**157CC**	**$0,00**	**100%**
174	**3**	**FIN DEL CONTRATO**	**0 días**	**vie 23/12/22**	**vie 23/12/22**	**155**	**$0,00**	**0%**

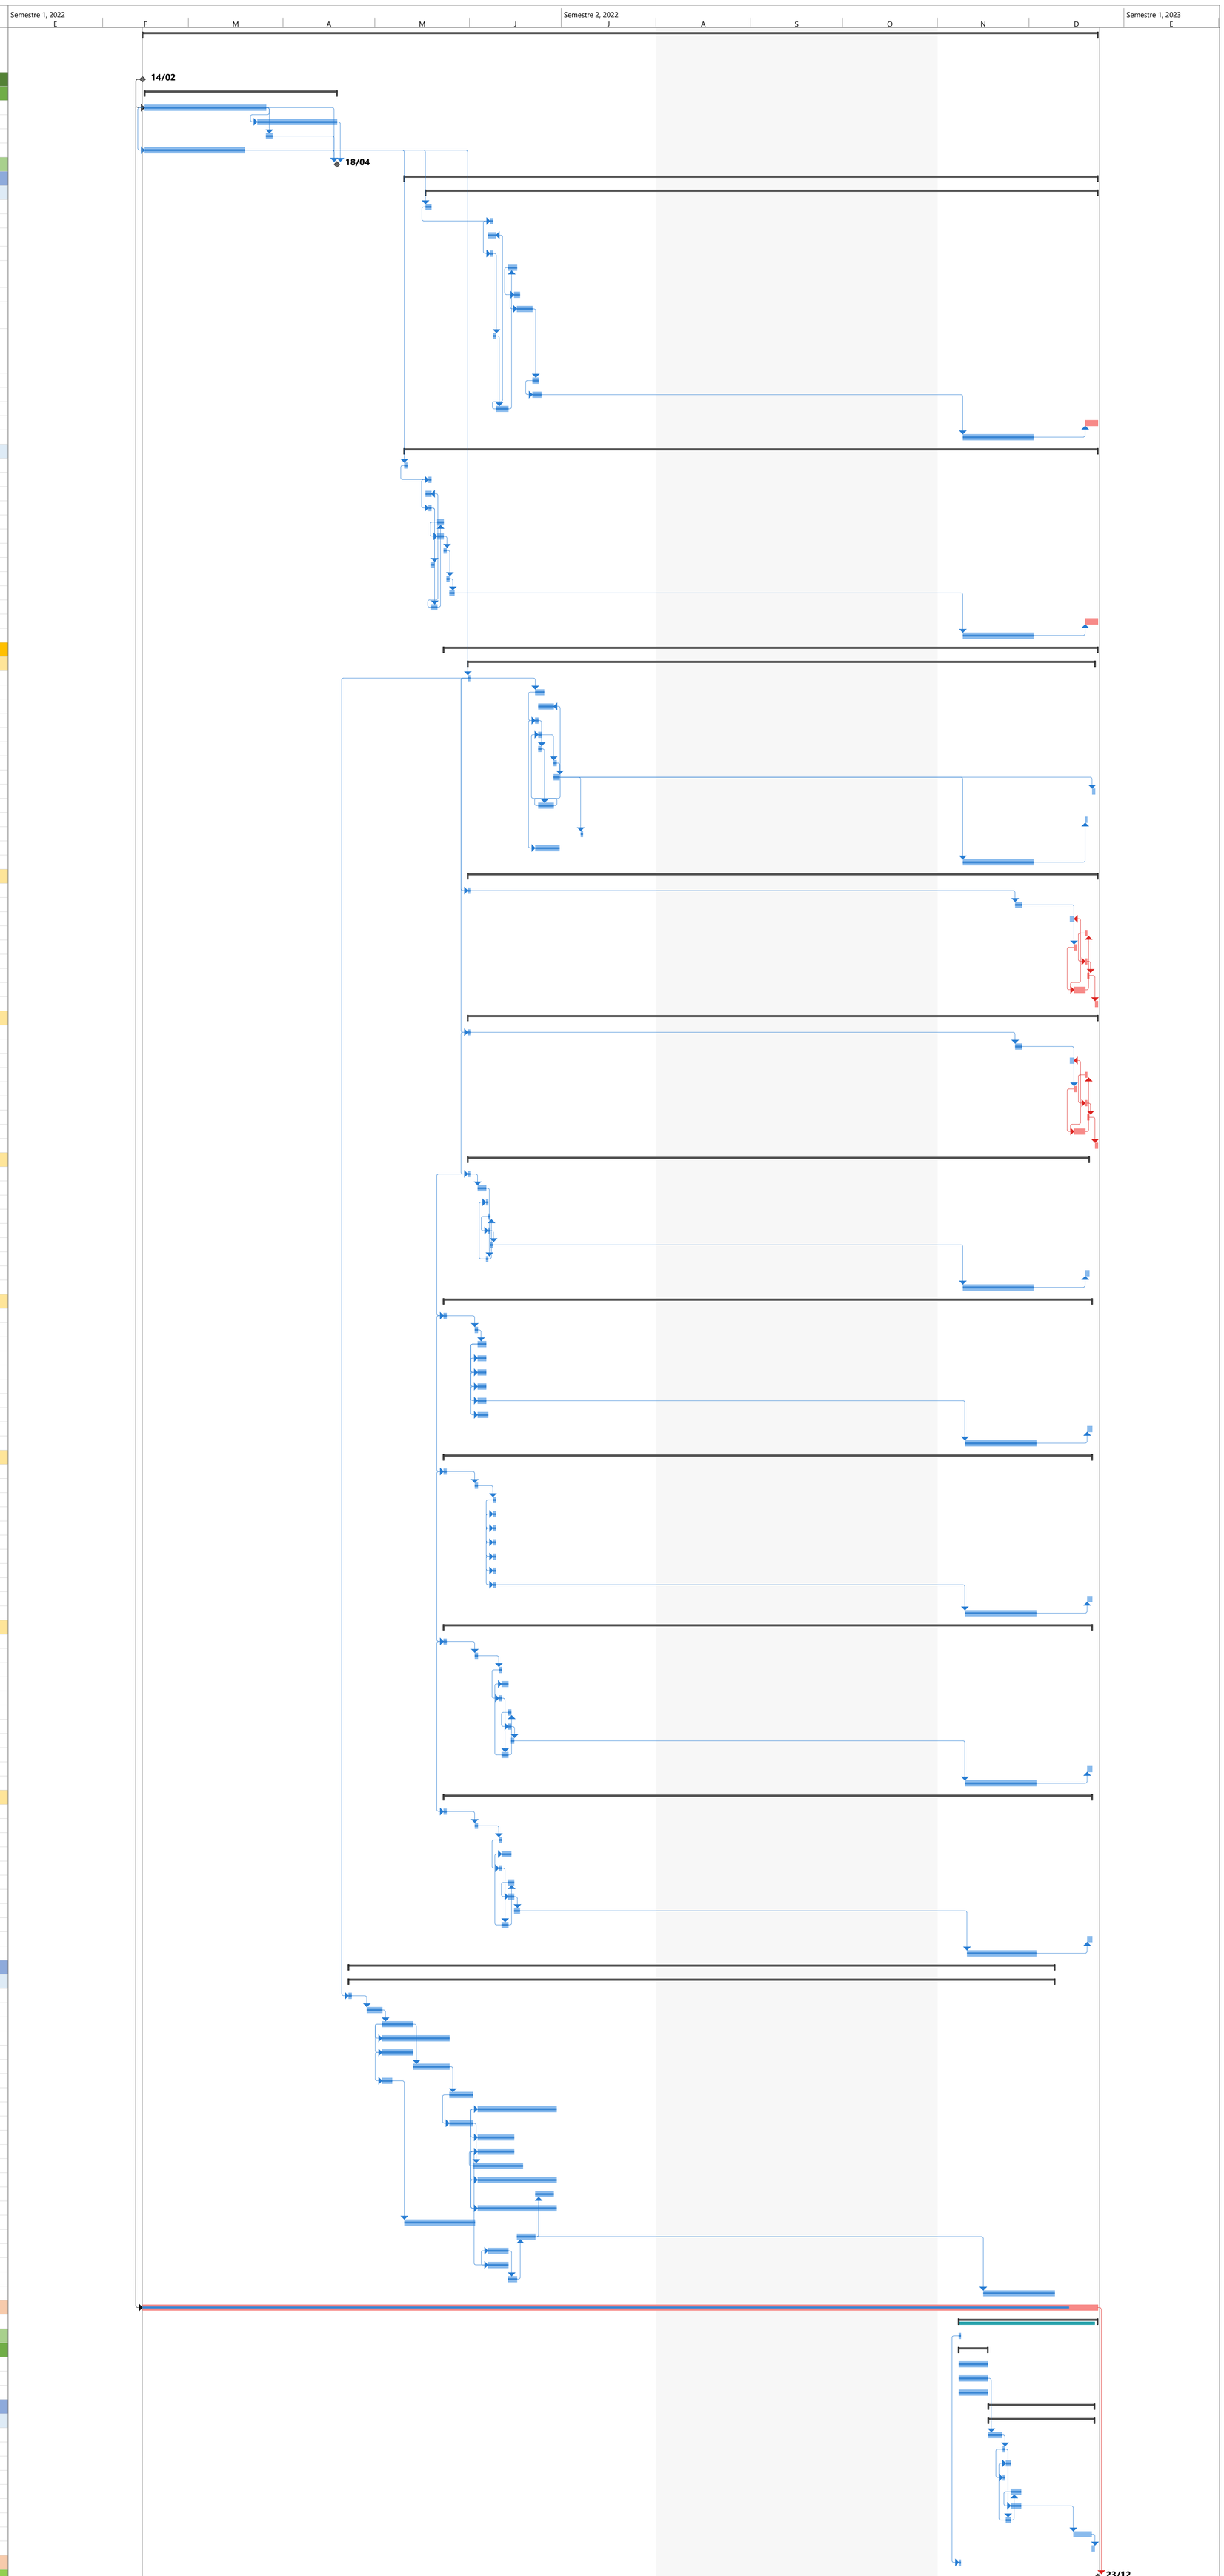

Proyecto: PROGRAMACIÓN BO
Fecha: mar 12/03/24

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual
