

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**1**	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y CICLO INFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES**	**159,13 días**	**lun 14/02/22**	**vie 3/02/23**	
2	**1.1**	**FIRMA DE ACTA DE INICIO**	**0 días**	**lun 14/02/22**	**lun 14/02/22**	
3	**1.2**	**ETAPA DE DIAGNÓSTICO**	**52 días**	**lun 14/02/22**	**lun 18/04/22**	
4	1.2.1	Revisión de diseños iniciales	35 días	lun 14/02/22	sáb 26/03/22	2CC+1 día
5	1.2.2	Radicación de requisitos para PMT	20 días	mié 23/03/22	lun 18/04/22	4FC-3 días
6	1.2.3	Apropiación de diseños	1 día	sáb 26/03/22	lun 28/03/22	4
7	1.2.4	Elaboración de diagnósticos	30 días	lun 14/02/22	sáb 19/03/22	4CC
8	**1.3**	**INICIO DE OBRA**	**0 días**	**lun 18/04/22**	**lun 18/04/22**	**6;7;5;4**
9	**1.4**	**CIV'S MALLA VIAL**	**86 días**	**mar 10/05/22**	**vie 3/02/23**	
10	**1.4.1**	**CIV 14000567**	**80 días**	**mar 17/05/22**	**vie 3/02/23**	
11	1.4.1.14	Socialización y preliminares de componentes	2 días	mar 17/05/22	jue 19/05/22	7FC+48 días
12	1.4.1.15	REPLANTEO GENERAL	1 día	mar 7/06/22	mié 8/06/22	11CC+18 día
13	1.4.1.16	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	3 días	mar 7/06/22	jue 9/06/22	21CF
14	1.4.1.17	PROTECCION A SUMIDEROS	1 día	mar 7/06/22	mié 8/06/22	12CC
15	1.4.1.18	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PARA CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE CON RETROEXCAVADORA	3 días	lun 13/06/22	jue 16/06/22	21
16	1.4.1.19	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	mié 15/06/22	vie 17/06/22	15CC+2 días
17	1.4.1.20	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	3 días	jue 16/06/22	mar 21/06/22	16CC+1 día
18	1.4.1.21	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	14
19	1.4.1.22	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	2 días	mar 21/06/22	jue 23/06/22	17
20	1.4.1.23	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD	3 días	mar 21/06/22	vie 24/06/22	19CC
21	1.4.1.24	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARG	3 días	jue 9/06/22	lun 13/06/22	18
22	1.4.1.25	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	3 días	mié 1/02/23	vie 3/02/23	23FC+12 días
23	1.4.1.26	ACTIVIDADES CONTRALORIA	20 días	mar 8/11/22	jue 1/12/22	20FC+13 días
24	**1.4.2**	**CIV 14001505**	**86 días**	**mar 10/05/22**	**vie 3/02/23**	
25	1.4.2.14	Socialización y preliminares de componentes	1 día	mar 10/05/22	mié 11/05/22	7FC+42 días
26	1.4.2.15	REPLANTEO GENERAL	1 día	mié 18/05/22	jue 19/05/22	25CC+7 días
27	1.4.2.16	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBR	2 días	mar 17/05/22	jue 19/05/22	35CF
28	1.4.2.17	PROTECCION A SUMIDEROS.	1 día	mié 18/05/22	jue 19/05/22	26CC
29	1.4.2.18	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PA	1 día	sáb 21/05/22	lun 23/05/22	35
30	1.4.2.19	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	sáb 21/05/22	lun 23/05/22	29CC
31	1.4.2.20	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENII	1 día	lun 23/05/22	mar 24/05/22	30
32	1.4.2.21	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTA	1 día	jue 19/05/22	vie 20/05/22	28
33	1.4.2.22	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	1 día	mar 24/05/22	mié 25/05/22	31
34	1.4.2.23	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD	2 días	mié 25/05/22	jue 26/05/22	33
35	1.4.2.24	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARG	2 días	jue 19/05/22	sáb 21/05/22	28
36	1.4.2.25	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	3 días	mié 1/02/23	vie 3/02/23	37FC+12 días
37	1.4.2.26	ACTIVIDADES CONTRALORIA	20 días	mar 8/11/22	jue 1/12/22	34FC+36 días
38	**1.5**	**CIV'S CICLORUTAS**	**'5,13 día**	**lun 23/05/22**	**vie 3/02/23**	
39	**1.5.1**	**CIV 14000009**	**69 días**	**mar 31/05/22**	**vie 3/02/23**	
40	1.5.1.15	Socialización y preliminares de componentes	1 día	mar 31/05/22	mié 1/06/22	7FC+59 días
41	1.5.1.16	REPLANTEO GENERAL	3 días	mié 22/06/22	sáb 25/06/22	40FC+18 días
42	1.5.1.17	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBR	3 días	mar 21/06/22	vie 24/06/22	49CF

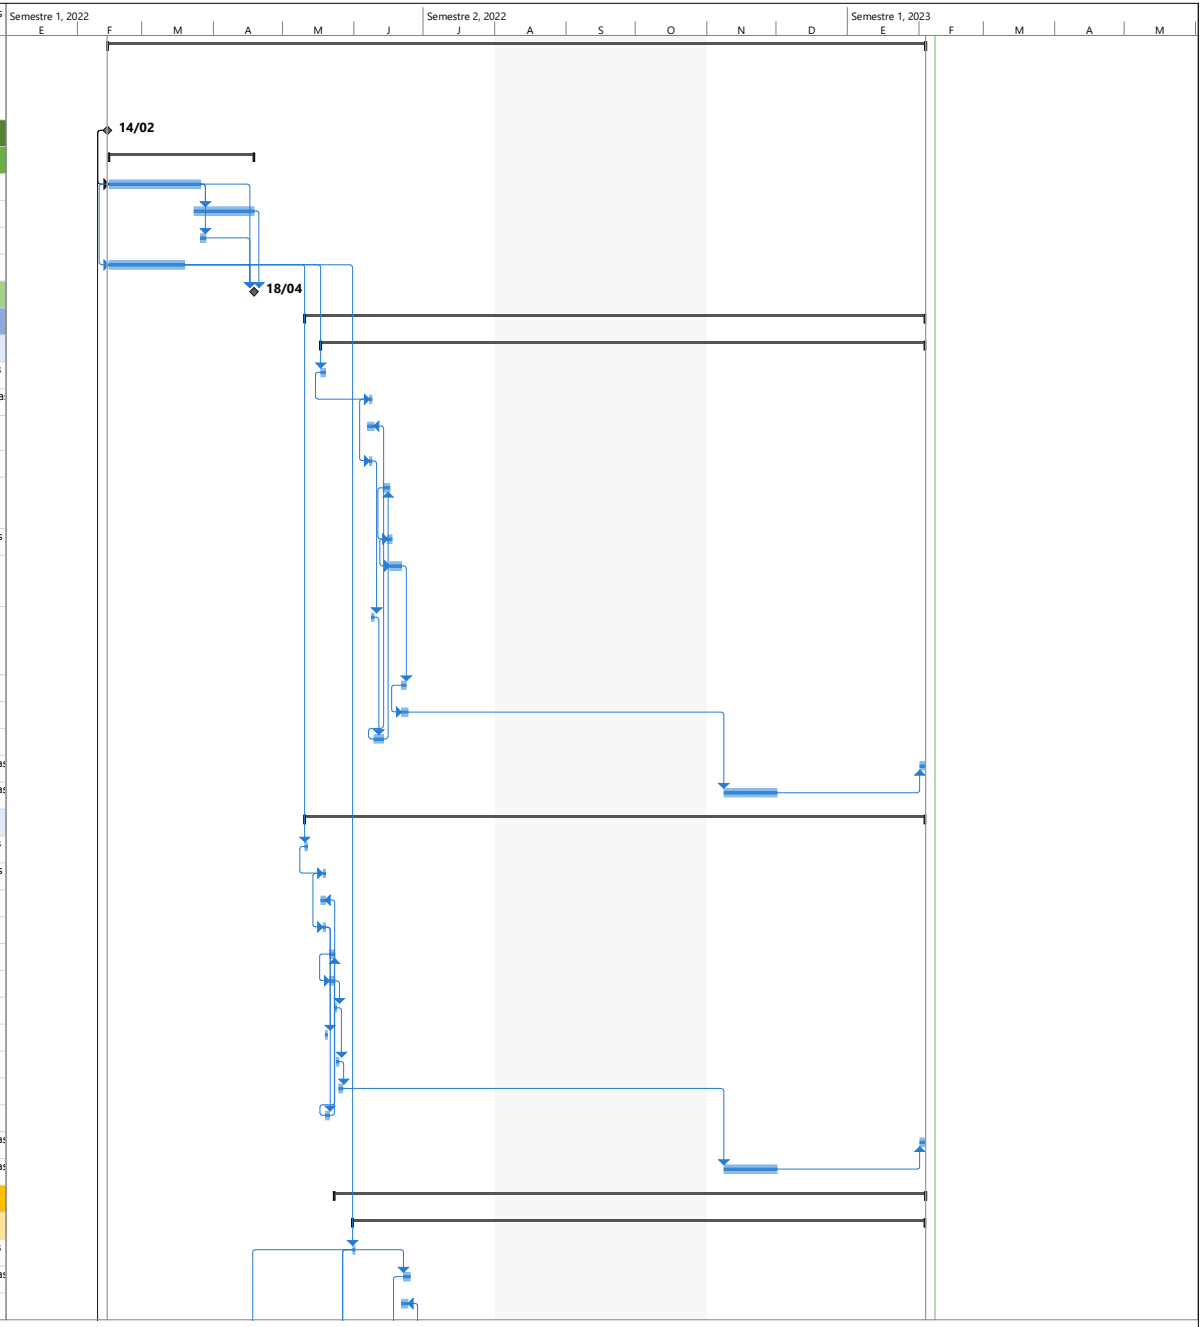

Proyecto: PROGRAMACIÓN BO
Fecha: mié 8/02/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
43	1.5.1.18	PROTECCION A SUMIDEROS.	1 día	mié 22/06/22	jue 23/06/22	41CC
44	1.5.1.19	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	mié 29/06/22	jue 30/06/22	49
45	1.5.1.20	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	1 día	jue 23/06/22	vie 24/06/22	43
46	1.5.1.21	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	1 día	jue 30/06/22	vie 1/07/22	44
47	1.5.1.22	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO CONVENCIONAL (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	2 días	vie 1/07/22	mar 5/07/22	46
48	1.5.1.23	CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4")	1 día	sáb 28/01/23	lun 30/01/23	47FC+35 días
49	1.5.1.24	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	3 días	vie 24/06/22	mié 29/06/22	45
50	1.5.1.25	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	1 día	vie 3/02/23	vie 3/02/23	53FC+10 días
51	1.5.1.26	AFOROS DE TRANSITO	1 día	vie 4/11/22	mar 8/11/22	47FC+5 días
52	1.5.1.27	BARRERAS RELLENABLES	6 días	mié 22/06/22	jue 30/06/22	43CC
53	1.5.1.28	ACTIVIDADES CONTRALORIA	20 días	vie 11/11/22	mar 6/12/22	47FC+10 días
54	**1.5.2**	**CIV 14000018**	**69,13 días**	**mar 31/05/22**	**vie 3/02/23**	
55	1.5.2.10	Socialización y preliminares de componentes	1 día	mar 31/05/22	mié 1/06/22	40CC
56	1.5.2.11	REPLANTEO GENERAL	1 día	vie 25/11/22	sáb 26/11/22	55FC+48 días
57	1.5.2.12	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBR	2 días	mar 6/12/22	vie 9/12/22	62CF
58	1.5.2.13	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	vie 9/12/22	vie 9/12/22	62CC
59	1.5.2.14	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTA	1 día	vie 9/12/22	vie 9/12/22	56FC+10 días
60	1.5.2.15	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	1 día	vie 9/12/22	vie 9/12/22	58CC
61	1.5.2.16	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO CONVENCIONAL (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	1 día	vie 9/12/22	vie 9/12/22	60CC
62	1.5.2.17	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	1 día	vie 9/12/22	vie 9/12/22	59CC
63	1.5.2.18	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	1 día	vie 3/02/23	vie 3/02/23	61FC+7 días
64	**1.5.3**	**CIV 14000025**	**69 días**	**mar 31/05/22**	**vie 3/02/23**	
65	1.5.3.11	Socialización y preliminares de componentes	1 día	mar 31/05/22	mié 1/06/22	40CC
66	1.5.3.12	REPLANTEO GENERAL	1 día	vie 25/11/22	sáb 26/11/22	65FC+48 días
67	1.5.3.13	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBR	2 días	mar 6/12/22	mié 7/12/22	72CF
68	1.5.3.14	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	vie 9/12/22	vie 9/12/22	72CC
69	1.5.3.15	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTA	1 día	vie 9/12/22	vie 9/12/22	66FC+10 días
70	1.5.3.16	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	1 día	vie 9/12/22	vie 9/12/22	68CC
71	1.5.3.17	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO CONVENCIONAL (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	1 día	vie 9/12/22	vie 9/12/22	70CC
72	1.5.3.18	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	1 día	vie 9/12/22	vie 9/12/22	69CC
73	1.5.3.19	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	1 día	vie 3/02/23	vie 3/02/23	71FC+7 días
74	**1.5.4**	**CIV 14000048**	**69 días**	**mar 31/05/22**	**vie 3/02/23**	
75	1.5.4.10	Socialización y preliminares de componentes	1 día	mar 31/05/22	mié 1/06/22	65CC
76	1.5.4.11	REPLANTEO GENERAL	1 día	vie 3/06/22	lun 6/06/22	75FC+3 días
77	1.5.4.12	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBR	1 día	lun 6/06/22	lun 6/06/22	81CC
78	1.5.4.13	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	mar 7/06/22	mar 7/06/22	81
79	1.5.4.14	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	1 día	mar 7/06/22	mar 7/06/22	78CC
80	1.5.4.15	MEZCLA ASFÁLTICA	1 día	mar 7/06/22	mié 8/06/22	79
81	1.5.4.16	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	1 día	lun 6/06/22	lun 6/06/22	76

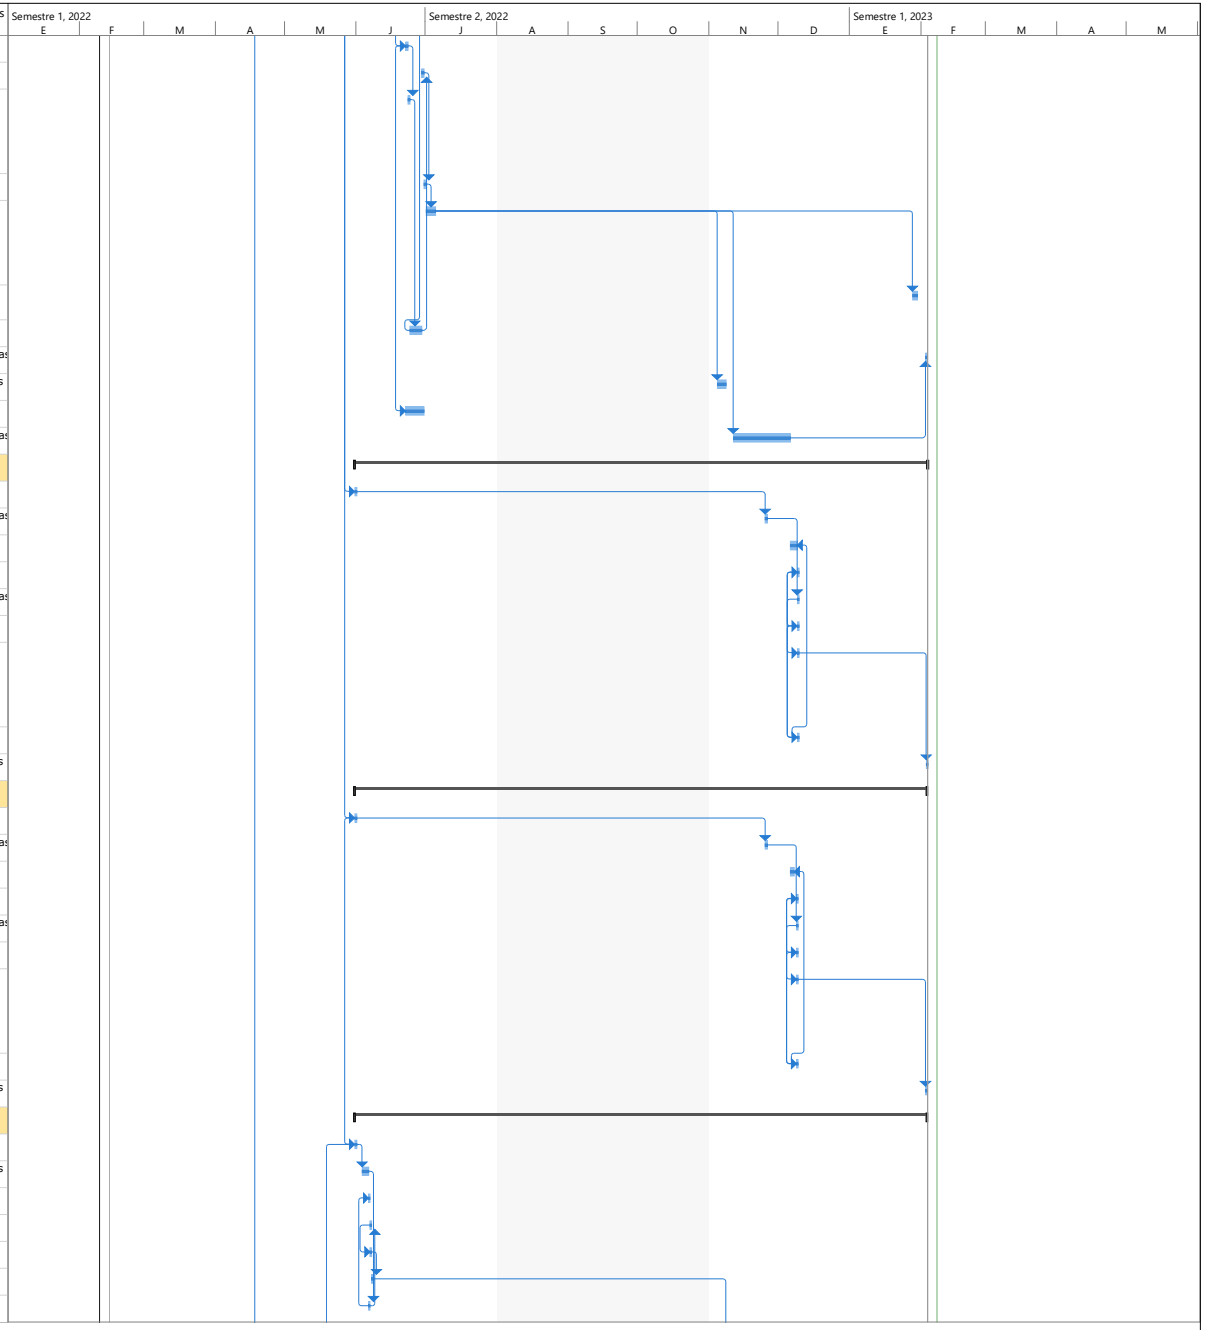

Proyecto: PROGRAMACIÓN BO
Fecha: mié 8/02/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
82	1.5.4.17	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	2 días	jue 2/02/23	vie 3/02/23	83FC+13 días
83	1.5.4.18	ACTIVIDADES CONTRALORIA	20 días	mar 8/11/22	jue 1/12/22	80FC+26 días
84	**1.5.5**	**CIV 14000091**	**75 días**	**lun 23/05/22**	**vie 3/02/23**	
85	1.5.5.11	Socialización y preliminares de componentes	1 día	lun 23/05/22	mar 24/05/22	75CC-6 días
86	1.5.5.12	Semaforización	1 día	jue 2/06/22	vie 3/06/22	85FC+8 días
87	1.5.5.13	REPLANTEO GENERAL	1 día	vie 3/06/22	lun 6/06/22	86
88	1.5.5.14	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBR	1 día	vie 3/06/22	lun 6/06/22	89CC
89	1.5.5.15	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	vie 3/06/22	lun 6/06/22	87CC
90	1.5.5.16	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	1 día	vie 3/06/22	lun 6/06/22	89CC
91	1.5.5.17	MEZCLA ASFÁLTICA	1 día	vie 3/06/22	lun 6/06/22	90CC
92	1.5.5.18	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	2 días	vie 3/06/22	lun 6/06/22	87CC
93	1.5.5.19	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	2 días	jue 2/02/23	vie 3/02/23	94FC+12 días
94	1.5.5.20	ACTIVIDADES CONTRALORIA	20 días	mié 9/11/22	vie 2/12/22	91FC+30 días
95	**1.5.6**	**CIV 14000102**	**75 días**	**lun 23/05/22**	**vie 3/02/23**	
96	1.5.6.12	Socialización y preliminares de componentes	1 día	lun 23/05/22	mar 24/05/22	85CC
97	1.5.6.13	Semaforización	1 día	jue 2/06/22	vie 3/06/22	96FC+8 días
98	1.5.6.14	REPLANTEO GENERAL	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	97FC+4 días
99	1.5.6.15	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBR	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	101CC
100	1.5.6.16	PROTECCION A SUMIDEROS.	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	98CC
101	1.5.6.17	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	100CC
102	1.5.6.18	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	101CC
103	1.5.6.19	MEZCLA ASFÁLTICA	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	102CC
104	1.5.6.20	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	100CC
105	1.5.6.21	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	2 días	jue 2/02/23	vie 3/02/23	106FC+12 día
106	1.5.6.22	ACTIVIDADES CONTRALORIA	20 días	mié 9/11/22	vie 2/12/22	104FC+26 día
107	**1.5.7**	**CIV 14000118**	**75 días**	**lun 23/05/22**	**vie 3/02/23**	
108	1.5.7.12	Socialización y preliminares de componentes	1 día	lun 23/05/22	mar 24/05/22	96CC
109	1.5.7.13	Semaforización	1 día	jue 2/06/22	vie 3/06/22	108FC+8 días
110	1.5.7.14	REPLANTEO GENERAL	1 día	vie 10/06/22	sáb 11/06/22	109FC+6 días
111	1.5.7.15	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBR	1 día	sáb 11/06/22	lun 13/06/22	116CC
112	1.5.7.16	PROTECCION A SUMIDEROS.	1 día	vie 10/06/22	sáb 11/06/22	110CC
113	1.5.7.17	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	lun 13/06/22	mar 14/06/22	116
114	1.5.7.18	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	1 día	lun 13/06/22	mar 14/06/22	113CC
115	1.5.7.19	MEZCLA ASFÁLTICA	1 día	mar 14/06/22	mié 15/06/22	114
116	1.5.7.20	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	1 día	sáb 11/06/22	lun 13/06/22	112
117	1.5.7.21	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	2 días	jue 2/02/23	vie 3/02/23	118FC+12 día
118	1.5.7.22	ACTIVIDADES CONTRALORIA	20 días	mié 9/11/22	vie 2/12/22	115FC+21 día
119	**1.5.8**	**CIV 14000145**	**75 días**	**lun 23/05/22**	**vie 3/02/23**	
120	1.5.8.12	Socialización y preliminares de componentes	1 día	lun 23/05/22	mar 24/05/22	108CC
121	1.5.8.13	Semaforización	1 día	jue 2/06/22	vie 3/06/22	120FC+8 días
122	1.5.8.14	REPLANTEO GENERAL	1 día	vie 10/06/22	sáb 11/06/22	121FC+6 días
123	1.5.8.15	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBR	2 días	sáb 11/06/22	mar 14/06/22	128CC
124	1.5.8.16	PROTECCION A SUMIDEROS.	1 día	vie 10/06/22	sáb 11/06/22	122CC
125	1.5.8.17	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	lun 13/06/22	mié 15/06/22	128
126	1.5.8.18	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	2 días	lun 13/06/22	mié 15/06/22	125CC
127	1.5.8.19	MEZCLA ASFÁLTICA	2 días	mié 15/06/22	vie 17/06/22	126
128	1.5.8.20	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	1 día	sáb 11/06/22	lun 13/06/22	124
129	1.5.8.21	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	2 días	jue 2/02/23	vie 3/02/23	130FC+12 día



Proyecto: PROGRAMACIÓN BO
Fecha: mié 8/02/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
130	1.5.8.22	ACTIVIDADES CONTRALORIA	19 días	mié 9/11/22	vie 2/12/22	127FC+20 día
131	**1.6**	**CIV'S ESPACIO PÚBLICO**	**92 días**	**vie 22/04/22**	**mié 7/12/22**	
132	**1.6.1**	**CIV 14001393**	**92 días**	**vie 22/04/22**	**mié 7/12/22**	
133	1.6.1.1	Socialización y preliminares de componentes	1 día	vie 22/04/22	sáb 23/04/22	40CC-33 días
134	1.6.1.2	REPLANTEO GENERAL	4 días	jue 28/04/22	mar 3/05/22	133FC+4 días
135	1.6.1.3	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO	10 días	mar 3/05/22	vie 13/05/22	134
136	1.6.1.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBR	20 días	mar 3/05/22	mié 25/05/22	135CC
137	1.6.1.5	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE	10 días	mar 3/05/22	vie 13/05/22	135CC
138	1.6.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCI	10 días	vie 13/05/22	mié 25/05/22	135
139	1.6.1.7	PROTECCION A SUMIDEROS	4 días	mar 3/05/22	vie 6/05/22	137CC
140	1.6.1.8	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	6 días	mié 25/05/22	mié 1/06/22	138
141	1.6.1.11	SARDINEL H=0.20M, E=0.15M CONCRETO 3000 P	20 días	vie 3/06/22	mié 29/06/22	146CC
142	1.6.1.12	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B)	6 días	mié 25/05/22	mié 1/06/22	140CC
143	1.6.1.13	LOSETA ACHURADO TIPO A20	10 días	vie 3/06/22	mié 15/06/22	141CC
144	1.6.1.14	CONCRETO MR41 COLOR OCRE PARA RAMPAS Y E	10 días	vie 3/06/22	mié 15/06/22	145CC+2 día
145	1.6.1.15	CONCRETO 3000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PA	15 días	jue 2/06/22	sáb 18/06/22	142
146	1.6.1.17	SARDINEL TIPO A10	20 días	vie 3/06/22	mié 29/06/22	148CC
147	1.6.1.18	CANECA TIPO M120	4 días	mié 22/06/22	mar 28/06/22	150
148	1.6.1.19	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS	20 días	vie 3/06/22	mié 29/06/22	144CC
149	1.6.1.20	ACCESO TEMPORAL A VIVIENDA EN MADERA. SUM	20 días	mar 10/05/22	jue 2/06/22	139FC+3 días
150	1.6.1.22	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PAI	4 días	jue 16/06/22	mié 22/06/22	153
151	1.6.1.23	RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D	6 días	mar 7/06/22	lun 13/06/22	152CC
152	1.6.1.24	REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA	6 días	mar 7/06/22	lun 13/06/22	144CC+2 día
153	1.6.1.25	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M	3 días	lun 13/06/22	jue 16/06/22	151
154	1.6.1.26	ACTIVIDADES CONTRALORIA	20 días	mar 15/11/22	mié 7/12/22	150FC+20 día
155	**1.7**	**Componentes (SST, Ambiental, PMT)**	**157 días**	**lun 14/02/22**	**vie 3/02/23**	**2CC**
156	**2**	**ADICION**	**7,88 días**	**mar 8/11/22**	**vie 23/12/22**	
157	**2.1**	**FIRMA DE ADICION Y PRORROGA**	**1 día?**	**mar 8/11/22**	**mar 8/11/22**	
158	**2.2**	**ETAPA DE DIAGNÓSTICO**	**8 días**	**mar 8/11/22**	**jue 17/11/22**	
159	2.2.1	Revisión de diseños iniciales	8 días	mar 8/11/22	jue 17/11/22	
160	2.2.2	Radicación de requisitos para PMT	8 días	mar 8/11/22	jue 17/11/22	
161	2.2.3	Elaboración de diagnósticos	8 días	mar 8/11/22	jue 17/11/22	
162	**2.3**	**CIV'S MALLA VIAL**	**6,38 días**	**jue 17/11/22**	**vie 3/02/23**	
163	**2.3.1**	**CIV 14001416**	**6,38 días**	**jue 17/11/22**	**vie 3/02/23**	
164	2.3.1.1	Socialización y preliminares de componentes	3 días	jue 17/11/22	lun 21/11/22	160FC-1 día
165	2.3.1.2	REPLANTEO GENERAL	1 día	mar 22/11/22	mar 22/11/22	164
166	2.3.1.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBR	2 días	mié 23/11/22	jue 24/11/22	170CC
167	2.3.1.4	PROTECCION A SUMIDEROS.	1 día	mar 22/11/22	mar 22/11/22	165CC
168	2.3.1.5	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	2 días	vie 25/11/22	lun 28/11/22	170
169	2.3.1.6	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD	2 días	vie 25/11/22	lun 28/11/22	168CC
170	2.3.1.7	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARG	2 días	mié 23/11/22	jue 24/11/22	165
171	2.3.1.8	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	3 días	mar 31/01/23	vie 3/02/23	169FC+15 día
172	**2.4**	**Componentes (SST, Ambiental, PMT)**	**35 días**	**mar 8/11/22**	**vie 3/02/23**	**157CC**
173	**3**	**FIN DEL CONTRATO**	**0 días**	**vie 3/02/23**	**vie 3/02/23**	**155;172**

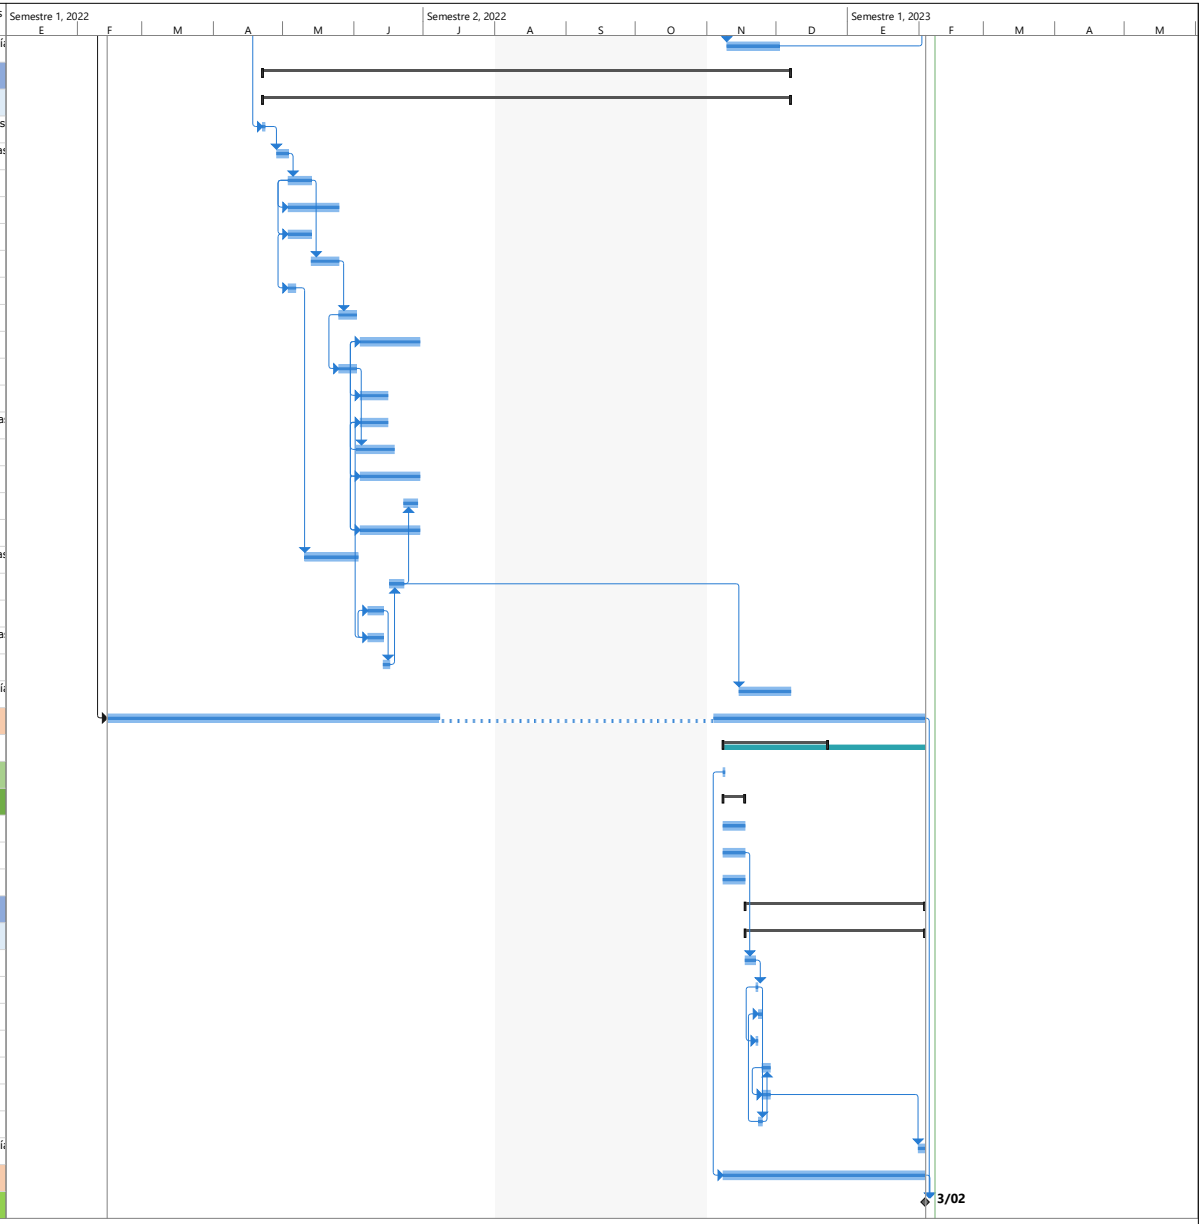

Proyecto: PROGRAMACIÓN BO
Fecha: mié 8/02/23

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual
