
Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**1**	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y CICLO INFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES**	**187 días**	**lun 14/02/22**	**mié 7/02/24**	
2	**1.1**	**FIRMA DE ACTA DE INICIO**	**0 días**	**lun 14/02/22**	**lun 14/02/22**	
3	**1.2**	**ETAPA DE DIAGNÓSTICO**	**52 días**	**lun 14/02/22**	**lun 18/04/22**	
4	1.2.1	Revisión de diseños iniciales	35 días	lun 14/02/22	sáb 26/03/22	2CC+1 día
5	1.2.2	Radicación de requisitos para PMT	20 días	mié 23/03/22	lun 18/04/22	4FC-3 días
6	1.2.3	Apropiación de diseños	1 día	sáb 26/03/22	lun 28/03/22	4
7	1.2.4	Elaboración de diagnósticos	30 días	lun 14/02/22	sáb 19/03/22	4CC
8	**1.3**	**INICIO DE OBRA**	**0 días**	**lun 18/04/22**	**lun 18/04/22**	**6;7;5;4**
9	**1.4**	**CIV'S MALLA VIAL**	**114 días**	**mar 10/05/22**	**mié 7/02/24**	
10	**1.4.1**	**CIV 14000567**	**108 días**	**mar 17/05/22**	**mié 7/02/24**	
11	1.4.1.1	Socialización y preliminares de componentes	2 días	mar 17/05/22	jue 19/05/22	7FC+48 días
12	1.4.1.2	REPLANTEO GENERAL	1 día	mar 7/06/22	mié 8/06/22	11CC+18 días
13	1.4.1.3	PROTECCIÓN A SUMIDEROS	1 día	mar 7/06/22	mié 8/06/22	12CC
14	1.4.1.4	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	13
15	1.4.1.5	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE)	3 días	jue 9/06/22	lun 13/06/22	14
16	1.4.1.6	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PARA CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE CON RETROEXCAVADORA	3 días	lun 13/06/22	jue 16/06/22	15
17	1.4.1.7	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	6 días	jue 9/06/22	jue 16/06/22	15CC
18	1.4.1.8	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	jue 16/06/22	sáb 18/06/22	16
19	1.4.1.9	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	2 días	sáb 18/06/22	mié 22/06/22	18
20	1.4.1.10	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	2 días	mié 22/06/22	vie 24/06/22	19
21	1.4.1.11	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100)	2 días	vie 24/06/22	mar 28/06/22	20
22	1.4.1.12	ACTIVIDADES CONTRALORÍA	5 días	jue 4/01/24	mié 10/01/24	21FC+44 días
23	1.4.1.13	ACTIVIDADES PARA RECIBO A SATISFACCION	15 días	jue 18/01/24	lun 5/02/24	22FC+7 días
24	1.4.1.14	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	3 días	lun 5/02/24	mié 7/02/24	23
25	**1.4.2**	**CIV 14001505**	**114 días**	**mar 10/05/22**	**mié 7/02/24**	
26	1.4.2.1	Socialización y preliminares de componentes	1 día	mar 10/05/22	mié 11/05/22	7FC+42 días
27	1.4.2.2	REPLANTEO GENERAL	1 día	mié 18/05/22	jue 19/05/22	26CC+7 días
28	1.4.2.3	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE).	2 días	jue 19/05/22	sáb 21/05/22	27
29	1.4.2.4	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PARA CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE CON RETROEXCAVADORA	1 día	sáb 21/05/22	lun 23/05/22	28
30	1.4.2.5	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.	3 días	jue 19/05/22	lun 23/05/22	28CC
31	1.4.2.6	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	lun 23/05/22	mar 24/05/22	29
32	1.4.2.7	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	1 día	mar 24/05/22	mié 25/05/22	31
33	1.4.2.8	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	1 día	mié 25/05/22	jue 26/05/22	32
34	1.4.2.9	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100).	1 día	jue 26/05/22	jue 26/05/22	33
35	1.4.2.10	ACTIVIDADES CONTRALORÍA	5 días	jue 4/01/24	mié 10/01/24	34FC+69 días
36	1.4.2.11	ACTIVIDADES PARA RECIBO A SATISFACCION	15 días	jue 18/01/24	lun 5/02/24	35FC+7 días
37	1.4.2.12	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	3 días	lun 5/02/24	mié 7/02/24	36
38	**1.5**	**CIV'S CICLORRUTAS**	**147 días**	**jue 31/03/22**	**mié 7/02/24**	
39	**1.5.1**	**CIV 14000009**	**147 días**	**jue 31/03/22**	**mié 7/02/24**	
40	1.5.1.1	Socialización y preliminares de componentes	1 día	mar 31/05/22	mié 1/06/22	7FC+59 días
41	1.5.1.2	REPLANTEO GENERAL	3 días	vie 3/06/22	mar 7/06/22	40FC+3 días
42	1.5.1.3	BARRERAS RELLENABLES	8 días	vie 3/06/22	lun 13/06/22	41CC
43	1.5.1.4	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	1 día	vie 3/06/22	lun 6/06/22	41CC
44	1.5.1.5	FRESADO O DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	3 días	lun 6/06/22	mié 8/06/22	43
45	1.5.1.6	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	3 días	lun 6/06/22	mié 8/06/22	44CC
46	1.5.1.7	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	44
47	1.5.1.8	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	1 día	jue 9/06/22	vie 10/06/22	46
48	1.5.1.9	MEZCLA ASFÁLTICA	1 día	vie 10/06/22	sáb 11/06/22	47
49	1.5.1.10	AFOROS SEMAFORIZACION	2 días	jue 31/03/22	vie 1/04/22	40CC-50 días
50	1.5.1.11	ACTIVIDADES CONTRALORÍA	5 días	jue 4/01/24	mié 10/01/24	48FC+56 días
51	1.5.1.12	ACTIVIDADES PARA RECIBO A SATISFACCION	15 días	jue 18/01/24	lun 5/02/24	50FC+7 días
52	1.5.1.13	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	3 días	lun 5/02/24	mié 7/02/24	51
53	**1.5.2**	**CIV 14000018**	**97 días**	**mar 31/05/22**	**mié 7/02/24**	
54	1.5.2.1	Socialización y preliminares de componentes	1 día	mar 31/05/22	mié 1/06/22	40CC
55	1.5.2.2	REPLANTEO GENERAL	1 día	jue 1/12/22	vie 2/12/22	54FC+53 días
56	1.5.2.3	FRESADO O DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	2 días	vie 2/12/22	lun 5/12/22	55
57	1.5.2.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	2 días	vie 2/12/22	lun 5/12/22	56CC
58	1.5.2.5	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	lun 5/12/22	mar 6/12/22	56
59	1.5.2.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	1 día	mar 6/12/22	mié 7/12/22	58
60	1.5.2.7	MEZCLA ASFÁLTICA	1 día	mié 7/12/22	mié 7/12/22	59
61	1.5.2.8	ACTIVIDADES PARA RECIBO A SATISFACCION	15 días	jue 18/01/24	lun 5/02/24	60FC+19 días
62	1.5.2.9	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	3 días	lun 5/02/24	mié 7/02/24	61
63	**1.5.3**	**CIV 14000025**	**97 días**	**mar 31/05/22**	**mié 7/02/24**	
64	1.5.3.1	Socialización y preliminares de componentes	1 día	mar 31/05/22	mié 1/06/22	40CC
65	1.5.3.2	REPLANTEO GENERAL	1 día	jue 1/12/22	vie 2/12/22	64FC+53 días
66	1.5.3.3	FRESADO O DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	2 días	vie 2/12/22	lun 5/12/22	65
67	1.5.3.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	2 días	vie 2/12/22	lun 5/12/22	66CC
68	1.5.3.5	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	lun 5/12/22	mar 6/12/22	66
69	1.5.3.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	1 día	mar 6/12/22	mié 7/12/22	68
70	1.5.3.7	MEZCLA ASFÁLTICA	1 día	mié 7/12/22	mié 7/12/22	69
71	1.5.3.8	ACTIVIDADES DE ENTREGA DEL PROYECTO	15 días	jue 18/01/24	lun 5/02/24	70FC+19 días
72	1.5.3.9	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	3 días	lun 5/02/24	mié 7/02/24	71
73	**1.5.4**	**CIV 14000048**	**147 días**	**jue 31/03/22**	**mié 7/02/24**	
74	1.5.4.1	Socialización y preliminares de componentes	1 día	mar 31/05/22	mié 1/06/22	40CC
75	1.5.4.2	REPLANTEO GENERAL	3 días	vie 3/06/22	mar 7/06/22	74FC+3 días
76	1.5.4.3	BARRERAS RELLENABLES	8 días	vie 3/06/22	lun 13/06/22	75CC
77	1.5.4.4	FRESADO O DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	1 día	mar 7/06/22	mié 8/06/22	75
78	1.5.4.5	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	1 día	mar 7/06/22	mié 8/06/22	77CC
79	1.5.4.6	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	77
80	1.5.4.7	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	1 día	jue 9/06/22	vie 10/06/22	79
81	1.5.4.8	MEZCLA ASFÁLTICA	1 día	vie 10/06/22	sáb 11/06/22	80
82	1.5.4.9	AFOROS SEMAFORIZACION	2 días	jue 31/03/22	vie 1/04/22	74CC-50 días
83	1.5.4.10	ACTIVIDADES DE SEMAFORIZACION	1 día	lun 13/06/22	mar 14/06/22	82FC+60 días
84	1.5.4.11	ACTIVIDADES CONTRALORÍA	5 días	jue 4/01/24	mié 10/01/24	81FC+56 días
85	1.5.4.12	ACTIVIDADES PARA RECIBO A SATISFACCION	15 días	jue 18/01/24	lun 5/02/24	84FC+7 días
86	1.5.4.13	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	3 días	lun 5/02/24	mié 7/02/24	85
87	**1.5.5**	**CIV 14000091**	**96 días**	**mié 1/06/22**	**mié 7/02/24**	
88	1.5.5.1	Socialización y preliminares de componentes	1 día	mié 1/06/22	mié 1/06/22	40CC+1 día
89	1.5.5.2	REPLANTEO GENERAL	1 día	lun 13/06/22	mar 14/06/22	88FC+10 días
90	1.5.5.3	BARRERAS RELLENABLES	6 días	lun 13/06/22	mar 21/06/22	89CC
91	1.5.5.4	FRESADO O DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	1 día	mar 14/06/22	mié 15/06/22	89
92	1.5.5.5	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	1 día	mar 14/06/22	mié 15/06/22	91CC
93	1.5.5.6	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	mié 15/06/22	jue 16/06/22	91
94	1.5.5.7	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	1 día	jue 16/06/22	vie 17/06/22	93
95	1.5.5.8	MEZCLA ASFÁLTICA	1 día	vie 17/06/22	sáb 18/06/22	94
96	1.5.5.9	ACTIVIDADES CONTRALORÍA	5 días	jue 4/01/24	mié 10/01/24	95FC+50 días
97	1.5.5.10	ACTIVIDADES PARA RECIBO A SATISFACCION	15 días	jue 18/01/24	lun 5/02/24	96FC+7 días
98	1.5.5.11	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	3 días	lun 5/02/24	mié 7/02/24	97
99	**1.5.6**	**CIV 14000102**	**146 días**	**vie 1/04/22**	**mié 7/02/24**	
100	1.5.6.1	Socialización y preliminares de componentes	1 día	mié 1/06/22	mié 1/06/22	40CC+1 día
101	1.5.6.2	REPLANTEO GENERAL	1 día	lun 13/06/22	mar 14/06/22	100FC+10 días
102	1.5.6.3	BARRERAS RELLENABLES	6 días	lun 13/06/22	mar 21/06/22	101CC
103	1.5.6.4	FRESADO O DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	1 día	mar 14/06/22	mié 15/06/22	101
104	1.5.6.5	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	1 día	mar 14/06/22	mié 15/06/22	103CC
105	1.5.6.6	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	mié 15/06/22	jue 16/06/22	103
106	1.5.6.7	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	1 día	jue 16/06/22	vie 17/06/22	105
107	1.5.6.8	MEZCLA ASFÁLTICA	1 día	vie 17/06/22	sáb 18/06/22	106
108	1.5.6.9	AFOROS SEMAFORIZACION	2 días	vie 1/04/22	lun 4/04/22	100CC-50 días
109	1.5.6.10	ACTIVIDADES DE SEMAFORIZACION	1 día	lun 13/06/22	mar 14/06/22	108FC+59 días
110	1.5.6.11	ACTIVIDADES CONTRALORÍA	5 días	jue 4/01/24	mié 10/01/24	107FC+50 días
111	1.5.6.12	ACTIVIDADES PARA RECIBO A SATISFACCION	15 días	jue 18/01/24	lun 5/02/24	110FC+7 días
112	1.5.6.13	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	3 días	lun 5/02/24	mié 7/02/24	111
113	**1.5.7**	**CIV 14000118**	**146 días**	**vie 1/04/22**	**mié 7/02/24**	
114	1.5.7.1	Socialización y preliminares de componentes	1 día	mié 1/06/22	mié 1/06/22	40CC+1 día
115	1.5.7.2	REPLANTEO GENERAL	1 día	sáb 18/06/22	mar 21/06/22	114FC+15 días
116	1.5.7.3	BARRERAS RELLENABLES	6 días	sáb 18/06/22	mar 28/06/22	115CC
117	1.5.7.4	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	1 día	mar 21/06/22	mié 22/06/22	115
118	1.5.7.5	FRESADO O DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	2 días	mar 21/06/22	jue 23/06/22	117CC
119	1.5.7.6	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	2 días	mar 21/06/22	jue 23/06/22	118CC
120	1.5.7.7	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	jue 23/06/22	sáb 25/06/22	118
121	1.5.7.8	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	2 días	sáb 25/06/22	mié 29/06/22	120
122	1.5.7.9	MEZCLA ASFÁLTICA	2 días	mié 29/06/22	vie 1/07/22	121
123	1.5.7.10	AFOROS SEMAFORIZACION	2 días	vie 1/04/22	lun 4/04/22	114CC-50 días
124	1.5.7.11	ACTIVIDADES CONTRALORÍA	5 días	jue 4/01/24	mié 10/01/24	122FC+41 días
125	1.5.7.12	ACTIVIDADES PARA RECIBO A SATISFACCION	15 días	jue 18/01/24	lun 5/02/24	124FC+7 días
126	1.5.7.13	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	3 días	lun 5/02/24	mié 7/02/24	125
127	**1.5.8**	**CIV 14000145**	**96 días**	**mié 1/06/22**	**mié 7/02/24**	
128	1.5.8.1	Socialización y preliminares de componentes	1 día	mié 1/06/22	mié 1/06/22	40CC+1 día
129	1.5.8.2	REPLANTEO GENERAL	1 día	jue 23/06/22	vie 24/06/22	128FC+18 días
130	1.5.8.3	BARRERAS RELLENABLES	2 días	jue 23/06/22	sáb 25/06/22	129CC
131	1.5.8.4	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	1 día	vie 24/06/22	sáb 25/06/22	129
132	1.5.8.5	FRESADO O DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	2 días	vie 24/06/22	mar 28/06/22	131CC
133	1.5.8.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	2 días	mar 28/06/22	jue 30/06/22	132
134	1.5.8.7	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	4 días	vie 24/06/22	jue 30/06/22	132CC
135	1.5.8.8	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	jue 30/06/22	vie 1/07/22	133
136	1.5.8.9	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	2 días	sáb 2/07/22	mié 6/07/22	135
137	1.5.8.10	MEZCLA ASFÁLTICA	2 días	mié 6/07/22	jue 7/07/22	136
138	1.5.8.11	ACTIVIDADES CONTRALORÍA	5 días	jue 4/01/24	mié 10/01/24	137FC+36 días
139	1.5.8.12	ACTIVIDADES PARA RECIBO A SATISFACCION	15 días	jue 18/01/24	lun 5/02/24	138FC+7 días
140	1.5.8.13	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	3 días	lun 5/02/24	mié 7/02/24	139
141	**1.6**	**CIV'S ESPACIO PÚBLICO**	**141 días**	**jue 7/04/22**	**mié 7/02/24**	
142	**1.6.1**	**CIV 14001393**	**141 días**	**jue 7/04/22**	**mié 7/02/24**	
143	1.6.1.1	Socialización y preliminares de componentes	1 día	jue 7/04/22	jue 7/04/22	7FC+15 días
144	1.6.1.2	REPLANTEO GENERAL	4 días	vie 8/04/22	mié 13/04/22	143FC+1 día
145	1.6.1.3	PROTECCIÓN A SUMIDEROS	4 días	vie 8/04/22	mié 13/04/22	144CC
146	1.6.1.4	BARRERAS RELLENABLES	52 días	vie 8/04/22	vie 10/06/22	144CC
147	1.6.1.5	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO	15 días	mié 13/04/22	mar 3/05/22	145
148	1.6.1.6	DEMOLICIÓN MANUAL SARDINEL EXISTENTE	10 días	mié 20/04/22	lun 2/05/22	147CC+3 días
149	1.6.1.7	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE.	10 días	mar 26/04/22	vie 6/05/22	147CC+8 días
150	1.6.1.8	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	18 días	mié 13/04/22	vie 6/05/22	147CC
151	1.6.1.9	ACCESO TEMPORAL A VIVIENDA EN MADERA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN.	40 días	mié 13/04/22	mié 1/06/22	147CC
152	1.6.1.10	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	6 días	vie 6/05/22	vie 13/05/22	149
153	1.6.1.11	RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2"	6 días	vie 6/05/22	vie 13/05/22	152CC
154	1.6.1.12	CAJILLA PLASTICA Y TAPA PARA MEDIDOR	4 días	vie 6/05/22	mié 11/05/22	152CC
155	1.6.1.13	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M	4 días	vie 6/05/22	mié 11/05/22	152CC
156	1.6.1.14	BORDILLO A80	8 días	lun 9/05/22	mié 18/05/22	152CC+2 días
157	1.6.1.15	SARDINEL TIPO A10	10 días	lun 9/05/22	vie 20/05/22	152CC+2 días
158	1.6.1.16	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS	6 días	lun 9/05/22	lun 16/05/22	152CC+2 días
159	1.6.1.17	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B)	6 días	vie 20/05/22	jue 26/05/22	157
160	1.6.1.18	REFUERZOS MALLA ELECTROSOSLDADA 8 MM Y 4 MM	2 días	vie 27/05/22	mar 31/05/22	159
161	1.6.1.19	CONCRETO MR41 COLOR GRIS	6 días	mar 31/05/22	lun 6/06/22	160
162	1.6.1.20	CONCRETO 3000 PSI	2 días	vie 27/05/22	mar 31/05/22	159
163	1.6.1.21	CANECA TIPO M120	2 días	mar 31/05/22	mié 1/06/22	161CC
164	1.6.1.22	ACTIVIDADES CONTRALORÍA	8 días	jue 4/01/24	lun 15/01/24	161FC+61 días
165	1.6.1.23	ACTIVIDADES PARA RECIBO A SATISFACCION	18 días	jue 18/01/24	mié 7/02/24	164FC+4 días
166	**1.7**	**Componentes (SST, Ambiental, PMT)**	**179 días**	**lun 14/02/22**	**mié 31/01/24**	**2CC**
167	**2**	**ADICIÓN**	**56 días?**	**mar 8/11/22**	**mié 31/01/24**	
168	**2.1**	**FIRMA DE ADICIÓN Y PRORROGA**	**1 día?**	**mar 8/11/22**	**mar 8/11/22**	
169	**2.2**	**ETAPA DE DIAGNÓSTICO**	**8 días**	**mar 8/11/22**	**jue 17/11/22**	
170	2.2.1	Revisión de diseños iniciales	8 días	mar 8/11/22	jue 17/11/22	
171	2.2.2	Radicación de requisitos para PMT	8 días	mar 8/11/22	jue 17/11/22	
172	2.2.3	Elaboración de diagnósticos	8 días	mar 8/11/22	jue 17/11/22	
173	**2.3**	**CIV'S MALLA VIAL**	**63 días**	**mar 8/11/22**	**mié 7/02/24**	
174	**2.3.1**	**CIV 14001416**	**63 días**	**mar 8/11/22**	**mié 7/02/24**	
175	2.3.1.1	Socialización y preliminares de componentes	2 días	mar 8/11/22	mié 9/11/22	171CC
176	2.3.1.2	REPLANTEO GENERAL	1 día	mié 16/11/22	jue 17/11/22	175FC+5 días
177	2.3.1.3	PROTECCIÓN A SUMIDEROS.	1 día	mié 16/11/22	jue 17/11/22	176CC
178	2.3.1.14	ACCESO TEMPORAL A VIVIENDA EN MADERA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN.	20 días	mié 16/11/22	vie 9/12/22	176CC
179	2.3.1.4	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE).	1 día	jue 17/11/22	vie 18/11/22	177
180	2.3.1.5	EXCAVACIÓN MECÁNICA	5 días	vie 18/11/22	jue 24/11/22	179
181	2.3.1.6	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.	6 días	jue 17/11/22	jue 24/11/22	179CC
182	2.3.1.7	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	3 días	jue 24/11/22	lun 28/11/22	180
183	2.3.1.15	GEOSINTETICOS	4 días	lun 28/11/22	jue 1/12/22	182
184	2.3.1.8	INSTALACIÓN GRANULARES	10 días	mar 29/11/22	lun 12/12/22	183CC+1 día
185	2.3.1.9	INSTALACIÓN BASE ESTABILIZADA CON ASFALTO	2 días	lun 12/12/22	vie 29/12/23	184
186	2.3.1.10	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	1 día	mar 2/01/24	mié 3/01/24	185FC+1 día
187	2.3.1.11	MEZCLA ASFÁLTICA GRANO DE CAUCHO	2 días	mié 3/01/24	jue 4/01/24	186
188	2.3.1.12	ACTIVIDADES DE ENTREGA DEL PROYECTO	15 días	jue 18/01/24	lun 5/02/24	187FC+11 días
189	2.3.1.13	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	3 días	lun 5/02/24	mié 7/02/24	188
190	**2.4**	**Componentes (SST, Ambiental, PMT)**	**49 días**	**mar 8/11/22**	**mié 31/01/24**	**175CC**
191	**3**	**FIN DEL CONTRATO**	**0 días**	**mié 31/01/24**	**mié 31/01/24**	
192	5		1 día?	lun 21/02/22	mar 22/02/22	

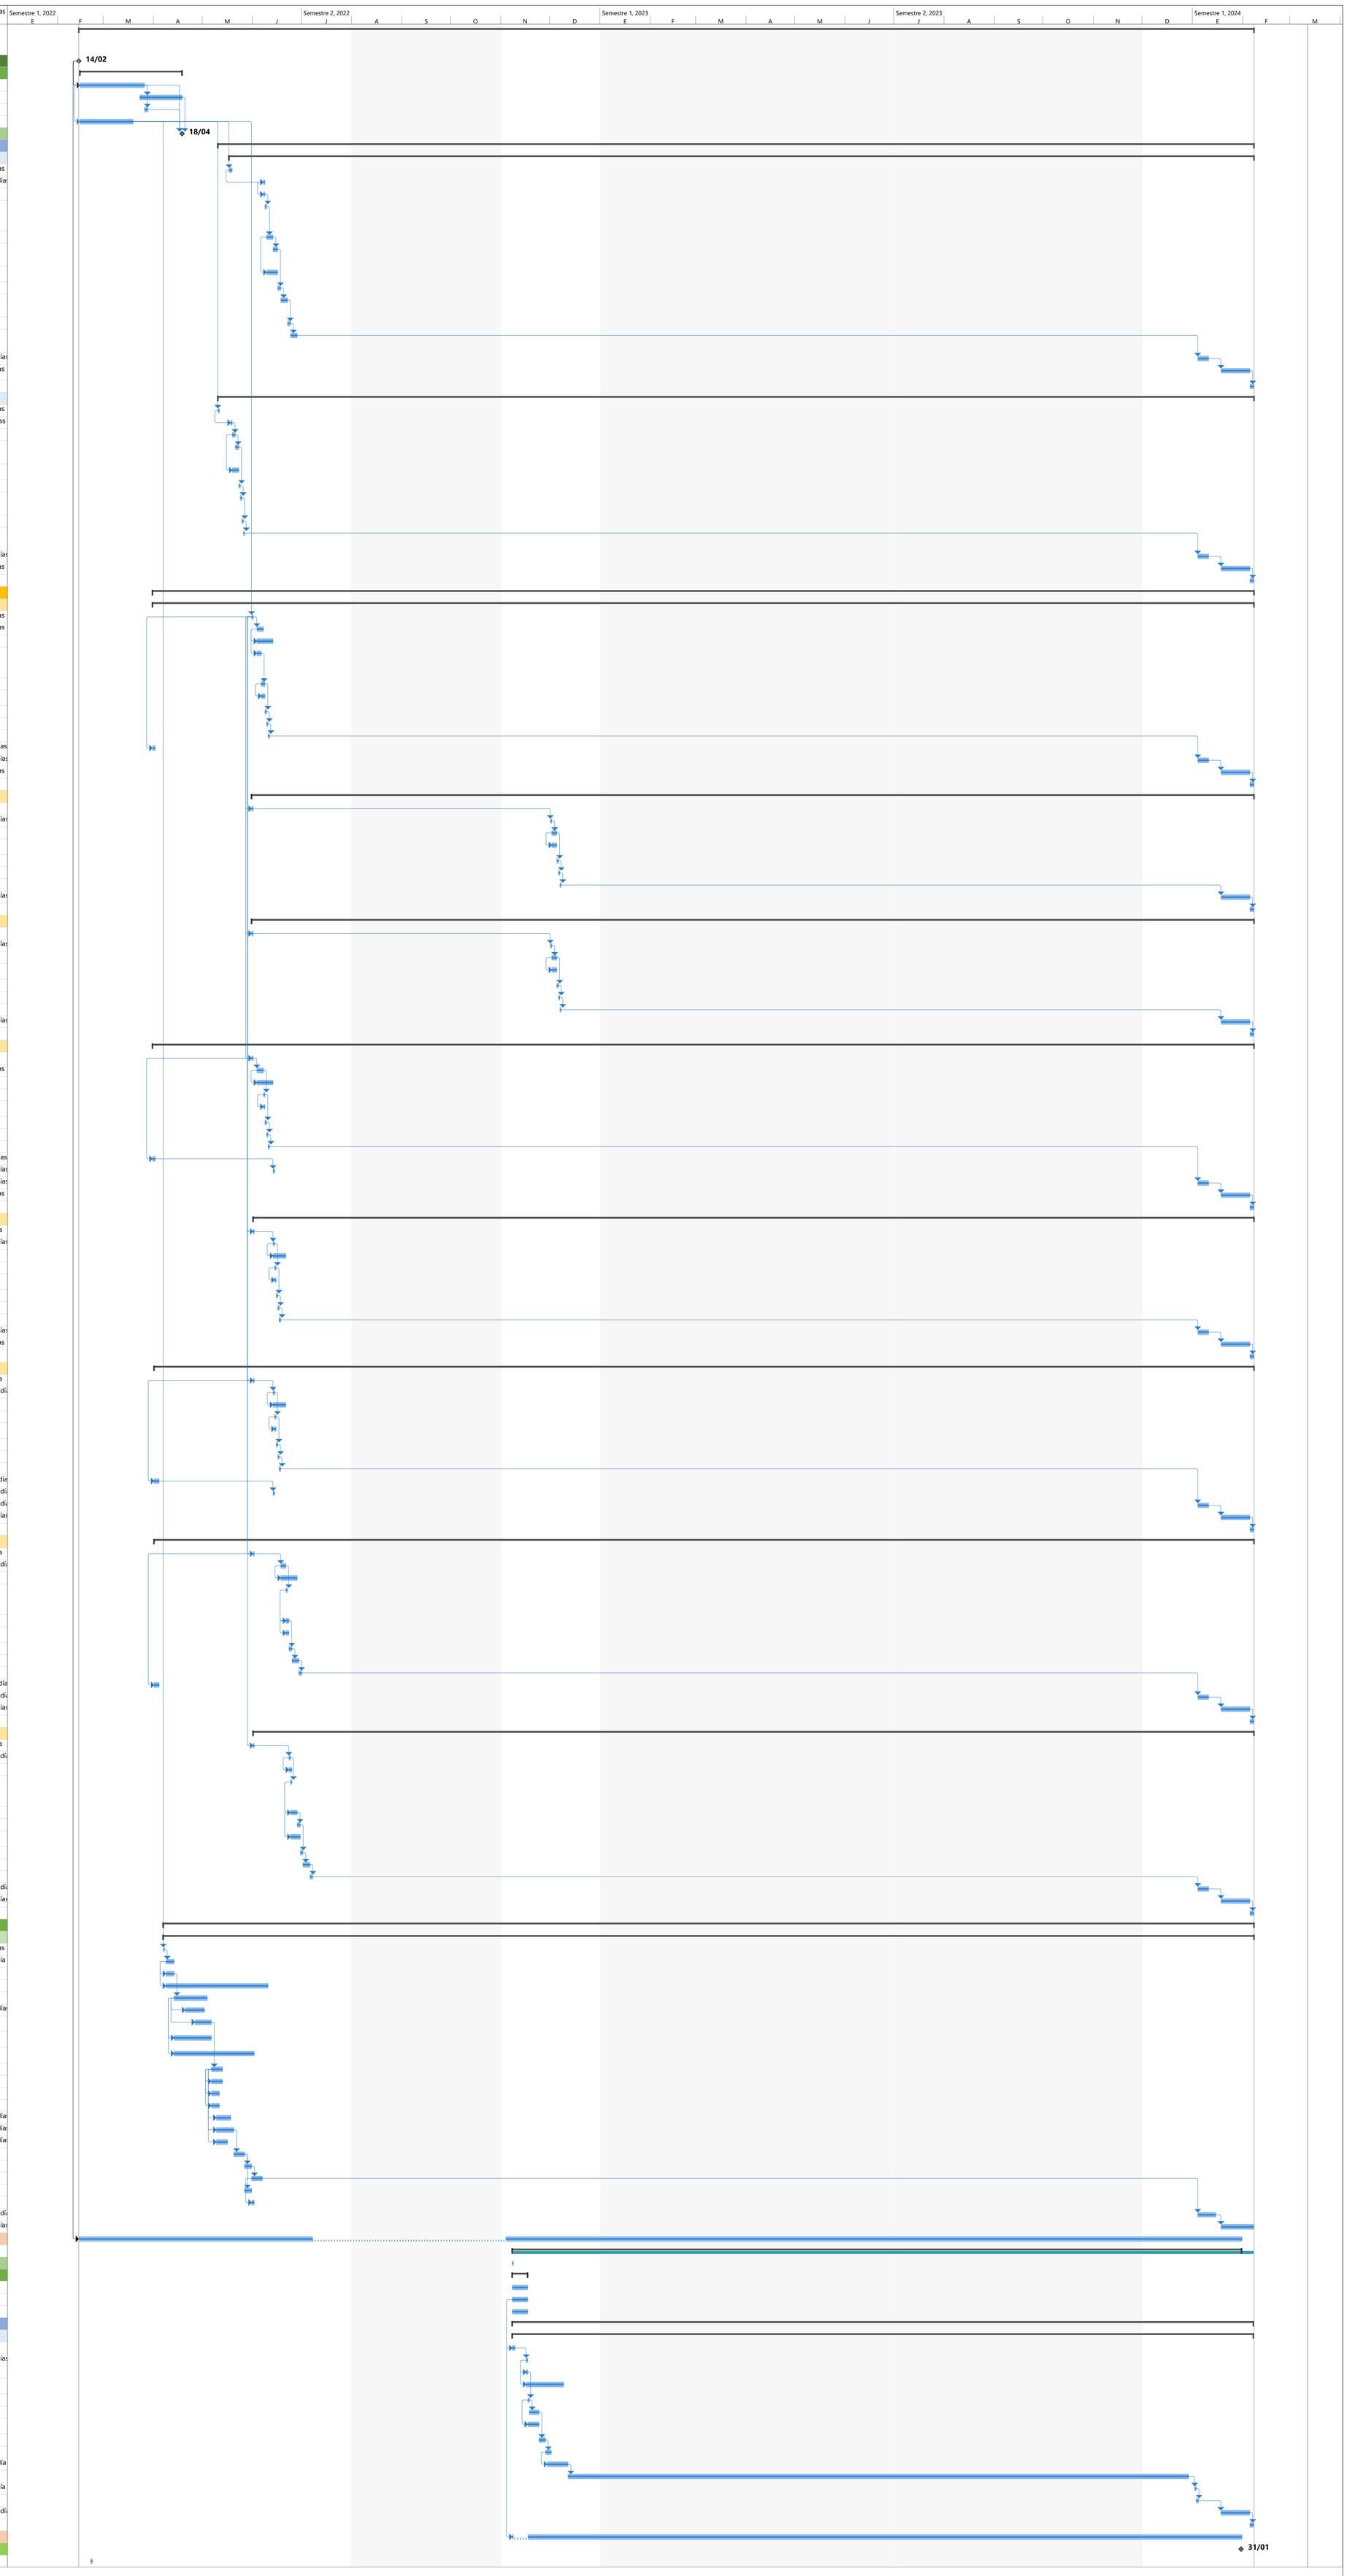

Proyecto: PROGRAMACIÓN BO
Fecha: mar 12/03/24

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso
