INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02

CONTRATO N° 2000.13.12.004-2024

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL SOBRE EL CONTRATO CUYO OBJETO ES "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL DEL CORREGIMIENTO LA PAILA MUNICIPIO DE ZARZAL-VALLE DEL CAUCA"

PROYECTO: "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL DEL CORREGIMIENTO LA PAILA MUNICIPIO DE ZARZAL-VALLE DEL CAUCA"

Nombre del Supervisor: MIGUEL EDINSON ZULUAGA MONTERO
Nombre del Apoyo del supervisor: DARIO LOPEZ LEDESMA

CONTRATISTA: GRUPO CONSITEC INGENIERIA S.A.S

FECHA: AGOSTO DE 2024

FIRMA : _____
SUPERVISOR

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015

PERIODO : 20/07/2024 AL 19/08/2024

INFORME N°. 02

INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02

CONTENIDO

ÍTEM	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
1	DATOS GENERALES DEL CONTRATO	**COMPLETOS**	X
2	EJECUCION FINANCIERA	**ACORDE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	X
3	CONTROL DE GARANTÍAS	**ESTÁN COMPLETAS**	X
4	ASPECTOS TÉCNICOS	**SE ESTÁ CUMPLIENDO CON LAS NORMASY ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO**	X
5	SEGURIDAD SOCIAL	**SE ESTÁ CUMPLIENDO CON LAS NORMASY ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO**	X
6	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	**COMPLETOS**	X
7	REGISTRO FOTOGRAFICO	**SE ADJUNTA**	X

CONTRATISTA: GRUPO CONSITEC INGENIERIA S.A.S

FECHA: AGOSTO DE 2024

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015

PERIODO	20/07/2024 AL 19/08/2024
INFORME DE SUPERVISIÓN N°.02	OTRO ESPECIFIQUE:

INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02

1.1 Identificación del Contrato / Convenio

CONTRATO N°.	2000.13.12.004-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL SOBRE EL CONTRATO CUYO OBJETO ES "OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL DEL CORREGIMIENTO LA PAILA MUNICIPIO DE ZARZAL-VALLE DEL CAUCA"
CONTRATISTA:	GRUPO CONSITEC INGENIERIA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ
NIT	900738802-3

1.2. Plazos del Contrato / Convenio

FECHA DEL CONTRATO	9 de mayo de 2024
FECHA DE ACTA DE INICIO	20 de junio de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	13 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	20 de julio de 2025
FECHA DEL ACTA DE SUSPENSIÓN: N°. 1	
FECHA DEL ACTA DE REINICIO: N°. 1	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	
PLAZO ADICIONAL ,OTRO SI N°. 1:	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	
FECHA DEL ACTA DE SUSPENSIÓN: N°. 2	
FECHA ACTA DE REINICIO : N°. 2	
PLAZO ADICIONAL OTROSI N°. 2	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	
ADICIONAL OTROSI No. 3	
ADICIONAL OTROSI No. 4	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	

1.3 Valor del Contrato / Convenio

VLOR INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	$ 72.171.120,00
OTROSI EN VLR No 1	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO	**$ 72.171.120,00**
ACTA DE COMITÉ DIRECTIVO Y FECHA	
N°. de CDR	15685 de septiembre 20 de 2023
CARTA DE VIABILIZACION DEL MVCT Y FECHA (si aplica)	N.A.

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015

INFORME N°. 02 — PERIODO : 20/07/2024 AL 19/08/2024

2. EJECUCION FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02	Fecha Acta (dd/mm/aa)	Valor del Acta	% Ejecución	Amortización Anticipo	Valor Total Pagado	Estado
Anticipo						
Acta No. 1	14-ago.-2024	$ 21.651.336	30,00%			PAGADO
Acta No. 2						
Acta No. 3						
Acta No. 4						
Acta No. 5						
Acta No. 6						
TOTALES		**$ 21.651.336**	**30,00%**	**$ -**	**$ -**	

De acuerdo con lo anterior, el presente informe describe las actividades de supervisión efectuadas desde el 20/07/2024 hasta el 19/08/2024, de acuerdo con el Manual del Interventoría de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015

INFORME N°. 02 | PERIODO: 20/07/2024 AL 19/08/2024

3. CONTROL DE GARANTIAS

INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02	Valor Asegurado	N°. Poliza	Compañia Aseguradora	Vigencia		Observaciones
				Desde	Hasta	
Cumplimiento del contrato	$ 14.434.224,00	C-100077127	SEGUROS MUNDIAL	19/06/2024	19/01/2026	
Suspensión N°. 1						
Suspensión N°. 2						
Otro Si 1						
Buen Manejo del Anticipo						
Otro Si 1						
Suspensión N°. 1						
Otro Si 1						
Salarios y Prestaciones Sociales	$ 3.608.556,00	C-100077127	SEGUROS MUNDIAL	19/06/2024	19/07/2028	
Suspensión N°. 1						
Otro Si 1						
Suspensión N°. 2						
Calidad del Servicio	$ 14.434.224,00	C-100077127	SEGUROS MUNDIAL	19/07/2025	19/07/2030	
Suspensión N°. 1						
Otro Si 1						
Otro Si 2						
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 260.000.000,00	C-100020119	SEGUROS MUNDIAL	19/06/2024	19/07/2025	
Suspensión N°. 1						
Suspensión N°. 2						
Otro Si 1						

INFORME N°. 02	PERIODO: DEL 20/07/2024 AL 19/08/2024

4. ASPECTOS TÉCNICOS

INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02

Informe	Fecha de Corte
N°. 02	AGOSTO 19 DE 2024

4.2 Reporte de las fichas de seguimiento entregados por el contratista (Si aplica)

CONTRATO N° 2000.13.12.004-2024	Fecha de Corte
No aplica	AGOSTO 19 DE 2024

4.3 Avance de ejecución


Durante el período correspondiente al presente informe N°. 02, el GRUPO CONSITEC INGENIERIA S.A.S , realizó el seguimiento y control a las distintas actividades relacionadas con el proyecto, desarrolladas por la firma consultora CONSORCIO LA PAILA 2023; las cuales se enumeran, a continuación: El avance físico del proyecto hasta la fecha de corte del presente informe, se encuentra en un 16 %.

Desde el punto de vista del componente administrativo, social y ambiental, el GRUPO CONSITEC INGENIERIA S.A.S, participó en las siguientes actividades: Asistencia y acompañamiento a reuniones con ASEPAILA-Reunión virtual con Vallecaucana de Aguas y el Consorcio la Paila 2023 para socializar los formatos de la entidad contratante y lineamientos para su diligenciamiento-Asistencia a visita de campo con Consorcio La Paila 2023 y ASEPAILA para revisión de la infraestructura existente-Acompañamiento durante la labores de levantamiento topográfico por parte del Consorcio La Paila 2023 .

4.4 Cronograma

FECHA (dd/mm/aa)	% AVANCE FISICO	VALOR DE ACTA DE AVANCE	% EJECUCIÓN FINANCIERA
19-jul.-2024	10,00%	$ -	0,0%
19-ago.-2024	16,00%	$ 21.651.336,00	30,00%

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015
INFORME N°. 02	PERIODO: DEL 20/07/2024 AL 19/08/2024	

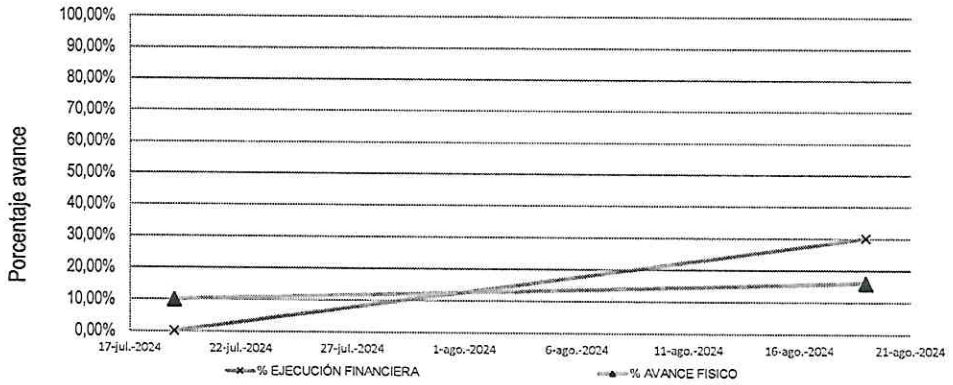

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015

INFORME N°. 02	PERIODO: DEL 20/07/2024 AL 19/08/2024

5. SEGURIDAD SOCIAL

INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02

6. CONCLUSIONES

1.Asistencia y acompañamiento a reuniones con ASEPAILA
2.Reunión virtual con Vallecaucana de Aguas y el Consorcio la Paila 2023 para socializar los formatos de la entidad contratante y lineamientos para su diligenciamiento
3.Asistencia a visita de campo con Consorcio La Paila 2023 y ASEPAILA para revisión de la infraestructura existente
4.Acompañamiento durante la labores de levantamiento topográfico por parte del Consorcio La Paila 2023 .

Firma del Supervisor Contrato N°. 2000.13.12.008-2022 - Área Tecnica - Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

CONTRATO N° 2000.13.12.004-2024

Revisado por: Profesionales de la Dirección Técnica


Aprobado por : Miguel Edinson Zuluaga Montero - Director Técnico, Luis Eduardo Pineda - Director Jurídico, José Edilso Rueda - Director Financiero

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P — PAP-PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015


INFORME N°. 02	PERIODO: DEL 20/07/2024 AL 19/08/2024

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 02

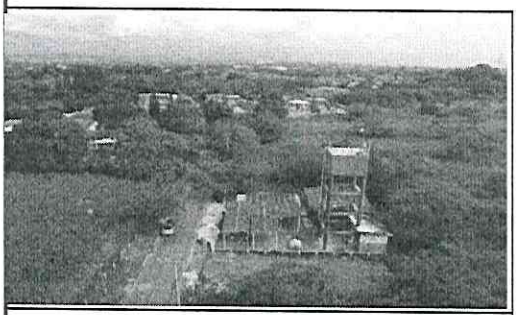


Visita a Infraestructura Existente

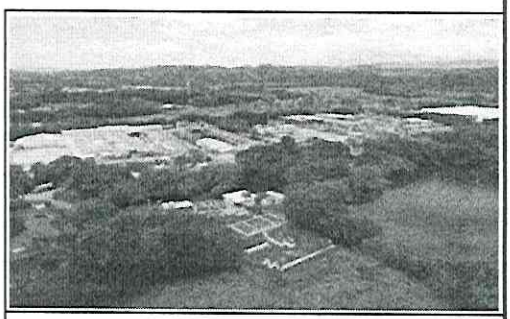

Visita a Infraestructura Existente




Visita a Infraestructura Existente

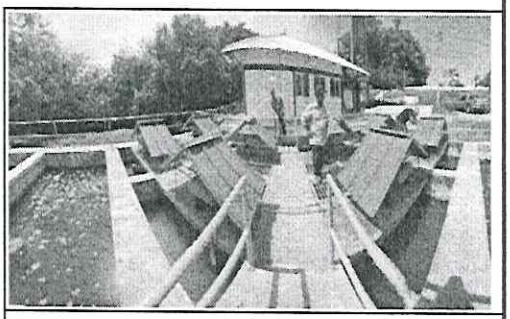

Visita a Infraestructura Existente



Visita a Infraestructura Existente

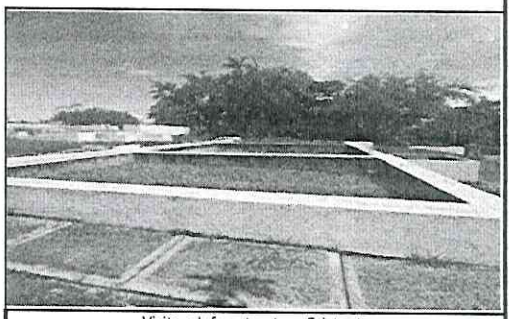

Visita a Infraestructura Existente
