| MINISTERIO DEL DEPORTE | **PROCESO:** GESTION FINANCIERA Y TESORERIA | **Versión: 5** |
|---|---|---|
| | | **CÓDIGO:** GF - FR - 020 |
| | **FORMATO:** LISTA DE CHEQUEO RADICACIÓN DE CUENTAS | Pagina 1 de 1 |

Fecha de Radicación en la Central de Cuentas: Día: 28 Mes: NOVIEMBRE Año: 2022

Nombre Del Contratista: JASEN CONSULTORES SAS

No. y Fecha del Contrato: CCS-856-2021 DEL 6 DE SEPTIEMBRE 2021

Certificado de Disponibilidad No. 121221

Registro Presupuestal No. 640121

## DOCUMENTOS PRESENTADOS - LISTA DE CHEQUEO

(Marque con una **X** los documentos a radicar en el G.I.T Financiera y Presupuestal, que sean de su competencia)

| | DOCUMENTOS ANEXOS |
|---|---|
| **1. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS** | |
| – Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato. | |
| – Pagos aportes de salud, pensión y riesgos profesionales (Planilla en estado Pagada) | |
| – Factura de Venta, debidamente firmada **(SI APLICA)** | |
| – Declaracion Juramentada Personal (Ley 1819/2016) | |
| – Informe de Actividades Formato BS-FR-057 - Informe de Actividades. | |
| – Formato de deducciones para disminuir base de retencion en la fuente **(SI APLICA)** | |
| **2. CONTRATOS DE ADQUISICION DE BIENES** | |
| – Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato. | |
| – Entrada al Almacén | |
| – Factura de venta original - debidamente firmada | |
| – Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal (Art.50 ley 789/2002 y Art.23 de la ley 150/2007). | |
| – Copia del encargo del Representante Legal si no es el Titular. (Anexar copia del documento legal en la cual se encarguen o deleguen las funciones) **SI APLICA.** | |
| **3. CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS** | |
| – Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato, (en el cual se certifica que el contratista ha dado cumplimiento con las obligaciones y entrega de los documentos requridos para cada uno de los desembolsos, segun en articulo de forma de pago. Relacionar cada documento que indica su cumplimiento el espacio de las observaciones) | |
| – Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal (Art.50 ley 789/2002 y Art.23 de la ley 1150/2007). | |
| – Copia del encargo del Representante Legal si no es el Titular. (Anexar copia del documento legal en la cual se encarguen o deleguen las funciones) **SI APLICA.** | |
| – Factura de Venta **(SI APLICA)** | |
| **4. CONTRATOS DE ADQUISICION DE SERVICIOS (Vigilancia, Aseo y Cafetería, Combustible, Mantenimientos en general, etc.)** | |
| – Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato. | X |
| – Factura de Venta original | X |
| – Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal (Art.50 ley 789/2002 y Art.23 de la ley 1150/2007). | X |
| – Copia del encargo del Representante Legal si no es el Titular. (Anexar copia del documento legal en la cual se encarguen o deleguen las funciones) **SI APLICA** | |

| MINISTERIO DEL DEPORTE | **PROCESO:** GESTIÓN FINANCIERA<br>**FORMATO:** CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA PAGO | **Versión:** 5<br>**Código:** GF-FR-021<br>**Fecha:** 26/01/2022<br>**Página:** 1 de 1 |
|---|---|---|

**CONTRATO DE CONSULTORIA** 856 **DE** 2021

**El cual fue suscrito el día** 06-sep-2021 **y dio inicio a su ejecución con acta del día** 24-nov-2021 **; cuya fecha de terminación de ejecución según contrato es el** 29-dic-2022

**El contrato** SI **tiene suspensiones.** **Se anexa como soporte de esta certificación el acta de suspensión del contrato.**

**El Supervisor de este Contrato suscrito por el Ministerio del Deporte – MINDEPORTE**

## CERTIFICA

**Que** JASEN CONSULTORES SAS

**Identificado con** NIT **N°** 830.087.225-5 **de** N/A

**Con correo Electrónico de contacto:** jgrisales@mindeporte.gov.co **dirección de domicilio** CRA 69F Nº 8-31 **y No. Telefónico de Contacto** (601)2608664

**Cumplió con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato y/o Convenio cuyo Objeto es:**

***INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LA TRIBUNA PRINCIPAL DEL ESTADIO JORGE ELIECER GAITÁN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO.***

**Y según la Cláusula de Valor y Forma de Pago:**

***CLAUSULA 3. VALOR: El valor del contrato corresponde a la suma CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y CINCO PESOS $111.631.045. MCTE, incluido IVA y todos los impuestos, retenciones, tributos, contribuciones y/o gravámenes a que haya lugar; de conformidad con la propuesta presentada, la cual hace parte integral del contrato. CLAUSULA 5. FORMA DE PAGO. El MINISTERIO DEL DEPORTE pagará a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato de la siguiente manera:***
***1. COSTOS FIJOS: El MINISTERIO DEL DEPORTE hará pagos mensuales, hasta el TREINTA POR CIENTO (30%) DEL VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, el cual se realizará en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un número de cuotas igual al número de meses del plazo de dicho contrato, los cuales se realizarán con la entrega y recibo a satisfacción por parte de supervisor designado por el MINISTERIO DEL DEPORTE de los informes semanales y mensuales de las actividades desarrolladas del mes correspondiente. Todos los informes se deben realizar en el formato establecido por el Supervisor del MINDEPORTE. Los informes mensuales deberán tener el visto bueno por parte del ente territorial como contratante de la obra derivada del Convenio Interadministrativo No. 001293 del 2017.***
***2. COSTOS VARIABLES: El MINISTERIO DEL DEPORTE hará pagos mensuales, hasta completar el SESENTA POR CIENTO (60%) DEL VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, aplicado a las actas parciales, por el sistema de avance de obra, de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado entre el Municipio, Contratista de Obra e Interventoria. Se pagará al contratista de interventoría el valor resultante entre el porcentaje de avance físico de obra del mes y el sesenta por ciento del valor total del contrato de interventoría:***
***Vcv: % Avance físico de obra del mes x 0.60VC.***
***VC: Valor total Contrato de Interventoría.***
***Los avances de obra deben estar aprobados por el supervisor del MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, en el formato establecido por el supervisor del MINISTERIO DEL DEPORTE.3. El último pago, correspondiente al saldo del DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, el cual se pagará con la presentación del informe final, según lo establezca el supervisor del MINISTERIO DEL DEPORTE, acta de liquidación del contrato de obra, acta de liquidación del contrato de interventoría, previa suscripción del acta de recibo final de las obras por parte de la interventoría y el MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, así como de la aprobación de las garantías correspondientes. PARÁGRAFO PRIMERO. En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO. El contratista deberá presentar para cada pago, la factura electrónica, cuando corresponda, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), riesgos profesionales, y demás documentos requeridos para el pago. El contratista deberá garantizar que el personal contratado se encuentre afiliado y al día en los pagos al sistema de seguridad social integral y cancelar aportes parafiscales a todo el personal que vincule para la ejecución y desarrollo del contrato, cuando el vínculo sea por relación laboral, y/o verificar y aportar los pagos al sistema de seguridad social y parafiscales cuando el personal contratado sea por otro tipo de contrato legal vigente, cuando aplique.***
***PARÁGRAFO TERCERO. REQUISITOS COMUNES PARA LOS PAGOS: Para la procedencia de los pagos, el (la) CONTRATISTA deberá cumplir los siguientes requisitos: a) Anexar los soportes que acrediten los requisitos establecidos o contemplados para cada uno de los pagos como son los informes técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, la factura y/o la cuenta de cobro (lo que aplique y corresponda para cada pago). b) Acreditar que se encuentran al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos Laborales), adjuntando los soportes que evidencien dicho cumplimiento como es el comprobante o planilla de pago de los aportes que correspondan, de conformidad con la normatividad vigente para el efecto. c) Adjuntar la certificación de cumplimiento emitida por el (la) supervisor(a) para el pago. Los soportes documentales que acrediten los requisitos establecidos o contemplados para cada uno de los pagos, presentados por el (la) CONTRATISTA, deberán ser revisados y avalados por el (la) supervisor(a) del contrato. Se aplicarán los impuestos, retenciones, tributos, contribuciones y/o gravámenes, de acuerdo con la normatividad vigente y los conceptos y tarifas previstas en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. El MINISTERIO DEL DEPORTE no se hará responsable por la demora que se genere en la entrega incompleta e incorrecta de la documentación solicitada o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.***
***Los pagos antes señalados estarán sujetos a la existencia y disponibilidad del recurso, por parte de la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la correspondiente programación del PAC que efectué el Tesoro Nacional y a la disponibilidad de los recursos de tesorería del MINISTERIO DEL DEPORTE.***

**Se autoriza el pago, con el cual se presenta un avance de ejecución del** 17,30% **% de los recursos aportados por MINDEPORTE; Por valor de:**

**NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE**

**$** 9.417.805,00 **, previo cumplimiento de sus actividades, correspondientes a la ejecución del período comprendido entre el** 13-ene-2022 **al** 17-mar-2022

**asi mismo el desembolso debe ser girado a Beneficiario Final a** JASEN CONSULTORES SAS **o Endosado a** N/A

**a la Cuenta Bancaria** CORRIENTE **No** 4691012897 **del Banco** SCOTIABANK COLPATRIA

**y que se encuentra activa en el SIIF Nación II.**

**Para este desembolso se dispone de los siguientes Registros Presupuestales y con la siguiente ejecución financiera con corte al último periodo certificado para pago:**
(Favor diligenciar cada pago cobrado y/o facturado de acuerdo al periodo, a fin de observar la ejecución acumulada del contrato a la fecha del expedición de la presente certificación)

| N° de Pago cobrado | N° RP | RUBRO PRESUPUESTAL | USO PRESUPUESTAL | RECURSO | VALOR EJECUCIÓN | N° FACTURA DEL CONTRATISTA | VALOR ADQUISICIÓN BIENES (1) | VALOR ADQUISICIÓN SERVICIOS (2) | VALOR DE BIENES Y/O SERVICIOS EXCLUIDOS (3) | VALOR DE IVA (4) | VALOR TOTAL SUMA(1+2+3+4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMER | 640121 | C-4302-1604-16-0-4302071-02 | A-02-02-02-008-003-03 | 11 | $ 3.044.483,00 | JC - 111 | 0,00 | $ 2.558.389,08 | 0,00 | $ 486.093,92 | $ 3.044.483,00 |
| SEGUNDO | 640121 | C-4302-1604-16-0-4302071-02 | A-02-02-02-008-003-03 | 11 | $ 6.852.523,00 | JC - 112 | 0,00 | $ 5.758.422,69 | 0,00 | $ 1.094.100,31 | $ 6.852.523,00 |
| TERCERO | 640121 | C-4302-1604-16-0-4302071-02 | A-02-02-02-008-003-03 | 11 | $ 9.417.805,00 | JC - 113 | 0,00 | $ 7.914.121,85 | 0,00 | $ 1.503.683,15 | $ 9.417.805,00 |
| CUARTO | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QUINTO | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEXTO | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTALES | | $ 19.314.811,00 | | 0,00 | $ 16.230.933,62 | 0,00 | $ 3.083.877,38 | $ 19.314.811,00 |

**Los demás documentos que soportan el debido cumplimiento del mismo (Informes Administrativos, Técnicos y Financieros, Informes de Gestión, productos etc. cuando estos apliquen), reposa dentro de la carpeta contractual del Archivo del G.I.T. de Contratación de MINDEPORTE.**

**La presente certificación se expide en** BOGOTA **a los** 28 **día (s) del mes de** NOVIEMBRE

**del año** 2022

**Nombre Supervisor:** JOSE ALBEIRO GRISALES VALENCIA
**G.I.T. o área:** GIT - INFRAESTRUCTURA
**Periodo designación:** 7/4/2022 **hasta** 29/12/2022

**Nombre Supervisor (E):** EDGAR MUÑOZ DAVID
**G.I.T. o área:** GIT - INFRAESTRUCTURA
**Periodo designación:** 18/11/2021 **hasta** 6/4/2022

**OBSERVACIONES:**

**(Aquí se puede Escribir las Explicaciones y/o Aclaraciones que considere necesario):**

**Anexo 8 folios**
**Certifico que el contratista, ha dado cumplimiento con las obligaciones de la cláusula 5) forma de pago, numerales 1 y 2 y presentó los siguientes documentos: Parafiscales,acta de pago parcial de interventoría, factura,informe mensual, acta de suspension y reinicio al contrato/convenio,aval Ente territorial , los cuales se adjuntan a esta certificacion.**

# CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSION, ARL Y APORTES PARAFISCALES

## ARTÍCULO 204 DE LA LEY 100 DE 1993 - ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Revisora Fiscal de la sociedad JASEN CONSULTORES S.A.S., Identificada con NIT. N° 830.087.225-5, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y revisados los estados financieros de la compañía, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de los aportes correspondientes a los Sistemas de pensiones, Riegos Profesionales, y Cajas de Compensación Familiar, la empresa se encuentra a paz y salvo y realizo los respectivos pagos.

Respecto a los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social en Salud, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la sociedad se encuentra exonerada de acuerdo a lo señalado taxativamente en el inciso 1 del artículo 65 de la ley 1819 de 2016, el cual adiciono el artículo 114-1 del Estatuto Tributario "Exoneración de aportes".

De la misma manera, a partir del 1 de enero de 2014, la sociedad se encuentra exonerada de las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud de que trata el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, acorde con el literal 3 del artículo 8 del Decreto 0862 del 26 de abril del 2013.

Así mismo, respecto a los pagos laborales, por prestación de servicios y no laborales del personal vinculado, la empresa se encuentra a paz y salvo por todo concepto prestacional, salarial y no salarial.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C. a los 08 días del mes de noviembre de 2022.

**MARIA GLADYS RINCON HURTADO**
**TP. 126815-T**
Revisora Fiscal de JASEN CONSULTORES S.A.S.

OFICINA PRINCIPAL
CRA. 69 F No 8-31
TELEFAX 2608664. - 2900754
BOGOTÁ, D.C.
www.jasenconsultores.com

MINISTERIO DEL DEPORTE

# ACTA DE PAGO DE INTERVENTORIA
## JASEN CONSULTORES S.A.S.

Público [X] Reservad [ ] Clasificad [ ]



**CONTRATO No:** CCS-856-2021

**OBJETO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LA TRIBUNA PRINCIPAL DEL ESTADIO JORGE ELIECER GAITÁN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO.

**INTERVENTOR:** JASEN CONSULTORES S.A.S

**ACTA DE PAGO PARCIAL DE INTERVENTORIA**

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 24/11/2021 |
| **PLAZO:** | 5 MESES Y 15 DIAS |
| **PRORROGA:** | 28 dias |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN 01:** | DEL 29/12/2021 AL 12/01/2022 |
| **FECHA DE REINICIO 01:** | 13/01/2022 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN 02:** | DEL 18/01/2022 AL 31/01/2022 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN 03:** | DEL 01/02/2022 AL 21/02/2022 |
| **FECHA DE REINICIO 02:** | 22/02/2022 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN 04:** | DEL 22/05/2022 AL 21/06/2022 |
| **FECHA DE REINICIO 03:** | 24/05/2022 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN 05:** | DEL 31/05/2022 AL 30/06/2022 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN 06:** | DEL 1/07/2022 AL 31/07/2022 |
| **FECHA DE REINICIO 04:** | 01/08/2022 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN 07:** | DEL 23/09/2022 AL 22/12/2022 |
| **FECHA DE REINICIO 05:** | 23/09/2022 |
| **FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZAI** | 29/12/2022 |
| **VALOR INICIAL (incluido IVA):** | $ 111.631.045,00 |
| **VALOR ADICIÓN:** | N.A |
| **VALOR TOTAL:** | $ 111.631.045,00 |

**ACTA No.** 3

**VALOR ACTA:** $ 9.417.805,00

**FECHA :** 17/11/2022

**PERIODO PAGO MES:** DEL 13/01/2022 AL 17/01/2022 - DEL 22/02/2022 AL 17/03/2022

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES | | | | CONDICIONES REALES MENSUAL | | | | PRESENTE ACTA | | | | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANT. | CARGO / OFICIO | SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL | PARTICIP. (h-mes) | MESES (No. Meses) | VALOR PARCIAL ($) | SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL | PRIMA REGIONAL | PARTICIP. (h-mes) | VALOR PARCIAL ($) | PRIMA REGIONAL | PARTICIP. (h-mes) | MESES (No. Meses | VALOR PARCIAL ($) | VALOR TOTAL ($) |
| | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | $ 5.340.000,00 | 17,57% | 5,50 | $ 5.160.309,00 | $ 5.340.000,00 | | 17,57% | $ 938.238,00 | | 17,57% | 1,00 | $ 938.238,00 | $ 2.345.595,00 |
| 1 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | $ 3.601.260,00 | 90,90% | 5,50 | $ 18.004.499,37 | $ 3.601.260,00 | | 90,90% | $ 3.273.545,34 | | 90,90% | 1,00 | $ 3.273.545,00 | $ 8.183.863,00 |
| 1 | ESPECIALISTA ESTRUCTURAL | $ 3.601.260,00 | 9,09% | 5,50 | $ 1.800.449,94 | $ 3.601.260,00 | | 9,09% | $ 327.354,53 | | 9,09% | 1,00 | $ 327.355,00 | $ 818.387,00 |
| 1 | ESPECIALISTA ELECTRICO | $ 3.601.260,00 | 6,67% | 5,50 | $ 1.321.122,23 | $ 3.601.260,00 | | 6,67% | $ 240.204,04 | | 6,67% | 1,00 | $ 240.204,00 | $ 600.510,00 |
| 1 | ESPECIALISTA HIDRAULICO | $ 3.601.260,00 | 10,30% | 5,50 | $ 2.040.113,79 | $ 3.601.260,00 | | 10,30% | $ 370.929,78 | | 10,30% | 1,00 | $ 370.930,00 | $ 927.325,00 |
| 1 | PROFESIONAL HSE | $ 3.601.260,00 | 40,00% | 5,50 | $ 7.922.772,00 | $ 3.601.260,00 | | 40,00% | $ 1.440.504,00 | | 40,00% | 1,00 | $ 1.440.504,00 | $ 3.601.260,00 |
| 1 | ABOGADO | $ 3.601.260,00 | 16,36% | 5,50 | $ 3.240.413,75 | $ 3.601.260,00 | | 16,36% | $ 589.166,14 | | 16,36% | 1,00 | $ 589.166,00 | $ 1.472.915,00 |
| | **TOTAL** | | | | **$ 39.489.680,08** | | | | **$ 7.179.942,00** | | | | **$ 7.179.942,00** | **$ 17.949.855,00** |
| | **FACTOR MULTIPLICADOR** | | | | **1,86** | | | | **1,86** | | | | **1,86** | **1,86** |
| | **SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL** | | | | **$ 73.450.805,00** | | | | **$ 13.354.692,00** | | | | **$ 13.354.692,00** | **$ 33.386.730,00** |
| | **PERSONAL TÉCNICO** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | INSPECTOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ | $ 1.440.360,00 | 72,73% | 5,50 | $ 5.761.656,05 | $ 1.440.360,00 | | 72,73% | $ 1.047.573,83 | | 72,73% | 1,00 | $ 1.047.574,00 | $ 2.618.935,00 |
| 1 | TOPOGRAFO | $ 1.690.920,00 | 14,55% | 5,50 | $ 1.353.158,73 | $ 1.690.920,00 | | 14,55% | $ 246.028,86 | | 14,55% | 1,00 | $ 246.029,00 | $ 615.072,00 |
| 1 | CADENERO 1 | $ 1.190.700,00 | 9,09% | 5,50 | $ 595.290,47 | $ 1.190.700,00 | | 9,09% | $ 108.234,63 | | 9,09% | 1,00 | $ 108.235,00 | $ 270.587,00 |
| | **TOTAL** | | | | **$ 7.710.105,25** | | | | **$ 1.401.837,00** | | | | **$ 1.401.838,00** | **$ 3.504.594,00** |
| | **FACTOR MULTIPLICADOR** | | | | **1,86** | | | | **1,86** | | | | **1,86** | **1,86** |
| | **SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL TECNICO** | | | | **$ 14.340.796,00** | | | | **$ 2.607.417,00** | | | | **$ 2.607.419,00** | **$ 6.518.545,00** |
| | **EQUIPOS - VEHICULOS - OTROS** | | | | | | | | | | | | | |
| mes | Topografia (Incluye tránsito, nivel y elementos complementarios. El tránsito equivale al 72%, el nivel al 18% y los elementos complementarios el 10% del valor de la tarifa). | $ 3.424.000,00 | 100,00% | 0,50 | $ 1.712.000,00 | $ 311.272,73 | | 100,00% | $ 311.273,00 | | 100,00% | 1,00 | $ 311.273,00 | $ 778.182,00 |
| | **EMSAYOS/ANALISIS LABORATORIO** | | | | | | | | | | | | | |
| gl | Ensayos de laboratorio | $ 2.084.000,00 | 100,00% | 1,00 | $ 2.084.000,00 | $ 378.909,09 | | 100,00% | $ 378.909,00 | | 100,00% | 1,00 | $ 378.909,00 | $ 947.273,00 |
| | **GASTOS DE VIAJE** | | | | | | | | | | | | | |
| und | Gastos de Viaje | $ 2.220.000,00 | 100,00% | 1,00 | $ 2.220.000,00 | $ 403.636,36 | | 100,00% | $ 403.636,00 | | 100,00% | 1,00 | $ 403.636,00 | $ 1.009.090,00 |
| | **COSTO DE PERSONAL** | | | | **$ 87.791.601,00** | | | | **$ 15.962.109,00** | | | | **15.962.111,00** | **39.905.275,00** |
| | **COSTOS DIRECTOS** | | | | **$ 6.016.000,00** | | | | **$ 1.093.818,00** | | | | **1.093.818,00** | **2.734.545,00** |
| | **COSTOS ANTES DE IVA** | | | | **$ 93.807.601,00** | | | | **$ 17.055.927,00** | | | | **17.055.929,00** | **42.639.820,00** |
| | **IVA (19%)** | | | | **$ 17.823.444,00** | | | | **$ 3.240.626,00** | | | | **3.240.627,00** | **8.101.566,00** |
| | **VALOR TOTAL CONTRATO** | | | | **$ 111.631.045,00** | | **VALOR MENSUAL** | | **20.296.553,00** | | **VALOR TOTAL ACTA** | | **20.296.556,00** | **50.741.386,00** |

**PAGO POR AVANCE DE OBRA**

| OBJETO DEL PAGO | PORCENTAJE AVANCE DE OBRA | | | PRESENTE ACTA | | | ACUMULADO | | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRESENTE ACTA | ACTAS ANT. | ACUMULADO | ACTA No. | % por mes | Valor a pagar del mes | Cobro No. | % por mes | Valor Pagado | |
| ACTA DE PAGO No. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 13/01/2022 AL 17/01/2022 - DEL 22/02/2022 AL 17/03/2022 | 4,97% | 0,00% | 0,00% | 1 | 2,73% | $ 3.044.483,00 | 1 | 2,73% | $ 3.044.483,00 | $ 108.586.562,00 |
| | | 1,14% | 1,14% | 2 | 6,14% | $ 6.852.523,00 | 2 | 8,87% | $ 9.897.006,00 | $ 101.734.039,00 |
| | | 4,97% | 6,11% | 3 | 8,44% | $ 9.417.805,00 | 3 | 17,30% | $ 19.314.811,00 | $ 92.316.234,00 |
| **VALOR ACTA No. 3** | **VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA** | | | | | | | | | |
| $ 9.417.805,00 | $ 2.019.037.185,00 | | | | | | | | | |

**SON: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS MC/TE $ 9.417.805,00**

| | |
|---|---|
| 30% DEL VTC (COSTO FIJO) | $ 5.116.779,00 |
| 60% DEL VTC (COSTOS VARIABLES) | $ 2.797.343,00 |
| SUBTOTAL | $ 7.914.122,00 |
| IVA 19% | $ 1.503.683,00 |
| **TOTAL ACTA No. 3** | **$ 9.417.805,00** |

**FIRMA: JOHNNY LEANDRO CASTILLO CURIEUX**
**REPRESENTANTE. LEGAL JASEN CONSULTORES S.A.S.**
**C.C. No. 79.649.294 DE BOGOTA D.C.**

**FIRMA:**
**EDGAR MUÑOZ DAVID**
**SUPERVISOR MINDEPORTE**

# Factura electrónica de venta N°: JC-113

**JASEN CONSULTORES S.A.S.**
830.087.225-5
CARRERA 69F No. 8 - 31
Bogotá - Colombia
(031) 2608664
financiera@jasen.com.co
www.jasenconsultores.com.co/

**Cliente:** MINISTERIO DEL DEPORTE
**Nit:** 899.999.306-8
**Teléfono:** (601) 4377030
**Dirección:** Av. Cra. 68 No. 55-65
**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 21/11/2022, 11:58 |
| **Expedición** | 21/11/2022, 11:58 |
| **Vencimiento** | 06/12/2022 |
| **Vendedor** | JASEN CONSULTORES S |
| **Centro de costo** | 0 |
| **Cotización** | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Pago acta 03 del contrato CCS-856-2021, cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA EN LA TRIBUNA PRINCIPAL DEL ESTADIO JORGE ELIECER GAITÁN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, durante el periodo comprendido entre el 13 DE ENERO DE 2022 AL 17 DE ENERO DE 2022 Y DEL 22 DE FEBRERO DE 2022 AL 17 DE MARZO DE 2022. | 1.00 | 9,417,805.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Nueve millones cuatrocientos diecisiete mil ochocientos cinco pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-06 por $ 9,417,805.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | **7,914,121.85** |
| **IVA 19%** | **1,503,683.15** |
| **Total a Pagar** | **9,417,805.00** |

**Observaciones:**
CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE
BANCO SCOTIABANK COLPATRIA No. 4691012897
#$43-01-01; CCS-856-2021; Jgrisales@mindeporte.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764023571157 aprobado en 20211230 prefijo JC desde el número 64 al 1000 Vigencia: 18 Meses** Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 8.66

**CUFE:**
f659615b41f782bf4e80e592385408ab3efbaae4e0a435ad88347d22e3b63478d62b322c4da633e91c0b30b396c077db

Elaborado por

Firma recibido

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| MINISTERIO DEL DEPORTE | PROCESO: | Versión: 1 |
|---|---|---|
| | APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA | CÓDIGO: ATC-FR-045 |
| | FORMATO: INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA | Fecha: 19/11/2021 |

| FECHA DE ENTREGA DEL INFORME | viernes, 18 de marzo de 2022 | MES No. | 2 | INFORME DEL | 13/01/2022 | AL | 17/01/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Y DEL | 22/02/2022 | AL | 18/03/2022 |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LA TRIBUNA PRINCIPAL DEL ESTADIO JORGE ELIECER GAITÁN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | PUERTO BERRIO - BARRIO PUEBLO NUEVO |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA | | | | CONTRATO DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No.: | CCS-856-2021 | | | CONTRATO No.: | 341 de 2021 | | |
| PLAZO INICIAL (DIAS): | 37 | | | PLAZO INICIAL (DIAS): | 90 | | |
| FECHA DE INICIO: | 24 de noviembre de 2021 | | | FECHA DE INICIO: | lunes, 29 de noviembre de 2021 | | |
| MODIFICACIÓN No. Y FECHA: | 001 - 24 de diciembre de 2021 | | | SUSPENSIÓN No. Y FECHA: | 001 - 24 de diciembre de 2021 | | |
| SUSPENSIÓN No. Y FECHA: | 001 - 29 de diciembre de 2021 | | | SUSPENSIÓN No. Y FECHA: | 002 - 13 de enero de 2022 | | |
| REINICIO No. Y FECHA: | 001 - 13 de enero de 2022 | | | PRORROGA No. Y FECHA: | 002 -04 de febrero de 2022 (10 días calendario) | | |
| SUSPENSIÓN No. Y FECHA: | 002 - 18 de enero de 2022 | | | PRORROGA No. Y FECHA: | 003 -03 de marzo de 2022 (1 mes) | | |
| SUSPENSIÓN No. Y FECHA: | 003 - 01 de febrero de 2022 | | | | | | |
| REINICIO No. Y FECHA: | 002 - 22 de febrero 2022 | | | REINICIO No. Y FECHA: | 001 - 22 de febrero de 2022 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: | 09 de mayo de 2022 | | | FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: | 06 de junio de 2022 | | |
| PLAZO ACTUALIZADO: | 112 | | | PLAZO ACTUALIZADO: | 130 | | |
| PLAZO TRANSCURRIDO: | 65 | EQUIVALE AL: | 58% | PLAZO TRANSCURRIDO: | 50 | EQUIVALE AL: | 38% |
| VALOR INICIAL : | $ | 111.631.045,00 | | VALOR INICIAL : | $ | 2.019.037.185,00 | |
| VALOR ANTICIPO (SI APLICA) | N/A | | | VALOR ANTICIPO (SI APLICA) | N/A | | |
| VALOR ADICION(ES) MINDEPORTE: | N/A | | | VALOR ADICION(ES) MINDEPORTE: | $ | - | |
| VALOR ADICION(ES) ENTE TERRITORIAL: | N/A | | | VALOR ADICION(ES) ENTE TERRITORIAL: | $ | 33.636.540,00 | |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ | 111.631.045,00 | | VALOR ACTUALIZADO: | $ | 2.052.673.725,00 | |
| VALOR PAGADO: | $ | - | | VALOR PAGADO: | $ | - | |
| VALOR POR PAGAR: | $ | 111.631.045,00 | | VALOR CAUSADO POR PAGAR: | $ | 2.052.673.725,00 | |
| INTERVENTOR O CONSULTOR: | JASEN CONSULTORES S.A.S. | | | CONTRATISTA OBRA | CONYSER S.A.S. | | |

## 2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| AMPARO | No. PÓLIZA | VIGENTE (Fechas) DESDE | VIGENTE (Fechas) HASTA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 980-47-994000017644 | 24/11/2021 | 1/07/2022 | 22.326.209,00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 980-47-994000017644 | 24/11/2021 | 31/12/2021 | 5,581,552.25 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 980-47-994000017644 | 21/06/2021 | 1/07/2022 | 22.326.209,00 |

**CONTRATO DE OBRA**

| AMPARO | No. PÓLIZA | VIGENTE (Fechas) DESDE | VIGENTE (Fechas) HASTA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 56-44-101001018 | 29/11/2021 | 29/08/2022 | 403,807,437.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 56-44-101001018 | 29/11/2021 | 28/02/2025 | 201,903,718.50 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 56-44-101001018 | 29/08/2022 | 29/08/2027 | 201,903,718.50 |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 56-44-10100049 | 29/11/2021 | 28/02/2022 | 272,557,800.00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 56-44-10100049 | 29/11/2021 | 28/02/2022 | 272,557,800.00 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 56-44-10100049 | 29/11/2021 | 28/02/2022 | 272,557,800.00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 56-44-10100491 | 29/11/2021 | 28/02/2022 | 272,557,800.00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 56-44-10100491 | 29/11/2021 | 28/02/2022 | 272,557,800.00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 56-44-10100491 | 29/11/2021 | 28/02/2022 | 272,557,800.00 |

### 2.1 ACTUALIZACION ESTADO DE LAS GARANTÍAS

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| SEGÚN: | | SEGÚN: | |
| MODIFICACION No.: 001 | DE FECHA: 24 DE DICIEMBRE DE 2021 | SUSPENSION NO.: 001 | DE FECHA: 24 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| SUSPENSION NO.: 001 | DE FECHA: 29 DE DICIEMBRE DE 2021 | PRORROGA No.: 002 | DE FECHA: 04 DE FEBRERO DE 2022 |
| REINICIO No.: 002 | DE FECHA: 22 DE FEBRERO DE 2022 | REINICIO No.: 001 | DE FECHA: 22 DE FEBRERO DE 2022 |
| | | PRORROGA No.: 003 | DE FECHA: 03 DE MARZO DE 2022 |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| AMPARO | No. PÓLIZA | VIGENTE (Fechas) DESDE | VIGENTE (Fechas) HASTA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 980-47-994000017644 | 24/11/2021 | 11/04/2023 | 22.326.209,00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 980-47-994000017644 | 24/11/2021 | 11/10/2025 | 5,581,552.25 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 980-47-994000017644 | 21/06/2021 | 11/02/2023 | 22.326.209,00 |

**CONTRATO DE OBRA**

| AMPARO | No. PÓLIZA | VIGENTE (Fechas) DESDE | VIGENTE (Fechas) HASTA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 56-44-101001018 | 29/11/2021 | 10/12/2022 | $ 410.534.745,00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 56-44-101001018 | 29/11/2021 | 10/06/2022 | $ 205.267.372,50 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 56-44-101001018 | 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL | | $ 205.267.372,50 |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 56-44-10100049 | 29/11/2021 | 10/06/2022 | $ 272.557.800,00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 56-44-10100049 | 29/11/2021 | 10/06/2022 | $ 272.557.800,00 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 56-44-10100049 | 29/11/2021 | 10/06/2022 | $ 272.557.800,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 56-44-10100491 | 29/11/2021 | 10/06/2022 | $ 272.557.800,00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 56-44-10100491 | 29/11/2021 | 10/06/2022 | $ 272.557.800,00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 56-44-10100491 | 29/11/2021 | 10/06/2022 | $ 272.557.800,00 |

## 3. RESUMEN DE PAGOS

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| CONCEPTO | VALOR | % | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL PAGADO | | | |

**CONTRATO DE OBRA**

| CONCEPTO | VALOR | % | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL PAGADO | | | |

## 4. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

1: EL item 2,1 Excavación manual de 0-2m, para los anillos de protección de los ejes 5, 9
2. El item 2.2 Excavación manual de 2 4m, las cantidades reportadas hacen referencia a la excavación de los caissons de los ejes 5 y 9
3. El item 2.3 Excavación manual mayor a 4m de profundidad hace referencia a las cantidades reportadas a la excavación de los caissons de los ejes 1,2,3,4,5,9
4. El item 3.5 Figuración e instalación de acero de refuerzo para anillos de protección y canastas de acero de refuerzo de los caissons.
5. El item 3.2 Concreto 3000 psi para pilotes. inicio el día 07 de marzo, ara el presente infrme se han fundido los caisson de los ejes 1. 2. y 9.
6. El item 3.6 Suministro. colocación, vibrado y curado de concreto de 21 MPa. para anillos de Caissons de espesor promedio, e=0.12m incluye formaleta. según diseños. En el periodo que comprende este informe. se fundieron 45 mts. para un total de 63 mts de anillos de protección.

### 4.1. PROGRAMACIÓN OBRA

| % DE AVANCE OBRA PROGRAMADO | ACUMULADO 9,08% | | % DE AVANCE OBRA EJECUTADO | | | ACUMULADO 6,11% | | % DE ATRASO ACUMULADO 3,0% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITULOS | INICIO | FIN | DURACIÓN (DIAS) | % TOTAL | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | % ATRASO | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO | DÍAS DE ATRASO |
| Campaña de topografía. localización y replanteo de cimiento, control de niveles y posición para elementos estructurales y obras en general | lunes, 29 de noviembre de 2021 | domingo, 17 de abril de 2022 | 17 | 0,45% | 0,29% | 0,29% | 0,00% | EN EJECUCIÓN | 0 |
| Excavación manual de material comun 0-2 m, incluye cargue transporte y disposicon final del material en botadero autorizado por la autoridad ambiental | lunes, 6 de diciembre de 2021 | domingo, 3 de abril de 2022 | 118 | 0,44% | 0,24% | 0,23% | 0,01% | EN EJECUCIÓN | 0 |
| Excavación manual de material comun 2-4 m, incluye cargue transporte y disposicon final del material en botadero autorizado por la autoridad ambiental | lunes, 13 de diciembre de 2021 | domingo, 6 de marzo de 2022 | 83 | 0,11% | 0,11% | 0,08% | 0,04% | EN EJECUCIÓN | 0 |
| Excavación manual de material comun mayor a 4m, incluye cargue transporte y disposicon final del material en botadero autorizado por la autoridad ambiental | lunes, 13 de diciembre de 2021 | domingo, 20 de marzo de 2022 | 97 | 0,36% | 0,36% | 0,28% | 0,08% | EN EJECUCIÓN | 0 |
| Relleno con material de prestamo compactado | lunes, 10 de enero de 2022 | domingo, 27 de marzo de 2022 | 76 | 0,32% | 0,16% | 0,00% | 0,16% | EN EJECUCIÓN | 0 |
| Concreto simple 3000 PSI para Zapatas | lunes, 3 de enero de 2022 | domingo, 3 de abril de 2022 | 90 | 0,67% | 0,22% | 0,00% | 0,22% | EN EJECUCIÓN | 0 |
| Concreto 3000 psi pilotes | lunes, 20 de diciembre de 2021 | domingo, 3 de abril de 2022 | 104 | 2,49% | 1,15% | 0,79% | 0,36% | EN EJECUCIÓN | 0 |
| Solado de limpieza en concreto de 2500 PSI | lunes, 3 de enero de 2022 | domingo, 27 de marzo de 2022 | 83 | 0,10% | 0,05% | 0,00% | 0,05% | EN EJECUCIÓN | 0 |
| Acero de refuerzo 60000PSI | lunes, 6 de diciembre de 2021 | domingo, 10 de abril de 2022 | 125 | 5,72% | 2,97% | 1,26% | 1,71% | EN EJECUCIÓN | 0 |
| Suministro, colocación, vibrado y curado de concreto de 21 MPa, para anillos de Caissons de espesor promedio, e=0.12m incluye formaleta, según diseños | lunes, 6 de diciembre de 2021 | domingo, 27 de marzo de 2022 | 111 | 1,89% | 1,41% | 1,06% | 0,35% | EN EJECUCIÓN | 0 |
| Rediseños del proyecto (arquitectonicos, estructural e hidrosanitario, cada uno con sus respectivas memorias de calculo y firmados por los profesionales responsables de los mismos) | martes, 22 de febrero de 2022 | domingo, 27 de febrero de 2022 | 5 | 1,64% | 1,64% | 1,64% | 0,00% | FINALIZADO | 0 |
| PLANES | | | | 2,67% | 0,48% | 0,48% | 0,00% | EN EJECUCIÓN | 0 |
| TOTAL | | | | 16,82% | 9,08% | 6,11% | 2,97% | | |


| MINISTERIO DEL DEPORTE | PROCESO: | Versión: 1 |
|---|---|---|
| | APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA | CÓDIGO: ATC-FR-045 |
| | FORMATO: INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA | Fecha: 19/11/2021 |

| FECHA DE ENTREGA DEL INFORME | viernes, 18 de marzo de 2022 | MES No. | 2 | INFORME DEL | 13/01/2022 | AL | 17/01/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ESTADO DE LA PROGRAMACIÓN | | ACTIVIDADES QUE ESTÁN GENERANDO RETRASO Y MEDIDAS A TOMAR AL RESPECTO |
|---|---|---|
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 06 de junio de 2022 | La actividad que esta generando mayor retraso, sigue siendo el acero estructural para la cubierta metálica, debido a las mayores cantidades reportadas. Esto implica un desbalance representativo en el contrato y por tal motivo el contratista de obra decidió no realizar las compras de material ni su inicio de construccion hasta que el contrato no tenga los recursos suficientes aprobados. Por otra parte, la solución planteada a estos inconvenientes, fue la de rediseñar la estructura y redes hidrosanitarias que intervienen con la cimentación, por lo tanto el contrato de obra e interventoría fueron suspendidos y reiniciados el 22 de febrero del 2022, quedando pendiente el trámite administrativo de los recursos adicionales que conllevan las obras extras solicitadas para un cambio de obra No 2. |
| ADELANTO (DIAS): | N/A | |
| FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN: | 06 de junio de 2022 | |

| OBSERVACIONES: | Estas cantidades mayores en el item 4,3 del acero estructural provienen incialmente de un posible mal calculo de cantidades del proyecto. |
|---|---|
| | Debido a la suspensión del contrato de obra y las mayores cantidades, el cronograma deberá ser modificado para el cambio de obra No2 solicitado por el contratista de obra CONYSER S.A.S y avalado por la interventoría JASEN |
| | CONSULTORES S.A.S. |

## CURVA DE AVANCE

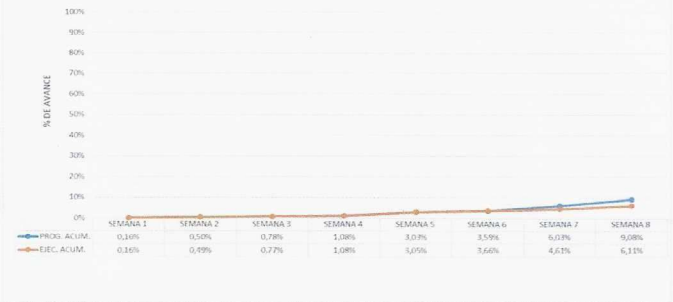


## 5. RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES POR COMPONENTE Y ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre el riesgo o la situación problemática identificada por cada uno de los siguientes componentes y describa las causas que estan originando dicha situación: a.Programación (cronograma de actividades), b. Calidad de los trabajos, c. Aspectos administrativos. d. Disponibilidad de los recursos, materiales e insumos. e. Ejecución Financiera del Contrato. f. Seguridad y Salud en el Trabajo con el reporte de los indicadores. g.Manejo ambiental con relación a su cumplimiento. h. Aspectos sociales. i.Aspecto Jurídico.

**a. CRONOGRAMA:** El cronograma de obra esta presentando atraso en el avance debido a la serie de inconvenientes anteriormente reportados, tales como: *mayores cantidades de acero estructural en los diseños versus las cantidades contractuales, lo cual implica que el contratista no haya dado inicio a esta actividad. Una vez adicionado los recursos solicitados por el contratista para el contrato de obra N° 341- 2021 quedará en firme la nueva programación con las obras extras reportadas en el balance de mayores y menores cantidades del cambio de obra N°2.
Cabe aclarar que la actividad del acero estructural es la que mayor porcentaje de ejecución representa en el proyecto siendo un 73,83% de este.

**b. CALIDAD DE LOS TRABAJOS:** Ninguno

**c. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:** Ninguno

**d. DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS, MATERIALES E INSUMOS:** El contratista de obra esta a la espera de la adición y prórroga solicitada para el contrato de obra, debido a que sin estos recursos solicitados para el contrato, no se puede realizar la compra de matriales para la estructura métalica, ya que como se enuncio anteriormente, esta representa la mayor parte de los recursos del proyecto.

**e. EJECUCIÓN FINANCIERA:** El flujo de caja del proyecto podría no cumplirse según la programación vigente, para lo cual, el contratista de obra cuenta con los recursos propios suficientes para la ejecución normal del mismo.

**f. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:**

| No. DE INCIDENTES: | 0 | No. ACCIDENTES: | 0 |
|---|---|---|---|

**FECHA Y REPORTE DE EVENTOS**
Durante el periodo no se presentaron incidentes ni accidentes

**g. ASPECTO AMBIENTAL:** Durante este periodo se cumple con los programas de manejo ambiental aplicables a las actividades ejecutadas en la construcción de caisson

**h. ASPECTO SOCIAL:** No se reportan novedades.

**i. ASPECTO JURÍDICO:** Se realizaron los trámites correspondientes para la suspensión N°001 del contrato de obra e interventoría debido a las mayores cantidades del acero estructural para la cubierta encontradas en el diseño actual respecto a las cantidades contratadas en el presupuesto vigente, de igual manera las redes hidrosanitarias y eléctricas que interceptan con el eje principal de la cimentación y los pilotes existentes hallados durante las excavaciones. El contrato de obra e interventoria reinició el 22 de febrero de 2022.

## 6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA O RIESGO.

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| REDISEÑOS ESTRUCTURALES E HIDROSANITARIOS QUE DAN ORIGEN AL CAMBIO DE OBRA No 2 SOLICITADO POR EL CONTRATISTA | CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORÍA, PLANEACIÓN | 4/02/2022 |
| DEBIDO A LAS MAYORES CANTIDADES ENCONTRADAS EN LOS DIFERENTES ITEMS ANTERIORMENTE ENUNCIADOS, POR PETICIÓN DEL CONTRATISTA DE OBRA, AVAL DE LA INTERVENTORÍA Y APROBACIÓN DEL ENTE CONTRATANTE DE OBRA, SE DIO LA CORRESPONDIENTE PRÓRROGA AL CONTRATO DE OBRA PARA EJECUTAR LAS CANTIDADES Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS, LO CUAL DESENCADENÓ UN PLAN DE CONTINGENCIA Y AJUSTE EN LA PROGRAMACIÓN. | CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORÍA, PLANEACIÓN PUERTO BERRIO | 9/03/2022 |

## 7. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoria.
La actividad identificada que representa mayores cantidades en el presupuesto, es el acero estructural para la cubierta.
Además de estas actividades, durante las excavaciones de los caissons, se identificaron pilotes existentes los cuales implican actividad no prevista de demolición de concreto.
Otra actividad no menos importante es la reposición de cardinal y losas de concreto del andén que tuvo que ser intervenido para las correspondientes excavaciones de las zapatas.

b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APUS por parte de la interventoría y del contratista.
Los APUS de las obras extras relacionadas en el balance de obra presentado para el cambio de obra 2, se encuentra en trámite de la alcaldía municipal, los mismo fueron anteriormente revisados y avalados por la interventoría.

c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas.
La alcaldía municipal esta realizando la consecusión de los recursos y extensión de CDP.

Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N/A (no aplica).

## 8. RECURSOS DE INTERVENTORÍA O CONSULTOR:

Relacionar todo el personal y recursos utilizados durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal y recursos efectivamente utilizados.

| ENSAYOS / ANÁLISIS / LABORATORIOS / EQUIPOS / OTROS | OBSERVACIONES / RESULTADO | PERSONAL DE INTERVENTORÍA | CARGO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| NINGUNO | N/A | NATHALIE GASTILLO | DIRECTORA INTERVENTORIA | 1 |
| | | LILIANA KARINA JÁUREGUI APARICIO | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | 1 |
| | | JAQUELINE MENA FAJARDO | RESIDENTE SST INTERVENTORIA | 1 |
| | | JORGE ALEXIS SANABRIA | TOPÓGRAFO | 1 |
| | | CESAR AUGUSTO RAMIREZ | ESP. ELECTRICO | 1 |
| | | LUIS ALEJANDRO GONZÁLEZ | ESP. HIDRÁULICO | 1 |
| | | HECTOR JULIO TRONCOSO | ABOGADO | 1 |
| | | JOSE URIEL VANEGAS | INSPECTOR SST | 1 |

**Nota: (Relacionar todo el personal y recursos utilizados durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal y recursos efectivamente utilizados. Adjuntar los debidos soportes para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).**

## 9. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR Y/O FIRMA DE CONSULTORIA:

El día 11 de marzo se gestionó ante la acaldía la solicitud de adición y prórroga realizada por el contratita de obra mediante el oficio JEG-341201-11/03/2022-011, siendo esta revisada y avalada por la interventoría. Es indispensable que los recursos solicitados sean dispuestos, para así evitar retrasos en las actividades que son ruta crítica.

**10. Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe mensual, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y/o actividades desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría, en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de marzo del 2022.**

Nathalie Castillo C.

FIRMA INTERVENTOR O CONSULTOR

NOMBRE: NATHALIE CASTILLO

CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

No. DE RADICADO DEL INFORME A LA ENTIDAD TERRITORIAL: 2022102130

FECHA DE RADICADO A LA ENTIDAD TERRITORIAL: (02/05/2022)

NOMBRE SUPERVISOR DESIGNADO POR EL E.T: Dr. Grevson Orrego Mosquera FIRMA:

CARGO SUPERVISOR DESIGNADO POR EL E.T.E.T: Secretario de Planeación e infraestructura

| | | |
|---|---|---|
| El deporte es de todos Mindeporte | PROCESO: APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA | Versión: 1 / Código: ATC-FR-045 |
| | FORMATO: INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA | Fecha: 19/11/2021 |

| | | |
|---|---|---|
| PUERTO BERRIO - BARRIO PUEBLO NUEVO | OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LA TRIBUNA PRINCIPAL DEL ESTADIO JORGE ELIECER GAITÁN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO. | |
| MES No. 2 | DE: 5,5 | CONTRATISTA INTERVENTORÍA: JASEN CONSULTORES S.A.S. |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24 de noviembre de 2021 | FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO: | 09 de mayo de 2022 |

## 10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Estado inicial de reinicio de obra, excavaciones saturadas. | Estado inicial de reinicio de obra, excavaciones saturadas. | Limpieza de material de excavación para el acondicionamiento de la zona a trabajar |
|  |  |  |
| Excavación manual en el eje 5. | Excavación manual en el eje 5. | Excavación manual en el eje 9. |
|  |  |  |
| Excavación mnaual eje 1 | Excavación mnaual eje 4 | Excavación mnaual eje 3 |
|  |  |  |
| Excavación manual en el eje 2. | Excavación manual en el eje 2. | Excavación mnaual eje 3 |


Liliana Jáuregui A.

FIRMA: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

| El deporte es de todos Mindeporte | PROCESO: APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA | Versión: 1 |
|---|---|---|
| | | Código: ATC-FR-045 |
| | FORMATO: INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA | Fecha: 19/11/2021 |

| PUERTO BERRIO - BARRIO PUEBLO NUEVO | OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LA TRIBUNA PRINCIPAL DEL ESTADIO JORGE ELIECER GAITÁN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO. | |
|---|---|---|
| MES No. 2 | DE: 5,5 | CONTRATISTA INTERVENTORÍA: JASEN CONSULTORES S.A.S. |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24 de noviembre de 2021 | FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO: | 09 de mayo de 2022 |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
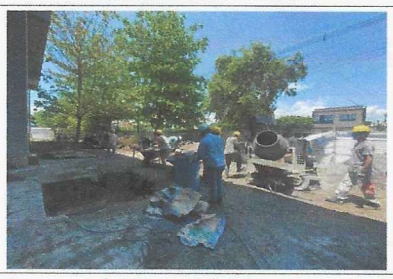
| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Excavación manual eje 5 | Anillos eje 5 | Excavación manual eje 5 |
|  |  |  |
| Armado de acero de refuerzo para caisson eje 9 | Excavación manual en el eje 7. | Excavación manual en el eje 7. |
|  |  |  |
| Fundición de anillos de protección eje 5D | Toma de cilindros 14 de marzo fundición caisson eje 9. | Toma de cilindros 14 de marzo fundición caisson eje 9. |
|  |  |  |
| Fundición caisson eje 9 - 14 de marzo. | Llegada de material triturado para la fundición de los caisson eje 1 y 2. | Acero de refuerzo para caisson eje 1. |
|  |  |  |
| Acero de refuerzo para caisson eje 2. | Fundición de anillos de protección eje 5D | Cilindros enviados para prueba de resistencia y rotura en laboratorio |

Liliana Jáuregui A.
FIRMA: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | |
|---|---|
| **No CONTRATO** | CCS-856-2021 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |
| **CONTRATANTE:** | MINISTERIO DEL DEPORTE |
| **CONTRATISTA:** | JASEN CONSULTORES S.A.S. |

Entre los suscritos **MARÍA ISABEL URRUTIA OCORO**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía **66.703.541**, en su condición de Ministra y Ordenador(a) del Gasto del Ministerio del Deporte, entidad identificada(a) con **NIT. 899.999.306-8**, de una parte; y por la otra, **NATHALIE CASTILLO CURIEUX,** identificado con cédula de ciudadanía No. 52.476.960, actuando en nombre y representación legal de **JASEN CONSULTORES S.A.S.,** identificada con **NIT.830.087.225-5,** quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente Acta de Suspensión No. 7, previa las siguientes:

**CONSIDERACIONES:**

**1.** La información general del Convenio, a la fecha es la siguiente:

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LA TRIBUNA PRINCIPAL DEL ESTADIO JORGE ELIECER GAITÁN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO. |
| **FECHA DE INICIO** | 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| **PLAZO INICIAL** | CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| **MODIFICACIÓN No. 1** | CINCO MESES (5) Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO. |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1** | DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 12 DE ENERO DE 2022 |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2** | DEL 18 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE ENERO DE 2022 |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3** | DEL 01 DE FEBRERO DE 2022 AL 21 DE FEBRERO DE 2022 |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 4** | DEL 22 DE MAYO DE 2022 AL 21 DE JUNIO DE 2022 |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 5** | DEL 31 DE MAYO DE 2022 HASTA EL 30 DE JUNIO 2022 |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 6** | DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022 |
| **MODIFICACIÓN No. 2** | SEIS (6) MESES Y TRECE (13) DÍAS CALENDARIO |
| **VALOR INICIAL** | CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y CINCO PESOS ($111.631.045 M/CTE). |
| **VALOR ADICIÓN** | N/A |
| **VALOR TOTAL** | $111.631.045 M/CTE |

**2.** Que el Supervisión del contrato solicita realizar la Suspensión y la Dirección de Recursos y Herramientas del SND avaló la solicitud de suspensión del Contrato de Consultoría **CCS-856-2021**, en los siguientes términos:

(…) *En mi condición de supervisor del contrato antes mencionado, de manera atenta solicito adelantar el trámite anteriormente señalado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:*

*CAUSAS QUE DAN LUGAR A LA SUSPENSIÓN*

*Mediante Oficio No. JASEN-PTOBERRIO-2021-071 del 16 de septiembre de 2022, el representante legal de JASEN CONSULTORES S.A.S. solicita a esta supervisión, la suspensión del contrato CCS-856-2021, argumentando entre otros, lo siguiente:*

*En atención al contrato de interventoría de la referencia celebrado, entre JASEN CONSULTORES S.A.S y el MINISTERIO DEL DEPORTE, cuyo objeto e: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LA TRIBUNA PRINCIPAL DEL ESTADIO JORGE ELIECER GAITÁN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO.", y de acuerdo a la comunicación de la alcaldía de Puerto Berrio del 14 de Septiembre de 2022 para la solicitud de suspensión del convenio N COID-1242-2020 por un plazo de tres (3) meses, y que de acuerdo a las justificaciones dadas y las cuales se relacionan a continuación:*

*- Los recursos económicos aportados de cofinanciación por parte del Ministerio del Deporte para la cofinanciación del proyecto fueron embargados.*

*- Que en reiteradas ocasiones los representantes de Ministerio del Deporte han solicitado la consignación y / o reintegro de los recursos económicos por parte del municipio de Puerto Berrío a la cuenta del convenio, para garantizar el pago de las obligaciones contraídas con la firma contratista de obra por la ejecución del convenio.*
*- Que la Administración Municipal adelanto y desarrolló las gestiones jurídicas necesarias y posibles para el desembargo de los recursos económicos por parte de la rama judicial, situación que no fue posible.*
*- Que hasta la fecha la Administración municipal ha adelantado las gestiones necesarias tendientes a recuperar los dineros embargados y / o retenidos del convenio por orden judicial, situación que es compleja y demorada, debido a que son varios los embargos que hay que superar.*
*- Que la Administración Municipal de Puerto Berrío ha mostrado toda su intención y voluntad de respaldar y culminar el compromiso adquirido con el Ministerio del Deporte, para la construcción de la cubierta del escenario deportivo.*
*- Debido la proximidad del cierre de la vigencia fiscal, no es fácil para el ente municipal la consecución total de los recursos económicos para ser reintegrados al convenio. Que esta situación podría afectar el normal y correcto desarrollo de las obras objeto del presente convenio.*

*Teniendo en cuenta lo anterior, esta interventoría aclara que de acuerdo acto legal por el H Tribunal Superior Antioquia, se ordenó el levantamiento de medidas cautelares el día 22 de Junio de 2022 y que por lo tanto se dejó sin efecto el auto proferido por el despacho el 29 de abril de 2022.*

*Así las cosas, en los diferentes comités operativos realizados entre ls partes del convenio, se han evidenciado los tramites que han sido adelantados por parte de la Alcaldía de Puerto Berrio con el propósito de levantar el embargo de la cuenta del convenio quedando pendiente el reintegro de los recursos que fueron retenidos a las cuentas del convenio.*

*Con lo anterior, se evidencia la necesidad de realizar la suspensión del convenio y por tanto se requiere la suspensión del contrato de obra y del contrato de interventoría por el mismo plazo solicitado por la Alcaldía, es decir tres (3) meses, por lo cual esta firma interventora JASEN CONSULTORES S.A.S., cordialmente solicita realizar la suspensión al contrato de interventoría desde el 23 de septiembre de 2022 y hasta el 22 de diciembre de 2022.*

*CONCEPTO DEL SUPERVISIOR*

*Que en virtud de la solicitud de suspensión del convenio No. 1242-2020 realizada por esta supervisión, y teniendo en cuenta que los contratos accesorios deben correr con la misma suerte del contrato principal, es menester realizar la suspensión al contrato de interventoría encargado de realizar el seguimiento al contrato de obra derivado del convenio 1242 de 2020.*

*Que el contrato de obra No. 341 de 2021, actualmente se encuentra vigente y será suspendido desde el 23 de septiembre igualmente, considerando que el Ente Ejecutor requiere de un tiempo prudencial para superar los hechos acaecidos con el embargo de sus cuentas.*

*Que teniendo en cuenta los compromisos adquiridos por el municipio se espera que a más tardar el día 22 de diciembre del presente año se superen los hechos que generaron la suspensión de la obra y se consiga realizar el cierre financiero para la correcta ejecución de la obra.*

*Que a la fecha el contrato de interventoría referido se encuentra VIGENTE.*

*Teniendo en cuenta lo anterior, es posible concluir que la presente suspensión procede, toda vez que no se cuenta con las herramientas que garantizan la continuidad y el debido cumplimiento del contrato, permitiendo la satisfacción de los fines del Estado, consagrados en el preámbulo, artículos 1 y 2 de la Constitución Política de Colombia, generando bienestar a la ciudadanía y desarrollo en las ciudades.*

*SOLICITUD*

*Así las cosas, en atención a las actuaciones que debe surtir el Ente Ejecutor para superar los riesgos en que se encuentra el desarrollo del proyecto por la desfinanciación de este, y dejando claridad que tanto el convenio 1242 de 2020 como el contrato de obra No. 341 de 2021 se suspenderán a partir del 23 de septiembre de 2022, nos permitimos solicitar:*

*1. Suspensión del contrato de interventoría No. CCS-856-2021 desde el 23 de septiembre de 2022 y hasta el 22 de diciembre de 2022, reiniciando actividades el día 23 de diciembre de 2022.*

*NOTA: Para efectos del contrato electrónico la fecha de terminación luego de pactada esta suspensión será el día 29 de diciembre de 2022.*

*Manifiesto que, durante el término de la presente suspensión solicitada, no se requiere adición de recursos para el Contrato ni genera erogación alguna para las partes, y se radica de mutuo acuerdo entre las partes, lo cual se evidencia en los soportes documentales adjuntos.*

*Una vez suscrita el acta de suspensión, el contratista presentara el certificado modificatorio de la garantía donde se extiende el plazo por el término de la suspensión.*

*Es de importancia mencionar que esta supervisión, corroboro la información mencionada por el Contratista y que los documentos entregados en la solicitud hacen parte de la solicitud de prórroga del Contrato de Interventoría. (…)"*

**3.** Que la presente suspensión no genera costos adicionales para MINDEPORTE y que el convenio se encuentra vigente.

**4.** Que las partes, atendiendo el principio de la autonomía de la voluntad consagrada en el artículo 1602 del Código Civil Colombiano, consideran pertinente realizar la suspensión del Contrato de Interventoría **CCS-856-2021**.

En virtud de lo anterior, las partes:

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Suspender temporalmente el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría **CCS-856-2020,** durante el periodo comprendido entre el **23 de septiembre al 22 de diciembre de 2022**, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la presenta Acta.

**SEGUNDO:** Considerando las fechas señaladas en la Cláusula Primera del presente documento, el Contrato de Interventoría **CCS-856-2021** se reiniciará automáticamente el **23 de diciembre de 2022**; no obstante, si las causas que generaron la necesidad de suspender el Contrato de Interventoría **CCS-856-2021** son superadas antes de la fecha pactada, se podrá reiniciar la ejecución del mismo, previo aval por parte de la Supervisor,

**TERCERO:** Teniendo en cuenta la presente suspensión del Contrato de Interventoría **CCS-856-2021**, la nueva fecha de terminación de este será el **29 de diciembre de 2022**, con base en el cálculo de los días faltantes por ejecutar al momento del reinicio.

**CUARTO:** Que los demás términos y condiciones del Contrato de Interventoría **CCS-856-2021**, no se modifican y continúan vigentes en lo que no sea contrario a la presente Acta.

| | | |
|---|---|---|
| Contratista: | Nathalie Castillo Curieux – Representante Legal | Se entiende suscrito electrónicamente en el SECOP II |
| Entidad contratante: | María Isabel Urrutia Ocoro – Ministra y Ordenadora del Gasto | Se entiende suscrito electrónicamente en el SECOP II |
| Revisó: | Fabio Alberto Alzate Carreño – Secretario General | Se entiende suscrito electrónicamente en el SECOP II |
| Revisó: | Javier Hernando Salinas Vargas – Asesor del Despacho | Se entiende suscrito electrónicamente en el SECOP II |
| Vo. Bo: | Natalia Moreno Murillo – Coordinadora GIT Contratación | Se entiende suscrito electrónicamente en el SECOP II |
| Revisó: | Ivette Marcela Londoño Tamayo – Contratista GIT Contratación | |
| Proyectó: | Lilian Puentes Báez – Profesional G.I.T. Contratación | Se entiende suscrito electrónicamente en el SECOP II |

**De:** planeacion puertoberrio-antioquia <planeacion@puertoberrio-antioquia.gov.co>
**Enviado:** Tuesday, November 22, 2022 5:23:51 PM
**Para:** Catherine Calderon Aguilar <cacalderon@mindeporte.gov.co>
**Asunto:** Aval Informe Auditorías

Cordial saludo: En mi condición de Supervisor del convenio, de manera atenta y respetuosa por medio del presente me permito manifestar que, SE AVALAN, los informes de la Interventoría presentados por parte de la Interventoría del contrato abajo relacionado de las Actas correspondientes de la 1 a la 5:

Contrato N° 341 del 23 de Septiembre del 2021

Objeto: Construcción de cubierta en la tribuna principal del estadio Jorge Eliecer Gaitán en el Municipio de Puerto Berrio Antioquia

--
Cordialmente,

**GREYSON ORREGO MOSQUERA**
Secretario de Despacho
Secretaría de Planeación e Infraestructura
