Interior

Al contestar cite Radicado 2025-3-003123-009402 Id: 503873
Folios: 1 Fecha: 06-03-2025 17:15:11
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: **SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

DE: **MARLENY RIVERA GALEANO**

Supervisor del Contrato No. 2219-22

ASUNTO: Radicación de informes de supervisión Contrato No. 2219-22- Meses: octubre, noviembre de 2024

Cordial saludo.

De manera atenta, me permito radicar los siguientes informes de supervisión correspondientes a meses de **OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2024,** los cuales detallan las actividades de supervisión realizadas en el marco del contrato celebrado.

Atentamente,

.

MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisor del Contrato No. 2219-22

Elaboró: Evert D Sánchez Puerta – Apoyo de supervisión SIES

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO No. 2319 DE 2022, ORITO- PUTUMAYO
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **OCTUBRE DE 2024**

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE ORITO		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	ORITO PUTUMAYO		
BENEFICIARIO:	ORITO PUTUMAYO		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 5.348.096.810
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 594.232.979
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$ 5.942.329.789
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/12/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	29/09/2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	MARLENY RIVERA GALEANO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	MARLENY RIVERA GALEANO	21/08/2024	A LA FECHA
	SERGIO ANDRÉS VEGA NOVOA	04/04/2024	20/08/2024
	MARLENY RIVERA GALEANO	10/01/2024	03/04/2024
	SERGIO ANDRÉS VEGA NOVOA	19/10/2023	09/01/2024
	EDGAR RICARDO CONZALEZ PATIÑO	26/09/2023	18/10/2023
	SERGIO ANDRES VEGA NOVOA	21/03/2023	25/09/2023
	NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR	28/12/2022	20/03/2023
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	EVERT D SANCHEZ PUERTA	07/10/2024	A LA FECHA
	WILMAR OCAMPO	16/05/2024	06/10/2024
	FAIVER RIVERA MONTES	1/02/2023	15/05/2024
	EDGAR MAURICIO SÁNCHEZ PITA	17-01-2023	31/01/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.169722	28/12/2022	$ 2.139.238.724
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.22922	28/12/2022	$3.208.858.086,00
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.2022001041	15/07/2022	$597.875.228,00
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 436-47-994000057465	28/12/2022	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	28/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA: 24/10/2023		FECHA: 16/12/2023
	SEGUNDA PRÓRROGA: 15/12/2023		FECHA: 26/12/2023
	TERCERA PRÓRROGA: 26/03/2024		FECHA: 26/09/2024
	SUSPENSIÓN 01: 26/12/2023		FECHA: 25/03/2024

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN: N/A	FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO: 19/03/2024	FECHA: 26/03/2024
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA: N/A	
	FECHA: DD/MM/AAAA: N/A	
	FECHA: DD/MM/AAAA: N/A	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 183.706.795,00	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 85.980.031,00	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A	
VALOR DE OBRA	$ 5.409.212.908,00	
VALOR INTERVENTORÍA	$263.430.055	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.	NO APLICA	28/12/2022	$ 2.139.238.724
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 40% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor	40%	20/11/2023	$1.337.024.203
UN TERCER DESEMBOLSO	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 70% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor.	70%	DD/MM/AAAA	$0
UN ÚLTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el interventor. B. Entrega al Ministerio del Interior de "Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON", debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$0
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$3.476.262.927
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

ESTADO CUENTA BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE 2024	
Saldo Inicial	$1.319.269.493,00
Rendimientos Financieros	$ 14.534,00
Cargos	$0,00
Saldo Final	$1.319.284.027,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*

436-47-994000057465	Cumplimiento	$ 1.188.465.957,80	27/12/2022	29/03/2025
	Calidad de servicio	N/A	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios & Diseños E Implementación***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. LP-SGM-004-2023	IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.		$ 5.592.919.703,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	**MYR CAPITAL GROUP S.A.S** NIT No. 900401345		Nombre del Representante Legal del Contratista **MAURICIO ANTONIO MENDEZ RADA** Cédula de Ciudadanía No. 79709715
Fecha de Acta de inicio del contrato	21/06/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	16/12/2023		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 5.592.919.703,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA		
PÓLIZA No.	66721		
FECHA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA INICIAL 27/04/2023 – VIGENCIA DE TERMINACION 31/10/2026		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. CM-SGM-011-2023	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (BPIN 2022863200004)		$ 349,497,800,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	**CONSORCIO JC-ORITO2023** NIT No. 901724272-2		Nombre del Representante Legal del Contratista **JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA** Cédula de Ciudadanía No. 76.305.303
Fecha de Acta de inicio del contrato	21/06/2023		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	16/12/2023		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 349,497,800,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
PÓLIZA No.	4144-101270732		

FECHA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA INICIAL 20/06/2023 - VIGENCIA DE TERMINACION 20/06/2028

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: MAYO 2024	SI	NO
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	X	
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$1.319.284.027,00	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		X

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PORCENTAJE DE AVANCE SEGÚN CRONOGRAMA	**85,00%**
% EJECUTADO DE OBRA	**40,35%**

EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO ***OCTUBRE 2024***

El porcentaje de avance del convenio:
Con base a la visita realizada por parte del ministerio del interior el 25 de octubre de 2024 al municipio de Orito, se pudo verificar que el avance es del 40,35% y el avance proyectado en el cronograma es del 85%, evidenciando un presunto atraso de 44,65%.

Estado Financiero Del Convenio:
Desembolso No. 1 $ 2.139.238.724 03/12/2022 Pagado
Desembolso No. 2 $ 1.337.024.203 28/02/2023 Pagado

Estado de avance Técnico:

El convenio actualmente tiene contrato interventoría el cual inicio el 17 de septiembre de 2024, pero al momento de la vista no se aprecia adelanto de trabajos en externos en calle ni en el CCM, el avance avalado es el mimo de la vista hecha por el ministerio del interior el día 16 de mayo de 2024.

Anexos y Evidencias

- *Acta de visita del 25 de octubre de 2024.*
- *Acta de reunión del 04 de octubre de 2024.*
- *Acta de reunión del 10 de octubre de 2024.*
- *Acta de visita del 25 de octubre de 2024.*
- *Acta de reunión del 31 de octubre de 2024.*
- *INFORME FINANCIERO OCTUBRE 2024*

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

16/05/2024	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

MARLENY RUIVERA GALEANO Supervisor Convenio No. 2319 de 2022 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana- FONSECON	**EVERT D SANCHEZ PUERTA** Apoyo a la supervisión Convenio No. 2319 de 2022 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana - FONSECON

CONVENIO 2319 DE 2022

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACION PARA LA ADQUISICION E ISTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDADEN EL MUNICIPIO DE ORITO (PUTUMAYO).

INFORME FINANCIERO DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO

PROYECTO (S):

185-2023 IMPLEMENTACION DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
292-2023 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CUENTA (AHORROS) No.: 001302210200152945 DEL BANCO: BBVA

VALOR CONVENIO			**$ 5.942.329.789,00**
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			**$ 5.348.096.810,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO			$ 594.232.979,00
	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	29/12/2022	GIRO 1	$ 2.139.238.724,00
	28/02/2024	GIRO 2	$ 1.337.024.203,00
		GIRO 3	$ 0,00
		GIRO 4	$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 3.476.262.927,00**
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 001302210200152945 A LA FECHA (31/10/2024)			**$ 3.476.262.927,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
185-2023	M&R CAPITAL GROUP S.A.S	$ 5.592.919.703,00	$ 0,00	$ 5.592.919.703,00
292/2023	CONSORCIO JC-ORITO2023	$ 349.407.800,00	$ 0,00	$ 349.407.800,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 5.942.327.503,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
185-2023	Pago Total Estudios y Diseños contrato No. 185-2023	2023001050	2023001049	31/08/2023	$ 160.781.995,00	$ 0,00	$ 160.781.995,00
185-2023	Idustria y comercio contrato 185-2023	2023001050	2023000845	31/08/2023	$ 1.543.800,00	$ 0,00	$ 1.543.800,00
185-2023	pago parcial 1 contrato No. 185-2023	2023001106	2023001106	13/09/2023	$ 1.859.975.546,00	$ 0,00	$ 1.859.975.546,00
185-2023	pago retencion en la fuente e iva CO 2023001049 y 2023001106		2023000042	27/11/2023	$ 119.544.300,00	$ 0,00	$ 119.544.300,00
		2023001106	2024000406	3/05/2024	$ 18.348.300,00		$ 18.348.300,00
							$ 0,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 2.160.193.941,00**	**$ 0,00**	**$ 2.160.193.941,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
29/12/2022	$ 35.131,00
31/01/2023	$ 363.047,00
28/02/2023	$ 327.963,00
31/03/2023	$ 391.036,00
30/04/2023	$ 351.505,00
31/05/2023	$ 363.282,00
30/06/2023	$ 351.624,00
31/07/2023	$ 363.467,00
31/08/2023	$ 363.403,00
30/09/2023	$ 152.103,00
31/10/2023	$ 20.362,00
30/11/2023	$ 17.077,00
31/12/2023	$ 5,00
31/01/2024	$ 34.445,00
29/02/2024	$ 14.606,00
31/03/2024	$ 35.204,00
30/04/2024	$ 14.250,00
31/05/2024	$ 14.583,00
30/06/2024	$ 13.723,00
31/07/2024	$ 14.140,00
31/08/2024	$ 14.346,00
30/09/2024	$ 14.066,00
31/10/2024	$ 14.534,00
TOTAL (3)	**$ 3.283.902,00**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 3.476.262.927,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 2.160.193.941,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 3.283.902,00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 3.283.902,00**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 1.319.352.888,00**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER
(INFORME FINAL)

OBSERVACIONES

la diferencia entre informe y auxiliar de bancos se debe a: comision meses de dic/2022 y enero, febrero, marzo, septiembre de 2023 por valor de $68,861,00, se hace devolucion del valor del embargo $34.037.476,00,quedando un saldo final en auxiliar de bancos $1.319.284.027,00

FIRMA

YASMANY DUVAN PEREZ RAMIREZ
TESORERO MUNICIPIO

* SE ADJUNTAN COPIAS DE EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES

MUNICIPIO DE ORITO .

.

CLL 8 # 9 A-13 ALCALDIA MUNICIPAL ORITO .
ORITO PUTUMAYO- COLOMBIA

1119 759 Oficina: 0221

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

¿Sabías que tu Tarjeta Débito BBVA tiene fecha de vencimiento? Verifica la fecha en el frente de tu tarjeta. Si está próxima a vencer, acércate a una oficina BBVA y realiza el cambio sin costo. Sigue disfrutando de sus beneficios

Información de la oficina

AGENCIA ORITO

DIRECCIÓN: CARRERA 8 10 - 129

TELEFONO: 00984229263

PERIODO DESDE: 01-10-2024 HASTA: 31-10-2024

Información de la cuenta

Número de cuenta	001302210200152945
Fecha de corte	31-10-2024
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		1,319,269,493.00	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	22	14,534.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL	1,319,284,027.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
	31-10-2024	31-10-2024	ABONO INTERESES GANADOS		14,534.00	1,319,284,027.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono:3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisoriafiscalgrupoBBVA@co.ey.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Productos protegidos por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

MUNICIPIO DE ORITO
NIT: 800102896-2

AUXILIAR DE BANCOS

Entre 01 - oct - 2024 y 31 - oct - 2024

Cuenta: 1110060229 **B.bbva 200152945 convenio 2319 2022 cámaras de seguridad** **SALDO INICIAL: 1.319.269.493,00**

NUMERO	TMC	FECHA	No CHEQUE	DESCRIPCION COMPROBANTE	NIT	NOMBRE TERCERO	CUPON	DEBITO	CREDITO	SALDO
2024000427	NDB	31/10/2024	ND	2945 INTERESES MES DE OCTUBRE DE 00122	860003020-1	BANCO BBVA	0,00	14.534,00	0,00	1.319.284.027,00
							1.319.269.493,00	**14.534,00**	**0,00**	**1.319.284.027,00**

Interior	**FORMATO** **ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL** **ANEXO 7**	**Código: GC-P3-F7** **Versión: 2** **Vigente desde: 17/12/2018**

ACTA No.	Reunión Virtual
FECHA	04/10/2024
CIUDAD	BOGOTA D.C.
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2319 -2022
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE ORITO.".
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	40,35 %
MOTIVO:	Reunión Seguimiento a implementación de Estudios y Diseños

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

EL DIA 28/12/2022 SE SUSCRIBE EL CONTRATO No. 2319-22
EL DIA 28/12/2022 SE FIRMA EL ACTA DE INICIO
VALOR DEL CONTRAO $5.942.329.789

DESARROLLO DE LA REUNION

Reunión de Seguimiento Contrato No. 2319 - 2022

ORDEN DEL DIA

En la mesa trabajo se trataron los siguientes temas:

1. Presentación de los asistentes a la mesa de trabajo, que integran el grupo de supervisión y apoyo a la supervisión; del contrato, así como el gerente de proyecto designado por el contratista.

2. El municipio realiza seguimiento a los procesos de implementación de Estudios y Diseños y su correspondiente interventoría, en el que se establecieron actividades para cumplir con la ejecución del convenio:

   A la fecha presenta un avance del 40,35 % en la implementación de los estudios y diseños.

3. Se realiza reunión de seguimiento semanal para determinar el avance en la implementación de estudios y diseños

MINISTERIO DEL INTERIOR
- Marleny Rivera Galeano – Supervisor
- Faiver Rivera Montes - Apoyo a la Supervisión
- Evert D Sánchez Puerta - Apoyo a la Supervisión

MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO
- Alejandra Escobar – Supervisor Municipio.

CONTRATISTA DE LA IMPLEMENTACION
- Elisabeth Castillo Aguirre

INTERVENTORIA
- Oscar Hernando Motta Valencia – Interventoría

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 2319 de 2022: 31/12/2024

1. El municipio, contratista de la obra e Interventoría realiza seguimiento a la ejecución de la implementación de Estudios y Diseños y su correspondiente interventoría, se expone por parte de la M&R CAPITAL GROUP, las obras realizadas durante la semana:

   - Reinicio de actividades, se procede a realizar inventario de equipos existentes.

2. A la fecha 04 de octubre de 2024 el municipio de Orito, contratista de la obra e Interventoría exponen un avance del 40,35% en la implementación ejecución de los estudios y diseños.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO – INTERVENTORIA - CONTRATISTA	• Entrega de Inventario de todos los equipos en bodega.	04/10/2024
MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO	• Ajustar el cronograma del plan de choque.	07/10/2024

MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO	• Estudio de mercado de los registros o caja en concreto.	09/10/2024
MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO	• Permiso para el nuevo CCM con la nueva ampliación.	09/10/2024
MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO	• Subir la Pólizas de la prórroga IV para su aprobación en el SECOP II.	09/10/2024
MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO	• Aportar las prórrogas de los contratos derivados de interventoría e Implementación con sus respectivas aprobación de pólizas.	09/10/2024
MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO – INTERVENTORIA - CONTRATISTA	• Inventario de todos los elementos hurtados en planta externa y órdenes de compra de dicho elementos.	09/10/2024

FIRMA	
Nombre y firma: Marleny Rivera Galeano Cargo: Supervisor convenio 2319-2022	**Nombre y firma: • Evert D Sánchez Puerta** Cargo: Apoyo a la Supervisión convenio 2319-2022

Interior	**FORMATO** **ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL** **ANEXO 7**	**Código: GC-P3-F7** **Versión: 2** **Vigente desde: 17/12/2018**

ACTA No.	Reunión Virtual
FECHA	10/10/2024
CIUDAD	BOGOTA D.C.
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2319 -2022
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE ORITO.".
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	40,35 %
MOTIVO:	Reunión Seguimiento a implementación de Estudios y Diseños

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

EL DIA 28/12/2022 SE SUSCRIBE EL CONTRATO No. 2319-22
EL DIA 28/12/2022 SE FIRMA EL ACTA DE INICIO
VALOR DEL CONTRAO $5.942.329.789

DESARROLLO DE LA REUNION

Reunión de Seguimiento Contrato No. 2319 - 2022

ORDEN DEL DIA

En la mesa trabajo se trataron los siguientes temas:

1. Presentación de los asistentes a la mesa de trabajo, que integran el grupo de supervisión y apoyo a la supervisión; del contrato, así como el gerente de proyecto designado por el contratista.

2. El municipio realiza seguimiento a los procesos de implementación de Estudios y Diseños y su correspondiente interventoría, en el que se establecieron actividades para cumplir con la ejecución del convenio:

   A la fecha presenta un avance del 40,35 % en la implementación de los estudios y diseños.

3. Se realiza reunión de seguimiento semanal para determinar el avance en la implementación de estudios y diseños

MINISTERIO DEL INTERIOR
- Marleny Rivera Galeano – Supervisor
- Evert D Sánchez Puerta - Apoyo a la Supervisión

MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO
- Alejandra Escobar – Supervisor Municipio.

CONTRATISTA DE LA IMPLEMENTACION
- Elisabeth Castillo Aguirre

INTERVENTORIA
- Oscar Hernando Motta Valencia – Interventoría

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 2319 de 2022: 31/12/2024

1. El municipio, contratista de la obra e Interventoría realiza seguimiento a la ejecución de la implementación de Estudios y Diseños y su correspondiente interventoría, se expone por parte de la M&R CAPITAL GROUP, las obras realizadas durante la semana:

   - Reinicio de actividades, se procede a realizar inventario de equipos existentes.

2. A la fecha 11 de octubre de 2024 el municipio de Orito, contratista de la obra e Interventoría exponen un avance del 40,35% en la implementación ejecución de los estudios y diseños.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
CONTRATISTA DE IMPLEMENTACION	• Soporte del pago de las pólizas de la prórroga del contrato con el municipio de Orito.	10/10/2024
CONTRATISTA DE IMPLEMENTACION	• Entrega de pólizas de la prorroga al Municipio de Orito.	11/10/2024

MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO – INTERVENTORIA - CONTRATISTA	• Cronograma del plan de choque actualizando la fecha de inicio.	16/10/2024
MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO	• Sigue pendiente el permiso para el nuevo CCM con la nueva ampliación.	18/10/2024
MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO	• Sigue pendiente estudio de mercado para la cajas proyectadas e instaladas.	18/10/2024

FIRMA	
Nombre y firma: Marleny Rivera Galeano Cargo: Supervisor convenio 2319-2022	**Nombre y firma: Evert D Sánchez Puerta** Cargo: Apoyo a la Supervisión convenio 2319-2022

MUNICIPIO:	ORITO - PUTUMAYO	**No. CONVENIO:**	**2319-22**
FECHA DE ACTA INICIO:	**28/12/2022**	**FECHA DE TERMINACIÓN DE CONVENIO:**	**26/09/2024**
ELABORÓ:	**EVERT D SANCHEZ PUERTA**	**FECHA DE VISITA:**	**24 de octubre de 2024**
TIPO DE PROYECTO:	**CCTV -SIES PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO ORITO – PUTUMAYO**		

ASISTENTES			
No.	**NOMBRE**	**CARGO**	**REPRESENTA A**
1	EVERT D SANCHEZ PUERTA	APOYO A LA SUPERVISIÓN	MINISTERIO DEL INTERIOR
2	ORLANDO MORIANO	ALCALDE (E)	MUNICIPIO DE ORITO
3	DARWIN MENESES	SECRETARIO DE GOBIERNO/SUPERVISOR	MUNICIPIO DE ORITO
4	MARLON STEVEN SAMBONI	APOYO JURIDICO Y CONTRATACION	MUNICIPIO DE ORITO
5	DANIELA ALEJANDRA ESCOBAR	APOYO JURIDICO SECRETARIA DE GOBIERNO	MUNICIPIO DE ORITO
6	MARIA ELIZABETH CASTILLO AGUIRRE	GERENTE M&R CAPITAL GROUP	CONTRATISTA DE IMPLEMENTACION
8	MAURICIO ANTONIO MENDEZ	GERENTE SEGURIDAD M&R CAPITAL GROUP	CONTRATISTA DE IMPLEMENTACION
9	OSCAR HERNANDO MOTTA VALENCIA	DIRECTOR DE PROYECTOS INTERVENTORIA	VIRTUAL DESK S.A INTERVENTORIA
10	JERSON HERAZO BELTRAN	APOYO INTERVENTORIA	VIRTUAL DESK S.A INTERVENTORIA

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN: Dirección: Calle 8 # 12-38 Barrio Marco Fidel Suarez - Palacio Municipal, Orito – Putumayo.

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

No. contrato	Nombre del contratista	Fecha de inicio	Fecha de terminación
Contrato No. LP-SGM-004-2023 ESTUDIOS DISEÑOS E IMPLEMENTACION	**M&R CAPITAL GROUP S.A.S Representante Legal MAURICIO MENDEZ RADA**	**21/06/2023**	**26/09/2024**
Contrato No. CM-SGM-011-2023 INTERVENTORIA	**CONSORCIO JC-ORITO2023 Representante Legal JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA**	**21/06/2023**	**16/12/2023**

CUADRO FINANCIERO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

INGRESOS CORTE 24/10/2024		
FECHA	**VALOR**	**CONCEPTO**
29/12/2022	$ 2,139,238,724.00	ABONO DOMI PRIMER DESEMBOLSO MINISTERIO DEL INTERIOR
28/02/2024	$ 1,337,024,203.00	ABONO DOMI SEGUNDO DESEMSOLSO MINISTERIO DEL INTERIOR
TOTAL	**$ 3,476,262,927.00**	

El total de los abonos realizados por el Ministerio del interior son $ 3.476.262.927,00.

EGRESOS CORTE 24/10/2024				
FECHA	**VALOR**	**EGRESO**	**Orden de pago**	**OBJETO DE PAGO**

31/08/2023	$ 160.781.995	2023001049	2023001050	Pago total de estudios y diseños del contrato No. 185 de 2023
31/08/2023	$ 1.545.800	2023000845	2023001050	Industria y comercio del contrato No. 185 de 2023
13/09/2023	$1.859.975.546	2023001106	2023001106	Pago parcial No. 1 contrato No. 185 de 2023
27/11/2023	$119.544.300	2023000042		Pago de retención y la fuente del comprobante de egreso 2023001049 - 2023001106
03/05/2024	$ 18.348.300	2024000406	2023001106	
TOTAL	$ 2.160.193.941			

Total, Pagado a (DOMI 800102896) Contrato suministro $ 2.160.193.941,00

SALDO CUENTA 001302210200152945 CORTE 30/09/2024 -- $ 1.319.269.493

Estudios Diseños y Obra:

MYR CAPITAL GROUP S.A.S
Contrato: 0185-2023
Proceso: LP-SGM-004-2023
Valor: $ 5.592.919.703,00
Vigencia: 21/06/2023 a 13/12/2024

A la fecha se tiene un total pagado al contratista de $ 2.160.193.941,00 correspondiente al 38,62%. Se tiene pendiente el 61,38% correspondiente a $ 3.432.725.762,00

NOTA: SE DEBEN ADJUNTAR LOS RESPECTIVOS SOPORTES, ES DECIR, COMPROBANTES DE EGRESO, ORDENES DE PAGO Y EXTRACTOS BANCARIOS.

DESARROLLO DE LA VISITA

ANTECEDENTES

Estado del Convenio: Ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 de acuerdo con la cuarta prórroga del convenio 2319-2022 suscrita el 26 de septiembre de 2024.

MESA DE TRABAJO

En desarrollo de la visita realizada el 24 de octubre de 2024 al municipio de Orito-Putumayo como propósito de realizar seguimiento al convenio 2319-2022.

Para la jornada se solicitan los siguientes documentos:

Facturas con anexos, pagadas al contratista de implementación.
Facturas con anexos, pagadas al contratista de Interventoría.
Plan de amortización del anticipo.
Plano KMZ – Físico
Cantidades acumuladas a la fecha, avaladas por la interventoría.
Ultimo informe de interventoría septiembre 2024.
Acta de liquidación del contrato de interventoría.

Intervención por parte del municipio:

Municipio manifiesta que no se realizó empalme de manera satisfactoria con la administración anterior. El contrato de interventoría inicio 17 de septiembre de 2024

ESTADO DE CONTRATOS DERIVADOS

PRIMER CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1. Se aperturó un proceso de incumplimiento al primer contrato de interventoría. Tuvo dos (2) audiencias de incumplimiento, pero no se realizó ni efectuó alguna multa.

2. Liquidado bilateralmente en diciembre 2023.

CONTRATO DE IMPLEMENTACIÓN

- Se reanudó por defecto el contrato de implementación el 15 de mayo 2024. Pero sin interventoria.

Según reporte de contratista se cuenta con los siguinetes componentes instalados:

Cámaras instaladas: 13
UPS: 18

Switch tipo 1: 0
Brazos: 19
Coronas:13
Gabinetes: 30
Fibra óptica: 24.000 sin fusionar ni empalmar

Y En bodega los siguientes:

Cámaras: 45
UPS: 34
Brazos: 43
Coronas:49
Gabinetes: 31

COMPONENTE TECNICO:

Se realizó cambio en el lugar para ubicar el centro de control y monitoreo. Por parte del ministerio se solicita la trazabilidad de dicho cambio, pero el contratista no la aporta en el momento de la visita. Además, no se aporta por parte del contratista los planos del nuevo CCM. El contratista e interventoría no tiene proyectados las modificaciones al presupuesto referente al cambio de sitio del CCM.

Se debe realizar una revisión de las condiciones mínimas requeridas para la locación, se solicita el acta de aprobación de Policía, interventoría, supervisión y demás involucrados en el proyecto.

CRONOGRAMA

Según el cronograma de la reanudación y prórroga, el convenio debería estar ejecutado como mínimo en un 70% con corte a la segunda semana de mayo 2024. A la fecha de la visita 24 de octubre de 2024 toda la ejecución sigue igual no ha tenido avance motivo por el cual el avance a la fecha se considera el estipulado en la visita del 16 de mayo de 2024 40,35%. La nueva interventoría manifiesta no tiene conocimiento del avance de la ejecución del proyecto.

RECORRIDO

De acuerdo con el recorrido realizado y a la visita a 5 puntos de Cámara y a las Bodegas del contratista se evidenció lo siguiente:

Punto de cámara 61, se evidencia corona antiescalatoria, brazo y cámara, gabinete, la caja del poste de cámaras no corresponde con el diseño presentado el cual está en plano con medidas 54x74x80 cms medidas bordes internos y la implementada es de 45x45 cms medidas en bordes internos, la profundidad de la caja tiene 52 cm. Las cajas en los postes auxiliares no corresponden con el diseño presentado el cual está en plano con medidas 40x40 cms medidas en bordes internos y la implementada fue de 30x30 cms. El punto de cámara no cuenta varilla de puesta a tierra, no tiene anillo inferior, ni bajante de puesta a tierra del gabinete en poste. Además, no cuenta con cableado eléctrico ni cableado de fibra.

Punto de cámara 40, se evidencia corona antiescalatoria, brazo y cámara, gabinete, la caja del poste de camaras no corresponde con el diseño presentado el cual está en plano con medidas 54x74x80 cms medidas bordes internos y la implementada es de 45x45 cms medidas en bordes internos, la profundidad de la varilla fue de 29 cms. Las cajas en los postes auxiliares no corresponden con el diseño presentado el cual está en plano con medidas 34x34 cms medidas en bordes internos y la implementada fue de 30x30 cms, El punto de cámara cuenta varilla de puesta a tierra sin soldadura exotérmica, tiene anillo inferior sin soldadura, ni bajante de puesta a tierra del gabinete en poste. Además, no cuenta con cableado eléctrico ni cableado de fibra. No cumple con la norma RETIE 2013, ni con la nueva actualización del RETIE 40117 del 02 de abril de 2024.

Punto de cámara 39, se evidencia corona antiescalatoria, brazo y cámara, gabinete, la caja del poste de cámaras no corresponde con el diseño presentado el cual está en plano con medidas 54x74x80 cms medidas bordes internos y la implementada es de 45x45 cms medidas en bordes internos, la profundidad de la caja tiene 50 cm. Las cajas en los postes auxiliares no corresponden con el diseño presentado el cual está en plano con medidas 40x40 cms medidas en bordes internos y la implementada fue de 30x30 cms. El punto de cámara no cuenta varilla de puesta a tierra, no tiene anillo inferior, ni bajante de puesta a tierra del gabinete en poste. Además, no cuenta con cableado eléctrico ni cableado de fibra.

Punto de cámara 55, se evidencia corona antiescalatoria, brazo y cámara, gabinete, la caja del poste de cámaras no corresponde con el diseño presentado el cual está en plano con medidas 54x74x80 cms medidas bordes internos y la implementada es de 45x45 cms medidas en bordes internos, la profundidad de la caja tiene 46 cm. Las cajas en los postes auxiliares no corresponden con el diseño presentado el cual está en plano con medidas 40x40 cms medidas en bordes internos y la implementada fue de 30x30 cms. El punto de cámara no cuenta varilla de puesta a tierra, no tiene anillo inferior, ni bajante de puesta a tierra del gabinete en poste. Además, no cuenta con cableado eléctrico ni cableado de fibra.

Punto de cámara 03, se evidencia corona antiescalatoria, brazo y cámara, gabinete, la caja del poste de cámaras no corresponde con el diseño presentado el cual está en plano con medidas 54x74x80 cms medidas bordes internos y la implementada es de 45x45 cms medidas en bordes internos, la profundidad de la caja tiene 50 cm. Las cajas en los postes auxiliares no corresponden con el diseño presentado el cual está en plano con medidas 40x40 cms medidas en bordes internos y la implementada fue de 30x30 cms. El punto de cámara no cuenta varilla de puesta a tierra, no tiene anillo inferior, ni bajante de puesta a tierra del gabinete en poste. Además, no cuenta con cableado eléctrico ni cableado de fibra.

En la visita a las bodegas del contratista se contaron los elementos que allí se encontraban y se evidencio lo siguiente:

Cámaras PTZ: 45 Cámaras en bodegas, 13 instaladas, para un total de 58 de 62, hacen falta4 cámaras.

Coronas antiescalatorias: 42 coronas en bodega, 13 instaladas, para un total de 44 de 62, hacen falta18.

Brazos de cámaras: 47 en Bodega y 15 instalados, para un total de 62.

Switch tipo 1: no se encuentran en las bodegas del Municipio de Orito.

UPS: 34 en bodega, para un total de 34 de 62, hacen falta 28.

Gabinetes de Puntos de Cámara: 31 gabinetes en Bodega, 13 instaladas, para un total de 44 de 62, hacen falta 18.

Adicionalmente, se cuentan en el CCM con las 6 pantallas de visualización sin instalar.

De acuerdo a lo evidenciado en la visita a los puntos de cámara mencionados anteriormente, se constató que las medidas de las cajas implementadas son 45x45 cms bordes internos y las aprobadas en estudios y diseños son de 54x74x80 bordes internos, No se evidencia en sitio los siguientes elementos: 62 switches tipo 1, elementos del KIT CAI (dos cámaras fijas, UPS, Switch y gabinete) , servidores, sillas ergonómicas que cumplan con la especificación técnica, puestos de trabajo, pantallas de operador. Sistema de visualización, sistema de apertura con acceso facial.

A continuación se relaciona la revisión de los ítems correspondientes a las obras civiles realizadas en el centro de control y monitoreo (CCM), que fueron motivo de observación por parte de la supervisión del Ministerio del Interior:

De acuerdo con lo evidenciado y corroborado en la visita al Centro de Control y monitoreo, en primera instancia cabe recalcar que el lugar donde se implementaría el CCM fue cambiado y no corresponde la presentado ni en viabilidad ni en los Estudios y diseños, a lo anterior, se tenía estipulado un valor de $89.419.315. A la fecha de la visita no se tiene planos ni cuantificado los cambios necesarios para la obra civil y el valor de componte eléctrico. Además del espacio solicitado con el cambio, se solicitó por parte del contratista una nueva ampliación adicional la cuarto eléctrico solicitado por segunda vez. El ministerio le solicito al contratista la trazabilidad para dichos cambios y no ha sido suministrada.

Se aprecia los siguientes ítems en los APU eléctricos:

No.	*SISTEMA ELÉCTRICO CCM*	*VALOR ANTES DE IVA*	*VALOR CON IVA*
ELOR3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA CCM	$ 4.947.488,00	$ 5.887.510,72
ELOR10	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA BYPASS	$ 1.865.242,00	$ 2.219.637,98
		$ 6.812.730,00	$ 8.107.148,70
	AIU 20%	$ 817.527,60	
	SUBTOTAL	$ 7.630.257,60	
	IVA 19%	$ 1.294.418,70	
	TOTAL	$ 8.924.676,30	

El ítem ELOR3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA CCM, de acuerdo con las especificaciones técnicas este ítem está incluido en ítem del PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO.

El ítem ELOR10 SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA BYPASS, de acuerdo con las especificaciones técnicas este ítem está incluido en ítem de la UPS.

Se aprecia los siguientes ítems en los APU CIVILES no deben de ser pagados por estar incluidos en el valor de la planta eléctrica según lo estipulado en las especificaciones técnicas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	**PISOS**	**GL**			
10,2	PLACA EN CONCRETO PARA PLANTA ELÉCTRICA	M3	2,7520	$ 148.468,79	$ 408.586,11
11	**CERRAMIENTO**				
11,1	CERRAMIENTO PLANTA ELÉCTRICA	M2	38,3400	$ 66.352,22	$ 2.543.944,11
11,2	CUBIERTA PLANTA ELÉCTRICA	M2	13,7600	$ 62.608,16	$ 861.488,31
11,3	PARALES METÁLICOS	ML	60,0000	$ 23.403,04	$ 1.404.182,34
	TOTAL CERRAMIENTO				**$ 5.218.200,87**
	COSTO DIRECTO				**$ 5.218.200,87**
		ADMINISTRACION		20%	$ 1.043.640,17
		IMPREVISTOS		3%	$ 156.546,03
		UTILIDAD		7%	$ 365.274,06
	COSTOS INDIRECTOS				**$ 1.565.460,26**
	COSTO TOTAL				**$ 6.783.661,13**

Nota: En el presupuesto de los APUs eléctricos se aplicar el IVA del 19% al COSTO DIRECTO, solamente se debe aplicar IVA a los materiales. Motivo por el cual se debe ajustar dichos APUs y el presupuesto.

OBSERVACIONES:

1. Para la fecha de la visita por parte del Ministerio del Interior, la supervisión está en revisión del informe de la interventoría por lo tanto no se tiene un avance proyectado aprobado por la supervisión.

2. Es de anotar que la interventoría inicio contrato el 17 de septiembre de 2024, se prorrogo el convenio 2319 el día 26 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2024 al igual que el contrato derivado de la implementación para la misma fecha. El 24 de octubre se realiza visita al municipio de Orito por parte del Ministerio del interior, no se encontró ningún avance de obras en el CCM ni en calles. No se aprecia trabajadores adelantado ninguna labor. Se puede afirmar que desde la ultima visita del realizada por el ministerio del interior no se ha tenido ningún avance significativo. Motivo por el cual se estima que el avance el mismo avance estimado para la visita del 16 de mayo del 2024, el cual fue de 40,35 %

3. Se sugiere realizar replanteo de la ubicación de los elementos que hacen parte del CCM, toda vez que se evidencia que no hay planos, ni autorización para demoler una pared.

CONCEPTO DEL APOYO A LA SUPERVISION

En la visita por parte del ministerio del interior no se encontró personal en campo trabajando, motivo por el cual no se puede asegurar avance el proyecto mas del estimado en mayo del 2024.

CIERRE DE LA INSPECCIÓN




Se fijan compromisos entre las partes.

Documentos entregados en la visita (En caso de recibir documentación en la visita)

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	**ACCIONES**	**FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO**
Municipio / Implementado	Remitir soporte o documentación referente a la aprobación del cambio de sitio para la adecuación del CCM, con la trazabilidad del dicho cambio.	28/10/2024
Municipio	Aprobación del plan de choque.	25/10/2024
Municipio	Entrega el Informes de supervisión del mes de septiembre respectivos soportes (Informe de Interventoría, informe financiero, extractos bancarios. etc)	24/10/2024
Municipio/ Implementador/interventoría	Actualización de APUs eléctricos y civiles con los nuevos cambios del CCM.	28/10/2024

Implementador	Envío KMZ para validar avance de la instalación de la fibra óptica	30/10/2024
Implementador / Alcaldía	Revisar la totalidad de los equipos en la bodega del contratista y entregar reporte del porcentaje total de equipos disponibles en sitio con un listado de los seriales.	05/11/2024
Implementador	Diseño y planos de las cajas o registros instaladas	28/10/2024
Municipio	Estudio de mercado de las cajas instaladas y las cajas proyectadas en la estudios y diseños.	12/11/2024
Implementador	Entréga de documentación donde se pueda validar la aprobación de la ubicación del CCM en la estación de policía y también donde se evidencie que las medidas y espacios disponibles cumplen con la norma SST (planos)	28/10/2024

REGISTRO FOTOGRÁFICO (Ver anexo 1- parte integral de esta acta)

FIRMA DE ASISTENTES	
Por parte de: ***MINISTERIO DEL INTERIOR***  **Nombre y firma: EVERT D SANCHEZ PUERTA** Cargo: Apoyo a supervisión 2319-2022 Email: evert.sanchez@mininterior.gov.co Celular: 3107325777-3112645367	*Por parte de:* ***MUNICIPIO ORITO***  **Nombre y firma: ORLANDO MORIANO** Cargo: ALCALDE (E) (Resolución 729 del 2024) Email: despacho@orito-putumayo.gov.co Celular:3223598649
Por parte de: ***MUNICIPIO ORITO***  **Nombre y firma: DARWIN MENESES** Cargo: Supervisor convenio 2319-2022 Email: secretariadegobierno@orito-putumayo.gov.co Celular:3115790060	*Por parte de:* ***MUNICIPIO ORITO***  **Nombre y firma: MARLON STEEVENS SAMBONI** Cargo: APOYO JURIDICO Y CONTRATACION Email: despacho@orito-putumayo.gov.co @orito-putumayo.gov.co
Por parte de: ***MUNICIPIO ORITO***  **Nombre y firma: DANIELA ALEJANDRA ESCOBAR** Cargo: APOYO JURIDICO SECRETARIA DE GOBIERNO Email: secretariadegobierno@orito-putumayo.gov.co Celular:3233660110	*Por parte de* ***VIRTUAL DESK S.A***  **Nombre y firma: OSCAR H MOTTA VALENCIA** Cargo: DIRECTOR DE PROYECTOS Email: virtualrecepciondocumentos@gmail.com Celular:3115294826
Por parte de ***VIRTUAL DESK S.A***  **Nombre y firma: JERSON HERAZO BELTRAN** Cargo: Apoyo a la Interventoría Email: virtualrecepciondocumentos@gmail.com Celular:3012386473	*Por parte de:* ***M&R CAPITAL GROUP S.A.S*** **Nombre y firma MAURICIO ANTONIO MENDEZ** Cargo: Gerente Seguridad *M&R CAPITAL GROUP S.A.S* Email: gerencia@myrcapitalgroup.com Celular: 3004033153

Por parte de: ***M&R CAPITAL GROUP S.A.S*** **Nombre y firma: MARIA ELIZABETH CASTILLO** Cargo: Gerente del proyecto Email: gerencia@myrcapitalgroup.com Celular:3175754663	

Bajo la gravedad del juramento, el MUNICIPIO certifica que los documentos en medio físico y magnético anexos son auténticos y la información es veraz y asume todas las responsabilidades de índole fiscal, penal y disciplinaria, en el evento de demostrarse que la información o parte de ella o de los estudios, no corresponden a la realidad.

ANEXOS FOTOS
CONVENIO 2319 – 2022 -ORITO PUTUMAYO

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>PLANTA ELECTRICA</td><td>PLACA DE CARACTRISTICAS PLANTA ELECTRICA</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>TANSFERENCIA AUTOMATICA DE LA PANTA ELECTRICA</td><td>CCM</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>CCM AMPLIACION PROYECTA</td><td>CCM AMPLIACION PROYECTA</td></tr>
</table>

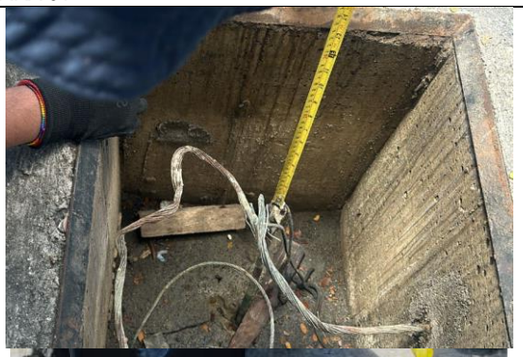


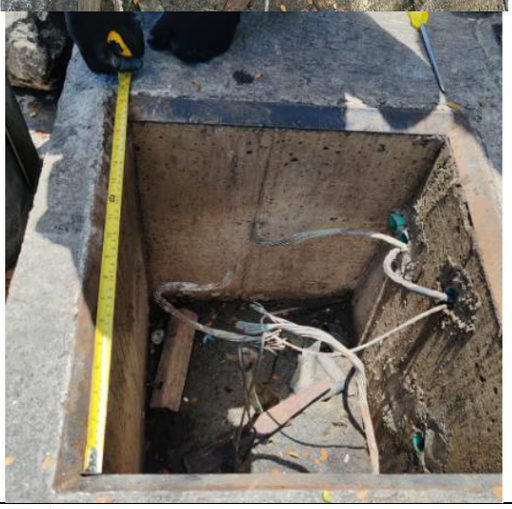




PUNTO DE CAMARA 61







PUNTO DE CAMARA 40







PUNTO DE CAMARA 39



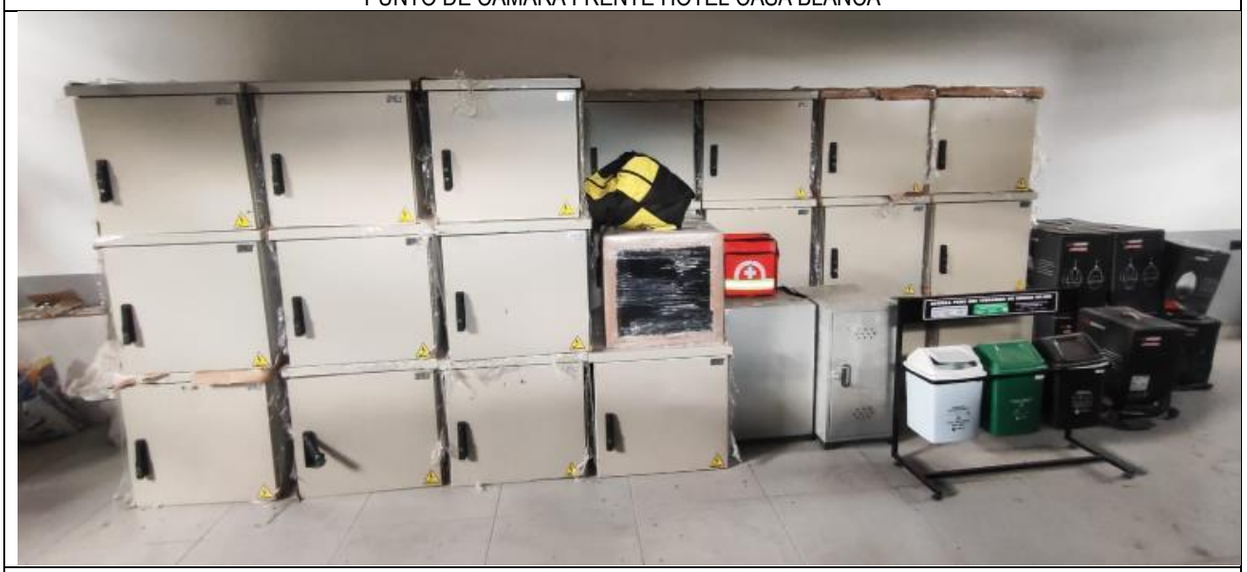


PUNTO DE CAMARA 55

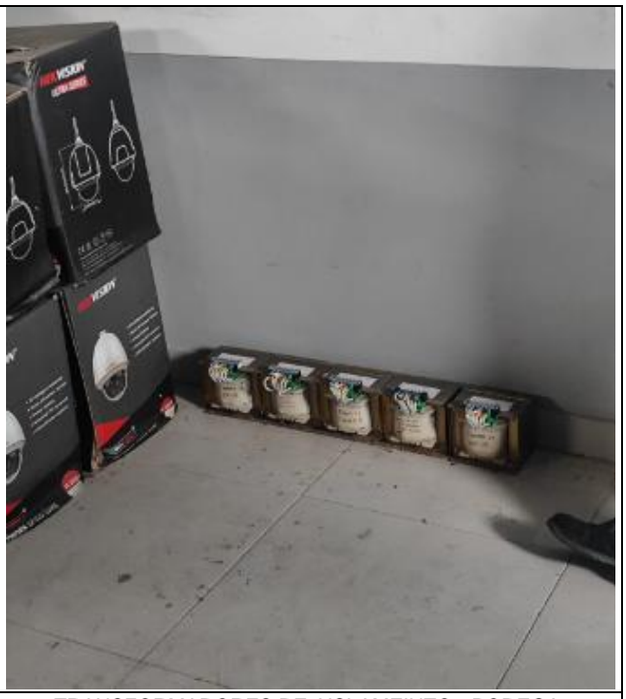
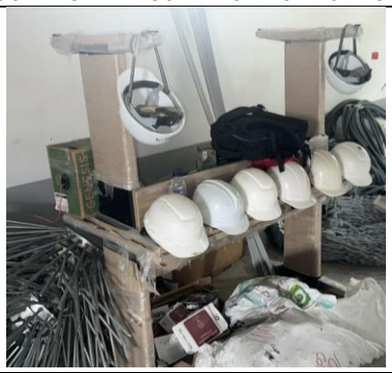




PUNTO DE CAMARA FRENTE HOTEL CASA BLANCA



GABINETES PARA POSTED -BODEGA

	
CARRETE DE FIBRA OPTICA	TRANSFORMADORES DE AISLAMEINTO - BODEGA
	
MUFLAS EN BODEGA	HERRAJE PARA SUJECION CABLE DE FIBRA
	
CORNAS ANTIESCALATORIAS - BODEGA	BRAZOS -BODEGAS
	
PUESTOS DE TRABAJO- BODEGA	SUELO ELECTROLITICO - BODEGA

	
LOCKER - BODEGA	CAMARAS PTZ EN BODEGA
	
UPS 2 KVA – BODEGA	CAMARAS PTZ EN BODEGA

Interior	FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL ANEXO 7	Código: GC-P3-F7 Versión: 2 Vigente desde: 17/12/2018

ACTA No.	Reunión Virtual
FECHA	31/10/2024
CIUDAD	BOGOTA D.C.
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2319 -2022
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE ORITO.".
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	40,35 %
MOTIVO:	Reunión Seguimiento a implementación de Estudios y Diseños

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

EL DIA 28/12/2022 SE SUSCRIBE EL CONTRATO No. 2319-22
EL DIA 28/12/2022 SE FIRMA EL ACTA DE INICIO
VALOR DEL CONTRAO $5.942.329.789

DESARROLLO DE LA REUNION

Reunión de Seguimiento Contrato No. 2319 - 2022

ORDEN DEL DIA

En la mesa trabajo se trataron los siguientes temas:

1. Presentación de los asistentes a la mesa de trabajo, que integran el grupo de supervisión y apoyo a la supervisión; del contrato, así como el gerente de proyecto designado por el contratista.

2. El municipio realiza seguimiento a los procesos de implementación de Estudios y Diseños y su correspondiente interventoría, en el que se establecieron actividades para cumplir con la ejecución del convenio:

   A la fecha presenta un avance del 40,35 % en la implementación de los estudios y diseños.

3. Se realiza reunión de seguimiento semanal para determinar el avance en la implementación de estudios y diseños

MINISTERIO DEL INTERIOR
- Marleny Rivera Galeano – Supervisor
- Evert D Sánchez Puerta - Apoyo a la Supervisión

MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO
- Darwin Meneses - Supervisor Municipio.

CONTRATISTA DE LA IMPLEMENTACION
- Elisabeth Castillo Aguirre

INTERVENTORIA
- Oscar Hernando Motta Valencia – Interventoría

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 2319 de 2022: 31/12/2024

1. El municipio, contratista de la obra e Interventoría realiza seguimiento a la ejecución de la implementación de Estudios y Diseños y su correspondiente interventoria, se expone por parte de la M&R CAPITAL GROUP, las obras realizadas durante la semana:

   - Reinicio de actividades, se procede a realizar inventario de equipos existentes.

2. A la fecha 31 de octubre de 2024 el municipio de Orito, contratista de la obra e Interventoría exponen un avance del 40,35% en la implementación ejecución de los estudios y diseños.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO – INTERVENTORIA - CONTRATISTA	• Validación de todo el total de equipos en bodega en Orito.	5/11/2024
CONTRATISTA DE LA IMPLEMENTACION	• Planos del nuevo CCM.	5/11/2024

MUNICIPIO DE ORITO INTERVENTORIA	• Actualización de plan de choque con porcentajes de obras	5/11/2024
MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO	• Validación de la autorización del permiso del nuevo CCM presentado por el contratista de la implementación y aprobado por la interventoría.	5/11/2024
CONTRATISTA DE LA IMPLEMENTACION	• Trabajadores de obras externas en calle.	6/11/2024

FIRMA	
Nombre y firma: • Darwin Meneses Cargo: Supervisor del Municipio de Orito Convenio 2319-2022	Nombre y firma: Evert D Sánchez Puerta Cargo: Apoyo a la Supervisión convenio 2319-2022
