Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATO	4600102792 DE 2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
VALOR INICIAL	$ 7.825.688.944
PLAZO INICIAL:	5 MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG-VNF
INTERVENTORÍA	SITELSA SAS
FECHA ACTA:	**PERIODO**
	1-abr.-25 / **4-may.-25**

[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de **propuesta económica** de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 -Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]

Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.

CONDICIONES CONTRACTUALES									ACTA N°1			ACTA N°2			ACTA N°3			ACTA N°4			ACTA N°5			ACUMULADO	
N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO SIN AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL CON AIU	VALOR TOTAL SIN AIU	CANTIDAD	VALOR TOTAL CON AIU	VALOR TOTAL SIN AIU	CANTIDAD	VALOR TOTAL CON AIU	VALOR TOTAL SIN AIU	CANTIDAD	VALOR TOTAL CON AIU	VALOR TOTAL SIN AIU	CANTIDAD	VALOR TOTAL CON AIU	VALOR TOTAL SIN AIU	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1				PRELIMINARES																						
	1.1			LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL. Este ítem incluye la topografía general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de ejecución de la obra. Se entiende por el trabajo que debe realizarse para localizar, replantear y fijar en el terreno los niveles y trazos establecidos en los planos (coordenadas, alineatria BM, linderos, ejes, mampostería, verticales, entre otros) y el control durante el proceso de ejecución de la obra. Se utilizará personal experto y calificado (topógrafo con su respectiva matrícula profesional vigente), utilizando equipo moderno y actualizado de precisión. Incluye teodolito electrónico o estación total (Zoof bis-962e o similar); colector de datos rígido; mira profesional; nivel circular; medidor de laser horizontal, vertical, inclinación y azimut; dendrómetro electrónico (medidor de diámetro); baston profesional; trípode profesional; prisma; plomada en zamak (aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre); libretas; cinta métrica 30m, y todos los demás materiales, elementos, equipos, seguros de equipos, instalaciones, combustibles, lubricantes, energía, transporte, mano de obra, necesarios para una correcta ejecución de los trabajos. Se harán los chequeos o revisiones necesarios, con la frecuencia que indique la interventoría. Incluye elaboración de planos.	dia	50,00	$ 986.161	$ 743.283	$ 49.308.050	3,00	$ 2.958.483,00	$ 2.229.788,21	4,00	$ 3.944.644,00	$ 2.973.050,95		$ -	$ -	9,00	$ 8.875.449,00	$ 6.689.364,64	4,00	$ 3.944.644,00	$ 2.973.050,95	20,00	$ 19.723.220
	1.2			ROCERÍA Y LIMPIEZA, hasta altura de la vegetación de 0,50 m, La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará cuadaña o machete.	m2	2.000,00	$ 1.268	$ 956	$ 2.536.000	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	1999,38	$ 2.535.213,84	$ 1.910.773,17	1999,38	$ 2.535.214
Subtotal									$ 51.844.050		$ 2.958.483,00	$ 2.229.788,21		$ 3.944.644,00	$ 2.973.050,95		$ -	$ -		$ 8.875.449,00	$ 6.689.364,64		$ 6.479.857,84	$ 4.883.824,12	0,00	$ 22.258.434
2				RETIROS Y DEMOLICIONES																						
	2.1			Demolición de piso o andén en concreto. e = hasta 15 cm. Incluye transporte interno hasta el sitio de almacenamiento. Se contempla el equipo necesario para su correcta ejecución.	m2	8.000,00	$ 33.222	$ 25.039	$ 272.420.400	1089,06	$ 36.180.751,32	$ 27.269.182,48	702,37	$ 23.334.086,31	$ 17.588.739,76	1968,62	$ 65.401.563,41	$ 49.292.706,82	1589,77	$ 52.815.295,75	$ 39.808.523,78	1522,10	$ 50.567.106,53	$ 38.112.079,09	6870,92	$ 228.298.803
	2.2			Desmonte de piso en adoquín. Incluye recuperación de los materiales y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría.	m2	500,00	$ 17.291	$ 13.032	$ 8.645.500	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	40,44	$ 699.248,04	$ 527.018,42	40,44	$ 699.248
	2.3			Demolición de andenes o placa de cualquier espesor. INCLUYE ENTRESUELO, retiro de tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de teléfonos, entre otros.	m2	9.181,00	$ 65.474	$ 49.347	$ 601.116.794	466,935	$ 30.572.102,19	$ 23.041.982,36	187,04	$ 12.245.968,87	$ 9.228.702,20	330,16	$ 21.616.791,08	$ 16.292.426,20	578,70	$ 37.889.528,81	$ 28.557.076,28	537,46	$ 35.189.492,36	$ 26.522.077,45	2100,38	$ 137.513.683
	2.4			Retiro de tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de teléfonos.	un	20,00	$ 19.024	$ 14.338	$ 380.480	5,00	$ 95.120,00	$ 71.691,29	15,00	$ 285.360,00	$ 215.073,86		$ -	$ -	-	$ -	$ -		$ -	$ -	20,00	$ 380.480
Subtotal									$ 882.563.174		$ 66.847.973,51	$ 50.382.856,13		$ 35.965.415,18	$ 27.031.515,81		$ 87.016.354,49	$ 65.585.133,82		$ 90.704.824,56	$ 68.363.600,06		$ 86.455.846,93	$ 65.161.174,95	0,00	$ 366.892.415
3				MOVIMIENTOS DE TIERRA																						
3.1				Excavaciones						0,00	$ -		0,00	$ -	$ -					$ -						0,00	$ -
	3.1.1			EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye roca descompuesta, volumen inferior a 0.30 m³. Su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	2.600,00	$ 63.568,00	$ 47.911	$ 165.276.800	228,70	$ 14.538.166,88	$ 10.957.316,01	0,00	$ -	$ -	177,40	$ 11.277.081,44	$ 8.499.458,42	304,63	$ 19.364.486,48	$ 14.594.879,77	282,72	$ 17.971.885,12	$ 13.545.270,67	993,45	$ 63.151.600
3.2				Llanos				$ -	$ -	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	0,00	$ -
	3.2.1			LLENOS EN ARENILLA compactados mecánicamente hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la misma obtenida en el ensayo del proctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la consecución de la misma o transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	m3	100,00	$ 172.088	$ 129.685	$ 17.206.600	0,00	$ -	$ -	11,93	$ 2.052.129,66	$ 1.546.675,96	69,20	$ 11.906.401,10	$ 8.973.772,31	11,98	$ 2.061.949,81	$ 1.554.077,34		$ -	$ -	93,11	$ 16.020.481
	3.2.2			Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo Ø 2½", nacromodado con medios MECÁNICOS y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	m3	2.600,00	$ 337.253	$ 254.185	$ 876.857.800	0,00	$ -	$ -	279,62	$ 94.371.429,51	$ 71.127.094,96	336,02	$ 113.324.287,61	$ 85.411.733,20	354,34	$ 119.503.241,80	$ 90.068.768,32	301,10	$ 101.547.384,18	$ 76.535.562,39	1271,29	$ 428.746.343
3.3								$ -	$ -			$ -			$ -			$ -			$ -	$ -		$ -	$ -	0,00	
	3.3.1			Cargue (Mecánico o Manual) y transporte del material proveniente de las EXPLANACIONES, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O VOLADURAS DE ROCA, hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio. En caso de requerir el pago de derecho de botadero, se pagará en su ítem respectivo.	m3-km	105.000,00	$ 3.357	$ 2.530	$ 352.485.000	11552,55	$ 38.781.897,76	$ 29.229.648,60	3673,33	$ 12.331.372,59	$ 9.294.070,38	16.298,66	$ 54.714.594,91	$ 41.238.012,44	16.363,09	$ 61.644.886,67	$ 46.461.325,50	16258,47	$ 54.579.682,45	$ 41.136.329,85	66546,09	$ 222.852.434
	3.3.2			Derechos de Botadero en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental	m3	4.200,00	$ 7.486	$ 5.642	$ 31.441.200	462,10	$ 3.459.294,45	$ 2.607.246,34	146,93	$ 1.099.884,82	$ 828.975,59	657,32	$ 4.920.714,89	$ 3.708.708,84	799,33	$ 5.983.796,07	$ 4.509.945,78	657,72	$ 4.923.712,91	$ 3.710.968,43	2723,40	$ 20.387.403
Subtotal									$ 1.443.367.400		$ 56.779.359,09	$ 42.794.216,95		$ 109.854.915,5782	$ 82.796.916,8362		$ 196.140.879,9389	$ 147.831.695,2117		$ 208.558.360,8316	$ 157.188.996,7976		$ 179.022.644,6560	$ 134.928.131,3356	0,00	$ 758.958.241
4				CONCRETOS																						
4.1				Concretos para Andenes, rampas y Escalas						0,00	$ -		0,00	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	0,00	$ -
	4.1.1			Construcción de ANDÉN en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.09 m (9 centímetros) Vaciado alternado (Junta fría). Incluye suministro y transporte de los materiales, acabado escobillado y llenado 0.10 m en los bordes TIPO METRO, los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Se ejecutarán los rebajes que sean necesarios en los sitios que indique la interventoría. Se ejecutarán los rebajes que sean necesarios en los sitios que indique la interventoría. Las excavaciones o descortes, mallla y material de soporte (base, sub base, entresuelo o arenilla) así como las llaves en caso de requerirse, se pagarán en su ítem respectivo.	m2	200,00	$ 120.530	$ 90.843	$ 24.106.000	0,00	$ -	$ -	5,88	$ 709.186,47	$ 534.508,94		$ -	$ -	28,31	$ 3.412.565,89	$ 2.572.027,35	9,43	$ 1.136.356,84	$ 856.464,31	43,62	$ 5.258.109
	4.1.2			Construcción de ESCALAS sobre entresuelo, en concreto 21 MPa., según diseño y condiciones del sitio. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper "T" de 16 mm. o su equivalente para acabado a la vista, contrahuellas, moldura chaflán en contrahuellas, vibrado, protección, curado, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m3	69,00	$ 1.337.482	$ 1.008.051	$ 92.286.258	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	0,04	$ 51.158,69	$ 38.557,95	0,04	$ 51.159
	4.1.3			Construcción de contenedor de raices U350, incluye viga de fundacion en concreto de 17.5 mpa (20x20m), muro en bloque de concreto (15x20x40m). No incluye marco para alcorque, refuerzo, excavación. Según detalle de MEP	m	30,00	$ 210.925	$ 158.973	$ 6.327.750	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	0,00	$ -
	4.1.4			Construcción de cárcamo en concreto de 17.5 Mpa. Incluye Tapa prefabricada de 40x40x8 cm. dimensiones 30x25 medidas internas, muros de 10 cm. La excavación y acero se pagara en su ítem respectivo.	m	50,00	$ 359.151	$ 270.690	$ 17.957.550	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	0,00	$ -
	4.1.5			Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 35 kg/cm2 adicionado con microfibra de polipropileno para construcción de andén, espesor e=0.10 m. Incluye aditivo plastificante, corte y sellado de juntas cada 2.0 m. Acabado escobillado tipo Metro, según diseño S.I.F. El material de soporte (base o subase) se pagará en su ítem respectivo. La interventoría podrá solicitar las ensayos necesarios para verificar el MR requerido mediante la norma INVIAS E-414-22.	m2	17.400,00	$ 136.000	$ 102.502	$ 2.366.400.000	281,85	$ 38.330.920,00	$ 28.889.749,77	957,66	$ 130.241.120,80	$ 98.161.833,58	2.394,19	$ 324.250.220,80	$ 244.385.152,85	2.385,55	$ 324.434.718,40	$ 244.524.267,42	1827,61	$ 248.554.361,60	$ 187.333.706,36	7936,85	$ 1.065.811.342
4.2				Concreto para solado, cunetas y cordones				$ -	$ -	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	0,00	$ -
	4.2.1			Suministro, transporte y colocación de Cordon prefabricado de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas rasuradas. Incluye conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra. De 15 x 45 x 80 cm (BOBAR)	m	10.000,00	$ 120.703,00	$ 90.973	$ 1.207.030.000	187,90	$ 22.680.093,70	$ 17.093.830,04	1369,24	$ 165.271.375,72	$ 124.563.894,87	1.511,67	$ 182.463.104,01	$ 137.521.181,80	1.781,99	$ 215.091.538,97	$ 162.113.007,97	1266,25	$ 152.840.173,75	$ 115.194.583,77	6117,05	$ 738.346.286
	4.2.2			Construcción de CUNETA AUXILIAR EN "V" en concreto de 21 Mpa. 0,30 x 0,25 x 0,20 m. según ficha U180 del MEP. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, entresuelo 15 cm de piedra y 5 cm de arenilla y todos lo demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m	1.460,00	$ 139.398,00	$ 105.063	$ 203.521.080	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	0,00	$ -
	4.2.3			Suministro, transporte y Construccion de cordon-cuneta en concreto de 21 MPa. Incluye ajustes en concreto donde sea necesario y triturado de fondo. Según detalle S.I.F. No incluye refuerzo.	m	862,00	$ 201.501,00	$ 151.870	$ 173.693.862	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	0,00	$ -
	4.2.4			Suministro, transporte y colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor de mínimo 0.05 m. Incluye transporte interno y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	1.333,00	$ 42.090,00	$ 31.723	$ 56.105.970	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	0,00	$ -
Subtotal									$ 4.147.429.470		$ 61.011.013,70	$ 45.983.579,82		$ 296.221.692,99	$ 223.260.237,40		$ 506.713.324,81	$ 381.906.334,65		$ 542.938.823,26	$ 409.209.242,73		$ 402.592.050,80	$ 303.423.312,39	0,00	$ 1.809.466.896

5				**ACERO DE REFUERZO**																												
	5.1			Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, cartilicados y todas las elementos necesarios para su correcta instalación, segun diseño y recomendaciones estructurales	kg	2000,00	$ 9.326	$ 7.029	$ 18.652.000	0,00	$ -	$ -	6,72	$ 62.670,72	$ 47.234,49		$ -	$ -		$ -	$ -	4,48	$ 41.780,48	$ 31.489,66	11,20	$ 104.451
	5.2			Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada Tipo D84. Incluye el suministro y transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	m2	4200,00	$ 15.704	$ 11.836	$ 65.956.800	0,00	$ -	$ -	175,44	$ 2.755.185,14	$ 2.076.564,02	645,69	$ 10.139.989,57	$ 7.642.440,13	41,87	$ 657.548,47	$ 495.589,74	503,23	$ 7.902.694,08	$ 5.956.205,97	1366,24	$ 21.455.417
	5.3			Acarreo interno de ACERO para lugares de difícil acceso, pendiente y/o escalas. Se pagará según lo acordado por la interventoría. Distancia mayor a. 350 m.	kg	1273,00	$ 663	$ 500	$ 843.999	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	0,00	$ -
Subtotal										**$ 85.452.799**		$ -	$ -		**$ 2.817.855,86**	**$ 2.123.798,51**		**$ 10.139.989,57**	**$ 7.642.440,13**		**$ 657.548,47**	**$ 495.589,74**		**$ 7.944.474,56**	**$ 5.987.695,63**	0,00	**$ 21.559.868**
6				**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**								$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	0,00	$ -
	6.1			Resíce para cajas de acueducto y alcantarillado existente y recuperacion de herrajas de andenes. Altura 15 - 20 cm. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	un	315,00	$ 83.564	$ 62.982	$ 26.322.660	0,00	$ -	$ -	86,00	$ 7.186.504,00	$ 5.416.418,45	196,00	$ 16.378.544,00	$ 12.344.395,54	33,00	$ 2.757.612,00	$ 2.078.393,13		$ -	$ -	315,00	$ 26.322.660
	6.2			Suministro, transporte e instalación de Tapa en polipropileno para caja de inspección de 0.40x 0.40 m, incluye marco.	un	190,00	$ 172.204	$ 129.789	$ 32.718.760	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	$ -		$ -	$ -	-	$ -	$ -	7,00	$ 1.205.428,00	$ 908.522,76	7,00	$ 1.205.428
	6.3			Construcción de caja de inspección y/o empalme de 80x80x80 cm medidas internas (L=80cm) en concreto de 17,5 mpa, espesor 10 cm. Incluye tapa y herraje. Según diseño SIF Municipio de Medellín.	un	20,00	$ 907.292	$ 683.820	18.145.840	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	$ -	3,00	$ 2.721.876,00	$ 2.051.459,15	3,00	$ 2.721.876,00	$ 2.051.459,15	14,00	$ 12.702.088,00	$ 9.573.476,03	20,00	$ 18.145.840
Subtotal										**$ 77.187.260**		$ -	$ -		**$ 7.186.504,00**	**$ 5.416.418,45**		**$ 19.100.420,00**	**$ 14.395.854,69**		**$ 5.479.488,00**	**$ 4.129.852,28**		**$ 13.907.516,00**	**$ 10.481.998,79**	0,00	**$ 45.673.928**
7				**COMPLEMENTARIOS EN ADOQUIN PARA PISOS**								$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	0,00	
	7.1			Suministro, transporte y colocación de adoquín táctil guía o alerta discapacitados visuales de 20X20X6 cm LOST-AL . Incluye arena de apoyo 5 cm, sello de juntas con arena,cortes a maquina . Según diseño. Seguir recomendaciones MEP color AMARILLO.	m2	48,00	$ 214.709	$ 161.825	$ 10.306.032	0,00	$ -	$ -	30,69	$ 6.588.989,79	$ 4.968.076,12	17,28	$ 3.710.171,52	$ 2.796.330,66	-	$ -	$ -		$ -	$ -	47,97	$ 10.299.161
	7.2			Colocación de ADOQUÍN TÁCTIL GUÍA O ALERTA 20 x 20 x 6. Color ollas, marrón, chocolate, ocre, loja y terracota. Para un ancho de 0.30m. Incluye suministro y transporte de los materiales, perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	m	8600,00	$ 45.895	$ 34.591	$ 394.697.000	0,00	$ -	$ -	145,03	$ 6.656.151,85	$ 5.016.695,70		$ -	$ -	122,01	$ 5.599.648,95	$ 4.220.416,75	619,96	$ 28.453.064,20	$ 21.444.878,05	887,00	$ 40.708.865
	7.3			Suministro, transporte y colocación de franja demarcadora para limitados visuales en adoquín ADOP-A de 10x20x6 cm, en color amarillo, salmón o jaspe, según diseño. Incluye cama de arena de apoyo e = 5 cm, sello de juntas con arena de reseqúa, cortes a maquina y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Cumplir norma NTC 2017, seguir recomendaciones del MEP y patrones de instalación del ICBF", el retiro/o deberá resaltarse con 3 capas en un tercio de 4 mases hasta de su instalación	m	8500,00	36.909	27.816	313.726.500	0,00	$ -	$ -	118,64	$ 4.378.883,76	$ 3.300.334,46	249,33	$ 9.202.526,97	$ 6.935.876,52	110,12	$ 4.064.419,08	$ 3.063.324,60	489,43	$ 18.064.371,87	$ 13.614.982,37	967,52	$ 35.710.196
Subtotal										**$ 718.729.532**		$ -	$ -		**$ 17.624.025,40**	**$ 13.285.196,27**		**$ 12.912.692,49**	**$ 9.732.207,18**		**$ 9.664.068,03**	**$ 7.283.741,36**		**$ 46.517.436,07**	**$ 35.059.870,42**	0,00	**$ 86.719.222**
8				**BARANDAS Y PASAMANOS**								$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	0,00	
	8.1			Suministro, transporte e instalacion de baranda con pasamanos con una altura de 1.00 m, en tubería galvanizada tipo acueducto en diametros de 2" calibre 10, 1 1/2" calibre 14 y 3/4" calibre 14, segun diseño. Incluye soldadura en todas las uniones, pulida y mastiada, anticorrosivo, wash primer, pintura esmalte color a definir, con los espasores especificados en el diseño. Los barrotes verticales de 3/4" deben ir cada 0,10 m centro a centro; los tubos verticales estructurales de soporte de 2" van cada 1,50 m, el anclaje al piso se hará con platinas de 0.15x0.15x1/4" de acero galvanizado y 4 pernos de expansión de diámetro de 1/2" y longitud mínima de 3" y/o concreto de 21 MPa en caso de ser necesario. Los pasamanos irán fijados a la baranda mediante platinas de acero galvanizado de acuerdo a la figura que se plantea en el diseño. Incluye todo lo necesario para su correcto anclaje, fijación y funcionamiento.	m	50,00	$ 687.922	$ 518.482	$ 34.396.100	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	0,00	$ -
Subtotal										**$ 34.396.100**		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	0,00	$ -
9				**ARBORIZACIÓN Y PAISAJISMO**									$ -			$ -			$ -				$ -		$ -	0,00	
	9.1			Suministro, transporte e instalación de grama tipo San Agustín, para conformación de zonas verdes. Incluye perfilación y nivelación de la superficie hasta un espesor de 5 cm , adición de tierra abonada con un espesor de 5 cm, anclaje inicial y final con ganchos de sujeción, negado y todo lo necesario para su correcta siembra y total prendimiento, capote mínimo 5 cm.	m2	300,00	$ 38.160,00	$ 28.701	$ 11.448.000	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	299,81	$ 11.440.917,50	$ 8.622.940,54	299,81	$ 11.440.918
Subtotal										**$ 11.448.000**		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		**$ 11.440.917,50**	**$ 8.622.940,54**	0,00	**$ 11.440.918**
								SUBTOTAL OBRAS		**$ 7.452.316.785**		**$ 187.596.829,00**	**$ 141.390.435,00**		**$ 473.514.944,00**	**$ 356.894.944,00**		**$ 832.027.861,00**	**$ 627.093.655,00**		**$ 866.878.582,00**	**$ 653.360.388,00**		**$ 754.350.744,00**	**$ 568.548.948,00**		$ 3.114.368.941

						ACTA N°1	ACTA N°2	ACTA N°3	ACTA N°4	ACTA N°5	ACUMULADO
SUBTOTAL OBRAS			$ 7.452.316.785	A	26,69%	$ 37.722.968,00	$ 95.216.903,00	$ 167.308.587,00	$ 174.316.552,00	$ 151.688.889,00	$ 626.253.869,00
Destinación pago de Reajustes	NO MODIFICAR		$ 185.979.642,00	I	1,00%	$ 1.413.904,00	$ 3.568.949,00	$ 6.270.937,00	$ 6.533.604,00	$ 5.685.489,00	$ 23.472.783,00
Inversión Socio-Ambiental-Implementación PMT- Gasto Reembolsable-	NO MODIFICAR		$ 157.581.021,00	U	5,00%	$ 7.069.522,00	$ 17.844.347,00	$ 31.354.683,00	$ 32.668.019,00	$ 28.427.447,00	$ 117.363.918,00
Pólizas - Gasto Reembolsable-	NO MODIFICAR		$ 29.811.496,00	TOTAL CON AIU	32,69%	$ 187.596.829,00	$ 473.514.943,00	$ 832.027.862,00	$ 866.878.563,00	$ 754.350.743,00	$ 3.114.368.940,00
VALOR TOTAL			**$ 7.825.688.948**	TOTAL SIN I	31,69%	$ 186.182.925,00	$ 469.946.094,00	$ 825.756.925,00	$ 860.344.959,00	$ 748.665.254,00	$ 3.090.896.157,00
									VALOR TOTAL ACTA MENOS IMPREVISTOS ACTUAL Y AIU%	$ 730.677.960,00	

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea

NOTA 3: El A.I.U.y su discriminación deben estar en porcentaje (%)

NOTA 4: El valor definido por la Entidad por concepto de pólizas es un valor estimado que será un gasto reembolsable comprobable, la entidad reconocerá al contratista el valor real

NOTA 5: El valor total presupuestado por la Entidad por concepto de "Inversión Ambiental - Social - Implementación PMT" reflejado en sus respectivos anexos, es un valor estimado

NOTA 6: El valor total presupuestado por la Entidad por concepto de "Destinación pago de Reajustes" es un valor estimado, con el cual se realizara el pago de los reajuste de

NOTA 7: Las operaciones y/o formulas que se presentan en estos formularios, solo son de ayuda para la formulación de la oferta, es responsabilidad del proponente verificar las

NOTA 8: Los valores Definidos para los ítems Destinación pago de Reajustes, Inversión Socio-Ambiental e Implementación PMT y Pólizas NO PODRÁN ALTERARSE O MODIFICARSE.

DESCRIPCION			PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=		26,69%
IMPREVISTO	I=		1,00%
UTILIDAD	U=		5,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=		32,69%

Consorcio Vial VG-VNF - Representante Legal

ERNESTO MILLÁN CUENCA
DIRECTOR DE OBRA

MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	1
FECHA	DD	4	MM	5	AA	2025	PERÍODO	01/04/2025 - 4/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
CONTRATO No	4600102792 DE 2024
FECHA DE INICIO	

ÍTEM	1.1	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL. Este ítem incluye la topografía general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de ejecución de la obra. Se entiende por el trabajo que debe realizarse para localizar, replantear y fijar en el terreno los niveles y trazos establecidos en los planos (coordenadas, altimetría BM, linderos, ejes, mampostería, verticales, entre otros) y el control durante el proceso de ejecución de la obra. Se utilizará personal experto y calificado (topógrafo con su respectiva matrícula profesional vigente), utilizando equipo moderno y actualizado de precisión. Incluye teodolito electrónico o estación total ((boif bts-962e o similar); colector de datos rígido; mira profesional; nivel circular; medidor de laser horizontal, vertical, inclinación y azimut; dendrómetro electrónico (medidor de diámetro); bastón profesional; trípode profesional; prisma; plomada en zamak (aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre); libretas; cinta métrica 30m, y todos los demás materiales, elementos, equipos, seguros de equipos, instalaciones, combustibles, lubricantes, energía, transporte, mano de obra, necesarios para una correcta ejecución de los trabajos. Se harán los chequeos o revisiones necesarios, con la frecuencia que indique la interventoría. Incluye elaboración de planos.	UNID.	DÍA	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

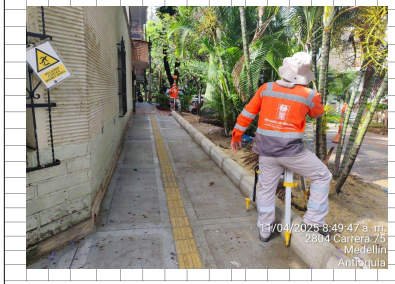





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (DÍA)	CANTIDAD TOTAL
Del 01 al 06 de abril del 2025		
LA AMÉRICA - FERRINI	1,00	1,00
CALLE NUEVA	1,00	1,00
LAURELES - LORENA	2,00	2,00
Subtotal		4,00
TOTAL		4,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN


CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG - VNF	HOJA N°	2


FECHA	DD	4	MM	5	AA	2025	PERÍODO	01/04/2025 - 4/05/2025	ELABORÓ		ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	1.2	DESCRIPCIÓN	ROCERÍA Y LIMPIEZA, hasta altura de la vegetación de 0,50 m, La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete.	UNID.		m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

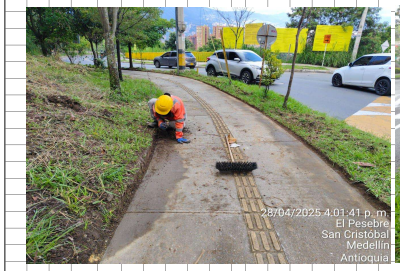





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO		
Del 07 al 13 de abril					
BOSTON - ENCISO					
CL 57-CR 36A Y 34		31,8	1,2	38,16	**38,16**
Del 21 al 27 de abril					
LA AMÉRICA - CALASANZ					
CL 50A - CR 86 Y 96C		112,77	0,75	84,58	
CL 50A - CR 86 Y 96C		120,00	0,75	90,00	
CL 50A - CR 86 Y 96C		105,00	0,75	78,75	
CL 50A - CR 86 Y 96C		105,00	0,75	78,75	
CL 50A - CR 86 Y 96C		135,00	0,75	101,25	
CL 50A - CR 86 Y 96C		75,60	0,75	56,70	**490,03**
Del 28 de abril al 4 de mayo					
LA AMÉRICA - CALASANZ					
CL 50A - CR 86 Y 96C		261,00	0,75	195,75	
CL 50A - CR 86 Y 96C		315,00	1,05	330,75	
CL 50A - CR 86 Y 96C		546,00	1,20	655,20	
CL 50A - CR 86 Y 96C		390,00	0,61	238,19	
CL 50A - CR 86 Y 96C		114,00	0,45	51,30	**1471,19**
			Subtotal		**1.999,38**

OBSERVACIONES:

TOTAL **1.999,38**

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG - VNF	HOJA Nº	3


FECHA	DD	4	MM	5	AA	2025	PERÍODO	01/04/2025 - 4/05/2025	ELABORÓ		ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	


ÍTEM	2.1	DESCRIPCIÓN	Demolición de piso o andén en concreto. e = hasta 15 cm. Incluye transporte interno hasta el sitio de almacenamiento. Se contempla el equipo necesario para su correcta ejecución.	UNID.		m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	





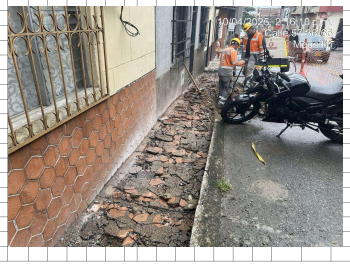


LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
Del 01 al 06 de bril del 2025					
BOSTON - ENCISO					
CL 57-CR 36A Y 34		8,00	3,85	30,80	
CL 57-CR 36A Y 34		4,42	2,55	11,27	
CL 57-CR 36A Y 34		1,60	1,30	2,08	
CL 57-CR 36A Y 34		81,50	1,30	105,95	
MENOS CAJAS				7,09	**143,02**
LA AMÉRICA - FERRINI					
CL 53A - CR 81 Y 80		1,92	0,80	1,54	**1,54**
BELÉN GRANADA					
CR 75 - CL 30A Y 28		3,14	2,46	7,72	
CR 75 - CL 30A Y 28		0,85	2,50	2,13	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,10	1,44	1,58	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,10	1,44	1,58	
CR 75 - CL 30A Y 28		7,30	2,34	17,08	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,30	1,50	3,45	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,00	2,50	2,50	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,93	1,50	5,90	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,00	2,50	2,50	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,80	1,50	5,70	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,50	2,50	6,25	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,05	1,50	4,58	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,85	2,50	9,63	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,93	1,50	2,90	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,06	2,50	5,15	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,10	1,50	3,15	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,50	2,90	7,25	**89,04**
CL 28 - CR 75 Y 74A		30,00	2,50	75,00	
CL 28 - CR 75 Y 74A		39,40	2,50	98,50	
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,60	2,10	7,56	
CL 28 - CR 75 Y 74A		6,90	3,90	26,91	**207,97**
CR 74 - CL 27 Y 28		7,26	4,30	31,22	
CR 74 - CL 27 Y 28		5,70	4,30	24,51	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,30	2,30	2,99	
CR 74 - CL 27 Y 28		6,40	4,34	27,78	
CR 74 - CL 27 Y 28		4,00	2,30	9,20	
CR 74 - CL 27 Y 28		6,40	4,40	28,16	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,00	2,30	2,30	
CR 74 - CL 27 Y 28		5,26	4,30	22,62	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,00	2,30	2,30	
CR 74 - CL 27 Y 28		4,80	4,30	20,64	
CR 74 - CL 27 Y 28		13,00	2,30	29,90	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,60	2,40	3,84	
CR 74 - CL 27 Y 28		2,00	2,00	4,00	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,00	2,00	2,00	
CR 74 - CL 27 Y 28		20,00	2,30	46,00	**257,45**
Del 07 al 13 de abril					
BOSTON - ENCISO					
CL 57-CR 36A Y 34		9,30	1,97	18,32	
CL 57-CR 36A Y 34		23,70	1,50	35,55	
CL 57-CR 36A Y 34		15,40	1,40	21,56	

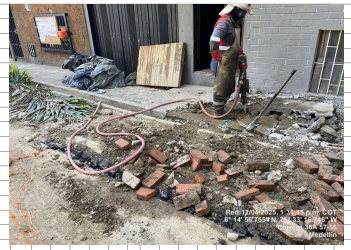











CL 57-CR 36A Y 34		19,80	1,98	39,20	
CL 57-CR 36A Y 34		4,93	2,10	10,35	
CL 57-CR 36A Y 34		18,70	1,25	23,38	
CL 57-CR 36A Y 34		16,90	0,90	15,21	
CL 57-CR 36A Y 34		1,50	11,37	17,06	
CL 57-CR 36A Y 34		1,46	9,60	14,02	
CL 57-CR 36A Y 34		8,00	1,40	11,20	
CL 57-CR 36A Y 34		3,60	1,22	4,39	
CL 57-CR 36A Y 34		3,50	1,60	5,60	
CL 57-CR 36A Y 34		5,30	1,30	6,89	
CL 57-CR 36A Y 34		6,40	1,50	9,60	
CL 57-CR 36A Y 34		5,89	1,42	8,36	
CL 57-CR 36A Y 34		4,90	1,30	6,37	
CL 57-CR 36A Y 34		4,34	1,56	6,77	
CL 57-CR 36A Y 34		3,85	1,46	5,62	
CL 57-CR 36A Y 34		4,15	1,30	5,40	
MENOS CAJAS				11,225	**253,62**
LA AMÉRICA - CALASANZ					
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,40	1,35	3,24	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,60	1,30	3,38	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,40	1,30	3,12	**9,74**
BELÉN GRANADA					
CR 75 - CL 30A Y 28		19,29	3,60	69,44	
CR 75 - CL 30A Y 28		16,42	2,24	36,78	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,83	4,06	11,49	
CR 75 - CL 30A Y 28		10,50	0,50	5,25	
MENOS CAJAS				5,25	**117,71**
CR 74 - CL 27 Y 28		1,00	0,88	0,88	**0,88**
Del 14 al 20 de abril					
LA AMÉRICA - CALASANZ					
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,20	1,20	2,64	**2,64**
Del 21 al 27 de abril					
SIMÓN BOLÍVAR					
CL 37D-CR 82A Y 83A		1,55	2,25	3,49	
CL 37D-CR 82A Y 83A		1,30	6,05	7,87	
CL 37D-CR 82A Y 83A		3,61	1,53	5,52	**16,88**
LA AMÉRICA - CALASANZ					
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,20	1,20	2,64	**2,64**
POBLADO - FLORIDA					
CALLE 5G		18,50	1,20	22,20	
CALLE 5G VILLA DEL POBLADO		8,50	3,00	25,50	
CALLE 5F		25,00	1,60	40,00	**87,70**
Del 28 de abril al 4 de mayo					
BOSTON - ENCISO					
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		3,80	3,10	11,78	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,10	0,62	0,68	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		71,10	1,50	106,65	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		9,00	1,40	12,60	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,40	3,00	4,20	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,30	1,00	1,30	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		9,50	1,98	18,81	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		4,65	2,16	10,04	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,10	1,30	9,23	
MENOS CAJAS				4,73	**170,57**
POBLADO - FLORIDA					
CALLE 7		8,50	3,60	30,60	
CALLE 7		40,00	1,50	60,00	**90,60**
POBLADO - LAS LOMAS					
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		6,40	2,70	17,28	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		13,00	1,30	16,90	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		11,00	1,15	12,65	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		7,20	2,33	16,78	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		2,50	2,60	6,50	**70,11**
	Subtotal				**1.522,10**
TOTAL					**1.522,10**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN


CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	4
FECHA	DD	4	MM	5	AA	2025	PERÍODO	01/04/2025 - 4/05/2025	ELABORÓ		ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATO No	4600102792 DE 2024 — FECHA DE INICIO:

ÍTEM	2.2	DESCRIPCIÓN	Desmonte de piso en adoquín. Incluye recuperación de los materiales y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría.	UNID.		m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
Del 07 al 13 de abril					
POBLADO - FLORIDA					
CALLE 7 - CRA 33-34		10,00	0,20	2,00	**2,00**
Del 14 a 20 de abril					
POBLADO - FLORIDA					
CALLE 7 - CRA 33-34		82,00	0,20	16,40	**16,40**
Del 21 al 27 de abril					
POBLADO - FLORIDA					
CALLE 7 - CRA 33-34		72,00	0,20	14,40	
CALLE 7 - CRA 33-34		1,20	1,20	1,44	
CALLE 7 - CRA 33-34		31,00	0,20	6,20	**22,04**
				Subtotal	**40,44**
				TOTAL	**40,44**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF


CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG - VNF	HOJA Nº	5

FECHA	DD	4	MM	5	AA	2025	PERÍODO	01/04/2025 - 4/05/2025	ELABORÓ		ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	2.3	DESCRIPCIÓN	Demolición de andenes o pisos de cualquier espesor. INCLUYE ENTRESUELO, retiro de: tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de teléfonos, entre otros.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



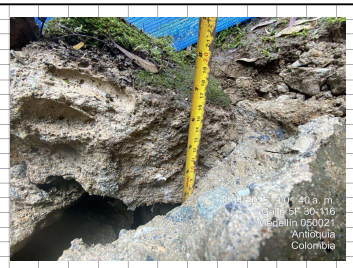





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
Del 07 al 13 de abril					
BOSTON - ENCISO					
CRA 36A - CLL 58 Y 54		7,80	3,35	26,13	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		5,22	2,70	14,09	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		90,00	1,52	136,80	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		13,54	1,35	18,28	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		1,12	6,82	7,64	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		7,60	1,20	9,12	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		1,00	0,95	0,95	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		7,10	0,95	6,75	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		7,90	1,10	8,69	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		10,20	1,20	12,24	
CRA 36A - CLL 58 Y 54		90,00	0,27	24,30	
MENOS CAJAS				4,65	**260,34**
Del 07 al 13 de abril					
BELÉN GRANADA					
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,15	1,50	4,73	**4,73**
POBLADO - FLORIDA					
CL 5 F		21,60	1,45	31,32	
CL 5 F		33,80	1,40	47,32	**78,64**
Del 28 de abril al 4 de mayo					
LA CANDELARIA - BOSTON					
CR 40-CL 54 Y 56		13,70	2,07	28,36	
CR 40-CL 54 Y 56		4,93	1,80	8,87	
CR 40-CL 54 Y 56		5,20	1,60	8,32	
CR 40-CL 54 Y 56		16,30	1,54	25,10	
CR 40-CL 54 Y 56		30,00	1,66	49,80	
CR 40-CL 54 Y 56		25,20	1,60	40,32	
CR 40-CL 54 Y 56		4,70	3,10	14,57	
CR 40-CL 54 Y 56		12,00	1,95	23,40	
CR 40-CL 54 Y 56		2,53	1,87	4,73	
CR 40-CL 54 Y 56		1,63	2,00	3,26	
MENOS CAJAS				12,98	**193,76**
			Subtotal		**537,46**
TOTAL					**537,46**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	6
FECHA	DD	4	MM	5	AA	2025	PERÍODO	01/04/2025 - 4/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	3.1.1	DESCRIPCIÓN	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, volumen inferior a 0.30 m³. Su medida será en el sitio. No incluye entibado.	UNID.	m3	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.













LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			CANTIDAD (M3)	MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO	ESPESOR		
Del 01 al 06 de abril del 2025						
BOSTON - ENCISO						
CL 57-CR 36A Y 34		43,00	1,22	0,15	7,87	
CL 57-CR 36A Y 34		8,00	3,90	0,15	4,68	
CL 57-CR 36A Y 34		4,50	2,30	0,15	1,55	
CL 57-CR 36A Y 34		1,65	1,30	0,15	0,32	
CL 57-CR 36A Y 34		81,50	1,30	0,15	15,89	
MENOS CAJAS					1,76	**28,56**
BELÉN GRANADA						
CR 75 - CL 30A Y 28		2,30	1,50	0,15	0,52	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,00	2,50	0,15	0,38	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,93	1,50	0,15	0,88	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,00	2,50	0,15	0,38	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,80	1,50	0,15	0,86	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,14	2,46	0,15	1,16	
CR 75 - CL 30A Y 28		0,85	2,50	0,15	0,32	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,10	1,44	0,15	0,24	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,10	1,44	0,15	0,24	
CR 75 - CL 30A Y 28		7,30	2,34	0,15	2,56	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,50	2,50	0,15	0,94	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,05	1,50	0,15	0,69	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,85	2,50	0,15	1,44	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,93	1,50	0,15	0,43	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,06	2,50	0,15	0,77	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,10	1,50	0,15	0,47	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,50	2,90	0,15	1,09	
CR 75 - CL 30A Y 28		10,30	1,50	0,15	2,32	
CR 75 - CL 30A Y 28		5,50	2,50	0,15	2,06	
CR 75 - CL 30A Y 28		7,70	1,50	0,15	1,73	
CR 75 - CL 30A Y 28		4,30	2,60	0,15	1,68	
CR 75 - CL 30A Y 28		7,80	2,50	0,15	2,93	
CR 75 - CL 30A Y 28		7,00	1,90	0,15	2,00	**26,07**
Del 07 al 13 de abril						
LA AMÉRICA - CALASANZ						
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,60	1,30	0,13	0,44	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,40	1,35	0,13	0,42	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,40	1,30	0,13	0,41	**1,27**
BELÉN GRANADA						
CL 28 - CR 75 Y 74A		4,20	2,50	0,18	1,89	
CL 28 - CR 75 Y 74A		5,30	1,50	0,18	1,43	
CL 28 - CR 75 Y 74A		15,00	2,50	0,18	6,75	
CL 28 - CR 75 Y 74A		6,00	2,50	0,18	2,70	
CL 28 - CR 75 Y 74A		4,20	0,50	0,18	0,38	
MENSO CAJAS					0,38	**12,77**
CR 74 - CL 27 Y 28		5,89	4,30	0,17	4,31	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,30	2,30	0,17	0,51	
CR 74 - CL 27 Y 28		6,40	4,34	0,17	4,72	
CR 74 - CL 27 Y 28		4,00	2,30	0,17	1,56	
CR 74 - CL 27 Y 28		7,26	4,30	0,17	5,31	
CR 74 - CL 27 Y 28		6,40	4,40	0,17	4,79	
CR 74 - CL 27 Y 28		6,30	0,50	0,17	0,54	
MENOS CAJAS					0,54	**21,19**
POBLADO - FLORIDA						
CL 5 F		21,60	1,45	0,09	2,82	**2,82**













Del 14 al 20 de abril						
BOSTON - ENCISO						
CL 57-CR 36A Y 34		9,30	1,97	0,15	2,75	
CL 57-CR 36A Y 34		23,70	1,50	0,15	5,33	
CL 57-CR 36A Y 34		15,40	1,40	0,15	3,23	
CL 57-CR 36A Y 34		19,80	1,98	0,15	5,88	
CL 57-CR 36A Y 34		4,93	2,10	0,15	1,55	
CL 57-CR 36A Y 34		18,70	1,25	0,15	3,51	
CL 57-CR 36A Y 34		16,90	0,90	0,15	2,28	
MENOS CAJAS					0,82	**23,72**
BELÉN GRANADA						
CR 75 - CL 30A Y 28		2,83	4,06	0,16	1,84	
CR 75 - CL 30A Y 28		5,00	2,24	0,16	1,79	**3,63**
CL 28 - CR 75 Y 74A		2,80	2,25	0,18	1,13	
CL 28 - CR 75 Y 74A		2,20	0,80	0,18	0,32	
CL 28 - CR 75 Y 74A		2,00	0,80	0,18	0,29	
CL 28 - CR 75 Y 74A		7,20	2,30	0,18	2,98	
CL 28 - CR 75 Y 74A		2,60	1,40	0,18	0,66	
CL 28 - CR 75 Y 74A		10,00	2,30	0,18	4,14	
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,15	1,50	0,18	0,85	
CL 28 - CR 75 Y 74A		4,55	0,50	0,18	0,41	
MENOS CAJAS					0,41	**10,37**
CR 74 - CL 27 Y 28		1,00	2,30	0,17	0,39	
CR 74 - CL 27 Y 28		5,26	4,30	0,17	3,85	**4,24**
LA AMÉRICA - CALASANZ						
CL 50A - CR 86 Y 96C		10,30	1,20	0,13	1,61	**1,61**
Del 21 al 27 de abril						
BOSTON - ENCISO						
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,80	3,35	0,10	2,61	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		5,22	2,70	0,10	1,41	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		90,00	1,52	0,10	13,68	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		13,54	1,35	0,10	1,83	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,12	6,82	0,10	0,76	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,60	1,20	0,10	0,91	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,00	0,95	0,10	0,10	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,10	0,95	0,10	0,67	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,90	1,10	0,10	0,87	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		10,20	1,20	0,10	1,22	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		90,00	0,27	0,10	2,43	
CL 57-CR 36A Y 34		1,50	11,37	0,15	2,56	
CL 57-CR 36A Y 34		1,46	9,60	0,15	2,10	
CL 57-CR 36A Y 34		8,00	1,40	0,15	1,68	
CL 57-CR 36A Y 34		3,60	1,22	0,15	0,66	
CL 57-CR 36A Y 34		3,50	1,60	0,15	0,84	
CL 57-CR 36A Y 34		5,30	1,30	0,15	1,03	
CL 57-CR 36A Y 34		6,40	1,50	0,15	1,44	
CL 57-CR 36A Y 34		5,89	1,42	0,15	1,25	
CL 57-CR 36A Y 34		4,90	1,30	0,15	0,96	
CL 57-CR 36A Y 34		4,34	1,56	0,15	1,02	
CL 57-CR 36A Y 34		3,85	1,46	0,15	0,84	
CL 57-CR 36A Y 34		4,15	1,30	0,15	0,81	**40,36**
SIMÓN BOLÍVAR						
CL 37D-CR 82A Y 83A		1,55	2,25	0,15	0,52	
CL 37D-CR 82A Y 83A		1,30	6,05	0,15	1,18	
CL 37D-CR 82A Y 83A		3,61	1,53	0,15	0,83	
MENOS CAJAS					1,33	**1,20**
BELÉN GRANADA						
CR 75 - CL 30A Y 28		5,00	2,24	0,16	1,79	
CR 75 - CL 30A Y 28		16,42	2,24	0,16	5,88	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,83	4,06	0,16	1,84	





MENOS CAJAS					0,08	**9,43**
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,60	2,10	0,18	1,36	
CL 28 - CR 75 Y 74A		6,90	3,90	0,18	4,84	**6,20**
CR 74 - CL 27 Y 28		33,00	2,30	0,17	12,90	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,00	2,30	0,17	0,39	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,60	2,40	0,17	0,65	
CR 74 - CL 27 Y 28		2,00	2,00	0,17	0,68	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,00	2,00	0,17	0,34	
CR 74 - CL 27 Y 28		4,80	4,30	0,17	3,51	
MENOS CAJAS					0,30	**18,18**
LA AMÉRICA - CALASANZ						
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,20	1,20	0,13	0,34	**0,34**
POBLADO - FLORIDA						
CALLE 5G		18,50	1,20	0,16	3,55	
CALLE 5G VILLA DEL POBLADO		8,50	3,00	0,26	6,63	
CALLE 5F		25,00	1,60	0,16	6,40	**16,58**
Del 28 de abril al 4 de mayo						
POBLADO - FLORIDA						
CALLE 7		4,20	3,30	0,35	4,85	
CALLE 7		10,50	1,45	0,10	1,52	
CALLE 7		55,00	1,40	0,15	11,55	**17,92**
POBLADO - LAS LOMAS						
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		6,40	2,70	0,16	2,76	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		13,00	1,30	0,16	2,70	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		11,00	1,15	0,16	2,02	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		7,20	2,33	0,16	2,68	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		2,50	2,60	0,16	1,04	**11,22**
BOSTON - ENCISO						
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,80	3,35	0,10	2,61	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		5,22	2,70	0,10	1,41	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		90,00	1,52	0,10	13,68	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		13,54	1,35	0,10	1,83	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,12	6,82	0,10	0,76	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,60	1,20	0,10	0,91	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,00	0,95	0,10	0,10	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,10	0,95	0,10	0,67	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		9,70	1,10	0,10	1,07	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		10,20	1,20	0,10	1,22	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		90,00	0,27	0,10	2,43	
MENOS CAJAS					1,65	**25,05**
Subtotal						**282,72**
TOTAL						**282,72**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	7
FECHA	DD	4	MM	5	AA	2025	PERÍODO	01/04/2025 - 4/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	3.2.2	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo Ø 2½", reacomodado con medios MECÁNICOS y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	UNID.	m3	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.















LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			CANTIDAD (M3)	MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO	ESPESOR		
Del 01 al 06 de abril del 2025						
CL 57-CR 36A Y 34		67,50	1,30	0,15	13,16	
CL 57-CR 36A Y 34		54,70	1,22	0,15	10,01	
CL 57-CR 36A Y 34		2,50	4,83	0,15	1,81	
CL 57-CR 36A Y 34		8,00	3,85	0,15	4,62	
CL 57-CR 36A Y 34		4,42	2,55	0,15	1,69	
CL 57-CR 36A Y 34		1,60	1,30	0,15	0,31	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		5,90	1,50	0,15	1,33	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		27,10	1,42	0,15	5,77	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,90	4,60	0,15	2,00	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		4,55	1,50	0,15	1,02	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,40	3,00	0,15	1,08	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,45	1,50	0,15	0,55	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		3,00	2,15	0,15	0,97	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		25,60	1,48	0,15	5,68	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		9,50	4,40	0,15	6,27	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		5,50	2,15	0,15	1,77	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,00	2,30	0,15	0,69	
MENOS CAJAS					8,67	**50,08**
BELÉN GRANADA						
CR 75 - CL 30A Y 28		2,30	1,50	0,15	0,52	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,00	2,50	0,15	0,38	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,93	1,50	0,15	0,88	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,00	2,50	0,15	0,38	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,80	1,50	0,15	0,86	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,14	2,46	0,15	1,16	
CR 75 - CL 30A Y 28		0,85	2,50	0,15	0,32	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,10	1,44	0,15	0,24	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,10	1,44	0,15	0,24	
CR 75 - CL 30A Y 28		7,30	2,34	0,15	2,56	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,50	2,50	0,15	0,94	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,05	1,50	0,15	0,69	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,85	2,50	0,15	1,44	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,93	1,50	0,15	0,43	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,06	2,50	0,15	0,77	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,10	1,50	0,15	0,47	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,50	2,90	0,15	1,09	**13,36**
Del 07 al 13 de abril						
BOSTON - ENCISO						
CL 57-CR 36A Y 34		39,00	1,30	0,15	7,61	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,80	3,35	0,15	3,92	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		5,22	2,70	0,15	2,11	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		59,20	1,52	0,15	13,50	
MENOS CAJAS					0,09	**27,05**
LA AMÉRICA - CALASANZ						
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,40	1,35	0,15	0,49	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,40	1,30	0,15	0,47	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,60	1,30	0,15	0,51	**1,46**
BELÉN GRANADA						
CR 75 - CL 30A Y 28		2,00	2,34	0,15	0,70	**0,70**
CR 74 - CL 27 Y 28		5,89	4,30	0,15	3,80	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,30	2,30	0,15	0,45	
CR 74 - CL 27 Y 28		6,40	4,34	0,15	4,17	
CR 74 - CL 27 Y 28		4,00	2,30	0,15	1,38	





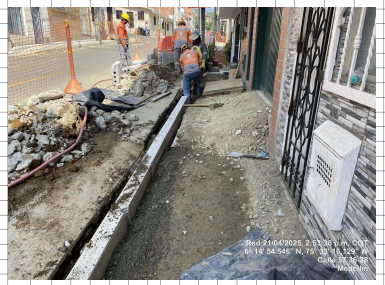



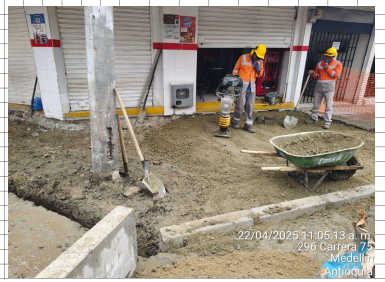

CR 74 - CL 27 Y 28		7,26	4,30	0,15	4,68	
CR 74 - CL 27 Y 28		6,40	4,40	0,15	4,22	**18,70**
POBLADO - FLORIDA						
CL 5 F		21,60	1,45	0,15	4,70	
CL 5 F		33,80	1,40	0,15	7,10	**11,80**
Del 14 al 20 de abril						
BOSTON - ENCISO						
CL 57-CR 36A Y 34		9,30	1,97	0,15	2,75	
CL 57-CR 36A Y 34		23,70	1,50	0,15	5,33	
CL 57-CR 36A Y 34		15,40	1,40	0,15	3,23	
CL 57-CR 36A Y 34		19,80	1,98	0,15	5,88	
CL 57-CR 36A Y 34		4,93	2,10	0,15	1,55	
CL 57-CR 36A Y 34		18,70	1,25	0,15	3,51	
CL 57-CR 36A Y 34		16,90	0,90	0,15	2,28	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,80	3,35	0,15	3,92	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		5,22	2,70	0,15	2,11	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		59,20	1,52	0,15	13,50	
MENOS CAJAS					0,82	**43,25**
BELÉN GRANADA						
CR 75 - CL 30A Y 28		2,83	4,06	0,15	1,72	
CR 75 - CL 30A Y 28		5,00	2,24	0,15	1,68	**3,40**
CL 28 - CR 75 Y 74A		2,80	2,25	0,15	0,95	
CL 28 - CR 75 Y 74A		2,20	0,80	0,15	0,26	
CL 28 - CR 75 Y 74A		2,00	0,80	0,15	0,24	
CL 28 - CR 75 Y 74A		7,20	2,30	0,15	2,48	
CL 28 - CR 75 Y 74A		2,60	1,40	0,15	0,55	
CL 28 - CR 75 Y 74A		10,00	2,30	0,15	3,45	
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,15	1,50	0,15	0,71	
CL 28 - CR 75 Y 74A		4,55	0,50	0,15	0,34	
MENOS CAJAS					0,34	**8,64**
CR 74 - CL 27 Y 28		1,00	2,30	0,15	0,35	
CR 74 - CL 27 Y 28		5,26	4,30	0,15	3,39	**3,74**
LA AMÉRICA - CALASANZ						
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,20	1,20	0,15	0,40	**0,40**
Del 21 al 27 de abril						
BOSTON - ENCISO						
CL 57-CR 36A Y 34		1,50	11,37	0,15	2,56	
CL 57-CR 36A Y 34		1,46	9,60	0,15	2,10	
CL 57-CR 36A Y 34		8,00	1,40	0,15	1,68	
CL 57-CR 36A Y 34		3,60	1,22	0,15	0,66	
CL 57-CR 36A Y 34		3,50	1,60	0,15	0,84	
CL 57-CR 36A Y 34		5,30	1,30	0,15	1,03	
CL 57-CR 36A Y 34		6,40	1,50	0,15	1,44	
CL 57-CR 36A Y 34		5,89	1,42	0,15	1,25	
CL 57-CR 36A Y 34		4,90	1,30	0,15	0,96	
CL 57-CR 36A Y 34		4,34	1,56	0,15	1,02	
CL 57-CR 36A Y 34		3,85	1,46	0,15	0,84	
CL 57-CR 36A Y 34		4,15	1,30	0,15	0,81	
CL 57-CR 36A Y 34		2,00	1,30	2,20	5,72	
MENOS CAJAS					0,86	**20,05**
BELÉN GRANADA						
CR 75 - CL 30A Y 28		16,42	2,24	0,15	5,52	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,83	4,06	0,15	1,72	
CR 75 - CL 30A Y 28		5,00	2,24	0,15	1,68	
CR 75 - CL 30A Y 28		19,29	3,60	0,15	10,42	
MENOS CAJAS					0,08	**19,26**
CL 28 - CR 75 Y 74A		10,00	2,30	0,15	3,45	
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,15	1,50	0,15	0,71	

CL 28 - CR 75 Y 74A		2,20	0,80	0,15	0,26	
CL 28 - CR 75 Y 74A		6,90	2,50	0,15	2,59	
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,60	2,10	0,15	1,13	
CL 28 - CR 75 Y 74A		7,50	3,90	0,15	4,39	
CL 28 - CR 75 Y 74A		2,00	0,80	0,15	0,24	
CL 28 - CR 75 Y 74A		7,20	2,30	0,15	2,48	
CL 28 - CR 75 Y 74A		2,60	1,40	0,15	0,55	**15,80**
CR 74 - CL 27 Y 28		10,00	2,30	0,15	3,45	
CR 74 - CL 27 Y 28		23,00	2,30	0,15	7,94	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,50	2,30	0,15	0,52	
CR 74 - CL 27 Y 28		4,80	4,30	0,15	3,10	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,90	2,40	0,15	0,68	
CR 74 - CL 27 Y 28		2,00	2,00	0,15	0,60	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,80	2,00	0,15	0,54	
MENOS CAJAS					0,26	**16,56**
LA AMÉRICA - CALASANZ						
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,20	1,20	0,15	0,40	**0,40**
POBLADO - FLORIDA						
CALLE 5G		18,50	1,20	0,15	3,33	
CALLE 5G VILLA DEL POBLADO		8,50	3,00	0,15	3,83	
CALLE 5F		25,00	1,60	0,15	6,00	**13,16**
Del 28 de abril al 4 de mayo						
BOSTON - ENCISO						
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		3,50	3,10	0,15	1,63	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,00	1,00	0,15	0,15	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		52,10	1,50	0,15	11,72	
MENOS CAJAS					0,71	**12,79**
POBLADO - FLORIDA						
CALLE 7		4,20	3,30	0,35	4,85	**4,85**
BELÉN GRANADA						
CR 75 - CALLE 30 A Y 28		8,21	1,90	0,15	2,34	**2,34**
CL 28 - CR 75 Y 74A		12,55	1,50	0,15	2,82	**2,82**
POBLADO - LAS LOMAS						
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		6,40	2,70	0,15	2,59	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		13,00	1,30	0,15	2,54	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		11,00	1,15	0,15	1,90	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		7,20	2,33	0,15	2,52	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		2,50	2,60	0,15	0,98	**10,52**
Subtotal						**301,10**
TOTAL						**301,10**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	8
FECHA	DD	4	MM	5	AA	2025	PERÍODO	01/04/2025 - 4/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	


OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	3.3.1	DESCRIPCIÓN	Cargue (Mecánico o Manual) y transporte del material proveniente de las EXPLANACIONES, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O VOLADURAS DE ROCA, hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio. En caso de requerir el pago de derecho de botadero, se pagará en su ítem respectivo.	UNID.	m3-km	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES					CANTIDAD (M3KM)	MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	DISTANCIA		
Del 01 al 06 de abril del 2025								
BOSTON - ENCISO								
CL 57-CR 36A Y 34		8,00	3,85	0,10	3,08	25,00	77,00	
CL 57-CR 36A Y 34		4,42	2,55	0,10	1,13	25,00	28,18	
CL 57-CR 36A Y 34		1,60	1,30	0,10	0,21	25,00	5,20	
CL 57-CR 36A Y 34		81,50	1,30	0,10	10,60	25,00	264,88	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		9,16	0,35	0,48	1,54	25,00	38,47	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		22,77	0,35	0,30	2,39	25,00	59,77	
CL 57-CR 36A Y 34		48,04	0,35	0,48	8,07	25,00	201,77	
CL 57-CR 36A Y 34		48,20	0,35	0,30	5,06	25,00	126,53	
CL 57-CR 36A Y 34		42,55	1,22	0,15	7,79	25,00	194,67	
CL 57-CR 36A Y 34		8,00	3,85	0,15	4,62	25,00	115,50	
CL 57-CR 36A Y 34		4,42	2,55	0,15	1,69	25,00	42,27	
CL 57-CR 36A Y 34		1,60	1,30	0,15	0,31	25,00	7,80	
CL 57-CR 36A Y 34		81,50	1,30	0,15	15,89	25,00	397,31	
MENOS CAJAS					2,47	25,00	61,63	**1.497,71**
LA AMÉRICA - FERRINI								
CL 53A - CR 81 Y 80		1,92	0,80	0,10	0,15	25,00	3,84	**3,84**
BELÉN GRANADA								
CR 75 - CL 30A Y 28		3,14	2,46	0,10	0,77	25,00	19,31	
CR 75 - CL 30A Y 28		0,85	2,50	0,10	0,21	25,00	5,31	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,10	1,44	0,10	0,16	25,00	3,96	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,10	1,44	0,10	0,16	25,00	3,96	
CR 75 - CL 30A Y 28		7,30	2,34	0,10	1,71	25,00	42,71	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,30	1,50	0,10	0,35	25,00	8,63	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,00	2,50	0,10	0,25	25,00	6,25	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,93	1,50	0,10	0,59	25,00	14,74	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,00	2,50	0,10	0,25	25,00	6,25	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,80	1,50	0,10	0,57	25,00	14,25	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,50	2,50	0,10	0,63	25,00	15,63	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,05	1,50	0,10	0,46	25,00	11,44	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,85	2,50	0,10	0,96	25,00	24,06	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,93	1,50	0,10	0,29	25,00	7,24	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,06	2,50	0,10	0,52	25,00	12,88	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,10	1,50	0,10	0,32	25,00	7,88	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,50	2,90	0,10	0,73	25,00	18,13	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,30	1,50	0,15	0,52	25,00	12,94	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,00	2,50	0,15	0,38	25,00	9,38	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,93	1,50	0,15	0,88	25,00	22,11	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,00	2,50	0,15	0,38	25,00	9,38	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,80	1,50	0,15	0,86	25,00	21,38	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,14	2,46	0,15	1,16	25,00	28,97	
CR 75 - CL 30A Y 28		0,85	2,50	0,15	0,32	25,00	7,97	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,10	1,44	0,15	0,24	25,00	5,94	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,10	1,44	0,15	0,24	25,00	5,94	
CR 75 - CL 30A Y 28		7,30	2,34	0,15	2,56	25,00	64,06	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,50	2,50	0,15	0,94	25,00	23,44	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,05	1,50	0,15	0,69	25,00	17,16	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,85	2,50	0,15	1,44	25,00	36,09	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,93	1,50	0,15	0,43	25,00	10,86	

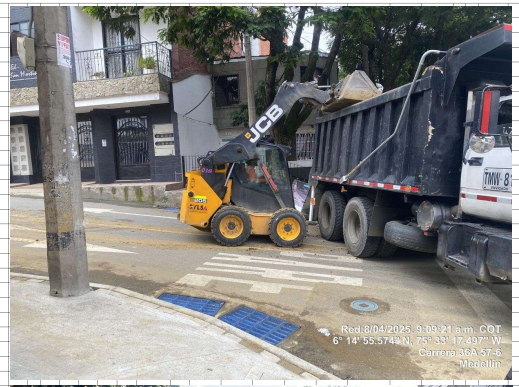





CR 75 - CL 30A Y 28		2,06	2,50	0,15	0,77	25,00	19,31	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,10	1,50	0,15	0,47	25,00	11,81	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,50	2,90	0,15	1,09	25,00	27,19	
CR 75 - CL 30A Y 28		10,30	1,50	0,15	2,32	25,00	57,94	
CR 75 - CL 30A Y 28		5,50	2,50	0,15	2,06	25,00	51,56	
CR 75 - CL 30A Y 28		7,70	1,50	0,15	1,73	25,00	43,31	
CR 75 - CL 30A Y 28		4,30	2,60	0,15	1,68	25,00	41,93	
CR 75 - CL 30A Y 28		7,80	2,50	0,15	2,93	25,00	73,13	
CR 75 - CL 30A Y 28		7,00	1,90	0,15	2,00	25,00	49,88	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,90	0,30	0,50	0,29	25,00	7,13	
CR 75 - CL 30A Y 28		15,00	0,30	0,35	1,58	25,00	39,38	**920,73**
CL 28 - CR 75 Y 74A		30,00	2,50	0,07	5,25	25,00	131,25	
CL 28 - CR 75 Y 74A		39,40	2,50	0,07	6,90	25,00	172,38	
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,60	2,10	0,07	0,53	25,00	13,23	
CL 28 - CR 75 Y 74A		6,90	3,90	0,07	1,88	25,00	47,09	**363,95**
CR 74 - CL 27 Y 28		7,26	4,30	0,08	2,50	25,00	62,44	
CR 74 - CL 27 Y 28		5,70	4,30	0,08	1,96	25,00	49,02	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,30	2,30	0,08	0,24	25,00	5,98	
CR 74 - CL 27 Y 28		6,40	4,34	0,08	2,22	25,00	55,55	
CR 74 - CL 27 Y 28		4,00	2,30	0,08	0,74	25,00	18,40	
CR 74 - CL 27 Y 28		6,40	4,40	0,08	2,25	25,00	56,32	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,00	2,30	0,08	0,18	25,00	4,60	
CR 74 - CL 27 Y 28		5,26	4,30	0,08	1,81	25,00	45,24	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,00	2,30	0,08	0,18	25,00	4,60	
CR 74 - CL 27 Y 28		4,80	4,30	0,08	1,65	25,00	41,28	
CR 74 - CL 27 Y 28		13,00	2,30	0,08	2,39	25,00	59,80	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,60	2,40	0,08	0,31	25,00	7,68	
CR 74 - CL 27 Y 28		2,00	2,00	0,08	0,32	25,00	8,00	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,00	2,00	0,08	0,16	25,00	4,00	
CR 74 - CL 27 Y 28		20,00	2,30	0,08	3,68	25,00	92,00	**514,90**
Del 07 al 13 de abril								
BOSTON - ENCISO								
CL 57-CR 36A Y 34		9,30	1,97	0,10	1,83	25,00	45,80	
CL 57-CR 36A Y 34		23,70	1,50	0,10	3,56	25,00	88,88	
CL 57-CR 36A Y 34		15,40	1,40	0,10	2,16	25,00	53,90	
CL 57-CR 36A Y 34		19,80	1,98	0,10	3,92	25,00	98,01	
CL 57-CR 36A Y 34		4,93	2,10	0,10	1,04	25,00	25,88	
CL 57-CR 36A Y 34		18,70	1,25	0,10	2,34	25,00	58,44	
CL 57-CR 36A Y 34		16,90	0,90	0,10	1,52	25,00	38,03	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,80	3,35	0,15	3,92	25,00	97,99	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		5,22	2,70	0,15	2,11	25,00	52,85	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		90,00	1,52	0,15	20,52	25,00	513,00	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		13,54	1,35	0,15	2,74	25,00	68,55	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,12	6,82	0,15	1,15	25,00	28,64	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,60	1,20	0,15	1,37	25,00	34,20	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,00	0,95	0,15	0,14	25,00	3,56	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,10	0,95	0,15	1,01	25,00	25,29	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,90	1,10	0,15	1,30	25,00	32,59	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		10,20	1,20	0,15	1,84	25,00	45,90	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		90,00	0,27	0,15	3,65	25,00	91,13	
CL 57-CR 36A Y 34		10,60	0,40	0,15	0,64	25,00	15,90	
CL 57-CR 36A Y 34		37,63	0,35	0,48	6,32	25,00	158,05	
CL 57-CR 36A Y 34		44,28	0,35	0,30	4,65	25,00	116,24	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		14,70	0,95	0,20	2,79	25,00	69,83	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		5,65	0,35	0,15	0,30	25,00	7,42	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		6,30	0,35	0,15	0,33	25,00	8,27	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,90	0,35	0,48	0,49	25,00	12,18	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		5,00	0,35	0,30	0,53	25,00	13,13	
MENOS CAJAS					1,244	25,00	31,10	**1.772,53**
LA AMÉRICA - CALASANZ								
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,40	1,35	0,12	0,39	25,00	9,72	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,60	1,30	0,12	0,41	25,00	10,14	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,40	1,30	0,12	0,37	25,00	9,36	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,60	1,30	0,13	0,44	25,00	10,99	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,40	1,35	0,13	0,42	25,00	10,53	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,40	1,30	0,13	0,41	25,00	10,14	
CL 50A - CR 86 Y 96C		8,40	0,30	0,50	1,26	25,00	31,50	**92,38**
BELÉN GRANADA								
CR 75 - CL 30A Y 28		19,29	3,60	0,10	6,94	25,00	173,61	
CR 75 - CL 30A Y 28		16,42	2,24	0,10	3,68	25,00	91,95	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,83	4,06	0,10	1,15	25,00	28,72	**294,29**
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,15	1,50	0,25	1,18	25,00	29,53	
CL 28 - CR 75 Y 74A		4,20	2,50	0,18	1,89	25,00	47,25	
CL 28 - CR 75 Y 74A		5,30	1,50	0,18	1,43	25,00	35,78	
CL 28 - CR 75 Y 74A		15,00	2,50	0,18	6,75	25,00	168,75	
CL 28 - CR 75 Y 74A		6,00	2,50	0,18	2,70	25,00	67,50	
CL 28 - CR 75 Y 74A		69,40	0,30	0,50	10,41	25,00	260,25	**609,06**
CR 74 - CL 27 Y 28		1,00	0,88	0,08	0,07	25,00	1,76	







CR 74 - CL 27 Y 28		5,89	4,30	0,17	4,31	25,00	107,64	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,30	2,30	0,17	0,51	25,00	12,71	
CR 74 - CL 27 Y 28		6,40	4,34	0,17	4,72	25,00	118,05	
CR 74 - CL 27 Y 28		4,00	2,30	0,17	1,56	25,00	39,10	
CR 74 - CL 27 Y 28		7,26	4,30	0,17	5,31	25,00	132,68	
CR 74 - CL 27 Y 28		6,40	4,40	0,17	4,79	25,00	119,68	
CR 74 - CL 27 Y 28		23,12	0,30	0,50	3,47	25,00	86,70	**618,31**
POBLADO - FLORIDA								
CL 5 F		21,60	1,45	0,16	5,01	25,00	125,28	
CL 5 F		33,80	1,40	0,16	7,57	25,00	189,28	
CL 5 F		21,60	1,45	0,09	2,82	25,00	70,47	
CL 5 F		33,80	1,40	0,09	4,26	25,00	106,47	
CL 5 F		55,40	0,35	0,30	5,82	25,00	145,43	**636,93**
Del 14 al 20 de abril								
BOSTON - ENCISO								
CL 57-CR 36A Y 34		9,30	1,97	0,15	2,75	25,00	68,70	
CL 57-CR 36A Y 34		23,70	1,50	0,15	5,33	25,00	133,31	
CL 57-CR 36A Y 34		15,40	1,40	0,15	3,23	25,00	80,85	
CL 57-CR 36A Y 34		19,80	1,98	0,15	5,88	25,00	147,02	
CL 57-CR 36A Y 34		4,93	2,10	0,15	1,55	25,00	38,82	
CL 57-CR 36A Y 34		18,70	1,25	0,15	3,51	25,00	87,66	
CL 57-CR 36A Y 34		16,90	0,90	0,15	2,28	25,00	57,04	
CL 57-CR 36A Y 34		37,67	0,35	0,30	3,96	25,00	98,88	
CL 57-CR 36A Y 34		16,95	0,35	0,48	2,85	25,00	71,19	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		37,90	0,35	0,48	6,37	25,00	159,18	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		67,70	0,35	0,30	7,11	25,00	177,71	
MENOS CAJAS							20,49	**1.099,87**
BELÉN GRANADA								
CR 75 - CL 30A Y 28		2,83	4,06	0,16	1,84	25,00	45,96	
CR 75 - CL 30A Y 28		5,00	2,24	0,16	1,79	25,00	44,80	
CR 75 - CL 30A Y 28		23,66	0,30	0,50	3,55	25,00	88,73	
CR 75 - CL 30A Y 28		36,20	0,30	0,35	3,80	25,00	95,03	**274,51**
CL 28 - CR 75 Y 74A		2,80	2,25	0,18	1,13	25,00	28,35	
CL 28 - CR 75 Y 74A		2,20	0,80	0,18	0,32	25,00	7,92	
CL 28 - CR 75 Y 74A		2,00	0,80	0,18	0,29	25,00	7,20	
CL 28 - CR 75 Y 74A		7,20	2,30	0,18	2,98	25,00	74,52	
CL 28 - CR 75 Y 74A		2,60	1,40	0,18	0,66	25,00	16,38	
CL 28 - CR 75 Y 74A		10,00	2,30	0,18	4,14	25,00	103,50	
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,15	1,50	0,18	0,85	25,00	21,26	**259,13**
CR 74 - CL 27 Y 28		1,00	2,30	0,17	0,39	25,00	9,78	
CR 74 - CL 27 Y 28		5,26	4,30	0,17	3,85	25,00	96,13	
CR 74 - CL 27 Y 28		27,00	0,30	0,50	4,05	25,00	101,25	
CR 74 - CL 27 Y 28		40,00	0,30	0,30	3,60	25,00	90,00	**297,15**
LA AMÉRICA - CALASANZ								
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,20	1,20	0,12	0,32	25,00	7,92	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,20	1,20	0,13	0,34	25,00	8,58	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,40	0,30	0,50	0,36	25,00	9,00	**25,50**
Del 21 al 27 de abril								
BOSTON - ENCISO								
CL 57-CR 36A Y 34		1,50	11,37	0,10	1,71	25,00	42,64	
CL 57-CR 36A Y 34		1,46	9,60	0,10	1,40	25,00	35,04	
CL 57-CR 36A Y 34		8,00	1,40	0,10	1,12	25,00	28,00	
CL 57-CR 36A Y 34		3,60	1,22	0,10	0,44	25,00	10,98	
CL 57-CR 36A Y 34		3,50	1,60	0,10	0,56	25,00	14,00	
CL 57-CR 36A Y 34		5,30	1,30	0,10	0,69	25,00	17,23	
CL 57-CR 36A Y 34		6,40	1,50	0,10	0,96	25,00	24,00	
CL 57-CR 36A Y 34		5,89	1,42	0,10	0,84	25,00	20,91	
CL 57-CR 36A Y 34		4,90	1,30	0,10	0,64	25,00	15,93	
CL 57-CR 36A Y 34		4,34	1,56	0,10	0,68	25,00	16,93	
CL 57-CR 36A Y 34		3,85	1,46	0,10	0,56	25,00	14,05	
CL 57-CR 36A Y 34		4,15	1,30	0,10	0,54	25,00	13,49	
CL 37D-CR 82A Y 83A		1,55	2,25	0,10	0,35	25,00	8,72	
CL 37D-CR 82A Y 83A		1,30	6,05	0,10	0,79	25,00	19,66	
CL 37D-CR 82A Y 83A		3,61	1,53	0,10	0,55	25,00	13,81	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,80	3,35	0,10	2,61	25,00	65,33	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		5,22	2,70	0,10	1,41	25,00	35,24	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		90,00	1,52	0,10	13,68	25,00	342,00	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		13,54	1,35	0,10	1,83	25,00	45,70	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,12	6,82	0,10	0,76	25,00	19,10	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,60	1,20	0,10	0,91	25,00	22,80	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,00	0,95	0,10	0,10	25,00	2,38	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,10	0,95	0,10	0,67	25,00	16,86	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,90	1,10	0,10	0,87	25,00	21,73	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		10,20	1,20	0,10	1,22	25,00	30,60	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		90,00	0,27	0,10	2,43	25,00	60,75	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 55		15,40	0,35	0,48	2,59	25,00	64,68	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 55		7,20	0,35	0,48	1,21	25,00	30,24	
CL 57-CR 36A Y 34		1,50	11,37	0,15	2,56	25,00	63,96	
CL 57-CR 36A Y 34		1,46	9,60	0,15	2,10	25,00	52,56	





CL 57-CR 36A Y 34		8,00	1,40	0,15	1,68	25,00	42,00	
CL 57-CR 36A Y 34		3,60	1,22	0,15	0,66	25,00	16,47	
CL 57-CR 36A Y 34		3,50	1,60	0,15	0,84	25,00	21,00	
CL 57-CR 36A Y 34		5,30	1,30	0,15	1,03	25,00	25,84	
CL 57-CR 36A Y 34		6,40	1,50	0,15	1,44	25,00	36,00	
CL 57-CR 36A Y 34		5,89	1,42	0,15	1,25	25,00	31,36	
CL 57-CR 36A Y 34		4,90	1,30	0,15	0,96	25,00	23,89	
CL 57-CR 36A Y 34		4,34	1,56	0,15	1,02	25,00	25,39	
CL 57-CR 36A Y 34		3,85	1,46	0,15	0,84	25,00	21,08	
CL 57-CR 36A Y 34		4,15	1,30	0,15	0,81	25,00	20,23	
CL 57-CR 36A Y 34		8,70	0,35	0,30	0,91	25,00	22,84	
CL 57-CR 36A Y 34		41,60	0,35	0,48	6,99	25,00	174,72	
CL 37D-CR 82A Y 83A		1,55	2,25	0,15	0,52	25,00	13,08	
CL 37D-CR 82A Y 83A		1,30	6,05	0,15	1,18	25,00	29,49	
CL 37D-CR 82A Y 83A		3,61	1,53	0,15	0,83	25,00	20,71	
MENOS CAJAS							47,63	**1.645,75**
BELÉN GRANADA								
CR 75 - CL 30A Y 28		5,00	2,24	0,16	1,79	25,00	44,80	
CR 75 - CL 30A Y 28		16,42	2,24	0,16	5,88	25,00	147,12	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,83	4,06	0,16	1,84	25,00	45,96	
CR 75 - CL 30A Y 28		20,00	0,50	0,30	3,00	25,00	75,00	
CR 75 - CL 30A Y 28		84,07	0,30	0,30	7,57	25,00	189,16	**502,04**
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,60	2,10	0,18	1,36	25,00	34,02	
CL 28 - CR 75 Y 74A		6,90	3,90	0,18	4,84	25,00	121,10	
CL 28 - CR 75 Y 74A		29,00	0,30	0,30	2,61	25,00	65,25	**220,37**
CR 74 - CL 27 Y 28		33,00	2,30	0,17	12,90	25,00	322,58	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,00	2,30	0,17	0,39	25,00	9,78	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,60	2,40	0,17	0,65	25,00	16,32	
CR 74 - CL 27 Y 28		2,00	2,00	0,17	0,68	25,00	17,00	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,00	2,00	0,17	0,34	25,00	8,50	
CR 74 - CL 27 Y 28		4,80	4,30	0,17	3,51	25,00	87,72	
CR 74 - CL 27 Y 28		5,08	0,50	0,30	0,76	25,00	19,05	
CR 74 - CL 27 Y 28		58,00	0,30	0,30	5,22	25,00	130,50	**611,44**
LA AMÉRICA - CALASANZ								
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,20	1,20	0,12	0,32	25,00	7,92	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,20	1,20	0,13	0,34	25,00	8,58	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,40	0,30	0,50	0,36	25,00	9,00	**25,50**
POBLADO - FLORIDA								
CALLE 7 - CRA 33-34		82,20	0,20	0,10	1,64	25,00	41,10	
CALLE 7 - CRA 33-34		31,00	0,20	0,10	0,62	25,00	15,50	**56,60**
CALLE 5G		18,50	1,20	0,16	3,55	25,00	88,80	
CALLE 5G VILLA DEL POBLADO		8,50	3,00	0,26	6,63	25,00	165,75	
CALLE 5F		25,00	1,60	0,16	6,40	25,00	160,00	
CALLE 5G		18,50	1,20	0,09	2,00	25,00	49,95	
CALLE 5G VILLA DEL POBLADO		8,50	3,00	0,09	2,30	25,00	57,38	
CALLE 5F		25,00	1,60	0,09	3,60	25,00	90,00	**611,88**
Del 28 de abril al 4 de mayo								
CANDELARIA - BOSTON								
CR 40-CL 54 Y 56		13,70	2,07	0,15	4,25	25,00	106,35	
CR 40-CL 54 Y 56		4,93	1,80	0,15	1,33	25,00	33,28	
CR 40-CL 54 Y 56		5,20	1,60	0,15	1,25	25,00	31,20	
CR 40-CL 54 Y 56		16,30	1,54	0,15	3,77	25,00	94,13	
CR 40-CL 54 Y 56		30,00	1,66	0,15	7,47	25,00	186,75	
CR 40-CL 54 Y 56		25,20	1,60	0,15	6,05	25,00	151,20	
CR 40-CL 54 Y 56		4,70	3,10	0,15	2,19	25,00	54,64	
CR 40-CL 54 Y 56		12,00	1,95	0,15	3,51	25,00	87,75	
CR 40-CL 54 Y 56		2,53	1,87	0,15	0,71	25,00	17,74	
CR 40-CL 54 Y 56		1,63	2,00	0,15	0,49	25,00	12,23	
CR 40-CL 54 Y 56		7,50	0,65	0,35	1,71	25,00	42,66	
CR 40-CL 54 Y 56		8,20	0,70	0,35	2,01	25,00	50,23	
CR 40-CL 54 Y 56		8,90	0,68	0,35	2,12	25,00	52,96	
BOSTON - ENCISO								
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		3,80	3,10	0,10	1,18	25,00	29,45	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,10	0,62	0,10	0,07	25,00	1,71	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		71,10	1,50	0,10	10,67	25,00	266,63	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		9,00	1,40	0,10	1,26	25,00	31,50	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,40	3,00	0,10	0,42	25,00	10,50	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,30	1,00	0,10	0,13	25,00	3,25	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		9,50	1,98	0,10	1,88	25,00	47,03	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		4,65	2,16	0,10	1,00	25,00	25,11	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,10	1,30	0,10	0,92	25,00	23,08	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		4,90	2,00	0,50	4,90	25,00	122,50	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		13,50	0,60	0,15	1,22	25,00	30,38	
MENOS CAJAS							2,42	**1.509,79**

CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,80	3,35	0,10	2,61	25,00	65,33	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		5,22	2,70	0,10	1,41	25,00	35,24	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		90,00	1,52	0,10	13,68	25,00	342,00	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		13,54	1,35	0,10	1,83	25,00	45,70	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,12	6,82	0,10	0,76	25,00	19,10	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,60	1,20	0,10	0,91	25,00	22,80	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,00	0,95	0,10	0,10	25,00	2,38	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,10	0,95	0,10	0,67	25,00	16,86	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		9,70	1,10	0,10	1,07	25,00	26,68	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		10,20	1,20	0,10	1,22	25,00	30,60	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		90,00	0,27	0,10	2,43	25,00	60,75	
MENOS CAJAS					1,65	25,00	41,25	**708,67**
POBLADO - LAS LOMAS								
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		6,40	2,70	0,09	1,56	25,00	38,88	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		13,00	1,30	0,09	1,52	25,00	38,03	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		11,00	1,15	0,09	1,14	25,00	28,46	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		7,20	2,33	0,09	1,51	25,00	37,75	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		2,50	2,60	0,09	0,59	25,00	14,63	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		6,40	2,70	0,16	2,76	25,00	69,12	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		13,00	1,30	0,16	2,70	25,00	67,60	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		11,00	1,15	0,16	2,02	25,00	50,60	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		7,20	2,33	0,16	2,68	25,00	67,10	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		2,50	2,60	0,16	1,04	25,00	26,00	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		100,00	0,35	0,50	17,50	25,00	437,50	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		80,00	0,35	0,30	8,40	25,00	210,00	**1.085,66**
				Subtotal				**16.258,47**
				TOTAL				**16.258,47**

OBSERVACIONES: Las celdas señaladas de color verde, hacen referencia a la demolición y las de color azul, a las excavaciones pertinentes por frente de trabajo.

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	9
FECHA	DD	4	MM	5	AA	2025	PERÍODO	01/04/2025 - 4/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	3.3.2	DESCRIPCIÓN	Derechos de Botadero en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental	UNID.	m3	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	
Del 01 al 06 de abril del 2025						
BOSTON - ENCISO						
CL 57-CR 36A Y 34		8,00	3,85	0,10	3,08	
CL 57-CR 36A Y 34		4,42	2,55	0,10	1,13	
CL 57-CR 36A Y 34		1,60	1,30	0,10	0,21	
CL 57-CR 36A Y 34		81,50	1,30	0,10	10,60	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		9,16	0,35	0,48	1,54	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		22,77	0,35	0,30	2,39	
CL 57-CR 36A Y 34		48,04	0,35	0,48	8,07	
CL 57-CR 36A Y 34		48,20	0,35	0,30	5,06	
CL 57-CR 36A Y 34		42,55	1,22	0,15	7,79	
CL 57-CR 36A Y 34		8,00	3,85	0,15	4,62	
CL 57-CR 36A Y 34		4,42	2,55	0,15	1,69	
CL 57-CR 36A Y 34		1,60	1,30	0,15	0,31	
CL 57-CR 36A Y 34		81,50	1,30	0,15	15,89	
MENOS CAJAS					2,47	**59,91**
LA AMÉRICA - FERRINI						
CL 53A - CR 81 Y 80		1,92	0,80	0,10	0,15	**0,15**
BELÉN GRANADA						
CR 75 - CL 30A Y 28		3,14	2,46	0,10	0,77	
CR 75 - CL 30A Y 28		0,85	2,50	0,10	0,21	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,10	1,44	0,10	0,16	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,10	1,44	0,10	0,16	
CR 75 - CL 30A Y 28		7,30	2,34	0,10	1,71	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,30	1,50	0,10	0,35	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,00	2,50	0,10	0,25	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,93	1,50	0,10	0,59	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,00	2,50	0,10	0,25	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,80	1,50	0,10	0,57	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,50	2,50	0,10	0,63	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,05	1,50	0,10	0,46	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,85	2,50	0,10	0,96	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,93	1,50	0,10	0,29	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,06	2,50	0,10	0,52	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,10	1,50	0,10	0,32	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,50	2,90	0,10	0,73	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,30	1,50	0,15	0,52	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,00	2,50	0,15	0,38	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,93	1,50	0,15	0,88	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,00	2,50	0,15	0,38	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,80	1,50	0,15	0,86	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,14	2,46	0,15	1,16	
CR 75 - CL 30A Y 28		0,85	2,50	0,15	0,32	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,10	1,44	0,15	0,24	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,10	1,44	0,15	0,24	
CR 75 - CL 30A Y 28		7,30	2,34	0,15	2,56	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,50	2,50	0,15	0,94	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,05	1,50	0,15	0,69	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,85	2,50	0,15	1,44	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,93	1,50	0,15	0,43	







CR 75 - CL 30A Y 28		2,06	2,50	0,15	0,77	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,10	1,50	0,15	0,47	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,50	2,90	0,15	1,09	
CR 75 - CL 30A Y 28		10,30	1,50	0,15	2,32	
CR 75 - CL 30A Y 28		5,50	2,50	0,15	2,06	
CR 75 - CL 30A Y 28		7,70	1,50	0,15	1,73	
CR 75 - CL 30A Y 28		4,30	2,60	0,15	1,68	
CR 75 - CL 30A Y 28		7,80	2,50	0,15	2,93	
CR 75 - CL 30A Y 28		7,00	1,90	0,15	2,00	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,90	0,30	0,50	0,29	
CR 75 - CL 30A Y 28		15,00	0,30	0,35	1,58	**36,83**
CL 28 - CR 75 Y 74A		30,00	2,50	0,07	5,25	
CL 28 - CR 75 Y 74A		39,40	2,50	0,07	6,90	
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,60	2,10	0,07	0,53	
CL 28 - CR 75 Y 74A		6,90	3,90	0,07	1,88	**14,56**
CR 74 - CL 27 Y 28		7,26	4,30	0,08	2,50	
CR 74 - CL 27 Y 28		5,70	4,30	0,08	1,96	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,30	2,30	0,08	0,24	
CR 74 - CL 27 Y 28		6,40	4,34	0,08	2,22	
CR 74 - CL 27 Y 28		4,00	2,30	0,08	0,74	
CR 74 - CL 27 Y 28		6,40	4,40	0,08	2,25	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,00	2,30	0,08	0,18	
CR 74 - CL 27 Y 28		5,26	4,30	0,08	1,81	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,00	2,30	0,08	0,18	
CR 74 - CL 27 Y 28		4,80	4,30	0,08	1,65	
CR 74 - CL 27 Y 28		13,00	2,30	0,08	2,39	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,60	2,40	0,08	0,31	
CR 74 - CL 27 Y 28		2,00	2,00	0,08	0,32	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,00	2,00	0,08	0,16	
CR 74 - CL 27 Y 28		20,00	2,30	0,08	3,68	**20,60**
Del 07 al 13 de abril						
BOSTON - ENCISO						
CL 57-CR 36A Y 34		9,30	1,97	0,10	1,83	
CL 57-CR 36A Y 34		23,70	1,50	0,10	3,56	
CL 57-CR 36A Y 34		15,40	1,40	0,10	2,16	
CL 57-CR 36A Y 34		19,80	1,98	0,10	3,92	
CL 57-CR 36A Y 34		4,93	2,10	0,10	1,04	
CL 57-CR 36A Y 34		18,70	1,25	0,10	2,34	
CL 57-CR 36A Y 34		16,90	0,90	0,10	1,52	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,80	3,35	0,15	3,92	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		5,22	2,70	0,15	2,11	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		90,00	1,52	0,15	20,52	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		13,54	1,35	0,15	2,74	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,12	6,82	0,15	1,15	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,60	1,20	0,15	1,37	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,00	0,95	0,15	0,14	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,10	0,95	0,15	1,01	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,90	1,10	0,15	1,30	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		10,20	1,20	0,15	1,84	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		90,00	0,27	0,15	3,65	
CL 57-CR 36A Y 34		10,60	0,40	0,15	0,64	
CL 57-CR 36A Y 34		37,63	0,35	0,48	6,32	
CL 57-CR 36A Y 34		44,28	0,35	0,30	4,65	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		14,70	0,95	0,20	2,79	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		5,65	0,35	0,15	0,30	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		6,30	0,35	0,15	0,33	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,90	0,35	0,48	0,49	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		5,00	0,35	0,30	0,53	
MENOS CAJAS					0,5465	**71,60**
LA AMÉRICA - CALASANZ						
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,40	1,35	0,12	0,39	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,60	1,30	0,12	0,41	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,40	1,30	0,12	0,37	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,60	1,30	0,13	0,44	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,40	1,35	0,13	0,42	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,40	1,30	0,13	0,41	
CL 50A - CR 86 Y 96C		8,40	0,30	0,50	1,26	**3,70**
BELÉN GRANADA						
CR 75 - CL 30A Y 28		19,29	3,60	0,10	6,94	
CR 75 - CL 30A Y 28		16,42	2,24	0,10	3,68	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,83	4,06	0,10	1,15	
CR 75 - CL 30A Y 28		19,29	3,60	0,10	6,94	
CR 75 - CL 30A Y 28		16,42	2,24	0,10	3,68	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,83	4,06	0,10	1,15	**23,54**
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,15	1,50	0,25	1,18	
CL 28 - CR 75 Y 74A		4,20	2,50	0,18	1,89	
CL 28 - CR 75 Y 74A		5,30	1,50	0,18	1,43	
CL 28 - CR 75 Y 74A		15,00	2,50	0,18	6,75	







CL 28 - CR 75 Y 74A		6,00	2,50	0,18	2,70	
CL 28 - CR 75 Y 74A		69,40	0,30	0,50	10,41	**24,36**
CR 74 - CL 27 Y 28		1,00	0,88	0,08	0,07	
CR 74 - CL 27 Y 28		5,89	4,30	0,17	4,31	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,30	2,30	0,17	0,51	
CR 74 - CL 27 Y 28		6,40	4,34	0,17	4,72	
CR 74 - CL 27 Y 28		4,00	2,30	0,17	1,56	
CR 74 - CL 27 Y 28		7,26	4,30	0,17	5,31	
CR 74 - CL 27 Y 28		6,40	4,40	0,17	4,79	
CR 74 - CL 27 Y 28		23,12	0,30	0,50	3,47	**24,73**
POBLADO - FLORIDA						
CL 5 F		21,60	1,45	0,16	5,01	
CL 5 F		33,80	1,40	0,16	7,57	
CL 5 F		21,60	1,45	0,09	2,82	
CL 5 F		33,80	1,40	0,09	4,26	
CL 5 F		55,40	0,35	0,30	5,82	**25,48**
Del 14 al 20 de abril						
BOSTON - ENCISO						
CL 57-CR 36A Y 34		9,30	1,97	0,15	2,75	
CL 57-CR 36A Y 34		23,70	1,50	0,15	5,33	
CL 57-CR 36A Y 34		15,40	1,40	0,15	3,23	
CL 57-CR 36A Y 34		19,80	1,98	0,15	5,88	
CL 57-CR 36A Y 34		4,93	2,10	0,15	1,55	
CL 57-CR 36A Y 34		18,70	1,25	0,15	3,51	
CL 57-CR 36A Y 34		16,90	0,90	0,15	2,28	
CL 57-CR 36A Y 34		37,67	0,35	0,30	3,96	
CL 57-CR 36A Y 34		16,95	0,35	0,48	2,85	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		37,90	0,35	0,48	6,37	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		67,70	0,35	0,30	7,11	
MENOS CAJAS					0,82	43,99
BELÉN GRANADA						
CR 75 - CL 30A Y 28		2,83	4,06	0,16	1,84	
CR 75 - CL 30A Y 28		5,00	2,24	0,16	1,79	
CR 75 - CL 30A Y 28		23,66	0,30	0,50	3,55	
CR 75 - CL 30A Y 28		36,20	0,30	0,35	3,80	**10,98**
CL 28 - CR 75 Y 74A		2,80	2,25	0,18	1,13	
CL 28 - CR 75 Y 74A		2,20	0,80	0,18	0,32	
CL 28 - CR 75 Y 74A		2,00	0,80	0,18	0,29	
CL 28 - CR 75 Y 74A		7,20	2,30	0,18	2,98	
CL 28 - CR 75 Y 74A		2,60	1,40	0,18	0,66	
CL 28 - CR 75 Y 74A		10,00	2,30	0,18	4,14	
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,15	1,50	0,18	0,85	**10,37**
CR 74 - CL 27 Y 28		1,00	2,30	0,17	0,39	
CR 74 - CL 27 Y 28		5,26	4,30	0,17	3,85	
CR 74 - CL 27 Y 28		27,00	0,30	0,50	4,05	
CR 74 - CL 27 Y 28		40,00	0,30	0,30	3,60	**11,89**
LA AMÉRICA - CALASANZ						
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,20	1,20	0,12	0,32	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,20	1,20	0,13	0,34	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,40	0,30	0,50	0,36	**1,02**
Del 21 al 27 de abril						
BOSTON - ENCISO						
CL 57-CR 36A Y 34		1,50	11,37	0,10	1,71	
CL 57-CR 36A Y 34		1,46	9,60	0,10	1,40	
CL 57-CR 36A Y 34		8,00	1,40	0,10	1,12	
CL 57-CR 36A Y 34		3,60	1,22	0,10	0,44	
CL 57-CR 36A Y 34		3,50	1,60	0,10	0,56	
CL 57-CR 36A Y 34		5,30	1,30	0,10	0,69	
CL 57-CR 36A Y 34		6,40	1,50	0,10	0,96	
CL 57-CR 36A Y 34		5,89	1,42	0,10	0,84	
CL 57-CR 36A Y 34		4,90	1,30	0,10	0,64	
CL 57-CR 36A Y 34		4,34	1,56	0,10	0,68	
CL 57-CR 36A Y 34		3,85	1,46	0,10	0,56	
CL 57-CR 36A Y 34		4,15	1,30	0,10	0,54	
CL 37D-CR 82A Y 83A		1,55	2,25	0,10	0,35	
CL 37D-CR 82A Y 83A		1,30	6,05	0,10	0,79	
CL 37D-CR 82A Y 83A		3,61	1,53	0,10	0,55	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,80	3,35	0,10	2,61	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		5,22	2,70	0,10	1,41	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		90,00	1,52	0,10	13,68	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		13,54	1,35	0,10	1,83	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,12	6,82	0,10	0,76	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,60	1,20	0,10	0,91	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,00	0,95	0,10	0,10	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,10	0,95	0,10	0,67	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,90	1,10	0,10	0,87	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		10,20	1,20	0,10	1,22	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		90,00	0,27	0,10	2,43	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 55		15,40	0,35	0,48	2,59	






CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 55		7,20	0,35	0,48	1,21	
CL 57-CR 36A Y 34		1,50	11,37	0,15	2,56	
CL 57-CR 36A Y 34		1,46	9,60	0,15	2,10	
CL 57-CR 36A Y 34		8,00	1,40	0,15	1,68	
CL 57-CR 36A Y 34		3,60	1,22	0,15	0,66	
CL 57-CR 36A Y 34		3,50	1,60	0,15	0,84	
CL 57-CR 36A Y 34		5,30	1,30	0,15	1,03	
CL 57-CR 36A Y 34		6,40	1,50	0,15	1,44	
CL 57-CR 36A Y 34		5,89	1,42	0,15	1,25	
CL 57-CR 36A Y 34		4,90	1,30	0,15	0,96	
CL 57-CR 36A Y 34		4,34	1,56	0,15	1,02	
CL 57-CR 36A Y 34		3,85	1,46	0,15	0,84	
CL 57-CR 36A Y 34		4,15	1,30	0,15	0,81	
CL 57-CR 36A Y 34		8,70	0,35	0,30	0,91	
CL 57-CR 36A Y 34		41,60	0,35	0,48	6,99	
CL 37D-CR 82A Y 83A		1,55	2,25	0,15	0,52	
CL 37D-CR 82A Y 83A		1,30	6,05	0,15	1,18	
CL 37D-CR 82A Y 83A		3,61	1,53	0,15	0,83	
MENOS CAJAS					1,91	**65,83**
BELÉN GRANADA						
CR 75 - CL 30A Y 28		5,00	2,24	0,16	1,79	
CR 75 - CL 30A Y 28		16,42	2,24	0,16	5,88	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,83	4,06	0,16	1,84	
CR 75 - CL 30A Y 28		20,00	0,50	0,30	3,00	
CR 75 - CL 30A Y 28		84,07	0,30	0,30	7,57	**20,08**
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,60	2,10	0,18	1,36	
CL 28 - CR 75 Y 74A		6,90	3,90	0,18	4,84	
CL 28 - CR 75 Y 74A		29,00	0,30	0,30	2,61	**8,81**
CR 74 - CL 27 Y 28		33,00	2,30	0,17	12,90	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,00	2,30	0,17	0,39	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,60	2,40	0,17	0,65	
CR 74 - CL 27 Y 28		2,00	2,00	0,17	0,68	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,00	2,00	0,17	0,34	
CR 74 - CL 27 Y 28		4,80	4,30	0,17	3,51	
CR 74 - CL 27 Y 28		5,08	0,50	0,30	0,76	
CR 74 - CL 27 Y 28		58,00	0,30	0,30	5,22	**24,46**
LA AMÉRICA - CALASANZ						
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,20	1,20	0,12	0,32	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,20	1,20	0,13	0,34	
CL 50A - CR 86 Y 96C		2,40	0,30	0,50	0,36	**1,02**
POBLADO - FLORIDA						
CALLE 7 - CRA 33-34		82,20	0,20	0,10	1,64	
CALLE 7 - CRA 33-34		31,00	0,20	0,10	0,62	**2,26**
CALLE 5G		18,50	1,20	0,16	3,55	
CALLE 5G VILLA DEL POBLADO		8,50	3,00	0,26	6,63	
CALLE 5F		25,00	1,60	0,16	6,40	
CALLE 5G		18,50	1,20	0,09	2,00	
CALLE 5G VILLA DEL POBLADO		8,50	3,00	0,09	2,30	
CALLE 5F		25,00	1,60	0,09	3,60	**24,48**
Del 28 de abril al 4 de mayo						
CANDELARIA - BOSTON						
CR 40-CL 54 Y 56		13,70	2,07	0,15	4,25	
CR 40-CL 54 Y 56		4,93	1,80	0,15	1,33	
CR 40-CL 54 Y 56		5,20	1,60	0,15	1,25	
CR 40-CL 54 Y 56		16,30	1,54	0,15	3,77	
CR 40-CL 54 Y 56		30,00	1,66	0,15	7,47	
CR 40-CL 54 Y 56		25,20	1,60	0,15	6,05	
CR 40-CL 54 Y 56		4,70	3,10	0,15	2,19	
CR 40-CL 54 Y 56		12,00	1,95	0,15	3,51	
CR 40-CL 54 Y 56		2,53	1,87	0,15	0,71	
CR 40-CL 54 Y 56		1,63	2,00	0,15	0,49	
CR 40-CL 54 Y 56		7,50	0,65	0,35	1,71	
CR 40-CL 54 Y 56		8,20	0,70	0,35	2,01	

CR 40-CL 54 Y 56		8,90	0,68	0,35	2,12	
BOSTON - ENCISO						
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		3,80	3,10	0,10	1,18	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,10	0,62	0,10	0,07	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		71,10	1,50	0,10	10,67	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		9,00	1,40	0,10	1,26	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,40	3,00	0,10	0,42	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,30	1,00	0,10	0,13	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		9,50	1,98	0,10	1,88	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		4,65	2,16	0,10	1,00	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,10	1,30	0,10	0,92	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		4,90	2,00	0,50	4,90	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		13,50	0,60	0,15	1,22	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		3,80	3,10	0,15	1,77	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,10	0,62	0,15	0,10	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		71,10	1,50	0,15	16,00	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		9,00	1,40	0,15	1,89	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,40	3,00	0,15	0,63	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,30	1,00	0,15	0,20	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		9,50	1,98	0,15	2,82	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		4,65	2,16	0,15	1,51	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,10	1,30	0,15	1,38	
MENOS CAJAS					3,13	**83,65**
POBLADO - LAS LOMAS						
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		6,40	2,70	0,09	1,56	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		13,00	1,30	0,09	1,52	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		11,00	1,15	0,09	1,14	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		7,20	2,33	0,09	1,51	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		2,50	2,60	0,09	0,59	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		6,40	2,70	0,16	2,76	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		13,00	1,30	0,16	2,70	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		11,00	1,15	0,16	2,02	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		7,20	2,33	0,16	2,68	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		2,50	2,60	0,16	1,04	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		100,00	0,35	0,50	17,50	
CL 11B - CR 34 Y CL 11A		80,00	0,35	0,30	8,40	**43,43**
Subtotal						**657,72**
TOTAL						**657,72**

OBSERVACIONES: Las celdas señaladas de color verde, hacen referencia a la demolición y las de color azul, a las excavaciones pertinentes por frente de trabajo.



CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA



INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	10
FECHA	DD	4	MM	5	AA	2025	PERÍODO	01/04/2025 - 4/05/2025	ELABORÓ		ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
CONTRATO No	4600102792 DE 2024
FECHA DE INICIO	

ÍTEM	4.1.1	DESCRIPCIÓN	Construcción de ANDÉN en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.08 m (8 centímetros) Vaciado alternado (Junta fría). Incluye suministro y transporte de los materiales, acabado escobillado y llaneado 0.10 m en los bordes TIPO METRO, los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Se ejecutarán los rebajes que sean necesarios para garantizar el acceso de los discapacitados y hasta una huellas y una contrahuella necesarias en los lugares que indique la interventoría. Las excavaciones o descapotes, malla y material de soporte (base, sub base, entresuelo o arenilla) así como las llaves en caso de requerirse, se pagarán en su ítem respectivo.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
Del 01 al 06 de abril del 2025					
LA AMÉRICA - FERRINI					
CL 53A - CR 81 Y 80		1,92	0,80	1,54	**1,54**
Del 07 al 13 de abril					
LA AMÉRICA - CALASANZ					
CL 50A - CR 86 Y 96C		0,40	1,40	0,56	
CL 50A - CR 86 Y 96C		0,40	1,40	0,56	
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,00	1,80	1,80	
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,60	1,20	1,92	
CL 50A - CR 86 Y 96C		0,20	1,20	0,24	
CL 50A - CR 86 Y 96C		1,00	1,30	1,30	**6,38**
Del 14 al 20 de abril					
LA AMÉRICA - CALASANZ					
CL 50A - CR 86 Y 96C		0,42	0,90	0,38	
CL 50A - CR 86 Y 96C		0,42	0,90	0,38	**0,76**
Del 21 al 27 de abril					
LA AMÉRICA - CALASANZ					
CL 50A - CR 86 Y 96C		0,42	0,90	0,38	
CL 50A - CR 86 Y 96C		0,42	0,90	0,38	**0,76**
				Subtotal	**9,43**
				TOTAL	**9,43**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	11
FECHA	DD	4	MM	5	AA	2025	PERÍODO	01/04/2025 - 4/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	4.1.2	DESCRIPCIÓN	Construcción de ESCALAS sobre entresuelo, en concreto 21 MPa., según diseño y condiciones del sitio. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper "T" de 18 mm. o su equivalente para acabado a la vista, contrahuellas, moldura chaflán en contrahuellas, vibrado, protección, curado, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	UNID.	m3	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

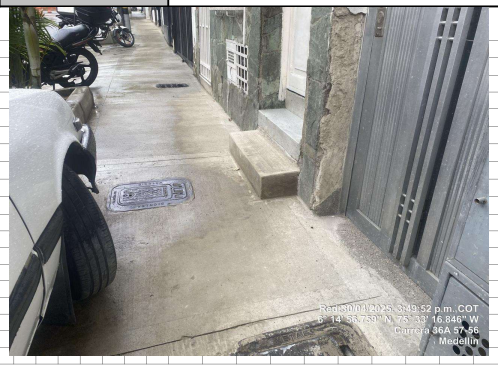

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			CANTIDAD (M3)	MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO	ESPESOR		
Del 21 al 27 de abril						
BOSTON - ENCISO						
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 55		0,25	0,9	0,17	0,04	**0,04**
Subtotal						**0,04**
TOTAL						**0,04**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	12
FECHA	DD	4	MM	5	AA	2025	PERÍODO	01/04/2025 - 4/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	


ÍTEM	4.1.5	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 35 kg/cm2 adicionado con microfibra de polipropileno para construcción de andén, espesor e=0.10 m. Incluye aditivo plastificante, corte y sellado de juntas cada 2,0 m. Acabado esgrafiado tipo Metro, según diseño S.I.F. El material de soporte (base o subsase) se pagará en su ítem respectivo. La interventoría y/o supervisión solicitarán los ensayos necesarios para verificar el MR requerido mediante la norma INVIAS E-414-22.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.









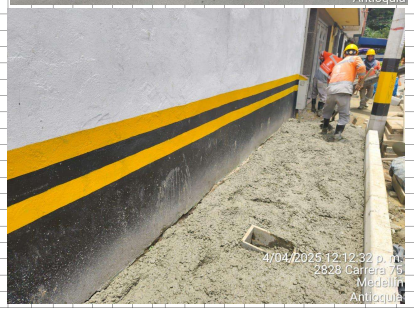





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO		
Del 01 al 06 de abril del 2025					
BOSTON - ENCISO					
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		11,42	1,35	15,42	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		27,94	1,25	34,93	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		4,71	1,55	7,30	
CL 57-CR 36A Y 34		5,83	1,37	7,99	
MENOS CAJAS				0,18	**65,45**
BELÉN GRANADA					
CR 75 - CL 30A Y 28		10,30	1,50	15,45	
CR 75 - CL 30A Y 28		5,50	2,50	13,75	
CR 75 - CL 30A Y 28		7,70	1,50	11,55	
CR 75 - CL 30A Y 28		4,30	2,60	11,18	
CR 75 - CL 30A Y 28		7,80	2,50	19,50	
CR 75 - CL 30A Y 28		7,00	1,90	13,30	**84,73**
CL 28 - CR 75 Y 74A		39,00	2,00	78,00	
CL 28 - CR 75 Y 74A		22,50	1,50	33,75	
CL 28 - CR 75 Y 74A		4,30	3,40	14,62	
CL 28 - CR 75 Y 74A		4,00	2,00	8,00	
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,00	2,00	6,00	
CL 28 - CR 75 Y 74A		4,00	2,00	8,00	**148,37**
CR 74 - CL 27 Y 28		2,90	2,20	6,38	
CR 74 - CL 27 Y 28		3,20	1,80	5,76	
CR 74 - CL 27 Y 28		3,70	3,80	14,06	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,70	1,80	3,06	
CR 74 - CL 27 Y 28		20,00	1,80	36,00	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,30	2,50	3,25	
CR 74 - CL 27 Y 28		3,90	2,50	9,75	**78,26**
Del 07 al 13 de abril					
BOSTON - ENCISO					
CL 57-CR 36A Y 34		7,80	3,90	30,42	
CL 57-CR 36A Y 34		2,40	4,30	10,32	
CL 57-CR 36A Y 34		21,10	1,15	24,27	
CL 57-CR 36A Y 34		38,00	1,58	60,04	
CL 57-CR 36A Y 34		7,30	0,97	7,08	
CL 57-CR 36A Y 34		2,15	1,10	2,37	
CL 57-CR 36A Y 34		1,02	1,30	1,33	
CL 57-CR 36A Y 34		23,90	1,30	31,07	
CL 57-CR 36A Y 34		29,70	1,15	34,16	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		29,50	1,62	47,79	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,60	1,15	2,99	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,60	1,10	2,86	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		0,80	1,12	0,90	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,00	1,12	1,12	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,00	1,62	11,34	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,52	2,00	3,04	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,00	1,32	2,64	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		29,30	1,50	43,95	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,50	2,58	6,45	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,20	3,60	4,32	
MENOS CAJAS				7,42	**321,02**
BELÉN GRANADA					
CR 75 - CL 30A Y 28		3,60	1,50	5,40	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,10	2,60	2,86	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,25	1,50	4,88	





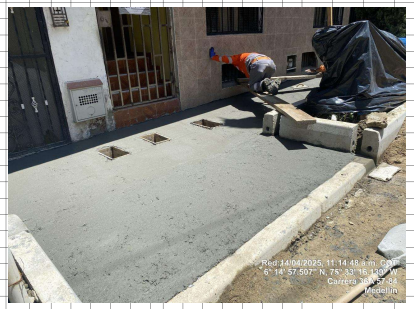



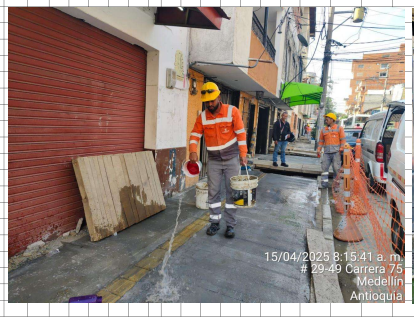



CR 75 - CL 30A Y 28		3,20	2,40	7,68	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,10	1,50	1,65	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,10	1,50	1,65	
CR 75 - CL 30A Y 28		0,84	2,50	2,10	
CR 75 - CL 30A Y 28		7,10	2,30	16,33	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,20	1,36	2,99	
CR 75 - CL 30A Y 28		4,00	1,36	5,44	
CR 75 - CL 30A Y 28		7,30	2,34	17,08	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,93	1,50	5,90	**73,95**
CR 74 - CL 27 Y 28		7,26	4,30	31,22	
CR 74 - CL 27 Y 28		5,89	4,30	25,33	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,30	2,30	2,99	
CR 74 - CL 27 Y 28		6,40	4,34	27,78	
CR 74 - CL 27 Y 28		6,40	4,40	28,16	
CR 74 - CL 27 Y 28		5,26	4,30	22,62	**138,09**
POBLADO - FLORIDA					
CL 5 F		21,60	1,45	31,32	
CL 5 F		33,80	1,40	47,32	
MENOS CAJAS				0,31	**78,33**
Del 14 al 20 de abril					
BOSTON - ENCISO					
CL 57-CR 36A Y 34		6,80	2,02	13,74	
CL 57-CR 36A Y 34		1,80	1,90	3,42	
CL 57-CR 36A Y 34		13,50	1,80	24,30	
CL 57-CR 36A Y 34		3,21	2,00	6,42	
CL 57-CR 36A Y 34		1,96	3,23	6,33	
CL 57-CR 36A Y 34		7,00	1,50	10,50	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		15,00	1,65	24,75	
MENOS CAJAS				8,18	**81,28**
BELÉN GRANADA					
CL 28 - CR 75 Y 74A		5,30	1,50	7,95	
CL 28 - CR 75 Y 74A		15,00	2,50	37,50	
CL 28 - CR 75 Y 74A		6,00	2,50	15,00	
CL 28 - CR 75 Y 74A		4,55	0,50	2,28	
CL 28 - CR 75 Y 74A		2,80	2,25	6,30	
CL 28 - CR 75 Y 74A		2,20	0,80	1,76	
CL 28 - CR 75 Y 74A		2,00	0,80	1,60	
CL 28 - CR 75 Y 74A		7,20	2,30	16,56	
CL 28 - CR 75 Y 74A		2,60	1,40	3,64	
CL 28 - CR 75 Y 74A		10,00	2,30	23,00	
CL 28 - CR 75 Y 74A		4,20	2,50	10,50	**126,09**
Del 21 al 27 de abril					
BOSTON - ENCISO					
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,60	1,40	3,64	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		36,00	1,60	57,60	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,00	1,40	1,40	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		0,90	1,40	1,26	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		4,60	1,40	6,44	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		3,97	3,70	14,69	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,20	1,85	2,22	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		5,60	2,10	11,76	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,18	2,00	4,36	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,40	2,00	2,80	
CL 57-CR 36A Y 34		18,10	1,04	18,82	
CL 57-CR 36A Y 34		3,30	2,10	6,93	
CL 57-CR 36A Y 34		16,30	0,60	9,78	
CL 57-CR 36A Y 34		26,45	1,40	37,03	














CL 57-CR 36A Y 34		2,10	1,05	2,21	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		4,80	2,10	10,08	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		3,30	3,00	9,90	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		4,00	3,90	15,60	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		7,50	1,03	7,73	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		3,20	1,42	4,54	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,50	2,00	5,00	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		4,00	1,60	6,40	
CL 57-CR 36A Y 34		10,25	1,15	11,79	
CL 57-CR 36A Y 34		1,40	0,75	1,05	
CL 57-CR 36A Y 34		7,50	0,89	6,68	
CL 57-CR 36A Y 34		23,45	1,32	30,95	
CL 57-CR 36A Y 34		3,00	1,15	3,45	
MENOS CAJAS				8,34	**285,76**
BELÉN GRANADA					
CR 75 - CL 30A Y 28		1,10	2,30	2,53	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,40	1,35	4,59	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,64	2,32	8,44	
CR 75 - CL 30A Y 28		2,00	1,26	2,52	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,90	2,27	4,31	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,40	1,24	4,22	
CR 75 - CL 30A Y 28		6,20	3,30	20,46	
CR 75 - CL 30A Y 28		1,70	2,17	3,69	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,14	1,24	3,89	
CR 75 - CL 30A Y 28		0,90	2,00	1,80	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,00	1,20	3,60	
CR 75 - CL 30A Y 28		4,40	2,90	12,76	
CR 75 - CL 30A Y 28		3,30	1,60	5,28	
MENOS CAJAS				0,53	**77,57**
CR 74 - CL 27 Y 28		2,30	2,50	5,75	
CR 74 - CL 27 Y 28		2,00	2,50	5,00	
CR 74 - CL 27 Y 28		2,20	2,50	5,50	
CR 74 - CL 27 Y 28		5,30	2,40	12,72	
CR 74 - CL 27 Y 28		1,00	2,40	2,40	
CR 74 - CL 27 Y 28		30,00	1,80	54,00	**85,37**
Del 28 de abril al 4 de mayo					
BOSTON - ENCISO					
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		39,00	1,28	49,92	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,00	1,70	1,70	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,75	1,57	4,32	
MENOS CAJAS				1,34	**54,60**
POBLADO - FLORIDA					
CALLE 7		25,42	1,55	39,40	**39,40**
BELÉN GRANADA					
CR 75 - CALLE 30 A Y 28		21,50	1,90	40,85	**40,85**
CL 28 - CR 75 Y 74A		2,00	3,30	6,60	
CL 28 - CR 75 Y 74A		6,75	1,90	12,83	
CL 28 - CR 75 Y 74A		3,70	1,50	5,55	
CL 28 - CR 75 Y 74A		5,00	3,40	17,00	
CL 28 - CR 75 Y 74A		1,00	2,00	2,00	**43,98**
CR 74 - CL 27 Y 28		1,80	2,50	4,50	**4,50**
	Subtotal				**1.827,61**
	TOTAL				**1.827,61**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	13
FECHA	DD	4	MM	5	AA	2025	PERÍODO	01/04/2025 - 4/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	4.2.1	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y colocación de Cordon prefabricado de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas. Incluye conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra. De 15 x 45 x 80 cm. (BOBAR)	UNID.	m	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.







LOCALIZACIÓN	LONGITUD	MEDIDA TOTAL
Del 01 al 06 de abril del 2025		
BOSTON - ENCISO	176,72	**176,72**
BELÉN GRANADA	36,51	
Del 07 al 13 de abril		
BOSTON - ENCISO	99,81	**99,81**
LA AMÉRICA - CALASANZ	4,16	**4,16**
POBLADO - FLORIDA	112,60	**112,60**
Del 14 al 20 de abril		
BOSTON - ENCISO	204,27	**204,27**
BELÉN GRANADA	70,00	**70,00**
LA AMÉRICA - CALASANZ	0,80	**0,80**
Del 21 al 27 de abril		
BOSTON - ENCISO	55,25	**55,25**
BELÉN GRANADA	99,00	**99,00**
LA AMÉRICA - CALASANZ	0,80	**0,80**
POBLADO - FLORIDA	111,70	**111,70**
Del 28 de abril al 4 de mayo		
BOSTON - ENCISO	70,00	**70,00**
POBLADO - FLORIDA	33,30	**33,30**
BELÉN GRANADA	77,84	**77,84**
POBLADO - LAS LOMAS	150,00	**150,00**
Subtotal		**1.266,25**
TOTAL		**1.266,25**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	14
FECHA	DD	4	MM	5	AA	2025	PERÍODO	01/04/2025 - 4/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	5.1	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	UNID.	kg	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN	LONGITUD	MEDIDA TOTAL
Del 21 al 27 de abril		
BOSTON - ENCISO	4,48	4,48

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	15
FECHA	DD	4	MM	5	AA	2025	PERÍODO	01/04/2025 - 4/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	


OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	5.2	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada Tipo D84. Incluye el suministro y transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.







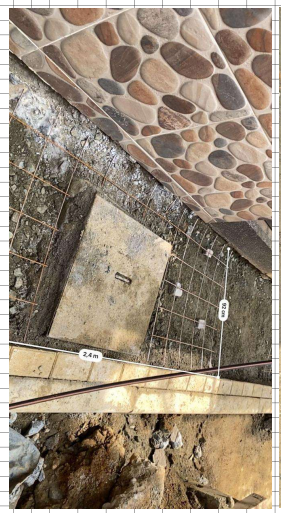



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
Del 01 al 06 de abril del 2025					
BOSTON - ENCISO					
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,28	2,38	3,05	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,26	2,43	3,06	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,31	2,36	3,09	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,32	1,53	3,55	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,38	2,42	3,34	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,35	2,39	3,23	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,45	3,38	4,90	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,35	2,33	3,15	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,60	2,40	3,84	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,65	2,37	3,91	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,36	1,29	3,04	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,04	1,41	1,47	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,38	2,36	3,26	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,32	1,53	3,55	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,42	2,27	3,22	
CL 57-CR 36A Y 34		2,32	1,20	2,78	
CL 57-CR 36A Y 34		2,38	1,83	4,36	
CL 57-CR 36A Y 34		2,36	1,47	3,47	
CL 57-CR 36A Y 34		2,38	1,38	3,28	
CL 57-CR 36A Y 34		2,33	1,40	3,26	
CL 57-CR 36A Y 34		2,34	0,84	1,97	
CL 57-CR 36A Y 34		0,91	3,34	3,04	
CL 57-CR 36A Y 34		1,04	3,85	4,00	
CL 57-CR 36A Y 34		0,92	2,40	2,21	
CL 57-CR 36A Y 34		2,32	1,03	2,39	**80,41**
BELÉN GRANADA					
CR 75 - CL 30A Y 28		44,00	1,65	72,60	
MENOS CAJAS				3,85	**68,75**
Del 07 al 13 de abril					
BOSTON - ENCISO					
CL 57-CR 36A Y 34		1,20	2,00	2,40	
CL 57-CR 36A Y 34		0,99	2,00	1,98	
CL 57-CR 36A Y 34		0,95	2,26	2,15	
CL 57-CR 36A Y 34		1,31	1,98	2,59	
CL 57-CR 36A Y 34		0,90	2,09	1,88	
CL 57-CR 36A Y 34		1,08	2,00	2,16	
CL 57-CR 36A Y 34		1,96	0,99	1,94	
CL 57-CR 36A Y 34		1,97	0,92	1,81	
CL 57-CR 36A Y 34		0,36	2,23	0,80	
CL 57-CR 36A Y 34		2,00	2,00	4,00	
CL 57-CR 36A Y 34		1,82	1,69	3,08	
CL 57-CR 36A Y 34		1,87	1,96	3,67	
CL 57-CR 36A Y 34		1,09	2,00	2,18	
CL 57-CR 36A Y 34		2,00	1,13	2,26	
CL 57-CR 36A Y 34		2,00	1,06	2,12	
CL 57-CR 36A Y 34		2,06	1,05	2,16	
CL 57-CR 36A Y 34		0,90	6,98	6,28	
CL 57-CR 36A Y 34		2,35	1,06	2,49	
CL 57-CR 36A Y 34		1,00	1,44	1,44	
CL 57-CR 36A Y 34		1,13	2,11	2,38	
CL 57-CR 36A Y 34		1,02	2,31	2,36	
CL 57-CR 36A Y 34		1,02	2,00	2,04	
CL 57-CR 36A Y 34		2,34	0,90	2,11	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,37	2,40	3,29	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,40	2,40	3,36	**62,93**
BELÉN GRANADA					
CR 75 - CL 30A Y 28		18,00	1,65	29,70	
CR 75 - CL 30A Y 28		12,00	1,65	19,80	
CR 75 - CL 30A Y 28		18,00	1,65	29,70	
MENOS CAJAS				4,20	**75,00**

POBLADO - FLORIDA					
CALLE 5F		2,00	1,40	2,80	
CALLE 5F		2,00	1,45	2,90	**5,70**
Del 14 al 20 de abril					
BOSTON - ENCISO					
CL 57-CR 36A Y 34		1,42	2,00	2,84	
CL 57-CR 36A Y 34		1,07	2,15	2,30	
CL 57-CR 36A Y 34		1,49	2,02	3,01	
CL 57-CR 36A Y 34		2,36	0,72	1,70	
CL 57-CR 36A Y 34		2,47	1,64	4,05	
CL 57-CR 36A Y 34		2,26	0,53	1,20	
CL 57-CR 36A Y 34		0,69	0,70	0,48	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,59	3,32	5,28	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,40	2,78	3,89	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,37	2,32	3,18	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,58	2,43	3,84	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,53	2,37	3,63	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,48	2,35	3,48	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,61	2,40	3,86	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,59	2,39	3,80	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,53	4,30	6,58	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,57	2,32	3,64	**56,76**
BELÉN GRANADA					
CR 75 - CL 30A Y 28		6,00	1,65	9,90	
MENOS CAJAS				0,53	**9,38**
CL 28 - CR 75 Y 74A		26,00	1,00	26,00	
MENOS CAJAS				2,28	**23,73**
Del 21 al 27 de abril					
BOSTON - ENCISO					
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,60	1,70	2,72	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,60	2,40	3,84	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,60	1,70	2,72	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,60	3,15	5,04	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,50	2,00	5,00	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,00	2,00	2,00	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,40	2,40	3,36	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		2,35	1,40	3,29	
CL 57-CR 36A Y 34		0,98	2,00	1,96	
CL 57-CR 36A Y 34		1,06	6,00	6,36	
CL 57-CR 36A Y 34		2,00	1,18	2,36	
CL 57-CR 36A Y 34		1,15	4,00	4,60	
CL 57-CR 36A Y 34		1,32	2,50	3,30	
CL 57-CR 36A Y 34		1,20	5,89	7,07	
CL 57-CR 36A Y 34		1,34	2,00	2,68	
CL 57-CR 36A Y 34		1,16	2,40	2,78	
CL 57-CR 36A Y 34		1,23	3,76	4,62	
CL 57-CR 36A Y 34		1,28	2,00	2,56	
CL 57-CR 36A Y 34		1,26	2,00	2,52	
CL 57-CR 36A Y 34		2,36	1,35	3,19	
CL 57-CR 36A Y 34		1,06	2,30	2,44	
CL 57-CR 36A Y 34		1,06	2,00	2,12	**76,53**
BELÉN GRANADA					
CR 75 - CL 30A Y 28		6,00	0,80	4,80	
MENOS CAJAS				0,53	**4,28**
CR 74 - CL 27 Y 28		20,00	1,00	20,00	
MENOS CAJAS				1,75	**18,25**
POBLADO - FLORIDA					
ALLE 5G		2,00	1,40	2,80	
ALLE 5G		2,00	1,40	2,80	
ALLE 5G		2,00	1,60	3,20	**8,80**
Del 28 de abril al 4 de mayo					
BOSTON - ENCISO					
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,57	1,32	2,07	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,26	3,83	4,83	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,32	2,41	3,18	
CRA 36A ENTRE CLL 58 Y 54		1,32	2,00	2,64	**12,72**
SUBTOTAL					**503,23**
TOTAL					**503,23**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	16
FECHA	DD	4	MM	5	AA	2025	PERÍODO	01/04/2025 - 4/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	6.2	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte e instalación de Tapa en polipropileno para caja de inspección de 0.40x 0.40 m, incluye marco.	UNID.	Und	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UND)	CANTIDAD TOTAL
Del 01 al 06 de abril del 2025		
LAURELES - ACACIAS	3,00	3,00
LAURELES - LORENA	4,00	4,00
Subtotal		7,00
TOTAL		7,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	17
FECHA	DD	4	MM	5	AA	2025	PERÍODO	01/04/2025 - 4/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	6.3	DESCRIPCIÓN	Construcción de caja de inspección y/o empalme de 80x80x80 cm medidas internas (L=80cm) en concreto de 17.5 mpa, espesor 10 cm. Incluye tapa y herraje. Según diseño SIF Municipio de Medellín.	UNID.	Und	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (UND)	CANTIDAD TOTAL
Del 01 al 06 de abril del 2025		
BOSTON - ENCISO	2,00	2,00
CALLE NUEVA	12,00	12,00
Subtotal		14,00
TOTAL		14,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN


CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	18
FECHA	DD	4	MM	5	AA	2025	PERÍODO	01/04/2025 - 4/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	7.2	DESCRIPCIÓN	Colocación de ADOQUÍN TÁCTIL GUÍA O ALERTA 20 x 20 x 6. Color oliva, marrón, chocolate, ocre, tojo y terracota. Para un ancho de 0.20m. Incluye suministro y transporte de los materiales, perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	UNID.	m	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



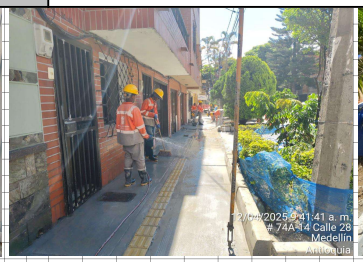



LOCALIZACIÓN	LONGITUD	MEDIDA TOTAL
Del 07 al 13 de abril		
BELÉN GRANADA	121,14	**121,14**
POBLADO - FLORIDA	65,40	**65,40**
Del 14 al 20 de abril		
BOSTON - ENCISO	27,45	**27,45**
BELÉN GRANADA	11,00	**11,00**
POBLADO - FLORIDA	139,40	**139,40**
LA AMÉRICA - CALASANZ	1,00	**1,00**
Del 21 al 27 de abril		
BOSTON - ENCISO	8,00	**8,00**
BELÉN GRANADA	193,57	**193,57**
LA AMÉRICA - CALASANZ	1,00	**1,00**
POBLADO - FLORIDA	52,00	**52,00**
	Subtotal	**619,96**
	TOTAL	**619,96**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	19
FECHA	DD	4	MM	5	AA	2025	PERÍODO	01/04/2025 - 4/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	7.3	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte y colocación de franja demarcadora para limitados visuales en adoquin ADOP-A de 10x20x6 cm, en color amarillo, salmón o jaspe, según diseño. Incluye cama de arena de apoyo e = 5 cm, sello de juntas con arena de revoque, cortes a maquina y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Cumplir norma NTC 2017, seguir recomendaciones del MEP y patrones de instalación del ICPC. el adoquín deberá resellarse por 2 veces en un lapso de 4 meses luego de su instalación.	UNID.	m	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN	LONGITUD	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
Del 01 al 06 de abril del 2025			
BOSTON - ENCISO	68,95		**68,95**
BELÉN GRANADA	4,00		**4,00**
Del 07 al 13 de abril			
BOSTON - ENCISO	84,90		**84,90**
LA AMÉRICA - CALASANZ	8,00		**8,00**
BELÉN GRANADA	102,38		**102,38**
Del 14 al 20 de abril			
BOSTON - ENCISO	21,40		**21,40**
LA AMÉRICA - CALASANZ	2,40		**2,40**
Del 21 al 27 de abril			
BOSTON - ENCISO	103,70		**103,70**
BELÉN GRANADA	74,90		**74,90**
LA AMÉRICA - CALASANZ	2,40		**2,40**
POBLADO - FLORIDA	16,40		**16,40**
Subtotal			**489,43**
TOTAL			**489,43**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN


CONSORCIO VIAL VG-VNF


CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	20
FECHA	DD	4	MM	5	AA	2025	PERÍODO	01/04/2025 - 4/05/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	

ÍTEM	9,1	DESCRIPCIÓN	Suministro, transporte e instalación de grama tipo San Agustín, para conformación de zonas verdes. Incluye perfilación y nivelación de la superficie hasta un espesor de 5 cm , adición de tierra abonada con un espesor de 5 cm, anclaje inicial y final con ganchos de sujeción, regado y todo lo necesario para su correcta siembra y total prendimiento, capote mínimo 5 cm.	UNID.	m2	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



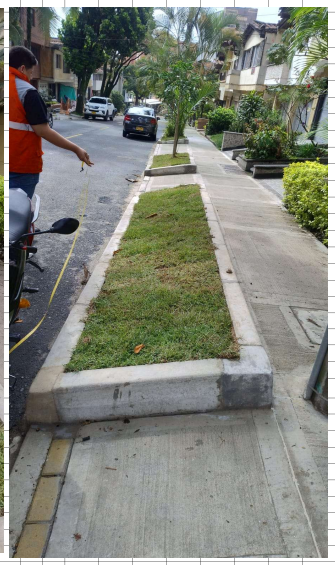

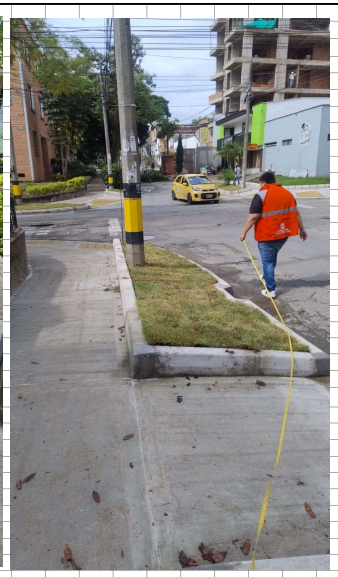

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES		CANTIDAD (M2)	MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO		
Del 01 al 06 de abril del 2025					
LA AMÉRICA - SIMÓN BOLÍVAR					
CR 81A-CL 35 Y 36		4,92	1,16	5,71	
CR 81A-CL 35 Y 36		12,80	1,18	15,10	
CR 81A-CL 35 Y 36		2,07	1,40	2,90	
CR 81A-CL 35 Y 36		1,70	1,45	2,47	
CR 81A-CL 35 Y 36		3,38	1,30	4,39	
CR 81A-CL 35 Y 36		1,23	5,40	6,64	
CR 81A-CL 35 Y 36		8,10	1,20	9,72	
CR 81A-CL 35 Y 36		4,90	1,04	5,10	
CR 81A-CL 35 Y 36		5,60	0,93	5,21	
CR 81A-CL 35 Y 36		54,91	1,06	58,20	
CR 82A-CL 36 Y 37D		6,20	1,32	8,18	
CR 82A-CL 36 Y 37D		13,40	1,37	18,36	
CR 82A-CL 36 Y 37D		11,34	0,77	8,73	
CR 82A-CL 36 Y 37D		4,63	0,84	3,89	
CR 82A-CL 36 Y 37D		9,35	1,20	11,22	
CR 82A-CL 36 Y 37D		6,60	1,54	10,16	
CR 82A-CL 36 Y 37D		4,30	1,65	7,10	
CR 82A-CL 36 Y 37D		6,26	1,46	9,14	
CR 82A-CL 36 Y 37D		1,20	0,30	0,36	
CR 82A-CL 36 Y 37D		1,88	0,90	1,69	
CR 82A-CL 36 Y 37D		10,70	0,90	9,63	
CR 82A-CL 36 Y 37D		21,90	1,50	32,85	
CR 82A-CL 36 Y 37D		6,70	0,85	5,70	
CR 82A-CL 36 Y 37D		11,20	0,88	9,86	
CR 82A-CL 36 Y 37D		8,40	1,07	8,99	
CR 82A-CL 36 Y 37D		3,15	1,10	3,47	
CR 82A-CL 36 Y 37D		9,60	0,93	8,93	
CR 82A-CL 36 Y 37D		7,60	0,85	6,46	
CR 82A-CL 36 Y 37D		3,40	1,55	5,27	
CR 82A-CL 36 Y 37D		9,00	1,60	14,40	**299,81**
	Subtotal				**299,81**
TOTAL					**299,81**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATO	4600102792 DE 2024	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.		
VALOR PPTO AMBIENTAL	$ 126.711.013	
PLAZO INICIAL:	5 MESES	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG-VNF	
INTERVENTORÍA	SITELSA SAS	
FECHA ACTA:	**PERIODO**	
	1-dic.-24	**31-ene.-25**

CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Fecha de realizacion del presupuesto 4/30/2024

APLICACIÓN DE GUÍA SOCIOAMBIENTAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA 1		ACTA N°2											
								DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		ACUMULADO	
GESTIÓN AMBIENTAL																			
1,0	**Manejo de residuos sólidos**		**PPTO CONTRACTUAL**																
1,1	Canecas de 5 gl con tapa y debidamente rotuladas (Tres recipientes reciclable, ordinario y organicos)	Juego	8,00	$ 175.030,00	$ 1.400.240,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 175.030,00	1,00	$ 175.030,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	2	$ 350.060,00
1,2	Canecas metálica de 55 gl con tapa, pintadas de acuerdo los colores según la Resol N° 2184 de 2019, debidamente rotuladas (Cuatro recipientes recipientes: No aprovechables, Aprovechables, Orgánicos aprovechables, especiales)*	Juego	6,00	$ 541.116,00	$ 3.246.696,00	1,00	$ 541.116,00	5,00	$ 2.705.580,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	6	$ 3.246.696,00
1,3	Bolsas plásticas para los frentes de obra color negro (residuos no aprovechables), según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	un	2200,00	$ 694,00	$ 1.526.800,00	50,00	$ 34.700,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	100	$ 69.400,00	84	$ 58.296,00	166	$ 115.204,00	400	$ 277.600,00
1,4	Bolsas plásticas para los frentes de obra color blanco (residuos aprovechables) según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	un	2200,00	$ 708,00	$ 1.557.600,00	50,00	$ 35.400,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	80	$ 56.640,00	76	$ 53.808,00	174	$ 123.192,00	380	$ 269.040,00
1,5	Bolsas plásticas para los frentes de obra color verde (residuos orgánicos aprovechables) según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) -(Calibre 1,6)	un	2200,00	$ 638,00	$ 1.403.600,00	50,00	$ 31.900,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	60	$ 38.280,00	76	$ 48.488,00	174	$ 111.012,00	360	$ 229.680,00
1,6	Bolsas plásticas para los frentes de obra color rojo (residuos peligrosos) (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	un	1100,00	$ 1.077,00	$ 1.184.700,00	50,00	$ 53.850,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	50	$ 53.850,00	40	$ 43.080,00	60	$ 64.620,00	200	$ 215.400,00
1,7	Construcción de caseta de 4 m2 aproximadamente para el acopio de residuos sólidos comunes. Incluye teleras, tejas de zinc, larqueros	un	4,00	$ 297.507,00	$ 1.190.028,00	1,00	$ 297.507,00	3,00	$ 892.521,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	4	$ 1.190.028,00
1,8	Recolección y disposición de residuos sólidos peligrosos por parte de una empresa autorizada. (Incluye Transporte). Mínimo por recolección . 50 Kg.	kg	200,00	$ 5.236,00	$ 1.047.200,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00
1,9	Recolección de residuos de Madera por parte de una empresa autorizada	m3	20,00	$ 51.487,00	$ 1.029.740,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00
1,10	Kit aseo y limpieza en obra (pala y cepillo carretero)	un	22,00	$ 63.008,00	$ 1.386.176,00	2,00	$ 126.016,00	4,00	$ 252.032,00	11,00	$ 693.088,00	5	$ 315.040,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	22	$ 1.386.176,00
1,11	Bascula colgante industrial digital capacidad maxima 300 Kg *	un	1,00	$ 87.424,00	$ 87.424,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00
1,12	Señalización en sitios de disposicion temporal de residuos. (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios	Global	14,00	$ 12.000,00	$ 168.000,00	2,00	$ 24.000,00	12,00	$ 144.000,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	14	$ 168.000,00
2,00	**Maquinaria, vehículos y equipo en obra**																		
2,1	Lona banner, 13 onzas para vehiculo (volqueta o camion) de 1,5m x 0,8m con doblez repísado 3 cm por el contorno y ojaletes 1 en cada esquina, impresión inkjet resistente a la interperie según diseño del Manual de Identidad del Municipio.	un	20,00	$ 35.000,00	$ 700.000,00	5,00	$ 175.000,00	5,00	$ 175.000,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	5	$ 175.000,00	15,00	$ 525.000,00
3,00	**Ahorro y uso eficiente de agua y energía**																		
3,1	Hidrolavadora portatil acople rápido doble filtro *	un	1,00	$ 264.710,00	$ 264.710,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 264.710,00	1,00	$ 264.710,00
4,00	**Manejo de sustancias químicas**																		
4,1	Kit de emergencia para derrames químicos de 10 galones. Incluye bolsa con arena, caneca de 10 galones, bolsas plásticas, pala pequeña, guantes y mascarilla para concentración de partículas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento).	un	8,00	$ 260.048,00	$ 2.080.384,00	1,00	$ 260.048,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 780.144,00	2,00	$ 520.096,00	1,00	$ 260.048,00	1,00	$ 260.048,00	8,00	$ 2.080.384,00
4,2	Estiba de contención de 55 litros fabricada en polietileno de alta densidad, para almacenamiento de sustancias químicas	un	8,00	$ 443.258,00	$ 3.546.064,00	1,00	$ 443.258,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.329.774,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 1.773.032,00
5,00	**Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción**																		
5,1	Teleras 1,35m x 0,90 m para construcción de acopios	un	44,00	$ 20.000,00	$ 880.000,00	20,00	$ 400.000,00	24,00	$ 480.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	44,00	$ 880.000,00
5,2	Plástico Negro, calibre 4 y ancho de 2 m.	kg	110,00	$ 8.300,00	$ 913.000,00	55,00	$ 456.500,00	55,00	$ 456.500,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	110,00	$ 913.000,00
5,3	Cinta Señalización Naranja (calibre 4, rollo por 500 m) para adecuación o provisión de senderos peatonales y demarcación de áreas de trabajo	un	22,00	$ 38.735,00	$ 852.170,00	22,00	$ 852.170,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	22,00	$ 852.170,00
5,4	Balizas (Alto 1,4m) Base negra *	un	44,00	$ 27.846,50	$ 1.225.246,00	44,00	$ 1.225.246,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	44,00	$ 1.225.246,00
5,5	Señalización de zonas de acopio (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios	Estimado	22,00	$ 12.000,00	$ 264.000,00	2,00	$ 24.000,00	8,00	$ 96.000,00	12,00	$ 144.000,00	12,00	$ 144.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	34,00	$ 408.000,00

6,00	**Control de emisiones atmosféricas**																		
6,1	Manguera multicapa con refuerzo textil interior y exterior para trabajo pesado. Incluye accesorios de conexión y regulación de agua - Pistola -.	m	200,00	$ 9.802,00	$ 1.960.400,00	0,00	$ 0,00	200,00	$ 1.960.400,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	200,00	$ 1.960.400,00
6,2	Cubierta para la concretadora. Incluye largueros y plástico	un	4,00	$ 87.663,00	$ 350.652,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,00	**Protección del suelo**																		
7,1	Plástico Negro, calibre 4 y ancho de 2 m. para la protección del suelo durante el almacenamiento o preparación de materiales de construcción	kg	220,00	$ 8.300,00	$ 1.826.000,00	55,00	$ 456.500,00	165,00	$ 1.369.500,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	220,00	$ 1.826.000,00
8,00	**Manejo de campamento e instalaciones temporales**																		
8,1	Señalización para campamento o instalaciones temporales (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios .	Global	22,00	$ 12.000,00	$ 264.000,00	4,00	$ 48.000,00	4,00	$ 48.000,00	8,00	$ 96.000,00	6,00	$ 72.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	22,00	$ 264.000,00
8,2	Balizas para adecuación o provisión de senderos peatonales 1,4 m base negra*	un	44,00	$ 27.846,50	$ 1.225.246,00	44,00	$ 1.225.246,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	44,00	$ 1.225.246,00
8,3	Cinta Señalización Naranja (calibre 4, rollo por 500 m) para adecuación o provisión de senderos peatonales y demarcación de áreas de trabajo	un	22,00	$ 38.735,00	$ 852.170,00	22,00	$ 852.170,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	22,00	$ 852.170,00
9,00	**Prevención de contaminación de cuerpos de agua de redes de servicios públicos**																		
9,1	Caja desarenadora móvil para la concretadora	un	8,00	$ 51.878,00	$ 415.024,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,2	Malla tipo polisombra color azúl para proteger sumideros	m	440,00	$ 1.994,00	$ 877.360,00	0,00	$ 0,00	100,00	$ 199.400,00	100,00	$ 199.400,00	240,00	$ 478.560,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	440,00	$ 877.360,00
9,3	Alquiler de baño estandar con 2 limpieza por semana (Zona urbana)	mes	66,00	$ 716.115,00	$ 47.263.590,00	2,00	$ 1.432.230,00	6,00	$ 4.296.690,00	1,00	$ 716.115,00	6,00	$ 4.296.690,00	3,00	$ 2.148.345,00	0,00	$ 0,00	18,00	$ 12.890.070,00
10,00	**Gestión de la fauna y la flora**																		
10,1	Malla tipo polisombra color azúl para protección de 1,50 m de ancho para proteccion de árboles	m	50,00	$ 1.994,00	$ 99.700,00	0,00	$ 0,00	50,00	$ 99.700,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	50,00	$ 99.700,00
10,2	Estación en madera común fijación vertical diámetro 0,10 m x 2,80 m de alto	un	70,00	$ 9.940,00	$ 695.800,00	0,00	$ 0,00	30,00	$ 298.200,00	30,00	$ 298.200,00	10,00	$ 99.400,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	70,00	$ 695.800,00
	Plan de Manejo de Tránsito																		
11,00	**Señalización y Desvíos**																		
11,1	Señales informativa. Dimensiones y características según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015. Vias secundarias. 60x60 *	un	8,00	$ 166.041,00	$ 1.328.328,00	8,00	$ 1.328.328,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.328.328,00
11,2	Señales reglamentarias. Dimensiones y características según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015. Vias secundarias. 60x60 *	un	8,00	$ 164.779,00	$ 1.318.232,00	8,00	$ 1.318.232,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.318.232,00
11,3	Señales preventivas. Dimensiones y características según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015. vias secundarias. 60x60 *	un	8,00	$ 166.041,00	$ 1.328.328,00	8,00	$ 1.328.328,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.328.328,00
11,4	Paleta de PARE y SIGA. Dimensiones y características según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015 - Numeral 4.10.5 *	un	10,00	$ 40.000,00	$ 400.000,00	4,00	$ 160.000,00	6,00	$ 240.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 400.000,00
11,5	Maletín (2,0 x 1,0 m) *	un	8,00	$ 274.976,00	$ 2.199.808,00	8,00	$ 2.199.808,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 2.199.808,00
11,6	Balizas (1,4 m) *	un	66,00	$ 27.847,00	$ 1.837.902,00	66,00	$ 1.837.902,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	66,00	$ 1.837.902,00
11,7	Conos (0,90 m de altura, material plástico color naranja, lámina reflectiva tipo III ó IV) *	un	16,00	$ 54.232,00	$ 867.712,00	16,00	$ 867.712,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 867.712,00
11,8	Barricadas con franjas reflectivas tipo 3 con 1,50m alto y 2,40m de ancho *	un	8,00	$ 210.364,00	$ 1.682.912,00	8,00	$ 1.682.912,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.682.912,00
11,9	Cinta Señalización Naranja (calibre 4, rollo por 500 m)	un	22,00	$ 38.735,00	$ 852.170,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11,10	Malla plástica naranja (polietileno de alta densidad, rollo por 50 m, ancho 1,40 m)	m	220,00	$ 1.749,00	$ 384.780,00	220,00	$ 384.780,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	220,00	$ 384.780,00
11,11	Teleras 1,35m x 0,90 m	un	40,00	$ 20.000,00	$ 800.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	40,00	$ 800.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	40,00	$ 800.000,00
11,12	Capacitación y entrenamiento para auxiliares de tránsito para obras en vías	un	8,00	$ 222.013,00	$ 1.776.104,00	4,00	$ 888.052,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 888.052,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.776.104,00
12,0	**Subprograma de seguridad y salud en el trabajo**																		
12,1	Extintor multiproposito 10 Lb (Incluye recarga en caso de necesitarse)*	un	8,00	$ 34.769,00	$ 278.152,00	4,00	$ 139.076,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 139.076,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 278.152,00
12,2	Silvato brigadista	un	8,00	$ 8.571,00	$ 68.568,00	2,00	$ 17.142,00	6,00	$ 51.426,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 68.568,00
12,3	Camilla emergencia polietileno 185 cm x 0.45 cm con inmovilizador de cuello y arnés *	un	8,00	$ 144.086,00	$ 1.152.688,00	4,00	$ 576.344,00	2,00	$ 288.172,00	2,00	$ 288.172,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.152.688,00
12,4	Botiquín primeros auxilios (en lona) TIPO A	un	8,00	$ 171.898,00	$ 1.375.184,00	4,00	$ 687.592,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 687.592,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.375.184,00
13,0	**Personal para brigada Ambiental**																		
13,1	Reconocimiento de personal para labores de brigada ambiental	hr	3025,00	$ 9.017,00	$ 27.276.425,00	40,00	$ 360.680,00	240,00	$ 2.164.080,00	2100,00	$ 18.935.700,00	645,00	$ 5.815.965,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3025,00	$ 27.276.425,00
	TOTAL				**$ 126.711.013,00**		**$ 22.771.745,00**		**$ 16.392.231**		**$ 24.840.569**	$ 668,00	**$ 13.289.695**		**$ 2.612.065**		**$ 1.113.786**		**$ 81.020.091**

ERNESTO MILLÁN CUENCA
DIRECTOR DE OBRA

MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG - VNF	HOJA N°	1

FECHA	DD	30	MM	4	AA	2025	PERÍODO	01/04/2025 - 30/04/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	1,30	DESCRIPCIÓN	Bolsas plásticas para los frentes de obra color negro (residuos no aprovechables), según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





FRENTE:		CANTIDAD
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	**10,00**
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	**10,00**
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	**7,00**
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	**15,00**
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 96C	**7,00**
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	**23,00**
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	**12,00**
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	**-**
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	**15,00**
Belén Granada	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	**11,00**
Belén Granada	Clle 28 entre Cra 75 y 74	**12,00**
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	**12,00**
Boston/Enciso	Clle 57 entre Cra 36A y 35	**10,00**
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	**4,00**
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	**8,00**
Florida	Cra 33 entre Calle 7 y 6	**6,00**
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	**4,00**

OBSERVACIONES:

Subtotal	166,00
TOTAL	**166,00**

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	2
FECHA	DD	30	MM	4	AA	2025	PERÍODO	01/04/2025 - 30/04/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	1,40	DESCRIPCIÓN	Bolsas plásticas para los frentes de obra color blanco (residuos aprovechables) según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





FRENTE:		CANTIDAD
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	**10,00**
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	**10,00**
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	**7,00**
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	**15,00**
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 96C	**7,00**
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	**25,00**
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	**15,00**
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	**-**
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	**15,00**
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	**14,00**
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	**12,00**
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	**12,00**
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	**10,00**
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	**4,00**
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	**8,00**
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	**6,00**
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	**4,00**
Subtotal		**174,00**
TOTAL		**174,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	3
FECHA	DD	30	MM	4	AA	2025	PERÍODO	01/04/2025 - 30/04/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	1,50	DESCRIPCIÓN	Bolsas plásticas para los frentes de obra color verde (residuos orgánicos aprovechables) según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) -(Calibre 1,6)	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





FRENTE:		CANTIDAD
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	**10,00**
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	**10,00**
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	**7,00**
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	**15,00**
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 96C	**7,00**
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	**25,00**
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	**15,00**
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	**-**
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	**15,00**
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	**14,00**
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	**12,00**
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	**12,00**
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	**10,00**
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	**4,00**
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	**8,00**
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	**6,00**
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	**4,00**

OBSERVACIONES:

Subtotal	174,00
TOTAL	**174,00**

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	4
FECHA	DD	30	MM	4	AA	2025	PERÍODO	01/04/2025 - 30/04/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	1,60	DESCRIPCIÓN	Bolsas plásticas para los frentes de obra color rojo (residuos peligrosos) (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





FRENTE:		CANTIDAD
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	**2,00**
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	**1,00**
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	**1,00**
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	**3,00**
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 96C	**1,00**
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	**13,00**
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	**2,00**
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	**-**
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	**14,00**
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	**7,00**
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	**3,00**
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	**3,00**
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	**2,00**
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	**2,00**
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	**4,00**
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	**-**
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	**2,00**
Subtotal		**60,00**
TOTAL		**60,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA Nº	5
FECHA	DD	30	MM	4	AA	2025	PERÍODO	01/04/2025 - 30/04/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	2,10	DESCRIPCIÓN	Lona banner, 13 onzas para vehiculo (volqueta o camion) de 1,5m x 0,8m con doblez repísado 3 cm por el contorno y ojaletes 1 en cada esquina, impresión inkjet resistente a la interperie según diseño del Manual de Identidad del Municipio.	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





FRENTE:		CANTIDAD
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 96C	-
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	**1,00**
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	-
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	**1,00**
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	-
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	**1,00**
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	**1,00**
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	-
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	**1,00**
Subtotal		**5,00**
TOTAL		**5,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	6
FECHA	DD	30	MM	4	AA	2025	PERÍODO	01/04/2025 - 30/04/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	3,10	DESCRIPCIÓN	Hidrolavadora portatil acople rápido doble filtro *	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



FRENTE:		CANTIDAD
Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 96C	
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	**1,00**
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	
Subtotal		**1,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	5
FECHA	DD	30	MM	4	AA	2025	PERÍODO	01/04/2025 - 30/04/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	4,1	DESCRIPCIÓN	Kit de emergencia para derrames químicos de 10 galones. Incluye bolsa con arena, caneca de 10 galones, bolsas plásticas, pala pequeña, guantes y mascarilla para concentración de partículas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento).	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





OBSERVACIONES:

Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b		-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a		-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84		-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80		-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 96C		-
	Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81		-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)		-
	Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46		-
	Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28		-
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B		-
	Clle 28 entre Cra 75 y 74		-
	Boston/Enciso		-
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57		-
	Clle 57 entre Cra 36A y 35		-
	Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56		-
	Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F		-
	Cra 33 entre Calle 7 y 6		-
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11		**1,00**
	Subtotal		**1,00**
	TOTAL		**1,00**

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATO	4600102792 DE 2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
VALOR PPTO SOCIAL	$ 30.782.608
PLAZO INICIAL	5 MESES
TIEMPO DE AMPLIACIÓN	6 MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG-VNF
INTERVENTORÍA	SITELSA SAS
FECHA ACTA:	**PERIODO**
	1-abr.-25 / **30-abr.-25**

PLANTILLA PRESUPUESTO GESTION SOCIAL EN OBRA

APLICACIÓN DE GUÍA DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**Programa de información y comunicación a la comunidad**					**ACTA N°1 Del 06 al 30 de noviembre**		**ACTA N°2 Del 01 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025**		**ACTA N°3 Del 1 al 28 de febrero 2025**		**ACTA N°4 Del 1 al 31 de marzo 2025**		**ACTA N°5 Del 1 al 30 de abril 2025**		**ACUMULADO**	
1,1	Impresión de volantes. Tamaño: media carta 21,59 cm x 14 cm Tintas: 4x0 Material: propalcote 115	un	11000	165	$ 1.815.000	240,00	$ 39.600	463,00	$ 76.395,00	428,00	$ 70.620,00	$ 403,00	$ 66.495,00	$ 372,00	$ 61.380,00	1.906,00	$ 314.490,00
1,2	Cartelera informativa (corcho con marco de madera y banner en adhesivo full color.) 120x80 (incluye diseño y producción).	un	8	164000	$ 1.312.000	4,00	$ 656.000	1,00	$ 164.000,00	-	$ -	$ -	$ -	$ 2,00	$ 328.000,00	7,00	$ 1.148.000,00
1,3	Buzón de sugerencias 24cm de Ancho 16cm de alto por 15c de fondo, material en acrílico, impresión adhesivo en inkjet.	un	8	120210	$ 961.680	2,00	$ 240.420	3,00	$ 360.630,00	-	$ -	$ -	$ -	$ 1,00	$ 120.210	6,00	$ 721.260,00
1,4	Valla tijera 1x1 en lámina galvanizada calibre 26, decorada con adhesivo ambas caras.(según manual de identidad gráfica) **Incluye producción y diseño.**	un	8	393410	$ 3.147.280	2,00	$ 786.820	6,00	$ 2.360.460,00	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	8,00	$ 3.147.280,00
1,5	Valla tijera 1x1 en lámina galvanizada calibre 26, decorada con adhesivo ambas caras.(según manual de identidad gráfica) Incluye producción y diseño).unidades adicionales por reposición, robo, durabilidad	un		393410	$ -		$ -	0	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -
1,6	Imantado para vehiculos Foto Vinilo impreso a 720 Dpi 0,5x0,3 (Según manual de obra).	un	2	65570	$ 131.140	2,00	$ 131.140	0	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 131.140,00
2	**Programa de participación comunitaria**																
2,1	Logística reuniones informativas comunidad /(incluye video beam+ silletería + auditorio para 30 personas)	un	17	43700	$ 742.900	2,00	$ 87.400	3,00	$ 131.100,00	1,00	$ 43.700,00	$ 1,00	$ 43.700,00	$ 2,00	$ 87.400,00	9,00	$ 393.300,00
2,2	Refrigerios para reuniones con comunidad (reuniones inicio y finalización para 30 personas por reunion/ reuniones) Refrigerio básico empacado con las siguientes características: Bebida: Jugo en cajita 200 ml Pastelería dulce o salada de 150 gr (Croissant, pazerotti, pastel, empanada de queso, jamón y queso, hawaiano, ranchero, verduras o carnes, etc.) Presentación: Empacado en material que no sea icopor	un	510	8190	$ 4.176.900	28,00	$ 229.320	90,00	$ 737.100,00	60,00	$ 491.400,00	$ 30,00	$ 245.700,00	$ 60,00	$ 491.400,00	268,00	$ 2.194.920,00
2,3	Logística reuniones Comité Ciudadano de Obra (incluye video beam+ silletería para 20 personas)	un	5	43700	$ 218.500	0	$ -	1,00	$ 43.700,00	0,00	$ -	$ 1,00	$ 43.700,00	$ 1,00	$ 43.700,00	3,00	$ 131.100,00
2,4	Refrigerios para reuniones con CCO / 20 personas por CCO/ 7 reuniones de CCO) Refrigerio básico empacado con las siguientes características: Bebida: Jugo en cajita 200 ml Pastelería dulce o salada de 150 gr (Croissant, pazerotti, pastel, empanada de queso, jamón y queso, hawaiano, ranchero, verduras o carnes, etc.) Presentación: Empacado en material que no sea icopor	un	140	8190	$ 1.146.600	0	$ -	20,00	$ 163.800,00	0,00	$ -	$ 15,00	$ 122.850,00	$ 20,00	$ 163.800,00	55,00	$ 450.450,00
3	**Programa de formación y capacitación**																
3,1	Logística para talleres de capacitación con comunidad / (materiales para el desarrollo del taller, + video beam)	un	17	150000	$ 2.550.000	0	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ 1,00	$ 150.000,00	$ 1,00	$ 150.000,00	2,00	$ 300.000,00
3,2	Refrigerios para talleres de capacitación con comunidad/ 20 personas por taller/ 17 talleres Refrigerio básico empacado con las siguientes características: Bebida: Jugo en cajita 200 ml Pastelería dulce o salada de 150 gr (Croissant, pazerotti, pastel, empanada de queso, jamón y queso, hawaiano, ranchero, verduras o carnes, etc.) Presentación: Empacado en material que no sea icopor	un	340	8190	$ 2.784.600	0	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ 15,00	$ 122.850,00	$ 20,00	$ 163.800,00	35,00	$ 286.650,00
4	**Programa de Sostenibilidad y calidad de la obra**																
4,1	Actividades de sostenibilidad y apropiación de obras /(logística de la actividad asociada de acuerdo al objeto de contrato).	un	17	400000	$ 6.800.000	0	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -
4,2	Refrigerios para talleres de capacitación con comunidad/ 11 actividades/ 20 personas Refrigerio básico empacado con las siguientes características: Bebida: Jugo en cajita 200 ml Pastelería dulce o salada de 150 gr (Croissant, pazerotti, pastel, empanada de queso, jamón y queso, hawaiano, ranchero, verduras o carnes, etc.) Presentación: Empacado en material que no sea icopor	un	340	8190	$ 2.784.600	0	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -
5	**Plan de divulgación (Plan de Manejo de Tránsito (PMT)**																
5,1	Instalación de pasacalle con las siguientes características: Lona impresa full color **Tamaño:** 90 cms de alto x 9 mts de ancho con 5 palos, uno en cada lateral y 3 distribuidos en el centro. **Incluye:**producción, instalación y desinstalación.	un	8	276426	$ 2.211.408	0	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -
	TOTAL				**$ 30.782.608**		**$ 2.170.700**		**$ 4.037.185,00**		**$ 605.720,00**		**$ 795.295,00**		**$ 1.609.690,00**		**$ 9.218.590**

ERNESTO MILLÁN CUENCA
DIRECTOR DE OBRA

MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIERREZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	1
FECHA	DD	30	MM	4	AA	2025	PERÍODO	01/04/2025 - 30/4/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	1,1	DESCRIPCIÓN	Impresión de volantes. Tamaño: media carta 21,59 cm x 14 cm Tintas: 4x0 Material: propalcote 115	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN			CANTIDAD
FRENTE:			
Comuna 10	Boston		163,00
	Bomboná 1		167,00
Comuna 9	Bomboná 2		42,00
			-
		Subtotal	
		TOTAL	372,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIERREZ - DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						**CONSORCIO VIAL VG - VNF**				**HOJA N°**	2
FECHA	**DD**	30	**MM**	4	**AA**	2025	**PERÍODO**	01/04/2025 - 30/4/2025	**ELABORÓ**	**ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA**	

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	**FECHA DE INICIO**	**6/11/2024**

ÍTEM	1,2	**DESCRIPCIÓN**	Cartelera informativa (corcho con marco de madera y banner en adhesivo full color.) 120x80 (incluye diseño y producción).	**UNID.**	un	**PROYECTO**	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN			CANTIDAD
FRENTE:			
			-
Comuna 14	**Las Lomas**		**1,00**
	La Florida		**1,00**
			-

Subtotal	**2,00**
TOTAL	**2,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIERREZ - DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	3
FECHA	DD	30	MM	4	AA	2025	PERÍODO	01/04/2025 - 30/4/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	1,3	DESCRIPCIÓN	Buzón de sugerencias 24cm de Ancho 16cm de alto por 15c de fondo, material en acrílico, impresión adhesivo en inkjet.	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN			CANTIDAD
FRENTE:			
Comuna 14	Las Lomas		1,00

OBSERVACIONES:

Subtotal	1,00
TOTAL	1,00

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIERREZ - DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						**CONSORCIO VIAL VG - VNF**				**HOJA N°**	4
FECHA	**DD**	30	**MM**	4	**AA**	2025	**PERÍODO**	01/04/2025 - 30/4/2025	**ELABORÓ**	**ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA**	

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	**FECHA DE INICIO**	**6/11/2024**

ÍTEM	2,1	**DESCRIPCIÓN**	Logística reuniones informativas comunidad /(incluye video beam+ silletería + auditorio para 30 personas)	**UNID.**	un	**PROYECTO**	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN			**CANTIDAD**
FRENTE:			
Comuna 10	**Boston**		**1,00**
	Bomboná 1		
Comuna 9	**Bomboná 2**		**1,00**
			-

OBSERVACIONES:

Subtotal	**2,00**
TOTAL	**2,00**

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIERREZ - DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG - VNF	HOJA N°	5

FECHA	DD	30	MM	4	AA	2025	PERÍODO	01/04/2025 - 30/4/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	2,2	DESCRIPCIÓN	Refrigerios para reuniones con comunidad (reuniones inicio y finalización para 30 personas por reunion/ reuniones) Refrigerio básico empacado con las siguientes características: Bebida: Jugo en cajita 200 ml Pastelería dulce o salada de 150 gr (Croissant, pazerotti, pastel, empanada de queso, jamón y queso, hawaiano, ranchero, verduras o carnes, etc.) Presentación: Empacado en material que no sea icopor	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





LOCALIZACIÓN			CANTIDAD
FRENTE:			
Comuna 10	Bombon		30,00
	Bomboná 1		
Comuna 9	Bomboná 2		30,00
			-
Subtotal			60,00
TOTAL			60,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIERREZ - DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG - VNF	HOJA N°	6

FECHA	DD	30	MM	4	AA	2025	PERÍODO	01/04/2025 - 30/4/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	2.3	DESCRIPCIÓN	Logística reuniones Comité Ciudadano de Obra (incluye video beam+ silletería para 20 personas)	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN			CANTIDAD
FRENTE:			
Comuna 16	Belén Granada		1,00
			-

OBSERVACIONES:

Subtotal	1,00
TOTAL	1,00

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIERREZ - DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG - VNF	HOJA N°	7

FECHA	DD	30	MM	4	AA	2025	PERÍODO	01/04/2025 - 30/4/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	2.4	DESCRIPCIÓN	Refrigerios para reuniones con CCO / 20 personas por CCO/ 7 reuniones de CCO) Refrigerio básico empacado con las siguientes características: Bebida: Jugo en cajita 200 ml Pastelería dulce o salada de 150 gr (Croissant, pazerotti, pastel, empanada de queso, jamón y queso, hawaiano, ranchero, verduras o carnes, etc.) Presentación: Empacado en material que no sea icopor	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN			CANTIDAD
FRENTE:			
Comuna 16	Belén Granada		20,00

OBSERVACIONES:	Subtotal	20,00
	TOTAL	20,00

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIERREZ - DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	8
FECHA	DD	30	MM	4	AA	2025	PERÍODO	01/04/2025 - 30/4/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	3,1	DESCRIPCIÓN	Logística para talleres de capacitación con comunidad / (materiales para el desarrollo del taller, + video beam)	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN			CANTIDAD
FRENTE:			
Comuna 16	Belén Granada		1,00
			-
Subtotal			1,00
TOTAL			1,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIERREZ - DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	9
FECHA	DD	30	MM	4	AA	2025	PERÍODO	01/04/2025 - 30/4/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	3.2	DESCRIPCIÓN	Refrigerios para talleres de capacitación con comunidad/ 20 personas por taller/ 17 talleres Refrigerio básico empacado con las siguientes características: Bebida: Jugo en cajita 200 ml Pastelería dulce o salada de 150 gr (Croissant, pazerotti, pastel, empanada de queso, jamón y queso, hawaiano, ranchero, verduras o carnes, etc.) Presentación: Empacado en material que no sea icopor	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



LOCALIZACIÓN			CANTIDAD
FRENTE:			
Comuna 16	Belén Granada		20,00

OBSERVACIONES:	Subtotal	20,00
	TOTAL	20,00

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIERREZ - DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Alcaldía de Medellín

ACTA REAJUSTE DE OBRA N° 1

Contrato N° 4600102792 de 2024

Objeto: "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS"

Contratista de obra: Consorvio Vial VG VNF

Contratista de Interventoría: Sitelsa SAS

Fórmula de Reajuste de Precios publicada en el pliego de condiciones

$$AR = AS \times \left[0{,}1989\left(\frac{COi}{COo}\right) + 0{,}1944\left(\frac{MOOPi}{MOOPo}\right) + 0{,}1430\left(\frac{EPXi}{EPXo}\right) + 0{,}1278\left(\frac{ACCi}{ACCo}\right) + 0{,}1132\left(\frac{TRAi}{TRAo}\right) + 0{,}0741\left(\frac{SBi}{SBo}\right) + 0{,}0648\left(\frac{EQOi}{EQOo}\right) + 0{,}0372\left(\frac{MAi}{MAo}\right) + 0{,}0153\left(\frac{AMi}{AMo}\right) + 0{,}0126\left(\frac{HEi}{HEo}\right) + \; +0{,}0111\left(\frac{HIi}{HIo}\right) + 0{,}0076\left(\frac{CEi}{CEo}\right)\right]$$

Fórmula de reajuste			(1) Mes Base	(2) Mes Acta de Pago	Cálculos del factor de reajuste	
			Agosto 2024	Febrero 2025		
Código	Concepto	Coeficentes Fórmula de reajustes	Io	Ii	Ii/Io	Fórmula
CO	CONCRETO PREMEZCLADO	0,1989	3.402,24	3574,39	1,05	0,21
MOOP	MANO DE OBRA DE OBRAS PÚBLICAS	0,1944	3.250,41	3.385,83	1,04	0,20
EPX	EPÓXICOS (ADHERENTES)	0,1430	511,96	546,06	1,07	0,15
ACC	ANDENES, CUNETAS Y CORDONES	0,1278	1.626,22	1.715,43	1,05	0,13
TRA	TRANSPORTE	0,1132	1.979,44	1.985,04	1,00	0,11
SB	SUBBASE	0,0741	3.768,28	4.009,40	1,06	0,08
EQO	EQUIPO DE OBRAS PÚBLICAS	0,0648	2.767,68	2.717,65	0,98	0,06
MA	MADERAS PARA CONTRUCCIÓN	0,0372	6.227,32	6.180,86	0,99	0,04
AM	AGREGADOS MINERAS	0,0153	2.498,08	2.699,12	1,08	0,02
HE	HERRAMIENTAS	0,0126	2.264,89	2.267,09	1,00	0,01
HI	HIERRO	0,0111	3.113,36	3.196,48	1,03	0,01
CE	CEMENTO	0,0076	3.399,99	3.561,82	1,05	0,01
	Total	**1,000**				1,03

Cálculo reajuste del acta:

Factor reajuste	1,03
Valor obra contractual acta N°____ (AS)	$ 832.027.861
Valor reajuste N°____ (AR)	$ 856.988.697
Valor total del reajuste a pagar (AR-AS)	**$ 24.960.836**

Notas:
1. El Mes Base corresponde al mes en que se presentó la propuesta, según los estudios previos.
2. El Mes Acta de Pago corresponde al mes en que se ejecutaron las actividades asociadas al objeto contractual.
3. Los cálculos en las fórmulas se realizan con dos (2) cifras decimales.
4. El valor del acta AS incluye el % de AIU, pero no incluye los gastos reembolsables ni la obra extra.
5. La interventoría debe verificar que el valor del acta AS no incluya el porcentaje de imprevistos sin haber sido causados y sin el aval de la supervisión.

Firma del Director de obra
Nombre: Ernesto Millán Cuenca
Empresa: Consorcio Vial VG VNF
Teléfono: 3104684570
email: consorciovialvgvnf@gmail.com

Firma del Director de Interventoría
Nombre: Mayra Alejandra Pimiento Gutiérrez
Empresa: Sitelsa SAS
Teléfono: _____
email: interventoriamedellin2024@outlook.com

VoBo Supervisor SIF
Nombre: _____
Teléfono: _____
email: _____

Alcaldía de Medellín

ACTA REAJUSTE DE OBRA N° 2

Contrato N° 4600102792 de 2024

Objeto: "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS"

Contratista de obra: Consorvio Vial VG VNF

Contratista de Interventoría: Sitelsa SAS

Fórmula de Reajuste de Precios publicada en el pliego de condiciones

$$AR = AS \times \left[0{,}1989\left(\frac{COi}{COo}\right) + 0{,}1944\left(\frac{MOOPi}{MOOPo}\right) + 0{,}1430\left(\frac{EPXi}{EPXo}\right) + 0{,}1278\left(\frac{ACCi}{ACCo}\right) + 0{,}1132\left(\frac{TRAi}{TRAo}\right) + 0{,}0741\left(\frac{SBi}{SBo}\right) + 0{,}0648\left(\frac{EQOi}{EQOo}\right) + 0{,}0372\left(\frac{MAi}{MAo}\right) + 0{,}0153\left(\frac{AMi}{AMo}\right) + 0{,}0126\left(\frac{HEi}{HEo}\right) + \; +0{,}0111\left(\frac{HIi}{HIo}\right) + 0{,}0076\left(\frac{CEi}{CEo}\right)\right]$$

Fórmula de reajuste			(1) Mes Base	(2) Mes Acta de Pago	Cálculos del factor de reajuste	
			Agosto 2024	Marzo 2025		
Código	Concepto	Coeficentes Fórmula de reajustes	Io	Ii	Ii/Io	Fórmula
CO	CONCRETO PREMEZCLADO	0,1989	3.402,24	3574,39	1,05	0,21
MOOP	MANO DE OBRA DE OBRAS PÚBLICAS	0,1944	3.250,41	3.387,61	1,04	0,20
EPX	EPÓXICOS (ADHERENTES)	0,1430	511,96	546,06	1,07	0,15
ACC	ANDENES, CUNETAS Y CORDONES	0,1278	1.626,22	1.715,61	1,05	0,13
TRA	TRANSPORTE	0,1132	1.979,44	1.982,43	1,00	0,11
SB	SUBBASE	0,0741	3.768,28	3.990,02	1,06	0,08
EQO	EQUIPO DE OBRAS PÚBLICAS	0,0648	2.767,68	2.652,31	0,96	0,06
MA	MADERAS PARA CONTRUCCIÓN	0,0372	6.227,32	6.180,86	0,99	0,04
AM	AGREGADOS MINERAS	0,0153	2.498,08	2.699,12	1,08	0,02
HE	HERRAMIENTAS	0,0126	2.264,89	2.267,09	1,00	0,01
HI	HIERRO	0,0111	3.113,36	3.080,75	0,99	0,01
CE	CEMENTO	0,0076	3.399,99	3.561,82	1,05	0,01
	Total	**1,000**				1,03

Cálculo reajuste del acta:

Factor reajuste	1,03
Valor obra contractual acta N°____ (AS)	$ 866.878.562
Valor reajuste N°____ (AR)	$ 892.884.919
Valor total del reajuste a pagar (AR-AS)	**$ 26.006.357**

Notas:
1. El Mes Base corresponde al mes en que se presentó la propuesta, según los estudios previos.
2. El Mes Acta de Pago corresponde al mes en que se ejecutaron las actividades asociadas al objeto contractual.
3. Los cálculos en las fórmulas se realizan con dos (2) cifras decimales.
4. El valor del acta AS incluye el % de AIU, pero no incluye los gastos reembolsables ni la obra extra.
5. La interventoría debe verificar que el valor del acta AS no incluya el porcentaje de imprevistos sin haber sido causados y sin el aval de la supervisión.

Firma del Director de obra
Nombre: Ernesto Millán Cuenca
Empresa: Consorcio Vial VG VNF
Teléfono: 3104684570
email: consorciovialvgvnf@gmail.com

Firma del Director de Interventoría
Nombre: Mayra Alejandra Pimiento Gutiérrez
Empresa: Sitelsa SAS
Teléfono: _____
email: interventoriamedellin2024@outlook.com

VoBo Supervisor SIF
Nombre: _____
Teléfono: _____
email: _____

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901871689	9	CONSORCIO VIAL VG-VNF	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVO COMFAMA	CALLE 127 13A 54 OFICINA 603	MEDELLIN-ANTIOQUIA	7188690	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1467623416	9485792583	E	2025/05/22	2025/05/08	BANCO ITAU	0	$24,356,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OPERATIVO COMFAMA (28 Afiliados)																						$76,528,233	$12,348,000			$78,482,921	$3,122,800			$78,293,121	$3,115,200			$78,482,921		$5,420,700		$0	$0		$24,006,700

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRACION (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Centro de Trabajo: OFICINA BOGOTA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
33	CC	52494108	CASTELLANOS TINOCO DIANA MARCELA																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS001	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Total	**Afiliados(29)**																					$77,951,733	$12,575,800			$79,906,421	$3,179,800			$79,716,621	$3,172,200			$79,906,421		$5,428,200		$0	$0		$24,356,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901871689	9	CONSORCIO VIAL VG-VNF	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVO COMFAMA	CALLE 127 13A 54 OFICINA 603	MEDELLIN-ANTIOQUIA	7188690	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1467623416	9485792583	E	2025/05/22	2025/05/08	BANCO ITAU	0	$24,356,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				28	$12,575,800	$0	$0	$12,575,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$952,000	$0	$0	$952,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$3,168,400	$0	$0	$3,168,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$3,623,700	$0	$0	$3,623,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$4,831,700	$0	$0	$4,831,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$5,428,200	$0	$0	$5,428,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	29	$5,428,200	$0	$0	$5,428,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				29	$3,172,200	$0	$0	$3,172,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	28	$3,115,200	$0	$0	$3,115,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				29	$3,179,800	$0	$0	$3,179,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	15	$1,898,000	$0	$0	$1,898,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$619,100	$0	$0	$619,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$53,200	$0	$0	$53,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$104,500	$0	$0	$104,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$388,000	$0	$0	$388,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$60,000	$0	$0	$60,000
TOTAL				29	$24,356,000	$0	$0	$24,356,000

Bogotá D.C., 23 de septiembre del 2024

Señores
A Quien interese
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente CONSORCIO VIAL VG-VNF identificado con NIT 901.871.689-9 se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde el 20/09/2024 a través del (los) producto (s):

Producto	No. producto	Fecha de apertura	Estado del producto
CUENTA AHORROS	096-07423-5	23/09/2024	Activo

La (s) cuenta (s) corriente (s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Operaciones
Banco Itaú

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Gmail **Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>**

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y/O ACREEDORES

Gestion de Proveedores <gestion.proveedores@medellin.gov.co> 28 de noviembre de 2024, 4:17 p.m.
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>


Buenas tardes,

Consorcio Vial VG VNF, se encuentra registrado desde el **24.09.2024** con el consecutivo interno (Acreedor) N°**1200056338** Tener en cuenta que la inscripción en el registro de proveedores se hace una sola vez y este le sirve para futuros trámites con el Distrito de Medellín, en caso tal que sus datos generales y bancarios hayan cambiado, deben solicitar actualización del registro a este mismo correo.

Se aclara que:

En esta dependencia "Gestión de Proveedores" (Secretaría de Suministros y Servicios), SOLO realizamos la Inscripción como proveedores de personas naturales o jurídicas en el Dato Maestro de Proveedores y Contratistas del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín por diferentes conceptos. Debe seguir gestionando el trámite con la dependencia con quien lo inició (Secretaría de Movilidad, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gestión Humana, Secretaría General, entre otras) para que procedan a realizar el contrato o hacer el pago respectivo de ser pertinente, una vez verifiquen la totalidad de los requisitos exigidos y los documentos que debe adjuntar.

Este pantallazo es la prueba de su registro, puede imprimir este correo y adjuntarlo como evidencia que está registrado:

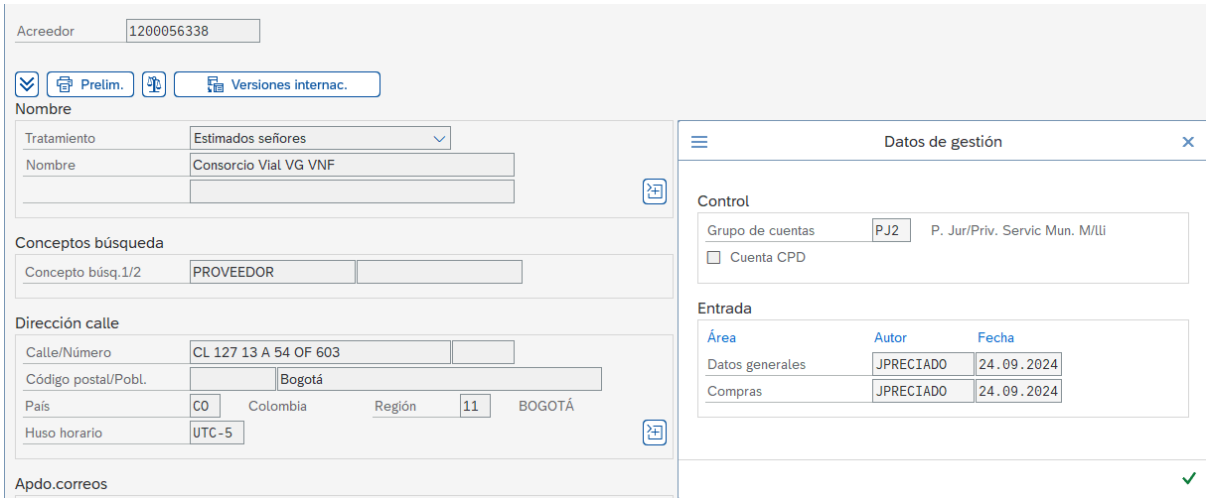

Cordialmente,

Estefanía Velásquez, 6043855555 ext 5020

Gestión de Proveedores
Secretaría de Suministros y Servicios
(604) 385 5555, Ext. 5020, 1178
Oficina 713, piso 7
CAD, Calle 44 # 52-165
gestion.proveedores@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: jueves, 28 de noviembre de 2024 15:14
Para: Gestion de Proveedores <gestion.proveedores@medellin.gov.co>
Asunto: [SPAM] SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y/O ACREEDORES

[Texto citado oculto]

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 5 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141126588964

(415)7707212489984(8020) 000014112658896 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 1 6 8 9	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAL VG-VNF

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 127 # 13 A - 54 OF 603

42. Correo electrónico facturacion@vnfsas.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 8 5 4 1 1 2 6	6 0 1 7 1 8 8 6 9 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 0 9 1 7							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 09 - 18 / 16 : 47: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VEGA CARDENAS HORACIO
985. Cargo Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141126588964

(415)7707212489984(8020) **000014112658896 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 1 6 8 9	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 7 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 7 2 6	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141126588964

(415)7707212489984(8020) **000014112658896 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 1 6 8 9	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 7 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 1 2 0 9 9 7 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VEGA	CARDENAS	HORACIO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 7 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 2 0 7 7 2 7 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VEGA	GARCIA	NATALIA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141126588964

(415)7707212489984(8020) **000014112658896 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 7 1 6 8 9	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 4 9 2 7 4	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: VNF S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	5 0	2 0 2 4 0 7 2 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 7 6 7 5 8 7	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA VG SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 4 0 7 2 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
df8c825c66954e000256a193e4026523e7fe86d972e1708266cd51b54adca90590bf889dd405335db7fb13d18aefd5ee

Número de Factura: FVE-10
Fecha de Emisión: 09/05/2025
Fecha de Vencimiento: 08/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO VIAL VG-VNF
Nombre Comercial: CONSORCIO VIAL VG-VNF
Nit del Emisor: 901871689
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 127 # 13 A - 54 OF 603
Teléfono / Móvil: 3108541126
Correo: facturacion@vnfsas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890905211
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CL 44 52 165
Teléfono / Móvil: 3855513
Correo: recepcionfacturas@medellin.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	Acta de recibo parcial de obra No 5 del contrato No 4600102792 de 2024 cuyo objeto es la construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias, periodo comprendido entre el 01.04.2025 al 04.05.2025.	94	1,00	$ 730.877.960,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 730.877.960,00
2	02	Acta Socioambiental No 5	94	1,00	$ 2.723.476,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.723.476,00

Notas Finales

Linea de negocio: Consorcio Vial VG- VNF, Porcentaje de Participación: Constructora VG SAS (Nit. 901.767.587-1) 50%, VNF SAS (Nit.900.049.274-8) 50%. AU:31.68%

Datos Totales

Documento generado el:
09/05/2025 10:14:09
Documento validado por la DIAN:
09/05/2025 10:14:10
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		733601436
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		733601436
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		733601436
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 733601436

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		733.601.436,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		733.601.436,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		733.601.436,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$733.601.436,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082863001 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2026-11-05

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3d922b1aa06ebd60eed5796049711d1e8959490fe0ade6dc1beb493c3973c876a748b3106fa061d129c549d196f5eedb

Número de Factura: FVE-11
Fecha de Emisión: 09/05/2025
Fecha de Vencimiento: 08/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO VIAL VG-VNF
Nombre Comercial: CONSORCIO VIAL VG-VNF
Nit del Emisor: 901871689
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 127 # 13 A - 54 OF 603
Teléfono / Móvil: 3108541126
Correo: facturacion@vnfsas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890905211
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CL 44 52 165
Teléfono / Móvil: 3855513
Correo: recepcionfacturas@medellin.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	01	Pago de pólizas correspondientes a la mod 1 con fecha del 17.12.2024 y mod 2 con fecha del 8.04.2025, del contrato 4600102792 de 2024 cuyo objeto es la construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias	94	1,00	$ 2.576.593,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.576.593,00

Notas Finales

Linea de negocio: Consorcio Vial VG- VNF, Porcentaje de Participación: Constructora VG SAS (Nit. 901.767.587-1) 50%, VNF SAS (Nit.900.049.274-8) 50%. AU:31.68%

Datos Totales

Documento generado el:
09/05/2025 10:26:04
Documento validado por la DIAN:
09/05/2025 10:26:04
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2576593
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2576593
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2576593
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2576593

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.576.593,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.576.593,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.576.593,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.576.593,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082863001 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2026-11-05

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3e20a1d7e85d15028052a727d9f8b5ca397100f12dca96c871812f9d05254a5a7e0c154a519897d4c976f2475e376411

Número de Factura: FVE-12
Fecha de Emisión: 09/05/2025
Fecha de Vencimiento: 08/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO VIAL VG-VNF
Nombre Comercial: CONSORCIO VIAL VG-VNF
Nit del Emisor: 901871689
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 127 # 13 A - 54 OF 603
Teléfono / Móvil: 3108541126
Correo: facturacion@vnfsas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890905211
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CL 44 52 165
Teléfono / Móvil: 3855513
Correo: recepcionfacturas@medellin.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	Reajuste de precios de las actas No1 de nov.2024, No2 de dic.2024 y ene.2025, No3 de feb.2025 y No4 de mar.2025, del contrato 4600102792 de 2024 cuyo objeto es la construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias	94	1,00	$ 50.967.193,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.967.193,00

Notas Finales

Linea de negocio: Consorcio Vial VG- VNF, Porcentaje de Participación: Constructora VG SAS (Nit. 901.767.587-1) 50%, VNF SAS (Nit.900.049.274-8) 50%. AU:31.68%

Datos Totales

Documento generado el:
09/05/2025 10:39:22
Documento validado por la DIAN:
09/05/2025 10:39:23
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		50967193
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		50967193
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		50967193
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 50967193

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		50.967.193,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		50.967.193,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		50.967.193,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 50.967.193,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082863001 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2026-11-05

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000760269 **División:01**
Pedido 5100008518
Contrato 4600102792
Secretaría Infraestruc.Fisica

Fecha Documento: 09.05.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Infraestructura F
Descripción del pago: FVE10
Objeto del contrato: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Proveedor

Codigo: 1200056338 **Nit:** 9018716899 **Nombre:** Consorcio Vial VG VNF

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	310001	CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS	733.601.436	733.601.436,00	5111150000	160070124	200030	010
		TOTAL	**733.601.436**	**733.601.436,00**				

Creado por John Bayron Serna Valencia
Registrado el 09.05.2025 14:09:34

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000760275 **División:01**
Pedido 5100008518
Contrato 4600102792
Secretaría Infraestruc.Fisica

Fecha Documento: 09.05.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Infraestructura F
Descripción del pago: FVE11
Objeto del contrato: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Proveedor

Codigo: 1200056338 **Nit:** 9018716899 **Nombre:** Consorcio Vial VG VNF

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240053	POLIZA REEMBOLSABLE	2.576.593	2.576.593,00	5111150000	160070124	200030	040
		TOTAL	**2.576.593**	**2.576.593,00**				

Creado por John Bayron Serna Valencia
Registrado el 09.05.2025 14:31:50

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000760270 **División:01**
Pedido 5100008518
Contrato 4600102792
Secretaría Infraestruc.Fisica

Fecha Documento: 09.05.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Infraestructura F
Descripción del pago: FVE12
Objeto del contrato: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Proveedor

Codigo: 1200056338 **Nit:** 9018716899 **Nombre:** Consorcio Vial VG VNF

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	310001	CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS	50.967.193	50.967.193,00	5111150000	160070124	200030	010
		TOTAL	**50.967.193**	**50.967.193,00**				

Creado por John Bayron Serna Valencia
Registrado el 09.05.2025 14:13:38

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FVE10
Fecha	09.05.2025
Valor	733.601.436,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Consorcio Vial VG VNF
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	CONSORCIO VIAL VG VNF
Entidad Bancaria	BANCO ITAÚ
No.Cuenta Bancaria	096074235
Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento

4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato	4600102792

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000760269	5100008518	200030	160070124	733.601.436,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	733.601.436,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio

7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
JOHN BAYRON SERNA VALENCIA	SUPERVISOR	204	3855555 EXT 6245

Creado por John Bayron Serna Valencia

Registrado 09.05.2025 14:11:34

Versión 6 - 2022

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FVE11
Fecha	09.05.2025
Valor	2.576.593,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Consorcio Vial VG VNF
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	CONSORCIO VIAL VG VNF
Entidad Bancaria	BANCO ITAÚ
No.Cuenta Bancaria	096074235
Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento

4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato: 4600102792

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000760275	5100008518	200030	160070124	2.576.593,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 2.576.593,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio

7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
JOHN BAYRON SERNA VALENCIA	SUPERVISOR	204	3855555 EXT 6245

Creado por John Bayron Serna Valencia

Registrado 09.05.2025 14:33:05

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FVE12
Fecha	09.05.2025
Valor	50.967.193,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Consorcio Vial VG VNF
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	CONSORCIO VIAL VG VNF
Entidad Bancaria	BANCO ITAÚ
No.Cuenta Bancaria	096074235
Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento

4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato	4600102792

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000760270	5100008518	200030	160070124	50.967.193,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	50.967.193,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio

7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
JOHN BAYRON SERNA VALENCIA	SUPERVISOR	204	3855555 EXT 6245

Creado por John Bayron Serna Valencia

Registrado 09.05.2025 14:16:28

Versión 6 - 2022

Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100448387

División: 01

Fecha: 09.05.2025
Factura/Número cuenta cobro: FVE10
Secretaría: Secretaría de Infraestructura Física
Dirección: CL 127 13 A 54 OF 603
Teléfono: 6017188690
Fecha Vcto: 12.05.2025
Detalle: CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS

Acreedor: Consorcio Vial VG VNF
NIT Acreedor: 9018716899
Codigo del Acreedor: 1200056338

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200056338	Consorcio Vial VG VNF	-631.044.437	2320202005				0701	200030
86	2425909999	Puente Mcia Transito	733.601.436	2320202005					200030
50	2436260200	RF Contrat Const.2%	-14.672.029	2320202005					200030
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-1.320.000	2320202005					200030
50	4110610100	Contribuc.Especial	-36.680.072	2320202005					200030
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-7.336.014	2320202005					200030
50	4105760200	Estamp.Adulto Mayor	-14.672.029	2320202005					200030
50	4105760100	Estamp.Procultura	-3.668.007	2320202005					200030
50	4105900100	Tasa Pro Deporte	-9.536.819	2320202005					200030
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-14.672.029	2320202005					200030

TOTAL A PAGAR: **631.044.437-**

ORDENADO POR: Jaime Naranjo Medina Impreso el 12.05.2025 **Página** **1 de 1**

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Consorcio Vial VG VNF **CEDULA:** 9018716899 **TELEFONO:** 6017188690
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 096074235.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** BANCO ITAÚ
CONDICION DE PAG0: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: LREYES (LEADY JOHANA REYES JIMENEZ).

Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100448385

División: 01

Fecha: 09.05.2025
Factura/Número cuenta cobro: FVE11
Secretaría: Secretaría de Infraestructura Física
Dirección: CL 127 13 A 54 OF 603
Teléfono: 6017188690
Fecha Vcto: 12.05.2025
Detalle: POLIZA REEMBOLSABLE

Acreedor: Consorcio Vial VG VNF
NIT Acreedor: 9018716899
Codigo del Acreedor: 1200056338

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200056338	Consorcio Vial VG VNF	-2.267.554	2320202005				0701	200030
86	2425909999	Puente Mcia Transito	2.576.593	2320202005					200030
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-5.000	2320202005					200030
50	4110610100	Contribuc.Especial	-128.830	2320202005					200030
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-25.766	2320202005					200030
50	4105760200	Estamp.Adulto Mayor	-51.532	2320202005					200030
50	4105760100	Estamp.Procultura	-12.883	2320202005					200030
50	4105900100	Tasa Pro Deporte	-33.496	2320202005					200030
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-51.532	2320202005					200030

TOTAL A PAGAR: **2.267.554-**

ORDENADO POR: Jaime Naranjo Medina Impreso el 12.05.2025 **Página** **1 de 1**

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Consorcio Vial VG VNF **CEDULA:** 9018716899 **TELEFONO:** 6017188690
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 096074235.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** BANCO ITAÚ
CONDICION DE PAG0: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: LREYES (LEADY JOHANA REYES JIMENEZ).

Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100448373

División: 01

Fecha: 09.05.2025
Factura/Número cuenta cobro: FVE12
Secretaría: Secretaría de Infraestructura Física
Dirección: CL 127 13 A 54 OF 603
Teléfono: 6017188690
Fecha Vcto: 12.05.2025
Detalle: CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS

Acreedor: Consorcio Vial VG VNF
NIT Acreedor: 9018716899
Codigo del Acreedor: 1200056338

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200056338	Consorcio Vial VG VNF	-43.841.719	2320202005				0701	200030
86	2425909999	Puente Mcia Transito	50.967.193	2320202005					200030
50	2436260200	RF Contrat Const.2%	-1.019.344	2320202005					200030
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-92.000	2320202005					200030
50	4110610100	Contribuc.Especial	-2.548.360	2320202005					200030
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-509.672	2320202005					200030
50	4105760200	Estamp.Adulto Mayor	-1.019.344	2320202005					200030
50	4105760100	Estamp.Procultura	-254.836	2320202005					200030
50	4105900100	Tasa Pro Deporte	-662.574	2320202005					200030
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-1.019.344	2320202005					200030

TOTAL A PAGAR: **43.841.719-**

ORDENADO POR: Jaime Naranjo Medina Impreso el 12.05.2025 **Página 1 de 1**

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Consorcio Vial VG VNF **CEDULA:** 9018716899 **TELEFONO:** 6017188690
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 096074235.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** BANCO ITAÚ
CONDICION DE PAG0: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: DOSORIOT (DANIEL ALBERTO OSORIO TAVERA).
