Consorcio Civil H&E
NIT. 901.767.013-6

INFORME DE OBRA No. 2

Dirección: Cra. 3 w N. 64-37 Barrio Chicalá
Email: consorciocivilheinder@gmail.com
Teléfonos: 3187167087
Ciudad: Neiva Huila


CONTRATO DE (OBRA/CONSULTORIA) No. CLPIH401 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO CIVIL H&E

INFORME MENSUAL N° 2

APOYO A LA SUPERVISIÓN		**ENTIDAD**	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	CLPIH401 DE 2023		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ, DEPARTAMENTO DEL HUILA	**PERIODO DEL INFORME**	Entre 01 de diciembre al 26 de diciembre 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CIVIL H&E	**NIT**	901.767.013-6
REPRESENTANTE LEGAL:	HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON	**C.C**	79.944.179 de Bogotá D.C.

FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	2 DE NOVIEMBRE DEL 2023
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16 DE NOVIEMBRE DEL 2023
PLAZO INICIAL	Tres (3) meses contando a partir del acta de inicio
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	N/A
PLAZO TOTAL	Tres (3) meses contando a partir del acta de inicio
VALOR INICIAL	QUINIENTOS cincuenta y un millones cuatrocientos ochenta y tres mil ciento ochenta y tres pesos ($551.483.183,00) M/CTE.
VALOR ADICIONAL (SI APLICA)	N/A
VALOR TOTAL	QUINIENTOS cincuenta y un millones cuatrocientos ochenta y tres mil ciento ochenta y tres pesos ($551.483.183,00) M/CTE.
INTERVENTOR	CONSORCIO WF Nit. 901.769.619-8 R.L. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

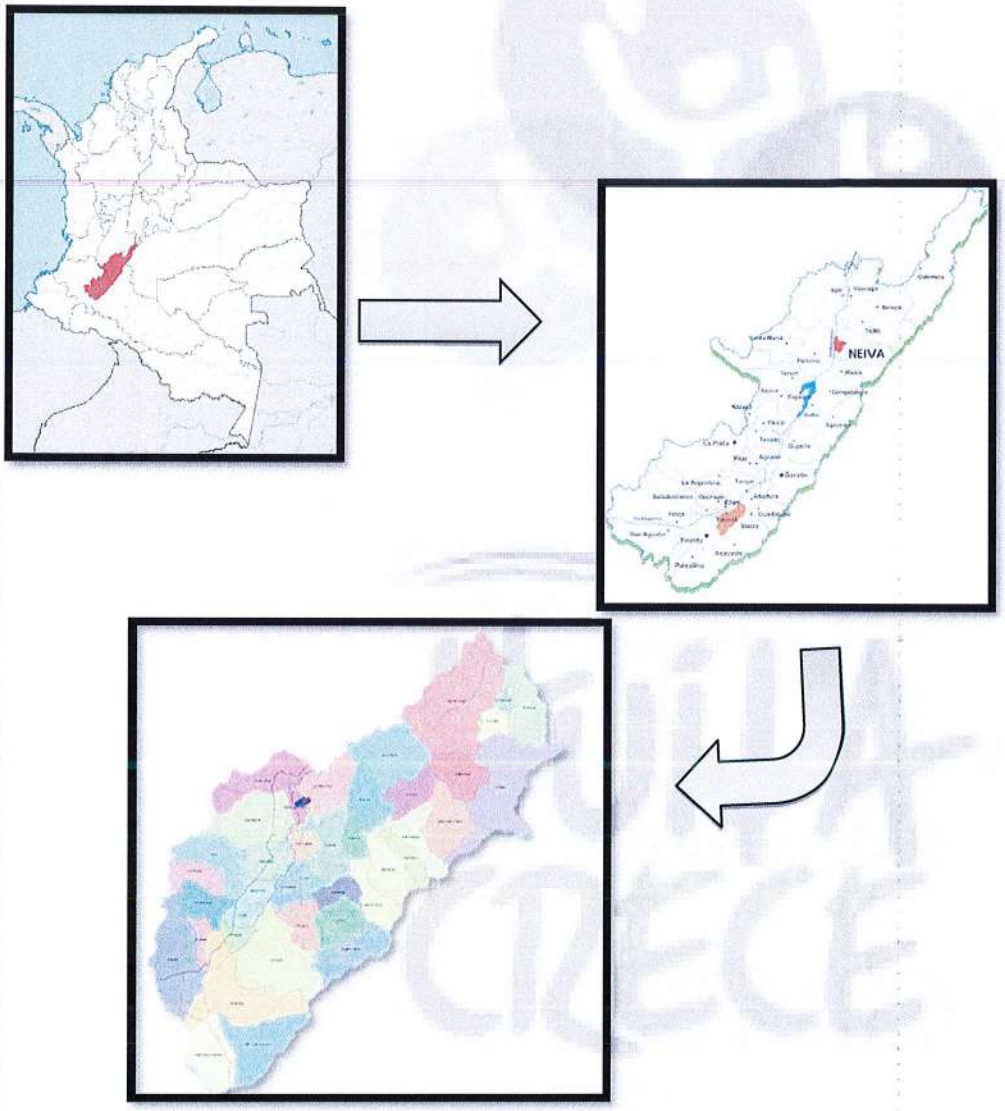

ILUSTRACIÒN 1. LOCALIZACIÒN MUNICIPIO DE TIMANA



ILUSTRACIÒN 2. LOCALIZACIÒN VEREDA PANTANOS TIMANA HUILA

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de (1) cubierta autoportante con iluminación para la vereda pantanos de la zona rural del Municipio de Timana Departamento del Huila

Es un sistema de estructura en concreto y teja auto portante a base de lámina de acero cal. 22:

- Área Total replanteo: 937,20 M2
- Actividades preliminares.
- Cimentación en concreto.
- Estructura en concreto.
- Cubierta.
- Instalaciones hidrosanitarias.
- Instalaciones eléctricas.


4. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO – ACTAS SUBSCRITAS E INFORME DE ACTAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION
Iniciación	16 de noviembre de 2023	**40**		
Suspensión No. 1	26 de Diciembre de 2023			
Reiniciación No. 1				
Terminación Cto.				
TOTAL DIAS		**40**	**0**	

5. TOTAL DIAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Entrega de dotación al personal, pagos de seguridad social, elaboración de bitácora, ajuste y balance de cantidades de obra. Aprobación de cambio de profesional Residente de Obra. Se crea el acta de comité de veeduría.
ACTIVIDADES OPERATIVAS	Se realizó la localización y replanteo Demolición de Placa con rotomartillo. Excavación Mecánica Zapatas y vigas de Amarre. Por el alto nivel freático que se encontró en obra, nos vimos en la necesidad de suspender las actividades de excavación ya que no se tenía contemplado dentro de nuestro contrato el manejo de las aguas subterráneas. Es por ello que se debe realizar un balance de obra en el cual se incluyan estos nuevos ítems como también se puedan verificar ciertas cantidades que al ser verificadas en el terreno difieren a las cantidades contractuales.

6. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

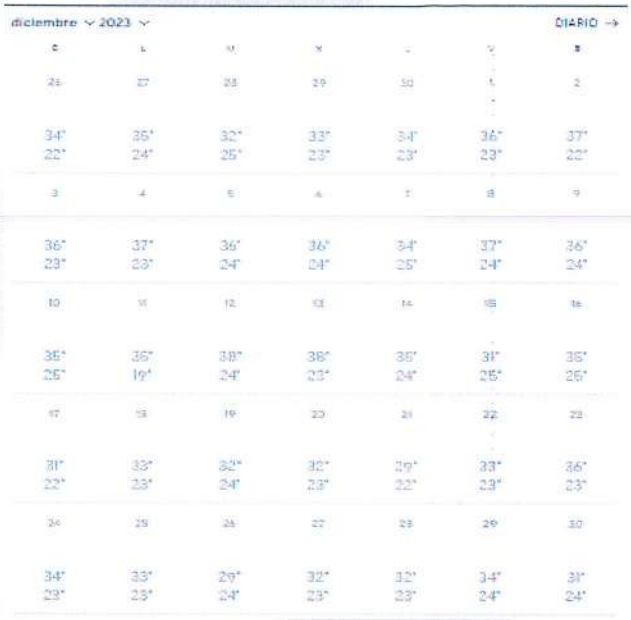

7. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

No se realizaron ensayos.

8. CONTROL DE ANTICIPO

En tramite

9. RELACION DE PERSONAL

PROFESIONAL	CARGO
HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON	**Director de Obra**
WILSON JAVIER RIVERA	**Residente de Obra**
LIZETH NAIROBY LUNA CUELLAR	**Personal Siso**

HERNAN FABRICIO CUELLAR	**Obrero**
JHON ALEXIS MUÑOZ	**Obrero**
CALOS ANDRES PEÑA	**Obrero**
DUBERNEY VILLAREAL	**Obrero**
WILSON JAVIER VILLAREAL	**Obrero**

10. RELACIÓN DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Acta No./Anticipo)	**No. COMPROBANTE**	**FECHA**
		__/__/____

11. RELACIÓN DE PAGOS DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	**PENSIÓN**	**SALUD**	**ARL**	**CCF**	**PARAFISCALES**	**N° PLANILLA**
HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON	$400.000	$312.500	$60.900	$50.000	$823.400	9462376644
WILSON JAVIER RIVERA	$185.600	$145.000	$80.800	$0	$411.400	8328202326
LIZETH NAIROBY LUNA CUELLAR	$185.600	$145.000	$80.800	$34.800	$446.200	28704889
HERNAN FABRICIO CUELLAR	$80.500	$35.000	$33.080	$15.100	$163.680	28706047
JHON ALEXIS MUÑOZ	$80.500	$35.000	$33.080	$15.100	$163.680	28706047
CALOS ANDRES PEÑA	$80.500	$35.000	$33.080	$15.100	$163.680	28706047
DUBERNEY VILLAREAL	$80.500	$35.000	$33.080	$15.100	$163.680	28706047
WILSON JAVIER VILLAREAL	$55.700	$24.300	$22.901	$10.500	$113.401	28706047

12. POLIZAS DE GARANTIA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (D/M/A):	HASTA (D/M/A):
SEGUROS	61-44-	0	02/11/2023	Cumplimiento del contrato	02/11/2023	02/08/2024

DEL ESTADO SA	10105 1701			Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	02/11/2023	02/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/11/2023	02/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (D/M/A):	HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-10101 8824	0	02/11/2023	Predios laborales y operacionales	02/11/2023	02/02/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (D/M/A):	HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-10105 1701	1	20/11/2023	Cumplimiento del contrato	02/11/2023	02/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	02/11/2023	02/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/11/2023	02/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (D/M/A):	HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-10101 8824	1	20/11/2023	Predios laborales y operacionales	02/11/2023	02/02/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (D/M/A):	HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-10105 1701	2	20/11/2023	Cumplimiento del contrato	16/11/2023	16/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	16/11/2023	16/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/11/2023	16/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0	Si ampara 5 años,0

					meses y 0 días	meses y 0 días
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (D/M/A):	HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-10101 8824	2	20/11/2023	Predios laborales y operacionales	16/11/2023	16/02/2024

13. PLANOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

N/A

14. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS								
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	% EJECUCION
1	PRELIMINARES							
1.1	Localización y replanteo.	M2	937,20	$ 3.558,00	$ 3.334.558,00	937,20	$3.558,00	0,00080646158162%
1.2	Corte de Placa de concreto e= 0.10 mts.	ML	20,30	$ 26.280,00	$ 533.484,00	20,30	$26.280,00	0,00595666395869%
1.3	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	2,00	$ 116.723,00	$ 233.446,00	2,00	$116.723,00	0,02645660910389%
1.4	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	185,33	$ 46.003,00	$ 8.525.736,00	114,31	$46.003,00	0,01042710852708%
1.5	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.	M3	114,10	$ 83.849,00	$ 9.566.836,00			0,00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 22.194.060,00**		**$ 3.247.031,00**	
2	CIMENTACIÓN							
2.1	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	15,92	$ 34.012,00	$ 541.471,00			0,00000000000000%
2.2	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	42,42	$ 619.063,00	$ 26.260.652,00			0,00000000000000%
2.3	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	2306	$ 7.116,00	$ 16.409.496,00			0,00000000000000%
2.4	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño,	M3	7,96	$ 742.041,00	$ 5.906.646,00			0,00000000000000%
2.5	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación.	KG	1127	$ 7.116,00	$ 8.019.732,00			0,00000000000000%
2.6	Concreto Ciclopeo - 2500 PSI (175 KG/CM2) 60% Concreto 2500 PSI + 40% Piedra media zonga	M3	53,98	$ 360.003,00	$ 19.434.402,00			0,00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 76.572.399,00**		**$**	
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO							

3.1	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	16,00	$ 920.829,00	$ 14.733.264,00			0,00000000000000%
3.2	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	4093,00	$ 7.116,00	$ 29.125.788,00			0,00000000000000%
3.3	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2- 3000 PSI. Incluye impermeabilización.	M3	20,00	$1.004.876,00	$ 20.097.520,00			0,00000000000000%
3.4	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	2160,00	$ 7.116,00	$ 15.370.560,00			0,00000000000000%
3.5	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	65,80	$ 40.347,00	$ 2.654.833,00			0,00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 81.981.965,00**		**$**	
4	CUBIERTA							
4.1	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	845,86	$ 211.559,00	$178.949.296,00			0,00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$178.949.296,00**		**$**	
5	ACABADOS - PLACA EN CONCRETO							0,00000000000000%
5.1	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	307,11	$ 14.798,00	$ 4.544.614,00			0,00000000000000%
5.2	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	2,00	$3.710.773,00	$ 7.421.546,00			0,00000000000000%
5.3	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	20,30	$ 73.943,00	$ 1.501.043,00			0,00000000000000%

5.4	Cuneta en concreto de 3.000psi, según diseño	ML	66,04	$ 83.852,00	$ 5.537.586,00			0,00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 19.004.789,00**		**$**	
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS							
6.1	Bajantes en tubería PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	49,60	$ 80.145,00	$ 3.975.192,00			0,00000000000000%
6.2	Suministro e instalación de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.	ML	24,10	$ 107.091,00	$ 2.580.893,00			0,00000000000000%
6.3	Suministro e instalación de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	24,00	$ 219.053,00	$ 5.257.272,00			0,00000000000000%
6.4	Caja de inspección en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms, con espesores de paredes de 0.10 mts. según diseño	UND	2,00	$ 349.989,00	$ 699.978,00			0,00000000000000%
6.5	Construcción de filtros laterales externos en un ancho de 0,40 mts, con altura variable menor a 0,50 mts, recubrimiento en geotextil no tejido NT-1600, con gravilla común o triturado de 1 1/2" a 4"+ tubería PVC drenaje de 6"	ML	66,04	$ 63.617,00	$ 4.201.267,00			0,00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 16.714.602,00**		**$**	
7	INSTALACIONES ELECTRICAS							
7.1	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	3,00	$ 638.903,00	$ 1.916.709,00			0,00000000000000%
7.2	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	16,54	$46.003,00	$747.089,00			0,00000000000000%


7.3	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	ML	29,00	$ 49.342,00	$1.430.918,00			0,00000000000000%
7.4	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2,00	$ 304.503,00	$609.006,00			0,00000000000000%
7.5	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	2,00	$282.276,00	$564.552,00			0,00000000000000%
7.6	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1,00	$1.016.827,00	$1.016.827,00			0,00000000000000%
7.7	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1,00	$4.701.216,00	$4.701.216,00			0,00000000000000%
7.8	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 AL ser8000 + 1x8 CU.	ML	12,00	$ 88.535,00	$ 1.062.420,00			0,00000000000000%
7.9	Suministro e instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12,00	$ 368.969,00	$ 4.427.628,00			0,00000000000000%
7.10	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	64,00	$ 58.153,00	$ 3.721.792,00			0,00000000000000%
7.11	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12,00	$1.018.790,00	$ 12.225.480,00			0,00000000000000%
7.12	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 975.015,00	$ 975.015,00			0,00000000000000%
7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$1.035.368,00	$ 1.035.368,00			0,00000000000000%
7.14	Excavación, hincada y plomada de postes de concreto de 8 mts x 510 kg armado y centrifugado.	UND	2,00	$ 2.252.908,00	$ 4.505.816,00			0,00000000000000%

7.15	Vestida de estructura de retención en baja tensión con grapa de retencion para cable trenzado y percha de gancho abierto.	UND	1,00	$ 340.951,00	$ 340.951,00			0,00000000000000%
7.16	Vestida de estructura de retención doble en baja tensión con dos grapas de retención para cable trenzado con perno de gancho abierto y percha de gancho abierto para sujeción de la red trenzada.	UND	1,00	$ 236.067,00	$ 236.067,00			0,00000000000000%
7.17	Vestida de estructura de retención en baja tensión con grapa de retención para cable trenzado y perno de gancho abierto.	UND	1,00	$ 340.951,00	$ 340.951,00			0,00000000000000%
7.18	Tendido y tensionado en conductor trenzado de aluminio aislado 2x35 mm + 50 mm tipo PE-XLPE - 600 VAC.	ML	55,00	$ 46.080,00	$ 2.534.400,00			0,00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 42.392.205,00**		**$**	
8	TRANSPORTE							
8.1	Transporte de materiales pétreos	M3-Km	3,070,21	$ 1.100,00	$ 3.377.231,00			0,00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 3.377.231,00**		**$**	
				% AVANCE DE OBRA				0,04364684317128%

R.L. HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON
CONTRATISTA OBRA

R.L. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
CONTRATISTA INTERVENTOR

14. REGISTRO FOTOGRAFICO

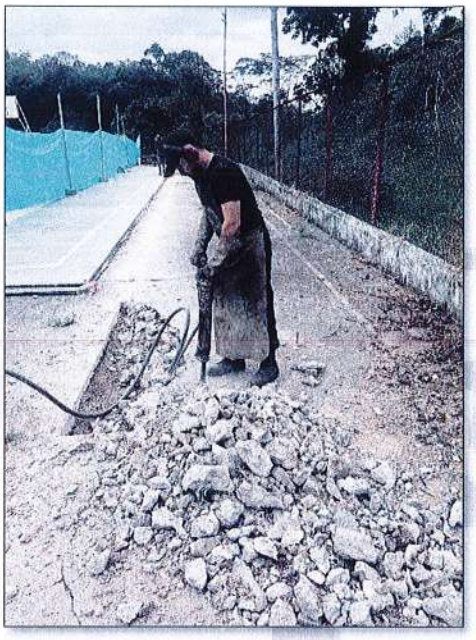

ILUSTRACIÒN 3. DEMOLICIÓN DE PLACA CON ROTOMARTILLO.



ILUSTRACIÒN 4. EXCAVACIÓN MECÁNICA ZAPATAS Y VIGAS DE AMARRE.



ILUSTRACIÒN 5. NIVEL FREATICO.

15. ANEXOS

(Anexar el informe HSEQ, informe PAPSO, actas de comités, registro de ensayos de laboratorio, ensayos de calidad, copia de la bitácora de obra, soportes de pago a aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP) y la correspondencia generada durante el periodo.

Entregar un CD con la copia digitalizada de todo el informe y sus anexos.

ING. HÈRNAN JOSE TRUJILLO CALDERON	(15/02/2024)	ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
FIRMA CONTRATISTA	**FECHA DE ENTREGA**	**VoBo INTERVENTOR**

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO CIVIL H&E NIT: 901.767.013-6	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV. 2023
		PÁG.: 1 DE 1
INDUCCION - REINDUCCION		

REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INDUCCIÓN

NOMBRE	JHON ALEXIS MUNOZ CUELLAR	CC	1077869893	NUEVO	X
CARGO	OFICIAL DE OBRA	FECHA	17/12/2024	ANTIGUO	

PROCESO	TEMA	CAPACITADOR	METODO EVALUACION
GESTION INTEGRAL	▪ Misión, Visión ▪ principios corporativos ▪ Reseña histórica		ORAL
ADMINISTRATIVA	▪ Presentación de la Empresa. ▪ Reglamento interno de trabajo ▪ Entrega de funciones y responsabilidades del cargo ▪ Horario para el cargo ▪ Documentos obligatorios hoja de vida. ▪ Dotación ▪ Manejo de comunicación	X	ORAL
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	▪ Sistema General de Seguridad Social en Colombia, Ley 100/1993 ▪ Socialización de Políticas SST, alcohol drogas y tabaco y respuesta ante emergencias ▪ Socialización de Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. ▪ Socialización de la matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros y sus respectivas recomendaciones. ▪ Presentación de comités y sus funciones: COPASST, CONVIVENCIA LABORAL ▪ Responsabilidades generales en SG-SST ▪ Plan de emergencias ▪ Procedimiento de reporte de incidente o accidente laboral ▪ Socialización PAPSO ▪ Socialización Protocolo de bioseguridad	X	ORAL
OBSERVACIONES			
JHON ALEXIS MUNOZ C.			
FIRMA DEL TRABAJADOR	GERENCIA	JEFE INMEDIATO	RESPONSABLE SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO CIVIL H&E NIT: 901.767.013-6	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV. 2023 PÁG.: 1 DE 1
	INDUCCION - REINDUCCION	

REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INDUCCIÓN

NOMBRE	HERNAN FABRICIO CUELLAR JIMENEZ	CC	1077012 555	NUEVO	X
CARGO	AYUDANTE DE OBRA	FECHA	17/12/2024.	ANTIGUO	

PROCESO	TEMA	CAPACITADOR	METODO EVALUACION
GESTION INTEGRAL	• Misión, Visión • principios corporativos • Reseña histórica	lizeth	ORAL
ADMINISTRATIVA	• Presentación de la Empresa. • Reglamento interno de trabajo • Entrega de funciones y responsabilidades del cargo • Horario para el cargo • Documentos obligatorios hoja de vida. • Dotación • Manejo de comunicación	X Lizeth	ORAL
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	• Sistema General de Seguridad Social en Colombia, Ley 100/1993 • Socialización de Políticas SST, alcohol drogas y tabaco y respuesta ante emergencias • Socialización de Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. • Socialización de la matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros y sus respectivas recomendaciones. • Presentación de comités y sus funciones: COPASST, CONVIVENCIA LABORAL • Responsabilidades generales en SG-SST • Plan de emergencias • Procedimiento de reporte de incidente o accidente laboral • Socialización PAPSO • Socialización Protocolo de bioseguridad	X Lizeth	ORAL
OBSERVACIONES			
Heron Fabricio Cuellar J.			
FIRMA DEL TRABAJADOR	GERENCIA	JEFE INMEDIATO	RESPONSABLE SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO CIVIL H&E NIT: 901.767.013-6 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	VERSIÓN: 01 FECHA: NOV. 2023 PÁG. 1 DE 1
	INDUCCION - REINDUCCION	

REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INDUCCIÓN

NOMBRE	CARLOS ANDRES PEÑA MATECHA	**CC**	1083893603	**NUEVO**	X
CARGO	AYUDANTE DE OBRA	**FECHA**	17/12/2024	**ANTIGUO**	

PROCESO	TEMA	CAPACITADOR	METODO EVALUACION
GESTION INTEGRAL	• Misión, Visión • principios corporativos • Reseña histórica	X	**ORAL**
ADMINISTRATIVA	• Presentación de la Empresa. • Reglamento interno de trabajo • Entrega de funciones y responsabilidades del cargo • Horario para el cargo • Documentos obligatorios hoja de vida. • Dotación • Manejo de comunicación	X	**ORAL**
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	• Sistema General de Seguridad Social en Colombia, Ley 100/1993 • Socialización de Políticas SST, alcohol drogas y tabaco y respuesta ante emergencias • Socialización de Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. • Socialización de la matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros y sus respectivas recomendaciones. • Presentación de comités y sus funciones: COPASST, CONVIVENCIA LABORAL • Responsabilidades generales en SG-SST • Plan de emergencias • Procedimiento de reporte de incidente o accidente laboral • Socialización PAPSO • Socialización Protocolo de bioseguridad	X	**ORAL**

OBSERVACIONES

FIRMA DEL TRABAJADOR	GERENCIA	JEFE INMEDIATO	RESPONSABLE SST
PEÑA CARLOS ANDRE			

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO CIVIL H&E NIT: 901.767.013-6	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV. 2023
		PÁG.: 1 DE 1
INDUCCION - REINDUCCION		

REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INDUCCIÓN

NOMBRE	JOSE DUBERNEY VILLAREAL CUERVO	CC	12 241 157	NUEVO	X
CARGO	AYUDANTE DE OBRA	FECHA	17/12/2024	ANTIGUO	

PROCESO	TEMA	CAPACITADOR	METODO EVALUACION
GESTION INTEGRAL	▪ Misión, Visión ▪ principios corporativos ▪ Reseña histórica		ORAL
ADMINISTRATIVA	▪ Presentación de la Empresa. ▪ Reglamento interno de trabajo ▪ Entrega de funciones y responsabilidades del cargo ▪ Horario para el cargo ▪ Documentos obligatorios hoja de vida. ▪ Dotación ▪ Manejo de comunicación	X	ORAL
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	▪ Sistema General de Seguridad Social en Colombia, Ley 100/1993 ▪ Socialización de Políticas SST, alcohol drogas y tabaco y respuesta ante emergencias ▪ Socialización de Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. ▪ Socialización de la matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros y sus respectivas recomendaciones. ▪ Presentación de comités y sus funciones: COPASST, CONVIVENCIA LABORAL ▪ Responsabilidades generales en SG-SST ▪ Plan de emergencias ▪ Procedimiento de reporte de incidente o accidente laboral ▪ Socialización PAPSO ▪ Socialización Protocolo de bioseguridad	X	ORAL
OBSERVACIONES			
FIRMA DEL TRABAJADOR	GERENCIA	JEFE INMEDIATO	RESPONSABLE SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO CIVIL H&E NIT: 901.767.013-6	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV. 2023 PÁG.: 1 DE 1
	INDUCCION - REINDUCCION	

REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INDUCCIÓN

NOMBRE	WILSON JAVIER V.	CC	1002931990	NUEVO	X
CARGO	Ayudante de obra	FECHA	18/12/2024	ANTIGUO	

PROCESO	TEMA	CAPACITADOR	METODO EVALUACION
GESTION INTEGRAL	• Misión, Visión • principios corporativos • Reseña histórica	X	ORAL
ADMINISTRATIVA	• Presentación de la Empresa. • Reglamento interno de trabajo • Entrega de funciones y responsabilidades del cargo • Horario para el cargo • Documentos obligatorios hoja de vida. • Dotación • Manejo de comunicación	X	ORAL
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	• Sistema General de Seguridad Social en Colombia, Ley 100/1993 • Socialización de Políticas SST, alcohol drogas y tabaco y respuesta ante emergencias • Socialización de Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. • Socialización de la matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros y sus respectivas recomendaciones. • Presentación de comités y sus funciones: COPASST, CONVIVENCIA LABORAL • Responsabilidades generales en SG-SST • Plan de emergencias • Procedimiento de reporte de incidente o accidente laboral • Socialización PAPSO • Socialización Protocolo de bioseguridad	X	ORAL
OBSERVACIONES			
WILSON JAVIER VILLAREAL			
FIRMA DEL TRABAJADOR	GERENCIA	JEFE INMEDIATO	RESPONSABLE SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT. 901.767.013-6

CONSORCIO CIVIL H&E

NIT: 901.767.013-6

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP

FECHA DE ENTREGA: SEMANA DEL 18 AL 23 DICIEMBRE 2023

	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA DEL TRABAJADOR	CARGO/ACTIVIDAD	LAVADO DE MANOS			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS								DOTACION				TIPO DE ENTREGA		FIRMA DEL TRABAJADOR
							CABEZA	VISUAL	AUDITIVA	RESPIRATORIA	MANOS		ALTURAS		CUERPO						
				Jabón antibacterial	Alcohol	Gel antibacterial	Casco	Gafas de seguridad	Protector auditivo de inserción	Tapabocas industrial	Guantes de carnaza	Guantes de vaqueta	Arnés	Eslingas	BUSO	PANTALON	Bbotas	CHALECO REFLECTIVO	INICIAL	REPOSICION	
1.	JHON ALEXIS MUÑOZ	1077869893	OFICIAL				X	X	X			X							X		JHON ALEXIS MUÑOZ
2.	HERNAN FABRICIO CUELLAR	1077012555	AYUDANTE				X	X	X			X							X		HERNAN FABRICIO
3.	CARLOS ANDRES PEÑA	1083893603	AYUDANTE				X	X	X			X							X		PEÑA CARLOS
4.	JOSE DUBERNEY VILLAREAL	12241757	AYUDANTE				X	X	X			X							X		DUBERNEY V.
5.	WILSON JAVIER	1080931990	AYUDANTE				X	X	X			X							X		WILSON JAVIER V.
6.																					
7.																					
8.																					
9																					
10.																					
11.																					
12.																					
13.																					
14.																					
15.																					
16.																					
17.																					
18.																					

Powered by CamScanner

INFORME MENSUAL

DEL 1 AL 26 DICIEMBRE DE 2023

AVANCES EN PROCESO DEL SISTEMA DE GESTION SST

ACTIVIDADES REALIZADA POR CONTRATISTA

1. Inducción
2. Entrega de EPP
3. Inspecciones de herramienta menor
4. Inspección de maquinaria y equipo
5. Inspección a equipos de emergencia

DESCRIPCÓN DE LAS ACTIVIDADES

- Se realiza inducción al personal de obra para inicio de actividades donde se socializa los componentes de gestión integral (Principios corporativos, misión, visión) componente administrativo (Presentación de la empresa, reglamento interno de trabajo, funciones y responsabilidades del cargo, horario de trabajo, dotación y manejo de documentación) y componente de seguridad y salud en el Trabajo SST (Políticas, matriz y planes)

- Se realiza entrega de dotación inicial y EPP (Elementos de protección personal) para la ejecución de sus labores, los cuales se suministran cada que los requieran.

- Se realiza inspección pre operacional semanal de las herramientas menores utilizadas para la realización de las actividades diarias, verificando que se encuentren aptas para su uso o si es necesario realizar los ajustes pertinentes.

- Inspección pre-operacional de equipos, esto se realiza con el propósito de verificar el adecuado estado de los mismos durante la ejecución de sus labores, y si, se llegase a presentar alguna

falla detectar a tiempo y realizar sus respectivos ajustes.

- Se realizó inspección de equipo de emergencias extintor, botiquín y camilla, los cuales se encuentran ubicado en obra y en adecuadas condiciones para el momento que sean requeridos hacer uso de estos.

REGISTRO FOTOGRAFICO

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MANOR



INSPECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO





CERRAMIENTO





TEMAS PENDIENTES:

- Continuar capacitación para el personal

COMPROMISOS

- Charlas pre operacionales
- Capacitaciones e inspecciones

ANEXOS

1. Control de afiliaciones
2. Inducción
3. Entrega de EPP
4. Informe
5. Inspecciones de herramienta menor
6. Inspección de maquinaria y equipo
7. Inspección de botiquín, camilla y extintor
8. Lista de personal
9. Documentos de maquinaria
10. ATS

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT. 901.767.013-6

CONSORCIO VIAS H&E	
NIT: 901.767.013-6	VERSION 01
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV. 2023
INSPECCION DE HERRAMIENTAS MENORES	

FECHA	SEMANA DEL 18 AL 23 DICIEMBRE 2023.
OBRA	OBRA - PANTANOS
AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE DE QUIEN REPORTA:	Lizeth Luna Cuellar

B = BUENO | M = MALO | N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**			
1	Se usa la adecuada al trabajo	X		
2	Se encuentran en buen estado	X		
3	Se guardan y portan adecuadamente	X		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	X		
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**	B	M	NA
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo			X
2	Los cinceles se encuentran afilados			X
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos			X
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			X
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	X		
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			X
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**	B	M	NA
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	X		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	X		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	X		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**	B	M	NA
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas			X
2	Se observan en la llave huellas y palancas			X
3	Se dispone de llaves para golpear			X
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas			X
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	X		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado			X
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	X		
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**	B	M	NA
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	X		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X		
3	Están limpia y lubricadas	X		
4	Tienen sus guardas	X		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X		
6	El cable y enchufe no presentan daños	X		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes			X
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			X
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			X
10	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			X
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	X		
F	**HERRAMIENTA NEUMATICA**	B	M	NA
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			X
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			X
3	Se trabaja a las presiones indicadas			X
4	La herramienta es descargada al terminar.			X

OBSERVACIONES

Lizeth Luna Cuellar

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN | RESPONSABLE DEL SG-SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO VIAS H&E	
	NIT: 901.767.013-6	VERSION 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV. 2023
	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MENORES	

FECHA	SEMANA DEL 25 AL 26 DICIEMBRE.
OBRA	PANTANOS
AREA INSPECCIONADA	OBRA
NOMBRE DE QUIEN REPORTA	Lizeth Luna Cuellar.

B = BUENO | M = MALO | N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**	B	M	NA
1	Se usa la adecuada al trabajo	X		
2	Se encuentran en buen estado	X		
3	Se guardan y portan adecuadamente	X		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	X		
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**	B	M	NA
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo			X
2	Los cinceles se encuentran afilados			X
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos			X
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			X
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	X		
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			X
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**	B	M	NA
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	X		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	X		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	X		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**	B	M	NA
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas			X
2	Se observan en la llave huellas y palancas			X
3	Se dispone de llaves para golpear			X
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas			X
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	X		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	X		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	X		
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**	B	M	NA
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	X		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X		
3	Están limpia y lubricadas	X		
4	Tienen sus guardas	X		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X		
6	El cable y enchufe no presentan daños	X		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	X		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			X
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			X
10	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			X
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	X		
F	**HERRAMIENTA NEUMATICA**	B	M	NA
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			X
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			X
3	Se trabaja a las presiones indicadas			X
4	La herramienta es descargada al terminar.			X

OBSERVACIONES

Lizeth Luna Cuellar

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	RESPONSABLE DEL SG-SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO CIVIL H&E	
	NIT: 901 767.013-6	VERSIÓN 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV 2023
		PÁG 1 DE 3

INSPECCIÓN VOLQUETA "VOLQUETA"

Area: OBRA	**Subcontratista:**	**Placa:** BBJ316
Inspeccion realizada por (operador): Lizeth Luna Cuellar.		
Semana de inspeccion del 4 **a** 9 **de** Diciembre **del** 2024.	**Marca:** INTERNACIONAL	**Modelo:** 1982

ITEM	DESCRIPCION	LUN			MAR			MIÉR			JUE			VIE			SÁB			DOM		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De Trabajo delanteras							X			X											
	Direccionales							X			X											
	De trabajo traseras							X			X											
	Testigos del tablero							X			X											
	Batería, cables y bornes							X			X											
	Luces de placa							X			X											
	Stop							X			X											
	Estroboscopica (Rutilante)							X			X											
	Exploradoras							X			X											
CABINA	Indicadores (refrigerante, amperimetro, presión aceite -motor, velocimetro)							X			X											
	Cinta reflectiva							X			X											
	Resorte, Antena, Banderola, Luz Tipo Capsula							X			X											
	Sistema Air Bag (Bolsa De Aire)							X			X											
	Control De Velocidad Ivms (In Vehicle Monitoring System							X			X											
	Cinturón de seguridad							X			X											
	Extintor - Fecha							X			X											
	Botiquín (Alcohol, gasas, algodón, curitas, agua oxigenada, isodine, alka seltser, sal de frutas, milanta, acetaminofen, gotas oticas, vendas, visina)							X			X											
	Puertas (vidrios, seguros, manijas)							X			X											
	Asiento							X			X											
	Vidrio panorámico en buen estado							X			X											
	Limpiavidrios							X			X											
	Alarma de retroceso							X			X											
	Pito							X			X											
	Espejos laterales							X			X											
	Desempañador delantero / trasero							X			X											
	Iluminación de la cabina							X			X											
	Herramientas							X			X											
	Gato							X			X											
	Cruceta							X			X											
	Espejo central							X			X											
	Equipo de carretera completo							X			X											
	Palancas de mando (sencilla y doble si aplica)							X			X											

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO CIVIL H&E	
	NIT: 901 767.013-6	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV 2023
		PÁG: 2 DE 3

INSPECCIÓN VOLQUETA "VOLQUETA"

	Sistema de Comunicación	
	Frenos (de emergencia y servicio)	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	
	Frenos ABS	
	Dirección (sin juegos, ruido, etc)	
	Seguro de la compuerta de tolva)	
	Mando de levante del platón	
	Gatos (cilindro de levante de tolva)	
	Comportamiento del motor (fugas, ruidos, raros, aseo)	
	Bateria (niveles,bornes,cables, tapa)	
	Tanque de combustible (tapa,fugas)	
	Cadena del cardán	
	LLANTAS	
	Delanteras (Estado fisico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)	
	Traseras (Estado fisico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)	
	Fugas refrigerantes	
	Llanta de repuesto	
	Kilometro inicial	
	Kilometro final	
	Kilómetros recorridos	
ESTADO DEL PLATÓN	Estado general del platón	
	Estado de la puerta del platon, anclajes	
	Estado de la carpa	
	Estado de los ganchos de la carpa	
	Mando de levante del platón	
	Gato (cilindro de levante del platon)	
	Estado de sistema hidraulico de platón	

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO CIVIL H&E	
	NIT: 901 767.013-6	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: FEB 01 2022
		PÁG: 3 DE 3

INSPECCIÓN VOLQUETA "VOLQUETA"

Nombres y Apellidos Supervisor y/o Ing Residente :

Nombre Conductor: MIGUEL CAMERO			**Placa No:**	BBJ 316	
Tarjeta de propiedad:	SI	NO	**SOAT No:**		
Licencia de conducción:	SI	NO			
Póliza Todo Riesgo :	SI	NO	**Fecha de Vencimiento SOAT:**		
Certificado de seguridad de responsabilidad civil para transportadores :	SI	NO N.A.	**Fecha de Vencimiento:**		
Revisión Técnico-Mecánica :	SI	NO	**Fecha de Vencimiento:**		
Alcoholimetria:					

OBSERVACIONES :

Plan de Accion Correctiva - Seguimiento**

Fecha	C/S			Descripcion	Responsable	Firma

C = Correccion S = Seguimiento

Responsable de Acciones Correctivas:	Firma:

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT. 901.767.013-6

CONSORCIO CIVIL H&E		
NIT: 901 767.013-6		VERSIÓN: 01
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST		FECHA: NOV 2023
		PÁG: 1 DE 2

PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA "EXCAVADORA"

Area: OBRA | Subcontratista: | Numero Interno: 11

Inspeccion relizada Por: Ureth Luna Cuello | Marca: | Modelo: 2001

Semana de Inspeccion del 4 al 9 de Diciembre del 2023

ITEM	DESCRIPCION	LUN B	LUN M	LUN N/A	MAR B	MAR M	MAR N/A	MIER B	MIER M	MIER N/A	JUE B	JUE M	JUE N/A	VIE B	VIE M	VIE N/A	SAB B	SAB M	SAB N/A	DOM B	DOM M	DOM N/A
LUCES	De trabajo delanteras				Y			Y			Y			Y								
	De trabajo traseras				Y			Y			Y			Y								
	Direccionales				Y			Y			Y			Y								
	De parqueo				Y			Y			Y			Y								
CABINA	Protección antivuelco				Y			Y			Y			Y								
	Cinturón de seguridad				Y			Y			Y			Y								
	Extinguidor de incendios				Y			Y			Y			Y								
	Asiento en buen estado				Y			Y			Y			Y								
	Vidrio panorámico				Y			Y			Y			Y								
	Indicadores * (refrigerante, horometro, corriente, presión de aceite motor, voltimetro, hidráulico)				Y			Y			Y			Y								
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)				Y			Y			Y			Y								
	Alarma de retroceso				Y			Y			Y			Y								
	Escalera y apoyos de acceso				Y			Y			Y			Y								
	Espejos laterales, central				Y			Y			Y			Y								
	Palancas de mando de movimiento				Y			Y			Y			Y								
	Frenos * (de emergencia, de parqueo)				Y			Y			Y			Y								
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas				Y			Y			Y			Y								
	Estado de pasadores (cuchilla-desgarrador)				Y			Y			Y			Y								
	Mandos de operación elementos				Y			Y			Y			Y								
	Estado general * (escalificador, cuchilla)				Y			Y			Y			Y								
	Estado de los cilindros				Y			Y			Y			Y								
	Estado del motor (sin fugas, aseado, ruidos raros)				Y			Y			Y			Y								
	Soporte del desgarrador, cuchilla				Y			Y			Y			Y								
	Estado del brazo excavador, cuchillas y/o balde				Y			Y			Y			Y								
	Batería * (cables, bornes, nivel)				Y			Y			Y			Y								
	Estado del tren de rodamiento(Rueda motriz, ruedas guias, dientes, cadenas, oruga)				Y			Y			Y			Y								

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT. 901.767.013-6

CONSORCIO PROAQUA 2022	
NIT: 901 767.013-6	VERSIÓN: 01
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV. 2023
	PÁG: 2 DE 2

INSPECCIÓN DE MAQUINARIA "EXCAVADORA"

Nombres y Apellidos Supervisor y/o Ing Residente :

Nombre Conductor:

Tarjeta de propiedad: SI X NO

Licencia de conducción: SI Y NO

Poliza Todo Riesgo : SI Y NO

Certificado de importació : SI X NO N.A.

Alcoholimetria:

Serial No: 45102

Marca / Modelo: CATERPILAR 2001

No. De motor: 7JK49543

OBSERVACIONES :

Plan de Accion Correctiva - Seguimiento**

Fecha	C/S			Descripcion	Responsable	Firma

C = Correccion S = Seguimiento

Responsable de Acciones Correctivas | Firma:

* Escriba toda especificacion que requiera aclarar en el espacio **Observaciones**

** Para ser diligenciado por el competente mecanico o encargado de mantenimiento

No deje ningun espacio en blanco, diligencie el formato en su totalidad.

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO CIVIL H&E	
	NIT: 901 767.013-6	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV 2023
		PÁG: 1 DE 3

INSPECCIÓN VOLQUETA "VOLQUETA"

Area: OBRA PANTANOS	**Subcontratista:**	**Placa:** BBJ 316.
Inspeccion realizada por (operador):		
Semana de inspeccion del 11 **a** 16 **de** Diciembre **del** 2024.	**Marca:** INTERNACIONAL	**Modelo:** 1982.

ITEM	DESCRIPCION	LUN			MAR			MIÉR			JUE			VIE			SÁB			DOM		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De Trabajo delanteras	X						X														
	Direccionales	X						X														
	De trabajo traseras	X						X														
	Testigos del tablero	X						X														
	Bateria, cables y bornes	X						X														
	Luces de placa	X						X														
	Stop	X						X														
	Estroboscopica (Rutilante)	V						X														
	Exploradoras	V						V														
CABINA	Indicadores (refrigerante, amperímetro, presión aceite -motor, velocímetro)	X						X														
	Cinta reflectiva	V						X														
	Resorte, Antena, Banderola, Luz Tipo Capsula	X						X														
	Sistema Air Bag (Bolsa De Aire)	X						X														
	Control De Velocidad Ivms (In Vehicle Monitoring System	X						X														
	Cinturón de seguridad	X						X														
	Extintor - Fecha:	X						X														
	Botiquín (Alcohol, gasas, algodón, curitas, agua oxigenada, isodine, alka seltser, sal de frutas, milanta, acetaminofen, gotas oticas, vendas, visina)	X						X														
	Puertas (vidnos, seguros, manijas)	X						X														
	Asiento	X						X														
	Vidrio panorámico en buen estado	X						X														
	Limpiavidrios	X						X														
	Alarma de retroceso	X						X														
	Pito	X						X														
	Espejos laterales	X						X														
	Desempañador delantero / trasero	X						X														
	Iluminación de la cabina	X						X														
	Herramientas	X						X														
	Gato	X						X														
	Cruceta	X						X														
	Espejo central	X						X														
	Equipo de carretera completo	V					/	X														
	Palancas de mando (sencilla y doble si aplica)	X				/		X														

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO CIVIL H&E	
	NIT: 901 767.013-6	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV 2023
		PÁG: 2 DE 3

INSPECCIÓN VOLQUETA "VOLQUETA"

| | | |

VERSION: 01
FECHA: NOV 2023
PAG: 2 DE 3

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT. 901.767.013-6

CONSORCIO CIVIL H&E		
NIT. 901 767.013-6		VERSIÓN: 01
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST		FECHA: NOV 2023
		PÁG: 1 DE 2

PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA "EXCAVADORA"

Area: OBRA PANTANOS | Subcontratista: | Numero Interno: # 1

Inspeccion relizada Por: Lizeth Lucia Cuellar

Semana de inspeccion del 11 al 16 de Diciembre del 2024 | Marca: | Modelo: 2001

ITEM	DESCRIPCION	LUN B	LUN M	LUN N/A	MAR B	MAR M	MAR N/A	MIÉR B	MIÉR M	MIÉR N/A	JUE B	JUE M	JUE N/A	VIE B	VIE M	VIE N/A	SÁB B	SÁB M	SÁB N/A	DOM B	DOM M	DOM N/A
LUCES	De trabajo delanteras	X			X			X														
	De trabajo traseras	X			X			X														
	Direccionales	X			X			X														
	De parqueo	X			X			X														
CABINA	Protección antivuelco	X			X			X														
	Cinturón de seguridad	X			X			X														
	Extinguidor de incendios	X			X			X														
	Asiento en buen estado	X			X			X														
	Vidrio panorámico	X			X			X														
	Indicadores * (refrigerante, horometro, corriente, presión de aceite motor, voltimetro, hidráulico)	X			X			X														
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)	X			X			X														
	Alarma de retroceso	X			X			X														
	Escalera y apoyos de acceso	X			X			X														
	Espejos laterales, central	X			X			X														
	Palancas de mando de movimiento	X			X			X														
	Frenos * (de emergencia, de parqueo)	X			X			X														
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	X			X			X														
	Estado de pasadores (cuchilla-desgarrador)	X			X			X														
	Mandos de operación elementos	X			X			X														
	Estado general * (escalificador, cuchilla)	X			X			X														
	Estado de los cilindros	X			X			X														
	Estado del motor (sin fugas, aseado, ruidos raros)	X			X			X														
	Soporte del desgarrador, cuchilla	X			X			X														
	Estado del brazo excavador, cuchillas y/o balde	X			X			X														
	Batería * (cables, bornes, nivel)	X			X			X														
	Estado del tren de rodamiento(Rueda motriz, ruedas guias, dientes, cadenas, oruga)	X			X			X														

CONSORCIO PROAQUA 2022	
NIT: 901 767.013-6	VERSIÓN: 01
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV. 2023
	PÁG: 2 DE 2

INSPECCIÓN DE MAQUINARIA "EXCAVADORA "

Nombres y Apellidos Supervisor y/o Ing Residente :			
Nombre Conductor:		Serial No:	45142
Tarjeta de propiedad:	SI X NO	Marca / Modelo:	CATERPILAR 2001
Licencia de conducción:	SI X NO	No. De motor:	7JK48543
Póliza Todo Riesgo :	SI X NO		
Certificado de importació :	SI X NO N.A.		
Alcoholimetria:			

OBSERVACIONES :

Plan de Accion Correctiva - Seguimiento**

Fecha	C/S			Descripcion	Responsable	Firma

C = Correccion S = Seguimiento

Responsable de Acciones Correctivas: | Firma:

* Escriba toda especificacion que requiera aclarar en el espacio **Observaciones**

** Para ser diligenciado por el competente mecanico o encargado de mantenimiento

No deje ningun espacio en blanco, diligencie el formato en su totalidad.

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO CIVIL H&E	
	NIT: 901 767.013-6	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV 2023
		PÁG: 1 DE 3

INSPECCION VOLQUETA "VOLQUETA"

Area: OBRA PANTANOS	**Subcontratista:**	**Placa:** BBJ 316.
Inspeccion realizada por (operador): Lizeth Luna Cuellar		
Semana de inspeccion del 18 **a** 23 **de** Diciembre **del** 2024.	**Marca:** INTERNATIONAL.	**Modelo:** 1982

ITEM	DESCRIPCION	LUN			MAR			MIÉR			JUE			VIE			SÁB			DOM		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De Trabajo delanteras				X																	
	Direccionales				X																	
	De trabajo traseras				X																	
	Testigos del tablero				X																	
	Bateria, cables y bornes				X																	
	Luces de placa				X																	
	Stop				X																	
	Estroboscopica (Rutilante)				X																	
	Exploradoras				X																	
CABINA	Indicadores (refrigerante, amperímetro, presión aceite -motor, velocimetro)				X																	
	Cinta reflectiva				X																	
	Resorte, Antena, Banderola, Luz Tipo Capsula				X																	
	Sistema Air Bag (Bolsa De Aire)				X																	
	Control De Velocidad Ivms (In Vehicle Monitoring System				X																	
	Cinturón de seguridad				X																	
	Extintor - Fecha				X																	
	Botiquin (Alcohol, gasas, algodón, curitas, agua oxigenada, isodine, alka seltser, sal de frutas, milanta, acetaminofen, gotas oticas, vendas, visina)				X																	
	Puertas (vidrios, seguros, manijas)				X																	
	Asiento				X																	
	Vidrio panorámico en buen estado				X																	
	Limpiavidrios				X																	
	Alarma de retroceso				X																	
	Pito				X																	
	Espejos laterales				X																	
	Desempañador delantero / trasero				X																	
	Iluminación de la cabina				X																	
	Herramientas				X																	
	Gato				X																	
	Cruceta				X																	
	Espejo central				X																	
	Equipo de carretera completo				X																	
	Palancas de mando (sencilla y doble si aplica)				X																	

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E NIT: 901.767.013-6	CONSORCIO CIVIL H&E	
	NIT: 901 767.013-6	VERSIÓN 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV 2023
		PAG: 2 DE 3

INSPECCIÓN VOLQUETA "VOLQUETA"

	Sistema de Comunicación	Y
	Frenos (de emergencia y servicio)	Y
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Y
	Frenos ABS	X
	Dirección (sin juegos, ruido, etc)	Y
	Seguro de la compuerta de tolva)	X
	Mando de levante del platón	Y
	Gatos (cilindro de levante de tolva)	Y
	Comportamiento del motor (fugas, ruidos, raros, aseo)	Y
	Bateria (niveles,bornes,cables, tapa)	Y
	Tanque de combustible (tapa,fugas)	X
	Cadena del cardán	X
	LLANTAS	X
	Delanteras (Estado fisico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)	Y
	Traseras (Estado fisico no lisas, sin cortaduras profundas, sin abultamientos)	Y
	Fugas refrigerantes	X
	Llanta de repuesto	X
	Kilometro inicial	Y
	Kilometro final	X
	Kilómetros recorridos	Y
ESTADO DEL PLATÓN	Estado general del platón	X
	Estado de la puerta del platon, anclajes	Y
	Estado de la carpa	X
	Estado de los ganchos de la carpa	X
	Mando de levante del platón	X
	Gato (cilindro de levante del platon)	X
	Estado de sistema hidraulico de platón	X

CONSORCIO CIVIL H&E NIT: 901.767.013-6	CONSORCIO CIVIL H&E	
	NIT: 901 767.013-6	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: FEB 01 2022
		PAG: 3 DE 3

INSPECCIÓN VOLQUETA "VOLQUETA"

Nombres y Apellidos Supervisor y/o Ing Residente :

Nombre Conductor: MIGUEL CAMERO				**Placa No:**	BBJ316
Tarjeta de propiedad:	SI ✓	NO		**SOAT No:**	1982
Licencia de conducción:	SI X	NO			
Póliza Todo Riesgo :	SI ✓	NO	**Fecha de Vencimiento SOAT:**		
Certificado de seguridad de responsabilidad civil para transportadores :	SI	NO	N.A.	**Fecha de Vencimiento:**	
Revisión Técnico-Mecánica :	SI X	NO	**Fecha de Vencimiento:**		
Alcoholimetria:					

OBSERVACIONES :

Plan de Accion Correctiva - Seguimiento**

Fecha	C/S			Descripcion	Responsable	Firma

C = Correccion S = Seguimiento

Responsable de Acciones Correctivas:	Firma:

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E		
CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	NIT: 901 767.013-6	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV 2023
		PÁG: 1 DE 2

PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA "EXCAVADORA"

Area: OBRA PANTANOS	Subcontratista:	Numero Interno: #1
Inspeccion relizada Por: Lizeth Lino Cuellar		
Semana de inspeccion del 18 al 23 de Diembre del 2024	Marca:	Modelo: 2001

ITEM	DESCRIPCION	LUN			MAR			MIER			JUE			VIE			SAB			DOM		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras				X																	
	De trabajo traseras				X																	
	Direccionales				X																	
	De parqueo				X																	
CABINA	Protección antivuelco				X																	
	Cinturón de segundad				X																	
	Extinguidor de incendios				X																	
	Asiento en buen estado				X																	
	Vidno panorámico				X																	
	Indicadores * (refrigerante, horometro, comente, presión de aceite motor, voltimetro, hidráulico)				X																	
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)				X																	
	Alarma de retroceso				X																	
	Escalera y apoyos de acceso				X																	
	Espejos laterales, central				X																	
	Palancas de mando de movimiento				X																	
	Frenos * (de emergencia, de parqueo)				X																	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas				X																	
	Estado de pasadores (cuchilla-desgarrador)				X																	
	Mandos de operación elementos				X																	
	Estado general * (escalificador, cuchilla)				X																	
	Estado de los cilindros				X																	
	Estado del motor (sin fugas, aseado, ruidos raros)				X																	
	Soporte del desgarrador, cuchilla				X																	
	Estado del brazo excavador, cuchillas y/o balde				X																	
	Batería * (cables, bornes, nivel)				X																	
	Estado del tren de rodamiento(Rueda motriz, ruedas guias, dientes, cadenas, oruga)				X																	

CONSORCIO PROAQUA 2022		
CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	NIT: 901 767.013-6	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV. 2023
		PÁG: 2 DE 2

INSPECCIÓN DE MAQUINARIA "EXCAVADORA"

Nombres y Apellidos Supervisor y/o Ing Residente :			
Nombre Conductor:		Serial No:	45142
Tarjeta de propiedad:	SI X NO	Marca / Modelo:	CATERPILAR 2001
Licencia de conducción:	SI X NO	No. De motor:	HK48543
Póliza Todo Riesgo :	SI X NO		
Certificado de importació :	SI X NO N.A.		
Alcoholimetria:			

OBSERVACIONES :

Plan de Accion Correctiva - Seguimiento**

Fecha	C/S			Descripcion	Responsable	Firma

C = Correccion S = Seguimiento

Responsable de Acciones Correctivas	Firma

* Escriba toda especificacion que requiera aclarar en el espacio **Observaciones**

** Para ser diligenciado por el competente mecanico o encargado de mantenimiento

No deje ningun espacio en blanco, diligencie el formato en su totalidad.

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO CIVIL H&E	
	NIT: 901 767.013-6	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV. 2023
	INSPECCIÓN DE CAMILLA	

FECHA	13 Diciembre 2023	HORA	2:00 pm.
RESPONSABLE	Lizeth Lora Cuellar	CARGO	SST.
UBICACIÓN DE CAMILLA	OBRA		

ITEN	ELEMENTO	ESTADO (B/M)	OBSERVACIONES
1	¿Se encuentra la camilla debidamente ubicada y señalizada?	B	
2	¿En qué estado se encuentra la camilla a la hora de la inspección?	B	
3	¿Cuenta la camilla con sus respetivas correas de ajuste para traslado de paciente?	B	
4	¿En que estado se encuentran las camillas?	B	
5	¿Cuenta la camilla con su respectivo inmovilizador cervical?	B	
6	¿En qué estado se encuentra el cervical?	B	
7	¿En que condiciones de limpieza se encuentra la camilla al momento de inspección?	B	
8	¿La camilla cuenta con algún otro elemento?	NO	

Hallazgos encontrados	Plana de acción	Fecha programada	Fecha ejecutada

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO CIVIL H&E	
	NIT: 901 767.013-6	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV 2023
		PÁG.: 1 DE 1

INSPECCION CONTENIDO DE BOTIQUINES

ELEMENTO	SI	NO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACION
ISODINE ESPUMA	X			
AGUA OXIGENADA	X			
SUERO FISIOLOGICO	X			
GUANTES QUIRURGICOS	X			
GASA ESTERIL	X			
VENDAS TRIANGULARES	X			
VENDA ELASTICA	X			
APLICADORES	X			
BAJA LENGUA	X			
ESPARADRAPO	X			
CURAS	X			
TIJERAS	X			
SUERO ORAL	X			
APOSITO OCULAR	X			
TOALLAS HIGIENICAS	X			

RESPONSABLE	Uzeth Luna C.	FECHA	13 Diciembre 2023
UBICACION			
RESPONSABLE INSPECCION	Uzeth Luna Cuellar.		

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT. 901.767.013-6

CONSORCIO CIVIL H&E

NIT: 901 767.013-6 | VERSION 01

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST | FECHA NOV 2023

INSPECCIÓN MENSUAL DE EXTINTORES

CONTRATO: Nº CLIPH401 DE 2023

AREA DE INSPECCION: OBRA

FECHA: 13 Diciembre 2023.

DATOS GENERALES					RESULTADOS DE LA INSPECCION MENSUAL												
Nº de Inventario/A	Ubicacion en el Área	Capacidad Lbs	Tipo	Fecha Recarga	Presión del manómetro		Pasador y Sujetador		Estado Manguera		Estado válvulas		Estado Boquilla		Marcacion Placa		OBSERVACIONES
					Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Si	No	
1	OBRA	10	ABC	8/2024	X		X		X		X		+		X		

OBSERVACIONES GENERALES

Inspección Realizada por: Lizeth Cano

Firma

Nombre Aclarado

Tipo de extintores:
CO2=Gas Carbonico
PPE=Presurizado (PQS)
CAP=Capsula (PQS-CO2)
CRT=Carretilla(PQS-N2)
MP=Multiproposito (PQS-ABC)
A L =Agente Limpio

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT. 901.767.013-6

CONTROL DE PERSONAL CONSORCIO CIVIL H&E

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	LUGAR	CONTRATISTA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SALUD	PENSION	ARP	PERIODO COTIZADO	CLASE DE RIESGO
PERONAL DE OBRA												
1	JOSE DUBERNEY VILLA REAL CUERVO	12.241.157	AYUDANTE DE OBRA	PANTANOS	CONSORCIO CIVIL H&E	17/12/2023	26/12/2023	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	dic-23	5
2	CARLOS ANDRES PEÑA MAHECHA	1.083.893.603	AYUDANTE DE OBRA	PANTANOS	CONSORCIO CIVIL H&E	17/12/2023	26/12/2023	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	dic-23	5
3	HERNAN FABRICIO CUELLAR JIMENEZ	1.077.012.555	AYUDANTE DE OBRA	PANTANOS	CONSORCIO CIVIL H&E	17/12/2023	26/12/2023	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	dic-23	5
4	JHON ALEXIS MUÑOZ CUELLAR	1.077.869.893	OFICIAL DE OBRA	PANTANOS	CONSORCIO CIVIL H&E	17/12/2023	26/12/2023	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	dic-23	5
5	WILSON JAVIER VILLAREAL CUERVO	1.080.931.990	AYUDANTE DE OBRA	PANTANOS	CONSORCIO CIVIL H&E	18/12/2023	26/12/2023	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	dic-23	5

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10008507628

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
BBJ316	INTERNATIONAL	DT466	1982

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.800	ROJO	PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	8000 - 1

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
467TM2U184427	N	******

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
1HTAA1955DHA13264	N	DHA13264	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
IRUA MENESES VICTOR ALFONSO	C.C. 1080934378

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 45142

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC076974	CATERPILLAR	320CL	2001

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	ANB01167

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO NEGRO	7JK48543	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
21760 Kg	3011 mm	2800 mm	9710 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
FERNANDEZ PEREZ DIEGO FERNANDO	C.C. 1.077.848.986

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACION

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
INST TTOYTTE DPTAL HUILA/RIVERA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
11-05-2018	11-05-2018	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	62008100110756	23/05/2008



ESTA TARJETA ES [illegible] RIO NACIONAL

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACION DE IMPORTACIÓN

I/E
I

FECHA IMPORT

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRICULA
22/12/1990

FECHA EXP. LIC. TTO.
27/11/2014

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

INST TTOYTTE DPTAL HUILA/TIMANA

LT0100497653 4

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 169567019

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA AUTOSUR E.U

NIT: 900239427

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-051-001

Fecha de expedición: 2023/11/11

Fecha de vencimiento: 2024/11/11

DATOS VEHÍCULO

PLACA: BBJ316

CLASE: VOLQUETA

MARCA: INTERNATIONAL

MODELO: 1982

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 5800

NRO. MOTOR: 467TM2U184427

NRO. CHASIS: DHA13264

VIN:

LÍNEA: DT466

COLOR: ROJO

NOMBRE PROPIETARIO: VICTOR A. IRUA M.

FIRMA DEL RESPONSABLE

CAMILO ANDRES OROZCO CORREA

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

Año 2008

Casilla reservada para la DIAN (antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario
06200810011075 6-9

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900164968 | 6. DV: 9 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: TRANSPORTE DE MAQUINAS LTDA

13. Dirección: CR 7 74 55 OF 708 | 14. Teléfono: 3131823 | 12. Cód. Aduana: 06 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

21. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830002183 | 25. DV: 1 | 26. Razón social del declarante autorizado: PANADUANAS S.I.A. LTDA | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 0467

24. Número documento de identificación: 19351690 | 30. Apellidos y nombres: MORENO C JORGE A

31. Clase declarante	32. Tipo declaración	33. Cód.	34. No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cód. Aceptac.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cód. Aduana
02	Legalización	2	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cód. lugar ingreso carga mercancías	41. Cód. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	7201	No. 062008100001639	2008 - 03 - 27	No. 3008CMC-5505-CTG-01	2008 - 03 - 21

48. Nombre importador o proveedor en el exterior: YODER & FREY AUCTIONEERS, INC | 47. Ciudad: KISSIMMEE | 49. Cód País Exportación: 249

49. Dirección importador o proveedor en el exterior: 1670 COMMERCE RD | 50. E-mail: 419 605-4595

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cód. país procedencia	54. Cód. Modo Transacción	55. Código de Bandera	56. Cód. Depto Destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ Cob.
101478	2008 - 02 - 18	249	1	169	13	CARIBBEAN AMERICAN SHIPPING AGENCY LTDA	1,766.75

Subpartida

59. Subpartida arancelaria	60. Cód. Complementario	61. Cód Suplementario	62. Cód. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cód. país de origen	67. Cód. Acuerdo
8429520000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	249	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cód. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código de medidas	74. No. bultos	75. Subcantidad	76. Cód. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	249	19,686.00		19,686.00		YY	1	1	U	1.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor Aduana USD	85. Código registro sistematizado	86. Número	87. Cód. oficina	88. Año	89. Programa No.	90. Código destino del Producto
76,000.00	5,216.00	380.00	1,085.00	6,680.00	0.00	82,680.00	L	20289374	3	2008	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	5.00	145,992,210	7,299,611	7,299,611	0
I.V.A.	16.00	153,291,821	24,526,691	24,526,691	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0
Sanción	0	0	21,899,832	21,899,832	
Rescate	0	0	0	0	
Total			53,725,134		0

91. Descripción de las mercancías: Incluir la descripción de las mercancías de conformidad con la señalada en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria (incluya marcas, modelos y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de esta forma)

1/1 - D.O. 0001/681/02 EXCAVADORA HIDRAULICA, MCA. CATRAPILLAR, MOD. 320 CL., AÑO DE FABRICACION 2001, PAIS DE ORIGEN USA, PRECIO CUANDO NUEVA US$150,000.00, MONTADO SOBRE ORUGA, MERCANCIA USADA. REF 6599 CANT. 1 UNB.SERIAL ANB01161, CBA 81933, MODRL [illegible], MOTOR 73K8543, MODELO 3066,MARCA CATRAPILLAR, COLOR: AMARILLO CON NEGRO. Factura No. 101478 Fecha 2008/02/18 , XX [illegible]

127. Valor pagos anticipados: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación administrativa	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 06200810011075 6 133. Fecha: 2008 05 02
134. Levante No.	135. Fecha	Firma funcionario responsable 136. Nombre 137. C. C. No.

Firma declarante: 06200810011075 6

PANADUANAS SIA. LTDA. NIT 830.002.183

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Banco de Crédito Helm Financial Services
Coloque el nombre de la oficina recaudadora a cargo de este formulario
OFICINA PRINCIPAL MANGA

OFI 502 | 21 MAY 2008 | 02

RECIBIDO CON PAGO

980. Pago Total $ 53,725,134

Banco de Crédito

14631444 4

(415)7707212489953(8020)14502020724147

Fecha de liquidación: 2008-05-02 18:43:34

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO CIVIL H&E	Versión 01
	NIT: 901.767.013-6	Codigo
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	
	LIZETH NAIROBY LUNA CUELLAR	Fecha
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	28/11/2023

ÁREA/PLANTA Y/O LUGAR DE OPERACION:	PANTANOS	FECHA DE ELABORACION	18 Diciembre 2023.
DESCRIBA LA ACTIVIDAD A REALIZAR:	EXCAVACIÓN MANUAL.	RESPONSABLE DEL AREA	
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	HERRAMIENTA MENOR.	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	
CONTACTOS DE EMERGENCIA:			

DESCRIPCION EXACTA O MAS PROXIMA DEL LUGAR DE OPERACIÓN Y DESCRIBA LAS ACTIVIDADES DE COMIENZO A FIN

INSPECCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO

INSPECCIÓN DE LA HERRAMIENTA A UTILIZAR.

EXCAVACIÓN MANUAL.

REMOVER MATERIAL SOBRANTE.

DELIMITAR EL AREA Y DEJAR EL LUGAR EN ORDEN Y ASEO AL TERMINAR. ACTIVIDADES.

No	PELIGRO	RIESGO	CONTROLES REQUERIDOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS (Preventivos/Protectivos/Reactivos)	CUMPLE: SI / NO / NA
1	Fisico - Temperaturas externas (Calor o frio) Radiaciones	Quemadura Insolación Cefalea Mareo Deshidratación Estado Gripales	Uso de los EPP - Uso camisa manga larga y Capuchón tipo monja.	SI
			Hidratación.	SI
2	Condiciones de Seguridad - Locativo Orden y Aseo	Caidas Esguinces Pérdida de Materiales Golpes	Jornada de orden y aseo	SI
			Divulgación del procedimiento	SI
3	Condiciones de seguridad - Locativo Superficies de Trabajo: Terreno escabroso	Caidas del personal Resbalones Fracturas Esguinces Contusión	Inspección del terreno	SI
			Señalización	SI
			Uso de EPP..	SI
4	Condiciones de Seguridad - Locativos: Trabajos en alturas	Pérdida humana	Programa de protección contra caídas	NA
			Capacitación y entrenamiento en trabajo en alturas	NA
		Caida Fractura Accidentes Graves	Programa de protección contra caídas	NA
			Uso de EPP para trabajos en alturas	NA
			Lista de verificacion para tareas de alto riesgo arnes y eslinga	NA
5	Condiciones de seguridad - Locativos: Espacios Confinados	Pérdida humana, Caida Fractura Accidentes Graves	Verificación de atmosferas peligrosas	NA
			Programa De Protección Espacios Confinados	NA
			Capacitación de personal en espacios confinados	NA
			Uso de EPP.	NA
6	Condiciones de seguridad - Mecánico: Uso de Herramientas Limpieza del área de trabajo	Lesiones por manejo inadecuado de herramientas manuales y equipos	Uso de los EPP	SI
			Verificación de Herramienta	SI
7	Biomecánico - Posturas inadecuadas y movimientos repetitivos Sobreesfuezo	Hernias Esguinces Calambres Trauma muscular Fatiga Muscular	PVE Osteomuscular (Charla y capacitación en manejo de cargas)	SI
			Charla en uso y manejo de herramientas	SI
			Pausas activas	SI
8	Psicosocial - Acoso laboral y sobrecarga laboral	Estrés laboral Bajo desempeño Bajo rendimiento Baja motivación	Programación de actividades: Bienestar	NA
			Calistenia	NA
			Programa de Riesgo Psicosocial	NA
14	Fenomenos Naturales - Terremoto Derrumbe Tormenta Eléctrica Vendaval	Atrapamiento Electrocución Caidas	Plan de Emergencia	Si
15	Orden Publico: Presencia de grupos armados al margen de la ley	Muerte Secuestro Atentado Robos	Plan de Emergencias	Si

Powered by CamScanner

SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA OPERACIÓN CUENTE CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LAS HERRAMIENTAS O EQUPOS ESTEN INSPECCIONADOS ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD			
CASCO	X	CAMISA MANGA LARGA	X	RESPIRADORES		ESLINGAS Y ELEMENTOS DE AMARRE		HERRAMIENTA MENOR	X
GUANTES	X	PANTALON LARGO JEAN	X	TAPABOCAS	X	ARNES		HERRAMIENTAS ELECTRICAS	
BOTAS DE SEGURIDAD	X	OVEROL		TAPAOIDOS		GUAYAS		MAQUINARIA Y VEHICULOS	
GAFAS	X	GUANTES DE NITRILO		PETOS		MOSQUETONES		EQUIPOS	

DIVULGACION DEL ANALISIS DE EVALACION DE RIESGOS EJECUTORES.

Declaramos haber entendido la divulgacion del analisis de evalacion de riesgos, y nos comprometemos a cumplir las condiciones de seguridad contempladas e informar sobre cualquier desviacion que se pueda presentar.

NOMRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	OBSERVACIONES
JHON ALEXIS MUÑOZ	1077869893	OFICIAL	
WILSON JAVIER	1080931990	AYUDANTE.	
HERNAN FABRICIO CUELLAR.	1077012555	AYUDANTE.	
CARLOS ANDRES PEÑA	1083893603	AYUDANTE.	
JOSE OVERNEY VILLAREAL.	12241 157	AYUDANTE.	

	LUNES	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado
FECHA	18/12/23	19/12/23	20/12/23	21/12/23	22/12/23	23/12/23
FIRMA LIDER DE LA ACTIVIDAD	Jhon Alexis	Jhon Alexis	Jhon Alexis	Jhon Alexis	Jhon Alexis	Jhon Alexis
FIRMA S.S.T.						

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO CIVIL H&E	Versión 01
	NIT: 901.767.013-6	Codigo
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	
	LIZETH NAIROBY LUNA CUELLAR	Fecha
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	28/11/2023

ÁREA/PLANTA Y/O LUGAR DE OPERACION:	PANTANOS	FECHA DE ELABORACION	25 Diciembre 2023.
DESCRIBA LA ACTIVIDAD A REALIZAR:	JORNADA DE LIMPIEZA	RESPONSABLE DEL AREA	
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	HERRAMIENTA MENOR.	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	
CONTACTOS DE EMERGENCIA:			

DESCRIPCION EXACTA O MAS PROXIMA DEL LUGAR DE OPERACIÓN Y DESCRIBA LAS ACTIVIDADES DE COMIENZO A FIN	No	PELIGRO	RIESGO	CONTROLES REQUERIDOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS (Preventivos/Protectivos/Reactivos)	CUMPLE: SI / NO / NA
INSPECCIÓN DEL LUGAR SE REALIZA JORNADA DE ORDEN Y ASEO. SE INSPECCIONA EL CERRAMIENTO Y SE AJUSTA. SE DEJA EL LUGAR. EN ORDEN Y EL CERRAMIENTO EN PERFECTAS CONDICIONES PREPARADO PARA LA. SUSPENCIÓN DE OBRA	1	Físico - Temperaturas externas (Calor o frio) Radiaciones	Quemadura Insolación Cefalea Mareo Deshidratación Estado Gripales	Uso de los EPP - Uso camisa manga larga y Capuchón tipo monja.	SI
				Hidratación.	SI
	2	Condiciones de Seguridad - Locativo: Orden y Aseo	Caidas Esguinces Pérdida de Materiales Golpes	Jornada de orden y aseo	SI
				Divulgación del procedimiento	SI
	3	Condiciones de seguridad - Locativo Superficies de Trabajo: Terreno escabroso	Caidas del personal Resbalones Fracturas Esguinces Contusión	Inspección del terreno	SI
				Señalización	SI
				Uso de EPP..	SI
	4	Condiciones de Seguridad - Locativos: Trabajos en alturas	Pérdida humana	Programa de protección contra caidas	NA
				Capacitación y entrenamiento en trabajo en alturas	NA
			Caida Fractura Accidentes Graves	Programa de protección contra caidas	NA
				Uso de EPP para trabajos en alturas	NA
				Lista de verificacion para tareas de alto riesgo arnes y eslinga	NA
	5	Condiciones de seguridad - Locativos: Espacios Confinados	Pérdida humana, Caida Fractura Accidentes Graves	Verificación de atmosferas peligrosas	NA
				Programa De Protección Espacios Confinados	NA
				Capacitación de personal en espacios confinados	NA
				Uso de EPP.	NA
	6	Condiciones de seguridad - Mecánico: Uso de Herramientas Limpieza del área de trabajo	Lesiones por manejo inadecuado de herramientas manuales y equipos	Uso de los EPP	SI
				Verificación de Herramienta	SI
	7	Biomecánico - Posturas inadecuadas y movimientos repetitivos Sobreesfuezo	Hernias Esguinces Calambres Trauma muscular Fatiga Muscular	PVE Osteomuscular (Charla y capacitación en manejo de cargas)	SI
				Charla en uso y manejo de herramientas	SI
				Pausas activas	SI
	8	Psicosocial - Acoso laboral y sobrecarga laboral	Estrés laboral Bajo desempeño Bajo rendimiento Baja motivación	Programación de actividades: Bienestar	NA
				Calistenia	NA
				Programa de Riesgo Psicosocial	NA
	14	Fenomenos Naturales - Terremoto Derrumbe Tormenta Eléctrica Vendaval	Atrapamiento Electrocución Caidas	Plan de Emergencia	SI
	15	Orden Publico: Presencia de grupos armados al margen de la ley	Muerte Secuestro Atentado Robos	Plan de Emergencias	SI

Powered by CamScanner

SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA OPERACIÓN CUENTE CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LAS HERRAMIENTAS O EQUPOS ESTEN INSPECCIONADOS ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD			
CASCO	X	CAMISA MANGA LARGA	X	RESPIRADORES		ESLINGAS Y ELEMENTOS DE AMARRE		HERRAMIENTA MENOR	X
GUANTES	X	PANTALON LARGO JEAN	X	TAPABOCAS	X	ARNES		HERRAMIENTAS ELECTRICAS	
BOTAS DE SEGURIDAD	X	OVEROL		TAPAOIDOS		GUAYAS		MAQUINARIA Y VEHICULOS	
GAFAS	X	GUANTES DE NITRILO		PETOS		MOSQUETONES		EQUIPOS	

DIVULGACION DEL ANALISIS DE EVALACION DE RIESGOS EJECUTORES.

Declaramos haber entendido la divulagacion del analisis de evalacion de riesgos, y nos comprometemos a cumplir las condiciones de seguridad contempladas e informar sobre cualquier desviacion que se pueda presentar.

NOMRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	OBSERVACIONES
WILSON JAVIER	1080931990	AYUDANTE	
JHON ALEXIS MUÑOZ	1077869893	OFICIAL DE OBRA	
HERNAN FABRICIO CUELLAR	1077012555	AYUDANTE	
CARLOS ANDRES PEÑA	1083893603	AYUDANTE.	
JOSE DUBERNEY VILLAREAL.	12241157	AYUDANTE.	

	LUNES	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado
FECHA	25/12/23	26/12/23				
FIRMA LIDER DE LA ACTIVIDAD	Jhon Alexis	Jhon Alexis				
FIRMA S.S.T.						

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79944179		TRUJILLO CALDERON HERNAN JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 3 W N 64 37	NEIVA-HUILA	8601919	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	423612926	9462376644	I	2024/01/19	2024/01/30	BANCOLOMBIA	11	$831,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	79944179	TRUJILLO CALDERON HERNAN JOSE																		25-14	30	EPS005	30	CCF32	30	14-23	30	30	No
Total	**Afiliados(1)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79944179		TRUJILLO CALDERON HERNAN JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 3 W N 64 37	NEIVA-HUILA	8601919	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	423612926	9462376644	I	2024/01/19	2024/01/30	BANCOLOMBIA	11	$831,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400,000	$4,000	$0	$404,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$400,000	$4,000	$0	$404,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,900	$700	$0	$61,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$60,900	$700	$0	$61,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$50,000	$500	$0	$50,500
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$50,000	$500	$0	$50,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$312,500	$3,100	$0	$315,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$312,500	$3,100	$0	$315,600
TOTAL				1	$823,400	$8,300	$0	$831,700

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901583183
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ERJ INGENIERIA E INVERSIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 9 # 4 - 19 OFC 310	TELÉFONO:	8659963
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:	1108635897			TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	0							
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/01/17			NÚMERO AUTORIZACIÓN:				001667

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP			MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA		COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:											**$ 371.200**	**$ 0**	**$ 371.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 290.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.000	$ 0	$ 0	$ 290.000
SUBTOTALES:													**$ 290.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 290.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 161.600	$ 161.600	$ 0	$ 0	$ 161.600
SUBTOTALES:									**$ 161.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 161.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$ 92.800	$ 0	$ 92.800
SUBTOTALES:			**$ 92.800**	**$ 0**	**$ 92.800**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	2	$ 69.600	$ 0	$ 69.600
SUBTOTALES:			**$ 69.600**	**$ 0**	**$ 69.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1075322661	DUCHIMBA ORTIZ MARIA JOSE	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1,160,000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,160,000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,160,000		$ 80.800	30	$ 1,160,000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 46.400	$ 0	$ 34.800	$ 0	$ 0
2	CC 36313598	MEDINA VARGAS LILIANA PATRICIA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1,160,000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,160,000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,160,000		$ 80.800	30	$ 1,160,000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 46.400	$ 0	$ 34.800	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 985.200

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	RIVERA GOMEZ WILSON JAVIER
IDENTIFICACION:	CC-12200514
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2024-01-04
PERIODO PENSION:	2023-12
PERIODO SALUD:	2023-12
NUMERO PLANILLA:	8628202326
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8647916118
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-11	830603780	ARL SURA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.800	$ 80.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400	$ 411.400

Banco de Occidente

Punto Pago

RECIBO DE PAGO

Fecha de pago: 22/12/2023 Hora: 15:50:24

Id Comercio: 2258 No. Terminal: 0847

Id Trx: 12582553 Id Aut: 248084

Comercio: PLATIC BALOTO-TIENDA MULTISERVICIOS LA QUINTA

Dirección: CRA 5 37-09

RECAUDO DE FACTURAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Convenio: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS

Código convenio: 1139

Referencia de pago: 864791518

Valor: $411.400,00

ORIGINAL

Este recibo corresponde a una transacción realizada en Punto Pago de Banco de Occidente. La impresión de este recibo confirma que la transacción fue aprobada y verifique la información. Este no es el único recibo oficial de pago. Requerimientos 018000 514652

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 04/01/2024

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO PROAQUA 2022
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-901555635
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2024-01-10
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1077862501
NOMBRE EMPLEADO	LIZETH NAIROBY LUNA CUELLAR
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	28704889
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2023-12
PERÍODO SALUD	2024-01
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5421001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.160.000	0,1600000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.160.000	0,1250000	$ 145.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.160.000	0,0696000	$ 80.800	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.160.000	0,0400000	$ 46.400	1.160.000	0,0200000	$ 23.200	0,0300000	$ 34.800	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 185.600	$ 145.000	$ 80.800	$ 104.400	$ 515.800

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28706047
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-01-11

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO CIVIL H&E	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901767013	D.V.	6	TIPO DE APORTANTE	A mayor o igual a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 3W 64 37	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	HERNANTRUJILLO@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	31716770
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	79944179	PRIMER APELLIDO	TRUJILLO	SEGUNDO APELLIDO	CALDERON
PRIMER NOMBRE	HERNAN	SEGUNDO NOMBRE	JOSE		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 12	Año: 2024	Mes: 01	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
5		$2.358.668		28706047

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1077012555	01	No	No	No	41	807	5429001	Fijo	CUELLAR JIMENEZ HERNAN FABRICIO	$1.160.000
CC-1077869893	01	No	No	No	41	807	5429001	Fijo	MUÑOZ CUELLAR JHON ALEXIS	$1.160.000
CC-1083893603	01	No	No	No	41	807	5429001	Fijo	PEÑA MAHECHA CARLOS ANDRES	$1.160.000
CC-12241157	01	No	No	No	41	807	5429001	Fijo	VILLAREAL CUERVO JOSE DUBERNEY	$1.160.000
CC-1080931990	01	No	No	No	41	807	5429001	Fijo	VILLAREAL CUERVO WILSON JAVIER	$1.160.000

NOVEDADES																												
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1077012555	X	2023-12-14	X	2023-12-26																								0		
CC - 1077869893	X	2023-12-14	X	2023-12-26																								0		
CC - 1083893603	X	2023-12-14	X	2023-12-26																								0		
CC - 12241157	X	2023-12-14	X	2023-12-26																								0		
CC - 1080931990	X	2023-12-18	X	2023-12-26																								0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1077012555	PORVENIR	13	$502.667	0.1600000	$80.500	$0	$0	$80.500	$0	$0	$0
CC - 1077869893	PORVENIR	13	$502.667	0.1600000	$80.500	$0	$0	$80.500	$0	$0	$0
CC - 1083893603	PORVENIR	13	$502.667	0.1600000	$80.500	$0	$0	$80.500	$0	$0	$0
CC - 12241157	PORVENIR	13	$502.667	0.1600000	$80.500	$0	$0	$80.500	$0	$0	$0
CC - 1080931990	PORVENIR	9	$348.000	0.1600000	$55.700	$0	$0	$55.700	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1077012555	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	13	$502.667	0.1250000	$62.900	$0	0	$0	0	$0	13	$502.667	4290	0.0696000	$35.000
CC - 1077869893	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	13	$502.667	0.1250000	$62.900	$0	0	$0	0	$0	13	$502.667	4290	0.0696000	$35.000

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1083893603	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	13	$502.667	0.1250000	$62.900	$0	0	$0	0	$0	13	$502.667	3700	0.0696000	$35.000
CC - 12241157	ESSC ASMET SALUD	13	$502.667	0.1250000	$62.900	$0	0	$0	0	$0	13	$502.667	4290	0.0696000	$35.000
CC - 1080931990	NUEVA E.P.S. S.A.	9	$348.000	0.1250000	$43.500	$0	0	$0	0	$0	9	$348.000	4290	0.0696000	$24.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1077012555	COMFAMILIAR DEL HUILA	13	$502.667	0.0400000	$20.200	0.0200000	$10.100	0.0300000	$15.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1077869893	COMFAMILIAR DEL HUILA	13	$502.667	0.0400000	$20.200	0.0200000	$10.100	0.0300000	$15.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1083893603	COMFAMILIAR DEL HUILA	13	$502.667	0.0400000	$20.200	0.0200000	$10.100	0.0300000	$15.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12241157	COMFAMILIAR DEL HUILA	13	$502.667	0.0400000	$20.200	0.0200000	$10.100	0.0300000	$15.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1080931990	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	$348.000	0.0400000	$14.000	0.0200000	$7.000	0.0300000	$10.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	5	$377.700	$0	$0	$0	$0	7	$2.400	$0	$0	$380.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$43.500	$0	0	$0	0	$0	$43.500	7	$300	$0	$43.800	$0	0	$0	$0	$43.800	$0	$0	$43.800
ESSC ASMET SALUD	1	$62.900	$0	0	$0	0	$0	$62.900	7	$400	$0	$63.300	$0	0	$0	$0	$63.300	$0	$0	$63.300
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	$188.700	$0	0	$0	0	$0	$188.700	7	$1.200	$0	$189.900	$0	0	$0	$0	$189.900	$0	$0	$189.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	5	$164.300	0	$0	$0	$164.300	7	$1.100	$165.400	0	$0	$1.654	$165.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	5	$94.800	7	$600	$95.400
SENA	5	$47.400	7	$300	$47.700
ICBF	5	$70.900	7	$500	$71.400
ESAP	0	$0	7	$0	$0
MinEdu	0	$0	7	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$297.000
PENSIONES	1	$380.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$165.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$95.400
SENA	1	$47.700
ICBF	1	$71.400
ESAP	1	$0


TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.057.000


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. _ **CIHCM420 DE de 2023**_

INFORME DE INTERVENTORIA No. _2___

MENSUAL [X] **FINAL** [ ]

Objeto Contrato: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA.

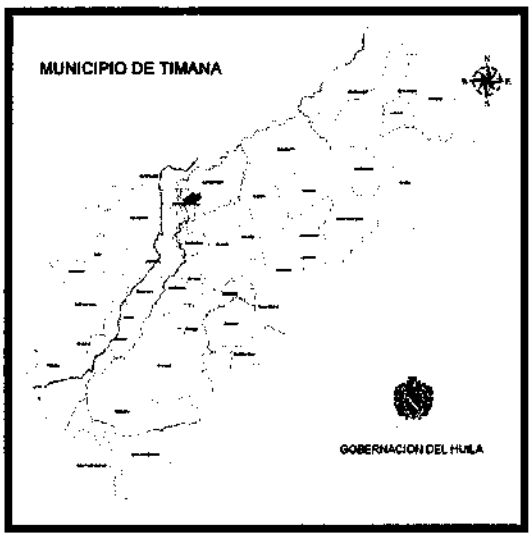

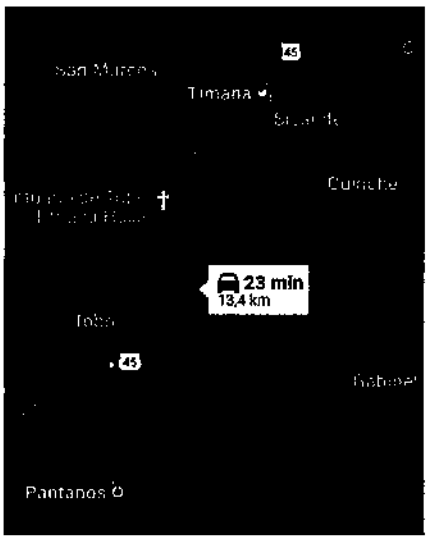

MUNICIPIO: TIMANA – VEREDA PANTANOS

DEPARTAMENTO: HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM420 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO WF.

APOYO A LA SUPERVISIÓN	1. RAFAEL GARCIA CABRERA	**ENTIDAD**	INDERHUILA

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	___ **CIHCM420**____ DE 2023___		
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA .	**PERIODO DEL INFORME**	1 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.
CONTRATISTA	CONSORCIO WF	**NIT:**	901.769.619 - 8.
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	**C.C:**	7.711.430 DE NEIVA

FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	09 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	N.A
PLAZO TOTAL:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.
VALOR INICIAL:	OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($ 88.657.430,00) M/CTE.
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	N.A
VALOR TOTAL:	OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($ 88.657.430,00) M/CTE.


2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	CLPIH401 DE 2023		
OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA **VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA** DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATISTA	CONSORCIO CIVIL H&E	**NIT:**	901.767.013-6

REPRESENTANTE LEGAL:	HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON	**C.C:**	79.944.179
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	02 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16 DE NOVIEMBRE DE 2023		
PLAZO INICIAL	3 MESES		
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	N/A		
PLAZO TOTAL:	3 MESES		
VALOR INICIAL:	$ 551.483.183		
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	N/A		

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Cubierta Autoportante con Iluminación para la Vereda Pantanos de la Zona Rural del Municipio Timana - Departamento Del Huila

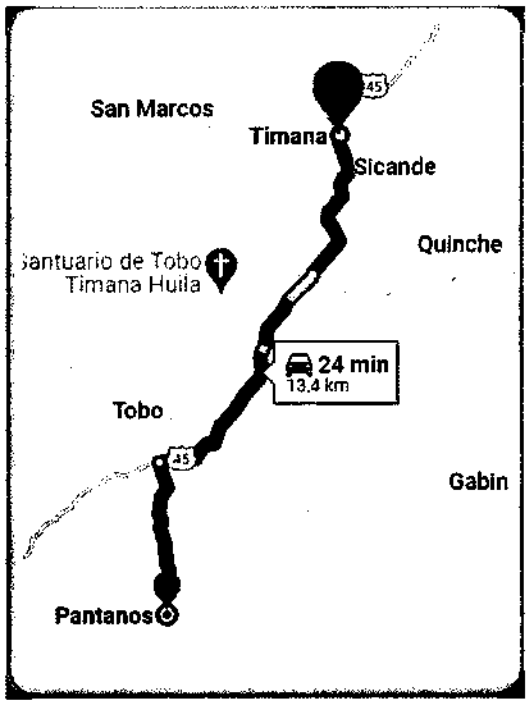

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La misión del INDERHUILA es generar y brindar a la comunidad oportunidades de participación en los procesos de iniciación, formación, fomento y práctica del deporte, la educación física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, como contribución al desarrollo integral del individuo, para el mejoramiento de la calidad de vida de la población del Departamento del Huila, por medio de la masificación, la promoción y el apoyo a la práctica deportiva.

En consecuencia, de lo anterior se requiere la adecuación locativa de los terrenos existentes para llevar a cabo la **CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA;** lo permitirán a la población realizar las prácticas deportivas, que van a contribuir con la mejora de la calidad de vida de las personas que acuden a estos escenarios recreo deportivos. Se resalta que este tipo de obras contribuyen a minimizar el déficit de espacios deportivos que existe en el Departamento del Huila.

El objetivo principal es promover la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre hacia el desarrollo humano integral; donde se promuevan y estimulen los valores para la convivencia, participación, disminución de la violencia, y construcción de! tejido social: apoyado en estrategias que beneficien los habitantes de la ciudad para fortalecer el desarrollo del deporte la recreación y la educación física, con la implementación de programas orientados a' la construcción de tejido social y convivencia ciudadana en la totalidad de la población Huilense con una infraestructura deportiva técnicamente adecuada, desarrollando acciones articuladas entre sí, que mejoren la calidad de vida de todas y todos los habitantes del Departamento del Huila, bajo los principios de sostenibilidad ambiental, participación ciudadana, democracia, equidad e inclusión de personas con movilidad reducida y respeto por las libertades individuales y que permitan posicionar al Departamento en el contexto regional, nacional y mundial, en concordancia con las Políticas Departamentales y Nacionales.

Las presentes especificaciones contienen el alcance para la ejecución de las obras de construcción de las cubiertas en el Departamento del Huila.

El proyecto arquitectónico contempla un área construida de 937.20 M2 por cubierta aproximadamente. en que se encuentra contemplada la construcción de la cubierta autoportante con teja metálica cal. 22 para el polideportivo ubicado fa vereda pantanos de la zona rural del municipio de Timana departamento del Huila la cual tiene una destinación de uso recreativo, deportivo y cultural; correspondientes a estructura, cubierta, iluminación y sistema hidráulico para el manejo de aguas lluvias.

La cubierta será con sistema auto portante, sostenida con columnas en concreto de 3000 PSI. sistema estructural propuesto consiste en columnas y vigas aéreas en concreto reforzado en 3000 PSI y una cimentación tipo zapatas, vigas de cimentación y viga canal. Todas las obras deberán atender lo establecido en la NORMA SISMORESITENTE de 2010 - NSR-10.

En la vereda Pantanos del municipio de Timaná departamento del Huita se realizará la construcción e iluminación de una (1) cubierta, la cual contará con redes eléctricas cumpliendo la normativa, también tendrá las salidas de aguas lluvias (bajantes aguas lluvias, cunetas) que garanticen el continuo y normal funcionamiento de la totalidad del escenario sin que se vea afectado por el horario o condiciones climáticas del sector para la práctica deportiva del municipio de Timaná departamento del Huila, la estructura será un sistema a porticado de concreto y la cubierta en teja auto portante a base de lámina de acero cal. 20 en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro -poliéster estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.

5. DESCRIPCION DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA

Las actividades de avance de obra se han centrado en la formalización y ordenamiento contractual, adecuación del terreno y las actividades preliminares. Tal como se describen en este informe.

SEMANA (1-2 DICIEMBRE)

Se continua con la consecución de documentos requeridos para la radicación del anticipo de obra.

SEMANA (04-09 DICIEMBRE)

El contratista radica la consecución, organización de documentos soportes para el desembolso del anticipo del contrato el cual fue entregado a la interventoría, revisado, avalado y entregado a la entidad el 5 de diciembre de 2023.

El día 07 de diciembre se efectúa la socialización y creación de comité de veeduría en la vereda la ondina, estando presente el contratista de obra, interventoría, comunidad y apoyo a la supervisión del Inderhuila

Se realiza contratación del personal requerido para la ejecución de la obra, mano de obra calificada y no calificada la cual es de la región. (Maestro de obra, oficiales y obreros.

Durante esta semana se continua con las actividades de obra capitulo PRELIMINARES, Localización y replanteo se toman las medidas de la cancha actual de acuerdo a los planos establecidos.

El 4 de Diciembre de 2023, la interventoría a cargo del presente proyecto remite a la ENTIDAD INDERHUILA, oficio radicado por el CONTRATISTA CONSORCIO CIVIL H&E, solicitando la revisión del diseño estructural del contrato CLPIH401-2023 que tiene por objeto "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA".

El 7 de Diciembre de 2023, bajo radicado IH 2-2023-1583 la entidad INDERHUILA da traslado al oficio IH1-2023-4248, para dar solución a la petición presentada por el contratista de obra y la interventoria.

SEMANA (11- 16 DICIEMBRE)

Durante esta semana el Contratista inicia con las actividades de obra capitulo PRELIMINARES.

El contratista realiza el corte de placa de concreto e= 0.10 mts.
Inicia la demolición de placa de concreto e= 0,10 mts.
Realiza el retiro del material sobrante.
El contratista ejecuta actividades de Excavación manual sin clasificar.en Eje A

EL 26 de diciembre de 2023, bajo el radicado SANAND. WF42023-006, y recibido por la entidad con No. IH1-2023-4445 la Interventoría aprueba la solicitud de suspensión del contrato de obra No. CLPIH383-2023 por los motivos expuestos con anterioridad por parte del CONTRATISTA, debido a que a la fecha la entidad no ha dado respuesta, a los oficios anteriores.

SEMANA (18- 23 DICIEMBRE)

Durante esta semana el Contratista finaliza las siguientes actividades de obra capitulo PRELIMINAR
Corte de Placa de concreto e= 0.10 mts.
Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.

Y continua con las actividades de excavación manual sin clasificar.en Eje A Zapatas

EL 22 y 23 de diciembre del 2023, bajo oficio CUB-06-2023 y CUB-07-2023, el contratista solicita la suspensión del contrato de obra No. CLPIH401-2023, debido a los siguientes puntos expuestos:

- Los aceros de refuerzo de la viga canal, en el tramo de los traslapos no están confinados, y se recomienda revisión y concepto del especialista estructural del INDERHUILA.

- Los aceros de refuerzo de las vigas de cimentación, para los traslapos se encuentran dentro del nudo, se recomienda revisar y posiblemente reubicar los traslapos fuera del nudo y de la zapata, de acuerdo a C.21 de la NSR-10. Por lo tanto, es necesario revisión y concepto del especialista estructural de INDERHUILA.

- Se deben revisar los niveles de arranque en las columnas, no coincide el nivel de las columnas en el despiece del Plano #2 a los cortes transversales eje 1 del plano #3. Por lo cual, es necesario revisión y concepto del especialista estructural de INDERHUILA.

- En las excavaciones realizadas para las zapatas, se ha presentado un nivel freático superficial en la zona, por lo cual, se recomienda aumentar por lo mínimo a 3 metros la profundidad de la excavación, un mejoramiento del suelo en concreto ciclópeo de acuerdo al estrato del terreno o realizar un sistema de drenaje superficial y subterráneo, el cual, pueda canalizar el agua lejos de los cimientos, pero lo que recomienda esta interventoría es realizar un nuevo estudio de suelos, por lo tanto, requerimos que la entidad contratante INDERHUILA, nos comparta el estudio de suelos con las coordenadas aprobadas por el especialista Responsable en la etapa de consultoría para la "CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA PANTANOS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

El 26 de Diciembre de 2023, bajo radicado IH2-2023-1649. la entidad INDERHUILA da traslado al oficio IH1-2023-4495, para dar solución a la petición presentada por el contratista de obra y la interventoría.

Con oficio No. MUN.TIM. WF41023-006 del 26 de diciembre de 2023, la Interventoría aprueba la solicitud de suspensión del contrato de obra No. CLPIH383-2023 por los motivos expuestos con anterioridad por parte del CONTRATISTA, debido a que a la fecha la entidad no ha dado respuesta, a los oficios anteriores.

6. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	16/11/2023	40		
Suspensión No. 1	26/11/2023			
Reiniciación No. 1				
TERMINACIÓN Cto.				
TOTAL DIAS		**40**	**0**	

7. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA DE INICIO 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	1	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA DE COMITÉ DE OBRA	1	30 DE DICIEMBRE 2023
ACTA DE CONCERTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE OBRA	1	07 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA	1	07 DE DICIEMBRE DE 2023

8. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO
(Cumplimiento Obligaciones del contrato).

a). Obligaciones de Carácter General.

1. Se he realizado la entrega de documentación en papel reciclado.
2. Se realizó acta de socialización del proyecto el día 7 de Diciembre de 2023
3. Se verifico la localización de los trabajos y condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el contrato, así mismo se constató los planos, diseños, especificaciones y demás consideraciones técnicas para suscribir el acta de inicio.
4. Se aprobó el flujo de inversión del anticipo y se radico en INDERHUILA los debidos soportes para el desembolso del anticipo.
5. Se suscribió con el contratista de obra el acta de justificación y acta de suspensión.

b). Actividades Administrativas.

1. se realiza control y seguimiento del personal que ejecuta la obra

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL	CARGO
HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON	Director de Obra
WILSON JAVIER RIVERA GOMEZ	Residente de Obra
LIZETH NAIROBY LUNA CUELLAR	Siso
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS	Sin equipos que requieran seguimiento y control a la fecha.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	Solo se han realizado actividades preliminares (replanteos y excavaciones).

	CONTROL Y SEGUIMIENTO A APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	Planilla relacionada **NRO. DE PLANILLA 9462376644** HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON PENSION: $ 400.000 SALUD: $ 312.500 ARL: $60.900 CCF: $50.000 Fecha de pago: 2024/01/30 **NRO. DE PLANILLA 1108635897** ERJ INGENIERIA E INVERSIONES SAS PENSION: $ 185.600 SALUD: $ 290.000 ARL: $161.600 CCF: $92.800 Fecha de pago: 2024/01/17 **NRO. DE PLANILLA 28704889** LIZETH NAIROBY LUNA CUELLAR PENSION: $ 185.600 SALUD: $ 145.000 ARL: $80.800 CCF: $34.800 Fecha de pago: 2024/01/10 **NRO. DE PLANILLA 8628202326** WILSON JAVIER RIVERA GOMEZ PENSION: $ 185.600 SALUD: $ 145.000 ARL: $80.800 CCF: $0 Fecha de pago: 2024/01/28 **NRO. DE PLANILLA 28706047** CONSORCIO CIVIL H&E PENSION: $ 185.600 SALUD: $ 297.000 ARL: $165.400 CCF: $95.400 Fecha de pago: 2024/01/11

	1. El 7 de diciembre de 2023, La Interventoría, junto con el contratista de obra y el apoyo a la supervisión, suscriben acta de concertación y socialización de inicio de obra y acta de conformación de veeduría ciudadana. 2. La interventoría reviso y suscribió el acta de suspensión el día 26 de diciembre del 2023. 3. El contratista de obra entrega soportes de afiliación del personal en obra y el cumplimiento legal de seguridad industrial y salud ocupacional de Entrega de dotación. 4. Se realizó la revisión de las vigencias de las pólizas del contrato de obra las cuales fueron remitidas a la entidad.
c). **Actividades Operativas.**	1. Se verifico la localización de los trabajos y condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el contrato, así mismo se constató los planos, diseños, especificaciones, para lo cual es necesario la revisión de las observaciones presentadas. 2. Se realiza control y seguimiento de las actividades operativas del contrato, se aprueba le inicio de las actividades:

Actividades	Cantidad Total Ejecutada	Municipio
Localización y replanteo.	937,20 m2	Timana (Vereda Pantanos)
Corte de Placa de concreto e= 0.10 mts.	20,30 ml	Timana (Vereda Pantanos)
Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	2,00 m2	Timana (Vereda Pantanos)
Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	114,31 m3	Timana (Vereda Pantanos)

PRELIMINARES

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

Localización y replanteo

Se realizó la actividad de localización y replanteo del terreno en el cual vamos a trabajar, marcando ejes y medidas según planos suministrados.

Unidad de medida	Cantidad Ejecutada
M2	937,20

Corte de Placa de concreto e= 0.10 mts.

Se inicia con la actividad de corte de la placa existente en concreto.

Unidad de medida	Cantidad Ejecutada
Ml	2

Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.

Se procede con la demolición de la placa de concreto existente.

Unidad de medida	Cantidad Ejecutada
M2	2

Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada

Se procede hacer la excavación de la zapata eje A6

Unidad de medida	Cantidad Ejecutada
M3	114,31

d). **Actividades Logísticos.**	1. Se realiza la revisión diaria de los avances de la bitácora de obra.
e). **Obligaciones de Carácter Ambiental.**	1. Se hace control y seguimiento del plan de manejo ambiental entregado por el contratista para verificar su cumplimiento en obra.
f). **Actividades Financieras.**	1. Se reviso y se avaló el plan de inversión del anticipo y los documentos requeridos para el trámite para el pago del anticipo los cuales fueron radicado a la entidad el día 5 de diciembre del 2023.
g). **Actividades Jurídicos.**	1. Se realiza seguimiento a pólizas y garantías

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (DM/A):	AMPARO	VIGENCIA DESDE (DM/A):	VIGENCIA HASTA (DM/A):
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-10105 1701	0	02/11/2023	Cumplimiento del contrato	02/11/2023	02/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	02/11/2023	02/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/11/2023	02/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (DM/A):	AMPARO	VIGENCIA DESDE (DM/A):	VIGENCIA HASTA (DM/A):
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-10101 8824	0	02/11/2023	Predios laborales y operacionales	02/11/2023	02/02/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (DM/A):	AMPARO	VIGENCIA DESDE (DM/A):	VIGENCIA HASTA (DM/A):
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-10105 1701	1	20/11/2023	Cumplimiento del contrato	02/11/2023	02/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	02/11/2023	02/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/11/2023	02/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (DM/A):	AMPARO	VIGENCIA DESDE (DM/A):	VIGENCIA HASTA (DM/A):
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-10101 8824	1	20/11/2023	Predios laborales y operacionales	02/11/2023	02/02/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)


ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (DM/A):	AMPARO	VIGENCIA DESDE (DM/A):	VIGENCIA HASTA (DM/A):
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-10105 1701	2	20/11/2023	Cumplimiento del contrato	16/11/2023	16/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	16/11/2023	16/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/11/2023	16/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (DM/A):	AMPARO	VIGENCIA DESDE (DM/A):	VIGENCIA HASTA (DM/A):
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-10101 8824	2	20/11/2023	Predios laborales y operacionales	16/11/2023	16/02/2024

9. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

Las temperaturas máximas diarias son alrededor de 25 °C, rara vez bajan a menos de 23 °C o exceden 28 °C. Las temperaturas mínimas diarias son alrededor de 18 °C, rara vez bajan a menos de 16 °C o exceden 19 °C. La temperatura baja promedio diaria más alta es 18 °C el 24 de enero.

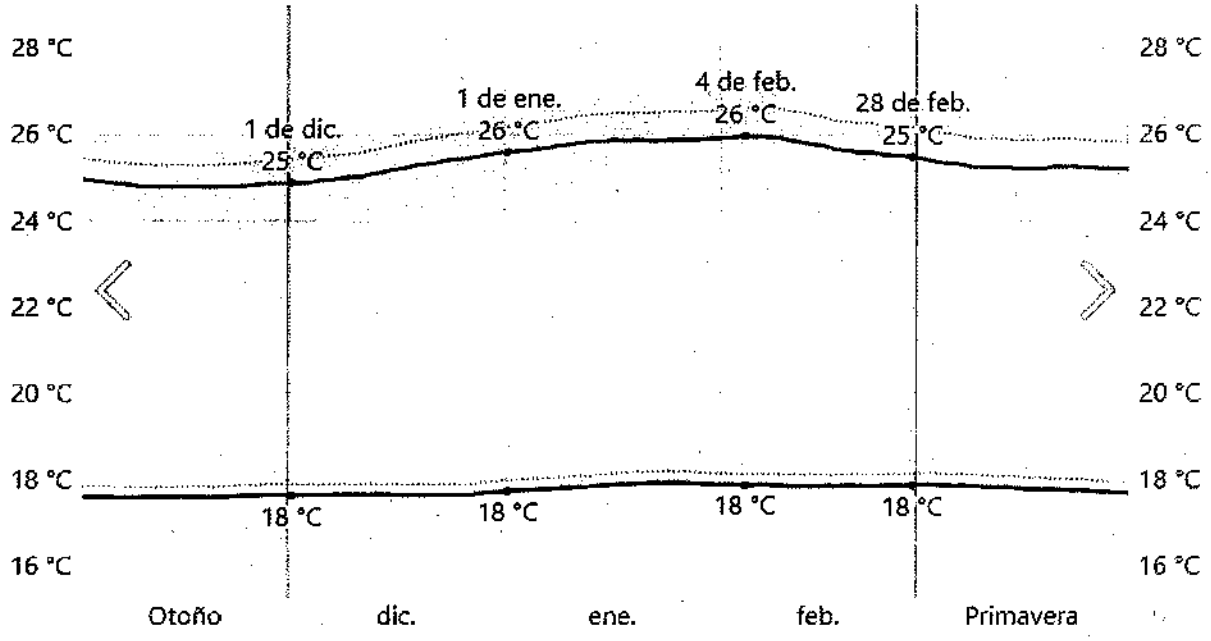

Temperatura máxima y mínima promedio en Timana. Tomado de Weather Spark
https://es.weatherspark.com/m/22360/11/Tiempo-promedio-en-noviembre-en-Timan%C3%A1-Colombia

10. ENSAYOS DE LABORATORIO

N/A

11. COMITES DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	**Lugar**	**Resultado del Comité** (Describir)
30-11-2023	INDERHUILA	ACTA DE COMITÉ DE OBRA N 01 (SE ADJUNTA)

12. RELACION DE PERSONAL (Profesional Interventoría)

NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	7.711.430	REPRESENTANTE LEGAL	PRESTACIÓN DE SERVICIO
JOSE WILMER CHILITO	76.320.749	REPRESENTANTE LEGAL	PRESTACIÓN DE SERVICIO
CRISTIAN FABIAN JUNCO AVILA	1.012.354.706	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	PRESTACIÓN DE SERVICIO
JAVIER HUMBERTO GIRALDO JIMENEZ	1.083.886.304	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	PRESTACIÓN DE SERVICIO
INGRID YOMARA DELGADO RAMOS	1.075.277.887	SECRETARIA	PRESTACIÓN DE SERVICIO

13. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

PÓLIZA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010098	0	09/11/2023	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	09/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	09/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	09/02/2024	09/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	0	Amparo Básico, Predios, Labores y Operaciones	09/11/2023	09/02/2024

PÓLIZA ACTUALIZADA (ANULADA)

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010098	1	21/11/2023	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	09/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	09/02/2027
				Calidad del Servicio	09/02/2024	09/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002028	1	Amparo Básico, Predios, Labores y Operaciones	09/11/2023	09/02/2024

PÓLIZA ACTUALIZADA – INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)


ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010098	2	21/11/2023	Cumplimiento del contrato	16/11/2023	16/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/11/2023	16/02/2027
				Calidad del Servicio	16/02/2024	16/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002028	2	Amparo Básico, Predios, Labores y Operaciones	16/11/2023	16/02/2024

14. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

(Describir el contenido del plano)

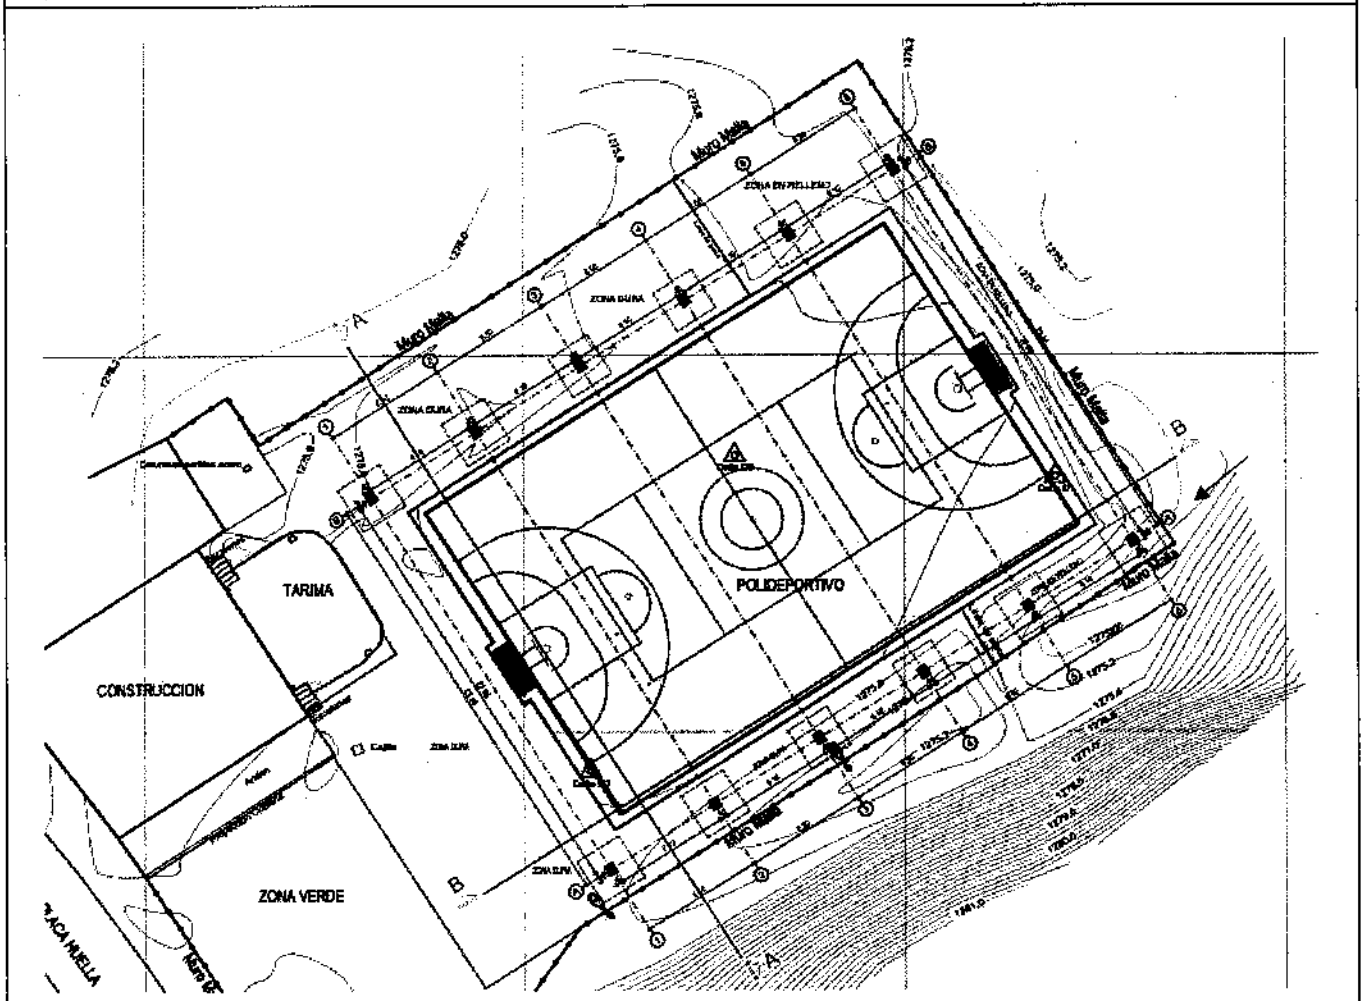

14. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS								
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	% EJECUCION
1	Preliminares							
1.1	Localización y replanteo.	M2	937,20	$ 3.558,00	$ 3.334.558,00	937,20	$ 3.558,00	0,00080646158162%
1.2	Corte de Placa de concreto e= 0.10 mts.	ML	20,30	$ 26.280,00	$ 533.484,00	20,30	$ 26.280,00	0,00595666395869%
1.3	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	2,00	$ 116.723,00	$ 233.446,00	2,00	$ 116.723,00	0,02645660910389%
1.4	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	185,33	$ 46.003,00	$ 8.525.736,00	114,31	$ 46.003,00	0,01042710852708%
1.5	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	114,10	$ 83.849,00	$ 9.566.836,00			0,00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 22.194.060,00**			
2	CIMENTACIÓN							
2.1	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	15,92	$ 34.012,00	$ 541.471,00			0,00000000000000%
2.2	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	42,42	$ 619.063,00	$ 26.260.652,00			0,00000000000000%
2.3	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	2306	$ 7.116,00	$ 16.409.496,00			0,00000000000000%
2.4	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	7,96	$ 742.041,00	$ 5.906.646,00			0,00000000000000%
2.5	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación.	KG	1127	$ 7.116,00	$ 8.019.732,00			0,00000000000000%
2.6	Concreto Ciclopeo - 2500 PSI (175 KG/CM2) 60% Concreto 2500 PSI + 40% Piedra media zonga	M3	53,98	$ 360.003,00	$ 19.434.402,00			0,00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 76.572.399,00**		$	
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO							
3.1	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	16,00	$ 920.829,00	$ 14.733.264,00			0,00000000000000%
3.2	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	4093,00	$ 7.116,00	$ 29.125.788,00			0,00000000000000%
3.3	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.	M3	20,00	$ 1.004.876,00	$ 20.097.520,00			0,00000000000000%
3.4	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	2160,00	$ 7.116,00	$ 15.370.560,00			0,00000000000000%
3.5	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	65,80	$ 40.347,00	$ 2.654.833,00			0,00000000000000%

	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 81.981.965,00**		**$**	
4	CUBIERTA							
4.1	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	845,86	$ 211.559,00	$ 178.949.296,00			0,00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 178.949.296,00**		**$**	
5	ACABADOS - PLACA EN CONCRETO							0,00000000000000%
5.1	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	307,11	$ 14.798,00	$ 4.544.614,00			0,00000000000000%
5.2	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M, Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	2,00	$ 3.710.773,00	$ 7.421.546,00			0,00000000000000%
5.3	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	20,30	$ 73.943,00	$ 1.501.043,00			0,00000000000000%
5.4	Cuneta en concreto de 3.000psi, segun diseño	ML	66,04	$ 83.852,00	$ 5.537.586,00			0,00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 19.004.789,00**		**$**	
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS							
6.1	Bajantes en tubería PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	49,60	$ 80.145,00	$ 3.975.192,00			0,00000000000000%
6.2	Suministro e instalacion de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.	ML	24,10	$ 107.091,00	$ 2.580.893,00			0,00000000000000%
6.3	Suministro e instalacion de tubería PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	24,00	$ 219.053,00	$ 5.257.272,00			0,00000000000000%
6.4	Caja de inspeccion en concreto de F'c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	2,00	$ 349.989,00	$ 699.978,00			0,00000000000000%
6.5	Construcción de filtros laterales externos en un ancho de 0,40 mts, con altura variable menor a 0,50 mts, recubrimiento en geotextil no tejido NT-1600, con gravilla común o triturado de 1 1/2" a 4"+ tubería PVC drenaje de 6"	ML	66,04	$ 63.617,00	$ 4.201.267,00			0,00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 16.714.602,00**		**$**	
7	INSTALACIONES ELECTRICAS							
7.1	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	3,00	$ 638.903,00	$ 1.916.709,00			0,00000000000000%
7.2	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	16,54	$ 46.003,00	$ 747.089,00			0,00000000000000%

7.3	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	ML	29,00	$ 49.342,00	$ 1.430.918,00			0,00000000000000%
7.4	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2,00	$ 304.503,00	$ 609.006,00			0,00000000000000%
7.5	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	2,00	$ 282.276,00	$ 564.552,00			0,00000000000000%
7.6	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1,00	$ 1.016.827,00	$ 1.016.827,00			0,00000000000000%
7.7	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1,00	$ 4.701.216,00	$ 4.701.216,00			0,00000000000000%
7.8	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 AL ser8000 + 1x8 CU.	ML	12,00	$ 88.535,00	$ 1.062.420,00			0,00000000000000%
7.9	Suministro e instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12,00	$ 368.969,00	$ 4.427.628,00			0,00000000000000%
7.10	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	64,00	$ 58.153,00	$ 3.721.792,00			0,00000000000000%
7.11	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12,00	$ 1.018.790,00	$ 12.225.480,00			0,00000000000000%
7.12	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 975.015,00	$ 975.015,00			0,00000000000000%
7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 1.035.368,00	$ 1.035.368,00			0,00000000000000%
7.14	Excavación, hincada y plomada de postes de concreto de 8 mts x 510 kg armado y centrifugado.	UND	2,00	$ 2.252.908,00	$ 4.505.816,00			0,00000000000000%
7.15	Vestida de estructura de retencion en baja tensiòn con grapa de retencion para cable trenzado y percha de gancho abierto.	UND	1,00	$ 340.951,00	$ 340.951,00			0,00000000000000%

7.16	Vestida de estructura de retención doble en baja tensión con dos grapas de retención para cable trenzado con perno de gancho abierto y percha de gancho abierto para sujeción de la red trenzada.	UND	1,00	$ 236.067,00	$ 236.067,00			0,00000000000000%
7.17	Vestida de estructura de retención en baja tensión con grapa de retención para cable trenzado y perno de gancho abierto.	UND	1,00	$ 340.951,00	$ 340.951,00			0,00000000000000%
7.18	Tendido y tensionado en conductor trenzado de aluminio aislado 2x35 mm + 50 mm tipo PE-XLPE - 600 VAC.	ML	55,00	$ 46.080,00	$ 2.534.400,00			0,00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 42.392.205,00**		**$**	
8	TRANSPORTE							
8.1	Transporte de materiales petreos	M3-Km	3.070,21	$ 1.100,00	$ 3.377.231,00			0,00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 3.377.231,00**		**$**	
% AVANCE DE OBRA								**0,04364684317128%**


NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

CONSORCIO WF
R.L. ING.FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
INTERVENTORIA


CONSORCIO CIVIL H&E
ING. HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON
CONTRATISTA

15. REGISTRO FOTOGRAFICO



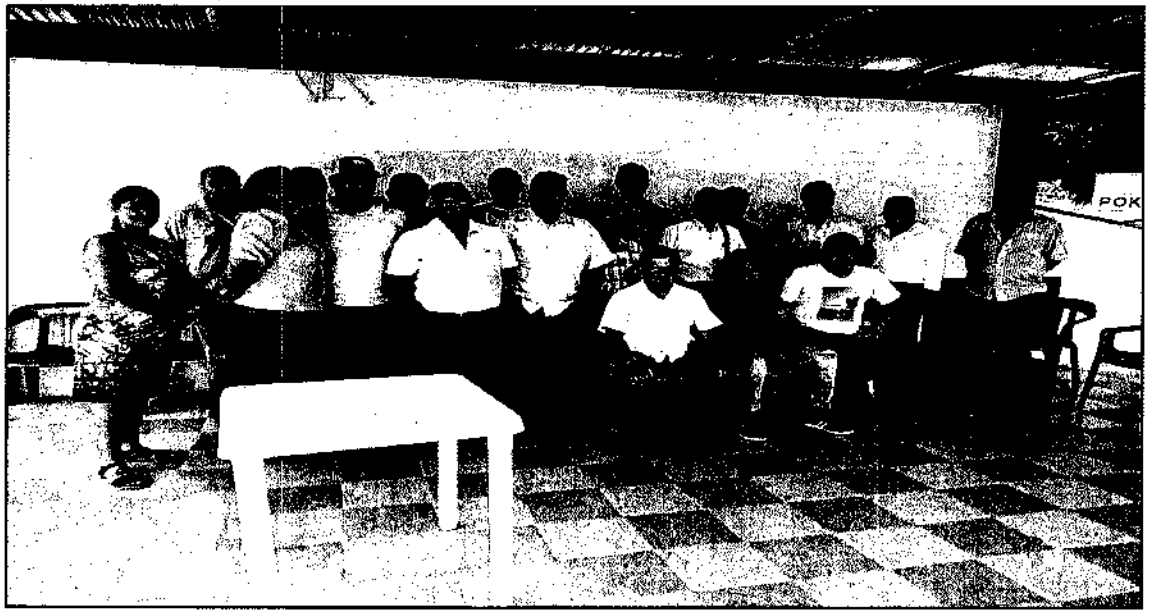


Concertación y socialización de inicio de obra, Elección de Veeduría Ciudadana

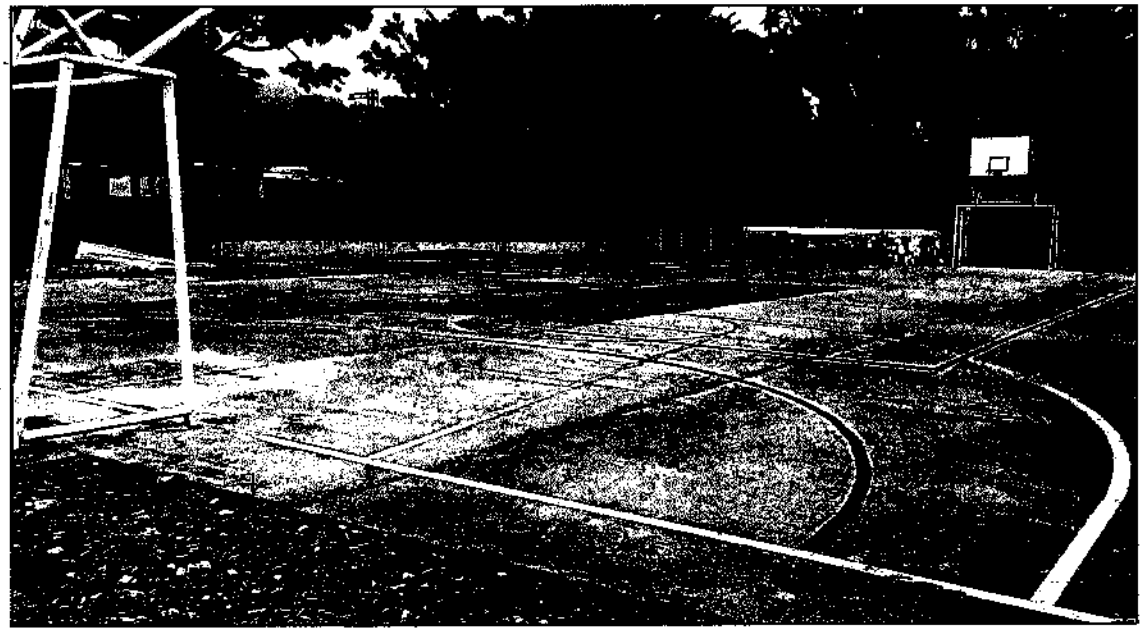




Cerramiento aislamiento de área de trabajos preliminares

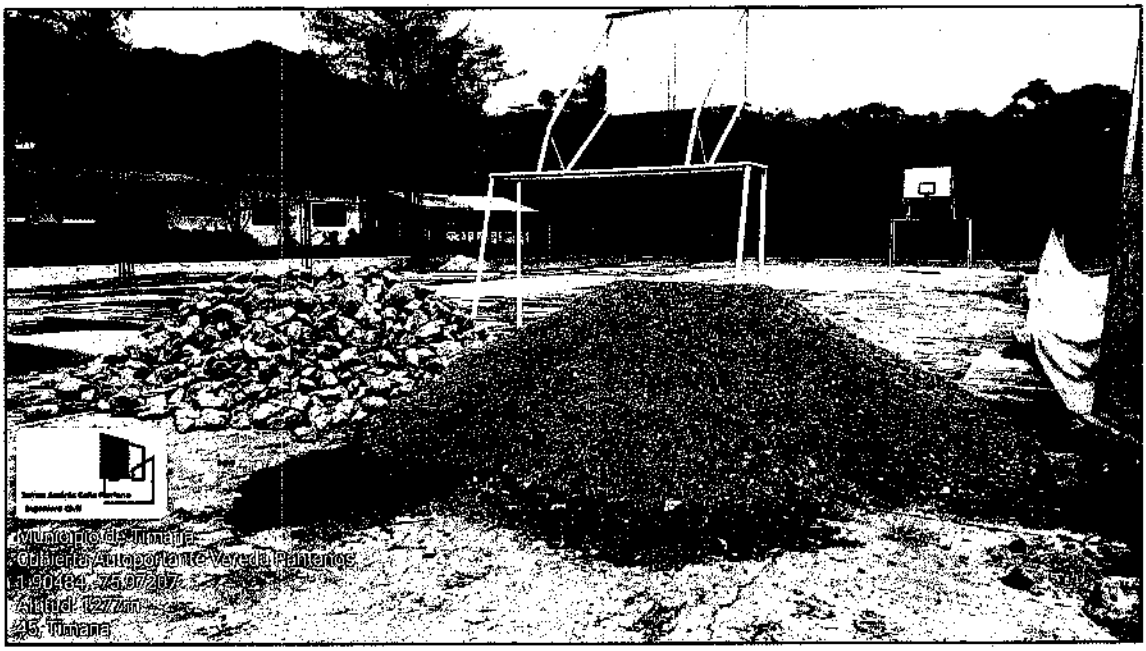




Almacenamiento de materiales agregados para concretos

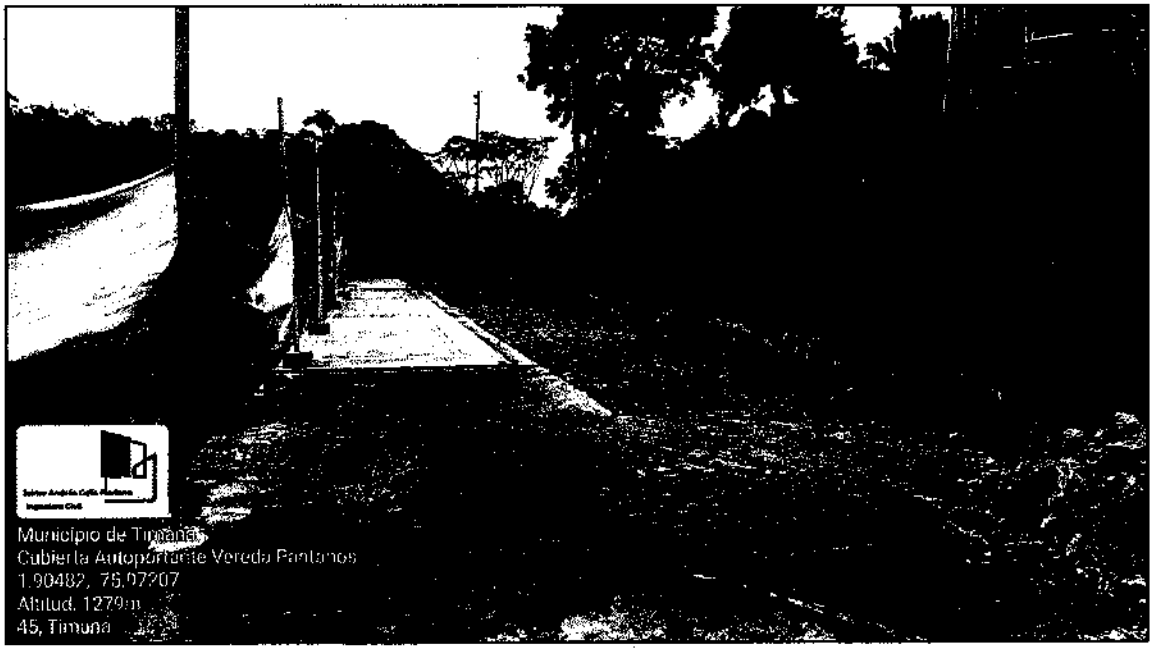



Demolición de placa de concreto existente en el perímetro



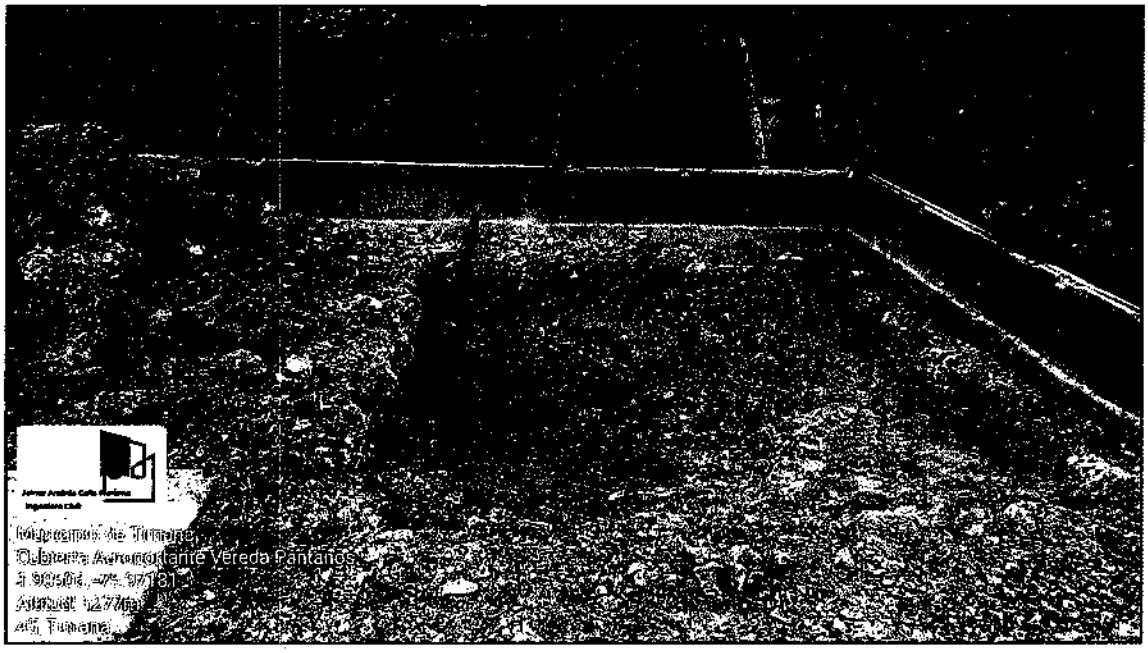

Inicio de Excavación manual para cimentación de zapatas





Excavación manual para cimentación de zapatas

16. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

1. Se realiza revisión de planos e implantación del proyecto nuevamente.
2. Se realizan observaciones a los diseños de los planos estructurales y se solicita suspensión.
3. El 7 de Diciembre se realiza la conformación del comité de veeduría con personal del área de influencia y la socialización del contrato.
4. Se radica la consecución de documentos requeridos para el pago de anticipo.
5. EL 22 y 23 de diciembre del 2023, bajo oficio CUB-06-2023 y CUB-07-2023, el contratista solicita la suspensión del contrato de obra no. CLPIH401-2023.

Dado lo anterior, el 26 de diciembre se ha decidido suspender temporalmente la ejecución de la obra con el fin de generar los cambios contractuales necesarios y ajustar el alcance del proyecto de acuerdo con las nuevas condiciones encontradas.

Rafael Garcia Cabrera.		
R.L. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	(26/12/2023)	**RAFAEL GARCIA CABRERA**
FIRMA ORIGINAL **INTERVENTOR**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo.Bo APOYO SUPERVISION**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7711430
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			FAIVER EDUARDO PEROOMO POLANÍA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 4 9 25 OF 507	TELÉFONO:	8668020
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y sena
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

NÚMERO PLANILLA:		79072459B1	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES diciembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		27	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/02/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 440940646

TOTAL APORTES A PENSIONES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.800	$ 0	$ 185.600	$ 4.800	$ 190.400
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 4.800	$ 190.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 3.800	$ 0	$ 145.000	$ 3.800	$ 0	$ 148.800
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 3.800	$ 0	$ 148.800

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DCI	VSP	VST	SLN	CDA	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD						ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																											
																											ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7711430	FERDOMO POLANIA FAIVER EDUARDO	INDEPEND		$ 3.227.330				NO								01-30									230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 338.800

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7711430
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 4 9 25 OF 507	TELÉFONO:	8658029
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	79201151961	TIPO DE PLANILLA:	N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	71		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/03/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	527574577
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	79072485961	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	2024/02/06

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:										$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:													$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 28.300	$ 28.300	$ 1.800	$ 0	$ 30.100
SUBTOTALES:									$ 28.300	$ 1.800	$ 0	$ 30.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76320749		JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA	INDEPENDIENTE	JOSE WILMER CHILITO RIVADENERIA	CRA 8 CL25N BL G AP 305	POPAYAN-CAUCA	3122879619	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	420212118	9460969549	I	2024/01/11	2024/01/29	NEQUI	18	$417,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: JOSE WILMER CHILITO RIVADENERIA (1 Afiliados)																																										
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																																										
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$411,400
1	CC	76320749	CHILITO JOSE																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
Total		Afiliados(1																				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$411,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76320749		JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA	INDEPENDIENTE	JOSE WILMER CHILITO RIVADENERIA	CRA 8 CL25N BL G AP 305	POPAYAN-CAUCA	3122879619	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	420212118	9460969549	I	2024/01/11	2024/01/29	NEQUI	18	$417,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$3,000	$0	$188,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$3,000	$0	$188,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$ 80,800	$1,800	$0	$82,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$ 80,800	$1,800	$0	$82,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$1,600	$0	$146,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	EPS018	805,001,157	2	1	$145,000	$1,600	$0	$146,600
TOTAL				1	$411,400	$6,400	$0	$417,800

2024/01/29 04:23 PM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7711430
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FARVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 4 9 25 OF 507	TELÉFONO:	8658020
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	79169685501		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2024	
DÍAS DE MORA:	46				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/02/26		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		480405999

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.200	$ 0	$ 165.600	$ 6.200	$ 165.600
SUBTOTALES:										$ 165.600	$ 6.200	$ 165.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 6.500	$ 0	$ 145.000	$ 6.500	$ 0	$ 151.500
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 6.500	$ 0	$ 151.500

planilla pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 300	$ 0	$ 6.400
SUBTOTALES:									$ 6.100	$ 300	$ 0	$ 6.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 46.400	$ 2.100	$ 48.500
SUBTOTALES:			$ 46.400	$ 2.100	$ 48.500

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 34.800	$ 1.800	$ 36.600
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 23.200	$ 1.100	$ 24.300
SUBTOTALES:			$ 58.000	$ 2.700	$ 60.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																												PENSIÓN					SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTIA TRIBUTARIA	INA	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1075277487	BELALCAZAR RAMOS INGRID TATIANA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	1.160.000	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 165.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	1.160.000	7711430	$ 6.100	30	1.160.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

TOTAL	$ 460.900

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-02-20, 09:41:50 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1066184523

Periodo Cotización: diciembre de 2023 **Periodo Servicio:** enero de 2024

Fecha límite de pago: 2024-01-05

PAGADA 20/02/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO WF				
Documento	NI901769619	**Dirección**	CR 4 #9 - 25 OFICINA 507		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8668020		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	3
Ciudad	NEIVA	**Departamento**	HUILA		
Representante Legal	PERDOMO POLANIA FAIVER EDUARDO	**Identificación**	CC7711430		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	RET	TDP	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días ERP	Días APO	Días COT	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1083866304	GIRALDO JIMENEZ JAVIER HUMBERTO	01	00	X															0	29	29	29	29	PORVENIR	$ 1.950.000	$ 312.000	EPS SANITAS	$ 1.950.000	$ 78.000	ARL SURA	$ 1.950.000	$ 135.600	COMFAMILIAR HUILA	$ 1.950.000	$ 78.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 603.600
CC 1012354709	JUNCO AVILA CRISTIAN FABIAN	01	00	X															0	29	29	29	29	COLFONDOS	$ 2.365.334	$ 361.400	EPS SANITAS	$ 2.365.334	$ 95.400	ARL SURA	$ 2.365.334	$ 165.600	COMFAMILIAR HUILA	$ 2.365.334	$ 95.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 726.100
CC 1079174293	POLANIA LEIVA YINA CARIME	01	00	X															0	21	21	21	21	PORVENIR	$ 1.575.000	$ 252.000	EPS SANITAS	$ 1.575.000	$ 63.000	ARL SURA	$ 1.575.000	$ 109.700	COMFAMILIAR HUILA	$ 1.575.000	$ 63.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 487.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 5.908.334	$ 5.908.334	$ 5.908.334	$ 5.908.334	$ 945.400	$ 0	$ 0	$ 236.400	$ 411.400	$ 236.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.829.600	$ 33.000	$ 1.862.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!
