Consorcio Civil H&E
NIT. 901.767.013-6

INFORME No. 5

Contrato Obra N. CLPIH401-2023

Objeto es el **"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA"**


Dirección: Cra. 3 w N. 64-37 Barrio Chicalá
Email: consorciocivilheinder@gmail.com
Teléfonos: 3187167087
Ciudad: Neiva Huila

CONTRATO DE OBRA No. CLPIH401 DE 2023

INFORME DE OBRA No. 5

MENSUAL [x] **FINAL** [ ]

Objeto Contrato: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ, DEPARTAMENTO DEL HUILA

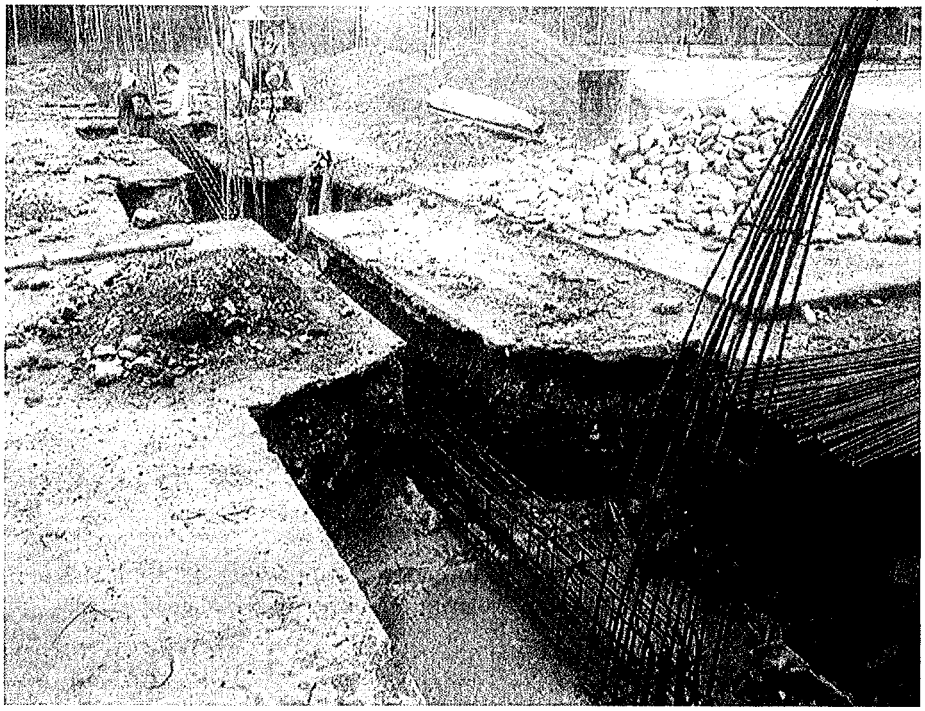

MUNICIPIO: Timana, Vereda Pantanos.

DEPARTAMENTO: HUILA


CONTRATO DE OBRA No. CLPIH401 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO CIVIL H&E


APOYO A LA SUPERVISIÓN	Ing. CESAR JOAQUIN VELASQUEZ TIQUE	ENTIDAD	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	CLPIH401 DE 2023		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ, DEPARTAMENTO DEL HUILA	**PERIODO DEL INFORME**	Entre 01 de noviembre al 30 De noviembre de 2024.
CONTRATISTA	CONSORCIO CIVIL H&E	**NIT**	901.767.013-6
REPRESENTANTE LEGAL:	HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON	**C.C**	79.944.179 de Bogotá D.C.


FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	2 DE NOVIEMBRE DEL 2023
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16 DE NOVIEMBRE DEL 2023
FECHA DE SUSPENSIÒN No. 1	26 de diciembre del 2023
FECHA DE REINICIO No. 1	24 de septiembre del 2024
OTROSI No. 1 24/09/2024	MODIFICACIÓN CLÁUSULA 3 -PLAZO DEL CONTRATO – VIGENCIA FISCAL
OTROSI No. 2 12/11/2024	Prorroga: Un (1) mes. Adición: Setenta y cinco millones ciento setenta y nueve mil trescientos cincuenta y siete pesos ($75.179.357) M/CTE
PLAZO INICIAL	Tres (3) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones sin superar la vigencia fiscal.
PLAZO ADICIONAL (No.1) (12/11/2024):	Un (1) mes.
PLAZO TOTAL:	Cinco (5) meses contando a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones sin superar la vigencia fiscal.
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS cincuenta y un millones cuatrocientos ochenta y tres mil ciento ochenta y tres pesos ($551.483.183,00) M/CTE.
VALOR ADICIONAL (12/11/2024):	Setenta y cinco millones ciento setenta y nueve mil trescientos cincuenta y siete pesos ($75.179.357) M/CTE.
VALOR TOTAL:	**SEISCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS ($ 626.662.540) M/CTE.**

INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	**NIT:**	Nit. 901.769.619-8
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	**C.C:**	7.711.430

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

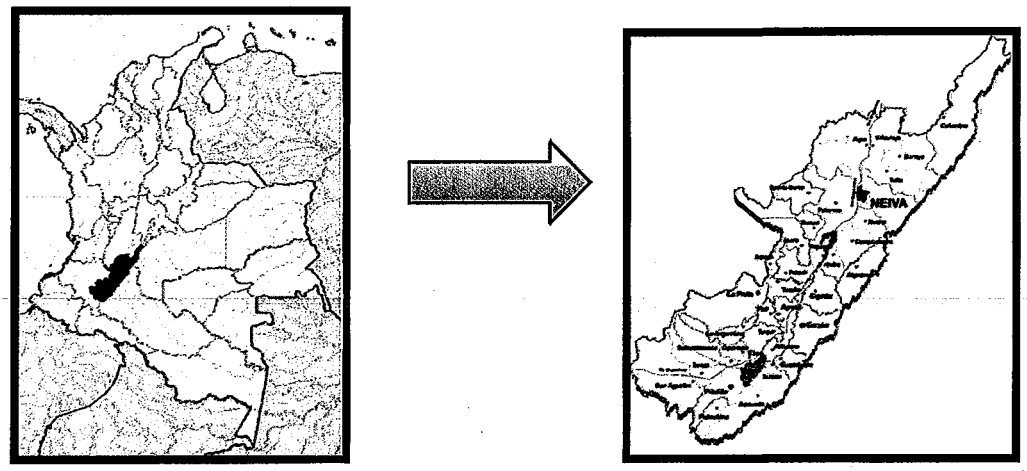

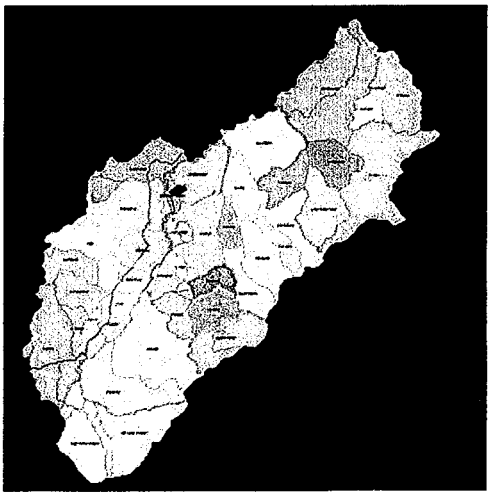

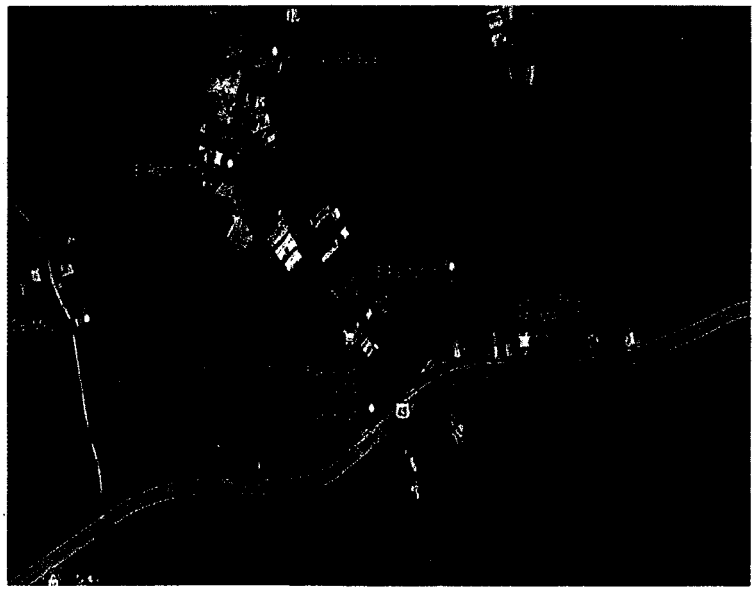

ILUSTRACIÒN 1. LOCALIZACIÒN MUNICIPIO DE TIMANA

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de (1) cubierta autoportante con iluminación para la vereda pantanos de la zona rural del Municipio de Timana Departamento del Huila

Es un sistema de estructura en concreto y teja auto portante a base de lámina de acero cal. 22:
- Área Total replanteo: 937,20 M2
- Actividades preliminares.
- Cimentación en concreto.
- Estructura en concreto.
- Cubierta.
- Instalaciones hidrosanitarias.
- Instalaciones eléctricas.

4. INFORME CONCRETO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DURANTE EL PERIODO

N/A

5. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION
Iniciación	16 de noviembre de 2023	40		
Suspensión No. 1	26 de diciembre de 2023		273	
Reiniciación No. 1	24 de septiembre de 2024	37		
OTROSI No. 2	12 de noviembre de 2024	30		
TERMINACIÓN Cto.				13 de diciembre de 2024
TOTAL DIAS		107	273	

6. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)


Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA INICIO	1	16 de noviembre del 2023
ACTA DE SUSPENSION	1	26 de diciembre del 2023
ACTA DE JUSTIFICACION	1	26 de diciembre del 2023
ACTA DE REINICIO	1	24 de septiembre del 2024
ACTA DE JUSTIFICACION	2	24 de septiembre del 2024
ACTA DE JUSTIFICACION	3	24 de septiembre del 2024
OTROSI MODIFICATORIO	1	24 de septiembre del 2024
ACTA DE JUSTIFICACION	4	12 de noviembre del 2024
OTROSI MODIFICATORIO	2	12 de noviembre del 2024

7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

a). **Actividades administrativas**	Cobro del anticipo, Capacitaciones profesionales siso Ajustes planos estructurales
b.) **Actividades operativas**	Amarre de acero para zapatas Se continua con la excavación manual viga de cimentación y perfilamiento eje B Instalación de formaletas y acero para zapatas eje A Fundición de zapatas B5, B6 Fundición de zapatas B4, B3 Fundición de zapatas B2, B1 Instalación de acero para vigas eje B Instalación de formaletas vigas eje B Fundición de vigas eje B Amarre de acero para columnas eje B Rellano con crudo de rio Compactación mecánica Fundición de Zapatas eje A Relleno recebo Compactación mecánica Replanteo para corte de placa instalación de filtro perforado Amarre de acero para columnas

8. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

En Timaná, la probabilidad de un día mojado en noviembre es esencialmente constante, permaneciendo en alrededor del 58 %.Como referencia, la probabilidad más alta del año de tener un día mojado es el 61 % el 12 de noviembre.
El mes de noviembre, Timaná tiene nubosidad que permanece esencialmente constante y el porcentaje de tiempo que el cielo está nublado o mayormente nublado permanece en alrededor del 84 % durante el mes.

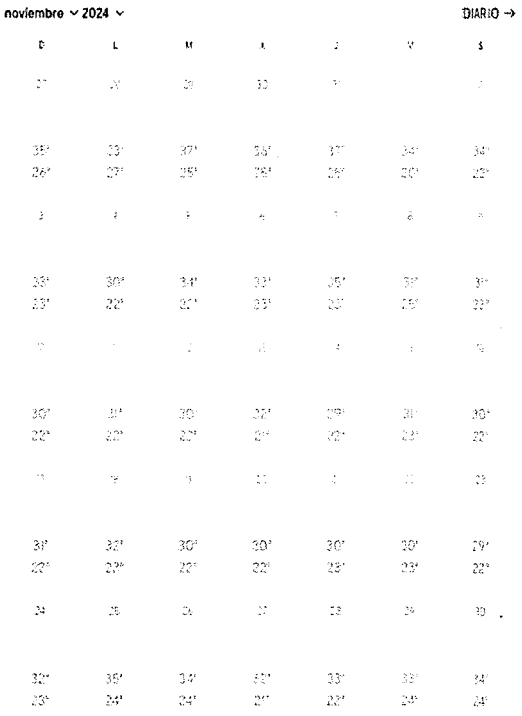

ILUSTRACIÒN 2. TIEMPO MUNICIPIO DE TIMANA

9. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Tipo Prueba de Laboratorio	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
Diseños de mezcla para los concretos.	N/A	N/A
Diseños de mezcla para base.	N/A	N/A
Compresión simple al concreto.	N/A	N/A
Ensayo de compactación de campo	N/A	N/A

NOTA: *Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Articulo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.*

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
N/A	N/A	N/A	7	14	28	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A				N/A	N/A	N/A
		N/A				N/A	N/A	N/A
		N/A				N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A				N/A	N/A	N/A
		N/A				N/A	N/A	N/A
		N/A				N/A	N/A	N/A

10. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo (25%)	23/10/2024	$130.977.256		$130.977.256
Acta Parcial No. 1		$	$	$
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$551.483.183	$0	$551.483.183	$	$420.505.977

11. COMITES DE OBRA		
Fecha de Realización	**Lugar**	**Resultado del Comité** (Describir)
04/11/2024	**OBRA**	Ajustar nuevas medidas que permitan el nuevo avance de la obra, sea mas notorio y se reajuste al cronograma, debido a las fuertes precipitaciones que se vienen presentando.
11/11/2024	**OBRA**	Se estableció que las actividades a desarrollar cumplan con las normas, planos exigidos por la entidad.
18/11/2024	**OBRA**	Visita del director para establecer y aumentar las actividades programadas por las precipitaciones altas que se vienen presentando.
25/11/2024	**OBRA**	Se programan actividades extras por temporadas de lluvia y seguin cumpliendo con el objeto del contrato.

12. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD	No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)	FORMATO (Físico/Digital)
Pólizas de cumplimiento (Endoso 3 (No61-44-101051701.)			**DIGITAL**
Pólizas R.C (Endoso 3 (No. 61-40-101018824))			**DIGITAL**
Pólizas de cumplimiento (Endoso 4 (No61-44-101051701.)			**DIGITAL**
Pólizas R.C (Endoso 4 (No. 61-40-101018824))			**DIGITAL**
Pólizas R.C (Endoso 5 (No. 61-40-101018824))			**DIGITAL**
Copias de Bitácora de Obra (periodo del (01 /11/2024) al (30/11/2024)	**06/12/2024**		**FISICO**
Informe HSEQ (periodo del 01 /11/2024) al (30/11/2024)	**06/12/2024**		**FISICO**
Actas de socialización e inicio de obra			**FISICO**
Actas de conformación de veeduría ciudadana			**FISICO**
Acta de vecindad			**FISICO**

Actas de comités (periodo del 01 /11/2024) al (30/11/2024)	06/12/2024		FISICO
Planillas de aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP) (periodo del 01 /11/2024) al (30/11/2024)	06/12/2024		FISICO
Correspondencia (periodo del (01 /11/2024) al (30/11/2024)	06/12/2024		FISICO
Registros de ensayos de calidad (periodo del (01 /11/2024) al (30/11/2024)	06/12/2024		FISICO
Registros de ensayos de calidad (periodo del (01 /11/2024) al (30/11/2024)	06/12/2024		FISICO

13. RELACION DE PERSONAL (Profesional y Mano de obra)

NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON	79944179	DIRECTOR	PRESTACION DE SERVICIOS
WILSON REINALDO PARRA TOVAR	79500020	RESIDENTE	PRESTACION DE SERVICIOS
LIZETH NAIROBY LUNA CUELLAR	1077862501	SISO	PRESTACION DE SERVICIOS
ADRIAN DIYER CHALA MEDINA	1080933023	AYUDANTE	PRESTACION DE SERVICIOS
YONEISON CORREA ORTIZ	1004440666	AYUDANTE	PRESTACION DE SERVICIOS
SEBASTIAN ESPAÑA ARDILA	1083876435	AYUDANTE	PRESTACION DE SERVICIOS
JONATHAN ESPAÑA MEDINA	1080935714	AYUDANTE	PRESTACION DE SERVICIOS
YEFERSON MEDINA PUENTES	1080937225	AYUDANTE	PRESTACION DE SERVICIOS
JUAN CARLOS SANCHEZ TRUJILLO	1081514075	RESIDENTE AUXILIAR	PRESTACION DE SERVICIOS

14. RELACIÓN DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA
ANTICIPO	2024001265	23 DE OCTUBRE DE 2024

15. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON	$421.400	$329.200	$64.200	$52.700	$0	9481662566	13/02/2025
WILSON REINALDO PARRA TOVAR	$208.000	$162.500	$90.500	$52.000	$68.000	32528768	13/02/2025
LIZETH NAIROBY LUNA CUELLAR	$208.000	$162.500	$90.500	$$52.000	$$65.000	32203679	15/01/2025
ADRIAN DIYER CHALA MEDINA	$208.000	$162.500	$90.500	$$52.000	$$65.000	32203679	15/01/2025
YONEISON CORREA ORTIZ	$90.200	$70.500	39.300	$22.600	$28.300	32203679	15/01/2025
SEBASTIAN ESPAÑA ARDILA	$208.000	$162.500	$90.500	$$52.000	$$65.000	32203679	15/01/2025
JONATHAN ESPAÑA MEDINA	$208.000	$162.500	$90.500	$$52.000	$$65.000	32203679	15/01/2025
YEFERSON MEDINA PUENTES	$124.800	$97.500	$54.300	$31.200	$39.000	32203679	15/01/2025
JUAN CARLOS SANCHEZ TRUJILLO	$208.000	$162.500	$90.500	$$52.000	$$65.000	32203679	15/01/2025

16. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

Póliza legalización del CONTRATO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-101051701	0	02/11/2023	Cumplimiento del contrato	02/11/2023	02/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	02/11/2023	02/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/11/2023	02/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-101018824	0	02/11/2023	02/11/2023	02/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-101051701	1 Y 2	20/11/2023	Cumplimiento del contrato	02/11/2023	02/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	02/11/2023	02/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/11/2023	02/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-101018824	1 Y 2	20/11/2023	02/11/2023	02/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION No. 1 - ACTA DE REINICIO No. 1:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
		3 Y 4	20/11/2023	Cumplimiento del contrato	16/11/2023	16/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	16/11/2023	16/08/2024

SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-101051701			Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/11/2023	16/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-101018824	3,4 Y 5	02/10/2024	16/11/2024	20/11/2024

Póliza actualizada x OTROSI MODIFICATORIO No.2

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)


ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-101051701	5, 6 Y 7	18/11/2024	Cumplimiento del contrato	16/11/2023	20/06/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	16/11/2023	02/06/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/11/2023	20/12/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)


ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-101018824		18/11/2024	16/11/2024	20/11/2024

17. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


(Describir el contenido del plano)

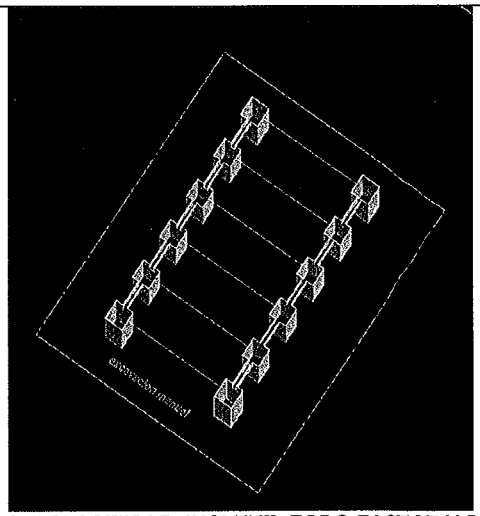

ESQUEMA 1. EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR. INCLUYE: TODO FACTOR Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL EN ESCOMBRERA AUTORIZADA.

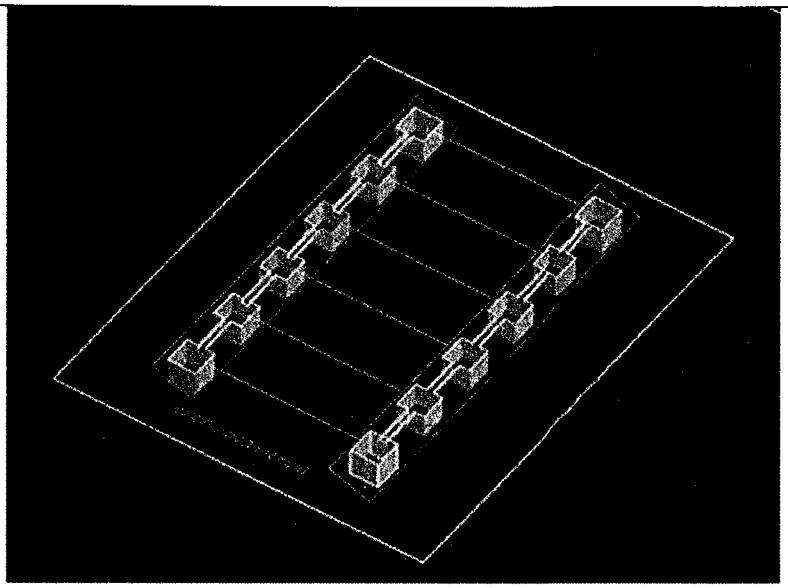

ESQUEMA 2. RELLENO EN RECEBO SELECCIONADO Y COMPACTADO MECANICAMENTE.

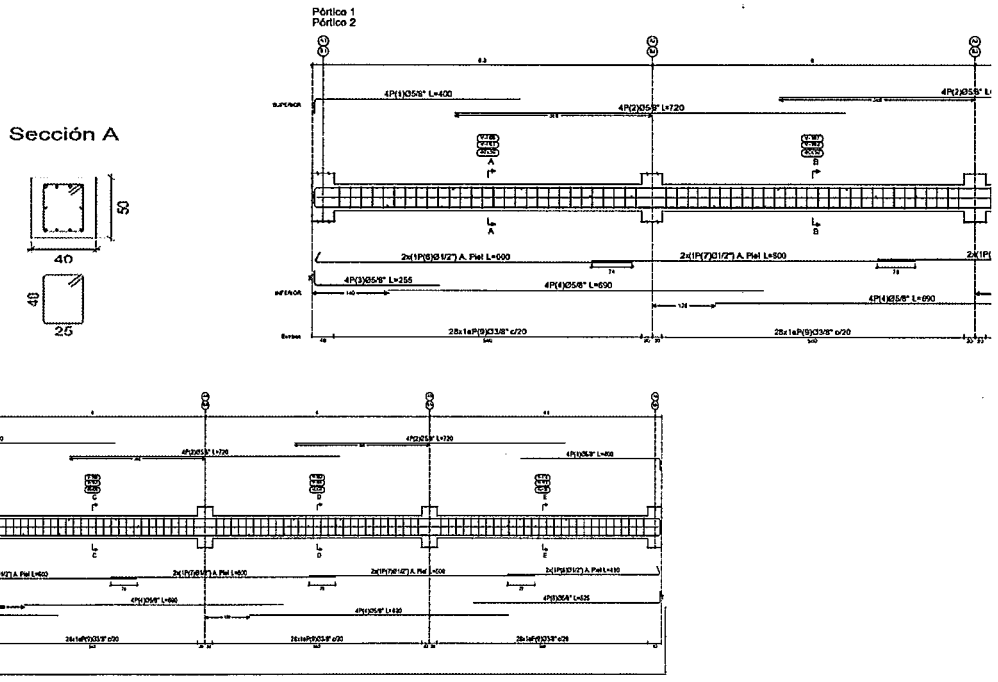

ESQUEMA 3. ACERO DE REFUERZO FY=60.000 P.S.I. VIGA DE CIMENTACIÓN.

18. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS					EJECUCIÓN DE OBRA MENSUAL			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR		CANT	% EJECUCION
1	**Preliminares**									
1.1	Localización y replanteo.	M2	900.42	$ 3,558.00	$ 3,203,694.00			0.00000000000000%	900.42	0.72615405572576%
1.2	Corte de Placa de concreto e= 0.10 mts.	ML	157.80	$ 26,280.00	$ 4,146,984.00	0.00	$ -	0.00000000000000%	74.90	0.44615413050592%
1.3	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	108.84	$ 116,723.00	$ 12,704,131.00		$ -	0.00000000000000%	108.84	0.05291321820778%
1.4	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	217.73	$ 46,003.00	$ 10,016,233.00	32.40	$ 1,490,497.00	0.29732843165824%	217.73	2.22978445724842%
1.5	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	201.04	$ 83,849.00	$ 16,857,003.00	42.00	$ 3,521,658.00	0.70251000168178%	42.00	0.70251000168178%
1.06 NP	Relleno, crudo de rio para filtrar y compactar, mecanicamente.	M3	54.49	$ 127,780.00	$ 6,962,732.00	20.00	$ 2,555,600.00	0.50979810086555%	20.00	0.50979810086555%
1.07 NP	Filtro en tuberia de drenaje de 4" PVC perforada	ML	94.50	$ 138,014.00	$ 13,042,323.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 66,933,100.00**		**$ 1,490,497.00**			
2	**CIMENTACIÓN**									
2.1	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	16.40	$ 34,012.00	$ 557,797.00		$ -	0.00000000000000%	15.92	0.12273062368250%

2.2	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	34.56	$ 619,063.00	$ 21,394,817.00	15.00	$ 9,285,945.00	1.85238579032006%	30.00	3.95715192060476%
2.3	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	2,462.20	$ 7,116.00	$ 17,521,015.00	306.00	$ 2,177,496.00	0.43437287738391%	2306.00	3.66021920387108%
2.4	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño,	M3	12.20	$ 742,041.00	$ 9,052,900.00	3.98	$ 2,953,323.00	0.58913697630402%	3.98	0.58913697630402%
2.5	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación.	KG	1,257.66	$ 7,116.00	$ 8,949,509.00	1000	$ 7,116,000.00	1.41951920713697%	1000.00	1.41951920713697%
2.6	Concreto Ciclopeo - 2500 PSI (175 KG/CM2) 60% Concreto 2500 PSI + 40% Piedra media zonga	M3	76.03	$ 360,003.00	$ 27,371,028.00	0	$ -	0.00000000000000%	76.03	6.20395799086407%
2.07 NP	Suministro e instalacion de plastico negro 3,5 impermehabilizacion.	M2	138.72	$ 15,257.00	$ 2,116,451.00	138.72	$ 2,116,451.00	0.42219545326929%	138.72	0.42219545326929%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 86,963,517.00**		**$ 21,532,764.00**			
3	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**									
3.1	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	17.04	$ 920,829.00	$ 15,690,926.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
3.2	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	3,894.25	$ 7,116.00	$ 27,711,483.00	1000.00	$ 7,116,000.00	1.41951920713697%	1000.00	1.41951920713697%
3.3	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.	M3	19.37	$ 1,004,876.00	$ 19,464,448.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
3.4	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	2,348.55	$ 7,116.00	$ 16,712,282.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
3.5	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	65.80	$ 40,347.00	$ 2,654,833.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%

	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 82,233,972.00**		**$ 7,116,000.00**			
4	**CUBIERTA**									
4.1	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	845.53	$ 211,559.00	$ 178,879,481.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 178,879,481.00**		**$**			
5	**ACABADOS - PLACA EN CONCRETO**									
5.1	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	307.11	$ 14,798.00	$ 4,544,614.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
5.2	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	0.00	$ 3,710,773.00	$ -		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
5.3	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	140.28	$ 73,943.00	$ 10,372,724.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
5.4	Cuneta en concreto de 3.000psi, segun diseño	ML	69.80	$ 83,852.00	$ 5,852,870.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
5.05 NP	Mantenimiento de cancha multifuncional Futbol de Salón, Baloncesto, incluye pintura, mallas, demarcado y logos.	UND	2.00	$ 736,291.00	$ 1,472,582.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 22,242,790.00**		**$**			
6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**									
6.1	Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	49.60	$ 80,145.00	$ 3,975,192.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%

6.2	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.	ML	23.68	$ 107,091.00	$ 2,535,915.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
6.3	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	24.00	$ 219,053.00	$ 5,257,272.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
6.4	Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	2.00	$ 349,989.00	$ 699,978.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
6.5	Construcción de filtros laterales externos en un ancho de 0,40 mts, con altura variable menor a 0,50 mts, recubrimiento en geotextil no tejido NT-1600, con gravilla común o triturado de 1 1/2" a 4"+ tubería PVC drenaje de 6"	ML	91.04	$ 63,617.00	$ 5,791,692.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 18,260,049.00**		**$**			
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**									
7.1	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	3.00	$ 638,903.00	$ 1,916,709.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.2	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	16.24	$ 46,003.00	$ 747,089.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.3	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	ML	29.00	$ 49,342.00	$ 1,430,918.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.4	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2.00	$ 304,503.00	$ 609,006.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.5	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	2.00	$ 282,276.00	$ 564,552.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.6	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1.00	$ 1,016,827.00	$ 1,016,827.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%

7.7	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1.00	$ 4,701,216.00	$ 4,701,216.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.8	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 AL ser8000 + 1x8 CU.	ML	12.00	$ 88,535.00	$ 1,062,420.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.9	Suministro e instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12.00	$ 368,969.00	$ 4,427,628.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.10	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	64.00	$ 58,153.00	$ 3,721,792.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.11	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12.00	$ 1,018,790.00	$ 12,225,480.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.12	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1.00	$ 975,015.00	$ 975,015.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	1.00	$ 1,035,368.00	$ 1,035,368.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.14	Excavación, hincada y plomada de postes de concreto de 8 mts x 510 kg armado y centrifugado.	UND	2.00	$ 2,252,908.00	$ 4,505,816.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.15	Vestida de estructura de retencion en baja tensiòn con grapa de retencion para cable trenzado y percha de gancho abierto.	UND	1.00	$ 340,951.00	$ 340,951.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.16	Vestida de estructura de retención doble en baja tensión con dos grapas de retención para cable trenzado con perno de gancho abierto y percha de gancho abierto para sujeción de la red trenzada.	UND	1.00	$ 236,067.00	$ 236,067.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.17	Vestida de estructura de retención en baja tensión con grapa de retención para cable trenzado y perno de gancho abierto.	UND	1.00	$ 340,951.00	$ 340,951.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.18	Tendido y tensionado en conductor trenzado de aluminio aislado 2x35 mm + 50 mm tipo PE-XLPE - 600 VAC.	ML	55.00	$ 46,080.00	$ 2,534,400.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%

	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 42,392, 205.00**		**$**			
8	**TRANSPORTE**									
8.1	Transporte de materiales petreos	M 3-K m	308 3.07	$ 1,100.00	$ 3,391,3 77.00		$ -	0.0000000 0000000%	0.00	0.0000000000 0000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 3,391,3 77.00**		**$**			
% AVANCE DE OBRA								**7.6467660 4575678%**		**22.461744547 10480%**


NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON
DIRECTOR DE OBRA

ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
DIERCTOR DE INTERVENTORIA

19. REGISTRO FOTOGRAFICO



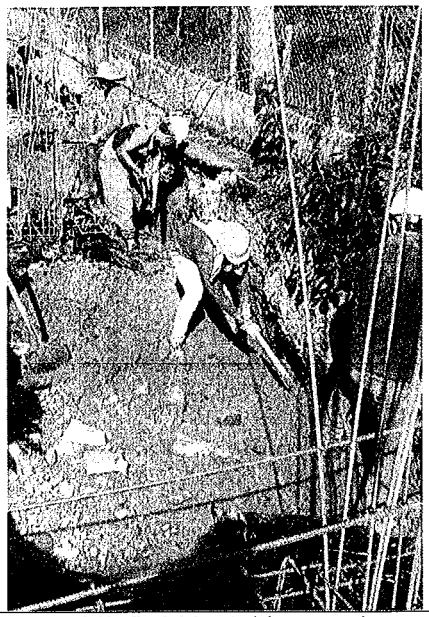


ILUSTRACIÒN 3 y 4. Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.





ILUSTRACIÒN 5 y 6. Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.

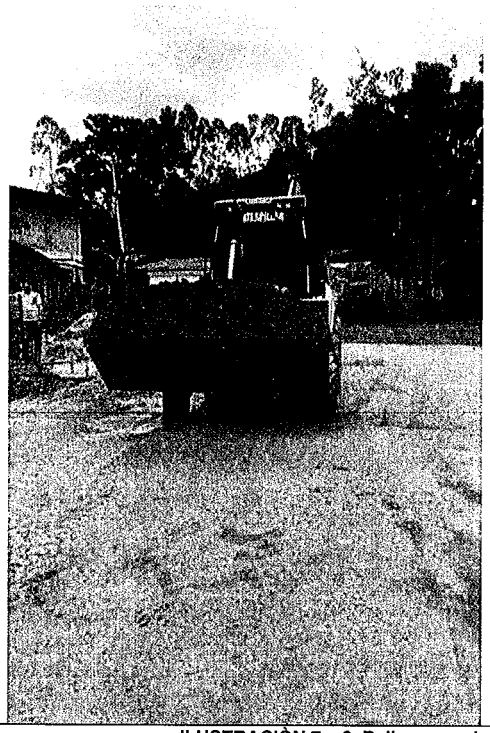

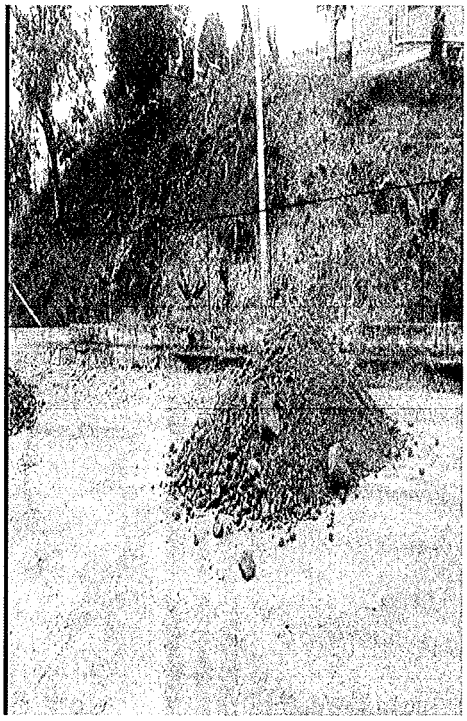
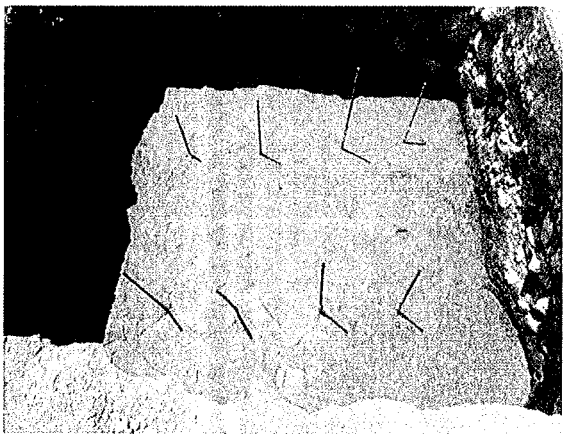


ILUSTRACIÓN 7 y 8. Relleno, crudo de rio para filtrar y compactar, mecánicamente.






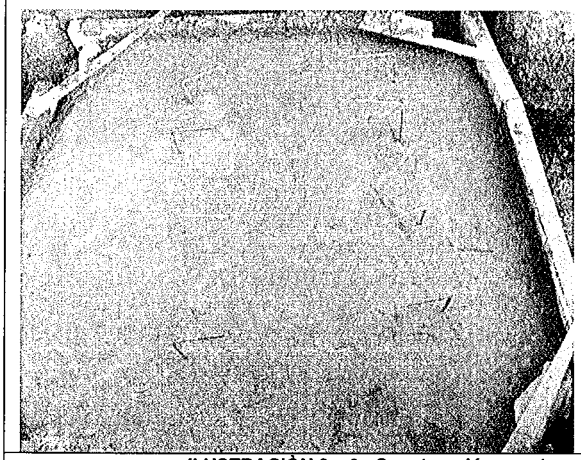



ILUSTRACIÓN 8 y 9. Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.

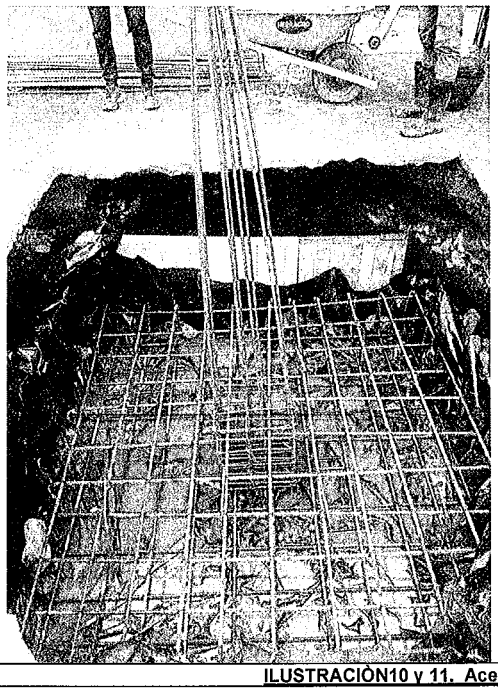

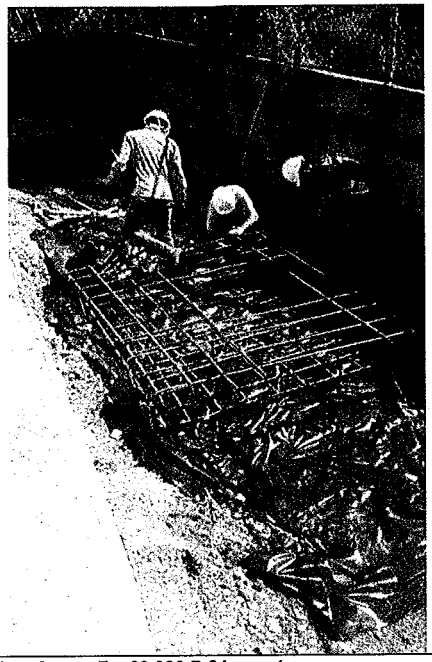

ILUSTRACIÒN10 y 11. Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas

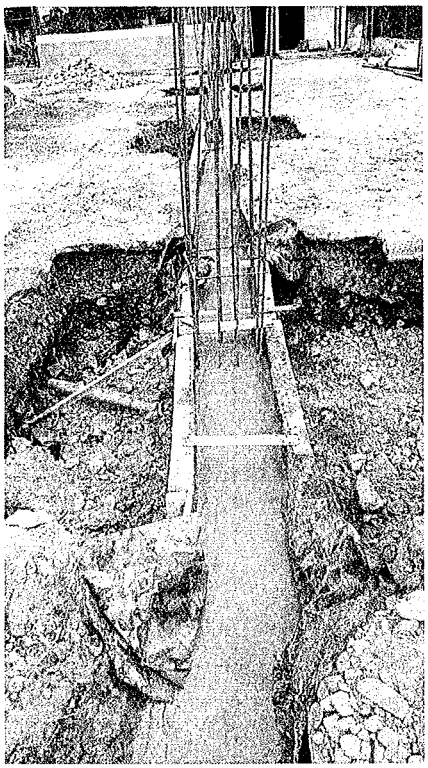

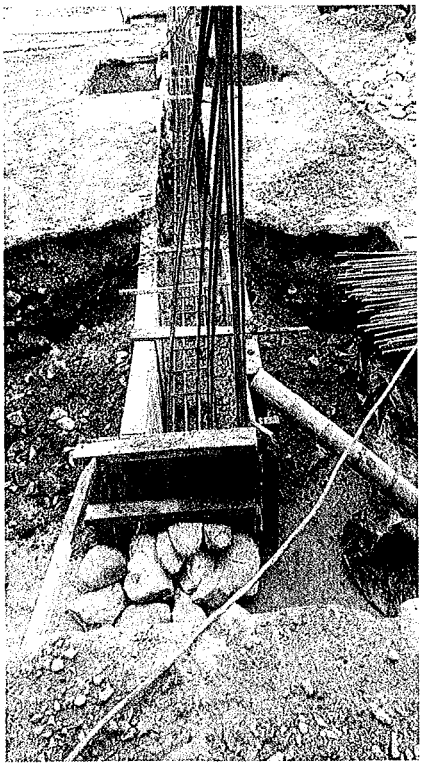


ILUSTRACIÒN 12 y 13. Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.




ILUSTRACIÒN 14. Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación.



ILUSTRACION 15. Suministro e instalación de plastico negro 3,5 impermeabilización.

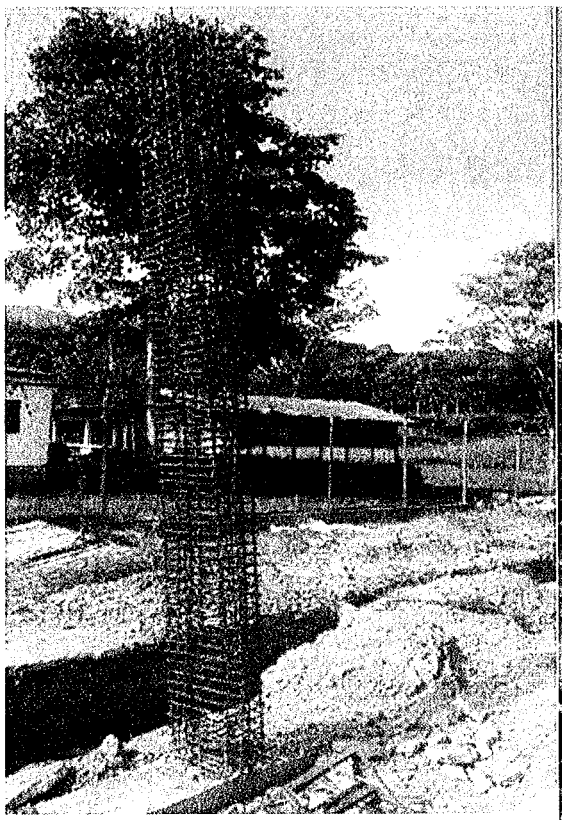

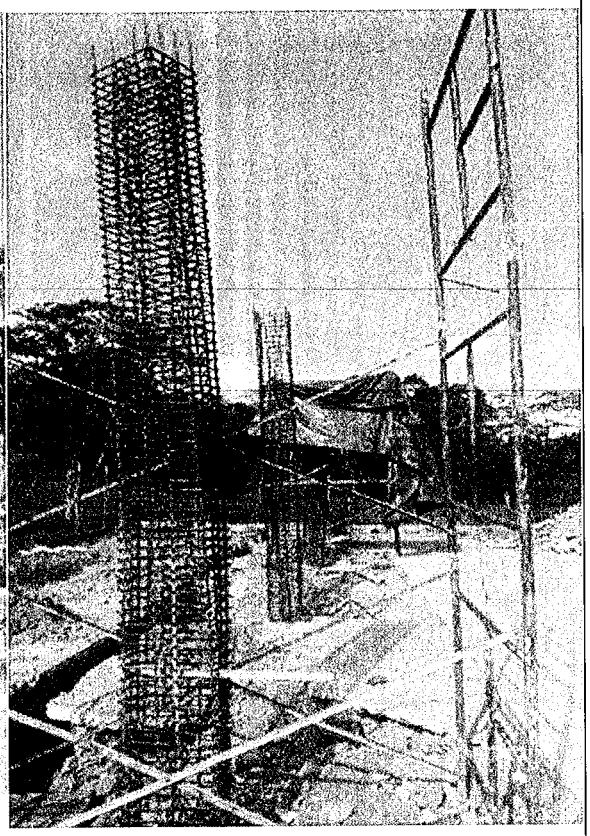

ILUSTRACIÒN 16 y 17. Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas

20. ANEXOS

- INFORME HSEQ.
- ACTAS DE COMITÉS.
- BITACORA DE OBRA.
- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP).
- CERTIFICADO VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA REALIZADO POR EL INTERVENTOR (Vo.Bo. Interventor).
- CORRESPONDENCIA GENERADA DURANTE EL PERIODO.

ING. HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON	(06/12/2024)	ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
FIRMA ORIGINAL **DIRECTOR DE OBRA**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo.Bo DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

Consorcio Civil H&E
NIT. 901.767.013-6

OTROSI No. 2

Dirección: Cra. 3 w N. 64-37 Barrio Chicalá
Email: consorciocivilheinder@gmail.com
Teléfonos: 3187167087
Ciudad: Neiva Huila

OTROSÍ MODIFICATORIO No.02 AL CONTRATO DE OBRA N°CLPIH401 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO CIVIL H&E

CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. CLPIH401 DE 2023
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMANETO DEL HUILA".
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CIVIL H&E**
NIT	901.767.013-6
REPRESÉNTATE LEGAL:	**HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON** C.C. 79.944.179 de Bogotá D.C.
INTERVENTOR	**CONSORCIO WF** NIT 901.769.619-7 R.L. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA C.C. 7.711.430
VALOR DEL CONTRATO:	QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 551.483.183) M/CTE
FECHA SUSCRIPCIÓN:	2 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:	26 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA ACTA DE REINICIO No. 1:	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
OTROSÍ No. 01 24/09/2024	MODIFICACIÓN CLÁUSULA 3 PLAZO DEL CONTRATO – VIGENCIA FISCAL.
PLAZO A PRORROGAR:	**UN (1) MES.**
VALOR A ADICIONAR:	***SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($ 75.179.357,00) M/CTE.***

Entre los suscritos: **EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FISÍCA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA – INDERHUILA-** con NIT. 813.005.578-7, entidad Representada Legalmente por el Doctor **FELIPE VICTORIA BARRAGÁN,** identificado con la cédula de ciudadanía N°1.077.845.632 expedida en Garzón - Huila, en calidad de **DIRECTOR,** nombrado mediante Decreto No.01 del 02 de enero de 2024, cargo para el cual tomó posesión el día 02 de enero de 2024, según consta en Acta de posesión No. 009, suscritas por el Doctor RODRIGO VILLALBA MOSQUERA, en su calidad de Gobernador del Departamento del Huila, en ejercicio de las facultades conferidas en el Decreto 1338 de 2004 numeral 3 del artículo 21 y en ejercicio de la competencia otorgada por la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y demás normas reglamentarias, quien se denomina la Entidad Estatal Contratante, por la otra, **HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número No. 79.944.179 de Bogotá D.C., Representante legal del **CONSORCIO CIVIL H&E** con NIT. 901.767.013-6 quien se denominará el Contratista; hemos convenido en celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO N°02,** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1. Que, doce (12) de noviembre de 2024, se reunieron en las oficinas del Instituto Departamental del Deporte, La Recreación, la Educación Física, y el Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila - INDERHUILA, El Ing. **CESAR JOAQUIN VELASQUEZ,** quien actúa en calidad de apoyo a la Supervisión del área de Infraestructura INDERHUILA, el Ing. **HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número No. 79.944.179 de Bogotá C.D, Representante legal del CONSORCIO CIVIL H&E, en calidad de Contratista de Obra y el Señor **FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.711.430, como representante legal de **CONSORCIO WF,** en calidad de Interventor, con el fin de

suscribir la presente ***ACTA DE JUSTIFICACIÓN No. 04 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y CREACIÓN DE ÍTEMS NUEVOS ADICIÓN Y PRORROGA AL*** **CONTRATO DE OBRA No. CLPIH401 DE 2023,** bajo los siguientes términos: A. El día 09 de octubre de 2023 por medio de Resolución No.361 de 2023, se Adjudicó el mencionado proceso de obra cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMANETO DEL HUILA." B. El Contrato de Obra Pública No.CLPIH401 de 2023 celebrado entre el Instituto Departamental Del Deporte, La Educación Física, La Recreación y El Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila - "INDERHUILA" Y CONSORCIO CIVIL H&E fue suscrito el día 2 de noviembre del 2023, por un valor de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 551.483.183) M/CTE. C. El día 16 de noviembre de 2023 se suscribe el acta de inicio del Contrato de Obra Pública No. CLPIH401 de 2023, para dar inicio al proyecto cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMANETO DEL HUILA.". D. El día 26 de diciembre del 2023 se suscribe el Acta de Justificación N°01 y Suspensión N°01 al Contrato de Obra N°CLPIH401 de 2023; por los motivos expuestos en el acta referida.. F. Que el día 24 de septiembre del 2024 se suscribió el Acta de Justificación No.2 y Acta de Reinicio No.1, por los motivos expuestos en el acta referida. G. Que, el día 24 de septiembre de 2024 se suscribe el Acta de Justificación No.2 y Otrosí No.01 modificatorio al Contrato de Obra Pública No. CLPIH401 de 2023 MODIFICACIÓN CLAUSULA 3 PLAZO DEL CONTRATO VIGENCIA FISCAL. H. El día 27 de septiembre de 2024, se lleva a cabo el acta de reunión entre el personal técnico del contratista de obra del Contrato No. CLPIH401 DE 2023, **CONSORCIO CIVIL H&E,** representado legalmente por el ingeniero **HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON,** el personal técnico del interventor del mismo, el ingeniero **FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA** representante legal de **CONSORCIO WF,** y **CESAR JOAQUIN VELASQUEZ,** quien actúa en calidad de apoyo a la Supervisión del área de infraestructura INDERHUILA y de acuerdo a lo cotejado en el terreno y en la revisión conjunta de los planos, (arquitectónicos, eléctricos, aguas lluvias y estructurales) se evidencia la necesidad de ajustar algunas cantidades de obra contratadas de acuerdo a las condiciones encontradas y a las necesidades de las intervenciones a realizar tanto en el proyecto como en el contrato de obra. I. El día 21 de octubre de 2024, se lleva a cabo el acta de reunión, la interventoría y el contratista realizaron el ajuste a las cantidades inicialmente aprobadas de acuerdo a las nuevas condiciones presentadas en el sitio de la obra que enmarcan el proyecto a desarrollar y que hace alusión en la referencia, teniendo en cuenta que, para el proyecto fueron contemplados los recursos necesarios para la ejecución de todo el objeto del contrato de obra N° CLPIH401 de 2023, pero que durante la puesta en marcha del contrato, se pudo verificar que se hace necesario contemplar mayores y menores cantidades de obra y creación de ítems nuevos. J. Por lo tanto, la interventoría y el contratista realizan el ajuste a las cantidades inicialmente aprobadas de acuerdo a las nuevas condiciones presentadas en el sitio de la obra que enmarcan el proyecto a desarrollar y que hace alusión en la referencia, teniendo en cuenta que, para el proyecto fueron contemplados los recursos necesarios para la ejecución de todo el objeto del contrato CLPIH401 DE 2023, pero durante la puesta en marcha del contrato, se pudo verificar que se hace necesario contemplar mayores y menores cantidades de obra, por ende las partes intervinientes consideran que las cantidades del contrato se deben ajustar a las condiciones reales del terreno y de los planos plasmadas en el balance general del contrato del Acta de **MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y CREACION DE ITEM NUEVOS,** siendo las mínimas requeridas y, en todo caso garanticen el cumplimiento en su totalidad del alcance contratado; los cuales son netamente responsabilidad del contratista y la interventoría, quienes las cuantificaron y las constataron en el terreno y en planos. K. Que, el INDERHUILA junto con el apoyo a la supervisión del Contrato de Obra Pública N°CLPIH401 DE 2023, procedió a revisar técnicamente la solicitud elevada por el Contratista de Interventoría, se encontró viable técnica y financieramente llevar a cabo una modificación contractual conforme a la solicitud del representante legal de la CONSORCIO CIVIL H&E, requiriéndose adicionar al valor inicial del contrato la suma de *SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($75.179.357,00) M/CTE,* y prorrogar por *UN (1) MES* más al plazo de ejecución inicialmente previsto en el contrato, esto con el propósito de garantizar la finalidad que persigue el mismo. L Que a la fecha, el Contrato de Obra Pública N°CLPIH401 DE 2023 tiene un avance y ejecución aproximada del 25 %, respecto del 100% de las actividades pactadas en el anexo técnico de acuerdo al certificado de cumplimiento suscrito por la interventoría el día 31 de octubre del 2024, y que una vez revisado el proyecto se hace necesario continuar y dar terminación al objeto contractual, evidenciándose la necesidad de suscribir la presente ***ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.04 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y CREACIÓN DE ITEM NUEVOS, ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE OBRA*** **No.CLPIH401 DE 2023,** considerándose técnica y financieramente conveniente realizar la adición de recursos solicitados y prorrogar el plazo contractual por *UN (1) MES* más, que permita superar cualquier reparo en la ejecución del cronograma de obra dentro de los términos establecidos que conlleve el retraso en el avance del

proyecto. M. Que debido a los argumentos que asocian a la presente acta se evidencia la necesidad de un ajuste técnico del contrato de obra CLPIH401 DE 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMANETO DEL HUILA" según el balance de Mayores y Menores Cantidades de obra y creación de ítems nuevos. N. Que, atendiendo a la solicitud de la interventoría, el INDERHUILA junto con el apoyo a la supervisión del contrato de interventoría, procedió a revisar la solicitud elevada por el CONTRATISTA, encontrando viable técnicamente y financieramente la presente modificación contractual, por lo que, se procederá a suscribir el **OTROSÍ MODIFICATORIO N°02** al Contrato de Obra N°CLPIH401 de 2023, modificándose la **Cláusula 2 –OBJETO-ALCANCE DEL OBJETO-** en sentido de que el contratista de obra deberá desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en el proceso de contratación LPIH018-2023 y en la presente acta de justificación; **Cláusula 3 –PLAZO DEL CONTRATO-**, prorrogándose el plazo de ejecución en *UN (1) MES* MÁS, **Cláusula 4 –VALOR DEL CONTRATO-**, adicionándose en ***SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($75.179.357,00) M/CTE.***, **Cláusula 6 –APROPIACIÓN PRESUPUESTAL-** y **Cláusula 17 –GARANTÍAS-**. Ñ Que el ajuste de mayores y menores cantidades de obra se requiere a razón de garantizar el cumplimiento contractual y al alcance del proyecto, garantizando la terminación, la calidad y estabilidad de la obra durante el desarrollo de la misma. Adicional en la revisión de los planos suministrados por la entidad y la visita de campo se evidenció que se requiere de ítems que no están contemplados en las condiciones originales del contrato, y que se deben ejecutar para poder cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por el proyecto. Estas razones se encuentran soportadas, descritas y detalladas en los documentos adjuntos a la presente Acta (Acta de mayores y menores, memorias de cantidades, análisis de precios unitarios – APUS de ítem no previsto con cotizaciones, acta de comité de obra), revisados y avalados por la interventoría. O. El contratista realizará los respectivos ajustes a las pólizas, bajo sus costas, una vez se suscriba el otrosí modificatorio de los contratos. P. Que de conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas reglamentarias resulta procedente la presente modificación. Q. Se adjuntan los siguientes documentos soporte de la presente acta de Justificación No. 4: Acta de Mayores y menores cantidades de obra y creación de ítem nuevos (Formato DIH-CGID-F96), Memorias de cantidades (Formato DIH-CGID-F95), Apus - ítems no previstos y cotizaciones soporte, Acta de comité de obra, Oficio de contratista de obra, Oficio de contratista interventoría **2.** Por lo anterior, las partes celebran el presente **Otrosí Modificatorio No.02**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁSULA PRIMERA:** Modifíquese la **CLÁUSULA 2. OBJETO-ALCANCE DEL OBJETO** del **CONTRATO DE OBRA N°CLPIH401 DE 2023** conforme las razones expuestas en el **Acta de Justificación N°04**, la cual quedará así: **"CLÁUSULA 2. OBJETO-ALCANCE DEL OBJETO:** El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación, los cuales hacen parte integral del Contrato. El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial y al **ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.04 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y CREACIÓN DE ÍTEMS NUEVOS ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA No. CLPIH401 DE 2023**, Memoria de cálculo que soporta el ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIADES DE OBRA Y CREACION DE ITEM NUEVOS, Análisis de precios unitarios – Ítems no Previsto, Cotizaciones soporte, Oficio de contratista de obra, Oficio de contratista interventoría). El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. **CLÁUSULA SEGUNDA:** Modifíquese la **CLÁUSULA 3. PLAZO DEL CONTRATO**, conforme las razones expuestas en el **Acta de Justificación N°04**, la cual quedará así: "El plazo estimado para la ejecución del contrato será de **CUATRO (04) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones, sin superar la vigencia fiscal 2024. **CLÁUSULA TERCERA:** Modifíquese la **CLÁUSULA 4. VALOR DEL CONTRATO**, conforme las razones expuestas en el **Acta de Justificación N°04**, en el sentido de adicionar al Contrato de Obra N°CLPIH401 de 2023, la suma de ***SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($ 75.179.357,00) M/CTE.***, al valor inicialmente pactado, registrando un valor total de **SEISCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS ($ 626.662.540) M/CTE.** El Contratista, con la suscripción del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el Contrato. **CLÁUSULA CUARTA:**

INDERHUILA

NIT 813.005.570-7

OTROSÍ MODIFICATORIO No.02 AL CONTRATO DE OBRA N°CLPIH401 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO CIVIL H&E

Modifíquese la **CLÁUSULA 6. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL,** conforme las razones expuestas, la cual quedará así: El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.2024000488 del 30 de septiembre del 2024, con el Rubro- 2.3.2.02.02.005, Denominado Construcción y Servicios de la construcción - Fuente: 141247 Tasa al deporte y recreación,. De igual manera, la entidad adicionará al Contrato de Obra N°CLPIH401 de 2023, la suma de ***SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($ 75.179.357,00) M/CTE.***, recursos que se encuentran soportados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.2024000640 del 12 de noviembre de 2024, con el Rubro 2.3.2.02.02.005, Denominado Construcción y Servicios de la Construcción - Proyecto: 2023004410190 – Apoyo a la construcción y mejoramiento de escenarios deportivos nuevos y existentes en el departamento del Huila - Fuente: 141245-R.B Estampilla Pro-desarrollo Departamental. **CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA** deberá ampliar las garantías otorgadas conforme a los numerales 17.1, 18.1 y 18.2 de la **Cláusula 17** denominada **-GARANTÍAS-** del contrato principal, que ampare los riesgos en los que pueda verse inmiscuido el INDERHUILA, dentro de la ejecución de las actividades propias dentro del objeto de este contrato desarrollado por **CONSORCIO CIVIL H&E,** con ocasión a la presente modificación. Estas garantías deberán reunir los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, y presentarse a favor del INDERHUILA dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción del presente otrosí los certificados de modificación de las garantías exigidas en los que conste el ajuste de la vigencia o del valor asegurado de cada uno de los amparos. **CLÁUSULA SEXTA:** Hace parte integral del OTROSÍ el **Acta de Justificación N°04** para modificar el **CONTRATO DE OBRA N°CLPIH401 DE 2023. CLÁUSUA SÉPTIMA:** El contratista deberá cancelar los gastos de legalización correspondiente al pago de derechos de contratación. **CLÁUSUA OCTAVA:** El contratista con la suscripción del presente documento renuncia expresamente a todo tipo de reclamaciones Judiciales o Extrajudiciales en virtud de presente otrosí. **CLÁUSUA NOVENA:** Las cláusulas del contrato principal que no han sido modificadas, continúan vigentes. El presente documento se firma en la ciudad de Neiva ***a los doce (12) días del mes de noviembre de 2024.***

FELIPE VICTORIA BARRAGÁN
Director INDERHUILA

Vo. Bo.
JAIME ENRIQUE JIMÉNEZ LÓPEZ
Asesor Jurídico Externo

Proyectó:
JESUS ANTONIO POLO SOTTO
Abogado - Contratista

CONSORCIO CIVIL H&E
R.L. HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON
CONTRATISTA OBRA

Consorcio Civil H&E
NIT. 901.767.013-6

RELACION DE GASTO DE ANTICIPO

Dirección: Cra. 3 w N. 64-37 Barrio Chicalá
Email: consorciocivilheinder@gmail.com
Teléfonos: 3187167087
Ciudad: Neiva Huila

ANTICIPO			
RELACION DE GASTOS			
NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
FEVE8030	CARLOS FERNADO VARGAS TOVAR	MATERIALES	$ 14.185.588,24
ABONO	CARLOS FERNADO VARGAS TOVAR	MATERIALES	$ 39.375.029,76
FEM1625	FERREAGRO	MATERIALES	$ 8.803.858,00
CUENTA DE COBRO	HERNAN JOSE TRUJILLO	MANO DE OBRA	$ 20.680.619,00
CUENTA DE COBRO	OSCAR ANDRES MARTINEZ	TRANSPORTE	$ 4.136.124,00
			$ 87.181.219,00

FERREAGRO JJ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° FEM1625

HENRY BARRERA VARGAS
Nit : 12240102-6
Dirección:CAR 3 # 8 - 33 HUILA - TIMANA
Correo :
henrybarreravargas@hotmail.com
Teléfono : 3108337055 -
Responsable de IVA.
Vendedor: HENRY BARRERA

fecha 2024-10-31 18:14:01

Autorización de numeración DIAN N° 18762407385475O prefijo FEM desde la 1001 hasta 100000 vigencia del 2024-06-27 hasta el 2026-06-27

Fecha de emision :	**2024-10-31 18:13:51**		
Cliente :	**CONSORCIO CIVIL**	**Pago :**	**Contado - Efectivo**
NIT :	**901767013 - 6**	**Correo :**	**hernantrujillo@hotmail.com**
Dirección :	**CR 3 W 64 37 BRR CHICALA Huila - Neiva**	**Telefono :**	**3187167087**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Imp	Val Imp	Total Neto
1	1726074313517	ROLLO PLASTICO NEGRO C-6 X 6 METROS DE ANCHO	1.00	620,000.00	521,008.40	19.0%	98,991.60	620,000.00
2	3036	MANGUERA NIVEL 5/16 POR METRO	15.00	1,500.00	1,260.50	19.0%	3,592.44	22,500.00
3	4028	CARRETA 2000 90 LITROS LLANTA ANTIPINCHAZO NARANJA	2.00	260,000.00	218,487.39	19.0%	83,025.21	520,000.00
4	80184	PUNTILLA DE 21/2 PROALCO POR 400 GRAMOS	7.00	4,000.00	3,361.34	19.0%	4,470.59	28,000.00
5	75811106	LIMA TRIANGULAR 6 M	1.00	5,000.00	4,201.68	19.0%	798.32	5,000.00
6	1578	CANDADI IDEASE GATO 63MM	1.00	25,000.00	21,008.40	19.0%	3,991.60	25,000.00
7	104173	SOLDADURA PVC 1/256 TUBECO	1.00	3,000.00	2,521.01	19.0%	478.99	3,000.00
8	80162	ACOPLE MANGUERA	1.00	2,000.00	2,000.00	Exe...	0	2,000.00
9	80365	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 GERFOR	2.00	600.00	504.20	19.0%	191.60	1,200.00
10	01190115	LLAVE JARDIN PLASTICA BLANCA GRICOL	1.00	8,000.00	6,722.69	19.0%	1,277.31	8,000.00
11	1576	SIERRA MINERAL ALEMAN ROJA	1.00	8,000.00	6,722.69	19.0%	1,277.31	8,000.00
12	5069	DISCOS DE CORTE DE HIERRO DE 7 DE WALT	4.00	8,000.00	6,722.69	19.0%	5,109.24	32,000.00
13	80197	DISCO CORTE DE CONCRETO 7	1.00	20,000.00	16,806.72	19.0%	3,193.28	20,000.00
14	80395	GAFAS DE SEGURIDAD HERRAGRO	2.00	8,000.00	6,722.69	19.0%	2,554.62	16,000.00
15	7021377	GUANTE ANTICORTE NIVEL 5 ALTA CALIDAD TALLA 9	2.00	20,000.00	16,806.72	19.0%	6,386.55	40,000.00
16	4023	PALA # 2 CON CABO HERRAGRO	2.00	35,000.00	33,333.33	5.0%	3,333.33	70,000.00
17	4025	ZAPAPICO 5 LIBRAS CON CABO 3105	2.00	60,000.00	57,142.86	5.0%	5,714.29	120,000.00
18	200224	ALMADANA HERRAGRO 4 LIBRAS	1.00	35,000.00	29,411.76	19.0%	5,588.24	35,000.00
19	5060	PUNTILLA ACERO VERTICAL 3 CAJA C A Y MEJIA	1.00	9,000.00	7,563.03	19.0%	1,436.97	9,000.00
20	7025	MARTILLO PULIDO 32MM HERRAGRO	1.00	28,000.00	23,529.41	19.0%	4,470.59	28,000.00
21	80155	BARRAS 18 LIBRAS HERRAGRO	1.00	110,000.00	104,761.90	5.0%	5,238.10	110,000.00
22	80137	FLEXOMETRO DE 8 METROS LUFKIN	1.00	28,000.00	23,529.41	19.0%	4,470.59	28,000.00
23	6952632325638	NIVEL SIMBRA IMP 0373	1.00	9,000.00	7,563.03	19.0%	1,436.97	9,000.00
24	4035	MACHETE GUADUERO GAVILAN	1.00	18,000.00	17,142.86	5.0%	857.14	18,000.00
25	1780	NYLON 90 LIBRAS DUKE TRANSPARENTE	2.00	8,000.00	6,722.69	19.0%	2,554.62	16,000.00
26	200201	ESCUADRA HERRAGRO 12	1.00	18,000.00	15,126.05	19.0%	2,873.95	18,000.00
27	5003	BARRA CORRUGADA DE 1/2 X 6 METROS	36.00	24,500.00	20,588.24	19.0%	140,823.53	882,000.00

FERREAGRO JJ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° FEM1625

HENRY BARRERA VARGAS
Nit : 12240102-6
Dirección:CAR 3 # 8 - 33 HUILA - TIMANA
Correo : henrybarreravargas@hotmail.com
Teléfono : 3108337055 -
Responsable de IVA.
Vendedor: HENRY BARRERA

fecha 2024-10-31 18:14:01

Autorización de numeración DIAN N° 18764073854750 prefijo FEM desde la 1001 hasta 100000 vigencia, del 2024-06-27 hasta el 2026-06-27

Fecha de emision :	**2024-10-31 18:13:51**		
Cliente :	**CONSORCIO CIVIL**	**Pago :**	**Contado - Efectivo**
NIT :	**901767013 - 6**	**Correo :**	**hernantrujillo@hotmail.com**
Dirección :	**CR 3 W 64 37 BRR CHICALA Huila - Neiva**	**Telefono :**	**3187167087**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Imp	Val Imp	Total Neto
28	1001	CEMENTO CEMEX USO GENERAL X 50	200.00	31,500.00	26,470.59	19.0%	1,005,882.35	6,300,000.00

Comentarios:

ITEMS	**28 de 28**
SUBTOTAL BRUTO	**7,593,680.67**
IVA 5.0 %	**15,142.86**
IVA 19.0 %	**1,384,876.47**
TOTAL IMPUESTOS	**1,400,019.33**
Concepto, COMPRAS GENERALES 2.5 %	**189,842.02**
TOTAL FACTURA:	**8,803,857.98**

Valor en Letras : Ocho millones ochocientos tres mil ochocientos cincuenta y siete con noventa y ocho pesos.

Cufe: 5e6efee8dc656c210925bf728ab51e67a528c365914f7024ce1f6c6aae09d8ae8b5b6c485c4fbabcaff4e049c77a4255

Términos y condiciones

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta elComprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141114412191

(415)7707212489984(8020) 000014111441219 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 2 2 4 0 1 0 2	6	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 2 4 0 1 0 2	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Huila 4 1	Pitalito 5 5 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BARRERA	VARGAS	HENRY	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
FERREAGRO JJ	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Timaná 8 0 7

41. Dirección principal: CR 3 8 33

42. Correo electrónico: henrybarreravargas@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 8 3 3 7 0 5 5	3 2 0 7 2 0 6 1 2 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	2 0 2 1 1 1 2 2	4 6 6 4	2 0 2 2 0 2 0 3		4 9 2 3			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	4 8	5 2																						

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

07- Retención en la fuente a título de rent

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 08 - 13 / 11 : 40: 54

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BARRERA VARGAS HENRY

985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141114412191

(415)7707212489984(8020) 000014111441219 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 2 2 4 0 1 0 2	6	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 7 0 9 1 2	
77. No. Matrícula mercantil	7 2 1 6 3 3 - 1	
78. Departamento	7 6	
79. Ciudad/Municipio	8	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141114412191

(415)7707212489984(8020) 000014111441219 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 2 2 4 0 1 0 2	6	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 5 1 9 7 2 7 5	4	1 7 9 8 9 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
DIAZ	CLAROS	LAURA	CATALINA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 1 0 1

COPIA CONTROLADA DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141114412191

(415)7707212489984(8020) 000014111441219 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 2 2 4 0 1 0 2	6	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2	
162. Nombre del establecimiento: FERREAGRO JJ		
163. Departamento: Huila 4 1	164. Ciudad/Municipio: Timaná 8 0 7	
165. Dirección: CR 3 8 33		
166. Número de matrícula mercantil: 3 6 4 4 4 9	167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 2 1 1 1 2 2	
168. Teléfono: 3 1 0 8 3 3 7 0 5 5	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO ORIGINAL

Certificado
Bancario

Jueves, 19 de mayo de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que HENRY BARRERA VARGAS identificado(a) con CC 12240102, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	45300003075	2022/02/14	ACTIVA
CUENTA CORRIENTE	45300003075	2022/02/14	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Bancolombia

BODEGA Y ALMACEN VARGAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° E8030

CARLOS FERNANDO VARGAS TOVAR
Nit : 79461196-1
Dirección:CLL 10 # 10-17 HUILA - PITALITO
Correo : cafev68@gmail.com
Teléfono : 8366406 - 8365865
Responsable de IVA.
Vendedor: Nirza Hurtado

fecha 2024-10-23 10:39:44

Autorizacion de numeración DIAN N° 18764079097226 prefijo E desde la 7725 hasta 20000 Vigencia: del 2024-09-09 hasta el 2025-03-09

Fecha de emision :	**2024-10-23 10:39:40**	**Vencimiento**	**2024-11-23**
Cliente :	**CONSORCIO CIVIL H&E**	**Pago :**	**Crédito - Credito**
NIT :	**901767013 - 6**	**Correo :**	**hernantrujillo@hotmail.com**
Dirección :	**CRA 3 W 64-37 Huila - Neiva**	**Telefono :**	**3187167087**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Imp	Val Imp	Total Neto
1	17	VARILLA DE 5/8	300.00	37,800.00	31,764.71	19.0%	1,810,588.24	11,340,000.00
2	01	CEMENTO GRIS CEMEX USO GENERAL X5	100.00	31,500.00	26,470.59	19.0%	502,941.18	3,150,000.00

Comentarios:

ITEMS	**2 de 2**
SUBTOTAL BRUTO	**12,176,470.59**
IVA 19 %	**2,313,529.41**
TOTAL IMPUESTOS	**2,313,529.41**
Concepto, COMPRAS GENERALES 2.5 %	**304,411.76**
ABONO	**0.00**
EN MORA	**14,185,588.24**
TOTAL FACTURA:	**14,185,588.24**

Firma Elaborado

Firma Recibido

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA RESOLUCIÓN DE 20184100092807 DE 31-10-2018

Valor en Letras : Catorce millones ciento ochenta y cinco mil quinientos ochenta y ocho con venticuatro pesos.

Cufe: bb511bb63df213c5470bad9a001c74de54f9e6f7d70649b6e55c3219756fec6b61d833e4ee92e911d1058263cbb51caa

Términos y condiciones

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta elComprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.

Actividad Económica ICA 4219 6.000X1.000 Según resolución no.4219 del 27 de Diciembre del 2023, somos AUTORRETENEDORES del impuesto de Industria y Comercio en la ciudad de PITALITO-HUILA, Favor abstenerse de practicar retención de ICA.

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1

ALMACEN VARGAS
NIT : 79.461.196.1

BODEGA Y ALMACEN VARGAS

CARLOS FERNANDO VARGAS TOVAR
Nit : 79461196-1
Dirección:CLL 10 # 10-17 HUILA - PITALITO
Correo : cafev68@gmail.com
Teléfono : 8366406 - 8365865
Responsable de IVA.
Vendedor: Gloria Rivera

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° E8136

fecha 2024-11-06 13:12:04

Autorización de numeración DIAN N° 18764079097226 prefijo E desde la 7725 hasta 20000 Vigencia, del 2024-09-09 hasta el 2026-03-09

Fecha de emision :	**2024-11-06 13:12:01**	**Vencimiento**	**2024-11-08**
Cliente :	**CONSORCIO CIVIL H&E**	**Pago :**	**Crédito - Credito**
NIT :	**901767013 - 6**	**Correo :**	**hernantrujillo@hotmail.com**
Dirección :	**CRA 3 W 64-37 Huila - Neiva**	**Telefono :**	**3187167087**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Imp	Val Imp	Total Neto
1	16	VARILLA DE 1/2	105.00	25,300.00	21,260.50	19.0%	424,147.06	2,656,500.00
2	15	VARILLA DE 12	268.00	23,000.00	19,327.73	19.0%	984,168.07	6,164,000.00
3	1287	ALAMBRE NEGRO	222.50	6,702.00	5,631.93	19.0%	238,089.96	1,491,195.00
4	12	VARILLA DE 3/8	157.00	15,000.00	12,605.04	19.0%	376,008.40	2,355,000.00
5	17	VARILLA DE 5/8	354.00	37,800.00	31,764.71	19.0%	2,136,494.12	13,381,200.00
6	01	CEMENTO GRIS CEMEX USO GENERAL X5	450.00	31,500.00	26,470.59	19.0%	2,263,235.29	14,175,000.00

Comentarios:

ITEMS	**6 de 6**
SUBTOTAL BRUTO	**33,800,752.10**
IVA 19 %	**6,422,142.90**
TOTAL IMPUESTOS	**6,422,142.90**
Concepto, COMPRAS GENERALES 2.5 %	**845,018.80**
ABONO	**0.00**
EN MORA	**39,377,876.20**
TOTAL FACTURA:	**39,377,876.20**

Firma Elaborado

Firma Recibido

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA RESOLUCIÓN DE 20184100092807 DE 31-10-2018

Valor en Letras : Treinta y nueve millones trescientos setenta y siete mil ochocientos setenta y seis pesos.

Cufe: 3c1402bc91786c904535e530fd3f77072ebf9eed6b9de30f8262b066c9c12c33cea56f7549c72d5ba45901441e72ff66

Términos y condiciones

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta elComprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.

Actividad Económica ICA 4219 6.000X1.000 Según resolución no.4219 del 27 de Diciembre del 2023, somos AUTORRETENEDORES del impuesto de Industria y Comercio en la ciudad de PITALITO-HUILA, Favor abstenerse de practicar retención de ICA.

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14974662517

(415)7707212489984(8020) 000001497466251 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 4 6 1 1 9 6	1	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	79461196	1 9 8 6 1 0 3 1

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VARGAS	TOVAR	CARLOS	FERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
BODEGA Y ALMACÉN VARGAS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Pitalito 5 5 1

41. Dirección principal: CL 10 10 17

42. Correo electrónico: cafev68@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
8	8 3 6 6 4 0 6	8 3 6 5 8 6 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	1 9 9 7 0 5 3 0	4 6 5 3	2 0 1 2 0 7 1 3	4 9 2 3			1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 4 2 2 3 3 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 23 / 11 : 37: 54

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VARGAS TOVAR CARLOS FERNANDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO GENERADO EN LA PÁGINA WEB DE LA DIAN

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14974662517

(415)7707212489984(8020) 000001497466251 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 4 6 1 1 9 6	1	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	1 9 9 7 0 5 3 0	
77. No. Matrícula mercantil	8 3 1 4 9	
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	5 5 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CONTROLADA DOCUMENTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14974662517

(415)7707212489984(8020) 000001497466251 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 4 6 1 1 9 6	1	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 6 2 7 2 6 4 1		2 4 5 8 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
VALDERRAMA	YAGUE	GABRIELA	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 0 6 0 8 2 4

COPIA CONTROLADA DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14974662517

(415)7707212489984(8020) 000001497466251 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2	

162. Nombre del establecimiento: BODEGA Y ALMACEN VARGAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Huila 4 1	Pitalito 5 5 1	

165. Dirección: CL 10 10 17

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 3 2 7 9 9	2 0 1 2 0 7 1 3	
168. Teléfono: 8 3 6 6 4 0 6	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

DOCUMENTO GENERADO POR EL RUT

Certificado
Bancario

Miércoles, 7 de septiembre de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CARLOS FERNANDO VARGAS TOVAR identificado(a) con CC 79461196, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	45344420709	1994/04/06	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Neiva, 1 de noviembre de 2024

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT. 901.767.013-6

DEBE A:

HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON
C.C. 79.944.179 de Bogotá D.C.

La suma de: Veinte millones seiscientos ochenta mil seiscientos diecinueve mcte (**$20.680.619.oo**)

Por concepto de: Abono a contrato por mano de obra para "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Atentamente,

HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON
C.C. 79.944.179 de Bogotá D.C.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14969556284

(415)7707212489984(8020) 000001496955628 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 9 4 4 1 7 9	8	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	79944179	1 9 9 5 1 0 1 8

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TRUJILLO	CALDERON	HERNAN	JOSE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal: CR 3 W 64 37

42. Correo electrónico: hernantrujillo@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 7 1 6 7 0 8 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	
4 2 9 0	2 0 0 4 0 2 2 4	7 1 1 2	2 0 0 4 0 2 2 4	4 9 2 3	8 2 9 9	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	1	4	2	2	4	2	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 12 - 28 / 15 : 13: 03

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TRUJILLO CALDERON HERNAN JOSE

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Documento generado en el SIC

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14969556284

(415)7707212489984(8020) 00001496955628 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
7 9 9 4 4 1 7 9		Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CONTROLADA DOCUMENTO SIN VALIDEZ

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 3 de 3 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14969556284

(415)7707212489984(8020) 000001496955628 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
7 9 9 4 4 1 7 9		Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 1 3 0 8 6 1 9		1 4 0 4 0 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GARCIA	RIASCOS	BEATRIZ	STELLA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 0 1 0 2

COPIA DOCUMENTO CONTROLADO

Certificado
Bancario

Sábado, 2 de marzo de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON identificado(a) con CC 79944179, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	94152982784	2015/12/30	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Neiva, 1 de noviembre de 2024

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT. 901.767.013-6

DEBE A:

OSCAR ANDRES MARTINEZ MURCIA
C.C. 7.723.082 de Neiva - H.

La suma de: Cuatro millones ciento treinta y seis mil ciento veinticuatro pesos mcte (**$4.136.124.oo**)

Por concepto de: Transporte de materiales para "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Atentamente,

OSCAR ANDRES MARTINEZ MURCIA
C.C. 7.723.082 de Neiva - H.

Dirección: Cra. 3 w N. 64-37 Barrio Chicalá
Email: consorciocivilheinder@gmail.com
Teléfonos: 3187167087
Ciudad: Neiva Huila

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141142018755

(415)7707212489984(8020) 000014114201875 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
7 7 2 3 0 8 2	2	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 7 2 3 0 8 2	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MARTINEZ	MURCIA	OSCAR	ANDRES

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal: CL 42 C 1 W 33 BRR ACROPOLIS

42. Correo electrónico: oscar83_1@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 8 8 4 2 2 9 0 0	3 1 3 3 2 2 3 3 5 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 9 0	2 0 1 7 0 7 0 1	2 5 1 1	2 0 0 6 0 1 2 3	4 9 2 3		1 3 1 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 11 - 06 / 13 : 23: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MARTINEZ MURCIA OSCAR ANDRES

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 06-11-2024 01:26:28PM

Certificación Bancaria

Bancolombia

Martes, 20 de junio de 2023

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **OSCAR ANDRES MARTINEZ MURCIA** identificado(a) con cc. **7723082** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	131-332233-50	2019/02/11	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14

Dorian Gutierrez Correa
Gerente Corresponsales Bancarios y Autoservicios

Consorcio Civil H&E
NIT. 901.767.013-6

RELACION DE GASTO DE ANTICIPO

Dirección: Cra. 3 w N. 64-37 Barrio Chicalá
Email: consorciocivilheinder@gmail.com
Teléfonos: 3187167087
Ciudad: Neiva Huila

ALMACEN VARGAS

NIT : 79.461.196-1

BODEGA Y ALMACEN VARGAS

CARLOS FERNANDO VARGAS TOVAR
Nit : 79461196-1
Dirección:CLL 10 # 10-17 HUILA - PITALITO
Correo : cafev68@gmail.com
Teléfono : 8366406 - 8365865
Responsable de IVA.
Vendedor: CARLOS FERNANDO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° E8228

fecha 2024-11-16 09:25:38

Autorización de numeración DIAN N° 18764079097226 prefijo E desde la 7725 hasta 20000 vigencia, del 2024-09-09 hasta el 2025-03-09

Fecha de emision :	2024-11-16 09:25:36	**Vencimiento**	2024-12-07
Cliente :	CONSORCIO CIVIL H&E	**Pago :**	Crédito - Credito
NIT :	901767013 - 6	**Correo :**	hernantrujillo@hotmail.com
Dirección :	CRA 3 W 64-37 Huila - Neiva	**Telefono :**	3187167087

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Imp	Val Imp	Total Neto
1	1287	ALAMBRE NEGRO	93.00	6,702.00	5,631.93	19.0%	99,516.25	623,286.00
2	15	VARILLA DE 12	282.00	23,000.00	19,327.73	19.0%	1,035,579.83	6,486,000.00
3	17	VARILLA DE 5/8	100.00	37,800.00	31,764.71	19.0%	603,529.41	3,780,000.00
4	16	VARILLA DE 1/2	300.00	25,300.00	21,260.50	19.0%	1,211,848.74	7,590,000.00
5	01	CEMENTO GRIS CEMEX USO GENERAL X5	280.00	31,500.00	26,470.59	19.0%	1,408,235.29	8,820,000.00

Comentarios:

ITEMS	**5 de 5**
SUBTOTAL BRUTO	**22,940,576.47**
IVA 19 %	**4,358,709.53**
TOTAL IMPUESTOS	**4,358,709.53**
Concepto, COMPRAS GENERALES 2.5 %	**573,514.41**
ABONO	**0.00**
EN MORA	**26,725,771.59**
TOTAL FACTURA:	**26,725,771.59**

Firma Elaborado

Firma Recibido

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA RESOLUCIÓN DE 20184100092807 DE 31-10-2018

Valor en Letras : Ventiseis millones setecientos venticinco mil setecientos setenta y un pesos.

Cufe: ebec1b3ade31d953a61b844cb39d54247bb4cb448940d1d465d36eadae9021fe5b6d53fa46ca612b08a36f8c6f233bea

Términos y condiciones

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta elComprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este título.

Actividad Económica ICA 4219 6.000X1.000 Según resolución no.4219 del 27 de Diciembre del 2023, somos AUTORRETENEDORES del impuesto de Industria y Comercio en la ciudad de PITALITO-HUILA, Favor abstenerse de practicar retención de ICA.

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14974662517

(415)7707212489984(8020) 000001497466251 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 4 6 1 1 9 6	1	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 4 6 1 1 9 6	1 9 8 6 1 0 3 1

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VARGAS	TOVAR	CARLOS	FERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
BODEGA Y ALMACÉN VARGAS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Pitalito 5 5 1

41. Dirección principal: CL 10 10 17

42. Correo electrónico: cafev68@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
8	8 3 6 6 4 0 6	8 3 6 5 8 6 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	1 9 9 7 0 5 3 0	4 6 5 3	2 0 1 2 0 7 1 3	4 9 2 3			1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	2	2	3	3	4	2	4	8	5	2												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2024 - 01 - 23 / 11 : 37: 54

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: VARGAS TOVAR CARLOS FERNANDO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA NO VALIDA PARA TRAMITES
DOCUMENTO SIN VALIDEZ

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14974662517

(415)7707212489984(8020) 000001497466251 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 4 6 1 1 9 6	1	Impuestos y Aduanas de Neiva	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	1 9 9 7 0 5 3 0	
77. No. Matrícula mercantil	8 3 1 4 9	
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	5 5 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

86. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14974662517

(415)7707212489984(8020) 000001497466251 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
7 9 4 6 1 1 9 6	1	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 6 2 7 2 6 4 1		2 4 5 8 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
VALDERRAMA	YAGUE	GABRIELA	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 0 6 0 8 2 4

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14974662517

(415)7707212489984(8020) 000001497466251 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2	

162. Nombre del establecimiento: BODEGA Y ALMACEN VARGAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Huila 4 1	Pitalito 5 5 1	

165. Dirección: CL 10 10 17

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 3 2 7 9 9	2 0 1 2 0 7 1 3	
168. Teléfono: 8 3 6 6 4 0 6	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

Certificado
Bancario

Miércoles, 7 de septiembre de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CARLOS FERNANDO VARGAS TOVAR identificado(a) con CC 79461196, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	45344420709	1994/04/06	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Neiva, 18 de noviembre de 2024

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT. 901.767.013-6

DEBE A:

HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON
C.C. 79.944.179 de Bogotá D.C.

La suma de: Trece millones setecientos ochenta y siete mil ochenta pesos mcte (**$13.787.080.oo**)

Por concepto de: Abono a contrato por mano de obra para "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Atentamente,

HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON
C.C. 79.944.179 de Bogotá D.C.

Dirección: Cra. 3 w N. 64-37 Barrio Chicalá
Email: consorciocivilheinder@gmail.com
Teléfonos: 3187167087
Ciudad: Neiva Huila

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14969556284

(415)7707212489984(8020) 000001496955628 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 9 4 4 1 7 9	8	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	79944179	1 9 9 5 1 0 1 8

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TRUJILLO	CALDERON	HERNAN	JOSE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal: CR 3 W 64 37

42. Correo electrónico: hernantrujillo@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 7 1 6 7 0 8 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 4 0 2 2 4	7 1 1 2	2 0 0 4 0 2 2 4		4 9 2 3	8 2 9 9	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 1 4 2 2 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

14- Informante de exogena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 12 - 28 / 15 : 13: 03

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TRUJILLO CALDERON HERNAN JOSE

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 27-03-2024 08:34:20AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 3 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14969556284

(415)7707212489984(8020) 000001496955628 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 9 4 4 1 7 9		Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14969556284

(415)7707212489984(8020) 000001496955628 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
7 9 9 4 4 1 7 9		Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de Identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 1 3 0 8 6 1 9		1 4 0 4 0 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GARCIA	RIASCOS	BEATRIZ	STELLA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 0 1 0 2

Certificado
Bancario

Sábado, 2 de marzo de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON identificado(a) con CC 79944179, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	94152982784	2015/12/30	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Consorcio Civil H&E
NIT. 901.767.013-6

Neiva, 18 de noviembre de 2024

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT. 901.767.013-6

DEBE A:

OSCAR ANDRES MARTINEZ MURCIA
C.C. 7.723.082 de Neiva – H.

La suma de: Dos millones setecientos cincuenta y siete mil cuatrocientos dieciséis pesos mcte ($2.757.416.oo)

Por concepto de: Transporte de materiales para "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Atentamente,

Oscar Andres Martinez.

OSCAR ANDRES MARTINEZ MURCIA
C.C. 7.723.082 de Neiva – H.

Dirección: Cra. 3 w N. 64-37 Barrio Chicalá
Email: consorciocivilheinder@gmail.com
Teléfonos: 3187167087
Ciudad: Neiva Huila

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141142018755

(415)7707212489984(8020) 000014114201875 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 7 2 3 0 8 2	2	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 7 2 3 0 8 2	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MARTINEZ	MURCIA	OSCAR	ANDRES

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal: CL 42 C 1 W 33 BRR ACROPOLIS

42. Correo electrónico: oscar83_1@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 8 8 4 2 2 9 0 0	3 1 3 3 2 2 3 3 5 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 9 0	2 0 1 7 0 7 0 1	2 5 1 1	2 0 0 6 0 1 2 3	4 9 2 3			1 3 1 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																								

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 11 - 06 / 13 : 23: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MARTINEZ MURCIA OSCAR ANDRES

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CONTROLADA DOCUMENTO SIN VALIDEZ

Fecha generación documento PDF: 06-11-2024 01:26:28PM

Certificación Bancaria

Bancolombia

Martes, 20 de junio de 2023


Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **OSCAR ANDRES MARTINEZ MURCIA** identificado(a) con cc. **7723082** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	131-332233-50	2019/02/11	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Darian Gutiérrez Correa
Gerente Corresponsales Bancarios y Autoservicios

VIGILADO

Consorcio Civil H&E
NIT. 901.767.013-6

POLIZAS

Dirección: Cra. 3 w N. 64-37 Barrio Chicalá
Email: consorciocivilheinder@gmail.com
Teléfonos: 3187167087
Ciudad: Neiva Huila

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101051701	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	11	2024	16	11	2023	00:00	20	12	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CIVIL H&E	NIT: 901.767.013-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 3W NRO. 64 - 37	NEIVA, HUILA	3187167087

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INDERHUILA	NIT: 813.005.578-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 18 CALLE 17 UNIDAD DEPORTIVA PISO 2	NEIVA, HUILA	8750431

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO CLPIH401-2023 RELACIONADA CON LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA
VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA CONTRA EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE ESPECIALMENTE LA DE CELEBRAR EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES DE ADJUDICACION.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD ESTARA VIGENTE POR EL TERMINO DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION DEL CONTRATANTE

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/11/2023	20/06/2025	$62,666,260.00	$62,666,260.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	16/11/2023	02/06/2025	$156,665,650.00	$156,665,650.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/11/2023	20/12/2027	$31,333,130.00	$31,333,130.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS *		$62,666,260.00	$62,666,260.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO OBJETO DE LA MODIFICACION
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTROSI MODIFICATORIO NO.2 DE FECHA 12/11/2024, SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PARA UN PLAZO TOTAL DEL CONTRATO DE 4 MESES, Y SE ADICIONA LA SUMA DE $75.179.357 PARA UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE $626.662.540, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******30,998.00	$ *******8,000.00	$ *******7,409.00	$ **********46,407.00	$ ******313,331,300.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LOB ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA	38679	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-44-101051701

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101051701	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	11	2024	16	11	2023	00:00	20	12	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO CIVIL H&E			NIT: 901.767.013-6
DIRECCIÓN: CR 3W NRO. 64 - 37	**CIUDAD:** NEIVA, HUILA	**TELÉFONO:**	3187167087

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
INDERHUILA			NIT: 813.005.578-7
DIRECCIÓN: CARRERA 18 CALLE 17 UNIDAD DEPORTIVA PISO 2	**CIUDAD:** NEIVA, HUILA	**TELÉFONO:**	8750431

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
TRUJILLO CALDERON HERNAN JOSE	79944179	30.00
ERJ INGENIERIA E INVERSIONES SAS	901583183-9	70.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-44-101051701

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101051701	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	11	2024	16	11	2023	00:00	20	11	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CIVIL H&E	NIT: 901.767.013-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 3W NRO. 64 - 37	NEIVA, HUILA	3187167087

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INDERHUILA	NIT: 813.005.578-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 18 CALLE 17 UNIDAD DEPORTIVA PISO 2	NEIVA, HUILA	8750431

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO CLPIH401-2023 RELACIONADA CON LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA
VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA CONTRA EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE ESPECIALMENTE LA DE CELEBRAR EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES DE ADJUDICACION.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD ESTARA VIGENTE POR EL TERMINO DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION DEL CONTRATANTE

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/11/2023	20/05/2025	$62,666,260.00	$55,148,320.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	16/11/2023	20/05/2025	$156,665,650.00	$137,870,800.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/11/2023	20/11/2027	$31,333,130.00	$27,574,160.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS *		$62,666,260.00	$55,148,320.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO
OBJETO DE LA MODIFICACION
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTROSI MODIFICATORIO NO.2 DE FECHA 12/11/2024, SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PARA UN PLAZO TOTAL DEL CONTRATO DE 4 MESES, Y SE ADICIONA LA SUMA DE $75.179.357 PARA UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE $626.662.540, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****129,802.00	$ *******8,000.00	$ ******26,182.00	$ **********163,985.00	$ ******313,331,300.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LOB ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA	38679	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

61-44-101051701

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101051701	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	11	2024	16	11	2023	00:00	20	11	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO CIVIL H&E			NIT: 901.767.013-6
DIRECCIÓN: CR 3W NRO. 64 - 37	**CIUDAD:** NEIVA, HUILA	**TELÉFONO:**	3187167087

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
INDERHUILA			NIT: 813.005.578-7
DIRECCIÓN: CARRERA 18 CALLE 17 UNIDAD DEPORTIVA PISO 2	**CIUDAD:** NEIVA, HUILA	**TELÉFONO:**	8750431

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
TRUJILLO CALDERON HERNAN JOSE	79944179	30.00
ERJ INGENIERIA E INVERSIONES SAS	901583183-9	70.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-44-101051701

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF038679A

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101051701	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	11	2024	16	11	2023	00:00	16	03	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO CIVIL H&E	NIT: 901.767.013-6	CR 3W NRO. 64 - 37	NEIVA, HUILA	3187167087

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
INDERHUILA	NIT: 813.005.578-7	CARRERA 18 CALLE 17 UNIDAD DEPORTIVA PISO 2	NEIVA, HUILA	8750431

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO CLPIH401-2023 RELACIONADA CON LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA
VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA CONTRA EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE ESPECIALMENTE LA DE CELEBRAR EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES DE ADJUDICACION.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD ESTARA VIGENTE POR EL TERMINO DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION DEL CONTRATANTE

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/11/2023	20/06/2025	$62,666,260.00	$62,666,260.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	16/11/2023	20/06/2025	$156,665,650.00	$156,665,650.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/11/2023	20/12/2027	$31,333,130.00	$31,333,130.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS *		$62,666,260.00	$62,666,260.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO OBJETO DE LA MODIFICACION

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTROSI MODIFICATORIO NO.2 DE FECHA 12/11/2024, SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PARA UN PLAZO TOTAL DEL 4 MESES, Y SE ADICIONA LA SUMA DE $75.179.357 PARA UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE $626.662.540, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******17,769.00	$ *******4,000.00	$ *******4,136.00	$ **********25,906.00	$ ******313,331,300.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LOB ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA	38679	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

61-44-101051701

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101051701	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	11	2024	16	11	2023	00:00	16	03	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO CIVIL H&E			NIT: 901.767.013-6
DIRECCION: CR 3W NRO. 64 - 37	**CIUDAD:** NEIVA, HUILA		**TELÉFONO:** 3187167087

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
INDERHUILA			NIT: 813.005.578-7
DIRECCIÓN: CARRERA 18 CALLE 17 UNIDAD DEPORTIVA PISO 2	**CIUDAD:** NEIVA, HUILA		**TELÉFONO:** 8750431

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
TRUJILLO CALDERON HERNAN JOSE	79944179	30.00
ERJ INGENIERIA E INVERSIONES SAS	901583183-9	70.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-44-101051701

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Consorcio Civil H&E
NIT. 901.767.013-6

INFORME HSEQ

Dirección: Cra. 3 w N. 64-37 Barrio Chicalá
Email: consorciocivilheinder@gmail.com
Teléfonos: 3187167087
Ciudad: Neiva Huila

ACTAS DE COMITÉ

Dirección: Cra. 3 w N. 64-37 Barrio Chicalá
Email: consorciocivilheinder@gmail.com
Teléfonos: 3187167087
Ciudad: Neiva Huila

Nombre Proyecto		***"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMANETO DEL HUILA"***		**Acta No.**	
No. De Contrato obra		CLPIH 401 DEL 2023	**Lugar:**	VEREDA PANTANOS (TIMANA HUILA)	
No. De Contrato Interventoría		CIHCM 420 - 2023			
Fecha	1 DE NOVIEMBRE	**Hora Inicio**	2: PM	**Hora Final**	5:PM

OBJETO DE LA REUNION
Evaluar el avance de la obra en el primer mes de intervención técnica, reorganizar tareas para tratar de obtener un mejor desarrollo de las actividades

AGENDA	
	1- Evaluar el avance de la obra, teniendo en cuanta las partes criticas por el alto nivel freático
	2- Reevaluar las medidas tomadas en el desarrollo del cumplimiento del cronograma de actividades
	3- Reorganizar cronograma de ser necesario para un mejor desarrollo de las actividades

DESARROLLO
- Después de evaluar el avance de la obra, el área intervenida, el alto nivel freático presente en el lugar, las precipitaciones continuas, se establece que el avance del primer mes, no fue el esperado, aunque se tomaron medidas como el uso de maquinaria, para realizar la gran mayoría de las actividades, no se obtuvo el avance esperado - Ajustar nuevas medidas que permitan el nuevo avance de la obra sea mas notorio y se ajuste al cronograma - Ajuste del cronograma de obra, con el animo obtener un mejor resultado

DESARROLLO

TAREAS – COMPROMISOS – TEMAS PROXIMAS REUNIONES			
Tema	**Tarea**	**Responsable**	**Fecha de Control**
1	Realizar seguimiento a las actividades y mejorar el avance de obra		
2	Contratar nuevo personal para el desarrollo de las actividades		
3	Revisión del nuevo cronograma, que se ajusten a las actividades antes establecidas.		

EN CONSTANCIA FIRMAN EL ACTA:		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Heman Jose Tryillo	Director	
Wilson Parra	Residente	
Javier Reyes	Apoyo Interventoria	
Yina Rolanda	Apoyo Interventoria	

Nombre Proyecto		***"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMANETO DEL HUILA"***		**Acta No.**	
No. De Contrato obra		CLPIH 401 DEL 2023	**Lugar:**	VEREDA PANTANOS (TIMANA HUILA)	
No. De Contrato Interventoría		CIHCM 420 - 2023			
Fecha	8 DE NOVIEMBRE	**Hora Inicio**	2: PM	**Hora Final**	5:PM

OBJETO DE LA REUNION
Seguimiento al desarrollo de las actividades establecidas por cronograma, revisar las acciones, capacitaciones e indicaciones realizadas por la profesional Siso

AGENDA	
	1-Revisar el desarrollo de las nuevas actividades que se están desarrollando.
	2-Revisar las capacitaciones y direcciones que se hayan tomado por parte de la Siso
	3-Revisar que los materiales cumplan con las especificaciones establecidas

DESARROLLO

- Se estableció que las actividades que se desarrollan como amarrado de acero, para zapatas, excavaciones, para vigas, formaletas, para zapatas cumplen con normas, planos y especificaciones

- Se estableció que la profesional siso ha realizado capacitaciones continuas a nuestro personal en obra, las cuales cumplen con el programa de salud ocupacional

- Los materiales utilizados en la obra cumplen con las especificaciones exigidas por parte de la entidad contratante, aceros, materiales pétreos.

DESARROLLO

TAREAS – COMPROMISOS – TEMAS PROXIMAS REUNIONES			
Tema	Tarea	Responsable	Fecha de Control
1	Programar la fundición de Zapatas, 3000psi según especificaciones		
2	Iniciar con el armado de estructura para viga de cimentación		
3	Iniciar compactación manual de los ejes AY B		

EN CONSTANCIA FIRMAN EL ACTA:		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Heiran Jose Trujillo	Director	
Wilson Parra	Residente	
JAVIER PERDOMO	DIRECTOR INTERVENTOR	
YINA POLANIA	RESIDENTE INTERVENTOR	

Nombre Proyecto		***"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMANETO DEL HUILA"***		**Acta No.**	
No. De Contrato obra		CLPIH 401 DEL 2023	**Lugar:**	VEREDA PANTANOS (TIMANA HUILA)	
No. De Contrato Interventoría		CIHCM 420 - 2023			
Fecha	15 DE NOVIEMBRE	**Hora Inicio**	2: PM	**Hora Final**	5:PM

OBJETO DE LA REUNION
Verificar el avance de la fundición de zapatas, dosificaciones, materiales, estructura

AGENDA	
	1-Revisar el desarrollo de los elementos fundidos, dosificaciones elementos
	2-verificar el avance
	3-compromisos

DESARROLLO

- Se realizo visita del director de la obra Ing. Hernán José Trujillo, para establecer los tiempos de ejecución, organizar un plan de con el fin de aumentar la eficiencia en las actividades programadas, cumplimiento del cronograma de obra

- Se estableció que las actividades ejecutadas a la fecha no cumplen con el cronograma establecido

- Los materiales utilizados en la obra cumplen con las especificaciones exigidas por parte de la entidad contratante, aceros, materiales pétreos. Dosificaciones

DESARROLLO

TAREAS – COMPROMISOS – TEMAS PROXIMAS REUNIONES			
Tema	**Tarea**	**Responsable**	**Fecha de Control**
1	Terminar de fundir las zapatas restantes en los ejes A Y B		
2	Continuar con el armado de estructura para viga de cimentación, encofrado de la misma		
3	Programar fundida de la viga de cimentación eje B		

EN CONSTANCIA FIRMAN EL ACTA:		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Hernan Jose Trujillo O.	Director	
Wilson Parra	Residente	
Javier Rodriguez	Apoyo Interventoria	
Yenny Polania	Residente Interventoria	

Nombre Proyecto		***"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMANETO DEL HUILA"***		**Acta No.**	
No. De Contrato obra		CLPIH 401 DEL 2023	**Lugar:**	VEREDA PANTANOS (TIMANA HUILA)	
No. De Contrato Interventoría		CIHCM 420 - 2023			
Fecha	22 DE NOVIEMBRE	**Hora Inicio**	2: PM	**Hora Final**	5:PM

OBJETO DE LA REUNION
Cumplimiento del cronograma, verificación de las actividades programadas,

AGENDA	
	1-Programar en conjunto con la interventoría, que actividades se pueden realizar en horas del medio día y tarde noche, ya que las altas precipitaciones no hacen posible la realización de las actividades
	2-inspeccionar que las zapatas se hayan fundido todas, vigas eje B
	3-compromisos

DESARROLLO

- Se procedió a programar actividades extra temporáneas ya que por las altas precipitaciones no se han podido ejecutar en un 100 %, aun con las acciones tomadas en la semana inmediatamente anterior por parte del director de obra en conjunto con la interventoría el rendimiento no es el ideal

- Se verifico que las zapatas ya fueron fundidas en su totalidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas, materiales, aceros, dosificaciones

- Se pudo verificar que la estructura de la viga ya se esta encofrando para su respectiva fundición, se verifico que los materiales e insumos estuvieran en la obra, que los mismos cumplieran con las especificaciones exigidas por la entidad, programar su

DESARROLLO
fundida para esta nueva semana.

TAREAS – COMPROMISOS – TEMAS PROXIMAS REUNIONES			
Tema	**Tarea**	**Responsable**	**Fecha de Control**
1	Seguimiento a las actividades extras programadas por el contratista en conjunto con la interventoría		
2	Fundición de la viga de cimentación eje B		
3	Empezar armado de las columnas en el eje B		

EN CONSTANCIA FIRMAN EL ACTA:		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Heiran Jose Tryllc C.	Director	
Wilson Parra	Residente	
JAVIER PERDOMO	RESIDENTE INTER	
YINA PALMIN	RESIDENTE INTER	

Nombre Proyecto		***"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMANETO DEL HUILA"***		**Acta No.**	
No. De Contrato obra		CLPIH 401 DEL 2023	**Lugar:**	VEREDA PANTANOS (TIMANA HUILA)	
No. De Contrato Interventoría		CIHCM 420 - 2023			
Fecha	29 DE NOVIEMBRE	**Hora Inicio**	2: PM	**Hora Final**	5:PM

OBJETO DE LA REUNION
Realizar seguimiento a las actividades y a los planes de contingencia tomados en la obra, resolver observaciones realizadas por la interventoría

AGENDA	
	1-verificar el cumplimiento de las actividades extras que se programaron, verificar avances de obra
	2-seguimiento a la fundación de la viga de cimentación, dosificación aceros, estribos distancias
	3-compromisos

DESARROLLO

- Las actividades programadas no han tenido el efecto esperado ya que el estado del tiempo ha sido poco generoso, se presentan lluvias fuertes en gran parte del día

- Se verifico que la viga del B se fundió, dosificación, aceros, longitudes, estribos, cantidades.

- Se comenzó con el armado de la estructura para columnas

- Se revisan pendientes de la instalación de filtros perforado en el eje A

- La interventoría hace observación acerca de la distancia entre los estribos de las vigas se solicita comité técnico junto con el supervisor, el ing. Cesar Joaquín Velázquez, para

DESARROLLO
verificar el cumplimento de la norma.

TAREAS – COMPROMISOS – TEMAS PROXIMAS REUNIONES			
Tema	**Tarea**	**Responsable**	**Fecha de Control**
1	Insistir en las actividades extra tiempos, aumentar el personal de obra		
2	Armado de columnas, cumpliendo con planos y especificaciones		
3	Empezar armado de la viga de cimentación eje A		

EN CONSTANCIA FIRMAN EL ACTA:		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Heiman Jose Trujillo C.	Director	
Wilson Parra	Residente	
Angel Ramos	Director Interventoria	
Yina Palomino	Residente Interventoria	

BITACORA

Dirección: Cra. 3 w N. 64-37 Barrio Chicalá
Email: consorciocivilheinder@gmail.com
Teléfonos: 3187167087
Ciudad: Neiva Huila

31 octubre 2024. Timana Huila
Clima lluvioso
Hora Inicial 7:am Hora Final 5:Pm
Personal en obra, 1 Ing residente, 5:50
Oficiales, Ayudantes. 5:50
Herramienta menor y equipos.

Se continua con excavacion Para Vigas eje B, y compactacion cuado R:0 eje A,
Wilson Parra. Residente interv Director Fiscal Persona

Timana Huila 01 noviembre 2024.
Hora Inicio 7:00 am Hora salida 5:Pm
Clima Soleado.
Porsonal de obrea, Ing residente, 5:50
Oficales, ayudantes, 5:50.
Herramienta menor y equipos.
Instalacion de canastas Para zapatas en hierro de 5/8

Wilson Parra. Residente interv. Director

Timana Huila, 02 Noviembre de 2024
Hora de Inicio 7:00 am Hora Final 12:Pm.
Clima: SoleadO
Personal en obra, Ing residente, 5:50, Oficiales ayudantes, 5:50
Herramienta menor, equipos, se Continua Amarrando acero: Para zapatas

Wilson Parra. Residente interv Director Fiscalizacion.

Timana Huila. 04 NOV. de 2024
Hora Inicial. 7:00 am Hora Final. 5:00 Pm.
Clima lluvioso
Personal en obra, Ing residente, Oficial, ayudantes, 5150
Herramienta y Equipo, Herramienta menor
se continua con la excavacion para la viga de cimentacion en el eje B
Wilson Parra. Residente Inter. Director Frente Regional.

Timana Huila 05 NOV. 2024.
Clima Soleado
Personal en obra Ing residente, oficiales ayudantes, 5150
Continuacion de excavacion manual Para viga de cimentacion eje B

Wilson Parra. Residente Inter. Director Frente Regional

Timana Huila, 06 Noviembre 2024
Hora Inicial. 7:00 am. Hora Final 5:00 Pm.
Clima soleado
Personal en obra. Ing residente, oficiales ayudantes, 5150
Se empieza armare Para zapatas eje B, en acero corrugado de 5/8 Segun planos y especificaciones

Wilson Parra Residente Inter. Director Frente Regional.

Timana Huila 07 noviembre 2024

Hora Inicial 7:am Hora Final 5:00Pm

Clima lluvioso

Personal en obra: Ing residente, oficiales, ayudantes, SISO

Herramientas y equipos, herramienta menor

Se realiza limpieza de la B1, se seca con motobomba, se instala acero Figurado y Formaleta, lista Para Fundir.

Wilson Parra. Residente Inter. Director Fause Ferrano

Timana, 08 Noviembre de 2024.

Clima lluvioso Hora Inicial 7:00am Final 5:Pm

Personal en obra: Ing residente, oficiales ayudantes, SISO

Herramientas y equipos, herramienta manual

Se realiza Fundicion de zapata B1, Concreto 3000 PSI, grava 3/4 Arena, medidas 2.4 X 2.4 X 0,5 mts, se continuo con la instalacion del acero de la zapata B6, Varilla corrugada de 5/8 alambre Precocido negro, segun Planos y ESPECIFICACIONES.

Wilson Parra. Residente Inter. Director Fause Ferrano

Timana, 09 Noviembre 2024.
Hora Inicial 7:am, Hora Final 12:00Pm.
Clima Soleado
Personal en obra, Ing residente, Oficiales
Ayudantes, 5150
Herramienta menor.
Se instala acero Figurado para zapatas
B6 y Formaleta de la B6 para Fundir.

Wilson Parra.

Timana Huila, 11 Noviembre 2024.
Hora Inicial, 7:00 am Hora Final 5:Pm.
Clima lluvioso.
Personal de obra: Ing, residente, Oficial,
ayudantes, 5150.
Herramienta menor
Se Funde zapata B6, concreto 3000PSI
Arena y grava, se instala acero Figurado
S/B para zapata B5 y Formaleta para la misma

Wilson Parra.

Timana Huila, Noviembre 12 de 2024
Hora inicial 7:000am. Hora Final 5:Pm.
Clima lluvioso
Personal en Obra, Ing residente, Oficiales, Ayudantes
Herramienta y equipos, herramienta menor.

Se realiza Fundicion zapata B5. se
Formaletea y se instala acero corrugado
ya Figurado para zapata B4.

Wilson Parra.

Timana Huila Noviembre 13 2024
Hora inicial 7:00 am Hora Final 5:00 Pm.
Clima lluvioso
Personal en obra, Ing residente, oficiales y ayudantes, 5150
Herramienta y equipos, herramienta menor
Se funde zapata B4, concreto mezclado en obra 3000 PSI, se instala acero Figurado en zapata B3, corrugado de 5/8

Wilson Parra. Residente Obra

Director Fraijer Perdomo

Timana, 14 de Noviembre 2024
Hora Inicial 7:00 am Hora Final 5:00 Pm.
Clima lluvioso
Personal en obra Ing residente, Oficial, ayudantes, 5150
Herramienta y equipos herramienta menor.
Se funde zapata B3, concreto mezclado 3000 PSI, arena, grava 3/4

Wilson Parra. Residente Obra

Director Fraijer Perdomo

Timana 15 de Noviembre de 2024
Hora inicial 7:00 am, hora Final 5:00 Pm
Clima lluvioso
Personal en obra, Ing residente, oficiales ayudantes, 5150
Herramientas y equipos, herramienta menor
Instalacion de acero Figurado 5/8 zapata B2.

Wilson Parra Residente Obra

Director Fraijer Perdomo

Scanned with AnyScanner

Timana Huila, 16 noviembre 2024
Hora inicial 7:am Hora Final 12 Pm
Clima lluvioso
Personal en obra, Ing residente, OFICIALES ayudantes, SISO
Herramienta menor.
instalacion de acero en zapatas del eje A, Figurado.

Wilson Parra. Residente Inter DIRECTOR FAMILIA PERSONA

Timana Huila, 18 de nov, de 2024
Hora inicial 7:00 am Hora Final 5: Pm.
Clima Soleado
Personal en obra, Ing residente, OFICIALES ayudantes, SISO
Herramienta y equipo, herramienta menor.
Se inicia amarrar acero para viga de cimentacion en el eje B

Wilson Parra. Residente Inter DIRECTOR FAMILIA PERSONA

Timana Huila, noviembre 19 2024
Hora inicial 7:am hora final: 5:00 Pm.
Clima lluvioso
Personal de obra Ing residente OFICIALES ayudantes, SISO.
Herramienta y equipos, herramienta menor.
Se continua con el armado de viga de cimentacion del eje A y amarrado de acero segun Planos y especificaciones llegan camillas para encofrar.

Wilson Para. Residente Inter DIRECTOR FAMILIA PERSONA

NKB

AnyScanner

Timana Huila Noviembre 20 de 2024
Hora inicial 7:am Hora Final 5:Pm
clima lluvioso
Personal en obra, Ing residente, oficiales ayudantes, SISO
Herramientas y equipos, herramienta menor.
Se continua amarrando el acero de la viga de cimentacion del Eje B.

Wilson Perra.

Timana 21 NOV, 2024
Hora inicial 7:am hora Final 5:12:Pm
clima lluvioso
Personal en obra ing residente, oficiales ayudante, SISO
Herramienta y equipo, herramienta menor

se inicia a formaleteor viga de cimentacion eje B

Wilson Perra

Timana Huila 22 NOV. 2024.
Hora inicial 7:am hora Final 5:Pm.
Clima lluvioso
Personal en obra ing residente, oficiales, ayudantes, SISO
Herramientas y equipos

Fundimos viga de cimentacion eje B
Concreto mezclado en obra 3000 PSI
Grava y arena.

Wilson Perra.

Timana Huila, 23 de nov. de 2024,
Hora inicial 7:am hora Final 13:Pm,
Clima lluvioso
Personal de obra; ing Residente, oficiales ayudantes, siso
Herramientas y equipos, herramienta menor.
se inicia con el amarre del acero de columnas de eje B, acero corrugado de 1/2 y estribos de 3/8, banchos 3/8 Segun planos y especificaciones.

Wilson Parra.

Residente interv.

Director Interv

Timana Huila, 25 nov. de 2024
Hora inicial 7:am Hora Final 5:Pm
Clima soleado
Personal en obra., ing residente, oficiales, ayudantes.
siso
Herramientas y equipos, herramienta menor.
se continua con el amarre de acero para columnas eje B, Formaletas para zapatas eje A.

wilson Parra

Residente interv.

Director Interv

26 de Noviembre 2024, Timana Huila.
Hora inicial 7:am Hora Final 5. Pm.
Clima soleado
Personal en obra. ing residente, siso
oficiales y ayudantes
Herramienta y equipo menor.
se continua el amarre de acero para columnas del eje B, se suministra relleno para eje B.

Wilson. Parra.

Residente interv.

Director Interv

Timana Huila, 27 de Nov. 2024
Hora inicial 7:00 am Hora Final 5:00 Pm.
Clima lluvioso
Personal en obra Ing Residente, oficiales ayudantes y SISO
Herramienta menor
Se continua amarrando acero Para Columnas del eje B, se inicia excavacion y se instala el Filtro en el eje A
Visita de la interventoria, observacion sobre aceros
Wilson Parra.

Residente Inter. Director Fauer Ferreira

Timana Huila: 28 de Noviembre 2024.
Hora 7:00 am Salida 5:00 Pm.
Clima lluvioso
Personal en obra; Ing residente, SISO
Oficiales y ayudantes
Herramientas y equipos

Se atiende sugerencia de la interventoria se acomodan los estribos 6 cm total entre ellos, Para columnas amarradas

Wilson Parra.

Residente Inter. Director Fauer Ferreira.

Timana Huila, 29 de Nov. de 2024
Hora inicial 7:00 am Hora Fina 5: Pm
Clima lluvioso
Personal en obra, Ing residente, oficiales y ayudantes, SISO
Herramienta menor. equipos
Se inicia Fundicion de zapatas eje A llega material de playa y Recebo.
Wilson Parra

Residente Inter. Director Fauer Ferreira.

NICE

AnyScanner

Timana Huila noviembre 30 2024.
Clima Soleado.
Hora inicial, 7:00 a.m Hora Final 5:00p.m.
Personal en obra, ing residente, oficiales
siso, ayudantes.
Herramientas y equipos: herramienta menor.

Se continua fundiendo zapatas del eje 1
llegan 14 m³ de recebo, 14 m³ casco de río
14 m³ Premesclado

Wilson Parra

Timana Huila 2 de diciembre 2024.
Clima Nuvioso
Hora inicial 7:00 a.m Hora final 5:00 p.m.
Personal en obra ing residente, oficiales,
ayudantes, siso
Herramientas y equipos herramienta menor.

Se Funde la zapata A 6, concreto armado
3000PSI, Grava arena, se comienzan
a rrellenar eje A, para compactar

Wilson Parra.

Timana Huila, 03 diciembre 2024.
Hora inicial 7:00 a.m Hora Final 5:00 Pm
Clima Nuvioso
Personal de obra, ing residente, siso
Oficiales y ayudantes
Se continua el amarrado de acero
Para Columnas, se inicia excavacion
para Filtro eje B.
Wilson Parra.

SEGURIDAD SOCIAL

Dirección: Cra. 3 w N. 64-37 Barrio Chicalá
Email: consorciocivilheinder@gmail.com
Teléfonos: 3187167087
Ciudad: Neiva Huila

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1080933023	01	No	No	No	41	807	5411101	Fijo	CHALA MEDINA DIYER ADRIAN	$1.300.000
CC-1004440666	01	No	No	No	41	807	5411101	Fijo	CORREA ORTIZ YONEISON	$1.300.000
CC-1083876435	01	No	No	No	41	807	5411101	Fijo	ESPAÑA ARDILA SEBASTIAN	$1.300.000
CC-1080935714	01	No	No	No	41	807	5411202	Fijo	ESPAÑA MEDINA JONATHAN	$1.300.000
CC-1077862501	01	No	No	No	41	807	5429001	Fijo	LUNA CUELLAR LIZETH NAIROBY	$1.300.000
CC-1080937225	01	No	No	No	41	807	5411202	Fijo	MEDINA PUENTES YEFERSON	$1.300.000
CC-1081514075	01	No	No	No	41	807	5411101	Fijo	SANCHEZ TRUJILLO JUAN CARLOS	$1.300.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1080933023																													0		
CC - 1004440666	X	2024-11-18																											0		
CC - 1083876435																													0		
CC - 1080935714	X	2024-11-01																											0		
CC - 1077862501																													0		
CC - 1080937225	X	2024-11-13																											0		
CC - 1081514075																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1080933023	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1004440666	PORVENIR	13	$563.334	0.1600000	$90.200	$0	$0	$90.200	$0	$0	$0
CC - 1083876435	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1080935714	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1077862501	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1080937225	PORVENIR	18	$780.000	0.1600000	$124.800	$0	$0	$124.800	$0	$0	$0
CC - 1081514075	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 32203679
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-01-15

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO CIVIL H&E	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901767013	D.V.	6	TIPO DE APORTANTE	A mayor o igual a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 3W 64 37	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	HERNANTRUJILLO@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	31716770
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	79944179	PRIMER APELLIDO	TRUJILLO	SEGUNDO APELLIDO	CALDERON
PRIMER NOMBRE	HERNAN	SEGUNDO NOMBRE	JOSE		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 11	Año: 2024	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
7		$7.843.334		32203679

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 11

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	5	$839.000	$0	$0	$0	$0	42	$23.000	$0	$0	$862.000
COLFONDOS	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	42	$5.700	$0	$0	$213.700
PROTECCION	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	42	$5.700	$0	$0	$213.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$70.500	$0	0	$0	0	$0	$70.500	42	$2.000	$0	$72.500	$0	0	$0	$0	$72.500	$0	$0	$72.500
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$325.000	$0	0	$0	0	$0	$325.000	42	$8.900	$0	$333.900	$0	0	$0	$0	$333.900	$0	$0	$333.900
EPS-S AIC CAUCA	1	$162.500	$0	0	$0	0	$0	$162.500	42	$4.500	$0	$167.000	$0	0	$0	$0	$167.000	$0	$0	$167.000
ESSC ASMET SALUD	2	$260.000	$0	0	$0	0	$0	$260.000	42	$7.200	$0	$267.200	$0	0	$0	$0	$267.200	$0	$0	$267.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$162.500	$0	0	$0	0	$0	$162.500	42	$4.500	$0	$167.000	$0	0	$0	$0	$167.000	$0	$0	$167.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	7	$546.100	0	$0	$0	$546.100	42	$15.000	$561.100	0	$0	$5.611	$561.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	7	$313.800	42	$8.600	$322.400
SENA	7	$156.900	42	$4.300	$161.200

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1080933023	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	4290	0.0696000	$90.500
CC - 1004440666	SANITAS	13	$563.334	0.1250000	$70.500	$0	0	$0	0	$0	13	$563.334	4290	0.0696000	$39.300
CC - 1083876435	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	4290	0.0696000	$90.500
CC - 1080935714	ESSC ASMET SALUD	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	4290	0.0696000	$90.500
CC - 1077862501	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	4290	0.0696000	$90.500
CC - 1080937225	ESSC ASMET SALUD	18	$780.000	0.1250000	$97.500	$0	0	$0	0	$0	18	$780.000	4290	0.0696000	$54.300
CC - 1081514075	EPS-S AIC CAUCA	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	4290	0.0696000	$90.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1080933023	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004440666	COMFAMILIAR DEL HUILA	13	$563.334	0.0400000	$22.600	0.0200000	$11.300	0.0300000	$17.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1083876435	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1080935714	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1077862501	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1080937225	COMFAMILIAR DEL HUILA	18	$780.000	0.0400000	$31.200	0.0200000	$15.600	0.0300000	$23.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081514075	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
ICBF	7	$235.400	42	$6.500	$241.900
ESAP	0	$0	42	$0	$0
MinEdu	0	$0	42	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	$1.007.600
PENSIONES	3	$1.289.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$561.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$322.400
SENA	1	$161.200
ICBF	1	$241.900
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$3.583.600

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 32528768
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-02-13

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO CIVIL H&E	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901767013	D.V.	6	TIPO DE APORTANTE	A mayor o igual a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 3W 64 37	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	HERNANTRUJILLO@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	31716770
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	79944179	PRIMER APELLIDO	TRUJILLO	SEGUNDO APELLIDO	CALDERON
PRIMER NOMBRE	HERNAN	SEGUNDO NOMBRE	JOSE		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 11	Año: 2024	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.300.000		32528768

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-79500020	01	No	No	No	41	807	5429001	Fijo	PARRA TOVAR WILSON REINALDO	$1.300.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 79500020																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 79500020	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 79500020	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	4290	0.0696000	$90.500

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-79500020	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	71	$9.600	$0	$0	$217.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$162.500	$0	0	$0	0	$0	$162.500	71	$7.500	$0	$170.000	$0	0	$0	$0	$170.000	$0	$0	$170.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$90.500	0	$0	$0	$90.500	71	$4.200	$94.700	0	$0	$947	$94.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$52.000	71	$2.400	$54.400
SENA	1	$26.000	71	$1.200	$27.200
ICBF	1	$39.000	71	$1.800	$40.800
ESAP	0	$0	71	$0	$0
MinEdu	0	$0	71	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$170.000
PENSIONES	1	$217.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$94.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$54.400
SENA	1	$27.200
ICBF	1	$40.800
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$604.700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79944179		TRUJILLO CALDERON HERNAN JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 3 W N 64 37	NEIVA-HUILA	8601919	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1263800899	9481662566	I	2024/12/18	2025/02/13	BANCOLOMBIA	57	$899,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,633,409	$421,400			$2,633,409	$329,200			$2,633,409	$52,700			$2,633,409	$64,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,633,409	$421,400			$2,633,409	$329,200			$2,633,409	$52,700			$2,633,409	$64,200		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)						$2,633,409	$421,400			$2,633,409	$329,200			$2,633,409	$52,700			$2,633,409	$64,200		$0	$0
1	CC	79944179	TRUJILLO CALDERON HERNAN JOSE	25-14	30	$2,633,409	$421,400	EPS005	30	$2,633,409	$329,200	CCF32	30	$2,633,409	$52,700	14-23	30	$2,633,409	$64,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,633,409	$421,400			$2,633,409	$329,200			$2,633,409	$52,700			$2,633,409	$64,200		$0	$0

2025/02/13 03:00 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79944179		TRUJILLO CALDERON HERNAN JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 3 W N 64 37	NEIVA-HUILA	8601919	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1263800899	9481662566	I	2024/12/18	2025/02/13	BANCOLOMBIA	57	$899,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$421,400	$15,500	$0	$436,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$421,400	$15,500	$0	$436,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$64,200	$2,400	$0	$66,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$64,200	$2,400	$0	$66,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,700	$2,000	$0	$54,700
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$52,700	$2,000	$0	$54,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$329,200	$12,100	$0	$341,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$329,200	$12,100	$0	$341,300
TOTAL				1	$867,500	$32,000	$0	$899,500

Consorcio Civil H&E
NIT. 901.767.013-6

CORRESPONDENCIA

Dirección: Cra. 3 w N. 64-37 Barrio Chicalá
Email: consorciocivilheinder@gmail.com
Teléfonos: 3187167087
Ciudad: Neiva Huila

Consorcio Civil H&E
NIT. 901.767.013-6

Neiva, 18 de Noviembre del 2024.

Señor:
Ing. Faiver Eduardo Perdomo Polania
R.L Consorcio WF
Interventor

CUB-014-2024

Referencia: Solicitud de aprobación de Pólizas de Modificatoria No. 2.

Cordial Saludo,

En mi calidad de representante legal del contrato de obra **CLPIH401-2023** que tiene por objeto **"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA"**, Quiero hacer entrega de los documentos requeridos por ustedes para la aprobación de las pólizas correspondiente de la Modificatoria No. 2.

ANEXO 5, 6, 7
- Póliza de cumplimiento Entidad Estatal

Cordialmente;

Hernán José Trujillo Calderón
Representante Legal
Consorcio Civil H&E

Dirección: Cra. 3 w N. 64-37 Barrio Chicalá
Email: consorciocivilheinder@gmail.com
Teléfonos: 3187167087
Ciudad: Neiva Huila

Dentro de los documentos solicitados se encuentran:

1. **Balance de obra**, para su debida revisión, diligenciamiento y complementación.
2. **Acta de justificación de mayores y menores cantidades**, así como de los ítems no previstos en el contrato. Este documento debe especificar las modificaciones requeridas en las cantidades de obra, y detallar la justificación para la adición y prórroga solicitada en el proyecto.

Adicionalmente, se recomienda el envío de la siguiente documentación, conforme a lo establecido en el contrato:

- Cronograma de obra debidamente firmado.
- Relación del personal de mano de obra calificada y no calificada.
- Caracterización de los materiales utilizados en la ejecución de la obra.

Por último, se destaca la importancia de implementar las medidas de **protección personal** para el personal que trabaja en la obra. Esta medida es crucial para garantizar la seguridad y prevenir inconvenientes que puedan afectar la integridad de los empleados.

Atentamente,

ING. FAIVER E. PERDOMO P.
Representante Legal

NIT. 901.769.619-8

CONSORCIO WF

Neiva, 6 de Noviembre de 2024.

MUN.TIM. WF42023-024

Ingeniero
HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON
Representante Legal
CONSORCIO CIVIL H&E
Ciudad

REFERENCIA: *CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CLPIH401-2023, que tiene por Objeto: "CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA PANTANOS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA, DEPARTAMENTO DEL HUILA".*

ASUNTO: SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN DE BALANCE DE OBRA, ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS, IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Cordial saludo,

Respetuosamente, mediante el presente oficio, se solicita al contratista del contrato de obra pública No. CLPIH401 de 2023, cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ, DEPARTAMENTO DEL HUILA"**, el diligenciamiento y posterior envío de la documentación requerida para continuar con las actividades de la obra, entre los documentos solicitados se anexa el balance de obra correspondiente, así como el acta de justificación de mayores y menores cantidades e ítems no previstos, los cuales son indispensables para avanzar en la ejecución de los compromisos establecidos en el contrato y concluir los trabajos en los términos previstos.

Clausula 8. Obligaciones específicas del contratista.
G. Obligaciones de información

2. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la Interventoria. el avance de cada uno de los frentes de trabajo, de cada una de las actividades programadas, cantidades de obra ejecutadas, registros fotográficos, resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas, fotocopia de la bitácora o libro de obra, resumen de las actividades realizadas en el periodo, relación del personal empleado en la ejecución de la obra, informe de seguridad industrial, informe de manejo ambiental, informe de manejo e inversión del anticipo con los respectivos soportes, actualización del programa de ejecución de obra, acreditación de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

Se anexa formato el cual debe ser diligenciado con la información y periodos de ejecución de actividades de obra.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento o duda que surja de la solicitud presentada.

Atentamente,

ING. FAIVER E. PERDOMO P.
Representante Legal

NIT. 901.769.619-8

CONSORCIO WF

Neiva, 14 de Noviembre de 2024.

MUN.TIM. WF42023-027

Ingeniero
HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON
Representante Legal
CONSORCIO CIVIL H&E
Ciudad

REFERENCIA: *CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CLPIH401-2023, que tiene por Objeto: "CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA PANTANOS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA, DEPARTAMENTO DEL HUILA".*

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMES MENSUALES DE OBRA.

Cordial saludo.

La presente es con el fin de solicitar los informes mensuales de obra junto con los documentos anexos de cada periodo para su debida revisión y aprobación por parte de la interventoría, así mismo recordando que estos se enmarcados dentro de las obligaciones del contrato de obra de la siguiente manera:

Por tal motivo y con el fin de no comprometer los tiempos de ejecución de la obra solicitar un incremento en el rendimiento de las labores y en el número de personal asignado a la obra para solventar.

En consideración a lo anterior, le solicita de manera atenta que:

- **Incrementar el número de trabajadores:** Aumentar el personal en las áreas críticas de la obra para acelerar las actividades y alcanzar las metas establecidas.
- **Optimizar los procesos constructivos:** Se sugiere evaluar y ajustar los métodos de trabajo actuales para mejorar la eficiencia y productividad de las cuadrillas.
- **Fortalecer la coordinación:** Es fundamental reforzar la comunicación y coordinación entre los diferentes equipos de trabajo para evitar retrasos y garantizar un flujo continuo de las labores.

Le agradezco su atención a esta solicitud y que, de manera conjunta, encontraremos las soluciones necesarias para acelerar el avance de la obra y cumplir con los objetivos planteados.

Quedo a la espera de su pronta respuesta y de las acciones que se implementarán al respecto.

Atentamente,

ING. FAIVER E. PERDOMO P.
Representante Legal

C.C. Ing. Cesar Joaquín Velásquez – Apoyo a la supervisión

NIT. 901.769.619-8

CONSORCIO WF

Neiva, 16 de Noviembre de 2024.

MUN.TIM. WF42023-028

Ingeniero
HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON
Representante Legal
CONSORCIO CIVIL H&E
Ciudad

REFERENCIA: *CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CLPIH401-2023, que tiene por Objeto: "CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA PANTANOS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA, DEPARTAMENTO DEL HUILA".*

ASUNTO: SOLICITUD DE INCREMENTO EN EL RENDIMIENTO Y PERSONAL DE OBRA.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, respetuosamente me dirijo a usted que dado a que como se evidencia, el avance actual de la obra se encuentra por debajo de lo establecido en el cronograma propuesto. Esta situación genera una preocupación, ya que podría comprometer el cumplimiento de los plazos establecidos y afectar el desarrollo general del proyecto.

INFORME HSEQ

Dirección: Cra. 3 w N. 64-37 Barrio Chicalá
Email: consorciocivilheinder@gmail.com
Teléfonos: 3187167087
Ciudad: Neiva Huila

INFORME MENSUAL

DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE DE 2024

AVANCES EN PROCESO DEL SISTEMA DE GESTION SST

ACTIVIDADES REALIZADA POR CONTRATISTA

1. Entrega de EPP
2. Inspecciones de herramienta menor
3. Inspección de maquinaria y equipo
4. Inspección a equipos de emergencia
5. Manejo ambiental en obra
6. Capacitación hábitos y estilos de vida saludable

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

- Se realiza inducción al personal de obra para inicio de actividades donde se socializa los componentes de gestión integral (Principios corporativos, misión, visión) componente administrativo (Presentación de la empresa, reglamento interno de trabajo, funciones y responsabilidades del cargo, horario de trabajo, dotación y manejo de documentación) y EL componente de seguridad y salud en el Trabajo SST (Políticas, matriz de peligros y planes SST)

- Se realiza entrega de EPP (Elementos de protección personal) para la ejecución de sus labores, los cuales se suministran cada que los requieran.

- Se realiza inspección pre operacional semanal de las herramientas menores utilizadas para la realización de las actividades diarias, verificando que se encuentren aptas para su uso o si es necesario realizar los ajustes pertinentes.

- Inspección pre-operacional de equipos, esto se realiza con el propósito de verificar el adecuado estado de los mismos durante la ejecución de sus labores, y si, se llegase a presentar alguna falla detectar a tiempo y realizar sus respectivos ajustes.

- Se realizó inspección de equipo de emergencias extintor, botiquín y camilla, los cuales se encuentran ubicado en obra y en adecuadas condiciones para el momento que sean requeridos hacer uso de estos.


- Durante la ejecución del proyecto se manejaron las siguientes actividades:

Se generaron aguas residuales domésticas, provenientes del lavado de manos y uso de los baños, las cuales fueron dispuestas directamente al sistema de alcantarillado. Además, se mantiene el sitio para acopiar materiales de construcción y/o agregados pétreos los cuales se cubre con plástico negro.

- Se realiza capacitación en el sub programa de medicina preventiva y del trabajo; hábitos de estilo de vida saludable, en el cual se socializo el tema de menos consumo de azúcar, creando conciencia de la vida de cada uno de los que hacen parte del consorcio en obra, y que puedan llevar el mensaje a sus familias, reduciendo el consumo de la misma.

REGISTRO FOTOGRAFICO


INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MANOR

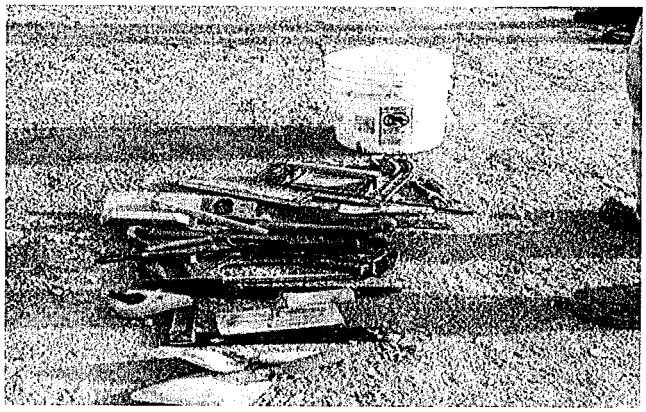


INSPECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO



CERRAMIENTO

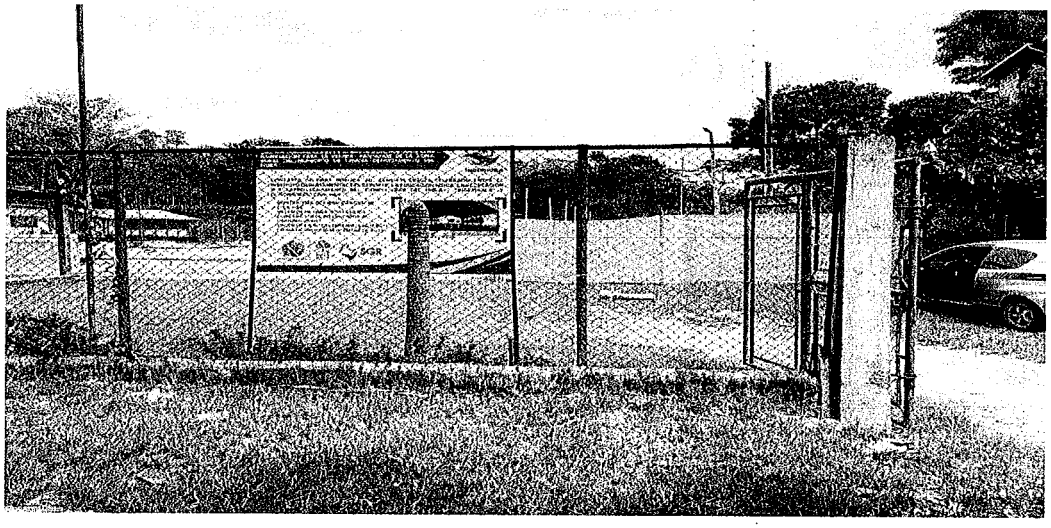

EQUIPOS DE EMERGENCIA

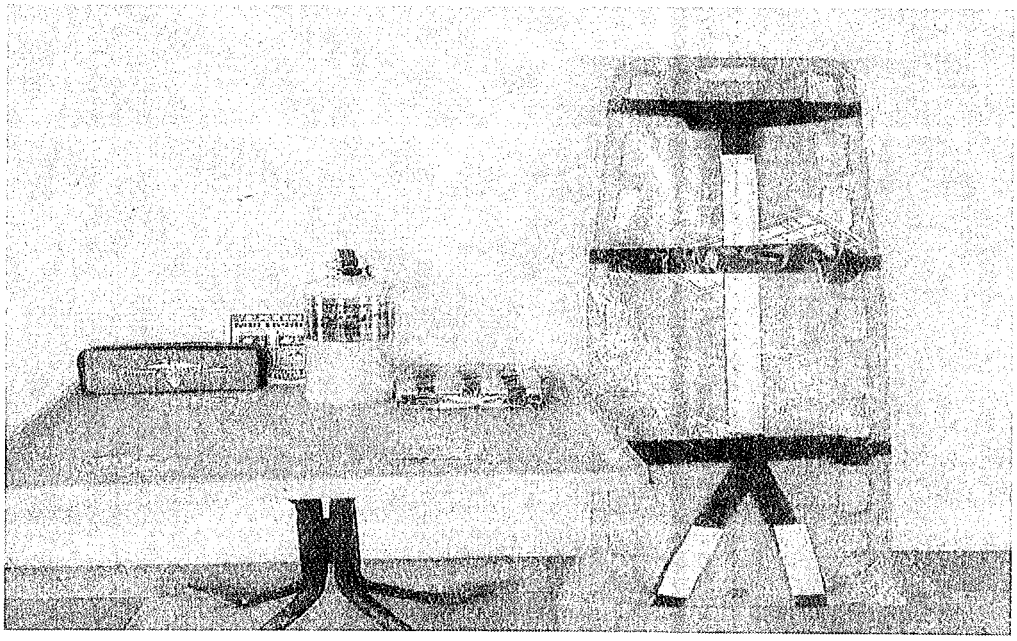

ACOPIO DE MATERIAL PETREO





CAPACITACIÓN HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE



TEMAS PENDIENTES:

- Continuar capacitación para el personal

COMPROMISOS

- Charlas pre operacionales
- Capacitaciones e inspecciones

ANEXOS

1. Inducción
2. Entrega de EPP
3. Informe
4. Inspección de botiquín, camilla y extintor
5. Lista de personal
6. ATS

ACOPIO DE MATERIAL PETREO





CAPACITACIÓN HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE



TEMAS PENDIENTES:

- Continuar capacitación para el personal

COMPROMISOS

- Charlas pre operacionales
- Capacitaciones e inspecciones

ANEXOS

1. Inducción
2. Entrega de EPP
3. Informe
4. Inspección de botiquín, camilla y extintor
5. Lista de personal
6. ATS

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT: 901 767.913-6

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP

FECHA DE ENTREGA: Del 5 Al 30 NOVIEMBRE 2025

	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA DEL TRABAJADOR	CARGO/ACTIVIDAD	LAVADO DE MANOS			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS							DOTACION				TIPO DE ENTREGA		FIRMA DEL TRABAJADOR
							CABEZA	VISUAL	AUDITIVA	RESPIRATORIA	MANOS		ALTURAS	CUERPO						
				Jabón antibacterial	Alcohol	Gel antibacterial	Casco	Gafas de seguridad	Protector auditivo de inserción	Tapabocas industrial	Guantes de carnaza	Guantes de vaqueta	Arnés	Eslingas	RUSO	PANTALON	BOTAS	CHALECO REFLECTIVO	INICIAL	REPOSICIÓN	
1.	Jonatha España	1080935714	Ayudante	X		X		X	X	X	—	X		-	-	-	-	-	-	-	Jonathan E.
2.	Yonelson Correa	1004440666	Ayudante	X		X		X	X	X	—	X		-	-	-	-	-	-	-	Yonelson C.
3.																					
4.																					
5.																					
6.																					
7.																					
8.																					
9																					
10.																					
11.																					
12.																					
13.																					
14.																					
15.																					
16.																					
17.																					
18.																					

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	**CONSORCIO CIVIL H&E** NIT: 901.767.013-6 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	VERSIÓN: 01 FECHA: NOV. 2023 PÁG.: 1 DE 1
INDUCCION - REINDUCCION		

REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INDUCCIÓN

NOMBRE	JONATHAN ESPAÑA	**CC**	1080935714	**NUEVO**	X
CARGO	ESPAÑA	**FECHA**	12/11/2024	**ANTIGUO**	

PROCESO	TEMA	CAPACITADOR	METODO EVALUACION
GESTION INTEGRAL	▪ Misión, Visión ▪ principios corporativos ▪ Reseña histórica	Lzeth	**ORAL**
ADMINISTRATIVA	▪ Presentación de la Empresa. ▪ Reglamento interno de trabajo ▪ Entrega de funciones y responsabilidades del cargo ▪ Horario para el cargo ▪ Documentos obligatorios hoja de vida. ▪ Dotación ▪ Manejo de comunicación	Lzeth	**ORAL**
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	▪ Sistema General de Seguridad Social en Colombia, Ley 100/1993 ▪ Socialización de Políticas SST, alcohol drogas y tabaco y respuesta ante emergencias ▪ Socialización de Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. ▪ Socialización de la matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros y sus respectivas recomendaciones. ▪ Presentación de comités y sus funciones: COPASST, CONVIVENCIA LABORAL ▪ Responsabilidades generales en SG-SST ▪ Plan de emergencias ▪ Procedimiento de reporte de incidente o accidente laboral ▪ Socialización PAPSO ▪ Socialización Protocolo de bioseguridad	Lzeth	**ORAL**
OBSERVACIONES			

FIRMA DEL TRABAJADOR	GERENCIA	JEFE INMEDIATO	RESPONSABLE SST
Jonathan España.			

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO CIVIL H&E NIT: 901.767.013-6 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	

INDUCCION - REINDUCCION

REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INDUCCIÓN

NOMBRE	YONEISON CORREA ORTIZ	**CC**	1004 [illegible]	**NUEVO**	✓
CARGO	AYUDANTE	**FECHA**	13/11/2024	**ANTIGUO**	

PROCESO	TEMA	CAPACITADOR	METODO EVALUACION
GESTION INTEGRAL	▪ Misión, Visión ▪ principios corporativos ▪ Reseña histórica		ORAL
ADMINISTRATIVA	▪ Presentación de la Empresa. ▪ Reglamento interno de trabajo ▪ Entrega de funciones y responsabilidades del cargo ▪ Horario para el cargo ▪ Documentos obligatorios hoja de vida. ▪ Dotación ▪ Manejo de comunicación		ORAL
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	▪ Sistema General de Seguridad Social en Colombia, Ley 100/1993 ▪ Socialización de Políticas SST, alcohol drogas y tabaco y respuesta ante emergencias ▪ Socialización de Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. ▪ Socialización de la matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros y sus respectivas recomendaciones. ▪ Presentación de comités y sus funciones: COPASST, CONVIVENCIA LABORAL ▪ Responsabilidades generales en SG-SST ▪ Plan de emergencias ▪ Procedimiento de reporte de incidente o accidente laboral ▪ Socialización PAPSO ▪ Socialización Protocolo de bioseguridad		ORAL

OBSERVACIONES

Yoneison O.			
FIRMA DEL TRABAJADOR	**GERENCIA**	**JEFE INMEDIATO**	**RESPONSABLE SST**

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT 901 767 013-6

CONSORCIO CIVIL H&E

NIT: 901 767.013-6

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

INSPECCIÓN DE CAMILLA

FECHA	18/11/2024	HORA	9:00 am
RESPONSABLE	Lizeth Lino Cuellar	CARGO	SST
UBICACIÓN DE CAMILLA	obra		

ITEN	ELEMENTO	ESTADO (B/M)	OBSERVACIONES
1	¿Se encuentra la camilla debidamente ubicada y señalizada?	B	
2	¿En qué estado se encuentra la camilla a la hora de la inspección?	B	
3	¿Cuenta la camilla con sus respetivas correas de ajuste para traslado de paciente?	B	
4	¿En que estado se encuentran las camillas?	B	
5	¿Cuenta la camilla con su respectivo inmovilizador cervical?	B	
6	¿En qué estado se encuentra el cervical?	B	
7	¿En que condiciones de limpieza se encuentra la camilla al momento de inspección?	B	
8	¿La camilla cuenta con algun otro elemento?	NO	

Hallazgos encontrados	Plana de acción	Fecha programada	Fecha ejecutada

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO CIVIL H&E	
	NIT: 901 767.013-6	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV 2023
		PÁG. 1 DE 1

INSPECCION CONTENIDO DE BOTIQUINES

ELEMENTO	SI	NO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACION
ISODINE ESPUMA	X			
AGUA OXIGENADA	X			
SUERO FISIOLOGICO	X			
GUANTES QUIRURGICOS	X			
GASA ESTERIL	X			
VENDAS TRIANGULARES	X			
VENDA ELASTICA	X			
APLICADORES	X			
BAJA LENGUA	X			
ESPARADRAPO	X			
CURAS	X			
TIJERAS	X			
SUERO ORAL	X			
APOSITO OCULAR	X			
TOALLAS HIGIENICAS	X			

RESPONSABLE		**FECHA**	18/11/2024
UBICACION	obra		
RESPONSABLE INSPECCION	Lizeth Lura Cuellar		

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT: 901.767.013-6

CONSORCIO CIVIL H&E

NIT: 901 767.013-5 | VERSION 01

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST | FECHA NOV 2023

INSPECCION MENSUAL DE EXTINTORES

CONTRATO: CLIPH401 De 2023

AREA DE INSPECCION: obra FECHA: 18 Noviembe 2024

DATOS GENERALES					RESULTADOS DE LA INSPECCION MENSUAL												
N° de extintor	Ubicación en la Obra	Capacidad en Lbs	Tipo	Fecha Recarga	Precinto de seguridad		Pasador y Boquilla		Estado Manguera		Estado Valvula		Estado Soporte		Marcación Piso		OBSERVACIONES
					Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	SI	No	
1	obra	20	ABC	12/2015	X		X		X		X		X		X		

OBSERVACIONES GENERALES

Inspección Realizada por: Lizeth Luna Cuellar
Firma

Nombre Asistente:

Tipo de contratista:
Empleado Directo
Empleado por Proy.

Cargo Asistente PCI-SCO
Cargo Asistente PCI-SC

Cargo Asistente PCI-ABC
Cargo Asistente

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT. 901.767.013-6

CONSORCIO CIVIL H&E

NIT 901767013-6

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

FECHA: SEMANA DEL 5 AL 9 NOVIEMBRE 2024

LUGAR: OBRA

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	L	M	M	J	V	S	FIRMA
1	DYER ADRIAN ESPAÑA	1083876435	oficial	/	X	X	X	X	X	
2	SEBASTIAN ESPAÑA	1083876435	ayudante	/	X	X	X	X	X	
3	YEFERSON MEDINA	1080937225	ayudante	/	X	X	X	X	X	
4	YONEISON CORREA ORTIZ	1004440666	ayudante	/	X	X	X	X	X	
5	JUAN CARLOS SANCHEZ	1081514075	ingeniero residente	/	X	X	X	X	X	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT. 901.767.013-6

CONSORCIO CIVIL H&E

NIT 901767013-6

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

FECHA: SEMANA DEL 12 AL 16 NOVIEMBRE. 2024

LUGAR: OBRA

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	L	M	M	J	V	S	FIRMA
1	DYER ADIAN ESPAÑA	1088876435	Oficial	/	X	X	X	X	X	Dyer Adian España.
2	SEBASTIAN ESPAÑA	1083878435	Ayudante	/	X	X	X	X	X	Sebastian España
3	YEFERSON MEDINA	1050937225	Ayudante.	/	X	X	X	X	X	Yefferson Medina
4	JONATHAN ESPAÑA M.	1080935714	Ayudante.	/	X	X	X	X	X	Jonatha España
5	JUAN CARLOS SANCHEZ	1081514035	Ayudante	/	X	X	X	X	X	Juan Carlos Sanchez.T.
6	YONELSON COLLERA	004440666	Ayudante	/	/	X	X	X	X	YONELSON C.
7										
8										
9										
10										
11										
12										

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT. 901.767.013-6

CONSORCIO CIVIL H&E

NIT 901767013-6

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

FECHA: SEMANA Del 18 Al 23 NOVIEMBRE 2024

LUGAR: OBRA

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	L	M	M	J	V	S	FIRMA
1	DIYER ADRIAN ESPAÑA	1083876435	Oficial	X	X	X	X	X	X	Diyer Adrian España
2	SEBASTIAN ESPAÑA	1083876435	Ayudante	X	X	X	X	X	X	Sebastian España
3	YEEERSON MEDINA	1080937225	Ayudante	X	X	X	X	X	X	Yeferson medina
4	JONATHAN ESPAÑA	1080935714	Ayudante	V	V	X	X	X	X	Jonathan España.
5	JONEISON CORREA	100440666	Ayudante	X	X	X	X	X	X	yoneison C.
6	JUAN CARLOS SANCHEZ	1081514075	Ingeniero Residente	X	X	X	X	X	X	Juan Carlos Sanchez.
7										
8										
9										
10										
11										
12										

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT. 901.767.013-6

CONSORCIO CIVIL H&E

NIT: 901767013-6

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

FECHA: SEMANA DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

LUGAR: OBRA

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	L	M	M	J	V	S	FIRMA
1	DYER ADRIAN ESPAÑA	1083876435	oficial	X	X	X	X	X	X	Dyer Adrian España
2	SEBASTIAN ESPAÑA	1083876435	Ayudante	X	X	X	X	X	X	Sebastian España
3	YEFERSON MEDINA	1080937225	Ayudante	X	X	X	X	X	X	Yeferson Medina P.
4	JONATHAN ESPAÑA	1080935714	Ayudante	X	X	X	X	X	X	Jonathan España
5	JONEISON CORREA	1004140666	Ayudante	X	X	X	X	X	X	Yoneison C.
6	JUAN CARLOS SANCHEZ	1081514075	Ingeniero residente	X	X	X	X	X	X	Juan Carlos Sanchéz.
7										
8										
9										
10										
11										
12										

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E NIT: 901.767.013-6	CONSORCIO CIVIL H&E	Versión 01
	NIT: 901.767.013-6	Codigo
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	
	LIZETH HAIROBY LUNA CUELLAR	Fecha
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	28/11/2023

AREA/PLANTA Y/O LUGAR DE OPERACION	OBRA	FECHA DE ELABORACION	9 Noviembre 2024
DESCRIBA LA ACTIVIDAD A REALIZAR:	Fundición de zapatas	RESPONSABLE DEL APEA	Juan Carlos
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	Herramienta menor - Mezcladora.	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	
CONTACTOS DE EMERGENCIA			

DESCRIPCION EXACTA O MAS PROXIMA DEL LUGAR DE OPERACION Y DESCRIBA LAS ACTIVIDADES DE COMIENZO A FIN	No	PELIGRO	RIESGO	CONTROLES REQUERIDOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS (Preventivos/Protectivos/Reactivos)	CUMPLE: SI / NO / NA
INSPECCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO INSPECCIÓN DE LA HERRAMIENTA. INSPECCIÓN DE MEZCLADORA. SE TRASLADA EL MATERIAL DE PLAYA Y CEMENTO AL PUNTO. EL MATERIAL DE PLAYA, SE MEZCLA Y SE VACIA EN EL BUGGY. EL BUGGY TRASLADA LA MEZCLA AL PUNTO. VACIADO DE LA MEZCLA AL TERMINAR ACTIVIDADES SE DEJA EL LUGAR EN ORDEN Y ASEO.	1	Físico - Temperaturas externas (Calor o frio) Radiaciones	Quemadura Insolación Cefalea Mareo Deshidratación Estrés Térmico	Uso de los EPP - Uso camisa manga larga y Capuchón tipo monja	SI
				Hidratación	SI
	2	Condiciones de Seguridad - Locativo Orden y Aseo	Caidas Esguinces Pérdida de Materiales Golpes	Jornada de orden y aseo	SI
				Divulgación del procedimiento	SI
	3	Condiciones de seguridad - Locativo Superficies de Trabajo Terreno escarpado	Caidas del personal Resbalones Fracturas Esguinces Contusión	Inspección del terreno	SI
				Señalización	SI
				Uso de EPP	SI
	4	Condiciones de Seguridad - Locativos Trabajos en alturas	Pérdida humana	Programa de protección contra caidas	NA
				Capacitación y entrenamiento en trabajo en alturas	NA
			Caida Fractura Accidentes Graves	Programa de protección contra caidas	NA
				Uso de EPP para trabajos en alturas	NA
				Lista de verificacion para tareas de alto riesgo arnes y eslinga	NA
	5	Condiciones de seguridad Locativos Espacios Confinados	Pérdida humana, Caida Fractura Accidentes Graves	Verificación de atmosferas peligrosas	NA
				Programa De Protección Espacios Confinados	NA
				Capacitación de personal en espacios confinados	NA
				Uso de EPP	NA
	6	Condiciones de seguridad - Mecánico Uso de Herramientas Limpieza del área de trabajo	Lesiones por manejo inadecuado de herramientas manuales y equipos	Uso de los EPP	SI
				Verificación de Herramienta	SI
	7	Biomecánico Posturas inadecuadas y movimientos repetitivos Sobreesfuerzo	Hernias Esguinces Cansancio Trauma masculoar Fatiga Muscular	PVE Osteomuscular (Charla y capacitación en manejo de cargas)	SI
				Charla en uso y manejo de herramientas	SI
				Pausas activas	SI
	8	Psicosocial Acoso laboral y convivencia laboral	Estrés laboral bajo desempeño bajo rendimiento Baja motivación	Programación de actividades Bienestar	SI
				Convenio	SI
				Programa de Riesgo Psicosocial	SI
	14	Fenómenos Naturales Temblor Deslizamiento Tormenta Eléctrica Vendaval	Atrapamiento Precipitación Caidas	Plan de Emergencia	SI
	15	Orden Público Presencia de grupos armados al margen de la ley	Muerte Secuestro Atentados Robos	Plan de Emergencias	SI

SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA OPERACIÓN CUENTE CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESTEN DEBIDAMENTE ASEGURADOS ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD

Escaneado con CamScanner

CASCO	X	CAMISA MANGA LARGA	X	RESPIRADORES		ESLINGAS Y ELEMENTOS DE AMARRE		HERRAMIENTA MENOR X
GUANTES	X	PANTALON LARGO JEAN	X	TAPABOCAS	X	ARNES		HERRAMIENTAS ELECTRICAS
BOTAS DE SEGURIDAD	X	OVEROL		TAPAOIDOS	X	GUAYAS		MAQUINARIA Y VEHICULOS
GAFAS	X	GUANTES DE NITRILO	X	PETOS		MOSQUETONES		EQUIPOS X

DIVULGACION DEL ANALISIS DE EVALACION DE RIESGOS EJECUTORES.

Declaramos haber entendido la divulgacion del analisis de evaluacion de riesgos, y nos comprometemos a cumplir las condiciones de seguridad contempladas e informar sobre cualquier desviacion que se pueda presentar

NOMRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	OBSERVACIONES
SEBASTIAN ESPAÑA	1083876435	AYUDANTE.	
DIYER CHALA MEDINA	1080933023	OFICIAL.	
YEFERSON MEDINA P.	1080937225	AYUDANTE	

	LUNES	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado
FECHA						9 / 11 / 2024
FIRMA LIDER DE LA ACTIVIDAD						Juan Carlos.
FIRMA S.S.T.						Lizeth.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO CIVIL H&E	Versión 01
	NIT: 901.767.013-6	Codigo
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	
	LIZETH NAIROBY LUNA CUELLAR	Fecha
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	28/11/2023

ÁREA/PLANTA Y/O LUGAR DE OPERACION:	obra	FECHA DE ELABORACION	5 Noviembre 2024.
DESCRIBA LA ACTIVIDAD A REALIZAR:	Amarrado de acero e instalación en zapatas	RESPONSABLE DEL AREA	Juan Carlos
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	Herramienta menor.	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	
CONTACTOS DE EMERGENCIA:			

DESCRIPCION EXACTA O MAS PROXIMA DEL LUGAR DE OPERACIÓN Y DESCRIBA LAS ACTIVIDADES DE COMIENZO A FIN	No	PELIGRO	RIESGO	CONTROLES REQUERIDOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS (Preventivos/Protectivos/Reactivos)	CUMPLE: SI / NO / NA
INSPECCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO INSPECCIÓN DE LA HERRAMIENTA SE AMARRA EL ACERO SEGÚN ESPECIFICACIÓN POSTERIOR, SE INSTALA EL ACERO EN EL PUNTO DISPUESTO AL TERMINAR ACTIVIDADES. SE DEJA EL LUGAR EN ORDEN Y ASEO.	1	Físico - Temperaturas externas (Calor o frio) Radiaciones	Quemadura Insolación Cefalea Mareo Deshidratación Estado Gripales	Uso de los EPP - Uso camisa manga larga y Capuchón tipo monja.	SI
				Hidratación	SI
	2	Condiciones de Seguridad - Locativo: Orden y Aseo	Caídas Esguinces Pérdida de Materiales Golpes	Jornada de orden y aseo	SI
				Divulgación del procedimiento	SI
	3	Condiciones de seguridad - Locativo - Superficies de Trabajo. Terreno escabroso	Caídas del personal Resbalones Fracturas Esguinces Contusión	Inspección del terreno	SI
				Señalización	SI
				Uso de EPP.	SI
	4	Condiciones de Seguridad - Locativos Trabajos en alturas	Pérdida humana	Programa de protección contra caídas	NA
				Capacitación y entrenamiento en trabajo en alturas	NA
			Caída Fractura Accidentes Graves	Programa de protección contra caídas	NA
				Uso de EPP para trabajos en alturas	NA
				Lista de verificación para tareas de alto riesgo ames y eslinga	NA
	5	Condiciones de seguridad - Locativos: Espacios Confinados	Pérdida humana, Caída Fractura Accidentes Graves	Verificación de atmosferas peligrosas	NA
				Programa De Protección Espacios Confinados	NA
				Capacitación de personal en espacios confinados	NA
				Uso de EPP.	NA
	6	Condiciones de seguridad - Mecánico Uso de Herramientas Limpieza del área de trabajo	Lesiones por manejo inadecuado de herramientas manuales y equipos	Uso de los EPP	SI
				Verificación de Herramienta	SI
	7	Biomecánico - Posturas inadecuadas y movimientos repetitivos Sobreesfuerzo	Hernias Esguinces Calambres Trauma muscular Fatiga Muscular	PVE Osteomuscular (Charla y capacitacion en manejo de cargas)	SI
				Charla en uso y manejo de herramientas	SI
				Pausas activas	SI
	8	Psicosocial - Acoso laboral y sobrecarga laboral	Estrés laboral Bajo desempeño Bajo rendimiento Baja motivación	Programación de actividades Bienestar	SI
				Calistenia	SI
				Programa de Riesgo Psicosocial	SI
	14	Fenómenos Naturales - Terremoto Derrumbe Tormenta Eléctrica Vendaval	Atrapamiento Electrocucion Caídas	Plan de Emergencia	SI
	15	Orden Público Presencia de grupos armados al margen de la ley	Muerte Secuestro Atentado Robos	Plan de Emergencias	SI

SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA OPERACIÓN CUENTE CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LAS HERRAMIENTAS O EQUIPOS ESTEN INSPECCIONADOS ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD

Escaneado con CamScanner

CASCO	X	CAMISA MANGA LARGA	X	RESPIRADORES		ESLINGAS Y ELEMENTOS DE AMARRE		HERRAMIENTA MENOR X
GUANTES	X	PANTALON LARGO JEAN	X	TAPABOCAS		ARNES		HERRAMIENTAS ELECTRICAS
BOTAS DE SEGURIDAD	X	OVEROL		TAPAOIDOS		GUAYAS		MAQUINARIA Y VEHICULOS
GAFAS	X	GUANTES DE NITRILO		PETOS		MOSQUETONES		EQUIPOS

DIVULGACION DEL ANALISIS DE EVALACION DE RIESGOS EJECUTORES.

Declaramos haber entendido la divulgacion del analisis de evalacion de riesgos, y nos comprometemos a cumplir las condiciones de seguridad contempladas e informar sobre cualquier desviacion que se pueda presentar

NOMRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	OBSERVACIONES
SEBASTIAN ESPAÑA	1083876435	AYUDANTE	
DIYER CHATA MEDINA	1080933023	OFICIAL	
YEFERSON MEDINA FUENTES	1080937225	AYUDANTE	

	LUNES	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado
FECHA		5/11/24	6/11/24			
FIRMA LIDER DE LA ACTIVIDAD		Juan Carlos	Juan Carlos			
FIRMA S.S.T.		Izeth	Izeth			

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO CIVIL H&E	Versión 01
	NIT: 901.767.013-6	Codigo
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	
	LIZETH NAIROBY LUNA CUELLAR	Fecha
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	29/11/2023

ÁREA/PLANTA Y/O LUGAR DE OPERACION:	OBRA	FECHA DE ELABORACION	12 Noviembre 2024
DESCRIBA LA ACTIVIDAD A REALIZAR:	Fundición de zapatas - Armare de acero	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	Juan Carlos
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	Herramienta menor - Mezcladora	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	
CONTACTOS DE EMERGENCIA:			

DESCRIPCION EXACTA O MAS PROXIMA DEL LUGAR DE OPERACIÓN Y DESCRIBA LAS ACTIVIDADES DE COMIENZO A FIN	No	PELIGRO	RIESGO	CONTROLES REQUERIDOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS (Preventivos/Protectivos/Reactivos)	CUMPLE: SI / NO / NA
INSPECCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO INSPECCIÓN DE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO. SE TRASLADA EL ACERO AL LUGAR Y SE AMARRA CON ALAMBRE. EN LA MEZCLADORA SE INGRESA EL MATERIAL DE PLAYA POSTERIOR SE VACIA LA MEZCLA AL BUGGY SE TRANSPORTA LA MEZCLA EN BUGGY Y SE VACIA SOBRE EL LUGAR A FUNDIR SE APLICA VIBRO Y SE DA TERMINACIÓN A LA FUNDICIÓN AL TERMINAR ACTIVIDADES, SE DEJA EL LUGAR EN ORDEN Y ASEO.	1	Físico - Temperaturas externas (Calor o frio) Radiaciones	Quemadura Insolación Cefalea Mareo Deshidratación Estado Gripales	Uso de los EPP - Uso camisa manga larga y Capuchón tipo monja	SI
				Hidratación	SI
	2	Condiciones de Seguridad - Locativo Orden y Aseo	Caídas Esguinces Pérdida de Materiales Golpes	Jornada de orden y aseo	SI
				Divulgación del procedimiento	SI
	3	Condiciones de seguridad - Locativo Superficies de Trabajo Terreno escabroso	Caídas del personal Resbalones Fracturas Esguinces Contusión	Inspección del terreno	SI
				Señalización	SI
				Uso de EPP	SI
	4	Condiciones de Seguridad - Locativos. Trabajos en alturas	Pérdida humana	Programa de protección contra caídas	NA
				Capacitación y entrenamiento en trabajo en alturas	NA
			Caída Fractura Accidentes Graves	Programa de protección contra caídas	NA
				Uso de EPP para trabajos en alturas	NA
				Lista de verificación para tareas de alto riesgo arnes y eslinga	NA
	5	Condiciones de seguridad - Locativos Espacios Confinados	Pérdida humana, Caída Fractura Accidentes Graves	Verificación de atmosferas peligrosas	NA
				Programa De Protección Espacios Confinados	NA
				Capacitación de personal en espacios confinados	NA
				Uso de EPP	NA
	6	Condiciones de seguridad - Mecánico Uso de Herramientas Limpieza del área de trabajo	Lesiones por manejo inadecuado de herramientas manuales y equipos	Uso de los EPP	SI
				Verificación de Herramienta	SI
	7	Biomecánico - Posturas inadecuadas y movimientos repetitivos Sobreesfuerzo	Hernias Esguinces Calambres Trauma muscular Fatiga Muscular	PVE Osteomuscular (Charla y capacitación en manejo de cargas)	SI
				Charla en uso y manejo de herramientas	SI
				Pausas activas	SI
	8	Psicosocial - Acoso laboral y sobrecarga laboral	Estrés laboral Bajo desempeño Bajo rendimiento Baja motivación	Programación de actividades Bienestar	SI
				Catedrina	SI
				Programa de Riesgo Psicosocial	SI
	14	Fenómenos Naturales - Terremoto Derrumbe Tormenta Eléctrica Vendaval	Atrapamiento Electrocución Caídas	Plan de Emergencia	SI
	15	Orden Público Presencia de grupos armados al margen de la Ley	Muerte Secuestro Atentado Robos	Plan de Emergencias	SI

SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA OPERACIÓN CUENTE CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LAS HERRAMIENTAS O EQUIPOS ESTEN INSPECCIONADOS ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD

Escaneado con CamScanner

CASCO	X	CAMISA MANGA LARGA	X	RESPIRADORES		ESLINGAS Y ELEMENTOS DE AMARRE		HERRAMIENTA MENOR X
GUANTES	X	PANTALON LARGO JEAN	X	TAPABOCAS	X	ARNES		HERRAMIENTAS ELECTRICAS
BOTAS DE SEGURIDAD	X	OVEROL		TAPAOIDOS		GUAYAS		MAQUINARIA Y VEHICULOS
GAFAS	X	GUANTES DE NITRILO	X	PETOS		MOSQUETONES		EQUIPOS X

DIVULGACION DEL ANALISIS DE EVALACION DE RIESGOS EJECUTORES.

Declaramos haber recibido la divulgación del análisis de evaluación de riesgos y nos comprometemos a cumplir las condiciones de seguridad contempladas en "forma" como cualquier otra que se pueda presentar

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	OBSERVACIONES
DIYER CHALA MEDINA	1080933023	OFICIAL	
SEBASTIAN ESPAÑA	1083876435	AYUDANTE -	
YEFERSON MEDINA FUENTES	1080937225	AYUDANTE	
JONATHAN ESPAÑA	1080935714	AYUDANTE	
YONEISON CORREA	1004440666	AYUDANTE	

	LUNES	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado
FECHA	/	12/11/2024	13/11/2024	14/11/2024	15/11/2024	16/11/2024
FIRMA LIDER DE LA ACTIVIDAD		Juan Carlos	Juan Carlos	Juan Carlos	Juan	Carlos Juan C.
FIRMA S.S.T		Lizeth	Lizeth	Lizeth.	Lizeth	Lizeth.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO CIVIL H&E NIT: 901.767.013-6 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	VERSIÓN: 01 FECHA: NOV. 2023 PÁG.: 1 DE 1
	INDUCCION - REINDUCCION	

REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INDUCCIÓN

NOMBRE	JONATHAN ESPAÑA	**CC**	1080935714	**NUEVO**	X
CARGO	ESPAÑA	**FECHA**	12/11/2024	**ANTIGUO**	

PROCESO	TEMA	CAPACITADOR	METODO EVALUACION
GESTION INTEGRAL	▪ Misión, Visión ▪ principios corporativos ▪ Reseña histórica	Lizeth	**ORAL**
ADMINISTRATIVA	▪ Presentación de la Empresa. ▪ Reglamento interno de trabajo ▪ Entrega de funciones y responsabilidades del cargo ▪ Horario para el cargo ▪ Documentos obligatorios hoja de vida. ▪ Dotación ▪ Manejo de comunicación	Lizeth	**ORAL**
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	▪ Sistema General de Seguridad Social en Colombia, Ley 100/1993 ▪ Socialización de Políticas SST, alcohol drogas y tabaco y respuesta ante emergencias ▪ Socialización de Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. ▪ Socialización de la matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros y sus respectivas recomendaciones. ▪ Presentación de comités y sus funciones: COPASST, CONVIVENCIA LABORAL ▪ Responsabilidades generales en SG-SST ▪ Plan de emergencias ▪ Procedimiento de reporte de incidente o accidente laboral ▪ Socialización PAPSO ▪ Socialización Protocolo de bioseguridad	Lizeth	**ORAL**
OBSERVACIONES			

Jonathan España.			
FIRMA DEL TRABAJADOR	**GERENCIA**	**JEFE INMEDIATO**	**RESPONSABLE SST**

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO CIVIL H&E NIT: 901.767.013-6	[illegible]
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	[illegible]

INDUCCION - REINDUCCION

REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INDUCCIÓN

NOMBRE	YONEISON CORREA OR	**CC**	[illegible]	**NUEVO**	X
CARGO	AYUDANTE	**FECHA**	13/11/2024	**ANTIGUO**	

PROCESO	TEMA	CAPACITADOR	METODO EVALUACION
GESTION INTEGRAL	▪ Misión, Visión ▪ principios corporativos ▪ Reseña histórica	[signature]	ORAL
ADMINISTRATIVA	▪ Presentación de la Empresa. ▪ Reglamento interno de trabajo ▪ Entrega de funciones y responsabilidades del cargo ▪ Horario para el cargo ▪ Documentos obligatorios hoja de vida. ▪ Dotación ▪ Manejo de comunicación	[signature]	ORAL
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	▪ Sistema General de Seguridad Social en Colombia, Ley 100/1993 ▪ Socialización de Políticas SST, alcohol drogas y tabaco y respuesta ante emergencias ▪ Socialización de Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. ▪ Socialización de la matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros y sus respectivas recomendaciones. ▪ Presentación de comités y sus funciones: COPASST, CONVIVENCIA LABORAL ▪ Responsabilidades generales en SG-SST ▪ Plan de emergencias ▪ Procedimiento de reporte de incidente o accidente laboral ▪ Socialización PAPSO ▪ Socialización Protocolo de bioseguridad	[signature]	ORAL

OBSERVACIONES

Yoneison O.	[signature]		[signature]
FIRMA DEL TRABAJADOR	**GERENCIA**	**JEFE INMEDIATO**	**RESPONSABLE SST**

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT 901 767 013-6

CONSORCIO CIVIL H&E

NIT: 901 767.013-6

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

INSPECCIÓN DE CAMILLA

FECHA	18/11/2024	HORA	9:00 am
RESPONSABLE	Lizeth Lino Cuellar	CARGO	SST
UBICACIÓN DE CAMILLA	obra		

ITEN	ELEMENTO	ESTADO (B/M)	OBSERVACIONES
1	¿Se encuentra la camilla debidamente ubicada y señalizada?	B	
2	¿En qué estado se encuentra la camila a la hora de la inspección?	B	
3	¿Cuenta la camila con sus respetivas correas de ajuste para traslado de paciente?	B	
4	¿En que estado se encuentran las camillas?	B	
5	¿Cuenta la camilla con su respectivo inmovilizador cervical?	B	
6	¿En qué estado se encuentra el cervical?	B	
7	¿En que condiciones de limpeza se encuentra la camila al momento de inspección?	B	
8	¿La camila cuenta con algun otro elemento?	NO	

Hallazgos encontrados	Plana de acción	Fecha programada	Fecha ejecutada

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO CIVIL H&E	
	NIT: 901 767.013-6	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV 2023
		PÁG. 1 DE 1

INSPECCION CONTENIDO DE BOTIQUINES

ELEMENTO	SI	NO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACION
ISODINE ESPUMA	X			
AGUA OXIGENADA	X			
SUERO FISIOLOGICO	X			
GUANTES QUIRURGICOS	X			
GASA ESTERIL	X			
VENDAS TRIANGULARES	X			
VENDA ELASTICA	X			
APLICADORES	X			
BAJA LENGUA	X			
ESPARADRAPO	X			
CURAS	X			
TIJERAS	X			
SUERO ORAL	X			
APOSITO OCULAR	X			
TOALLAS HIGIENICAS	X			

RESPONSABLE		FECHA	18/11/2024
UBICACION	obra		
RESPONSABLE INSPECCION	Lizeth Luna Cuellar		

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT. 901.767.013-6

CONSORCIO CIVIL H&E

NIT: 901 767.013-6 | VERSION: 01

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST | FECHA: NOV 2023

INSPECCIÓN MENSUAL DE EXTINTORES

CONTRATO: CLIPH401 DE 2023

AREA DE INSPECCION: obra FECHA: 13 Noviembe 2024

DATOS GENERALES					RESULTADOS DE LA INSPECCION MENSUAL												
N° de extintor	Ubicación en el Área	Capacidad del	Tipo	Fecha Recarga	Presión de manómetro		Precinto y Seguridad		Estado Manguera		Estado Manivela		Estado Boquilla		Manómetro Pinza		OBSERVACIONES
					Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Si	No	
1	obra	20	PQS	2025	X		X		X		X		X		X		

OBSERVACIONES GENERALES

Inspección Realizada por: Lizeth Lina Cuellar
Firma

Nombre Asistente:

Cargo Asistente: Auxiliar SST

Firma Asistente:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT. 901.767.013-6

CONSORCIO CIVIL H&E

NIT 901767013-6

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG SST

FECHA: SEMANA DEL 5 AL 9 NOVIEMBRE 2024

LUGAR: OBRA

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	L	M	M	J	V	S	FIRMA
1	DYER ADRIAN ESPAÑA	1083876435	oficial	/	X	X	X	X	X	Dyer Adrian España
2	SEBASTIAN ESPAÑA	1083876435	Ayudante	/	X	X	X	X	X	Sebastian España
3	YEFERSON MEDINA	1080931225	ayudante	/	X	X	X	X	X	Yeferson Medina
4	YONEISON CORREA ORTIZ	1004440666	Ayudante	/	X	X	X	X	X	YONEISON C.
5	JUAN CARLOS SANCHEZ	1081514075	Ingeniero residente	/	X	X	X	X	X	Juan Carlos Sanchez
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT. 901.767.013-6

CONSORCIO CIVIL H&E

NIT 901767013-0

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

FECHA: SEMANA DEL 12 AL 16 NOVIEMBRE. 2024

LUGAR: OBRA

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	L	M	M	J	V	S	FIRMA
1	DYER ADRIAN ESPAÑA	1083876435	Oficial	/	X	X	X	X	X	Dyer Adrian España.
2	SEBASTIAN ESPAÑA	1083876435	Ayudante	/	X	X	X	X	X	Sebastian España
3	YEFERSON MEDINA	1050937225	Ayudante.	/	X	X	X	X	X	Yefferson Medina
4	JONATHAN ESPAÑA M.	1080935714	Ayudante.	/	X	X	X	X	X	Jonatha España
5	JUAN CARLOS SANCHEZ	1081514075	Ayudante	/	X	X	X	X	X	Juan Carlos Sanchez T.
6	YONELSON COLPEA	004440666	Ayudante	/	/	X	X	X	X	YONELSON C.
7										
8										
9										
10										
11										
12										

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT. 901.767.013-6

CONSORCIO CIVIL H&E

NIT. 901767013-6

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

FECHA: SEMANA DEL 18 AL 23 NOVIEMBRE 2024

LUGAR: OBRA

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	L	M	M	J	V	S	FIRMA
1	DIYER ADRIAN ESPAÑA	1083876435	Oficial	X	X	X	X	X	X	Diyer Adrian España
2	SEBASTIAN ESPAÑA	1083876435	Ayudante	X	X	X	X	X	X	Sebastian España
3	YEEERSON MEDINA	1080937225	Ayudante	X	X	X	X	X	X	Yeferson medina
4	JONATHAN ESPAÑA	1080935714	Ayudante	V	V	X	X	X	X	Jonathan España.
5	JONEISON CORREA	100440666	Ayudante	X	X	X	X	X	X	yoneison C.
6	JUAN CARLOS SANCHEZ	1081514075	Ingeniero Residente	X	X	X	X	X	X	Juan Carlos Sanchez.
7										
8										
9										
10										
11										
12										

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT. 901.767.013-6

CONSORCIO CIVIL H&E

NIT: 901767013-6

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

FECHA: SEMANA DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

LUGAR: OBRA

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	L	M	M	J	V	S	FIRMA
1	DYER ADRIAN ESPAÑA	1083876435	Oficial	X	X	X	X	X	X	Dyer Adrian España
2	SEBASTIAN ESPAÑA	1083876435	Ayudante.	X	X	X	X	X	X	Sebastian España
3	YEFERSON MEDINA	1080937225	Ayudante.	X	X	X	X	X	X	Yeferson Medina P.
4	JONATHAN ESPAÑA	1080935714	Ayudante.	X	X	X	X	X	X	Jonathan España
5	JONEISON CORREA	1004406606	Ayudante.	X	X	X	X	X	X	Yoneison C.
6	JUAN CARLOS SANCHEZ	1081514075	Ingeniero residente.	X	X	X	X	X	X	Juan Carlos Sanchez.
7										
8										
9										
10										
11										
12										

Escaneado con CamScanner

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. _ **CIHCM420 DE de 2023**_

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 05

MENSUAL [X] **FINAL** [ ]

Objeto Contrato: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA LEGAL Y FINANCIERA A DOS (02) CONTRATO DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA



MUNICIPIO: **TIMANA.**

DEPARTAMENTO: **HUILA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CIHCM420 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO WF.

APOYO A LA SUPERVISIÓN	1. CESAR JOAQUIN VELASQUEZ TIQUE	**ENTIDAD**	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	**CIHCM420 DE 2023**		
OBJETO	**INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA LEGAL Y FINANCIERA A DOS (02) CONTRATO DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA**	**PERIODO DEL INFORME**	Entre 01 de noviembre al 30 De noviembre de 2024
CONTRATISTA	CONSORCIO WF	**NIT:**	901769619-8
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	**C.C:**	7.711.430


FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	09 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.
FECHA DE SUSPENSION 1:	26 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO 1:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024
OTROSÍ No.1: 24/09/2024	MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA 4 -PLAZO DEL CONTRATO- VIGENCIA FISCAL.
OTROSÍ No.2: 12/11/2024	Prórroga: VEINTE (20) DÍAS.
PLAZO ADICIONAL:	VEINTE (20) DÍAS.
PLAZO TOTAL:	TRES (03) MESES Y VEINTE (20) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.
VALOR INICIAL:	OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($88.657.430,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	N/A
VALOR TOTAL:	OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($88.657.430,00) M/CTE

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	CLPIH401 DE 2023

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA **VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA** DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATISTA	CONSORCIO CIVIL H&E	**NIT:**	901.767.013-6
REPRESENTANTE LEGAL:	HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON	**C.C:**	79.944.179
FECHA SUSCRIPCIÓN	02 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16 DE NOVIEMBRE DE 2023		
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.		
FECHA DE SUSPENSION 1:	26 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE REINICIO 1:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
OTROSÍ No.1: 24/09/2024	MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA 4 -PLAZO DEL CONTRATO- VIGENCIA FISCAL.		
OTROSÍ No.1: 12/11/2024	**Prorroga**: UN (1) MES. **Adición**: SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO ($ 75.179.371) M/CTE.		
PLAZO ADICIONAL (No.1)	UN (1) MES		
PLAZO TOTAL:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.		
VALOR ADICIONAL (12/11/2024):	Setenta y cinco millones ciento setenta y nueve mil trescientos cincuenta y siete pesos ($75.179.357) M/CTE.		
VALOR TOTAL:	**SEISCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS ($ 626.662.540) M/CTE.**		
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	**NIT:**	Nit. 901.769.619-8
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	**C.C:**	7.711.430

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Cubierta Autoportante con Iluminación para la Vereda Pantanos de la Zona Rural del Municipio Timana - Departamento Del Huila

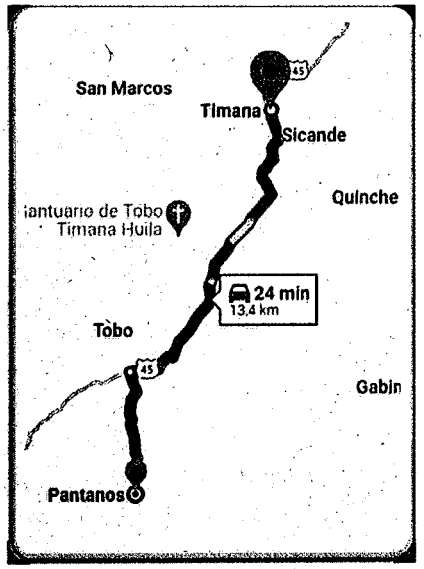

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La misión del INDERHUILA es generar y brindar a la comunidad oportunidades de participación en los procesos de iniciación, formación, fomento y práctica del deporte, la educación física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, como contribución al desarrollo integral del individuo, para el mejoramiento de la calidad de vida de la población del Departamento del Huila, por medio de la masificación, la promoción y el apoyo a la práctica deportiva.

En consecuencia, de lo anterior se requiere la adecuación locativa de los terrenos existentes para llevar a cabo la **CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA;** lo permitirán a la población realizar las prácticas deportivas, que van a contribuir con la mejora de la calidad de vida de las personas que acuden a estos escenarios recreo deportivos. Se resalta que este tipo de obras contribuyen a minimizar el déficit de espacios deportivos que existe en el Departamento del Huila.

El objetivo principal es promover la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre hacia el desarrollo humano integral; donde se promuevan y estimulen los valores para la convivencia, participación, disminución de la violencia, y construcción del tejido social: apoyado en estrategias que beneficien los habitantes de la ciudad para fortalecer el desarrollo del deporte la recreación y la educación física, con la implementación de programas orientados a' la construcción de tejido social y convivencia ciudadana en la totalidad de la población Huilense con una infraestructura deportiva técnicamente adecuada, desarrollando acciones articuladas entre sí, que mejoren la calidad de vida de todas y todos los habitantes del Departamento del Huila, bajo los principios de sostenibilidad ambiental, participación ciudadana, democracia, equidad e inclusión de personas con movilidad reducida y respeto por las libertades individuales y que permitan posicionar al Departamento en el contexto regional, nacional y mundial, en concordancia con las Políticas Departamentales y Nacionales.

Las presentes especificaciones contienen el alcance para la ejecución de las obras de construcción de las cubiertas en el Departamento del Huila.

El proyecto arquitectónico contempla un área construida de 937.20 M2 por cubierta aproximadamente. en que se encuentra contemplada la construcción de la cubierta autoportante con teja metálica cal. 22 para el polideportivo ubicado fa vereda pantanos de la zona rural del municipio de Timana departamento del Huila la cual tiene una destinación de uso recreativo, deportivo y cultural; correspondientes a estructura, cubierta, iluminación y sistema hidráulico para el manejo de aguas lluvias.

La cubierta será con sistema auto portante, sostenida con columnas en concreto de 3000 PSI. sistema estructural propuesto consiste en columnas y vigas aéreas en concreto reforzado en 3000 PSI y una cimentación tipo zapatas, vigas de cimentación y viga canal. Todas las obras deberán atender lo establecido en la NORMA SISMORESITENTE de 2010 - NSR-10.

El proyecto consiste en la construcción de (1) cubierta autoportante con iluminación para la vereda pantanos de la zona rural del Municipio de Timana Departamento del Huila

Es un sistema de estructura en concreto y teja auto portante a base de lámina de acero cal. 22:
- Actividades preliminares.
- Cimentación en concreto.
- Estructura en concreto.
- Cubierta.
- Instalaciones hidrosanitarias.
- Instalaciones eléctricas.

5. INFORME CONCRETO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DURANTE EL PERIODO

Se realizaron diversas actividades clave para avanzar en la cimentación de la obra. Primero, se ejecutaron trabajos de amarre de acero para las zapatas y columnas, tanto en el Eje A como en el Eje B. Se continuó con la excavación y perfilado manual para las vigas de cimentación en el Eje B. Luego, se fundieron las zapatas (B5, B6, B4, B3, B2 y B1) y las zapatas en Eje A. También se instaló el acero y las formaletas para las vigas en el Eje B, y se fundieron las vigas correspondientes.

Se realizó el relleno con crudo de río y recebo, seguido de compactación mecánica en ambos ejes. Además, se realizó un replanteo para el corte de placa y la instalación de un filtro perforado para garantizar el drenaje adecuado. Estas actividades proporcionaron una base sólida para la estructura y avanzaron significativamente en la cimentación de la obra.

6. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	16/11/2023	40		
Suspensión No. 1	26/12/2023			
Reiniciación No. 1	24/09/2024	37	273	
Otrosi No. 2	12/11/2024	30		
TERMINACIÓN Cto.				13/12/2024
TOTAL DIAS		107	273	

7. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA DE INICIO	1	16/11/2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN – SUSPENSIÓN 1	1	26/12/2023
ACTA DE SUSPENSIÓN	1	26/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN - REINICIO 1	2	24/09/2024
ACTA DE REINICIO	1	24/09/2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN - OTROSÍ No.01	3	24/09/2024
OTROSÍ	1	24/09/2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN - OTROSÍ No.02	4	12/11/2024
OTROSÍ No.02	2	12/11/2024

8. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

a). Obligaciones de Carácter General.	1. Se he realizado la entrega de documentación en papel reciclado. 2. Se realizó los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales y se dio cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social (Salud, Pensión y riesgos), que corresponden de acuerdo con el personal que se empleó. 3. Se suscribió con el contratista de obra el acta de justificación N°4 y otrosí N°2 el día 12/11/2024. 4. Se verifico los ajustes estructurales de diseños entregados por INDERHUILA. 5. Se solicito al contratista de obra, actualización de las pólizas, las cuales se cargaron en la plataforma secop II y radicaron a la entidad para su aprobación. 6. Se realizaron comités de obra
b.) Actividades operativas	La interventoría, en calidad de ente supervisor, gestiono, reviso y aprobó las siguientes actividades: Amarre de acero para zapatas: Se realizó el amarre de acero en las zapatas, las cuales son las bases fundamentales para la cimentación. El proceso consiste en colocar y unir las varillas de acero según los planos estructurales para asegurar la resistencia y estabilidad de las zapatas. Excavación manual de viga de cimentación y perfilado en Eje B: Se continuó con la excavación manual en el Eje B para la viga de cimentación. Este trabajo incluyó el perfilado del terreno, asegurando que las dimensiones y el nivel del terreno fueran adecuados para la correcta instalación de la viga. Instalación de formaletas y acero para zapatas en Eje A: En el Eje A, se instalaron las formaletas que servirán como moldes temporales para las zapatas. También se colocó el acero de refuerzo en las zapatas, siguiendo las especificaciones del diseño estructural para garantizar su resistencia.

	Fundición de zapatas B5 y B6: Se procedió con la fundición de las zapatas B5 y B6, que consistió en verter concreto en las formaletas ya preparadas, creando una base sólida para la estructura de la obra. Fundición de zapatas B4 y B3: De manera similar, se continuó con la fundición de las zapatas B4 y B3, asegurando la correcta ejecución de la cimentación para las siguientes fases de la construcción. Fundición de zapatas B2 y B1: Se completó la fundición de las zapatas B2 y B1, finalizando la cimentación en el Eje B con concreto fresco para crear las bases necesarias para las futuras estructuras. Instalación de acero para vigas en Eje B: Se instaló el acero de refuerzo necesario para las vigas del Eje B. Este paso es crucial para la resistencia de las vigas, ya que el acero proporciona la tracción y soporte que el concreto por sí solo no puede ofrecer. Instalación de formaletas para vigas en Eje B: Se procedió con la instalación de las formaletas para las vigas en el Eje B, que son moldes temporales que dan forma al concreto que se verterá posteriormente. Fundición de vigas en Eje B: Tras la instalación de las formaletas y el acero de refuerzo, se realizó la fundición de las vigas del Eje B, vertiendo concreto fresco en las formaletas para dar forma a las vigas de la estructura. Amarre de acero para columnas en Eje B: Se realizó el amarre de acero para las columnas en el Eje B, que implica organizar y unir las varillas de acero según el diseño estructural, asegurando que las columnas tengan la resistencia necesaria para soportar las cargas. Relleno con crudo de río: Se procedió a realizar un relleno en la base de la cimentación con crudo de río, un material que ofrece estabilidad y buen drenaje para la estructura, favoreciendo una base firme y duradera. Compactación mecánica del terreno: Después del relleno, se llevó a cabo una compactación mecánica del terreno utilizando maquinaria especializada, para asegurar que el suelo tuviera la densidad adecuada y evitar asentamientos futuros. Fundición de zapatas en Eje A: En el Eje A, se realizó la fundición de las zapatas, similar a las zapatas de Eje B, vertiendo concreto fresco en las formaletas instaladas para crear las bases de la cimentación. Relleno con recebo: Se aplicó un relleno con recebo, que es un material compuesto por tierra y grava, que se utiliza para mejorar las condiciones del terreno en la base de la cimentación. Compactación mecánica del relleno: Al igual que con el crudo de río, el relleno con recebo fue compactado mecánicamente para asegurar que el terreno tuviera la densidad necesaria y proporcionar una base sólida y estable para la obra. Replanteo para corte de placa e instalación de filtro perforado: Se realizó un replanteo para marcar las ubicaciones precisas de los cortes de placa y la instalación del filtro perforado. El filtro perforado se utilizará para garantizar un drenaje adecuado en la cimentación y evitar la acumulación de agua.

	Amarre de acero para columnas (segunda fase): Finalmente, se continuó con el amarre de acero para las columnas en el Eje B, un paso esencial para asegurar que las columnas tengan la capacidad de resistir las cargas de la estructura.
d). Actividades Administrativas.	1. Se realiza control y seguimiento del personal que ejecuta la obra

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL	CARGO
HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON	Director de Obra
WILSON REINALDO PARRA TOVAR	Residente de Obra
LIZETH NAIROBY LUNA CUELLAR	Siso
ADRIAN DIYER CHALA MEDINA	AYUDANTE
YONEISON CORREA ORTIZ	AYUDANTE
SEBASTIAN ESPAÑA ARDILA	AYUDANTE
JONATHAN ESPAÑA MEDINA	AYUDANTE
YEFERSON MEDINA PUENTES	AYUDANTE
JUAN CARLOS SANCHEZ TRUJILLO	RESIDENTE AUXILIAR
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS	Se le realiza seguimiento a la maquina tipo pajarita, retroexcavadora cargadora de llantas para las excavaciones mecánicas

	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	Se revisa el diseño de mezcla de concreto con los materiales presentados.
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	Planillas relacionadas

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	Nº PLANILLA	FECHA DE PAGO
HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON	$421.400	$329.200	$64.200	$62.700	$0	94816625	13/02/2025
WILSON REINALDO PARRA TOVAR	$208.000	$162.500	$80.500	$32.000	$68.000	32528768	13/02/2025
LIZETH NAIROBY LUNA CUELLAR	$208.000	$162.500	$80.500	$32.000	$965.000	32203879	15/01/2025
ADRIAN DIYER CHALA MEDINA	$208.000	$162.500	$80.500	$32.000	$965.000	32203879	15/01/2025
YONEISON CORREA ORTIZ	$80.200	$70.500	39.300	$22.600	$28.300	32203879	15/01/2025
SEBASTIAN ESPAÑA ARDILA	$208.000	$162.500	$80.500	$32.000	$965.000	32203879	15/01/2025
JONATHAN ESPAÑA MEDINA	$208.000	$162.500	$80.500	$32.000	$965.000	32203879	15/01/2025
YEFERSON MEDINA PUENTES	$124.800	$97.500	$54.300	$31.200	$39.000	32203879	15/01/2025
JUAN CARLOS SANCHEZ TRUJILLO	$208.000	$162.500	$80.500	$32.000	$965.000	32203879	15/01/2025

d). **Actividades Logísticos.**	1. Se realiza la revisión diaria de los avances de la bitácora de obra. 2. Se realiza la medición de las actividades realizadas en la ejecución y se aprueban las cantidades descritas 3. Se realizó la revisión de las vigencias de las pólizas del contrato de obra las cuales fueron remitidas a la entidad y cargadas al SECOP II. 4. Se verifica en obra el cumplimiento legal de seguridad industrial y salud ocupacional. Entrega de dotación y afiliaciones del personal. 5. Se realizaron comités de obra donde se expone actividades logísticas y administrativas realizadas.
e). **Obligaciones de Carácter Ambiental.**	1. Se realiza seguimiento al Informe HSEQ
f). **Actividades Financieras.**	1. Se firma balance de mayores y menores cantidades e ítems no previstos. 2. En este periodo no se realiza gestión de pago de acta. 3. Se solicita informe de inversión de anticipo.
juridi	

Póliza legalización del CONTRATO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-101051701	0	02/11/2023	Cumplimiento del contrato	02/11/2023	02/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	02/11/2023	02/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/11/2023	02/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-101018824	0	02/11/2023	02/11/2023	02/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-101051701	1 Y 2	20/11/2023	Cumplimiento del contrato	02/11/2023	02/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	02/11/2023	02/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/11/2023	02/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-101018824	1 Y 2	20/11/2023	02/11/2023	02/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION No. 1 - ACTA DE REINICIO No. 1:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-101051701	3 Y 4	20/11/2023	Cumplimiento del contrato	16/11/2023	16/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	16/11/2023	16/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/11/2023	16/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-101018824	3,4 Y 5	02/10/2024	16/11/2024	20/11/2024

Póliza actualizada x OTRO SI MODIFICATORIO No.2

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISION	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-101051701	5, 6 Y 7	18/11/2024	Cumplimiento del contrato	16/11/2023	20/06/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	16/11/2023	02/06/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/11/2023	20/12/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISION (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-101018824		18/11/2024	16/11/2024	20/11/2024

9. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

En Timaná, la probabilidad de un día mojado en noviembre es esencialmente constante, permaneciendo en alrededor del 58 %.Como referencia, la probabilidad más alta del año de tener un día mojado es el 61 % el 12 de noviembre.

El mes de noviembre, Timaná tiene nubosidad que permanece esencialmente constante y el porcentaje de tiempo que el cielo está nublado o mayormente nublado permanece en alrededor del 84 % durante el mes.

noviembre ~ 2024 ~ DIARIO →

D	L	M	X	J	V	S
27	28	29	30	31	1	2
35° 26°	33° 27°	37° 25°	36° 25°	37° 25°	34° 20°	34° 23°
3	4	5	6	7	8	9
33° 23°	30° 22°	34° 22°	33° 23°	35° 23°	31° 25°	31° 23°
10	11	12	13	14	15	16
30° 22°	31° 22°	30° 22°	32° 21°	29° 22°	31° 23°	30° 22°
17	18	19	20	21	22	23
31° 22°	32° 23°	30° 22°	30° 22°	30° 23°	30° 23°	29° 22°
24	25	26	27	28	29	30
32° 23°	35° 24°	34° 24°	32° 21°	33° 22°	33° 24°	34° 24°

10. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Tipo Prueba de Laboratorio	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
Diseños de mezcla para los concretos.	2500 PSI y 3000 PSI	
Diseños de mezcla para base.	N/A	
Compresión simple al concreto.	3000 PSI	
Ensayo de compactación de campo	N/A	

NOTA: *Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Artículo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.*

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
			7	14	28			
CONCRETO ZAPATAS	11/11/2024	18/11/2024	X			2100 PSI	2319	CUMPLE
		18/11/2024	X			2100 PSI	2294	CUMPLE
		25/11/2024		X		2700 PSI	2724	CUMPLE
		25/11/2024		X		2700 PSI	2700	CUMPLE
		9/12/2024				3000 PSI		
		9/12/2024				3000 PSI		

11. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo (%)	N/A	$		NO APLICA
Acta Parcial No. 1		$	$	$
Acta Parcial No. 2		$	$	$
Acta Parcial No. 3		$	$	$
Acta Recibo Final No.4		$	$	$
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 88.657.430,00	$ 0	$ 88.657.430,00	$	$ 88.657.430,00

12. COMITES DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
04/11/2024	**OBRA**	Ajustar nuevas medidas que permitan el nuevo avance de la obra, sea más notorio y se reajuste al cronograma, debido a las fuertes precipitaciones que se vienen presentando.
11/11/2024	**OBRA**	Se estableció que las actividades a desarrollar cumplan con las normas, planos exigidos por la entidad.
18/11/2024	**OBRA**	Visita del director para establecer y aumentar las actividades programadas por las precipitaciones altas que se vienen presentando.
25/11/2024	**OBRA**	Se programan actividades extras por temporadas de lluvia y seguir cumpliendo con el objeto del contrato.

13. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD (dd/mm/aaaa)	No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)	FORMATO (Físico/Digital)
Pólizas de cumplimiento (Endoso 3 (No61-44-101051701.)			**DIGITAL**
Pólizas R.C (Endoso 3 (No. 61-40-101018824))			**DIGITAL**
Pólizas de cumplimiento (Endoso 4 (No61-44-101051701.)			**DIGITAL**
Pólizas R.C (Endoso 4 (No. 61-40-101018824))			**DIGITAL**
Pólizas R.C (Endoso 5 (No. 61-40-101018824))			**DIGITAL**
Copias de Bitácora de Obra (periodo del (01 /11/2024) al (30/11/2024)	**06/12/2024**		**FISICO**
Informe HSEQ (periodo del 01 /11/2024) al (30/11/2024)	**06/12/2024**		**FISICO**
Actas de comités (periodo del 01 /11/2024) al (30/11/2024)	**06/12/2024**		**FISICO**
Planillas de aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP) (periodo del 01 /11/2024) al (30/11/2024)	**06/12/2024**		**FISICO**
Correspondencia (periodo del (01 /11/2024) al (30/11/2024)	**06/12/2024**		**FISICO**
Registros de ensayos de calidad (periodo del (01 /11/2024) al (30/11/2024)	**06/12/2024**		**FISICO**

14. RELACIÓN DE PERSONAL (INTERVENTORIA)

NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
JOSE WILMER CHILITO	76.320.749	CONSORCIADO	CONTRATO POR OBRA O LABOR
FAIVER EDUARDO POLANIA	7711430	CONSORCIADO Y DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CONTRATO POR OBRA O LABOR
YINA CARIME POLANIA	1079174293	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONTRATO POR OBRA O LABOR
INGRID DELGADO	1075277887	SECRETARIA	POR OBRA O LABOR

15. RELACIÓN DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA
ANTICIPO	2024001265	23 DE OCTUBRE DE 2024

16. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
FAIVER EDUARDO POLANIA	$562.900	$439.800	$85.700	N/A	N/A	7952398177	07/12/2024
YINA CARIME POLANIA	$336000	$84000	$146200	$84000	N/A	7952398150	08/12/2024
INGRID DELGADO	$208000	$52000	$6800	$52000	N/A	7952398150	08/12/2024

17. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

LEGALIZACION DEL CONTRATO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010098	0	09/11/2023	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	09/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	09/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	09/02/2024	09/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	0	Amparo Básico, Predios, Labores y Operaciones	09/11/2023	09/02/2024

POLIZA ANULADA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010098	1	21/11/2023	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	09/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	09/02/2027
				Calidad del Servicio	09/02/2024	09/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002028	1	Amparo Básico, Predios, Labores y Operaciones	09/11/2023	09/02/2024

PÓLIZA ACTUALIZADA – INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010098	2	21/11/2023	Cumplimiento del contrato	16/11/2023	16/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/11/2023	16/02/2027
				Calidad del Servicio	16/02/2024	16/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002028	2	Amparo Básico, Predios, Labores y Operaciones	16/11/2023	16/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aa aa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100010098	3	28/09/2024	Cumplimiento del contrato	17/09/2024	17/05/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/09/2024	17/11/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2024	17/11/2029

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100002028	3	28/09/2024	16/11/2023	17/11/2024

Póliza actualizada X otrosí 1


PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aa aa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100010098	4	28/09/2024	Cumplimiento del contrato	17/09/2024	17/05/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/09/2024	17/11/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2024	17/11/2029

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100002028	4	28/09/2024	16/11/2023	17/11/2024

18. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

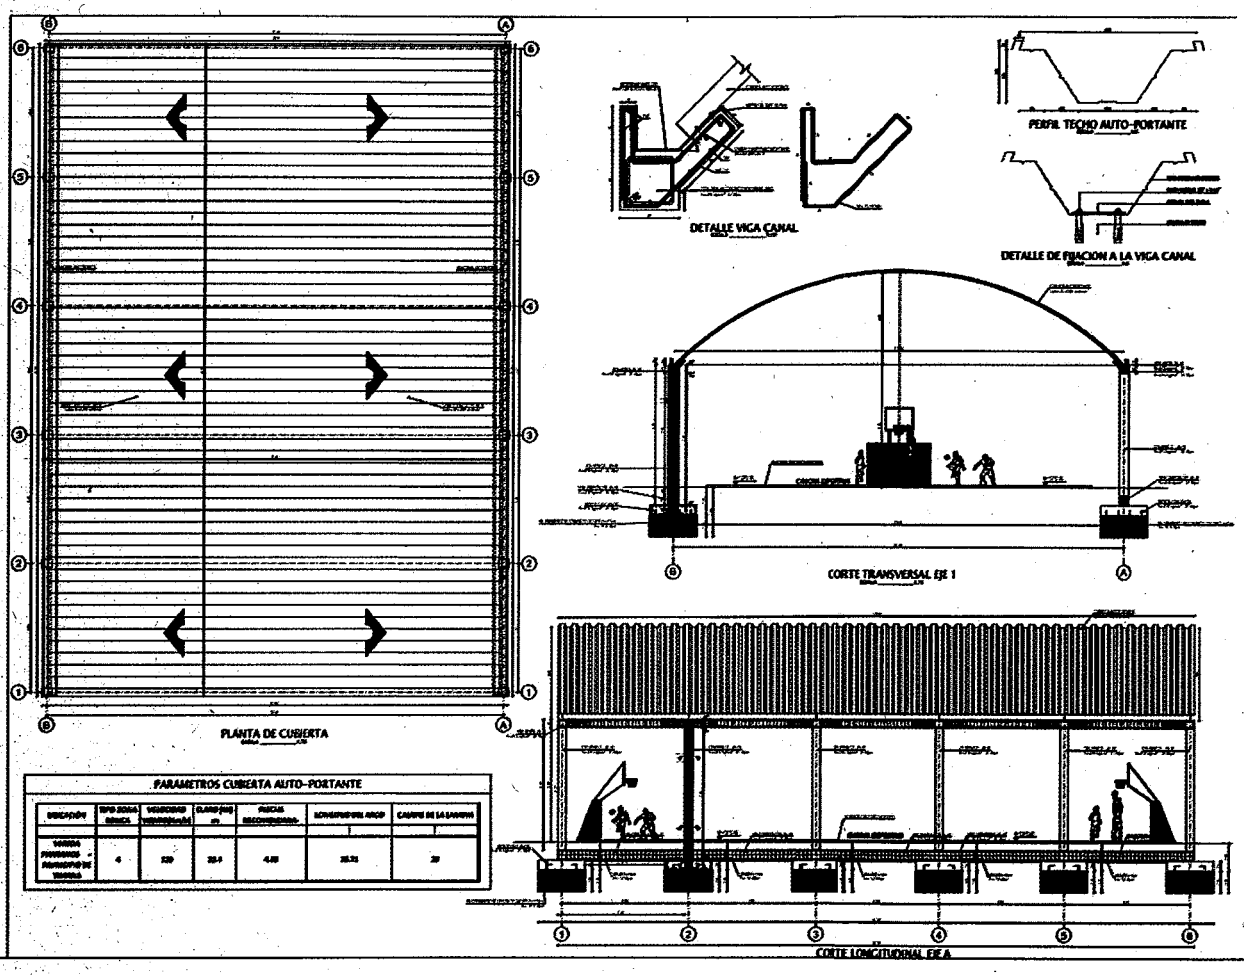

19. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS					EJECUCIÓN DE OBRA MENSUAL			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR		CANT	% EJECUCION
1	**Preliminares**									
1.1	Localización y replanteo.	M2	900.42	$ 3,558.00	$ 3,203,694.00			0.00000000000000%	900.42	0.72615405572576%
1.2	Corte de Placa de concreto e= 0.10 mts.	ML	157.80	$ 26,280.00	$ 4,146,984.00	0.00	$ -	0.00000000000000%	74.90	0.44615413050592%
1.3	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	108.84	$ 116,723.00	$ 12,704,131.00		$ -	0.00000000000000%	108.84	0.05291321820778%
1.4	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	217.73	$ 46,003.00	$ 10,016,233.00	32.40	$ 1,490,497.00	0.29732843165824%	217.73	2.22978445724842%
1.5	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	201.04	$ 83,849.00	$ 16,857,003.00	42.00	$ 3,521,658.00	0.70251000168178%	42.00	0.70251000168178%
1.06 NP	Relleno, crudo de rio para filtrar y compactar, mecanicamente.	M3	54.49	$ 127,780.00	$ 6,962,732.00	20.00	$ 2,555,600.00	0.50979810086555%	20.00	0.50979810086555%
1.07 NP	Filtro en tuberia de drenaje de 4" PVC perforada	ML	94.50	$ 138,014.00	$ 13,042,323.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 66,933,100.00**		**$ 1,490,497.00**			
2	**CIMENTACIÓN**									
2.1	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	16.40	$ 34,012.00	$ 557,797.00		$ -	0.00000000000000%	15.92	0.12273062368250%
2.2	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	34.56	$ 619,063.00	$ 21,394,817.00	15.00	$ 9,285,945.00	1.85238579032006%	30.00	3.95715192060476%
2.3	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	2,462.20	$ 7,116.00	$ 17,521,015.00	306.00	$ 2,177,496.00	0.43437287738391%	2306.00	3.66021920387108%

2.4	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño,	M3	12.20	$ 742,041.00	$ 9,052,900.00	3.98	$ 2,953,323.00	0.58913697630402%	3.98	0.58913697630402%
2.5	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación.	KG	1,257.66	$ 7,116.00	$ 8,949,509.00	1000	$ 7,116,000.00	1.41951920713697%	1000.00	1.41951920713697%
2.6	Concreto Ciclopeo - 2500 PSI (175 KG/CM2) 60% Concreto 2500 PSI + 40% Piedra media zonga	M3	76.03	$ 360,003.00	$ 27,371,028.00	0	$ -	0.00000000000000%	76.03	6.2039579908640 7%
2.07 NP	Suministro e instalacion de plastico negro 3,5 impermehabilizacion.	M2	138.72	$ 15,257.00	$ 2,116,451.00	138.72	$ 2,116,451.00	0.42219545326929%	138.72	0.42219545326929%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 86,963,517.00**		**$ 21,532,764.00**			
3	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**									
3.1	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	17.04	$ 920,829.00	$ 15,690,926.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
3.2	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	3,894.25	$ 7,116.00	$ 27,711,483.00	1000.00	$ 7,116,000.00	1.41951920713697%	1000.00	1.41951920713697%
3.3	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.	M3	19.37	$ 1,004,876.00	$ 19,464,448.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
3.4	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	2,348.55	$ 7,116.00	$ 16,712,282.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
3.5	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	65.80	$ 40,347.00	$ 2,654,833.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 82,233,972.00**		**$ 7,116,000.00**			
4	**CUBIERTA**									
4.1	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	845.53	$ 211,559.00	$ 178,879,481.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 178,879,481.00**		**$**			
5	**ACABADOS - PLACA EN CONCRETO**									

5.1	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	307.11	$ 14,798.00	$ 4,544,614.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
5.2	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	0.00	$ 3,710,773.00	$ -		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
5.3	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	140.28	$ 73,943.00	$ 10,372,724.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
5.4	Cuneta en concreto de 3.000psi, segun diseño	ML	69.80	$ 83,852.00	$ 5,852,870.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
5.05 NP	Mantenimiento de cancha multifuncional Futbol de Salón, Baloncesto, incluye pintura, mallas, demarcado y logos.	UND	2.00	$ 736,291.00	$ 1,472,582.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 22,242,790.00**		**$**			
6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**									
6.1	Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	49.60	$ 80,145.00	$ 3,975,192.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
6.2	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.	ML	23.68	$ 107,091.00	$ 2,535,915.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
6.3	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	24.00	$ 219,053.00	$ 5,257,272.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
6.4	Caja de inspeccion en concreto de F'c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	2.00	$ 349,989.00	$ 699,978.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
6.5	Construcción de filtros laterales externos en un ancho de 0,40 mts, con altura variable menor a 0,50 mts, recubrimiento en geotextil no tejido NT-1600, con gravilla común o triturado de 1 1/2" a 4"+ tubería PVC drenaje de 6"	ML	91.04	$ 63,617.00	$ 5,791,692.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 18,260,049.00**		**$**			
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**									
7.1	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	3.00	$ 638,903.00	$ 1,916,709.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%

7.2	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	16.24	$ 46,003.00	$ 747,089.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.3	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	ML	29.00	$ 49,342.00	$ 1,430,918.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.4	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2.00	$ 304,503.00	$ 609,006.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.5	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	2.00	$ 282,276.00	$ 564,552.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.6	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1.00	$ 1,016,827.00	$ 1,016,827.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.7	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1.00	$ 4,701,216.00	$ 4,701,216.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.8	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 AL ser8000 + 1x8 CU.	ML	12.00	$ 88,535.00	$ 1,062,420.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.9	Suministro e instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12.00	$ 368,969.00	$ 4,427,628.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.10	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	64.00	$ 58,153.00	$ 3,721,792.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.11	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12.00	$ 1,018,790.00	$ 12,225,480.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.12	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1.00	$ 975,015.00	$ 975,015.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	1.00	$ 1,035,368.00	$ 1,035,368.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.14	Excavación, hincada y plomada de postes de concreto de 8 mts x 510 kg armado y centrifugado.	UND	2.00	$ 2,252,908.00	$ 4,505,816.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.15	Vestida de estructura de retencion en baja tensiòn con grapa de retencion para cable trenzado y percha de gancho abierto.	UND	1.00	$ 340,951.00	$ 340,951.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.16	Vestida de estructura de retención doble en baja tensión con dos grapas de retención para cable trenzado con perno de gancho abierto y percha de gancho abierto para sujeción de la red trenzada.	UND	1.00	$ 236,067.00	$ 236,067.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%

7.17	Vestida de estructura de retención en baja tensión con grapa de retención para cable trenzado y perno de gancho abierto.	UND	1.00	$ 340,951.00	$ 340,951.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.18	Tendido y tensionado en conductor trenzado de aluminio aislado 2x35 mm + 50 mm tipo PE-XLPE - 600 VAC.	ML	55.00	$ 46,080.00	$ 2,534,400.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 42,392,205.00**		**$**			
8	**TRANSPORTE**									
8.1	Transporte de materiales petreos	M3-Km	3083.07	$ 1,100.00	$ 3,391,377.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 3,391,377.00**		**$** -			
% AVANCE DE OBRA								**7.646766045756780%**		**22.46174454710480%**

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON
DIRECTOR DE OBRA

ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
DIERCTOR DE INTERVENTORIA

20. REGISTRO FOTOGRÁFICO




Pasadores entre concreto ciclópeo y zapata de cimentación.



Pasadores entre concreto ciclópeo y zapata de cimentación




Concreto ciclópeo, pasadores de acero, material de rio, recebo.

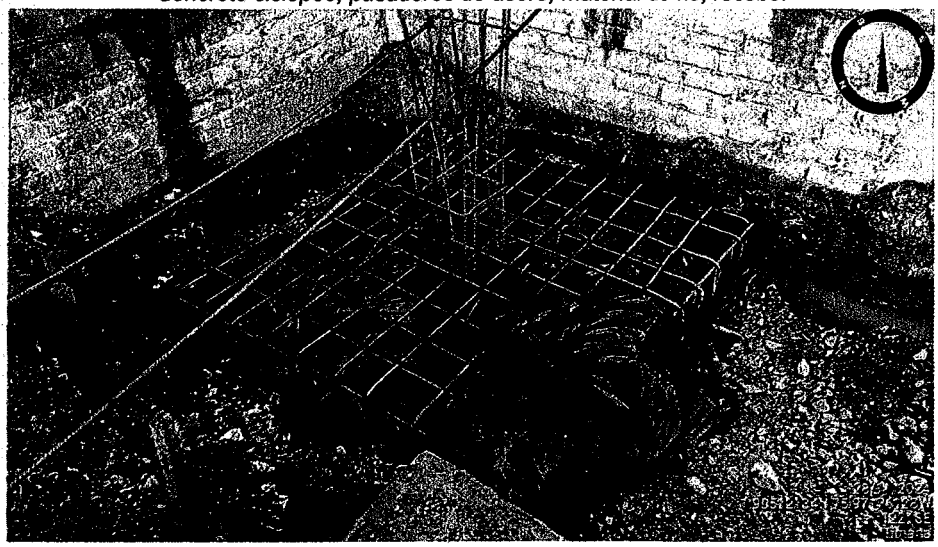


Acero de refuerzo para zapatas.




Acero de refuerzo para zapatas de cimentación

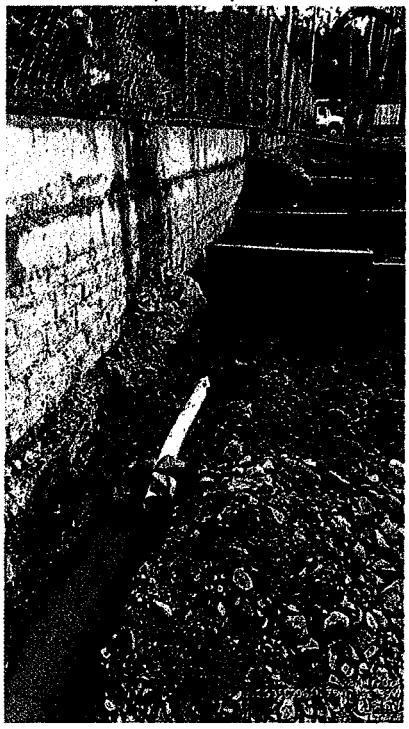

Filtro, material de rio.

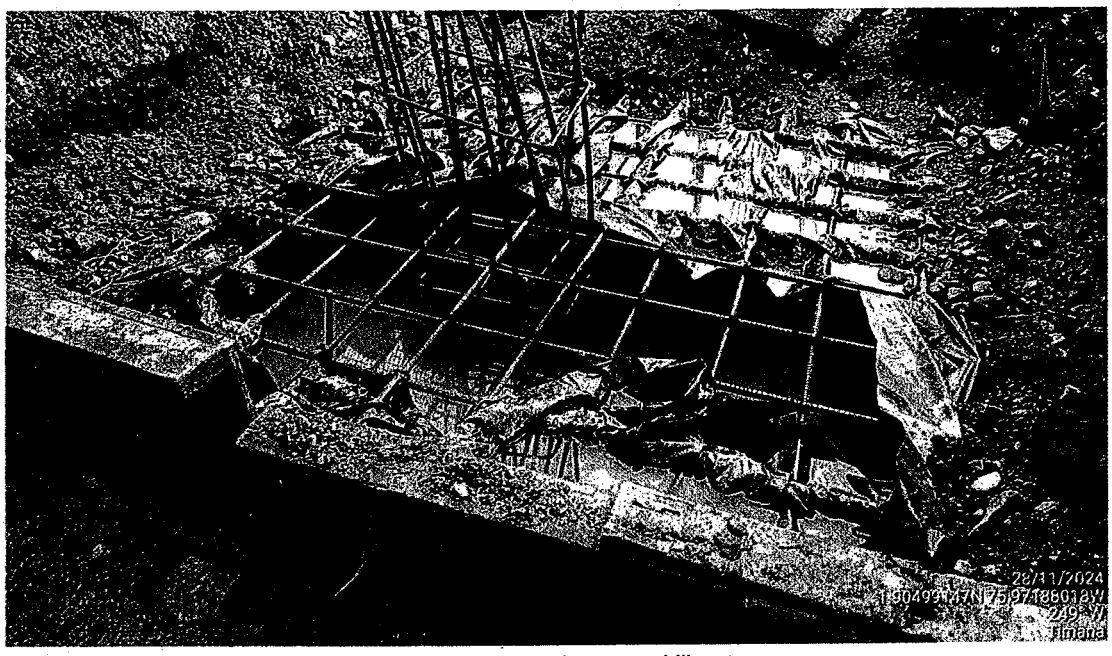

Acero de refuerzo, impermeabilizante.

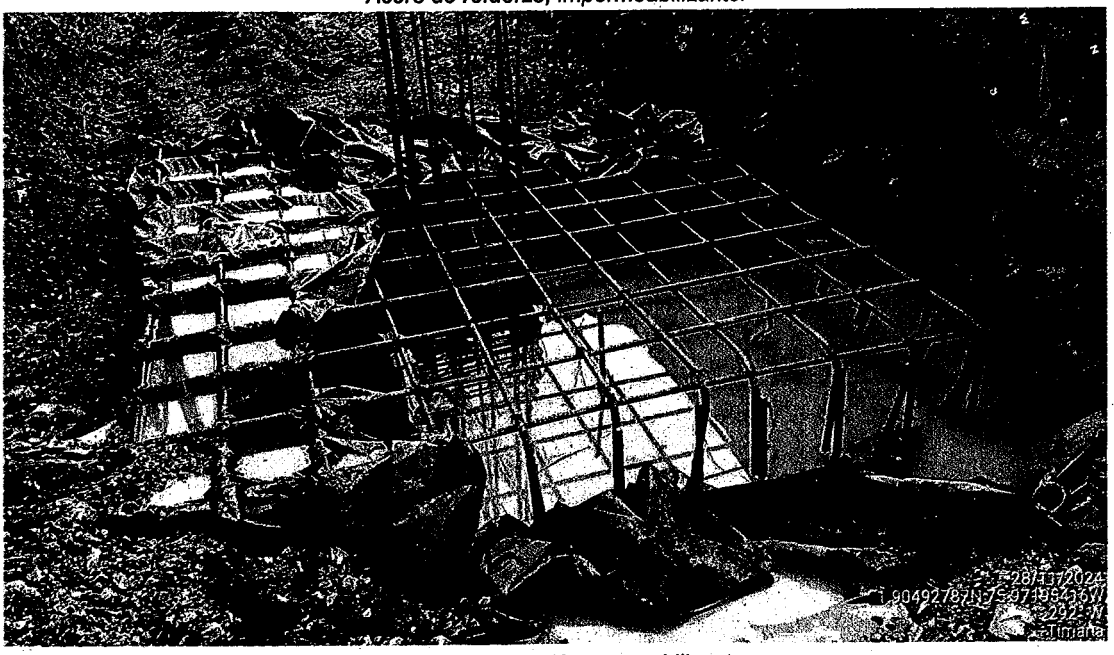

Acero de refuerzo, impermeabilizante.



Acero de refuerzo para zapatas y columnas.

21. ANEXOS

- BITÁCORA DE OBRA.
- ACTAS DE COMITÉS.
- RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIOS
- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP).

ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	(09/12/2024)	ING. CESAR JOAQUIN VELASQUEZ
FIRMA ORIGINAL **DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo.Bo APOYO A LA SUPERVISIÓN**

31 octubre 2024. Timana Huila
Clima lluvioso
Hora Inicial 7:am Hora Final 5:Pm
Personal en obra, 1 Ing residente, 5:50
Oficiales, Ayudantes. 5:50
Herramienta menor y equipos.

Se continua con excavacion Para Vigas eje B, y compactacion cuado R:0 eje A,
Wilson Parra. Residente interv Director Fiscal Persona

Timana Huila 01 noviembre 2024.
Hora Inicio 7:00 am Hora salida 5:Pm
Clima Soleado.
Porsonal de obrea, Ing residente, 5:50
Oficales, ayudantes, 5:50.
Herramienta menor y equipos.
Instalacion de canastas Para zapatas en hierro de 5/8

Wilson Parra. Residente interv. Director

Timana Huila, 02 Noviembre de 2024
Hora de Inicio 7:00 am Hora Final 12:Pm.
Clima: SoleadO
Personal en obra, Ing residente, 5:50, Oficiales ayudantes, 5:50
Herramienta menor, equipos, se Continua Amarrando acero: Para zapatas

Wilson Parra. Residente interv Director Fiscalizacion.

Timana Huila. 04 NOV. de 2024
Hora Inicial. 7:00 am Hora Final. 5:00 Pm.
Clima lluvioso
Personal en obra, Ing residente, Oficial, ayudantes, 5150
Herramienta y Equipo, Herramienta menor
se continua con la excavacion para la viga de cimentacion en el eje B
Wilson Parra. Residente Inter. Director Frente Regional.

Timana Huila 05 NOV. 2024.
Clima Soleado
Personal en obra Ing residente, oficiales ayudantes, 5150
Continuacion de excavacion manual Para viga de cimentacion eje B

Wilson Parra. Residente Inter. Director Frente Regional

Timana Huila, 06 Noviembre 2024
Hora Inicial. 7:00 am. Hora Final 5:00 Pm.
Clima soleado
Personal en obra. Ing residente, oficiales ayudantes, 5150
Se empieza armare Para zapatas eje B, en acero corrugado de 5/8 Segun planos y especificaciones

Wilson Parra Residente Inter. Director Frente Regional.

Timana Huila 07 noviembre 2024

Hora Inicial 7:am Hora Final 5:00Pm

Clima lluvioso

Personal en obra: Ing residente, oficiales, ayudantes, SISO

Herramientas y equipos, herramienta menor

Se realiza limpieza de la B1, se seca con motobomba, se instala acero Figurado y Formaleta, lista Para Fundir.

Wilson Parra. Residente Inter. Director Fause Ferrano

Timana, 08 Noviembre de 2024.

Clima lluvioso Hora Inicial 7:00am Final 5:Pm

Personal en obra: Ing residente, oficiales ayudantes, SISO

Herramientas y equipos, herramienta manual

Se realiza Fundicion de zapata B1, Concreto 3000 PSI, grava 3/4 Arena, medidas 2.4 X 2.4 X 0,5 mts, se continuo con la instalacion del acero de la zapata B6, Varilla corrugada de 5/8 alambre Precocido negro, segun Planos y ESPECIFICACIONES.

Wilson Parra. Residente Inter. Director Fause Ferrano

Timana, 09 Noviembre 2024.
Hora Inicial 7:am, Hora Final 12:00Pm.
Clima Soleado
Personal en obra, Ing residente, Oficiales
Ayudantes, 5150
Herramienta menor.
Se instala acero Figurado para zapatas
B6 y Formaleta de la B6 para Fundir.

Wilson Parra.

Timana Huila, 11 Noviembre 2024.
Hora Inicial, 7:00 am Hora Final 5:Pm.
Clima lluvioso.
Personal de obra: Ing, residente, Oficial,
ayudantes, 5150.
Herramienta menor
Se Funde zapata B6, concreto 3000PSI
Arena y grava, se instala acero Figurado
S/B para zapata B5 y Formaleta para la misma

Wilson Parra.

Timana Huila, Noviembre 12 de 2024
Hora inicial 7:000am. Hora Final 5:Pm.
Clima lluvioso
Personal en Obra, Ing residente, Oficiales, Ayudantes
Herramienta y equipos, herramienta menor.

Se realiza Fundicion zapata B5. se
Formaletea y se instala acero corrugado
ya Figurado para zapata B4.

Wilson Parra.

Timana Huila Noviembre 13 2024
Hora inicial 7:00 am Hora Final 5:00 Pm.
Clima lluvioso
Personal en obra, Ing residente, oficiales y ayudantes, 5150
Herramienta y equipos, herramienta menor
Se funde zapata B4, concreto mezclado en obra 3000 PSI, se instala acero Figurado en zapata B3, corrugado de 5/8

Wilson Parra. Residente Obra

Director Fraijer Perdomo

Timana, 14 de Noviembre 2024
Hora Inicial 7:00 am Hora Final 5:00 Pm.
Clima lluvioso
Personal en obra Ing residente, Oficial, ayudantes, 5150
Herramienta y equipos herramienta menor.
Se funde zapata B3, concreto mezclado 3000 PSI, arena, grava 3/4

Wilson Parra. Residente Obra

Director Fraijer Perdomo

Timana 15 de Noviembre de 2024
Hora inicial 7:00 am, hora Final 5:00 Pm
Clima lluvioso
Personal en obra, Ing residente, oficiales ayudantes, 5150
Herramientas y equipos, herramienta menor
Instalacion de acero Figurado 5/8 zapata B2.

Wilson Parra Residente Obra

Director Fraijer Perdomo

Scanned with AnyScanner

Timana Huila, 16 noviembre 2024
Hora inicial 7:am Hora Final 12 Pm
Clima lluvioso
Personal en obra, Ing residente, OFICIALES ayudantes, SISO
Herramienta menor.
instalacion de acero en zapatas del eje A, Figurado.

Wilson Parra. Residente Inter DIRECTOR FAMILIA PERSONA

Timana Huila, 18 de nov, de 2024
Hora inicial 7:00 am Hora Final 5: Pm.
Clima Soleado
Personal en obra, Ing residente, OFICIALES ayudantes, SISO
Herramienta y equipo, herramienta menor.
Se inicia amarrar acero para viga de cimentacion en el eje B

Wilson Parra. Residente Inter DIRECTOR FAMILIA PERSONA

Timana Huila, noviembre 19 2024
Hora inicial 7:am hora final: 5:00 Pm.
Clima lluvioso
Personal de obra Ing residente OFICIALES ayudantes, SISO.
Herramienta y equipos, herramienta menor.
Se continua con el armado de viga de cimentacion del eje A y amarrado de acero segun Planos y especificaciones llegan camillas para encofrar.

Wilson Para. Residente Inter DIRECTOR FAMILIA PERSONA

NKB

AnyScanner

Timana Huila Noviembre 20 de 2024
Hora inicial 7:am Hora Final 5:Pm
clima lluvioso
Personal en obra, Ing residente, oficiales ayudantes, SISO
Herramientas y equipos, herramienta menor.
Se continua amarrando el acero de la viga de cimentacion del Eje B.

Wilson Perra.

Timana 21 NOV, 2024
Hora inicial 7:am hora Final 5:12:Pm
clima lluvioso
Personal en obra ing residente, oficiales ayudante, SISO
Herramienta y equipo, herramienta menor

se inicia a formaleteor viga de cimentacion eje B

Wilson Perra

Timana Huila 22 NOV. 2024.
Hora inicial 7:am hora Final 5:Pm.
Clima lluvioso
Personal en obra ing residente, oficiales, ayudantes, SISO
Herramientas y equipos

Fundimos viga de cimentacion eje B
Concreto mezclado en obra 3000 PSI
Grava y arena.

Wilson Perra.

Timana Huila, 23 de nov. de 2024,
Hora inicial 7:am hora Final 13:Pm,
Clima lluvioso
Personal de obra; ing Residente, oficiales ayudantes, siso
Herramientas y equipos, herramienta menor.
se inicia con el amarre del acero de columnas de eje B, acero corrugado de 1/2 y estribos de 3/8, banchos 3/8 Segun planos y especificaciones.

Wilson Parra.

Residente interv.

Director Interv

Timana Huila, 25 nov. de 2024
Hora inicial 7:am Hora Final 5:Pm
Clima soleado
Personal en obra., ing residente, oficiales, ayudantes.
siso
Herramientas y equipos, herramienta menor.
se continua con el amarre de acero para columnas eje B, Formaletas para zapatas eje A.

wilson Parra

Residente interv.

Director Interv

26 de Noviembre 2024, Timana Huila.
Hora inicial 7:am Hora Final 5. Pm.
Clima soleado
Personal en obra. ing residente, siso
oficiales y ayudantes
Herramienta y equipo menor.
se continua el amarre de acero para columnas del eje B, se suministra relleno para eje B.

Wilson. Parra.

Residente interv.

Director Interv

Timana Huila, 27 de Nov. 2024
Hora inicial 7:00 am Hora Final 5:00 Pm.
Clima lluvioso
Personal en obra Ing Residente, oficiales ayudantes y SISO
Herramienta menor
Se continua amarrando acero Para Columnas del eje B, se inicia excavacion y se instala el Filtro en el eje A
Visita de la interventoria, observacion sobre aceros
Wilson Parra.

Residente Inter. Director Fauer Ferreira

Timana Huila: 28 de Noviembre 2024.
Hora 7:00 am Salida 5:00 Pm.
Clima lluvioso
Personal en obra; Ing residente, SISO
Oficiales y ayudantes
Herramientas y equipos

Se atiende sugerencia de la interventoria se acomodan los estribos 6 cm total entre ellos, Para columnas amarradas

Wilson Parra.

Residente Inter. Director Fauer Ferreira.

Timana Huila, 29 de Nov. de 2024
Hora inicial 7:00 am Hora Fina 5: Pm
Clima lluvioso
Personal en obra, Ing residente, oficiales y ayudantes, SISO
Herramienta menor. equipos
Se inicia Fundicion de zapatas eje A llega material de playa y Recebo.
Wilson Parra

Residente Inter. Director Fauer Ferreira.

NICE

AnyScanner

Timana Huila noviembre 30 2024.
Clima Soleado.
Hora inicial, 7:00 a.m Hora Final 5:00p.m.
Personal en obra, ing residente, oficiales
siso, ayudantes.
Herramientas y equipos: herramienta menor.

Se continua fundiendo zapatas del eje 1
llegan 14 m³ de recebo, 14 m³ casco de río
14 m³ Premesclado

Wilson Parra

Timana Huila 2 de diciembre 2024.
Clima Nuvioso
Hora inicial 7:00 a.m Hora final 5:00 p.m.
Personal en obra ing residente, oficiales,
ayudantes, siso
Herramientas y equipos herramienta menor.

Se Funde la zapata A 6, concreto armado
3000PSI, Grava arena, se comienzan
a rrellenar eje A, para compactar

Wilson Parra.

Timana Huila, 03 diciembre 2024.
Hora inicial 7:00 a.m Hora Final 5:00 Pm
Clima Nuvioso
Personal de obra, ing residente, siso
Oficiales y ayudantes
Se continua el amarrado de acero
Para Columnas, se inicia excavacion
para Filtro eje B.
Wilson Parra.

Nombre Proyecto		***"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMANETO DEL HUILA"***		**Acta No.**	
No. De Contrato obra		CLPIH 401 DEL 2023	**Lugar:**	VEREDA PANTANOS (TIMANA HUILA)	
No. De Contrato Interventoría		CIHCM 420 - 2023			
Fecha	1 DE NOVIEMBRE	**Hora Inicio**	2: PM	**Hora Final**	5:PM

OBJETO DE LA REUNION
Evaluar el avance de la obra en el primer mes de intervención técnica, reorganizar tareas para tratar de obtener un mejor desarrollo de las actividades

AGENDA	
	1- Evaluar el avance de la obra, teniendo en cuanta las partes criticas por el alto nivel freático
	2- Reevaluar las medidas tomadas en el desarrollo del cumplimiento del cronograma de actividades
	3- Reorganizar cronograma de ser necesario para un mejor desarrollo de las actividades

DESARROLLO
- Después de evaluar el avance de la obra, el área intervenida, el alto nivel freático presente en el lugar, las precipitaciones continuas, se establece que el avance del primer mes, no fue el esperado, aunque se tomaron medidas como el uso de maquinaria, para realizar la gran mayoría de las actividades, no se obtuvo el avance esperado - Ajustar nuevas medidas que permitan el nuevo avance de la obra sea mas notorio y se ajuste al cronograma - Ajuste del cronograma de obra, con el animo obtener un mejor resultado

DESARROLLO

TAREAS – COMPROMISOS – TEMAS PROXIMAS REUNIONES			
Tema	**Tarea**	**Responsable**	**Fecha de Control**
1	Realizar seguimiento a las actividades y mejorar el avance de obra		
2	Contratar nuevo personal para el desarrollo de las actividades		
3	Revisión del nuevo cronograma, que se ajusten a las actividades antes establecidas.		

EN CONSTANCIA FIRMAN EL ACTA:		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Heman Jose Tryillo	Director	
Wilson Parra	Residente	
Javier Reyes	Apoyo Interventoria	
Yina Rolanda	Apoyo Interventoria	

Nombre Proyecto		***"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMANETO DEL HUILA"***		**Acta No.**	
No. De Contrato obra		CLPIH 401 DEL 2023	**Lugar:**	VEREDA PANTANOS (TIMANA HUILA)	
No. De Contrato Interventoría		CIHCM 420 - 2023			
Fecha	8 DE NOVIEMBRE	**Hora Inicio**	2: PM	**Hora Final**	5:PM

OBJETO DE LA REUNION
Seguimiento al desarrollo de las actividades establecidas por cronograma, revisar las acciones, capacitaciones e indicaciones realizadas por la profesional Siso

AGENDA	
	1-Revisar el desarrollo de las nuevas actividades que se están desarrollando.
	2-Revisar las capacitaciones y direcciones que se hayan tomado por parte de la Siso
	3-Revisar que los materiales cumplan con las especificaciones establecidas

DESARROLLO

- Se estableció que las actividades que se desarrollan como amarrado de acero, para zapatas, excavaciones, para vigas, formaletas, para zapatas cumplen con normas, planos y especificaciones

- Se estableció que la profesional siso ha realizado capacitaciones continuas a nuestro personal en obra, las cuales cumplen con el programa de salud ocupacional

- Los materiales utilizados en la obra cumplen con las especificaciones exigidas por parte de la entidad contratante, aceros, materiales pétreos.

DESARROLLO

TAREAS – COMPROMISOS – TEMAS PROXIMAS REUNIONES			
Tema	Tarea	Responsable	Fecha de Control
1	Programar la fundición de Zapatas, 3000psi según especificaciones		
2	Iniciar con el armado de estructura para viga de cimentación		
3	Iniciar compactación manual de los ejes AY B		

EN CONSTANCIA FIRMAN EL ACTA:		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Heiran Jose Trujillo	Director	
Wilson Parra	Residente	
JAVIER PERDOMO	DIRECTOR INTERVENTOR	
YINA POLANIA	RESIDENTE INTERVENTOR	

Nombre Proyecto		***"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMANETO DEL HUILA"***		**Acta No.**	
No. De Contrato obra		CLPIH 401 DEL 2023	**Lugar:**	VEREDA PANTANOS (TIMANA HUILA)	
No. De Contrato Interventoría		CIHCM 420 - 2023			
Fecha	15 DE NOVIEMBRE	**Hora Inicio**	2: PM	**Hora Final**	5:PM

OBJETO DE LA REUNION
Verificar el avance de la fundición de zapatas, dosificaciones, materiales, estructura

AGENDA	
	1-Revisar el desarrollo de los elementos fundidos, dosificaciones elementos
	2-verificar el avance
	3-compromisos

DESARROLLO

- Se realizo visita del director de la obra Ing. Hernán José Trujillo, para establecer los tiempos de ejecución, organizar un plan de con el fin de aumentar la eficiencia en las actividades programadas, cumplimiento del cronograma de obra

- Se estableció que las actividades ejecutadas a la fecha no cumplen con el cronograma establecido

- Los materiales utilizados en la obra cumplen con las especificaciones exigidas por parte de la entidad contratante, aceros, materiales pétreos. Dosificaciones

DESARROLLO

TAREAS – COMPROMISOS – TEMAS PROXIMAS REUNIONES			
Tema	**Tarea**	**Responsable**	**Fecha de Control**
1	Terminar de fundir las zapatas restantes en los ejes A Y B		
2	Continuar con el armado de estructura para viga de cimentación, encofrado de la misma		
3	Programar fundida de la viga de cimentación eje B		

EN CONSTANCIA FIRMAN EL ACTA:		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Hernan Jose Trujillo O.	Director	
Wilson Parra	Residente	
Javier Rodriguez	Apoyo Interventoria	
Yenny Polania	Residente Interventoria	

Nombre Proyecto		***"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMANETO DEL HUILA"***		**Acta No.**	
No. De Contrato obra		CLPIH 401 DEL 2023	**Lugar:**	VEREDA PANTANOS (TIMANA HUILA)	
No. De Contrato Interventoría		CIHCM 420 - 2023			
Fecha	22 DE NOVIEMBRE	**Hora Inicio**	2: PM	**Hora Final**	5:PM

OBJETO DE LA REUNION
Cumplimiento del cronograma, verificación de las actividades programadas,

AGENDA	
	1-Programar en conjunto con la interventoría, que actividades se pueden realizar en horas del medio día y tarde noche, ya que las altas precipitaciones no hacen posible la realización de las actividades
	2-inspeccionar que las zapatas se hayan fundido todas, vigas eje B
	3-compromisos

DESARROLLO

- Se procedió a programar actividades extra temporáneas ya que por las altas precipitaciones no se han podido ejecutar en un 100 %, aun con las acciones tomadas en la semana inmediatamente anterior por parte del director de obra en conjunto con la interventoría el rendimiento no es el ideal

- Se verifico que las zapatas ya fueron fundidas en su totalidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas, materiales, aceros, dosificaciones

- Se pudo verificar que la estructura de la viga ya se esta encofrando para su respectiva fundición, se verifico que los materiales e insumos estuvieran en la obra, que los mismos cumplieran con las especificaciones exigidas por la entidad, programar su

DESARROLLO
fundida para esta nueva semana.

TAREAS – COMPROMISOS – TEMAS PROXIMAS REUNIONES			
Tema	**Tarea**	**Responsable**	**Fecha de Control**
1	Seguimiento a las actividades extras programadas por el contratista en conjunto con la interventoría		
2	Fundición de la viga de cimentación eje B		
3	Empezar armado de las columnas en el eje B		

EN CONSTANCIA FIRMAN EL ACTA:		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Heiran Jose Tryllc C.	Director	
Wilson Parra	Residente	
JAVIER PERDOMO	RESIDENTE INTER	
YINA PALMIN	RESIDENTE INTER	

Nombre Proyecto		***"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMANETO DEL HUILA"***		**Acta No.**	
No. De Contrato obra		CLPIH 401 DEL 2023	**Lugar:**	VEREDA PANTANOS (TIMANA HUILA)	
No. De Contrato Interventoría		CIHCM 420 - 2023			
Fecha	29 DE NOVIEMBRE	**Hora Inicio**	2: PM	**Hora Final**	5:PM

OBJETO DE LA REUNION
Realizar seguimiento a las actividades y a los planes de contingencia tomados en la obra, resolver observaciones realizadas por la interventoría

AGENDA	
	1-verificar el cumplimiento de las actividades extras que se programaron, verificar avances de obra
	2-seguimiento a la fundación de la viga de cimentación, dosificación aceros, estribos distancias
	3-compromisos

DESARROLLO

- Las actividades programadas no han tenido el efecto esperado ya que el estado del tiempo ha sido poco generoso, se presentan lluvias fuertes en gran parte del día

- Se verifico que la viga del B se fundió, dosificación, aceros, longitudes, estribos, cantidades.

- Se comenzó con el armado de la estructura para columnas

- Se revisan pendientes de la instalación de filtros perforado en el eje A

- La interventoría hace observación acerca de la distancia entre los estribos de las vigas se solicita comité técnico junto con el supervisor, el ing. Cesar Joaquín Velázquez, para


DESARROLLO
verificar el cumplimento de la norma.

TAREAS – COMPROMISOS – TEMAS PROXIMAS REUNIONES			
Tema	**Tarea**	**Responsable**	**Fecha de Control**
1	Insistir en las actividades extra tiempos, aumentar el personal de obra		
2	Armado de columnas, cumpliendo con planos y especificaciones		
3	Empezar armado de la viga de cimentación eje A		

EN CONSTANCIA FIRMAN EL ACTA:		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Heiman Jose Trujillo C.	Director	
Wilson Parra	Residente	
Angel Ramos	Director Interventoria	
Yina Palomino	Residente Interventoria	

AOLAB INGENIERIAS SAS

INFORME DEL ENSAYO COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS

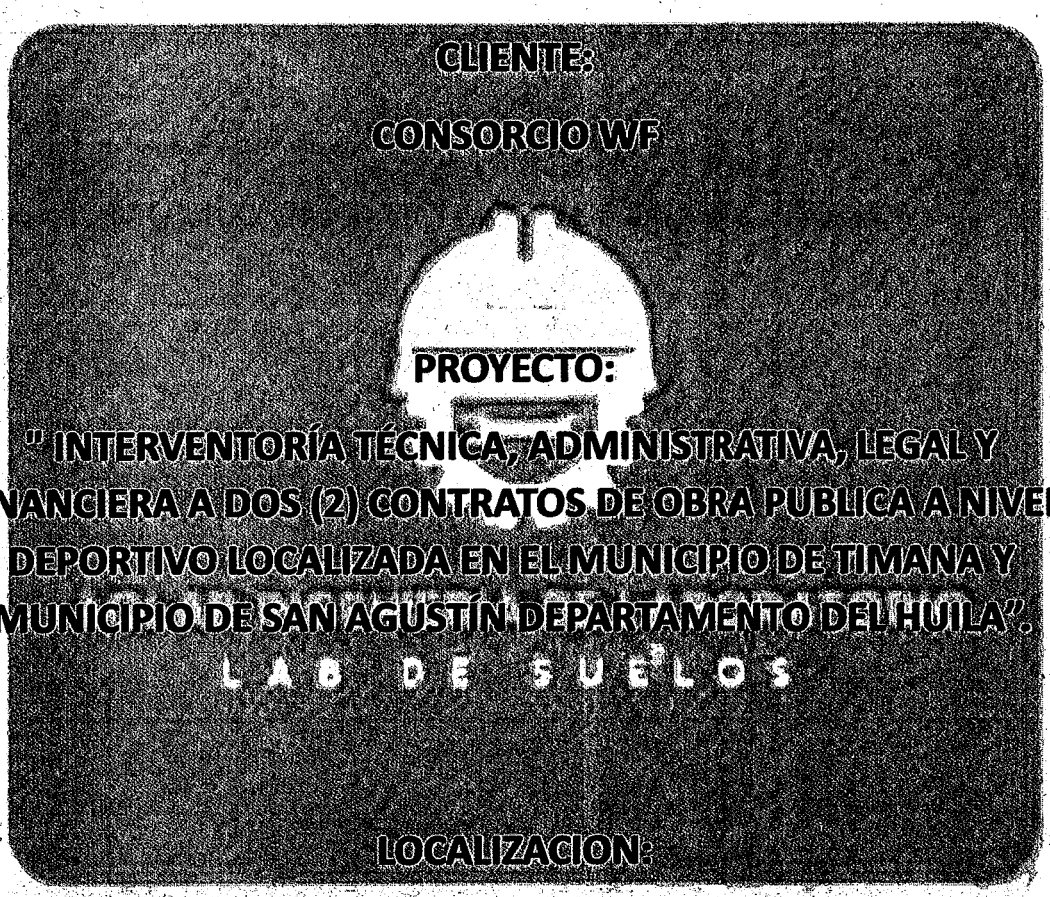

MUNICIPIO DE TIMANA – VEREDA PANTANOS

NOVIEMBRE DEL 2024

ingenieriadesuelosaolab@gmail.com / calle 76 # 1ª bis -33 puertas del edén /3115955822

AOLAB INGENIERIAS SAS

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

CONTRATISTA CONSORCIO WF


PROYECTO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA

UBICACIÓN MUNICIPIO DE TIMANA – VEREDA PANTANOS

FECHA EMISION INFORME: NOVIEMBRE DEL 2024

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD. LAB	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	% de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
			Diametro	Longitud	KN							
13/11/2024	11/11/2024	1	10.00	20.00	125.6	7	18/11/2024	2319	77%	3	3000	CONCRETOS ZAPATAS
	11/11/2024		10.00	20.00	124.2	7	18/11/2024	2294	76%	5	3000	
	11/11/2024		10.00	20.00	147.5	14	25/11/2024	2724	91%	4	3000	
	11/11/2024		10.00	20.00	146.2	14	25/11/2024	2700	90%	5	3000	
	11/11/2024		10.00	20.00		28	09/12/2024	0	0%		3000	
	11/11/2024		10.00	20.00		28	09/12/2024	0	0%		3000	


TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS HAN SIDO TOMADAS POR EL CLIENTE Y TRANSPORTADAS POR LABORATORIO. EL COMPORTAMIENTO PARA UN CONCRETO CONVENCIONAL (SIN ADITIVO) SERA: A LOS 1d= 15%; 3d= 40%; 7d= 70%; 14d= 90%; 28d= 100% CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5%

CALCULO
JEFE DE LABORATORIO

ingenieriadesuelosaolab@gmail.com / calle 76 # 1B bis -33 puertas del edén /3115955822



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7711430
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 4 9 25 OF 507	TELÉFONO:	5668020
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7952398177	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1106873045

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 562,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 562,900	$ 0	$ 562,900
SUBTOTALES:										$ 562,900	$ 0	$ 562,900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 439,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 439,800	$ 0	$ 0	$ 439,800
SUBTOTALES:													$ 439,800	$ 0	$ 0	$ 439,800

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 85,700	$ 85,700	$ 0	$ 0	$ 85,700
SUBTOTALES:									$ 85,700	$ 0	$ 0	$ 85,700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DIAS	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD							ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
1	CC 7711430	FERDOMO POLANIA FAIVER EDUARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE		$ 3.517.850				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 3.517.850	$ 562,900	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 562,900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.517.850	$ 439,800	$ 0	$ 439,800	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.517.850	7711430	$ 85,700	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.088.400

Planilla Pagada

Nota: Este soporte no es válido para reclamaciones ante entidades financieras y administradoras.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE PREVIO AL PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7711430
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 4 9 25 OF 507	TELÉFONO:	8698200
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7952398150			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO 2024	
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	8958254423		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 241.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.600	$ 0	$ 241.600
SUBTOTALES:										$ 241.600	$ 0	$ 241.600

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 60.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.400	$ 0	$ 0	$ 60.400
SUBTOTALES:													$ 60.400	$ 0	$ 0	$ 60.400

planilla pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 21.500	$ 21.500	$ 0	$ 0	$ 21.500
SUBTOTALES:									$ 21.500	$ 0	$ 0	$ 21.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$ 60.400	$ 0	$ 60.400
SUBTOTALES:			$ 60.400	$ 0	$ 60.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES: COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1075277887	DELGADO RAMOS INGRID YOMARA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																
2	CC 1079174289	POLANIA LEIVA YINA CARIME	DEPEND		$ 2.100.000	FIJO			SI	01	03														

SEGURIDAD SOCIAL

Nº	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DÍAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DÍAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	7711430	$ 6.800
2	230301-PORVENIR	3	$ 210.000	$ 33.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 33.600	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 210.000	$ 8.400	$ 0	$ 8.400	14-11 - ARL SURA	3	$ 210.000	7711430	$ 14.700

Nº	PARAFISCALES CCF DÍAS COT	CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 1.300.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	3	$ 210.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 8.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

planilla Pagada

TOTAL PAGADO: $ 383.900

Nota: Este soporte no es válido para reclamaciones ante entidades financieras y administradoras.
