INFORME No. 7

Contrato Obra N. CLPIH401-2023

Objeto es el **"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA"**


Dirección: Cra. 3 w N. 64-37 Barrio Chicalá
Email: consorciocivilheinder@gmail.com
Teléfonos: 3187167087
Ciudad: Neiva Huila

CONTRATO DE OBRA No. CLPIH401 DE 2023

INFORME DE OBRA No. 7

MENSUAL [X] **FINAL** [ ]

Objeto Contrato: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ, DEPARTAMENTO DEL HUILA

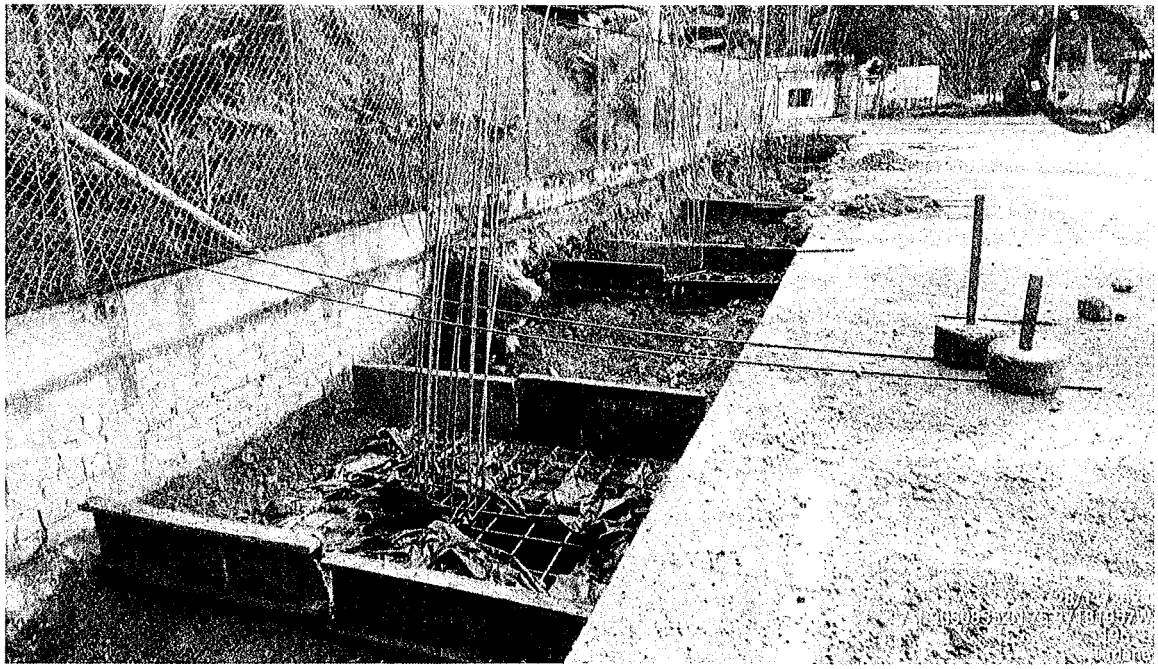

MUNICIPIO: Timana, Vereda Pantanos.


DEPARTAMENTO: HUILA


CONTRATO DE OBRA No. CLPIH401 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO CIVIL H&E


APOYO A LA SUPERVISIÓN	Ing. XIMENA ADELINDA JIMENEZ ZUÑIGA	**ENTIDAD**	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	CLPIH401 DE 2023		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ, DEPARTAMENTO DEL HUILA	**PERIODO DEL INFORME**	Entre 01 de enero al 30 De enero de 2025.
CONTRATISTA	CONSORCIO CIVIL H&E	**NIT**	901.767.013-6
REPRESENTANTE LEGAL:	HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON	**C.C**	79.944.179 de Bogotá D.C.

FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	2 DE NOVIEMBRE DEL 2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16 DE NOVIEMBRE DEL 2023		
FECHA DE SUSPENSIÒN No. 1	26 de diciembre del 2023		
FECHA DE REINICIO No. 1	24 de septiembre del 2024		
OTROSI No. 1 24/09/2024	MODIFICACIÓN CLÁUSULA 3 -PLAZO DEL CONTRATO – VIGENCIA FISCAL		
OTROSI No. 2 12/11/2024	Prorroga: Un (1) mes. Adición: Setenta y cinco millones ciento setenta y nueve mil trescientos cincuenta y siete pesos ($75.179.357) M/CTE		
OTROSI No. 3 13/12/2024	Prorroga: Un (1) mes.		
OTROSI No. 4 10/01/2025	Prorroga: Dos (2) mes.		
PLAZO INICIAL	Tres (3) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones.		
PLAZO TOTAL:	Siete (7) meses contando a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones sin superar la presente vigencia fiscal 2025.		
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS cincuenta y un millones cuatrocientos ochenta y tres mil ciento ochenta y tres pesos ($551.483.183,00) M/CTE.		
VALOR ADICIONAL (12/11/2024):	Setenta y cinco millones ciento setenta y nueve mil trescientos cincuenta y siete pesos ($75.179.357) M/CTE.		
VALOR TOTAL:	s cincuenta y un millones cuatrocientos ochenta y tres mil ciento ochenta y tres pesos ($626.662.540) M/CTE.		
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	**NIT:**	Nit. 901.769.619-8
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	**C.C:**	7.711.430

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

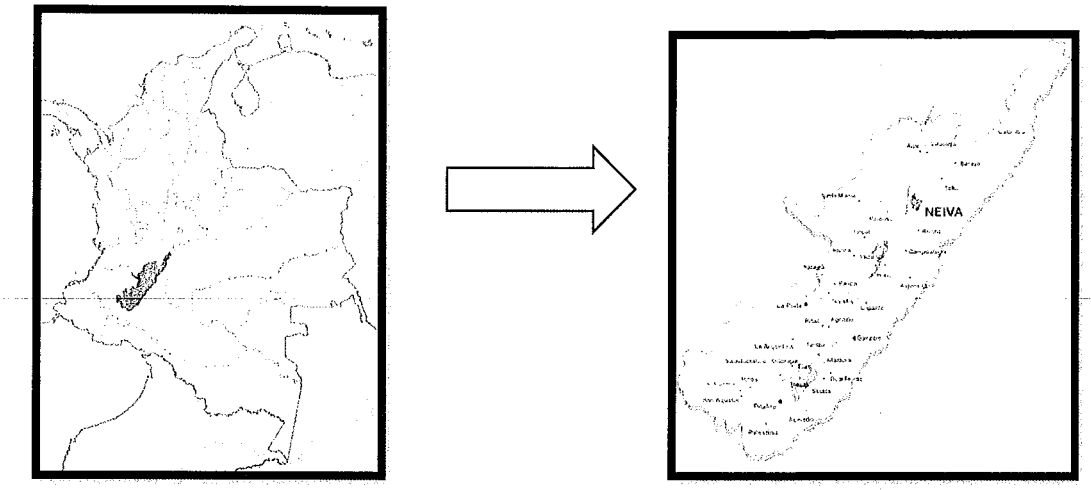

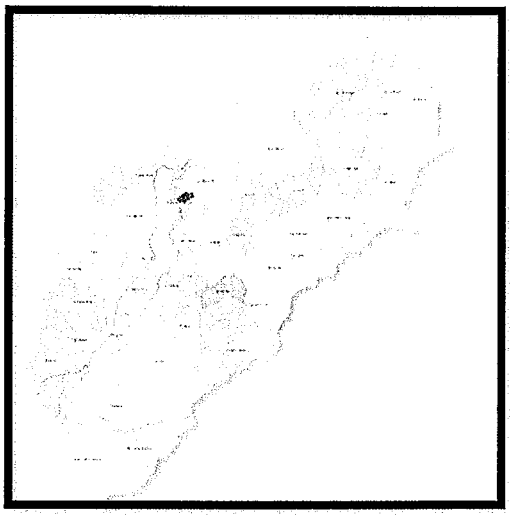

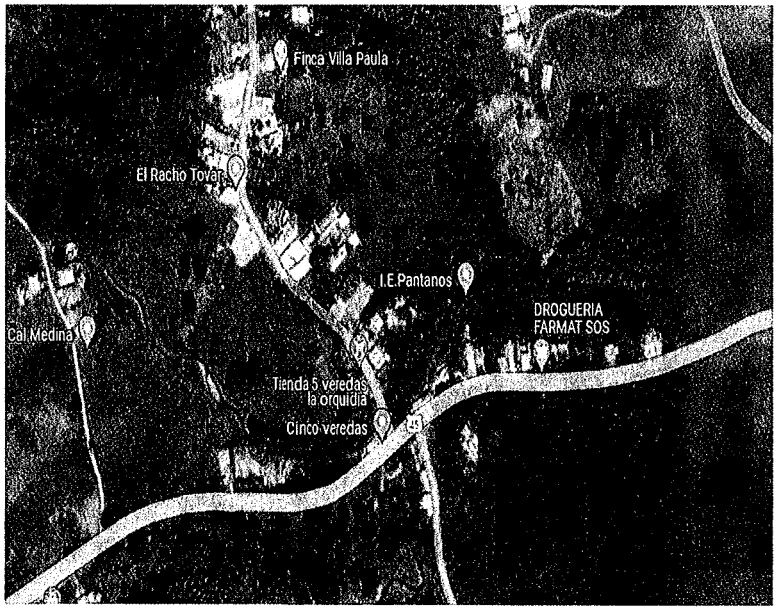

ILUSTRACIÒN 1. LOCALIZACIÒN MUNICIPIO DE TIMANA

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de (1) cubierta autoportante con iluminación para la vereda pantanos de la zona rural del Municipio de Timana Departamento del Huila
Es un sistema de estructura en concreto y teja auto portante a base de lámina de acero cal. 22:
- Área Total replanteo: 937,20 M2
- Actividades preliminares.
- Cimentación en concreto.
- Estructura en concreto.
- Cubierta.
- Instalaciones hidrosanitarias.
- Instalaciones eléctricas.

4. INFORME CONCRETO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DURANTE EL PERIODO

N/A

5. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION
Iniciación	16 de Noviembre de 2023	**40**		
Suspensión No. 1	26 de diciembre de 2023		**273**	
Reiniciación No. 1	24 de septiembre de 2024	**37**		
OTROSI No. 2	12 noviembre del 2024.	30		
OTROSI No.3	13 diciembre del 2024	30		
OTROSI No. 4	10 enero del 2025	30		
TERMINACIÓN Cto.				13 de marzo de 2025
TOTAL DIAS		**167**	**273**	

6. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA INICIO	1	16 de noviembre del 2023
ACTA DE SUSPENSION	1	26 de diciembre del 2023
ACTA DE JUSTIFICACION	1	26 de diciembre del 2023
ACTA DE REINICIO	1	24 de septiembre del 2024


ACTA DE JUSTIFICACION	2	24 de septiembre del 2024
ACTA DE JUSTIFICACION	3	24 de septiembre del 2024
OTROSI MODIFICATORIO	1	24 de septiembre del 2024
ACTA DE JUSTIFICACION	4	12 de noviembre del 2024
OTROSI MODIFICATORIO	2	12 de noviembre del 2024
OTROSI MODIFICATORIO	3	13 de diciembre del 2024
ACTA DE JUSTIFICACION	5	13 de diciembre del 2024
OTROSI MODIFICATORIO	4	10 de enero del 2025.
ACTA DE JUSTIFICACION	6	10 de enero del 2025.

7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

a). **Actividades administrativas**	Capacitaciones por parte la siso Reunión extraordinaria con la comunidad, interventoría, y contratista donde se exponen las razones por la pérdida de tiempo en la construcción de la cubierta. Comité extraordinario, interventoría, entidad, contratista Ampliación del plazo de ejecución del contrato
b.) **Actividades operativas**	• Limpieza de material residual • Finalización de viga de cimentación Eje A • Finalización de armado de canastas columnas Eje B • Encofrado de columnas para fundir eje B • Se funden columnas Eje B, B1, B6, B5, B3, B2, B4, A1, A2, A3, A4, A5, A6 • Armado de acero para viga de cimentación • Conexión de tubería perfora de 4" entre ejes

8. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

Las temperaturas máximas diarias son alrededor de 26 °C, rara vez bajan a menos de *24 °C* o exceden *28 °C*.
Las temperaturas mínimas diarias son alrededor de 18 °C, rara vez bajan a menos de *16 °C* o exceden *19 °C*. La temperatura baja promedio diaria más alta es *18 °C* el *24 de enero*.
El mes de enero, Timaná tiene nubosidad que *aumenta gradualmente* y el porcentaje de tiempo que el cielo está *nublado* o *mayormente nublado* aumenta del *81 %* al *85 %*. La probabilidad más baja de tener condiciones *nubladas* o *mayormente nubladas* es del *80 %* el *10 de enero*.
El día más despejado del mes es el *10 de enero*, con condiciones *despejadas*, *mayormente despejadas* o *parcialmente nubladas* el *20 %* del tiempo.
El promedio de lluvia durante un periodo de 31 días en una escala móvil en enero en Timaná *es esencialmente constante*.

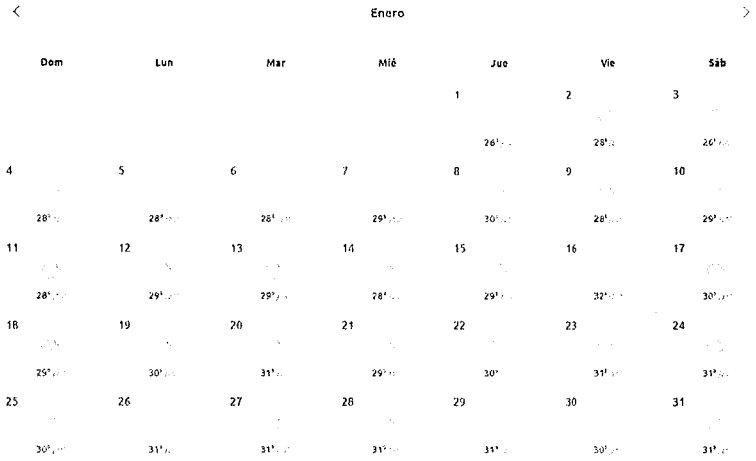

ILUSTRACIÒN 2. TIEMPO MUNICIPIO DE TIMANA

9. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Tipo Prueba de Laboratorio	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
Diseños de mezcla para los concretos.	N/A	N/A
Diseños de mezcla para base.	N/A	N/A
Compresión simple al concreto.	N/A	N/A
Ensayo de compactación de campo	N/A	N/A

NOTA: *Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Articulo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.*

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
N/A	N/A	N/A	7	14	28	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A				N/A	N/A	N/A
		N/A				N/A	N/A	N/A
		N/A				N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A				N/A	N/A	N/A
		N/A				N/A	N/A	N/A
		N/A				N/A	N/A	N/A

10. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo (25%)	23/10/2024	$130.977.256		$130.977.256
Acta Parcial No. 1		$	$	$
Acta Parcial No. 2		$	$	$
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$551.483.183	$75.179.357	$626.662.540	$	$495.685.334

11. COMITES DE OBRA

Fecha de Realización	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
06/01/2025	OBRA	Plan de contingencia, seguimiento de pruebas de laboratorios y fundición de columnas eje B
17/01/2025	OBRA	Fundición de columnas, compactación y pedestales del eje A.
24/01/2025	OBRA	Conexión de filtro entre el eje AY B
31/01/2025	OBRA	Finalizar la función de columnas, compactación mecánica y armado de estructura para encofrado viga corona.

12. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD	No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)	FORMATO (Físico/Digital)
Pólizas de cumplimiento (Endoso 3 (No61-44-101051701.)			DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso 3 (No. 61-40-101018824))			DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso 4 (No61-44-101051701.)			DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso 4 (No. 61-40-101018824))			DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso 5 (No. 61-40-101018824))			DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso 5, 6, 7 (No61-44-101051701.)			DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso 4 (No. 61-40-101018824))			DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso 9 (No 61-44-101051701.)			DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso 6, 7 (No. 61-40-101018824))			DIGITAL
Copias de Bitácora de Obra (periodo del 01/01/2025) al (31/01/2025)	07/02/2025		FISICO

Informe HSEQ (periodo del 01/01/2025) al (31/01/2025)	07/02/2025		FISICO
Actas de socialización e inicio de obra			FISICO
Actas de conformación de veeduría ciudadana			FISICO
Acta de vecindad			FISICO
Actas de comités (periodo del 01/01/2025) al (31/01/2025)	07/02/2025		FISICO
Planillas de aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP) (periodo del 01/01/2025) al (31/01/2025)	07/02/2025		FISICO
Correspondencia (periodo del 01/01/2025) al (31/01/2025)	07/02/2025		FISICO
Registros de ensayos de calidad(periodo del 01/01/2025) al (31/01/2025)	07/02/2025		FISICO
Registros de ensayos de calidad(periodo del 01/01/2025) al (31/01/2025)	07/02/2025		FISICO

13. RELACION DE PERSONAL (Profesional y Mano de obra)

NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON	79944179	DIRECTOR	PRESTACION DE SERVICIOS
WILSON REINALDO PARRA TOVAR	79500020	RESIDENTE	PRESTACION DE SERVICIOS
LIZETH NAIROBY LUNA CUELLAR	1077862501	SISO	PRESTACION DE SERVICIOS
ADRIAN DIYER CHALA MEDINA	1080933023	AYUDANTE	PRESTACION DE SERVICIOS
YONEISON CORREA ORTIZ	1004440666	AYUDANTE	PRESTACION DE SERVICIOS
SEBASTIAN ESPAÑA ARDILA	1083876435	AYUDANTE	PRESTACION DE SERVICIOS
JONATHAN ESPAÑA MEDINA	1080935714	AYUDANTE	PRESTACION DE SERVICIOS
LEONARDO GOMEZ QUINAYAS	1004208423	AYUDANTE	PRESTACION DE SERVICIOS
WILMAR SANTIAGO IDROBO CLAROS	1004034509	AYUDANTE	PRESTACION DE SERVICIOS
JOSE DUBERNEY VILLAREAL CUERVO	12241157	AYUDANTE	PRESTACION DE SERVICIOS

JUAN CARLOS SANCHEZ TRUJILLO	1081514075	RESIDENTE AUXILIAR	PRESTACION DE SERVICIOS

14. RELACIÓN DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA
ANTICIPO	2024001265	23 DE OCTUBRE DE 2024

15. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON	$480,000	$375,000	$73,100	$60.000	$0		
WILSON REINALDO PARRA TOVAR	$227.800	$178.000	$99.100	$57.000	$71.300	32652875	28/02/2025
LIZETH NAIROBY LUNA CUELLAR	$227.800	$178.000	$99.100	$57.000	$71.300	32652875	28/02/2025
ADRIAN DIYER CHALA MEDINA	$182.300	$142.400	$79.300	$45.600	$57.000	32652875	28/02/2025
YONEISON CORREA ORTIZ	$182.300	$142.400	$79.300	$45.600	$57.000	32652875	28/02/2025
SEBASTIAN ESPAÑA ARDILA	$182.300	$142.400	$79.300	$45.600	$57.000	32652875	28/02/2025
JONATHAN ESPAÑA MEDINA	$182.300	$142.400	$79.300	$45.600	$57.000	32652875	28/02/2025
LEONARDO GOMEZ QUINAYAS	$182.300	$142.400	$79.300	$45.600	$57.000	32652875	28/02/2025
WILMAR SANTIAGO IDROBO CLAROS	$182.300	$142.400	$79.300	$45.600	$57.000	32652875	28/02/2025
JOSE DUBERNEY VILLAREAL CUERVO	$182.300	$142.400	$79.300	$45.600	$57.000	32652875	28/02/2025
JUAN CARLOS SANCHEZ TRUJILLO	$47.450	$6.000	$3.400	$1.900	$2.500	32652875	28/02/2025

16. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

Póliza legalización del CONTRATO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-101051701	0	02/11/2023	Cumplimiento del contrato	02/11/2023	02/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	02/11/2023	02/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/11/2023	02/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-101018824	0	02/11/2023	02/11/2023	02/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-101051701	1 Y 2	20/11/2023	Cumplimiento del contrato	02/11/2023	02/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	02/11/2023	02/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/11/2023	02/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-101018824	1 Y 2	20/11/2023	02/11/2023	02/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION No. 1 - ACTA DE REINICIO No. 1:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-101051701	3 Y 4	20/11/2023	Cumplimiento del contrato	16/11/2023	16/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	16/11/2023	16/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/11/2023	16/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-101018824	3,4 Y 5	02/10/2024	16/11/2024	20/11/2024

Póliza actualizada x OTROSI MODIFICATORIO No.2

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA		5, 6 Y 7	18/11/2024	Cumplimiento del contrato	16/11/2023	20/06/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	16/11/2023	02/06/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/11/2023	20/12/2027

	61-44-101051701			Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-101018824		18/11/2024	16/11/2024	20/11/2024

Póliza actualizada x OTROSI MODIFICATORIO No.3

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-101051701	8	19/12/2024	Cumplimiento del contrato	16/11/2023	25/07/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	16/11/2023	25/07/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/11/2023	25/01/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-101018824	8	19/12/2024	16/11/2024	25/07/2025

Póliza actualizada x OTROSI MODIFICATORIO No.4

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)


ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-101051701	9	21/01/2025	Cumplimiento del contrato	16/11/2023	25/09/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	16/11/2023	25/09/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/11/2023	30/03/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)


ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-101018824	6, 7	21/01/2025	16/11/2024	25/06/2025

17. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

(Describir el contenido del plano)

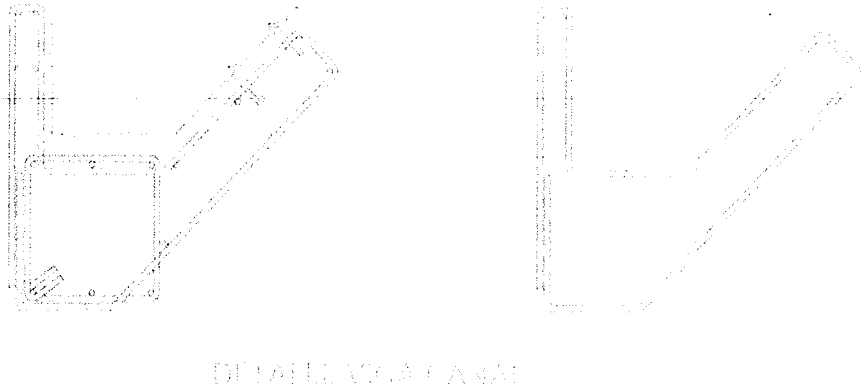

ESQUEMA 1. Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal

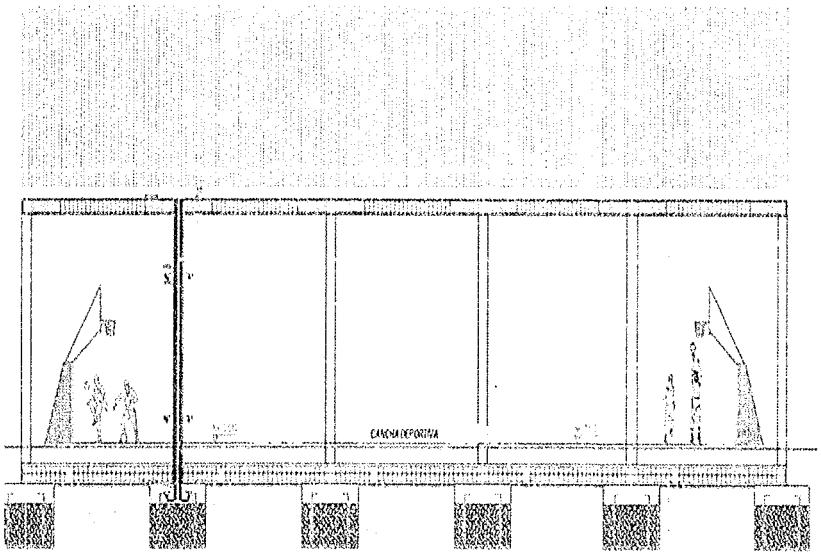

ESQUEMA 2. Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas

18. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

	CONDICIONES CONTRACTUALES					EJECUCIÓN DE OBRA MENSUAL			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR		CANT	% EJECUCION
1	**Preliminares**									
1.1	Localización y replanteo.	M2	900.42	$ 3,558.00	$ 3,203,694.00		$ -	0.00000000000000%	900.42	0.72615405572576%
1.2	Corte de Placa de concreto e= 0.10 mts.	ML	157.80	$ 26,280.00	$ 4,146,984.00		$ -	0.00000000000000%	74.90	0.44615413050592%
1.3	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	108.84	$ 116,723.00	$ 12,704,131.00		$ -	0.00000000000000%	108.84	0.05291321820778%
1.4	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	217.73	$ 46,003.00	$ 10,016,233.00		$ -	0.00000000000000%	217.73	2.22978445724842%
1.5	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	201.44	$ 83,849.00	$ 16,890,543.00	100.00	$ 8,384,900.00	1.67253096060282%	162.00	2.70954715440516%
1.06 NP	Relleno, crudo de rio para filtrar y compactar, mecanicamente.	M3	54.49	$ 127,780.00	$ 6,962,732.00	14.49	$ 1,851,532.00	0.36932397459085%	54.49	1.38888607060441%
1.07 NP	Filtro en tuberia de drenaje de 4" PVC perforada	ML	94.50	$ 138,014.00	$ 13,042,323.00	24.50	$ 3,381,343.00	0.67447445478391%	94.50	3.08331178849298%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 66,966,640.00**		**$ 13,617,775.00**			
2	**CIMENTACIÓN**									
2.1	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	16.40	$ 34,012.00	$ 557,797.00		$ -	0.00000000000000%	16.40	0.12598716108459%

2.2	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	34.56	$ 619,063.00	$ 21,394,817.00		$ -	0.00000000000000%	34.56	4.52023947168129%
2.3	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	2,462.20	$ 7,116.00	$ 17,521,015.00		$ -	0.00000000000000%	2462.20	3.88193323037089%
2.4	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño,	M3	12.20	$ 742,041.00	$ 9,052,900.00		$ -	0.00000000000000%	12.20	1.80581593241331%
2.5	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación.	KG	1,257.66	$ 7,116.00	$ 8,949,509.00		$ -	0.00000000000000%	1103.38	1.56625926918057%
2.6	Concreto Ciclopeo - 2500 PSI (175 KG/CM2) 60% Concreto 2500 PSI + 40% Piedra media zonga	M3	76.03	$ 360,003.00	$ 27,371,028.00		$ -	0.00000000000000%	76.03	6.20395799086407%
2.07 NP	Suministro e instalacion de plastico negro 3,5 impermehabilizacion.	M2	138.72	$ 15,257.00	$ 2,116,451.00		$ -		138.72	0.42219545326929%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 86,963,517.00**		**$ -**			
3	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**									
3.1	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	17.04	$ 920,829.00	$ 15,690,926.00	14.04	$ 12,928,439.00	2.57882795260109%	17.04	3.12985957322421%
3.2	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	3,894.25	$ 7,116.00	$ 27,711,483.00	1894.3	$ 13,479,483.00	2.68874436790174%	3894.25	5.52768781571536%
3.3	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.	M3	19.37	$ 1,004,876.00	$ 19,464,448.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
3.4	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	2,348.55	$ 7,116.00	$ 16,712,282.00	1000	$ 7,116,000.00	1.41942424067665%	1000.00	1.41942424067665%
3.5	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	65.80	$ 40,347.00	$ 2,654,833.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%

	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 82,233,972.00**		**$ 33,523,922.00**			
4	**CUBIERTA**									
4.1	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	845.53	$ 211,559.00	$ 178,879,481.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 178,879,481.00**		**$**			
5	**ACABADOS - PLACA EN CONCRETO**									
5.1	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	307.11	$ 14,798.00	$ 4,544,614.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
5.2	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	0.00	$ 3,710,773.00	$ -			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
5.3	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	140.28	$ 73,943.00	$ 10,372,724.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
5.4	Cuneta en concreto de 3.000psi, segun diseño	ML	69.80	$ 83,852.00	$ 5,852,870.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
5.05 NP	Mantenimiento de cancha multifuncional Futbol de Salón, Baloncesto, incluye pintura, mallas, demarcado y logos.	UND	2.00	$ 736,291.00	$ 1,472,582.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 22,242,790.00**		**$**			
6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**									
6.1	Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	49.60	$ 80,145.00	$ 3,975,192.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%

6.2	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.	ML	23.68	$ 107,091.00	$ 2,535,915.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
6.3	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	24.00	$ 219,053.00	$ 5,257,272.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
6.4	Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	2.00	$ 349,989.00	$ 699,978.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
6.5	Construcción de filtros laterales externos en un ancho de 0,40 mts, con altura variable menor a 0,50 mts, recubrimiento en geotextil no tejido NT-1600, con gravilla común o triturado de 1 1/2" a 4"+ tubería PVC drenaje de 6"	ML	91.04	$ 63,617.00	$ 5,791,692.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 18,260,049.00**		**$**			
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**									
7.1	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	3.00	$ 638,903.00	$ 1,916,709.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.2	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	16.24	$ 46,003.00	$ 747,089.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.3	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	ML	29.00	$ 49,342.00	$ 1,430,918.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.4	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2.00	$ 304,503.00	$ 609,006.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.5	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	2.00	$ 282,276.00	$ 564,552.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.6	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1.00	$ 1,016,827.00	$ 1,016,827.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%

7.7	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1.00	$ 4,701,216.00	$ 4,701,216.00			0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%
7.8	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 AL ser8000 + 1x8 CU.	ML	12.00	$ 88,535.00	$ 1,062,420.00			0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%
7.9	Suministro e instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12.00	$ 368,969.00	$ 4,427,628.00			0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%
7.10	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	64.00	$ 58,153.00	$ 3,721,792.00			0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%
7.11	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12.00	$ 1,018,790.00	$ 12,225,480.00			0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%
7.12	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1.00	$ 975,015.00	$ 975,015.00			0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%
7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	1.00	$ 1,035,368.00	$ 1,035,368.00			0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%
7.14	Excavación, hincada y plomada de postes de concreto de 8 mts x 510 kg armado y centrifugado.	UND	2.00	$ 2,252,908.00	$ 4,505,816.00			0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%
7.15	Vestida de estructura de retencion en baja tensiòn con grapa de retencion para cable trenzado y percha de gancho abierto.	UND	1.00	$ 340,951.00	$ 340,951.00			0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%
7.16	Vestida de estructura de retención doble en baja tensión con dos grapas de retención para cable trenzado con perno de gancho abierto y percha de gancho abierto para sujeción de la red trenzada.	UND	1.00	$ 236,067.00	$ 236,067.00			0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%
7.17	Vestida de estructura de retención en baja tensión con grapa de retención para cable trenzado y perno de gancho abierto.	UND	1.00	$ 340,951.00	$ 340,951.00			0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%


7.18	Tendido y tensionado en conductor trenzado de aluminio aislado 2x35 mm + 50 mm tipo PE-XLPE - 600 VAC.	ML	55.00	$ 46,080.00	$ 2,534,400.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 42,392,205.00**		**$**			
8	TRANSPORTE									
8.1	Transporte de materiales petreos	M3-Km	3,083.07	$ 1,100.00	$ 3,391,377.00			0.00000000000000%	3083.07	0.67647593072980%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 3,391,377.00**		**$**			
% AVANCE DE OBRA								**9.40332595115706%**		**39.91658694440040%**

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON
DIRECTOR DE OBRA

YINA CARIME POLANIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

19. REGISTRO FOTOGRAFICO

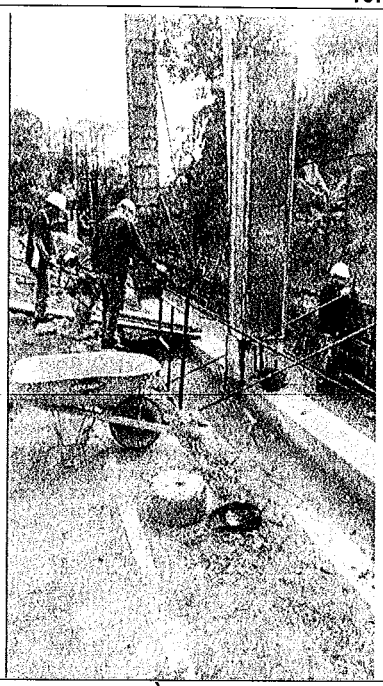





ILUSTRACIÒN 3 y 4. Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.



ILUSTRACIÒN 5 . Relleno, crudo de rio para filtrar y compactar, mecanicamente.

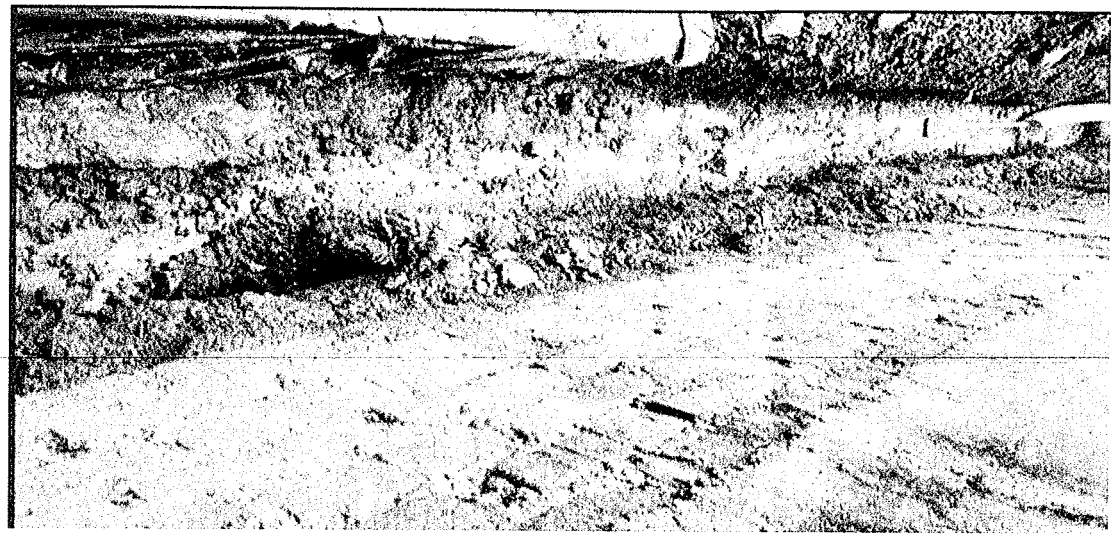


ILUSTRACIÒN 6. Filtro en tuberia de drenaje de 4" PVC perforada

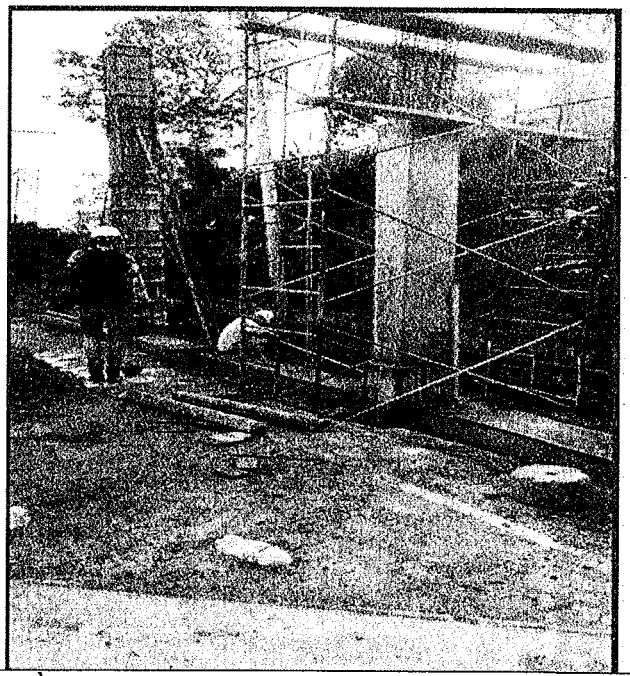

ILUSTRACIÒN 7. Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.



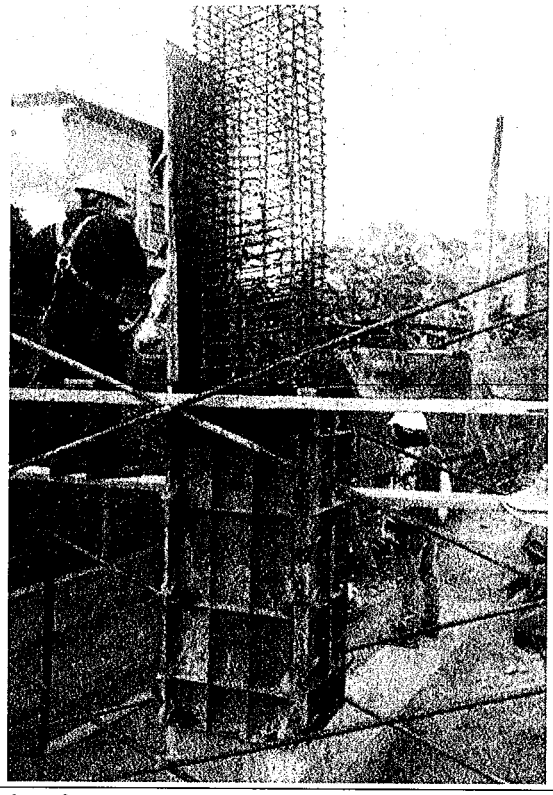

ILUSTRACIÒN 8 Y 9. Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas





ILUSTRACIÒN 10 y 11. Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal

20. ANEXOS

- INFORME HSEQ.
- ACTAS DE COMITÉS.
- BITACORA DE OBRA.
- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP).
- CERTIFICADO VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA REALIZADO POR EL INTERVENTOR (Vo.Bo. Interventor).
- CORRESPONDENCIA GENERADA DURANTE EL PERIODO.

ING. HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON	(07/02/2025)	ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
FIRMA ORIGINAL **DIRECTOR DE OBRA**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**

OTROSI No

Dirección: Cra. 3 w N. 64-37 Barrio Chicalá
Email: consorciocivilheinder@gmail.com
Teléfonos: 3187167087
Ciudad: Neiva Huila

OTROSÍ MODIFICATORIO No.04 AL CONTRATO DE OBRA N°CLPIH401 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO CIVIL H&E

CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA N°CLPIH401 DE 2023**
OBJETO:	**"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMANETO DEL HUILA".**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CIVIL H&E**
NIT:	901.767.013-6
REPRESÉNTATE LEGAL:	**HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON** C.C. 79.944.179 de Bogotá D.C.
INTERVENTOR:	**CONSORCIO WF** NIT 901.769.619-7 R.L. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA C.C. 7.711.430
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 551.483.183) M/CTE.**
FECHA SUSCRIPCIÓN:	2 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	**TRES (03) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No.1:	26 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA ACTA DE REINICIO No.1:	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
OTROSÍ No.01: 24/09/2024	MODIFICACIÓN CLÁUSULA 3 -PLAZO DEL CONTRATO – VIGENCIA FISCAL.
OTROSÍ No. 02: 12/11/2024	Prorroga: UN (1) MES. Adición: SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($ 75.179.371) M/CTE.
OTROSÍ No. 03: 13/12/2024	Prorroga: UN (1) MES.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS ($ 626.662.540) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (5) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución, y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones sin superar la presente vigencia fiscal 2024.
PLAZO A PRORROGAR:	**DOS (2) MESES.**

OTROSÍ MODIFICATORIO No.04 AL CONTRATO DE OBRA N°CLPIH401 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO CIVIL H&E

Entre los suscritos: **EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FISÍCA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA – INDERHUILA-** con NIT. 813.005.578-7, entidad Representada Legalmente por el Doctor **FELIPE VICTORIA BARRAGÁN**, identificado con la cédula de ciudadanía N°1.077.845.632 expedida en Garzón - Huila, en calidad de **DIRECTOR**, nombrado mediante Decreto No.01 del 02 de enero de 2024, cargo para el cual tomó posesión el día 02 de enero de 2024, según consta en Acta de posesión No. 009, suscritas por el Doctor RODRIGO VILLALBA MOSQUERA, en su calidad de Gobernador del Departamento del Huila, en ejercicio de las facultades conferidas en el Decreto 1338 de 2004 numeral 3 del artículo 21 y en ejercicio de la competencia otorgada por la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y demás normas reglamentarias, quien se denomina la Entidad Estatal Contratante, por la otra, **HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número No. 79.944.179 de Bogotá D.C., Representante legal del **CONSORCIO CIVIL H&E** con NIT. 901.767.013-6 quien se denominará el Contratista; hemos convenido en celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO N°04,** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **1.** Que, el día **diez (10) de enero de 2024,** se reunieron en las oficinas del Instituto Departamental del Deporte, La Recreación, la Educación Física, y el Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila – INDERHUILA, los suscritos **FELIPE VICTORIA BARRAGÁN**, en calidad de Director del INDERHUILA – Supervisor-, el Ing. **HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON** representante legal del **CONSORCIO CIVIL H&E** en calidad de contratista de obra y el Ing. **FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA** representante legal del CONSORCIO WF en calidad de Interventor; con la finalidad de suscribir el **Acta de Justificación No.06** para prorrogar el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°CLPIH 401 DE 2023, bajo los siguientes términos: A. El día 09 de octubre de 2023 por medio de la Resolución No.361 de 2023, se adjudicó el mencionado proceso de obra cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMANETO DEL HUILA."** B. El día 2 de noviembre del 2023 se suscribió el Contrato Contrato de Obra Pública No. CLPIH401 de 2023 celebrado entre el Instituto Departamental Del Deporte, La Educación Física, La Recreación y El Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila - "INDERHUILA" y CONSORCIO CIVIL H&E, por un valor de **QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 551.483.183) M/CTE.** C. El día 16 de noviembre de 2023 se suscribió el acta de inicio del Contrato de Obra Pública No.**CLPIH401 de 2023**. D. El día 26 de diciembre del 2023 se suscribió el Acta de Justificación N°01 y Suspensión N°01 al Contrato de Obra N°CLPIH401 de 2023; por los motivos expuestos en el acta referida. E. El día 24 de septiembre del 2024 se suscribió el Acta de Justificación N°02 y Reinicio N°01 al Contrato de Obra N°CLPIH401 de 2023; por los motivos expuestos en el acta referida. F. El día 24 de septiembre del 2024 se suscribió el Acta de Justificación N°03 y Otro si N°01 modificando la Cláusula 3 – Plazo del contrato – en sentido de ampliar el plazo de ejecución a la presente vigencia fiscal. G. El día 12 de noviembre del 2024 se suscribió el Acta de Justificación N°04 y Otrosí N°02, por medio del cual se adiciono al contrato de Obra N°CLPIH401 de 2023, la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($ 75.179.371) M/CTE., prorrogándose en UN (01) MES más al plazo de ejecución. H. El día 13 de diciembre del 2024 se suscribió el Acta de Justificación N°05 y Otrosí N°03, prorrogándose en UN (01) MES más al plazo de ejecución. I. Que, mediante oficio del 10 de enero del 2025 el Contratista de Obra CONSORCIO CIVIL H&E solicita a la Interventoría CONSORCIO WF la prórroga al contrato de obra pública N°CLPIH401 de 2023, argumentando lo siguiente: *"(...) En mi calidad de representante legal del contrato de obra CLPIH401-2023 que tiene por objeto "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA", y atendiendo al comité técnico efectuada el día 10 de enero del 2025 entre las partes, se eleva la solicitud formal de prórroga por 2 meses al contrato de obra, atendiendo a que persiste el mal clima en la zona que ha impedido el avance en las actividades de fundición de los concretos, retrasando el armado e izaje de las vigas de amarre actividad que genera mayor tiempo por su armado. Por consiguiente, se requiere del plazo anteriormente solicitado para poder cumplir a cabalidad con el objeto contractual. (...)"* J. Que, [illegible]

el día 10 de enero del 2025 el CONSORCIO WF en su calidad de interventor, mediante oficio No MUN.TIM. WF42023-036, avala, aprueba y viabiliza la solicitud de prórroga al Contrato de obra pública N°CLPIH401 de 2023, el cual manifiesta: *"(...) En mi calidad de Interventor del contrato de obra CLPIH401-2023, que tiene como objeto la "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ, DEPARTAMENTO DEL HUILA", me permito dar respuesta a la solicitud formal presentada por ustedes, en la cual solicitan una prórroga de dos (2) meses para la ejecución del contrato, debido a los persistentes inconvenientes generados por las condiciones climáticas adversas en la zona, que han dificultado el avance de las actividades de fundición de concretos, así como el armado e izaje de las vigas de amarre, tareas que requieren un tiempo considerable para su correcta ejecución. Luego de evaluar las circunstancias presentadas y en atención a los reportes y observaciones realizadas tanto por el contratista como por la interventoría, considero que los motivos expuestos son razonables y justifican la necesidad de una prórroga en el plazo de ejecución. Por lo tanto, la interventoría aprueba y avala la prórroga solicitada por un término de dos (2) meses, con el fin de permitir el cumplimiento adecuado del objeto contractual, teniendo en cuenta que el mal clima ha afectado directamente el cronograma de trabajo. Este plazo adicional se otorgará conforme a las disposiciones y términos establecidos en el contrato original, y se procederá a realizar los ajustes necesarios en los plazos de ejecución, de acuerdo con lo aprobado por las partes. (...)"* K. Que, atendiendo a lo expuesto, el INDERHUILA junto con el apoyo a la supervisión del Contrato de Interventoría N°CIHCM420 del 2023, procedió a revisar técnicamente la solicitud elevada por el CONTRATISTA, encontrando técnica y legalmente procedente prorrogar en DOS (02) MESES más el plazo de ejecución del CONTRATO DE OBRA N°CLPIH401 de 2023, con el fin de desarrollar en su totalidad todas las actividades contractuales para dar cumplimiento con el objeto del contrato. L. Que, por ello, es necesario modificar la **Cláusula 3 - PLAZO DE EJECUCIÓN-** del Contrato de CONTRATO DE OBRA N°CLPIH401 de 2023, la cual, quedará así: "**SIETE (7) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución, y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones *sin superar la vigencia fiscal 2025*". M. Que, de acuerdo a la solicitud del contratista de obra y a la aprobación de la interventoría, las partes acuerdan suscribir el **Otrosí Modificatorio No.04** al Contrato de Obra N°CLPIH401 de 2023, modificándose la Cláusula 3 – PLAZO DEL CONTRATO-, prorrogándose el plazo de ejecución en **DOS (02) MESES** más. N. Que, por las razones anteriormente expuestas la Cláusula 3 – PLAZO DEL CONTRATO- quedará así: "***SIETE (7) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución, y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones sin superar la vigencia fiscal 2025*". Ñ. Las partes acuerdan que la prórroga no genera costos adicionales en el valor del contrato ni dará lugar a futuras reclamaciones e indemnizaciones por parte del contratista por mayor permanencia en la obra y cambio de precios en el mercado de los insumos y materiales, hasta la firma del presente documento. O. El contratista realizará los respectivos ajustes a las pólizas, bajo sus costas, atendiendo al otrosí modificatorio. P. Se adjuntan los siguientes documentos soporte de la presente **Acta de Justificación N°06**: Oficio de solicitud de Prórroga de obra, y Oficio de solicitud de Prórroga – Interventoría. **2.** Por lo anterior, las partes celebran el presente **Otrosí Modificatorio N°04**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Modifíquese la **CLÁUSULA 3. PLAZO DEL CONTRATO**, conforme las razones expuestas en el **Acta de Justificación N°06**, la cual quedará así: **CLÁUSULA 3. PLAZO DEL CONTRATO**. El plazo estimado para la ejecución del contrato será de **SIETE (7) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución, y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones sin superar la vigencia fiscal 2025. **CLÁUSULA SEGUNDA:** El contratista se compromete a realizar las ampliaciones de las Garantías Únicas exigidas al momento de la celebración del Contrato de obra N°CLPIH401 de 2023, con el fin de garantizar la cobertura de la totalidad del plazo de ejecución. **CLÁUSULA TERCERA:** Hace parte integral del OTROSÍ el **acta de justificación N°06** para modificar el Contrato de obra N°CLPIH401 de 2023. **CLÁUSULA CUARTA:** El contratista con la suscripción del presente documento renuncia expresamente a todo tipo de reclamaciones

Nombre Proyecto		***"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMANETO DEL HUILA"***		**Acta No.**	
No. De Contrato obra		CLPIH 401 DEL 2023	**Lugar:**	VEREDA PANTANOS (TIMANA HUILA)	
No. De Contrato Interventoría		CIHCM 420 - 2023			
Fecha	6 DE ENERO 2025	**Hora Inicio**	2: PM	**Hora Final**	5:PM

OBJETO DE LA REUNION
Evaluar el estado de la obra, avance, después de la vacancia, plan de contingencia, reunión técnica

AGENDA	
	1- Reunión con la entidad para evaluar los retrasos en la ejecución de la misma,
	2- Solicitar prórroga del plazo para finalización de la cubierta
	3- Evaluar nuevos planos de contingencia para aumentar el rendimiento de la obra

DESARROLLO

- Se realizo un comité entre todas las partes intervinientes con el fin de solicitar un nuevo plazo, para la culminación de la cubierta. Con el resultado de la aprobación unánime de la ampliación del plazo.

- Se suscribió compromiso para aumentar el rendimiento, y así impactar las actividades

- Se pudo evidenciar el encofrado de las columnas, para su respectiva fundición

- Se realizo la capacitación por parte de la profesional siso, Lizeth Luna Cuellar, en trabajo seguro en alturas, utilización de los equipos estas actividades, líneas de vida equipos de seguridad

- Se solicito a la empresa de suelos Ingelab, unas nuevas pruebas de resistencia al

DESARROLLO
concreto a utilizar en las columnas

TAREAS – COMPROMISOS – TEMAS PROXIMAS REUNIONES			
Tema	**Tarea**	**Responsable**	**Fecha de Control**
1	Seguimiento al plan de contingencia		
2	Seguimiento a las pruebas de laboratorio		
3	Columnas eje B		

EN CONSTANCIA FIRMAN EL ACTA:		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Heiran Jose Trujillo	Director	
Wilson Parra	Residente	
YINA POLANIA	RESIDENTE INTERVENTORIA	

Nombre Proyecto		***"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMANETO DEL HUILA"***		**Acta No.**	
No. De Contrato obra		CLPIH 401 DEL 2023	**Lugar:**	VEREDA PANTANOS (TIMANA HUILA)	
No. De Contrato Interventoría		CIHCM 420 - 2023			
Fecha	17 DE ENERO 2025	**Hora Inicio**	2: PM	**Hora Final**	5:PM

OBJETO DE LA REUNION
Seguimiento a los compromisos suscritos

AGENDA	
	1- Verificar que los compromisos se están cumpliendo
	2- Socializar resultados de laboratorio Ingelab
	3- Compromisos

DESARROLLO

- Se verifica que el compromiso suscrito por parte del contratista se esta cumpliendo, aumentando la planta de personal, abasteciendo la obra con mas materiales para no tener demoras

- Las pruebas de laboratorio a los cilindros, arrojaron la resistencia exigida por parte de la entidad.

- Se empezó a fundir columnas, eje B

- Empezaron las actividades de amarres de traslapes para columnas

DESARROLLO

TAREAS – COMPROMISOS – TEMAS PROXIMAS REUNIONES			
Tema	**Tarea**	**Responsable**	**Fecha de Control**
1	Pedestales Eje A		
2	Fundición columnas		
3	Compactación manual		

EN CONSTANCIA FIRMAN EL ACTA:		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Heiman Jose Trujillo	Directo	
Wilson Parra	Residente	
Yina Polania	Residente Interv.	

Nombre Proyecto		***"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMANETO DEL HUILA"***		**Acta No.**	
No. De Contrato obra		CLPIH 401 DEL 2023	**Lugar:**	VEREDA PANTANOS (TIMANA HUILA)	
No. De Contrato Interventoría		CIHCM 420 - 2023			
Fecha	24 DE ENERO 2025	**Hora Inicio**	2: PM	**Hora Final**	5:PM

OBJETO DE LA REUNION
Avance de las actividades, cumplimiento del cronograma

AGENDA	
	1- Verificar que el plan de contingencia este resultando en el desarrollo de las actividades
	2- Rectificar medidas de los elementos fundidos
	3- Compromisos

DESARROLLO

- Se evidencia un leve incremento en el desarrollo de las actividades, teniendo en cuentas las grandes precipitaciones que se siguen presentando, aun así, se pude determinar que el plan de contingencia está generando un mayor avance en el desarrollo de las actividades

- Se evidencia que las especificaciones técnicas se están desarrollando conforme a los requerimientos y que el compromiso suscrito se esta cumpliendo de una forma diligente

- Se funden columnas eje B

- Empezaron las actividades de amarres de traslapes Para eje A

DESARROLLO

TAREAS – COMPROMISOS – TEMAS PROXIMAS REUNIONES			
Tema	**Tarea**	**Responsable**	**Fecha de Control**
1	Compactación manual con recebo		
2	Fundición columnas		
3	Conexión filtros entre ejes A Y B		

EN CONSTANCIA FIRMAN EL ACTA:		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Heiman Jose Trujillo	Director	
Wilson Parra	Residente	
Yina Polania	RESIDENTE INTERVENTOR	

Nombre Proyecto		***"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMANETO DEL HUILA"***		**Acta No.**	
No. De Contrato obra		CLPIH 401 DEL 2023	**Lugar:**	VEREDA PANTANOS (TIMANA HUILA)	
No. De Contrato Interventoría		CIHCM 420 - 2023			
Fecha	31 DE ENERO 2025	**Hora Inicio**	2: PM	**Hora Final**	5:PM

OBJETO DE LA REUNION
AVANCE DE OBRA

AGENDA	
	1-Verificar el porcentaje de avance de las columnas
	2- Verificar conexiones de los filtros de tubería perforada entre ejes
	3- Compromisos

DESARROLLO

- Las columnas ya se encuentran en proceso de encofrado para el eje A, ratificando que el plan de contingencia se esta cumpliendo teniendo un avance mas significativo, aun, cuando seguimos teniendo dificultades por teas de las lluvias.

- Se realizo las excavaciones y conexiones de los filtros en tubería perforada de 4", crudo de rio, dando por finalizado este ítem

- Verificando el plan de seguridad establecido por la siso se esta resultando, teniendo un registro de cero incidentes en la obra

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F02
Fecha Aprobación: 13/02/2023	ACTA COMITÉ DE OBRA	Versión: 2

DESARROLLO

TAREAS – COMPROMISOS – TEMAS PROXIMAS REUNIONES			
Tema	**Tarea**	**Responsable**	**Fecha de Control**
1	Finalizar las columnas		
2	Armado de estructura para encofrado viga corona		
3	Compactación mecánica		

EN CONSTANCIA FIRMAN EL ACTA:		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Hernan Jose Trujillo	Director	
Wilson Parra	Residente	
YINA POLANIA	RESIDENTE INTERVENTORIA	

SEGURIDAD SOCIAL

Dirección: Cra. 3 w N. 64-37 Barrio Chicalá
Email: consorciocivilheinder@gmail.com
Teléfonos: 3187167087
Ciudad: Neiva Huila

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 32652875
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-02-28

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO CIVIL H&E	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901767013	D.V.	6	TIPO DE APORTANTE	A mayor o igual a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 3W 64 37	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	HERNANTRUJILLO@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	31716770
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	79944179	PRIMER APELLIDO	TRUJILLO	SEGUNDO APELLIDO	CALDERON
PRIMER NOMBRE	HERNAN	SEGUNDO NOMBRE	JOSE		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 01	Año: 2025	Mes: 02	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
10		$10.866.050		32652875

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1080933023	01	No	No	No	41	807	5411101	Fijo	CHALA MEDINA DIYER ADRIAN	$1.423.500
CC-1004440666	01	No	No	No	41	807	5411101	Fijo	CORREA ORTIZ YONEISON	$1.423.500
CC-1083876435	01	No	No	No	41	807	5411101	Fijo	ESPAÑA ARDILA SEBASTIAN	$1.423.500
CC-1080935714	01	No	No	No	41	807	5411202	Fijo	ESPAÑA MEDINA JONATHAN	$1.423.500
CC-1004208423	01	No	No	No	41	807	5411101	Fijo	GOMEZ QUINAYAS LEONARDO	$1.423.500
CC-1004034509	01	No	No	No	41	807	5411101	Fijo	IDROBO CLAROS WILMAR SANTIAGO	$1.423.500
CC-1077862501	01	No	No	No	41	807	5429001	Fijo	LUNA CUELLAR LIZETH NAIROBY	$1.423.500
CC-79500020	01	No	No	No	41	807	5429001	Fijo	PARRA TOVAR WILSON REINALDO	$1.423.500
CC-1081514075	01	No	No	No	41	807	5411101	Fijo	SANCHEZ TRUJILLO JUAN CARLOS	$1.423.500
CC-12241157	01	No	No	No	41	807	5429001	Fijo	VILLAREAL CUERVO JOSE DUBERNEY	$1.423.500

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1080933023	X	2025-01-07																											0		
CC - 1004440666	X	2025-01-07																											0		
CC - 1083876435	X	2025-01-07																											0		
CC - 1080935714	X	2025-01-07																											0		
CC - 1004208423	X	2025-01-07																											0		
CC - 1004034509	X	2025-01-07																											0		
CC - 1077862501																													0		
CC - 79500020																													0		
CC - 1081514075			X	2025-01-01																									0		
CC - 12241157	X	2025-01-07																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1080933023	COLFONDOS	24	$1.138.800	0.1600000	$182.300	$0	$0	$182.300	$0	$0	$0
CC - 1004440666	PORVENIR	24	$1.138.800	0.1600000	$182.300	$0	$0	$182.300	$0	$0	$0
CC - 1083876435	PORVENIR	24	$1.138.800	0.1600000	$182.300	$0	$0	$182.300	$0	$0	$0
CC - 1080935714	PROTECCION	24	$1.138.800	0.1600000	$182.300	$0	$0	$182.300	$0	$0	$0
CC - 1004208423	COLPENSIONES	24	$1.138.800	0.1600000	$182.300	$0	$0	$182.300	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1004034509	COLPENSIONES	24	$1.138.800	0.1600000	$182.300	$0	$0	$182.300	$0	$0	$0
CC - 1077862501	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 79500020	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1081514075	PORVENIR	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	$0	$0	$0
CC - 12241157	PORVENIR	24	$1.138.800	0.1600000	$182.300	$0	$0	$182.300	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1080933023	NUEVA E.P.S. S.A.	24	$1.138.800	0.1250000	$142.400	$0	0	$0	0	$0	24	$1.138.800	4290	0.0696000	$79.300
CC - 1004440666	SANITAS	24	$1.138.800	0.1250000	$142.400	$0	0	$0	0	$0	24	$1.138.800	4290	0.0696000	$79.300
CC - 1083876435	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	24	$1.138.800	0.1250000	$142.400	$0	0	$0	0	$0	24	$1.138.800	4290	0.0696000	$79.300
CC - 1080935714	ESSC ASMET SALUD	24	$1.138.800	0.1250000	$142.400	$0	0	$0	0	$0	24	$1.138.800	4290	0.0696000	$79.300
CC - 1004208423	EPS-S CAPITAL	24	$1.138.800	0.1250000	$142.400	$0	0	$0	0	$0	24	$1.138.800	4290	0.0696000	$79.300
CC - 1004034509	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	24	$1.138.800	0.1250000	$142.400	$0	0	$0	0	$0	24	$1.138.800	4290	0.0696000	$79.300
CC - 1077862501	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4290	0.0696000	$99.100
CC - 79500020	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4290	0.0696000	$99.100
CC - 1081514075	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$47.450	0.1250000	$6.000	$0	0	$0	0	$0	1	$47.450	4290	0.0696000	$3.400
CC - 12241157	ESSC ASMET SALUD	24	$1.138.800	0.1250000	$142.400	$0	0	$0	0	$0	24	$1.138.800	4290	0.0696000	$79.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1080933023	COMFAMILIAR DEL HUILA	24	$1.138.800	0.0400000	$45.600	0.0200000	$22.800	0.0300000	$34.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1004440666	COMFAMILIAR DEL HUILA	24	$1.138.800	0.0400000	$45.600	0.0200000	$22.800	0.0300000	$34.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1083876435	COMFAMILIAR DEL HUILA	24	$1.138.800	0.0400000	$45.600	0.0200000	$22.800	0.0300000	$34.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1080935714	COMFAMILIAR DEL HUILA	24	$1.138.800	0.0400000	$45.600	0.0200000	$22.800	0.0300000	$34.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004208423	COMFAMILIAR DEL HUILA	24	$1.138.800	0.0400000	$45.600	0.0200000	$22.800	0.0300000	$34.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004034509	COMFAMILIAR DEL HUILA	24	$1.138.800	0.0400000	$45.600	0.0200000	$22.800	0.0300000	$34.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1077862501	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-79500020	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081514075	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0200000	$1.000	0.0300000	$1.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12241157	COMFAMILIAR DEL HUILA	24	$1.138.800	0.0400000	$45.600	0.0200000	$22.800	0.0300000	$34.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 01											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	5	$782.300	$0	$0	$0	$0	23	$12.000	$0	$0	$794.300
COLFONDOS	1	$182.300	$0	$0	$0	$0	23	$2.800	$0	$0	$185.100
COLPENSIONES	2	$364.600	$0	$0	$0	$0	23	$5.600	$0	$0	$370.200
PROTECCION	2	$410.100	$0	$0	$0	$0	23	$6.300	$0	$0	$416.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$498.400	$0	0	$0	0	$0	$498.400	23	$7.700	$0	$506.100	$0	0	$0	$0	$506.100	$0	$0	$506.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
ESSC ASMET SALUD	2	$284.800	$0	0	$0	0	$0	$284.800	23	$4.400	$0	$289.200	$0	0	$0	$0	$289.200	$0	$0	$289.200
SANITAS	1	$142.400	$0	0	$0	0	$0	$142.400	23	$2.200	$0	$144.600	$0	0	$0	$0	$144.600	$0	$0	$144.600
EPS-S CAPITAL	1	$142.400	$0	0	$0	0	$0	$142.400	23	$2.200	$0	$144.600	$0	0	$0	$0	$144.600	$0	$0	$144.600
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	$290.800	$0	0	$0	0	$0	$290.800	23	$4.500	$0	$295.300	$0	0	$0	$0	$295.300	$0	$0	$295.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	10	$756.700	0	$0	$0	$756.700	23	$11.600	$768.300	0	$0	$0	$768.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	10	$435.100	23	$6.700	$441.800
SENA	10	$217.600	23	$3.400	$221.000
ICBF	10	$326.500	23	$5.000	$331.500
ESAP	0	$0	23	$0	$0
MinEdu	0	$0	23	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	$1.379.800
PENSIONES	4	$1.766.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$768.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$441.800
SENA	1	$221.000
ICBF	1	$331.500

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4.908.400

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79944179		TRUJILLO CALDERON HERNAN JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 3 W N 64 37	NEIVA-HUILA	8601919	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1364478413	9483460084	I	2025/02/19	2025/03/27	BANCOLOMBIA	36	$1,010,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$11,000	$0	$491,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$480,000	$11,000	$0	$491,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$73,100	$1,700	$0	$74,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$73,100	$1,700	$0	$74,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,000	$1,400	$0	$61,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$60,000	$1,400	$0	$61,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$8,600	$0	$383,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$375,000	$8,600	$0	$383,600
TOTAL				1	$988,100	$22,700	$0	$1,010,800

2025/03/27 08:32 AM

Consorcio Civil H&E
NIT. 901.767.013-6

LABORATORIO

Dirección: Cra. 3 w N. 64-37 Barrio Chicalá
Email: consorciocivilheinder@gmail.com
Teléfonos: 3187167087
Ciudad: Neiva Huila

ENSAYOS DE LABORATORIO
RESISTENCIA A LA COMPRESION ESPECIMENES DE CONCRETO

CLIENTE: CONSORCIO CIVIL H&E

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA PANTANOS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

FECHA DE REPORTE: ENERO DEL 2025


Teléfonos: 316 778 8788 – 310 246 3804
E-mail: ingelabingenieros@gmail.com Dirección: Carrera 8G # 27 – 17 CAMBULOS

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

ORDEN DE TRABAJO	
CONTRATISTA	CONSORCIO CIVIL H&E
PROYECTO	"CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA PANTANOS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA, DEPARTAMENTO DEL HUILA".
UBICACIÓN	MUNICIPIO DE TIMANA, DEPARTAMENTO DEL HUILA
FECHA EMISION INFORME:	martes, 28 de enero de 2025

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD.	COD. INTERNO LABORATORIO	DIMENSIONES CILINDRO Diametro	Longitud	Lectura KN	LECTURA Lbs	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	%de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicacion
22/01/2025	20/01/2025	3	2	10,00	20,00	122,8	27607	7	27/01/2025	2268	76%	4	3000	CONCRETO COLUMNAS
		4		10,00	20,00		0	28	17/02/2025	0	0%	5	3000	

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS HAN SIDO TOMADAS POR EL CLIENTE Y TRANSPORTADAS POR EL LABORATORIO. EL COMPORTAMIENTO PARA UN CONCRETO COMVENCIONAL (SIN ADITIVO) SERA: A LOS 1d= 15%; 3d= 40%; 7d= 70%; 14d= 90%; 28d= 100% CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5%

REALIZO
LABORATORISTA

CALCULO
JEFE DE LABORATORIO

Consorcio Civil H&E
NIT. 901.767.013-6

BITACORA

Dirección: Cra. 3 w N. 64-37 Barrio Chicalá
Email: consorciocivilheinder@gmail.com
Teléfonos: 3187167087.
Ciudad: Neiva Huila

Timana Huila 7 enero 2025.

Hora inicial 7:00 am. Hora Final 5: Pm.
Clima Lluvioso, lluvias fuertes en horas de la mañana.
Personal Ing residente, oficiales, ayudantes SISO
Herramientas y equipo menor.
se realiza limpieza del material residual ocasionado por las altas precipitaciones generadas en la zona

Wilson Parra

Residente inter.

Timana Huila 8 de enero de 2025.
Hora inicial 7:00 am Hora Final 5:00Pm.
Clima Lluvioso, lluvias intermitentes todo el día.
Personal en obra, Ing residente, oficiales ayudantes, SISO
Herramienta menor.
se continua fundiendo viga de cimenta con eje A;

Wilson Parra.

Residente inter.

Timana Huila enero 9 de 2025.
Hora inicial 7:00 am Hora Final 5: Pm.
Clima lluvioso, lluvias intermitentes.
Personal en obra: Ing residente, oficiales. ayudantes, SISO
Herramienta menor.
Se continua con el amarrado de Hierro columnas eje B con Alambre negro
Wilson Parra.

Residente inter.

NKB

Tunana Huila, 10 de Enero de 2025.
Hora Inicial 7:00 AM : Hora Final 5: Pm.
Clima lluvioso, lluvias intermitentes.
Personal en obra, ing residente, oficales ayudantes.
Haramienta menor,
se realiza desencofrado de viga de cimenta con A5, al A4, y se empieza a encofrar. A4- al A3.

Wilson Parra. Residente Inter.

Tunana Huila, Enero 11 de 2025.
Hora inicial 7:00am : Hora Final 5:00Pm
Clima lluvioso, lluvias fuertes, en horas de la mañana
Personal en obra, ing residentes, oficales ayudantes,

no se pudo realizar actividades en obra alta Precipitacion en la zona.

Wilson Parra. Residente Inter.

Tunana Huila 13 enero 2025.
Hora inicial 7:00am Hora Final 5 Pm.
clima lluvias intermitentes
Personal en obra, ing residente, oficiales, ayudantes
SISO
Haramienta menor:
se Fundo viga de cimiacion viga A4 al A3
concreto 3000PSI, Grava 3/4. Arena
se realza encofrado A3 al A2

Wilson Parra Residente inter.

AnyScanner

Timana Huila Enero 14 de 2025.
Hora Inicial 7:00Am Hora Final 5:00Pm
Clima Lluvioso
Personal en obra: Ing residente, oficiales ayudantes.
Herramienta y equipo menor.
Se realiza amarre de traslapos para columnas, Vaciada corrugada de 1/2" y estribos de 3/8.

Wilson Parra.

Residente inter.

Timana Huila, Enero 15 de 2025
Hora Final 7:00Am Hora Final 5:Pm.
Clima lluvioso, lluvias intermitentes
Herramienta menor.
Personal en obra: Ing residente, oficiales ayudantes.
se continua con el despiece de traslapos para los columnos, se continua amarrando Columnas.

Wilson Parra.

Residente inter.

Timana Huila. 16 Enero de 2025.
hora Final 7:00am. Hora Final 5:Pm.
Clima lluvioso
Personal en Obra., Ing residente, Oficiales Ayudantes.
Se continua amarrando columnas eje B, y traslapos de los mismos.

Wilson Parra.

Residente inter.

Timana Huila 17 de Enero de 2025.
Hora Inicial: 7:am. Hora Final 5:Pm.
Clima lluvioso en las Primeras horas.
Personal en obra: Ing residente, ayudantes oficiales, SISO
Herramienta y equipo menor.

Se realiza encofrado de la viga de cimentacion A2 al A1., se continua tumbando tuer lapez. Para vigas ese B.

Wilson Parra. residente inter.

Timana Huila 18 de enero de 2025.
Hora inicial 7:00 am Hora Final 5:Pm.
clima soleado Herramientas y equipos
Personal en obra: Ing residente, Ayudantes oficiales.
se realiza la Fundicion del tramo de viga faltante, A3 al A2; y A2 al A1.

Wilson Parra. residente inter.

Timana Huila 20 enero de 2025.
Hora inicial 7:00 am. Hora Final 5: Pm.
Clima soleada
Personal en obra: Ing residente, oficiales, siso, ayudantes.
Se comienza a montar Formaleta. Para Columnas ese B. B1

Wilson Parra. residente inter.

Timana Huila, 21 enero del 2025

Hora Inician 7 am. Hora Final 5: Pm.

Clima soleado

Personal en obra: Ing. residente, OFICIALES ayudantes, SISO

Herramientas y equipos.

Se continua encofrando columnas con formaletas en lamina, B3, se amarra el traslape de las columnas B1 y B3

Wilson Parra. Residente Interv

Timana Huila, 22 enero de 2025

Hora inicial 7:00am. Hora Final 5:00Pm.

Clima soleado.

Personal en Obra. Ing residente, OFICIALES ayudantes. SISO

llegada de 14 m^3 de recebo, 14 m^3 de Premezclado, se continuan empalmando los traslapes de las columnas.

Wilson Parra. Residente Interv

Timana Huila, 23 de enero de 2025

Hora inicial 7:00am Hora Final 5: Pm

Clima soleado

Personal en obra Ing residente, Ayudantes OFICIALES, SISO

Se comienza a Fundir columna B1 hasta 3 mt y encofrando B5.

Wilson Parra. Residente Interv

Timana Huila, 24 de Enero de 2025

Hora Inicial 7:am Hora Final 5 Pm.

Clima lluvioso Lluvias fuertes horas de la mañana

Personal en obra, Ing residente, SISO, OFICIALES ayudantes

Se continua con el relleno del eje B

Formaletas de columnas eje. B.

Wilson Parra. Residente Intev.

Timana Huila, 25 enero 2025.

Hora Inicial 7:am hora Final 12:Pm

Clima. humedo. clima Frio por fuertes lluvias

Personal en obra: Ing residente, oficiales ayudantes, SISO

Herramientas y equipos.

Se realiza encofrado de columna B1 y amarrado de traslapos.

Wilson Parra. Residente Intev.

Timana Huila .27 enero 2025.

Clima soleado

Hora inicial 7:00 am Hora Final 5 Pm.


Personal en obra: Ing residente, SISO OFICIALES ayudantes

Herramientas y equipos.

Se instala formaleta de B2 y B4 para fundir columnas.

Wilson Parra. Residente Intev. NIC

Timana Huila 28 de Enero de 2025
Clima Frio
Hora Inicial 7:am Hora Final 5:Pm.
Personal en obra, ing residente, oficiales ayudantes, 5:50
Herramientas y equipos
Se Funden columnas B2 y B4



Wilson Parra.

Residente Inter

Timana Huila 29 Enero 2025
clima lluvioso, Fuertes lluvias en horas de la mañana.
Hora Inicial 7:00 am. Hora Final 5:Pm.
Personal en obra, ing residente, oficiales ayudantes 5:50

Se desencofra columna B1-B2. Para encofrar Para Fundir la parte superior de los mismos, Grava, Premezclado 3000psi

Residente Inter.

Timana Huila, 30 Enero de 2025.
Hora Inicial 7:00 am Hora Final 5 Pm.
Clima lluvioso, Fuertes lluvios.
Personal en obra, ing residente, 5:50
Oficiales ayudantes

Se Funde columna B1 Parte Superior



Wilson Parra.

Residente Inter.

Timana Huila, 31 enero de 2025
Hora 7:00 am Hora Final 5:00pm.
Clima soleado
Personal en obra Ing residente, OFICIALES ayudantes SISO
Herramientas y equipos.

Se acaban de amarra los traslapes Faltantes de las vigas.

Wilson Parra. Residente Inter.

Timana Huila 1 Feb de 2025
Hora inicial 7:am Hora Final. 5:Pm.
clima Frio
Personal en obra: Ing residente, oficiales ayudantes
Herramientas y equipos
Se empieza amarrar estribos de columnas eje A.

Wilson Parra Residente Inter.

Timana Huila 3 Febrero 2025.
Hora inicial 7:am Hora Final. 5:Pm.
Clima soleado
Personal en obra Ing residente, OFICIALES ayudantes SISO

Se continua con el armado de canastas Para las columnas eje A.

Wilson Parra. Residente Inter.

Consorcio Civil H&E
NIT. 901.767.013-6

CORRESPONDENCIA

Dirección: Cra. 3 w N. 64-37 Barrio Chicalá
Email: consorciocivilheinder@gmail.com
Teléfonos: 3187167087
Ciudad: Neiva Huila

NIT. 901.769.619-8

CONSORCIO WF

Neiva, 10 de Enero de 2025.

MUN.TIM. WF42023-036

Doctor
FELIPE VICTORIA BARRAGAN
Director
Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila - INDERHUILA
Ciudad

REFERENCIA 2: *CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CLPIH401-2023, que tiene por Objeto: "CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA PANTANOS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA, DEPARTAMENTO DEL HUILA".*

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE LA REFERENCIA.

Cordial saludo,

En mi calidad de Interventor del contrato de obra CLPIH401-2023, que tiene como objeto la "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ, DEPARTAMENTO DEL HUILA", me permito dar respuesta a la solicitud formal presentada por ustedes, en la cual solicitan una prórroga de dos (2) meses para la ejecución del contrato, debido a los persistentes inconvenientes generados por las condiciones climáticas adversas en la zona, que han dificultado el avance de las actividades de fundición de concretos, así como el armado e izaje de las vigas de amarre, tareas que requieren un tiempo considerable para su correcta ejecución.

Luego de evaluar las circunstancias presentadas y en atención a los reportes y observaciones realizadas tanto por el contratista como por la interventoría, considero que los motivos expuestos son razonables y justifican la necesidad de una prórroga en el plazo de ejecución.

Por lo tanto, la interventoría aprueba y avala la prórroga solicitada por un término de dos (2) meses, con el fin de permitir el cumplimiento adecuado del objeto contractual, teniendo en cuenta que el mal clima ha afectado directamente el cronograma de trabajo.

Este plazo adicional se otorgará conforme a las disposiciones y términos establecidos en el contrato original, y se procederá a realizar los ajustes necesarios en los plazos de ejecución, de acuerdo con lo aprobado por las partes.

Atentamente,

ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO P.
Representante Legal

C.C. Ing y/o Arq en cargo – Apoyo a la supervisión

Consorcio Civil H&E
NIT. 901.767.013-6

Neiva, 10 de enero 2025.

Señor:
Ing. Faiver Eduardo Perdomo Polania
R.L Consorcio WF
Interventor

CUB-019-2025

Referencia: Solicitud de Prorroga del Contrato Obra No. CLPIH401-2023.

Cordial saludo,

En mi calidad de representante legal del contrato de obra **CLPIH401-2023** que tiene por objeto **"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA"** y atendiendo al comité técnico efectuada el día 10 de enero del 2025 entre las partes, se eleva la solicitud formal de prórroga por 2 meses al contrato de obra, atendiendo a que persiste el mal clima en la zona que ha impedido el avance en las actividades de fundición de los concretos, retrasando el armado e izaje de las vigas de amarre actividad que genera mayor tiempo por su armado.

Por consiguiente, se requiere del plazo anteriormente solicitado para poder cumplir a cabalidad con el objeto contractual.

Cordialmente,

Les agradecemos de antemano la atención prestada.

Hernán José Trujillo Calderón
R.L. Consorcio Civil H&E

Dirección: Cra. 3 w N. 64-37 Barrio Chicalá
Email: consorciocivilhelnder@gmail.com
Teléfonos: 3187167087
Ciudad: Neiva Huila

Consorcio Civil H&E
NIT. 901.767.013-6

Neiva, 18 de enero 2024.

Señor:
Ing. Faiver Eduardo Perdomo Polania
R.L Consorcio WF
Interventor

CUB-020-2025

Referencia: Contrato Obra No. CLPIH401-2023.

Asunto: RESPUESTA A OFICIO, INFORMACION ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA

Cordial saludo,

Atendiendo su solicitud con respecto a diseño de la estructura calibres de aceros, longitudes y espaciamientos de las mismas, es de aclarar a la interventoría que este diseño de cubierta es "AUTOPORTANTE" por lo tanto no requiere estructura metálica para su fijación; está fabricada en acero galvanizado prepintado calibre 22, acero laminado estructural.

El sistema es grafado y está anclado a la viga canal en cada uno de sus extremos con 4 chazos de ½ y una platina calibre 16 de 15x15.

Las cubiertas autoportantes brindan la posibilidad de cubrir luces DE HASTA 36 METROS, sin necesidad de estructura metálica, su optimo rendimiento aporta una altura aprovechable del 20 % de la luz a cubrir, cumpliendo todos los estándares de NORMA NSR10.

y en pro de darle tramite a su solicitud se adjunta ficha técnica de la cubierta

Adjunto enviamos las cargas de diseño de dicha cubierta de acuerdo a la norma NSR10 (reacciones de arco)

Cordialmente,


Hernán José Trujillo Calderón
R.L. Consorcio Civil H&E

c.c. Ing. Karoll Lisseth Buitrago Hernández-Apoyo a la supervisión

Dirección: Cra. 3 w N. 64-37 Barrio Chicalá
Email: consorciocivilheinder@gmail.com
Teléfonos: 3187167087
Ciudad: Neiva Huila

PROYECTO: CONSORCIO CIVIL H&E

CIUDAD TIMANA



REACCIONES DE ARCO

Luz libre	23,9 m
Largo	35 m
Espesor de la Cobertura	0,75 mm
Calibre	22
Peso unitario de la Cobertura	8,97 kg/m2
% Flecha	20%
Flecha	4,78 m
Radio	17,33 m
Longitud del Arco	26,38 m

Angulo de Inclinacion	43,60 °
Peso total de la cobertura	8.376,17 kg

Datos de Carga

Carga Viva	35 kg/m2
Peso de luminarias / otros	10 kg/m2
Velocidad maxima de viento	100 km/h
Presion de viento basica	48,0 kg/m2


Velocidad de viento de diseño	103 km/h
Presion de viento de diseño	50,9 kg/m2

Reacciones del arco en los apoyos en kg/m *

Cargas Verticales	
Carga muerta	248,31 kg/m
Carga viva	418,25 kg/m
Cargas Horizontales	
Carga muerta	299,0 kg/m
Carga viva	522,8 kg/m
Carga de viento	243,4 kg/m

*Las cargas deben ser Factoradas para diseñar los elementos estructurales

Caracteristicas del perfil



Ancho lámina	0,91	m
Ancho útil	0,60	m
σy acero	2.800,00	kg/cm2
σy admisible	2.520,00	kg/cm2
Módulo de Elasticidad	2.030.000,00	kg/cm2

Calibre	Peso	Area	Eje X				Eje Y		
			Ix	rx	Sx top	Sx bot	Iy	ry	Sy
mm	kg/m2	mm2	mm4	mm	mm3	mm3	mm4	mm	mm3
0,6	7,18	541,2	3,57E+06	81,3	4,39E+04	1,06E+05	1,80E+07	182,23	5,99E+04
0,8	9,57	721,5	4,76E+06	81,3	5,85E+04	1,42E+05	2,40E+07	182,22	7,98E+04
0,9	11,96	901,7	5,95E+06	81,3	7,31E+04	1,77E+05	2,99E+07	182,2	9,98E+04
1,2	14,36	1081,8	7,14E+06	81,3	8,76E+04	2,13E+05	3,59E+07	182,19	1,20E+05

Carrera 10 A # 138 -50 Of. 712
info@techosycubiertas.com / www.techosycubiertas.com
Telfs: 6012150126 - 310 5525326 Bogotá D.C. Colombia

Consorcio Civil H&E
NIT. 901.767.013-6

Neiva, 22 de enero 2024.

Señor:
Ing. Faiver Eduardo Perdomo Polania
R.L Consorcio WF
Interventor

CUB-021-2025

Referencia: Contrato Obra No. CLPIH401-2023.

Asunto: **Solicitud de aprobación de Pólizas de Modificatoria No. 3 y 4.**

Cordial Saludo,

En mi calidad de representante legal del contrato de obra **CLPIH401-2023** que tiene por objeto **"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA"**, Se hace entrega de los documentos requeridos por ustedes para la aprobación de las pólizas correspondiente de la Modificatoria No. 3 y 4.

ANEXO 8 y 9
- Póliza de cumplimiento Entidad Estatal

Cordialmente;

Hernán José Trujillo Calderón
Representante Legal
Consorcio Civil H&E

Dirección: Cra. 3 w N. 64-37 Barrio Chicalá
Email: consorciocivilheinder@gmail.com
Teléfonos: 3187167087
Ciudad: Neiva Huila

Consorcio Civil H&E
NIT. 901.767.013-6

INFORME HSEQ

Dirección: Cra. 3 w N. 64-37 Barrio Chicalá
Email: consorciocivilheinder@gmail.com
Teléfonos: 3187167087
Ciudad: Neiva Huila

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT. 901.767.013-6

Timaná-Huila

Señores
CONSORCIO WF
Ciudad

REF: Contrato de obra pública CLIPH401 de 2023, Construcción de la cubierta autoportante con iluminación para la vereda Pantanos de la zona rural del municipio de Timaná departamento del Huila.

ASUNTO: Informe mensual

Cordial saludo.

Por medio del presente nos permitimos remitir el informe de las actividades del mes de enero de 2025

Anexos

1. Control de afiliaciones.
2. Inducción
3. Informe
4. Inspección de camilla, botiquín y extintor
5. Herramientas menores
6. ATS
7. Lista del personal
8. Entrega de EPP y Dotación
9. Acta de capacitación equipos de emergencia

Cortésmente,

Hernán Jose Trujillo Calderón
C.C. 79944179.
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO CIVIL H&E.
Elaboro: LIZETH NAIROBY LUNA CUELLAR
Anexo: documentos citados

INFORME MENSUAL

DEL 2 AL 31 DE ENERO DEL 2025

AVANCES EN PROCESO DEL SISTEMA DE GESTION SST

ACTIVIDADES REALIZADA POR CONTRATISTA

1. Inducción
2. Entrega de EPP
3. Inspección de herramienta menor
4. Inspección de maquinaria y equipo
5. Inspección a equipos de emergencia
6. Manejo ambiental de obra
7. Capacitación Riesgo Ergonómico

DESCRIPCÓN DE LAS ACTIVIDADES

- Se realiza inducción al personal de obra para inicio de actividades donde se socializa los componentes de gestión integral (Principios corporativos, misión, visión) componente administrativo (Presentación de la empresa, reglamento interno de trabajo, funciones y responsabilidades del cargo, horario de trabajo, dotación y manejo de documentación) y componente de seguridad y salud en el Trabajo SST (Políticas, matriz y planes)

- Se realiza entrega de dotación inicial y EPP (Elementos de protección personal) para la ejecución de sus labores, los cuales se suministran cada que los requieran.

- Se realiza inspección pre operacional semanal de las herramientas menores utilizadas para la realización de las actividades diarias, verificando que se encuentren aptas para su uso o si es necesario realizar los ajustes pertinentes.

- Inspección pre-operacional de maquinaria, esto se realiza con el propósito de verificar el adecuado estado de los mismos durante la ejecución de sus labores, y si, se llegase a presentar

alguna falla detectar a tiempo y realizar sus respectivos ajustes.

- Se realizó inspección de equipo de emergencias extintor, botiquín y camilla, los cuales se encuentran ubicado en obra y en adecuadas condiciones para el momento que sean requeridos hacer uso de estos.


- Durante la ejecución del proyecto se manejaron las siguientes actividades:

  Se generaron aguas residuales domésticas, provenientes del lavado de manos y uso de los baños, las cuales fueron dispuestas directamente al sistema de alcantarillado. Además, se mantiene el sitio para acopiar materiales de construcción y/o agregados pétreos los cuales se cubre con plástico negro.

  Se realiza capacitación de equipos de emergencia los cuales consta de camilla, extintor y botiquín. Donde se expone la importancia de los mismos, identificando sus componentes para determinar que sean actos para ser utilizados en caso de emergencia, de igual manera como se deben utilizar.

REGISTRO FOTOGRAFICO

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MANOR Y EQUIPOS

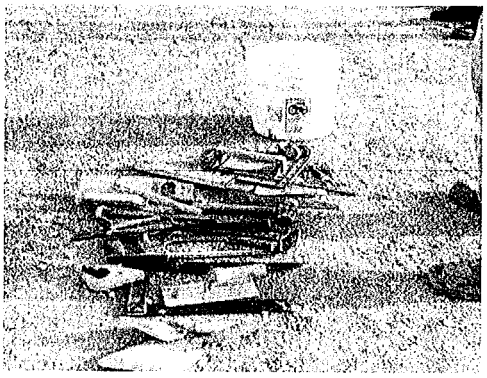

ENTREGA DE DOTACIÓN














TEMAS PENDIENTES:

- Continuar capacitación para el personal

COMPROMISOS

- Continuar con las charlas pre operacionales

ANEXOS

1. Control de afiliaciones.
2. Inducción
3. Informe
4. Inspección de camilla, botiquín y extintor
5. Inspección de herramienta menor
6. ATS
7. Listado de personal
8. Entrega de Dotación
9. Acta de capacitación equipos de emergencia

	CONSORCIO CIVIL H&E **NIT: 901.767.013-6** **SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST**	VERSION 01 FECHA NOV 2024 PAG 1 DE 1 FRO SST-002

INDUCCION - REINDUCCION

REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INDUCCIÓN

NOMBRE	JOSE DOLORES VILLAREAL COLONIO	**CC**	12411159	**NUEVO**	X
CARGO	AYUDANTE	**FECHA**	07/01/2025	**ANTIGUO**	

PROCESO	**TEMA**	**CAPACITADOR**	**METODO EVALUACION**
GESTION INTEGRAL	• Misión, Visión • Principios corporativos • Reseña histórica		**ORAL**
ADMINISTRATIVA	• Presentación de la Empresa. • Reglamento interno de trabajo • Entrega de funciones y responsabilidades del cargo • Horario para el cargo • Documentos obligatorios hoja de vida. • Dotación • Manejo de comunicación		**ORAL**
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	• Sistema General de Seguridad Social en Colombia, Ley 100/1993 • Socialización de Políticas SST, alcohol drogas y tabaco y respuesta ante emergencias • Socialización de Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. • Socialización de la matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros y sus respectivas recomendaciones. • Presentación de comités y sus funciones: COPASST, CONVIVENCIA LABORAL • Responsabilidades generales en SG-SST • Plan de emergencias • Procedimiento de reporte de incidente o accidente laboral • Socialización PAPSO • Socialización Protocolo de bioseguridad		**ORAL**

OBSERVACIONES

Jose villarea			
FIRMA DEL TRABAJADOR	**GERENCIA**	**JEFE INMEDIATO**	**RESPONSABLE SST**

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	**CONSORCIO CIVIL H&E** **NIT: 901.767.013-6**	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV. 2023 PÁG.: 1 DE 1
INDUCCION - REINDUCCION		FTO-SST-002

REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INDUCCIÓN

NOMBRE	WILMAR SANTIAGO IDROBO CLAROS	**CC**	1004034509	**NUEVO**	X
CARGO	AYUDANTE	**FECHA**	07/01/2025	**ANTIGUO**	

PROCESO	TEMA	CAPACITADOR	METODO EVALUACION
GESTION INTEGRAL	▪ Misión, Visión ▪ principios corporativos ▪ Reseña histórica		**ORAL**
ADMINISTRATIVA	▪ Presentación de la Empresa. ▪ Reglamento interno de trabajo ▪ Entrega de funciones y responsabilidades del cargo ▪ Horario para el cargo ▪ Documentos obligatorios hoja de vida. ▪ Dotación ▪ Manejo de comunicación		**ORAL**
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	▪ Sistema General de Seguridad Social en Colombia, Ley 100/1993 ▪ Socialización de Políticas SST, alcohol drogas y tabaco y respuesta ante emergencias ▪ Socialización de Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. ▪ Socialización de la matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros y sus respectivas recomendaciones. ▪ Presentación de comités y sus funciones: COPASST, CONVIVENCIA LABORAL ▪ Responsabilidades generales en SG-SST ▪ Plan de emergencias ▪ Procedimiento de reporte de incidente o accidente laboral ▪ Socialización PAPSO ▪ Socialización Protocolo de bioseguridad		**ORAL**
OBSERVACIONES			

FIRMA DEL TRABAJADOR	GERENCIA	JEFE INMEDIATO	RESPONSABLE SST

Powered by CamScanner

	CONSORCIO CIVIL H&E NIT: 901.767.013-6 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	VERSIÓN 01 FECHA NOV 2024 PÁG 1 DE 1 FTO-SST-002

INDUCCION - REINDUCCION

REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INDUCCIÓN

NOMBRE	LEONARDO GOMEZ C.	CC	1004208423	NUEVO	X
CARGO	OFICIAL	FECHA	07/01/2025	ANTIGUO	

PROCESO	TEMA	CAPACITADOR	METODO EVALUACION
GESTION INTEGRAL	• Misión, Visión • principios corporativos • Reseña histórica		ORAL
ADMINISTRATIVA	• Presentación de la Empresa. • Reglamento interno de trabajo • Entrega de funciones y responsabilidades del cargo • Horario para el cargo • Documentos obligatorios hoja de vida. • Dotación • Manejo de comunicación		ORAL
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	• Sistema General de Seguridad Social en Colombia, Ley 100/1993 • Socialización de Políticas SST, alcohol drogas y tabaco y respuesta ante emergencias • Socialización de Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. • Socialización de la matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros y sus respectivas recomendaciones. • Presentación de comités y sus funciones: COPASST, CONVIVENCIA LABORAL • Responsabilidades generales en SG-SST • Plan de emergencias • Procedimiento de reporte de incidente o acc dente laboral • Socialización PAPSO • Socialización Protocolo de bioseguridad		ORAL

OBSERVACIONES

Leonardo Gomez FIRMA DEL TRABAJADOR	GERENCIA	JEFE INMEDIATO	RESPONSABLE SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO VIAS H&E	
	NIT: 901 767.013-6	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV 2023
		PÁG.: 1 DE 1
ACTA DE CAPACITACIÓN		FTO-SST-014

-ACTA DE CAPACITACION SG-SST-

OBJETIVO: Capacitación equipos de emergencia

FECHA: 17 de enero de 2025 | **HORA DE INICIO:** 7:00 am

LUGAR: Obra | **Pantanos**


ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
TRABAJADORES	TRABAJADORES	ANEXO ASISTENCIA DE CADA DIA
LIZETH NAIROBY LUNA CUELLAR	PROFESIONAL SST	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se realiza capacitación de equipos de emergencia los cuales consta de camilla, extintor y botiquín. Donde se expone la importancia de los mismos, identificando sus componentes para determinar que sean actos para ser utilizados en caso de emergencia, de igual manera como se deben utilizar.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

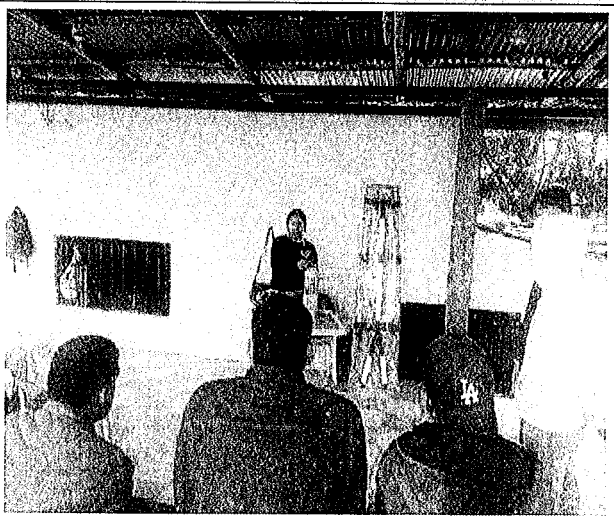



HORA DE FINALIZACION: 8:00 am

ELABORADO POR: LIZETH NAIROBY LUNA CUELLAR

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT. 901.767.013-6

CONSORCIO CIVIL H&E

NIT: 901 767.013-6	VERSIÓN: 01
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV 2023

INSPECCIÓN MENSUAL DE EXTINTORES

CONTRATO: CLIPH 401 DE 2023

AREA DE INSPECCION: OBRA PANTANOS FECHA. 10 ENERO 2025

DATOS GENERALES					RESULTADOS DE LA INSPECCION MENSUAL												
N° de Inventario	Ubicación en el Área	Capacidad Lbs.	Tipo	Fecha Recarga	Presión del manómetro		Pasador y Sujelador		Estado Manguera		Estado válvulas		Estado Boquilla		Marcación Placa		OBSERVACIONES
					Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Si	No	
1	OBRA	20	MULT.	12/2025	X		X		X		X		X		X		

OBSERVACIONES GENERALES:

Inspección Realizada por: Firma

Nombre Aclarado:

Tipo de extintores
CO2=Gas Carbonico CAP=Capsula (PQS-CO2) MP=Multipropósito (PQS-ABC)
PRE=Presurizado (PQS) CRT=Carretilla(PQS-N2) A.L.=Agente Limpio

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E		
CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	NIT: 901 767.013-6	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV. 2023

INSPECCIÓN DE CAMILLA

FECHA	10 ENERO 2025	HORA	2:00PM
RESPONSABLE	LIZETH LUNA C.	CARGO	SST
UBICACIÓN DE CAMILLA	OBRA		

ITEN	ELEMENTO	ESTADO (B/M)	OBSERVACIONES
1	¿Se encuentra la camilla debidamente ubicada y señalizada?	B	
2	¿En qué estado se encuentra la camilla a la hora de la inspección?	B	
3	¿Cuenta la camilla con sus respetivas correas de ajuste para traslado de paciente?	B	
4	¿En que estado se encuentran las camillas?	B	
5	¿Cuenta la camilla con su respectivo inmovilizador cervical?	B	
6	¿En qué estado se encuentra el cervical?	B	
7	¿En que condiciones de limpieza se encuentra la camilla al momento de inspección?	B	
8	¿La camilla cuenta con algún otro elemento?	NA	

Hallazgos encontrados	Plana de acción	Fecha programada	Fecha ejecutada

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E NIT: 901 767.013-6		
CONSORCIO CIVIL H&E NIT: 901 767.013-6	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	VERSIÓN: 01 FECHA: NOV 2023 PÁG: 1 DE 1

INSPECCION CONTENIDO DE BOTIQUINES

ELEMENTO	SI	NO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACION
ISODINE ESPUMA	X			
AGUA OXIGENADA	X			
SUERO FISIOLOGICO	X			
GUANTES QUIRURGICOS	X			
GASA ESTERIL	X			
VENDAS TRIANGULARES	X			
VENDA ELASTICA	X			
APLICADORES	X			
BAJA LENGUA	X			
ESPARADRAPO	X			
CURAS	X			
TIJERAS	X			
SUERO ORAL	X			
APOSITO OCULAR	X			
TOALLAS HIGIENICAS	X			

RESPONSABLE	UZETH LUNA C.	FECHA	10 ENERO 2025
UBICACION	OBRA		
RESPONSABLE INSPECCION	UZETH LUNA CUELLAR.		

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO VIAS H&E	
	NIT: 901.767.013-6	VERSION 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV. 2023
	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MENORES	FTO-SST-007

FECHA:	SEMANA DEL 02 AL 04 DE ENERO 2025
OBRA	PANTANOS
AREA INSPECCIONADA	OBRA
NOMBRE DE QUIEN REPORTA:	DIYER ADRIAN CHALA

B = BUENO | M = MALO | N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO		
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**	**B**	**M**	**NA**
1	Se usa la adecuada al trabajo	X		
2	Se encuentran en buen estado	X		
3	Se guardan y portan adecuadamente	X		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	X		
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**	**B**	**M**	**NA**
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo			X
2	Los cinceles se encuentran afilados			X
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	X		
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			X
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	X		
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			X
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**	**B**	**M**	**NA**
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	X		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	X		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	X		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**	**B**	**M**	**NA**
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas			X
2	Se observan en la llave huellas y palancas			X
3	Se dispone de llaves para golpear			X
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas			X
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	X		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	X		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			X
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**	**B**	**M**	**NA**
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	X		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X		
3	Están limpia y lubricadas	X		
4	Tienen sus guardas	X		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X		
6	El cable y enchufe no presentan daños			X
7	En los taladros se observa el mandil con golpes			X
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			X
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			X
10	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			X
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	X		
F	**HERRAMIENTA NEUMATICA**	**B**	**M**	**NA**
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			X
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			X
3	Se trabaja a las presiones indicadas			X
4	La herramienta es descargada al terminar.			X

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	RESPONSABLE DEL SG-SST

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO VIAS H&E	
	NIT: 901.767.013-6	VERSION 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV. 2023
	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MENORES	FTO-SST-007

FECHA:	SEMANA DEL 07 AL 11 DE ENERO 2025
OBRA	PANTANOS
AREA INSPECCIONADA	OBRA
NOMBRE DE QUIEN REPORTA:	DIYER ADRIAN CHALA

B = BUENO | M = MALO | N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO		
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**	**B**	**M**	**NA**
1	Se usa la adecuada al trabajo	X		
2	Se encuentran en buen estado	X		
3	Se guardan y portan adecuadamente	X		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	X		
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**	**B**	**M**	**NA**
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo			
2	Los cinceles se encuentran afilados			X
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	X		
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			X
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	X		
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			X
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**	**B**	**M**	**NA**
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	X		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	X		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	X		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**	**B**	**M**	**NA**
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas			X
2	Se observan en la llave huellas y palancas			X
3	Se dispone de llaves para golpear			X
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas			X
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	X		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	X		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			X
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**	**B**	**M**	**NA**
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	X		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X		
3	Están limpia y lubricadas	X		
4	Tienen sus guardas	X		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X		
6	El cable y enchufe no presentan daños			X
7	En los taladros se observa el mandil con golpes			X
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			X
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			X
10	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			X
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	X		
F	**HERRAMIENTA NEUMATICA**	**B**	**M**	**NA**
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			X
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			X
3	Se trabaja a las presiones indicadas			X
4	La herramienta es descargada al terminar.			X

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	RESPONSABLE DEL SG-SST

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO VIAS H&E	
	NIT: 901.767.013-6	VERSION 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV. 2023
	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MENORES	FTO-SST-007

FECHA:	SEMANA DEL 13 AL 18 DE ENERO DE 2025
OBRA	PANTANOS
AREA INSPECCIONADA	OBRA
NOMBRE DE QUIEN REPORTA:	YONEISON CORREA ORTIZ

B = BUENO | M = MALO | N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO		
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**	**B**	**M**	**NA**
1	Se usa la adecuada al trabajo	X		
2	Se encuentran en buen estado	X		
3	Se guardan y portan adecuadamente	X		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	X		
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**	**B**	**M**	**NA**
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo			
2	Los cinceles se encuentran afilados			X
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	X		
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			X
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	X		
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			X
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**	**B**	**M**	**NA**
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	X		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	X		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	X		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**	**B**	**M**	**NA**
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas			X
2	Se observan en la llave huellas y palancas			X
3	Se dispone de llaves para golpear			X
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas			X
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	X		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	X		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			X
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**	**B**	**M**	**NA**
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	X		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X		
3	Están limpia y lubricadas	X		
4	Tienen sus guardas	X		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X		
6	El cable y enchufe no presentan daños			X
7	En los taladros se observa el mandil con golpes			X
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			X
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			X
10	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			X
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	X		
F	**HERRAMIENTA NEUMATICA**	**B**	**M**	**NA**
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			X
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			X
3	Se trabaja a las presiones indicadas			X
4	La herramienta es descargada al terminar.			X

OBSERVACIONES

YONEISON CORRE ORTIZ

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN | RESPONSABLE DEL SG-SST

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO VIAS H&E	
	NIT: 901.767.013-6	VERSION 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV. 2023
	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MENORES 007	FTO-SST-

FECHA:	SEMANA DEL 20 AL 25 DE ENERO DE 2025
OBRA	PANTANOS
AREA INSPECCIONADA	OBRA
NOMBRE DE QUIEN REPORTA:	YONEISON CORREA ORTIZ

B = BUENO | M = MALO | N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO		
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**	**B**	**M**	**NA**
1	Se usa la adecuada al trabajo	X		
2	Se encuentran en buen estado	X		
3	Se guardan y portan adecuadamente	X		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	X		
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**	**B**	**M**	**NA**
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo			
2	Los cinceles se encuentran afilados			X
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	X		
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			X
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	X		
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			X
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**	**B**	**M**	**NA**
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	X		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	X		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	X		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**	**B**	**M**	**NA**
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas			X
2	Se observan en la llave huellas y palancas			X
3	Se dispone de llaves para golpear			X
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas			X
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	X		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	X		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			X
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**	**B**	**M**	**NA**
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	X		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X		
3	Están limpia y lubricadas	X		
4	Tienen sus guardas	X		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X		
6	El cable y enchufe no presentan daños			X
7	En los taladros se observa el mandil con golpes			X
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			X
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			X
10	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			X
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	X		
F	**HERRAMIENTA NEUMATICA**	**B**	**M**	**NA**
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			X
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			X
3	Se trabaja a las presiones indicadas			X
4	La herramienta es descargada al terminar.			X

OBSERVACIONES

YONEISON CORRE ORTIZ

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN | RESPONSABLE DEL SG-SST

	CONSORCIO CIVIL H&E	Versión 01
	NIT: 901.767.013-6	Codigo
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG SST	FTO-SST-001
	LIZETH NARDY LUNA CUELLAR	Fecha
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	20/11/2023

AREA/PLANTA Y/O LUGAR DE OPERACION:	OBRA PANTANOS	FECHA DE ELABORACION	2/01/2025
DESCRIBA LA ACTIVIDAD A REALIZAR	INSTALACIÓN ACERO ARMADO		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS	HERRAMIENTA MENOR.		
CONTACTOS DE EMERGENCIA:			

DESCRIPCION EXACTA O MAS PROXIMA DEL LUGAR DE OPERACIÓN Y DESCRIBA LAS ACTIVIDADES DE COMIENZO A FIN

INSPECCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO

INSPECCIÓN DE LA HERRAMIENTA A UTILIZAR

TRASLADO DEL ACERO ARMADO AL PUNTO DE TRABAJO

INSTALACIÓN DEL ACERO EN EL LUGAR

EL ACERO SE ASEGURO Y APLOMA.

AL TERMINAR ACTIVIDADES SE DEJA EL LUGAR EN ORDEN Y ASEO.

No	PELIGRO	RIESGO	CONTROLES REQUERIDOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS (Preventivos/Protectivos/Reactivos)	CUMPLE: SI / NO / NA
1	Físico - Temperaturas extremas (Calor o frío)	Quemadura Insolación Cefalea Mareo Deshidratación Estado Gripales	Uso de los EPP - Uso camisa manga larga y Capuchón tipo monja.	
	Radiaciones		Hidratación	
2	Condiciones de Seguridad - Locativo Orden y Aseo	Caídas Esguinces Pérdida de Materiales Golpes	Jornada de orden y aseo	SI
			Divulgación del procedimiento	SI
3	Condiciones de seguridad - Locativo Superficies de Trabajo Terreno escabroso	Caídas del personal Resbalones Fracturas Esguinces Contusión	Inspección del terreno	SI
			Señalización	SI
			Uso de EPP..	SI
4	Condiciones de Seguridad - Locativos: Trabajos en alturas	Pérdida humana	Programa de protección contra caídas	NA
			Capacitación y entrenamiento en trabajo en alturas	NA
		Caída Fractura Accidentes Graves	Programa de protección contra caídas	NA
			Uso de EPP para trabajos en alturas	NA
			Lista de verificacion para tareas de alto riesgo arnes y eslinga	NA
5	Condiciones de seguridad - Locativos: Espacios Confinados	Pérdida humana, Caída Fractura Accidentes Graves	Verificación de atmosferas peligrosas	NA
			Programa De Protección Espacios Confinados	NA
			Capacitación de personal en espacios confinados	NA
			Uso de EPP.	NA
6	Condiciones de seguridad - Mecanico Uso de Herramientas Limpieza del área de trabajo	Lesiones por manejo inadecuado de herramientas manuales y equipos	Uso de los EPP	SI
			Verificación de Herramienta	SI
7	Biomecánico - Posturas inadecuadas y movimientos repetitivos Sobreesfuerzo	Hernias Esguinces Calambres Trauma muscular Fatiga Muscular	PVE Osteomuscular (Charla y capacitación en manejo de cargas)	SI
			Charla en uso y manejo de herramientas	SI
			Pausas activas	SI
8	Psicosocial - Acoso laboral y sobrecarga laboral	Estrés laboral Bajo desempeño Bajo rendimiento Baja motivación	Programación de actividades Bienestar	NA
			Calistenia	SI
			Programa de Riesgo Psicosocial	NA
14	Fenómenos Naturales Terremoto Derrumbe Tormenta Eléctrica Vendaval	Atrapamiento Electrocución Caídas	Plan de Emergencia	SI
15	Orden Público Presencia de grupos armados al margen de la ley	Muerte Secuestro Atentado Robos	Plan de Emergencias	SI

Powered by CamScanner

SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA OPERACIÓN CUENTE CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LAS HERRAMIENTAS O EQUIPOS ESTEN INSPECCIONADOS ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD

CASCO	X	CAMISA MANGA LARGA	X	RESPIRADORES		ESLINGAS Y ELEMENTOS DE AMARRE		HERRAMIENTA MENOR	X
GUANTES	X	PANTALON LARGO JEAN	X	TAPABOCAS		ARNES		HERRAMIENTAS ELECTRICAS	
BOTAS DE SEGURIDAD	X	OVEROL		TAPAOIDOS		GUAYAS		MAQUINARIA Y VEHICULOS	
GAFAS	X	GUANTES DE NITRILO		PETOS		LAZOSGIETOLES		EQUIPOS	

DIVULGACION DEL ANALISIS DE EVALACION DE RIESGOS EJECUTORES.

Declaramos haber entendido la divulgacion del analisis de evalacion de riesgos, y nos comprometemos a cumplir las condiciones de seguridad contempladas e informar. sobre cualquier desviacion que se pueda presentar.

NOMRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	OBSERVACIONES
DIUER ADRIAN CHAIA	1080933023	MAESTRO	
JOSE DUBERNEY VILLAREAL	12241157	OFICIAL	
YONEISON CORREA	1004440660	OFICIA 1	
JONATHAN ESPAÑA	1080935714	OFICIA 1	
LEONARDO GOMEZ	1004086423	OFICIA 1	
SEBASTIAN ESPAÑA	1089357 14	AYUDANTE.	
WILMAR SANTIAGO IDROBO	1004034509	AYUDANTE.	

	LUNES	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado
FECHA				2/01/2025	3/02/25	4/01/2025
FIRMA LIDER DE LA ACTIVIDAD	/	/	/			
FIRMA S.S.T.	/	/	/			

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO CIVIL H&E	Versión 01
	NIT: 901.767.013-6	Codigo
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FTO-SST-001
	LIVETH NARROBY LUNA CUELLAR	Fecha
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	20/11/2023

AREA/PLANTA Y/O LUGAR DE OPERACION:	OBRA PANTANOS	FECHA DE ELABORACION	7/01/2025
DESCRIBA LA ACTIVIDAD A REALIZAR:	INSTALACIÓN DE ACERO		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	HERRAMIENTA MENOR.		
CONTACTOS DE EMERGENCIA:			

DESCRIPCION EXACTA O MAS PROXIMA DEL LUGAR DE OPERACIÓN Y DESCRIBA LAS ACTIVIDADES DE COMIENZO A FIN

INSPECCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO

INSPECCIÓN DE LA HERRAMIENTA A UTILIZAR.

TRASLADO DEL ACERO ARMADO AL PUNTO DE TRABAJO.

INSTALACIÓN DEL ACERO EN EL LUGAR.

AL TERMINAR ACTIVIDADES. SE DEJA EL LUGAR EN ORDEN Y ASEO.

No	PELIGRO	RIESGO	CONTROLES REQUERIDOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS (Preventivos/Protectivos/Reactivos)	CUMPLE: SI / NO / NA
1	Físico - Temperaturas extremas (Calor o frío) Radiaciones	Quemadura Insolación Cefalea Mareo Deshidratación Estado Gripales	Uso de los EPP - Uso camisa manga larga y Capuchón tipo monja	SI
			Hidratación	SI
2	Condiciones de Seguridad - Locativo Orden y Aseo	Caidas Esguinces Pérdida de Materiales Golpes	Jornada de orden y aseo	SI
			Divulgación del procedimiento	SI
3	Condiciones de seguridad - Locativo Superficies de Trabajo Terreno escabroso	Caídas del personal Resbalones Fracturas Esguinces Contusión	Inspección del terreno	SI
			Señalización	SI
			Uso de EPP..	SI
4	Condiciones de Seguridad - Locativos: Trabajos en alturas	Pérdida humana	Programa de protección contra caidas	NA
			Capacitación y entrenamiento en trabajo en alturas	NA
		Caida Fractura Accidentes Graves	Programa de protección contra caidas	NA
			Uso de EPP para trabajos en alturas	NA
			Lista de verificación para tareas de alto riesgo ames y eslinga	NA
5	Condiciones de seguridad - Locativos: Espacios Confinados	Pérdida humana, Caída Fractura Accidentes Graves	Verificación de atmosferas peligrosas	NA
			Programa De Protección Espacios Confinados	NA
			Capacitación de personal en espacios confinados	NA
			Uso de EPP.	NA
6	Condiciones de seguridad - Mecánico. Uso de Herramientas Limpieza del área de trabajo	Lesiones por manejo inadecuado de herramientas manuales y equipos	Uso de los EPP	SI
			Verificación de Herramienta	SI
7	Biomecánico - Posturas inadecuadas y movimientos repetitivos Sobreesfuerzo	Hernias Esguinces Calambres Trauma muscular Fatiga Muscular	PVE Osteomuscular (Charla y capacitación en manejo de cargas)	SI
			Charla en uso y manejo de herramientas	SI
			Pausas activas	SI
8	Psicosocial - Acoso laboral y sobrecarga laboral	Estrés laboral Bajo desempeño Bajo rendimiento Baja motivación	Programación de actividades. Bienestar	NA
			Calistenia	SI
			Programa de Riesgo Psicosocial	NA
14	Fenomenos Naturales - Terremoto Derrumbe Tormenta Eléctrica Vendaval	Atrapamiento Electrocución Caidas	Plan de Emergencia	SI
15	Orden Público: Presencia de grupos armados al margen de la ley	Muerte Secuestro Atentado Robos	Plan de Emergencias	SI

Powered by CamScanner

SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA OPERACIÓN CUENTE CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LAS HERRAMIENTAS O EQUPOS ESTEN INSPECCIONADOS ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD

CASCO	X	CAMISA MANGA LARGA	X	RESPIRADORES		ESLINGAS Y ELEMENTOS DE AMARRE		HERRAMIENTA MENOR	X
GUANTES	X	PANTALON LARGO JEAN	X	TAPABOCAS		ARNES		HERRAMIENTAS ELECTRICAS	
BOTAS DE SEGURIDAD	X	OVEROL		TAPAOIDOS		GUAYAS		MAQUINARIA Y VEHICULOS	
GAFAS	X	GUANTES DE NITRILO		PETOS		MOSQUETONES		EQUIPOS	

DIVULGACION DEL ANALISIS DE EVALACION DE RIESGOS EJECUTORES.

Declaramos haber entendido la divulagacion del analisis de evalacion de riesgos, y nos comprometemos a cumplir las condiciones de seguridad contempladas e informar. sobre cualquier desviacion que se pueda presentar.

NOMRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	OBSERVACIONES
DIYER ADRIAN CHALA	1080933023	MAESTRO	
YONEISON CORREA	1004440666	OFICIAL	
JOSE DOBERNEY VILLAREAL	12241157	OFICIAL	
JONATHAN ESPAÑA	1080935714	OFICIAL	
LEONARDO GOMEZ	1004208423	OFICIAL	
WILMAR SANTIAGO IDROBO	1004034509	AYUDANTE	
SEBASTIAN ESPAÑA	1080935714	AYUDANTE	

	LUNES	Maitas	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado
FECHA		7/01/2025	8/01/2025	9/01/2025	10/01/25	11/01/2025
FIRMA LIDER DE LA ACTIVIDAD						
FIRMA S.S.T.						

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E NIT: 901.767.013-6	CONSORCIO CIVIL H&E	Versión 01
	NIT: 901.767.013-6	Codigo
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FTO-SST-001
	LIZETH NARROBY LUNA CUELLAR	Fecha
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	20/11/2023

AREA/PLANTA Y/O LUGAR DE OPERACION:	OBRA PANTANOS	FECHA DE ELABORACION	13/01/2025
DESCRIBA LA ACTIVIDAD A REALIZAR:	ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	HERRAMIENTA MENOR.		
CONTACTOS DE EMERGENCIA:			

DESCRIPCION EXACTA O MAS PROXIMA DEL LUGAR DE OPERACIÓN Y DESCRIBA LAS ACTIVIDADES DE COMIENZO A FIN	No	PELIGRO	RIESGO	CONTROLES REQUERIDOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS (Preventivos/Protectivos/Reactivos)	CUMPLE: SI / NO / NA
INSPECCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO INSPECCIÓN DE LA HERRAMIENTA A UTILIZAR. TRASLADO DE FORMALETA AL PUNTO. ENGRASADO DE LA FORMALETA. INSTALACIÓN DE LA FORMALETA DE ASEGURA Y APLOMA LA FORMALETA. AL TERMINAR ACTIVIDADES. SE DEJA EL LUGAR EN ORDEN Y ASEO	1	Físico - Temperaturas externas (Calor o frio) Radiaciones	Quemadura Insolación Cefalea Mareo Deshidratación Estado Gripales	Uso de los EPP - Uso camisa manga larga y Capuchón tipo monja.	SI
				Hidratación.	SI
	2	Condiciones de Seguridad - Locativo Orden y Aseo	Caidas Esguinces Pérdida de Materiales Golpes	Jornada de orden y aseo	SI
				Divulgación del procedimiento	SI
	3	Condiciones de seguridad - Locativo Superficies de Trabajo: Terreno escabroso	Caidas del personal Resbalones Fracturas Esguinces Contusión	Inspección del terreno	SI
				Señalización	SI
				Uso de EPP.	SI
	4	Condiciones de Seguridad - Locativos: Trabajos en alturas	Pérdida humana	Programa de protección contra caidas	NA
				Capacitación y entrenamiento en trabajo en alturas	NA
			Caída Fractura Accidentes Graves	Programa de protección contra caidas	NA
				Uso de EPP para trabajos en alturas	NA
				Lista de verificacion para tareas de alto riesgo ames y eslinga	NA
	5	Condiciones de seguridad - Locativos: Espacios Confinados	Pérdida humana, Caida Fractura Accidentes Graves	Verificación de atmosferas peligrosas	NA
				Programa De Protección Espacios Confinados	NA
				Capacitación de personal en espacios confinados	NA
				Uso de EPP.	NA
	6	Condiciones de seguridad - Mecánico: Uso de Herramientas Limpieza del área de trabajo	Lesiones por manejo inadecuado de herramientas manuales y equipos	Uso de los EPP	SI
				Verificación de Herramienta	SI
	7	Biomecánico - Posturas inadecuadas y movimientos repetitivos Sobresfuerzo	Hernias Esguinces Calambres Trauma muscular Fatiga Muscular	PVE Osteomuscular (Charla y capacitación en manejo de cargas)	SI
				Charla en uso y manejo de herramientas	SI
				Pausas activas	SI
	8	Psicosocial - Acoso laboral y sobrecarga laboral	Estrés laboral Bajo desempeño Bajo rendimiento Baja motivación	Programación de actividades. Bienestar	NA
				Calistenia	SI
				Programa de Riesgo Psicosocial	NA
	14	Fenomenos Naturales - Terremoto Derrumbe Tormenta Eléctrica Vendaval	Atrapamiento Electrocución Caídas	Plan de Emergencia	SI
	15	Orden Publico: Presencia de grupos armados al margen de la ley	Muerte Secuestro Atentado Robos	Plan de Emergencias	SI

Powered by CamScanner

SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA OPERACION CUENTE CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LAS HERRAMIENTAS O EQUIPOS ESTEN INSPECCIONADOS ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD

CASCO	X	CAMISA MANGA LARGA	X	RESPIRADORES		ESLINGAS Y ELEMENTOS DE AMARRE		HERRAMIENTA MANUAL	X
GUANTES	X	PANTALON LARGO JEAN	X	TAPABOCAS		MAZOS		HERRAMIENTAS ELECTRICAS	
BOTAS DE SEGURIDAD	X	OVEROL		TAPAOIDOS		GRUAS		MAQUINARIA Y VEHICULOS	
GAFAS	X	GUANTES DE NOVILLO		PETOS		DESCARGADORES		EQUIPOS	

DIVULGACION DEL ANALISIS DE EVALACION DE RIESGOS EJECUTORES.

Declaramos haber entendido la divulgacion del analisis de evalacion de riesgos, y nos comprometemos a cumplir las condiciones de seguridad contempladas o informar sobre cualquier desviacion que se pueda presentar.

NOMRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	OBSERVACIONES
DIYER ADRIAN CHALA	1080933023	MAESTRO	
YONEISON CORREA	1004440666	OFICIAL	
JOSE GUBERNEY VILLAREAL	1224157	OFICIAL	
JONATHAN ESPAÑA	1080935714	OFICIAL	
LEONARDO GOMEZ	1004208423	OFICIAL	
WILMAR SANTIAGO OROZCO	1004034509	AYUDANTE	
SEBASTIAN ESPAÑA	1089357 14	AYUDANTE	

	LUNES	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado
FECHA	13/01/25	14/01/25	15/01/25	16/01/25	17/01/25	18/01/25
FIRMA LIDER DE LA ACTIVIDAD						
FIRMA S.S.T.						

Powered by CamScanner

	CONSORCIO CIVIL H&C NIT 901767136 SG-SST PLAN DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST HYDE HERNANDEZ LUNA CUELLAR **ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS**	Versión: 01 Código: FTO-SST-001 Fecha: 20/01/2025

AREA PLANTA Y/O LUGAR DE OPERACION:	OBRA PANTANOS	FECHA DIA/MES/AÑO	20/01/2025
DESCRIBA LA ACTIVIDAD A REALIZAR:	ENCOFRADO DE COLUMNAS		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	HERRAMIENTA MENOR		
CONTACTOS DE EMERGENCIA:			

DESCRIPCION EXACTA O MAS PROXIMA DEL LUGAR DE OPERACIÓN Y DESCRIBA LAS ACTIVIDADES DE COMIENZO A FIN

INSPECCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO

INSPECCIÓN DE LA HERRAMIENTA A UTILIZAR.

TRASLADO DE LA FORMALETA AL PUNTO.

ENGRASADO DE LA FORMALETA

INSTALACIÓN DE LA FORMALETA.

SE ASEGURA Y APLOMA LA FORMALETA.

AL TERMINAR. ACTIVIDADES SE DEJA EL LUGAR EN ORDEN Y ASEO.

No	PELIGRO	RIESGO	CONTROLES REQUERIDOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS (Preventivos/Protectivos/Reactivos)	CUMPLE: SI / NO / NA
1	Físico Temperaturas externas (Calor o frio) Radiaciones	Quemadura Insolación Cefalea Mareo Deshidratación Estado Gripales	Uso de los EPP - Uso camisa manga larga y Capución tipo monja	SI
			Hidratación	SI
2	Condiciones de Seguridad - Locativo Orden y Aseo	Caidas Esguinces Pérdida de Materiales Golpes	Jornada de orden y aseo	SI
			Divulgación del procedimiento	SI
3	Condiciones de seguridad - Locativo Superficies de Trabajo Terreno escabroso	Caidas del personal Resbalones Fracturas Esguinces Contusión	Inspección del terreno	SI
			Señalización	SI
			Uso de EPP..	SI
4	Condiciones de Seguridad - Locativos Trabajos en alturas	Pérdida humana	Programa de protección contra caídas	NA
			Capacitación y entrenamiento en trabajo en alturas	NA
		Caída Fractura Accidentes Graves	Programa de protección contra caídas	NA
			Uso de EPP para trabajos en alturas	NA
			Lista de verificación para tareas de alto riesgo arnes y eslinga	NA
5	Condiciones de seguridad - Locativos Espacios Confinados	Pérdida humana, Caída Fractura Accidentes Graves	Verificación de atmosferas peligrosas	NA
			Programa De Protección Espacios Confinados	NA
			Capacitación de personal en espacios confinados	NA
			Uso de EPP	NA
6	Condiciones de seguridad - Mecánico Uso de Herramientas Limpieza del área de trabajo	Lesiones por manejo inadecuado de herramientas manuales y equipos	Uso de los EPP	SI
			Verificación de Herramienta	SI
7	Biomecánico - Posturas inadecuadas y movimientos repetitivos Sobresfuerzo	Hernias Esguinces Calambres Trauma muscular Fatiga Muscular	PVE Osteomuscular (Charla y capacitación en manejo de cargas)	SI
			Charla en uso y manejo de herramientas	SI
			Pausas activas	SI
8	Psicosocial - Acoso laboral y sobrecarga laboral	Estrés laboral Bajo desempeño Bajo rendimiento Baja motivación	Desconexión de actividades. Recreativa	NA
			Calistenia	SI
			Programa de Riesgo Psicosocial	NA
14	Fenomenos Naturales Temporal Derrumbe Temporal Lluvia o Vendaval	Atrapamiento Enterramiento Golpes	Plan de Emergencia	SI
15	Orden Publico Presencia de grupos armados al margen de la ley	Muerte Secuestro Atentado Robos	Plan de Emergencias	SI

Powered by CamScanner

SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA OPERACIÓN CUENTE CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LAS HERRAMIENTAS O EQUIPOS ESTEN INSPECCIONADOS ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD

CASCO	X	CAMISA MANGA LARGA	X	RESPIRADORES		ESLINGAS Y ELEMENTOS DE AMARRE		HERRAMIENTA MENOR	X
GUANTES	X	PANTALON LARGO JEAN	X	TAPABOCAS		ARNES		HERRAMIENTAS ELECTRICAS	
BOTAS DE SEGURIDAD	X	OVEROL		TAPAOIDOS		GUAYAS		MAQUINARIA Y VEHICULOS	
GAFAS	X	GUANTES DE NITRILO		PETOS		MOSQUETONES		EQUIPOS	

DIVULGACION DEL ANALISIS DE EVALACION DE RIESGOS EJECUTORES.

Declaramos haber entendido la divulgacion del analisis de evalacion de riesgos, y nos comprometemos a cumplir las condiciones de seguridad contempladas e informar sobre cualquier desviacion que se pueda presentar.

NOMRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	OBSERVACIONES
DIVER ADRIAN CHALA	1080933023	MAESTRO	
JOSE DOBERNEY VILLAREAL	12241157	OFICIAL	
YONEISON CORREA	1004440666	OFICIAL	
JONATHAN ESPAÑA	1080935714	OFICIAL	
LEONARDO GOMEZ	1004208423	OFICIAL	
SEBASTIAN ESPAÑA	1089357141	AYUDANTE.	
WILMAR SANTIAGO IDROBO.	1004034509	AYUDANTE	

	LUNES	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado
FECHA	20/01/25	21/01/25	22/01/25	23/01/25	24/01/25	25/01/25
FIRMA LIDER DE LA ACTIVIDAD						
FIRMA S.S.T.						

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT. 901.767.013-6

CONSORCIO CIVIL H&E

NIT: 901767013-6

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

FECHA: SEMANA DEL 02 AL 04 DE ENERO 2025

LUGAR: PANTANOS

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	L	M	M	J	V	S	FIRMA
1	DIUER ADRIAN CHALA	1080933023	MAESTRO				X	X	X	
2	YONEISON CORREA O.	1004440666	OFICIAL				X	X	X	Yoneison Correa.
3	SEBASTIAN ESPAÑA ARDILA	1083876435	AYUDANTE				X	X	X	
4	JONATHAN ESPAÑA M.	1080935714	OFICIAL				X	X	X	
5	LEONARDO GOMEZ Q.	1004208423	OFICIAL				X	X	X	Leonardo Gomez.
6	WILMAR SANTIAGO IDROBO	1004034509	AYUDANTE				X	X	X	
7	JOSE QUBERNEY CUERVO	12241157	OFICIAL				X	X	X	Jose Villareal.
8										
9										
10										
11										
12										

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT. 901.767.013-6

CONSORCIO CIVIL H&E

NIT: 901767013-6

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

FECHA: SEMANA DEL 07 AL 11 DE ENERO 2025

LUGAR: PANTANOS

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	L	M	M	J	V	S	FIRMA
1	DIVER ADRIAN CHALA	1080933023	MAESTRO	X	X	X	X	X	X	
2	YONEISON CORREA O.	1004440666	OFICIAL	X	X	X	X	X	X	Yoneison Correa.
3	SEBASTIAN ESPAÑA ARDILA	1083876435	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	
4	JONATHAN ESPAÑA M.	1080935714	OFICIAL	X	X	X	X	X	X	
5	LEONARDO GOMEZ Q.	1004208423	OFICIAL	X	X	X	X	X	X	Leonardo Gomez.
6	WILMAR SANTIAGO IDROBO	1004034509	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	
7	JOSE QUBERNEY CUERVO	12241157	OFICIAL	X	X	X	X	X	X	Jose Villareal.
8										
9										
10										
11										
12										

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT. 901.767.013-6

CONSORCIO CIVIL H&E

NIT: 901767013-6

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

FECHA: SEMANA DEL 13 AL 18 DE ENERO 2025

LUGAR: PANTANOS

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	L	M	M	J	V	S	FIRMA
1	DIVER ADRIAN CHALA	1080933023	MAESTRO	X	X	X	X	X	X	
2	YONEISON CORREA O.	1004440666	OFICIAL	X	X	X	X	X	X	Yoneison Correa.
3	SEBASTIAN ESPAÑA ARDILA	1083876435	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	
4	JONATHAN ESPAÑA M.	1080935714	OFICIAL	X	X	X	X	X	X	
5	LEONARDO GOMEZ Q.	1004208423	OFICIAL	X	X	X	X	X	X	Leonardo Gomez.
6	WILMAR SANTIAGO IDROBO	1004034509	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	
7	JOSE OLBERNEY CUERVO	12241157	OFICIAL	X	X	X	X	X	X	Jose Villareal.
8										
9										
10										
11										
12										

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT. 901.767.013-6

CONSORCIO CIVIL H&E

NIT: 901767013-6

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

FECHA: SEMANA DEL 20 AL 25 DE ENERO 2025

LUGAR: PANTANOS

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	L	M	M	J	V	S	FIRMA
1	DIVER ADRIAN CHALA	1080933023	MAESTRO	X	X	X	X	X	X	
2	YONEISON CORREA O.	1004440666	OFICIAL	X	X	X	X	X	X	Yoneison Correa.
3	SEBASTIAN ESPAÑA ARDILA	1083876435	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	
4	JONATHAN ESPAÑA M.	1080935714	OFICIAL	X	X	X	X	X	X	
5	LEONARDO GOMEZ Q.	1004208423	OFICIAL	X	X	X	X	X	X	Leonardo Gomez.
6	WILMAR SANTIAGO IDROBO	1004034509	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	
7	JOSE QUBERNEY CUERVO	12241157	OFICIAL	X	X	X	X	X	X	Jose Villareal.
8										
9										
10										
11										
12										

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT. 901.767.013-6

CONSORCIO CIVIL H&E

NIT: 901767013-6

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

FECHA: SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO 2025

LUGAR: PANTANOS

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	L	M	M	J	V	S	FIRMA
1	DIUER ADRIAN CHALA	1080933023	MAESTRO	X	X	X	X	X	X	
2	YONEISON CORREA O.	1004440666	OFICIAL	X	X	X	X	X	X	Yoneison Correa.
3	SEBASTIAN ESPAÑA ARDILA	1083876435	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	
4	JONATHAN ESPAÑA M.	1080935714	OFICIAL	X	X	X	X	X	X	
5	LEONARDO GOMEZ Q.	1004208423	OFICIAL	X	X	X	X	X	X	Leonardo Gomez.
6	WILMAR SANTIAGO IDROBO	1004034509	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	
7	JOSE QUBERNEY CUERVO	12241157	OFICIAL	X	X	X	X	X	X	Jose Villareal.
8										
9										
10										
11										
12										

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT. 901.767.013-6

CONSORCIO CIVIL H&E

NIT: 901.767.013-6

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP

FECHA DE ENTREGA: ENERO 3 DE 2025

	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA DEL TRABAJADOR	CARGO/ACTIVIDAD	LAVADO DE MANOS			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS								DOTACION				TIPO DE ENTREGA		FIRMA DEL TRABAJADOR
							CABEZA	VISUAL	AUDITIVA	RESPIRATORIA	MANOS		ALTURAS		CUERPO						
				Jabón antibacterial	Alcohol	Gel antibacterial	Casco	Gafas de seguridad	Protector auditivo de inserción	Tapabocas Industrial	Guantes de carnaza	Guantes de vaqueta	Arnés	Eslingas	BUSO	PANTALON	BOTAS	CHALECO REFLECTIVO	INICIAL	REPOSICION	
1.	JOSE DUBERNEY V	12241157	OFICIAL				X	X	X	X		X					X		X		José Villareal
2.	YONEISON CORREA	1004440666	OFICIAL				X	X	X	X		X					X		X		Yoneison Correa
3.	SEBASTIAN ESPAÑA	1089357 14	AYUDANTE				X	X	X	X		X					X		X		
4.	WILMAR SANTIAGO I.	1004034509	AYUDANTE				X	X	X	X		X					X		X		
5.	LEONARDO GOMEZ	1004208623	OFICIAL				X	X	X	X		X					X		X		Leonardo Gomez
6.	JONATHAN ESPAÑA	1089357 14	OFICIAL				X	X	X	X		X					X		X		
7.																					
8.																					
9.																					
10.																					
11.																					
12.																					
13.																					
14.																					
15.																					
16.																					
17.																					
18.																					

Powered by CamScanner


CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO VIAS H&E	
	NIT: 901 767.013-6	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV 2023
		PÁG.: 1 DE 1
ACTA DE CAPACITACIÓN		FTO-SST-014


-ACTA DE CAPACITACION SG-SST-		
OBJETIVO: Capacitación equipos de emergencia		
FECHA: 17 de enero de 2025		**HORA DE INICIO:** 7:00 am
LUGAR: Obra	**Pantanos**	
ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
TRABAJADORES	TRABAJADORES	ANEXO ASISTENCIA DE CADA DIA
LIZETH NAIROBY LUNA CUELLAR	PROFESIONAL SST	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se realiza capacitación de equipos de emergencia los cuales consta de camilla, extintor y botiquín. Donde se expone la importancia de los mismos, identificando sus componentes para determinar que sean actos para ser utilizados en caso de emergencia, de igual manera como se deben utilizar.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

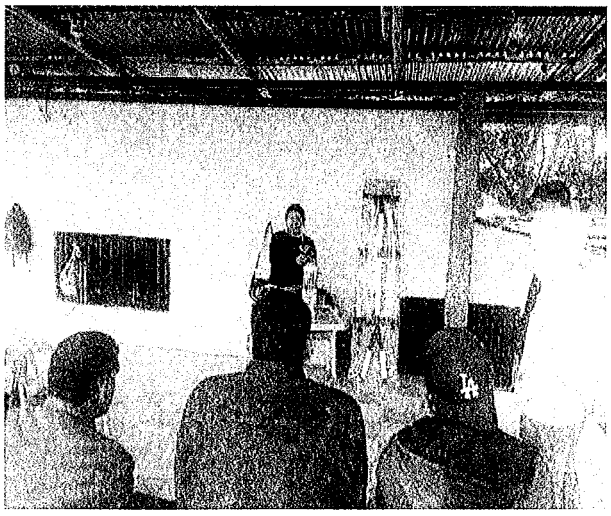

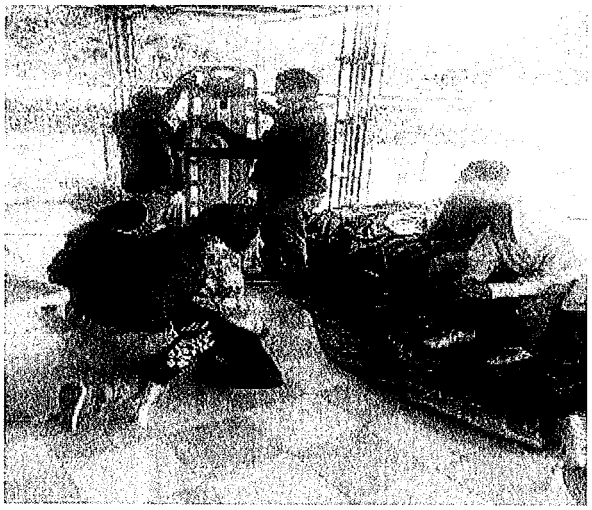

HORA DE FINALIZACION: 8:00 am


ELABORADO POR: LIZETH NAIROBY LUNA CUELLAR

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. _ **CIHCM420 DE de 2023_**

INFORME DE INTERVENTORIA No. _07

MENSUAL [X] **FINAL** [ ]

Objeto Contrato: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA.

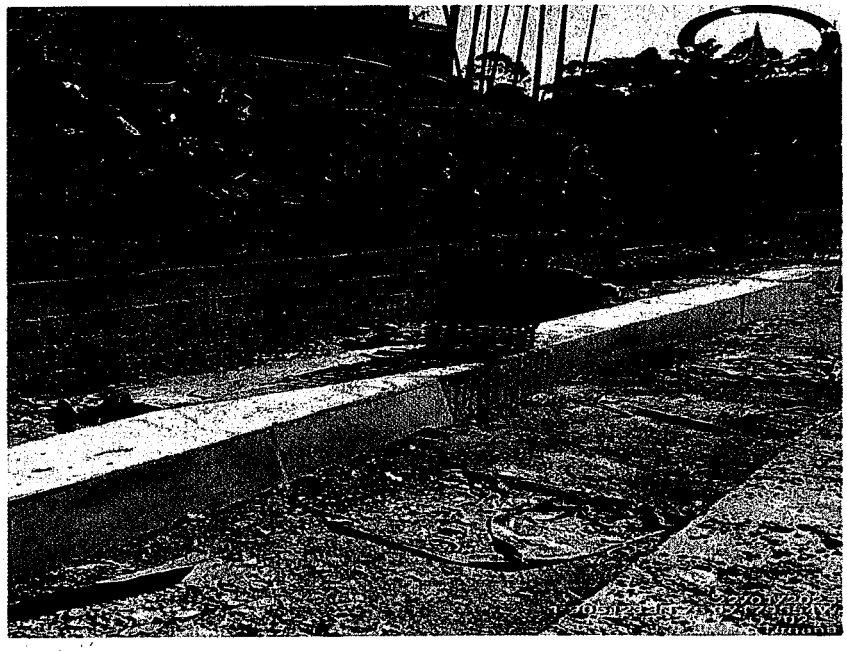

MUNICIPIO: TIMANA – VEREDA PANTANOS

DEPARTAMENTO: **HUILA**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM420 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO WF.


APOYO A LA SUPERVISIÓN	1. Ing. XIMENA ADELINDA JIMENEZ ZUÑIGA	**ENTIDAD**	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	___ **CIHCM420**____ DE 2023___		
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA	**PERIODO DEL INFORME**	1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025.
CONTRATISTA	CONSORCIO WF	**NIT:**	901.769.619 - 8.
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	**C.C:**	7.711.430 DE NEIVA

FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	09 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.
FECHA DE SUSPENSION 1:	26 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO 1:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024
OTROSÍ No.1: 24/09/2024	MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA 4 -PLAZO DEL CONTRATO- VIGENCIA FISCAL.
OTROSÍ No.2: 12/11/2024	Prórroga: VEINTE (20) DÍAS.
OTROSÍ No.3: 02/12/2024	**Prórroga:** UN (1) MES-. **Adicional:** DOCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 12.573.718,00) M/CTE.
OTROSÍ No.4: 27/12/2024	Prórroga: UN (1) MES- y TRES (3) DIAS.
PLAZO ADICIONAL:	DOS (2) mes y VEINTE (23) días
PLAZO TOTAL:	CINCO (5) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.
VALOR INICIAL:	OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($88.657.430,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	DOCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 12.573.718,00) M/CTE.

VALOR TOTAL:	CIENTO UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 101.231.148) M/CTE.		
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA No.	CLPIH401 DE 2023		
OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA **VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA** DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATISTA	CONSORCIO CIVIL H&E	**NIT:**	901.767.013-6
REPRESENTANTE LEGAL:	HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON	**C.C:**	79.944.179
FECHA SUSCRIPCIÓN	02 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16 DE NOVIEMBRE DE 2023		
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.		
FECHA DE SUSPENSION 1:	26 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE REINICIO 1:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
OTROSÍ No.1: 24/09/2024	MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA 4 -PLAZO DEL CONTRATO- VIGENCIA FISCAL.		
OTROSÍ No.2: 12/11/2024	**Prorroga**: UN (1) MES. **Adición**: SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO ($ 75.179.371) M/CTE.		
OTROSI No. 3: 13/12/2024	Prorroga: Un (1) mes.		
OTROSI No. 4: 10/01/2025	Prorroga: DOS (2) mes.		
PLAZO ADICIONAL	CUATRO (4) MES		
PLAZO TOTAL:	SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.		
VALOR ADICIONAL (12/11/2024):	Setenta y cinco millones ciento setenta y nueve mil trescientos cincuenta y siete pesos ($75.179.357) M/CTE.		
VALOR TOTAL:	**SEISCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS ($ 626.662.540) M/CTE.**		
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	**NIT:**	Nit. 901.769.619-8
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	**C.C:**	7.711.430

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Cubierta Autoportante con Iluminación para la Vereda Pantanos de la Zona Rural del Municipio Timana - Departamento Del Huila

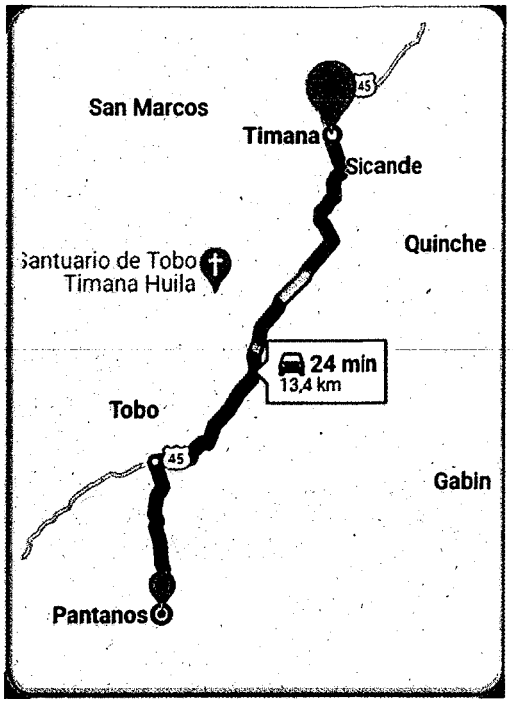

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La misión del INDERHUILA es generar y brindar a la comunidad oportunidades de participación en los procesos de iniciación, formación, fomento y práctica del deporte, la educación física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, como contribución al desarrollo integral del individuo, para el mejoramiento de la calidad de vida de la población del Departamento del Huila, por medio de la masificación, la promoción y el apoyo a la práctica deportiva.

En consecuencia, de lo anterior se requiere la adecuación locativa de los terrenos existentes para llevar a cabo la **CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA;** lo permitirán a la población realizar las prácticas deportivas, que van a contribuir con la mejora de la calidad de vida de las personas que acuden a estos escenarios recreo deportivos. Se resalta que este tipo de obras contribuyen a minimizar el déficit de espacios deportivos que existe en el Departamento del Huila.

El objetivo principal es promover la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre hacia el desarrollo humano integral; donde se promuevan y estimulen los valores para la convivencia, participación, disminución de la violencia, y construcción del tejido social: apoyado en estrategias que beneficien los habitantes de la ciudad para fortalecer el desarrollo del deporte la recreación y la educación física, con la implementación de programas orientados a' la construcción de tejido social y convivencia ciudadana en la totalidad de la población Huilense con una infraestructura deportiva técnicamente adecuada, desarrollando acciones articuladas entre sí, que mejoren la calidad de vida de todas y todos los habitantes del Departamento del Huila, bajo los principios de sostenibilidad ambiental, participación ciudadana, democracia, equidad e inclusión de personas con

movilidad reducida y respeto por las libertades individuales y que permitan posicionar al Departamento en el contexto regional, nacional y mundial, en concordancia con las Políticas Departamentales y Nacionales.

Las presentes especificaciones contienen el alcance para la ejecución de las obras de construcción de las cubiertas en el Departamento del Huila.

El proyecto arquitectónico contempla un área construida de 937.20 M2 por cubierta aproximadamente. en que se encuentra contemplada la construcción de la cubierta autoportante con teja metálica cal. 22 para el polideportivo ubicado fa vereda pantanos de la zona rural del municipio de Timana departamento del Huila la cual tiene una destinación de uso recreativo, deportivo y cultural; correspondientes a estructura, cubierta, iluminación y sistema hidráulico para el manejo de aguas lluvias.

La cubierta será con sistema auto portante, sostenida con columnas en concreto de 3000 PSI. sistema estructural propuesto consiste en columnas y vigas aéreas en concreto reforzado en 3000 PSI y una cimentación tipo zapatas, vigas de cimentación y viga canal. Todas las obras deberán atender lo establecido en la NORMA SISMORESITENTE de 2010 - NSR-10.

Es un sistema de estructura en concreto y teja auto portante a base de lámina de acero cal. 22:
- Área Total replanteo: 937,20 M2
- Actividades preliminares.
- Cimentación en concreto.
- Estructura en concreto.
- Cubierta.
- Instalaciones hidrosanitarias.
- Instalaciones eléctricas.

5. INFORME CONCRETO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DURANTE EL PERIODO

Se realiza la limpieza de material residual y se finaliza la construcción de la viga de cimentación en el eje A. Se completa el armado de las canastas de acero para las columnas del eje B y se procede al encofrado de las mismas. Se funden las columnas en los ejes B y A (puntos B1, B6, B5, B3, B2, B4, A1, A2, A3, A4, A5, A6). Además, se realiza el armado de acero para las vigas de cimentación y se conecta la tubería perforada de 4" entre los ejes para asegurar el drenaje adecuado.

6. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	16/11/2023	40		
Suspensión No. 1	26/12/2023		273	
Reiniciación No. 1	24/09/2024	37		
Otrosi No. 2	12/11/2024	30		

Otrosi No. 3	13/12/2024	30		
Otrosi No. 4	10/01/2025	30		
TERMINACIÓN Cto.				13/03/2025
TOTAL DIAS		167	273	

7. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
	CLPIH401 DE 2023	
ACTA DE INICIO	1	16/11/2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN – SUSPENSIÓN 1	1	26/12/2023
ACTA DE SUSPENSIÓN	1	26/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN - REINICIO 1	2	24/09/2024
ACTA DE REINICIO	1	24/09/2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN - OTROSÍ No.01	3	24/09/2024
OTROSÍ	1	24/09/2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN - OTROSÍ No.02	4	12/11/2024
OTROSÍ No.02	2	12/11/2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN - OTROSÍ No.03	5	13/12/2024
OTROSÍ No.03	3	13/12/2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN - OTROSÍ No.04	6	10/01/2024
OTROSÍ No.04	4	10/01/2024

8. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO
(Cumplimiento Obligaciones del contrato).

a). Obligaciones de Carácter General.	La interventoría, en calidad de ente supervisor, gestiono, reviso y aprobó los siguientes puntos: 1. Se he realizado la entrega de documentación en papel reciclado. 2. Se realizó los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales y se dio cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social (Salud, Pensión y riesgos), que corresponden de acuerdo con el personal de interventoría que se empleó. 3. Se suscribió con el contratista de obra el acta de justificación N°6 y otrosí N°4 el día 10/1/2025. 4. Se solicito al contratista el cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social (Salud, Pensión y riesgos), que corresponden de acuerdo con el personal que se empleó. 5. Se solicito al contratista de obra, actualización de las pólizas, las cuales se cargaron en la plataforma secop II y radicaron a la entidad para su aprobación. 6. Se realizaron comités de obra.

b). Actividades Administrativas.

1. se realiza control y seguimiento del personal que ejecuta la obra

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL	CARGO
HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON	Director de Obra
WILSON REINALDO PARRA TOVAR	Residente de Obra
LIZETH NAIROBY LUNA CUELLAR	Siso
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS	Se le realiza seguimiento a la maquinaria empleada.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	Se revisa el diseño de mezcla de concreto con los materiales presentados.

CONTROL Y SEGUIMIENTO A APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	PENSION	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	Nº PLANILLA	FECHA DE PAGO
HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON	$480,000	$375,000	$73,100	$60.000	$0	9483460084	27/03/2025
WILSON REINALDO PARRA TOVAR	$227.800	$178.000	$99.100	$57.000	$71.300	32652875	28/02/2025
LIZETH NAIROBY LUNA CUELLAR	$227.800	$178.000	$99.100	$57.000	$71.300	32652875	28/02/2025
ADRIAN DIYER CHALA MEDINA	$182.300	$142.400	$79.300	$45.600	$57.000	32652875	28/02/2025
YONEISON CORREA ORTIZ	$182.300	$142.400	$79.300	$45.600	$57.000	32652875	28/02/2025
SEBASTIAN ESPAÑA ARDILA	$182.300	$142.400	$79.300	$45.600	$57.000	32652875	28/02/2025
JONATHAN ESPAÑA MEDINA	$182.300	$142.400	$79.300	$45.600	$57.000	32652875	28/02/2025
LEONARDO GOMEZ QUINAYAS	$182.300	$142.400	$79.300	$45.600	$57.000	32652875	28/02/2025
WILMAR SANTIAGO IDROBO CLAROS	$182.300	$142.400	$79.300	$45.600	$57.000	32652875	28/02/2025
JOSE DUBERNEY VILLAREAL CUERVO	$182.300	$142.400	$79.300	$45.600	$57.000	32652875	28/02/2025
JUAN CARLOS SANCHEZ TRUJILLO	$47.450	$6.000	$3.400	$1.900	$2.500	32652875	28/02/2025

c). Actividades Operativas.

limpieza de material residual: Se realiza la limpieza y retiro de residuos y materiales sobrantes de la obra, asegurando un ambiente de trabajo ordenado y libre de obstrucciones.

Finalización de viga de cimentación en el eje A: Se culmina la construcción de la viga de cimentación en el eje A, verificando su alineación y nivelación conforme a los planos de diseño.

	Finalización del armado de canastas para columnas en el eje B: Se completa el armado de las canastas de acero para las columnas del eje B, garantizando el refuerzo adecuado para su posterior fundición. Encofrado de columnas para fundir en el eje B: Se procede con el encofrado de las columnas en el eje B, preparando las estructuras para el vertido de concreto. Fundición de columnas en el eje B (B1, B6, B5, B3, B2, B4, A1, A2, A3, A4, A5, A6): Se lleva a cabo la fundición de concreto en las columnas correspondientes a los puntos mencionados, asegurando la correcta compactación y curado del material. Armado de acero para viga de cimentación: Se realiza el armado y disposición del acero de refuerzo para las vigas de cimentación, siguiendo los requisitos estructurales establecidos. Conexión de tubería perforada de 4" entre ejes: Se efectúa la instalación y conexión de la tubería perforada de 4" entre los ejes correspondientes, garantizando un adecuado sistema de drenaje.
d). **Actividades Logísticos.**	1. Se realiza la revisión diaria de los avances de la bitácora de obra. 2. Se realiza la medición de las actividades realizadas en la ejecución y se aprueban las cantidades descritas 3. Se realizó la revisión de las vigencias de las pólizas del contrato de obra las cuales fueron remitidas a la entidad y cargadas al SECOP II. 4. Se verifica en obra el cumplimiento legal de seguridad industrial y salud ocupacional. Entrega de dotación y afiliaciones del personal. 5. Se realizaron comités de obra donde se expone actividades logísticas y administrativas realizadas.
e). **Obligaciones de Carácter Ambiental.**	1. Se hace control y seguimiento al Informe HSEQ entregado por el contratista para verificar su cumplimiento en obra.
f). **Actividades Financieras.**	1. Se hace seguimiento a los gastos del contrato según el plan de inversión de anticipo.
g). **Actividades Jurídicos.**	1. Se realiza seguimiento a pólizas y garantías

Póliza legalización del CONTRATO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-101051701	0	02/11/2023	Cumplimiento del contrato	02/11/2023	02/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	02/11/2023	02/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/11/2023	02/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 dias	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-101018824	0	02/11/2023	02/11/2023	02/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-101051701	1 Y 2	20/11/2023	Cumplimiento del contrato	02/11/2023	02/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	02/11/2023	02/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/11/2023	02/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 dias	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-101018824	1 Y 2	20/11/2023	02/11/2023	02/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION No. 1 - ACTA DE REINICIO No. 1:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-101051701	3 Y 4	20/11/2023	Cumplimiento del contrato	16/11/2023	16/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	16/11/2023	16/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/11/2023	16/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 dias	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-101018824	3,4 Y 5	02/10/2024	16/11/2024	20/11/2024

Póliza actualizada x OTROSI MODIFICATORIO No.2

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISION	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-101051701	5, 6 Y 7	18/11/2024	Cumplimiento del contrato	16/11/2023	20/06/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	16/11/2023	02/06/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/11/2023	20/12/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISION (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-101018824		18/11/2024	16/11/2024	20/11/2024

Póliza actualizada x OTROSI MODIFICATORIO No.3

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE	DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-101051701	8	19/12/2024	Cumplimiento del contrato	16/11/2023	25/07/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	16/11/2023	25/07/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/11/2023	25/01/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA DESDE	DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-101018824	8	19/12/2024	16/11/2024	25/07/2025

Póliza actualizada x OTROSI MODIFICATORIO No.4

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE	DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-101051701	9	21/01/2025	Cumplimiento del contrato	16/11/2023	25/09/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	16/11/2023	25/09/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/11/2023	30/03/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA DESDE	DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-101018824	6,7	21/01/2025	16/11/2024	25/06/2025

9. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO


Las temperaturas máximas diarias son alrededor de 26 °C, rara vez bajan a menos de 24 °C o exceden 28 °C.

Las temperaturas mínimas diarias son alrededor de 18 °C, rara vez bajan a menos de 16 °C o exceden 19 °C. La temperatura baja promedio diaria más alta es 18 °C el 24 de enero.

El mes de enero, Timaná tiene nubosidad que aumenta gradualmente y el porcentaje de tiempo que el cielo está nublado o mayormente nublado aumenta del 81 % al 85 %. La probabilidad más baja de tener condiciones nubladas o mayormente nubladas es del 80 % el 10 de enero.

El día más despejado del mes es el 10 de enero, con condiciones despejadas, mayormente despejadas o parcialmente nubladas el 20 % del tiempo.

El promedio de lluvia durante un periodo de 31 días en una escala móvil en enero en Timaná es esencialmente constante.

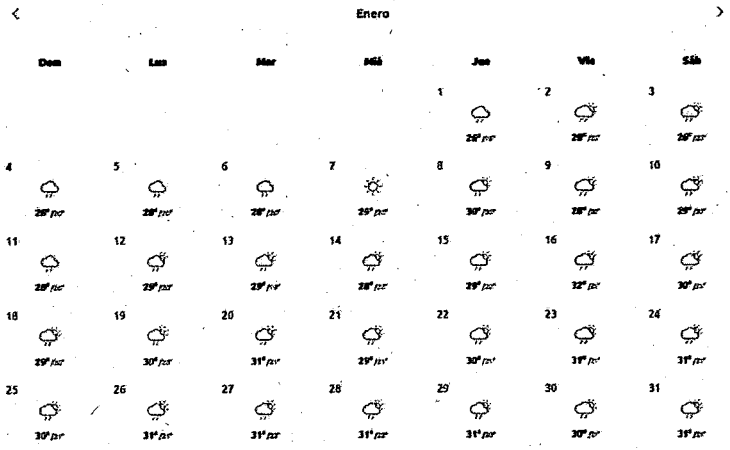

ILUSTRACIÒN 2. TIEMPO MUNICIPIO DE TIMANA

10. ENSAYOS DE LABORATORIO

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO	RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE

			7	14	28			
CONCRETOS COLUMNAS	20/01/2025	27/01/2025	X			2100 PSI	2188 PSI	CUMPLE
		27/01/2025	X			2100 PSI	2225 PSI	CUMPLE
						2700 PSI		
						2700 PSI		
						3000 PSI		
						3000 PSI		

11. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo (25%)	N/A			
Acta Parcial No. 1				
Acta Parcial No. 2		$	$	$
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 88.657.430,00	$ 0	$ 88.657.430,00	$	$ 88.657.430,00

12. COMITES DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
06/01/2025	**OBRA**	Plan de contingencia, seguimiento de pruebas de laboratorios y fundición de columnas eje B
17/01/2025	**OBRA**	Fundición de columnas, compactación y pedestales del eje A.
24/01/2025	**OBRA**	Conexión de filtro entre el eje AY B
31/01/2025	**OBRA**	Finalizar la función de columnas, compactación mecánica y armado de estructura para encofrado viga corona.

13. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD	No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)	FORMATO (Físico/Digital)
Pólizas de cumplimiento (Endoso 3 (No61-44-101051701.)			DIGITAL

Pólizas R.C (Endoso 3 (No. 61-40-101018824))			DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso 4 (No61-44-101051701.)			DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso 4 (No. 61-40-101018824))			DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso 5 (No. 61-40-101018824))			DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso 5, 6, 7 (No61-44-101051701.)			DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso 4 (No. 61-40-101018824))			DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso 9 (No 61-44-101051701.)			DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso 6, 7 (No. 61-40-101018824))			DIGITAL
Copias de Bitácora de Obra (periodo del 01/01/2025) al (31/01/2025)	07/02/2025		FISICO
Informe HSEQ (periodo del 01/01/2025) al (31/01/2025)	07/02/2025		FISICO
Actas de comités (periodo del 01/01/2025) al (31/01/2025)	07/02/2025		FISICO
Planillas de aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP) (periodo del 01/01/2025) al (31/01/2025)	07/02/2025		FISICO
Correspondencia (periodo del 01/01/2025) al (31/01/2025)	07/02/2025		FISICO
Registros de ensayos de calidad(periodo del 01/01/2025) al (31/01/2025)	07/02/2025		FISICO

14. RELACION DE PERSONAL (Profesional Interventoría)

NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	7.711.430	REPRESENTANTE LEGAL	PRESTACIÓN DE SERVICIO
JOSE WILMER CHILITO	76.320.749	REPRESENTANTE LEGAL	PRESTACIÓN DE SERVICIO
YINA CARIME POLANIA	1079174293	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONTRATO POR OBRA O LABOR

15. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

LEGALIZACION DEL CONTRATO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010098	0	09/11/2023	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	09/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	09/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	09/02/2024	09/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	0	Amparo Básico, Predios, Labores y Operaciones	09/11/2023	09/02/2024

POLIZA ANULADA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010098	1	21/11/2023	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	09/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	09/02/2027
				Calidad del Servicio	09/02/2024	09/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002028	1	Amparo Básico, Predios, Labores y Operaciones	09/11/2023	09/02/2024

PÓLIZA ACTUALIZADA – INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010098	2	21/11/2023	Cumplimiento del contrato	16/11/2023	16/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/11/2023	16/02/2027
				Calidad del Servicio	16/02/2024	16/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002028	2	Amparo Básico, Predios, Labores y Operaciones	16/11/2023	16/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100010098	3	28/09/2024	Cumplimiento del contrato	17/09/2024	17/05/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/09/2024	17/11/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2024	17/11/2029

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100002028	3	28/09/2024	16/11/2023	17/11/2024

Póliza actualizada X otrosí 1

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100010898	4	28/09/2024	Cumplimiento del contrato	17/09/2024	17/05/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/09/2024	17/11/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2024	17/11/2029

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100002028	4	28/09/2024	16/11/2023	17/11/2024

Póliza actualizada X otrosi 2

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100010098	5	02/12/2024	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	07/06/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	12/11/2024	07/12/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	07/11/2024	07/12/2029

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)					
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100002028	5	02/12/2024	16/11/2023	07/12/2024

Póliza actualizada X otrosi 3

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100010898	6	18/12/2024	Cumplimiento del contrato	02/12/2024	07/07/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	02/12/2024	07/01/2028
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	07/01/2025	07/01/2030

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)					
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100002028	6	18/12/2024	16/11/2023	07/01/2025

Póliza actualizada X otrosi 4


PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100010098	7	22/01/2025	Cumplimiento del contrato	27/12/2024	10/08/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	27/12/2024	10/12/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10/02/2025	10/02/2030

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)					
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100002028	7	22/01/2025	16/11/2023	10/02/2025

16. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


(Describir el contenido del plano)

ESQUEMA 1. Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal

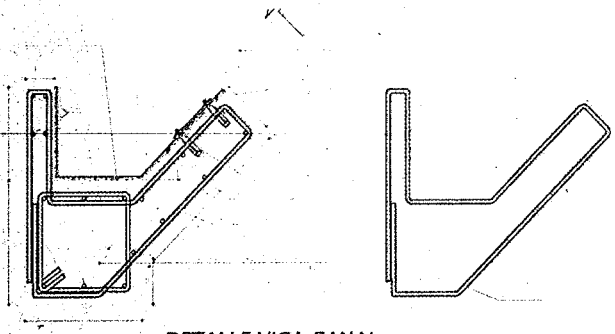

DETALLE VIGA CANAL

ESQUEMA 2. Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas

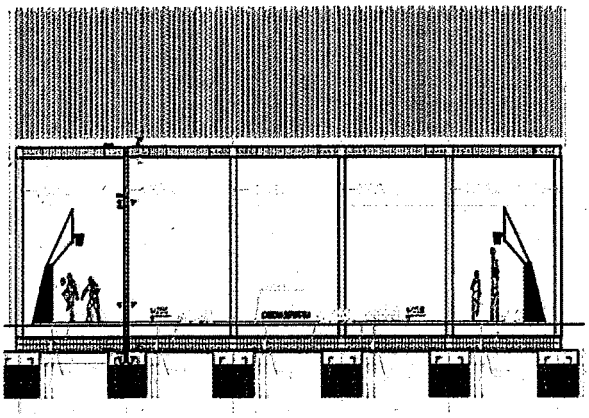

16. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

	CONDICIONES CONTRACTUALES					EJECUCIÓN DE OBRA MENSUAL			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR		CANT	% EJECUCION
1	**Preliminares**									
1.1	Localización y replanteo.	M2	900.42	$ 3,558.00	$ 3,203,694.00		$ -	0.00000000000000%	900.42	0.72615405572576%
1.2	Corte de Placa de concreto e= 0.10 mts.	ML	157.80	$ 26,280.00	$ 4,146,984.00		$ -	0.00000000000000%	74.90	0.44615413050592%
1.3	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	108.84	$ 116,723.00	$ 12,704,131.00		$ -	0.00000000000000%	108.84	0.05291321820778%
1.4	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	217.73	$ 46,003.00	$ 10,016,233.00		$ -	0.00000000000000%	217.73	2.22978445724842%
1.5	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	201.44	$ 83,849.00	$ 16,890,543.00	100.00	$ 8,384,900.00	1.67253096060282%	162.00	2.70954715440516%
1.06 NP	Relleno, crudo de rio para filtrar y compactar, mecanicamente.	M3	54.49	$ 127,780.00	$ 6,962,732.00	14.49	$ 1,851,532.00	0.36932397459085%	54.49	1.38888607060441%
1.07 NP	Filtro en tuberia de drenaje de 4" PVC perforada	ML	94.50	$ 138,014.00	$ 13,042,323.00	24.50	$ 3,381,343.00	0.67447445478391%	94.50	3.08331178849298%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 66,966,640.00**		**$ 13,617,775.00**			
2	**CIMENTACIÓN**									
2.1	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	16.40	$ 34,012.00	$ 557,797.00		$ -	0.00000000000000%	16.40	0.12598716108459%

2.2	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	34.56	$ 619,063.00	$ 21,394,817.00		$ -	0.00000000000000%	34.56	4.52023947168129%
2.3	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	2,462.20	$ 7,116.00	$ 17,521,015.00		$ -	0.00000000000000%	2462.20	3.88193323037089%
2.4	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño,	M3	12.20	$ 742,041.00	$ 9,052,900.00		$ -	0.00000000000000%	12.20	1.80581593241331%
2.5	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación.	KG	1,257.66	$ 7,116.00	$ 8,949,509.00		$ -	0.00000000000000%	1103.38	1.56625926918057%
2.6	Concreto Ciclopeo - 2500 PSI (175 KG/CM2) 60% Concreto 2500 PSI + 40% Piedra media zonga	M3	76.03	$ 360,003.00	$ 27,371,028.00		$ -	0.00000000000000%	76.03	6.20395799086407%
2.07 NP	Suministro e instalacion de plastico negro 3,5 impermehabilizacion.	M2	138.72	$ 15,257.00	$ 2,116,451.00		$ -		138.72	0.42219545326929%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 86,963,517.00**		**$ -**			
3	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**									
3.1	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	17.04	$ 920,829.00	$ 15,690,926.00	14.04	$ 12,928,439.00	2.57882795260109%	17.04	3.12985957322421%
3.2	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	3,894.25	$ 7,116.00	$ 27,711,483.00	1894.3	$ 13,479,483.00	2.68874436790174%	3894.25	5.52768781571536%
3.3	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.	M3	19.37	$ 1,004,876.00	$ 19,464,448.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
3.4	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	2,348.55	$ 7,116.00	$ 16,712,282.00	1000	$ 7,116,000.00	1.41942424067665%	1000.00	1.41942424067665%
3.5	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	65.80	$ 40,347.00	$ 2,654,833.00		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%

	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 82,233,972.00**		**$ 33,523,922.00**			
4	**CUBIERTA**									
4.1	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	845.53	$ 211,559.00	$ 178,879,481.00			0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 178,879,481.00**		**$**			
5	**ACABADOS - PLACA EN CONCRETO**									
5.1	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	307.11	$ 14,798.00	$ 4,544,614.00			0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%
5.2	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	0.00	$ 3,710,773.00	$ -			0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%
5.3	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	140.28	$ 73,943.00	$ 10,372,724.00			0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%
5.4	Cuneta en concreto de 3.000psi, segun diseño	ML	69.80	$ 83,852.00	$ 5,852,870.00			0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%
5.05 NP	Mantenimiento de cancha multifuncional Futbol de Salón, Baloncesto, incluye pintura, mallas, demarcado y logos.	UND	2.00	$ 736,291.00	$ 1,472,582.00			0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 22,242,790.00**		**$**			
6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**									
6.1	Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	49.60	$ 80,145.00	$ 3,975,192.00			0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%

6.2	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.	ML	23.68	$ 107,091.00	$ 2,535,915.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
6.3	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	24.00	$ 219,053.00	$ 5,257,272.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
6.4	Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	2.00	$ 349,989.00	$ 699,978.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
6.5	Construcción de filtros laterales externos en un ancho de 0,40 mts, con altura variable menor a 0,50 mts, recubrimiento en geotextil no tejido NT-1600, con gravilla común o triturado de 1 1/2" a 4"+ tubería PVC drenaje de 6"	ML	91.04	$ 63,617.00	$ 5,791,692.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 18,260,049.00**		**$**			
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**									
7.1	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	3.00	$ 638,903.00	$ 1,916,709.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.2	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	16.24	$ 46,003.00	$ 747,089.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.3	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	ML	29.00	$ 49,342.00	$ 1,430,918.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.4	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2.00	$ 304,503.00	$ 609,006.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.5	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	2.00	$ 282,276.00	$ 564,552.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.6	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1.00	$ 1,016,827.00	$ 1,016,827.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%

7.7	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1.00	$ 4,701,216.00	$ 4,701,216.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.8	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 AL ser8000 + 1x8 CU.	ML	12.00	$ 88,535.00	$ 1,062,420.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.9	Suministro e instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12.00	$ 368,969.00	$ 4,427,628.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.10	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	64.00	$ 58,153.00	$ 3,721,792.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.11	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12.00	$ 1,018,790.00	$ 12,225,480.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.12	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1.00	$ 975,015.00	$ 975,015.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	1.00	$ 1,035,368.00	$ 1,035,368.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.14	Excavación, hincada y plomada de postes de concreto de 8 mts x 510 kg armado y centrifugado.	UND	2.00	$ 2,252,908.00	$ 4,505,816.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.15	Vestida de estructura de retencion en baja tensiòn con grapa de retencion para cable trenzado y percha de gancho abierto.	UND	1.00	$ 340,951.00	$ 340,951.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.16	Vestida de estructura de retención doble en baja tensión con dos grapas de retención para cable trenzado con perno de gancho abierto y percha de gancho abierto para sujeción de la red trenzada.	UND	1.00	$ 236,067.00	$ 236,067.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.17	Vestida de estructura de retención en baja tensión con grapa de retención para cable trenzado y perno de gancho abierto.	UND	1.00	$ 340,951.00	$ 340,951.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%

7.18	Tendido y tensionado en conductor trenzado de aluminio aislado 2x35 mm + 50 mm tipo PE-XLPE - 600 VAC.	ML	55.00	$ 46,080.00	$ 2,534,400.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 42,392,205.00**		**$**			
8	TRANSPORTE									
8.1	Transporte de materiales petreos	M3-Km	3,083.07	$ 1,100.00	$ 3,391,377.00			0.00000000000000%	3083.07	0.67647593072980%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 3,391,377.00**		**$**			
% AVANCE DE OBRA								**9.40332595115706%**		**39.9165869 4440040%**

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.


ING. HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA


YINA CARIME POLANIA
RESIDENTE INTERVENTORIA

17. REGISTRO FOTOGRAFICO




N
E
W
S
22/01/2025
1:90506526N 75:97210258W
25 NE
Timana

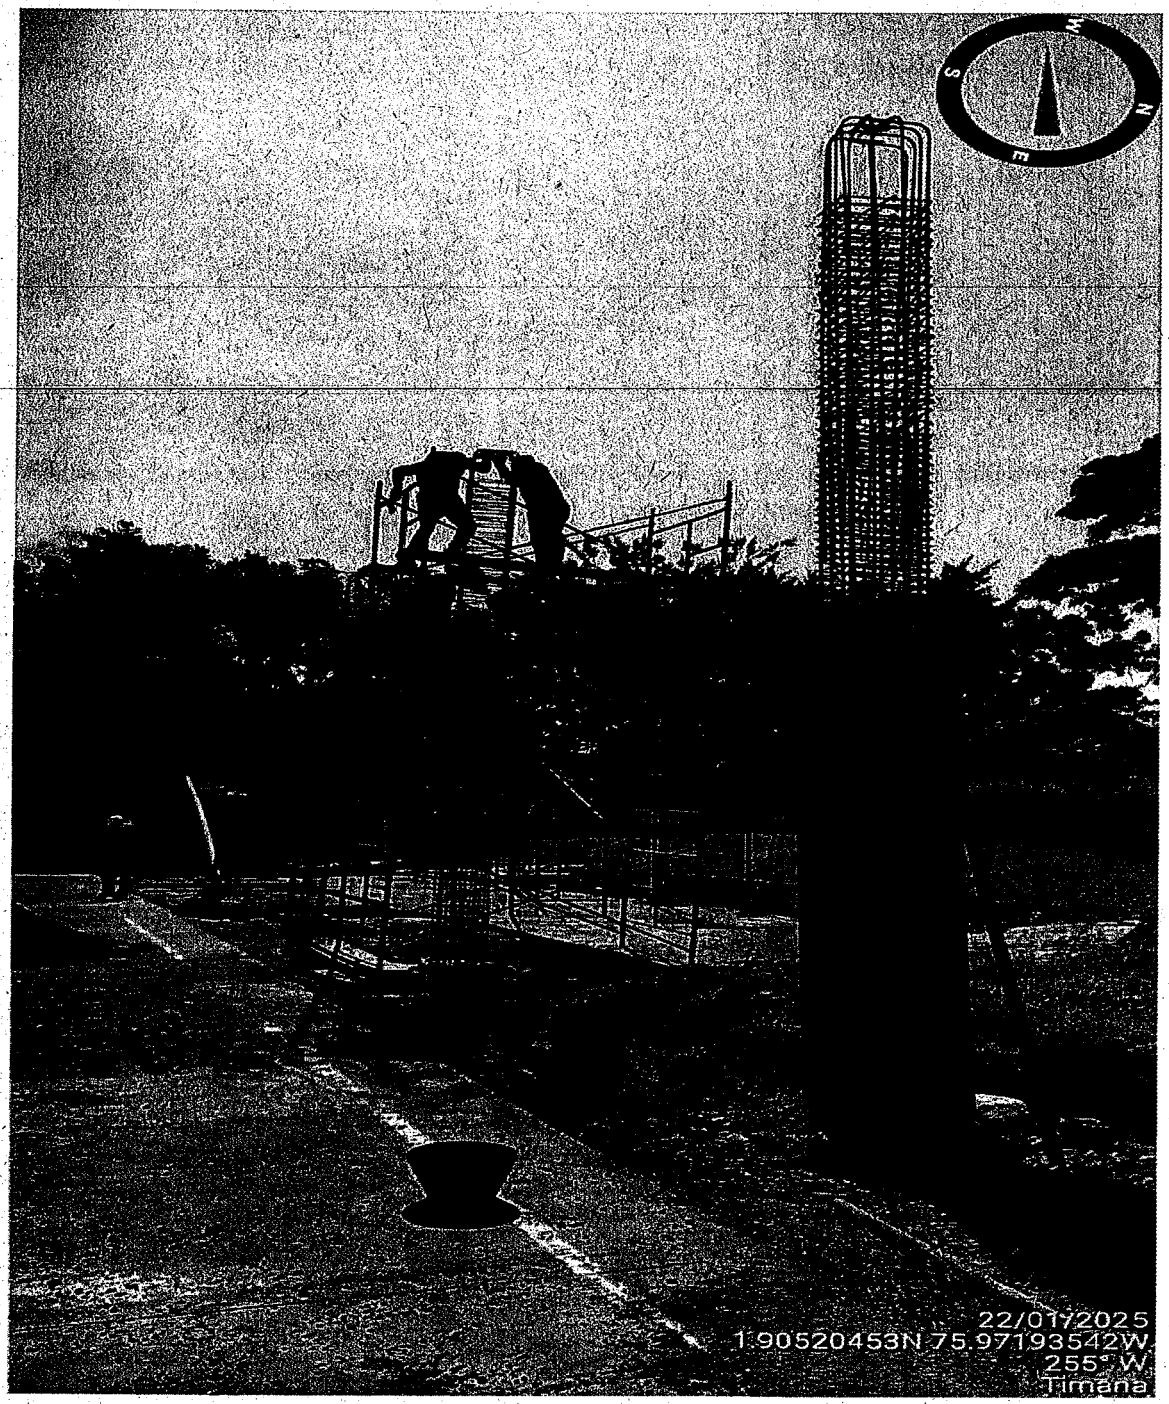
22/01/2025
1.90520453N 75.97193542W
255° W
Timana

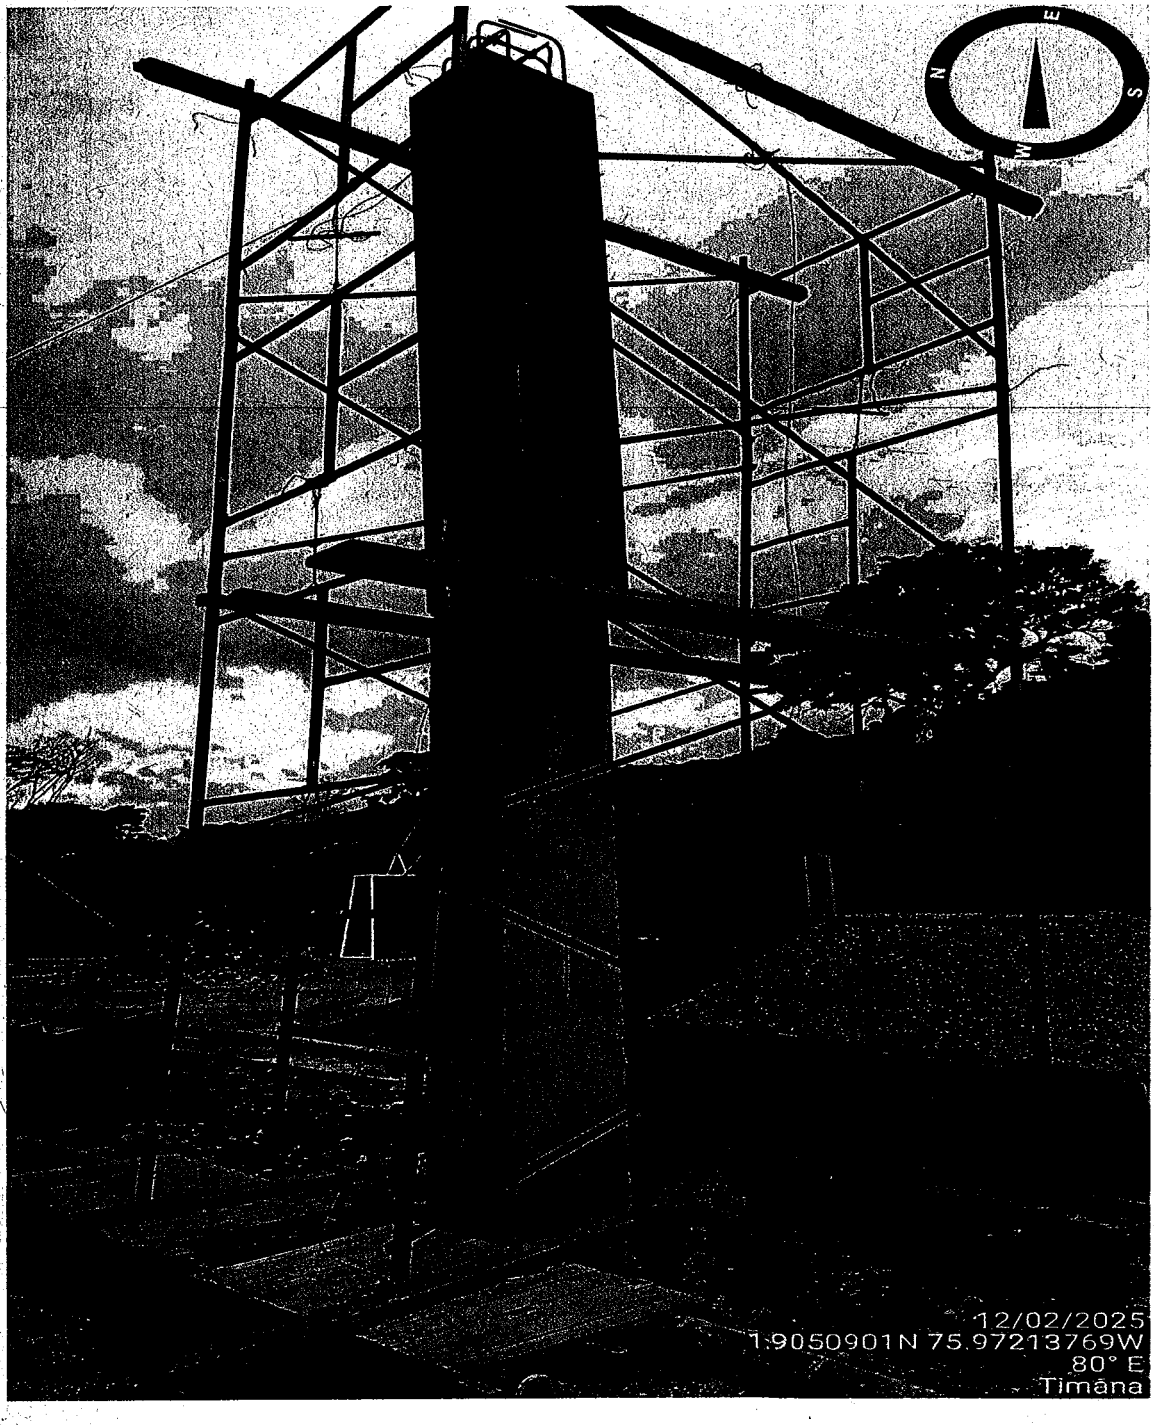
12/02/2025
1.9050901N 75.97213769W
80° E
Timaná


22/01/2025
1.90489253N 75.9721662W
25° NE
Timaná





1. ANEXOS

- BITÁCORA DE OBRA.
- ACTAS DE COMITÉS.
- RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIOS
- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP).

R.L. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	(10/02/2024)	ING. XIMENA ADELINDA JIMENEZ ZUÑIGA
FIRMA ORIGINAL **INTERVENTOR**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo.Bo APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Timana Huila 7 enero 2025.

Hora inicial 7:00 am. Hora Final 5: Pm.
Clima Lluvioso, lluvias fuertes en horas de la mañana.
Personal Ing residente, oficiales, ayudantes SISO
Herramientas y equipo menor.
se realiza limpieza del material residual ocasionado por las altas precipitaciones generadas en la zona

Wilson Parra

Residente inter.

Timana Huila 8 de enero de 2025.
Hora inicial 7:00 am Hora Final 5:00Pm.
Clima Lluvioso, lluvias intermitentes todo el día.
Personal en obra, Ing residente, oficiales ayudantes, SISO
Herramienta menor.
se continua fundiendo viga de cimenta con eje A;

Wilson Parra.

Residente inter.

Timana Huila enero 9 de 2025.
Hora inicial 7:00 am Hora Final 5: Pm.
Clima lluvioso, lluvias intermitentes.
Personal en obra: Ing residente, oficiales. ayudantes, SISO
Herramienta menor.
Se continua con el amarrado de Hierro columnas eje B con Alambre negro
Wilson Parra.

Residente inter.

NKB

Tunana Huila, 10 de Enero de 2025.
Hora Inicial 7:00 AM : Hora Final 5: Pm.
Clima lluvioso, lluvias intermitentes.
Personal en obra, ing residente, oficales ayudantes.
Haramienta menor,
se realiza desencofrado de viga de cimenta con A5, al A4, y se empieza a encofrar. A4- al A3.

Wilson Parra. Residente Inter.

Tunana Huila, Enero 11 de 2025.
Hora inicial 7:00am : Hora Final 5:00Pm
Clima lluvioso, lluvias fuertes, en horas de la mañana
Personal en obra, ing residentes, oficales ayudantes,

no se pudo realizar actividades en obra alta Precipitacion en la zona.

Wilson Parra. Residente Inter.

Tunana Huila 13 enero 2025.
Hora inicial 7:00am Hora Final 5 Pm.
clima lluvias intermitentes
Personal en obra, ing residente, oficiales, ayudantes
SISO
Haramienta menor:
se Fundo viga de cimiacion viga A4 al A3
concreto 3000PSI, Grava 3/4. Arena
se realza encofrado A3 al A2

Wilson Parra Residente inter.

AnyScanner

Timana Huila Enero 14 de 2025.
Hora Inicial 7:00Am Hora Final 5:00Pm
Clima Lluvioso
Personal en obra: Ing residente, oficiales ayudantes.
Herramienta y equipo menor.
Se realiza amarre de traslapos para columnas, Vaciada corrugada de 1/2" y estribos de 3/8.

Wilson Parra.

Residente inter.

Timana Huila, Enero 15 de 2025
Hora Final 7:00Am Hora Final 5:Pm.
Clima lluvioso, lluvias intermitentes
Herramienta menor.
Personal en obra: Ing residente, oficiales ayudantes.
se continua con el despiece de traslapos para los columnos, se continua amarrando Columnas.

Wilson Parra.

Residente inter.

Timana Huila. 16 Enero de 2025.
hora Final 7:00am. Hora Final 5:Pm.
Clima lluvioso
Personal en Obra., Ing residente, Oficiales Ayudantes.
Se continua amarrando columnas eje B, y traslapos de los mismos.

Wilson Parra.

Residente inter.

Timana Huila 17 de Enero de 2025.
Hora Inicial: 7:am. Hora Final 5:Pm.
Clima lluvioso en las Primeras horas.
Personal en obra: Ing residente, ayudantes oficiales, SISO
Herramienta y equipo menor.

Se realiza encofrado de la viga de cimentacion A2 al A1., se continua tumbando tuer lapez. Para vigas ese B.

Wilson Parra. residente inter.

Timana Huila 18 de enero de 2025.
Hora inicial 7:00 am Hora Final 5:Pm.
clima soleado Herramientas y equipos
Personal en obra: Ing residente, Ayudantes oficiales.
se realiza la Fundicion del tramo de viga faltante, A3 al A2; y A2 al A1.

Wilson Parra. residente inter.

Timana Huila 20 enero de 2025.
Hora inicial 7:00 am. Hora Final 5: Pm.
Clima soleada
Personal en obra: Ing residente, oficiales, siso, ayudantes.
Se comienza a montar Formaleta. Para Columnas ese B. B1

Wilson Parra. residente inter.

Timana Huila, 21 enero del 2025

Hora Inician 7 am. Hora Final 5: Pm.

Clima soleado

Personal en obra: Ing. residente, OFICIALES ayudantes, SISO

Herramientas y equipos.

Se continua encofrando columnas con formaletas en lamina, B3, se amarra el traslape de las columnas B1 y B3

Wilson Parra. Residente Interv

Timana Huila, 22 enero de 2025

Hora inicial 7:00am. Hora Final 5:00Pm.

Clima soleado.

Personal en Obra. Ing residente, OFICIALES ayudantes. SISO

llegada de 14 m^3 de recebo, 14 m^3 de Premezclado, se continuan empalmando los traslapes de las columnas.

Wilson Parra. Residente Interv

Timana Huila, 23 de enero de 2025

Hora inicial 7:00am Hora Final 5: Pm

Clima soleado

Personal en obra Ing residente, Ayudantes OFICIALES, SISO

Se comienza a Fundir columna B1 hasta 3 mt y encofrando B5.

Wilson Parra. Residente Interv

Timana Huila, 24 de Enero de 2025

Hora Inicial 7:am Hora Final 5 Pm.

Clima lluvioso Lluvias fuertes horas de la mañana

Personal en obra, Ing residente, SISO, OFICIALES ayudantes

Se continua con el relleno del eje B

Formaletas de columnas eje. B.

Wilson Parra. Residente Intev.

Timana Huila, 25 enero 2025.

Hora Inicial 7:am hora Final 12:Pm

Clima. humedo. clima Frio por fuertes lluvias

Personal en obra: Ing residente, oficiales ayudantes, SISO

Herramientas y equipos.

Se realiza encofrado de columna B1 y amarrado de traslapos.

Wilson Parra. Residente Intev.

Timana Huila .27 enero 2025.

Clima soleado

Hora inicial 7:00 am Hora Final 5 Pm.


Personal en obra: Ing residente, SISO OFICIALES ayudantes

Herramientas y equipos.

Se instala formaleta de B2 y B4 para fundir columnas.

Wilson Parra. Residente Intev. NIC

Timana Huila 28 de Enero de 2025
Clima Frio
Hora Inicial 7:am Hora Final 5:Pm.
Personal en obra, ing residente, oficiales ayudantes, 5:50
Herramientas y equipos
Se Funden columnas B2 y B4



Wilson Parra.

Residente Inter

Timana Huila 29 Enero 2025
clima lluvioso, Fuertes lluvias en horas de la mañana.
Hora Inicial 7:00 am. Hora Final 5:Pm.
Personal en obra, ing residente, oficiales ayudantes 5:50

Se desencofra columna B1-B2. Para encofrar Para Fundir la parte superior de los mismos, Grava, Premezclado 3000psi

Residente Inter.

Timana Huila, 30 Enero de 2025.
Hora Inicial 7:00 am Hora Final 5 Pm.
Clima lluvioso, Fuertes lluvios.
Personal en obra, ing residente, 5:50
Oficiales ayudantes

Se Funde columna B1 Parte Superior



Wilson Parra.

Residente Inter.

Timana Huila, 31 enero de 2025
Hora 7:00 am Hora Final 5:00pm.
Clima soleado
Personal en obra Ing residente, OFICIALES ayudantes SISO
Herramientas y equipos.

Se acaban de amarra los traslapes Faltantes de las vigas.

Wilson Parra. Residente Inter.

Timana Huila 1 Feb de 2025
Hora inicial 7:am Hora Final. 5:Pm.
clima Frio
Personal en obra: Ing residente, oficiales ayudantes
Herramientas y equipos
Se empieza amarrar estribos de columnas eje A.

Wilson Parra Residente Inter.

Timana Huila 3 Febrero 2025.
Hora inicial 7:am Hora Final. 5:Pm.
Clima soleado
Personal en obra Ing residente, OFICIALES ayudantes SISO

Se continua con el armado de canastas Para las columnas eje A.

Wilson Parra. Residente Inter.

Nombre Proyecto		***"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMANETO DEL HUILA"***		**Acta No.**	
No. De Contrato obra		CLPIH 401 DEL 2023	**Lugar:**	VEREDA PANTANOS (TIMANA HUILA)	
No. De Contrato Interventoría		CIHCM 420 - 2023			
Fecha	6 DE ENERO 2025	**Hora Inicio**	2: PM	**Hora Final**	5:PM

OBJETO DE LA REUNION
Evaluar el estado de la obra, avance, después de la vacancia, plan de contingencia, reunión técnica

AGENDA	
	1- Reunión con la entidad para evaluar los retrasos en la ejecución de la misma,
	2- Solicitar prórroga del plazo para finalización de la cubierta
	3- Evaluar nuevos planos de contingencia para aumentar el rendimiento de la obra

DESARROLLO

- Se realizo un comité entre todas las partes intervinientes con el fin de solicitar un nuevo plazo, para la culminación de la cubierta. Con el resultado de la aprobación unánime de la ampliación del plazo.

- Se suscribió compromiso para aumentar el rendimiento, y así impactar las actividades

- Se pudo evidenciar el encofrado de las columnas, para su respectiva fundición

- Se realizo la capacitación por parte de la profesional siso, Lizeth Luna Cuellar, en trabajo seguro en alturas, utilización de los equipos estas actividades, líneas de vida equipos de seguridad

- Se solicito a la empresa de suelos Ingelab, unas nuevas pruebas de resistencia al

DESARROLLO
concreto a utilizar en las columnas

TAREAS – COMPROMISOS – TEMAS PROXIMAS REUNIONES			
Tema	**Tarea**	**Responsable**	**Fecha de Control**
1	Seguimiento al plan de contingencia		
2	Seguimiento a las pruebas de laboratorio		
3	Columnas eje B		

EN CONSTANCIA FIRMAN EL ACTA:		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Heiran Jose Trujillo	Director	
Wilson Parra	Residente	
YINA POLANIA	RESIDENTE INTERVENTORIA	

Nombre Proyecto		***"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMANETO DEL HUILA"***		**Acta No.**	
No. De Contrato obra		CLPIH 401 DEL 2023	**Lugar:**	VEREDA PANTANOS (TIMANA HUILA)	
No. De Contrato Interventoría		CIHCM 420 - 2023			
Fecha	17 DE ENERO 2025	**Hora Inicio**	2: PM	**Hora Final**	5:PM

OBJETO DE LA REUNION
Seguimiento a los compromisos suscritos

AGENDA	
	1- Verificar que los compromisos se están cumpliendo
	2- Socializar resultados de laboratorio Ingelab
	3- Compromisos

DESARROLLO

- Se verifica que el compromiso suscrito por parte del contratista se esta cumpliendo, aumentando la planta de personal, abasteciendo la obra con mas materiales para no tener demoras

- Las pruebas de laboratorio a los cilindros, arrojaron la resistencia exigida por parte de la entidad.

- Se empezó a fundir columnas, eje B

- Empezaron las actividades de amarres de traslapes para columnas

DESARROLLO

TAREAS – COMPROMISOS – TEMAS PROXIMAS REUNIONES			
Tema	**Tarea**	**Responsable**	**Fecha de Control**
1	Pedestales Eje A		
2	Fundición columnas		
3	Compactación manual		

EN CONSTANCIA FIRMAN EL ACTA:		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Heiman Jose Trujillo	Directo	
Wilson Parra	Residente	
Yina Polania	Residente Interv.	

Nombre Proyecto		***"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMANETO DEL HUILA"***		**Acta No.**	
No. De Contrato obra		CLPIH 401 DEL 2023	**Lugar:**	VEREDA PANTANOS (TIMANA HUILA)	
No. De Contrato Interventoría		CIHCM 420 - 2023			
Fecha	24 DE ENERO 2025	**Hora Inicio**	2: PM	**Hora Final**	5:PM

OBJETO DE LA REUNION
Avance de las actividades, cumplimiento del cronograma

AGENDA	
	1- Verificar que el plan de contingencia este resultando en el desarrollo de las actividades
	2- Rectificar medidas de los elementos fundidos
	3- Compromisos

DESARROLLO

- Se evidencia un leve incremento en el desarrollo de las actividades, teniendo en cuentas las grandes precipitaciones que se siguen presentando, aun así, se pude determinar que el plan de contingencia está generando un mayor avance en el desarrollo de las actividades

- Se evidencia que las especificaciones técnicas se están desarrollando conforme a los requerimientos y que el compromiso suscrito se esta cumpliendo de una forma diligente

- Se funden columnas eje B

- Empezaron las actividades de amarres de traslapes Para eje A

DESARROLLO

TAREAS – COMPROMISOS – TEMAS PROXIMAS REUNIONES			
Tema	**Tarea**	**Responsable**	**Fecha de Control**
1	Compactación manual con recebo		
2	Fundición columnas		
3	Conexión filtros entre ejes A Y B		

EN CONSTANCIA FIRMAN EL ACTA:		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Heiman Jose Trujillo	Director	
Wilson Parra	Residente	
Yina Polania	RESIDENTE INTERVENTOR	

Nombre Proyecto		***"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMANETO DEL HUILA"***		**Acta No.**	
No. De Contrato obra		CLPIH 401 DEL 2023	**Lugar:**	VEREDA PANTANOS (TIMANA HUILA)	
No. De Contrato Interventoría		CIHCM 420 - 2023			
Fecha	31 DE ENERO 2025	**Hora Inicio**	2: PM	**Hora Final**	5:PM

OBJETO DE LA REUNION
AVANCE DE OBRA

AGENDA	
	1-Verificar el porcentaje de avance de las columnas
	2- Verificar conexiones de los filtros de tubería perforada entre ejes
	3- Compromisos

DESARROLLO

- Las columnas ya se encuentran en proceso de encofrado para el eje A, ratificando que el plan de contingencia se esta cumpliendo teniendo un avance mas significativo, aun, cuando seguimos teniendo dificultades por teas de las lluvias.

- Se realizo las excavaciones y conexiones de los filtros en tubería perforada de 4", crudo de rio, dando por finalizado este ítem

- Verificando el plan de seguridad establecido por la siso se esta resultando, teniendo un registro de cero incidentes en la obra

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F02
Fecha Aprobación: 13/02/2023	ACTA COMITÉ DE OBRA	Versión: 2

DESARROLLO

TAREAS – COMPROMISOS – TEMAS PROXIMAS REUNIONES			
Tema	**Tarea**	**Responsable**	**Fecha de Control**
1	Finalizar las columnas		
2	Armado de estructura para encofrado viga corona		
3	Compactación mecánica		

EN CONSTANCIA FIRMAN EL ACTA:		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Hernan Jose Trujillo	Director	
Wilson Parra	Residente	
YINA POLANIA	RESIDENTE INTERVENTORIA	

AOLAB INGENIERIAS SAS

INFORME DEL ENSAYO COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS



MUNICIPIO DE TIMANA – VEREDA PANTANOS

ENERO DEL 2025

ingenieriadesuelosaolab@gmail.com / calle 76 # 1ª bis -33 puertas del edén /3115955822

AOLAB INGENIERIAS SAS

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV E-410-13

CONTRATISTA CONSORCIO WF


PROYECTO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA

UBICACIÓN MUNICIPIO DE TIMANA – VEREDA PANTANOS

FECHA EMISION INFORME: ENERO DEL 2024

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD. LAB	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	%de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
			Diametro	Longitud	KN							
22/01/2025	20/01/2025	2	10.00	20.00	116.5	7	27/01/2025	2188	73%	5	3000	CONCRETOS COLUMNAS
	20/01/2025		10.00	20.00	120.5	7	27/01/2025	2225	74%	6	3000	
	20/01/2025		10.00	20.00		14	03/02/2025	0	0%		3000	
	20/01/2025		10.00	20.00		14	03/02/2025	0	0%		3000	
	20/01/2025		10.00	20.00		28	17/02/2025	0	0%		3000	
	20/01/2025		10.00	20.00		28	17/02/2025	0	0%		3000	

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS HAN SIDO TOMADAS POR EL CLIENTE Y TRANSPORTADAS POR LABORATORIO. EL COMPORTAMIENTO PARA UN CONCRETO CONVENCIONAL (SIN ADITIVO) SERA: A LOS 1d= 15% 3d= 40% 7d= 70% 14d= 90% 28d= 100% CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5%

CALCULO
JEFE DE LABORATORIO

ingenieriadesuelosaolab@gmail.com / calle 76 # 1ª bis -33 puertas del edén /3115955822

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7711430
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 4 9 25 OF 507	TELÉFONO:	8668020
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			79608488319	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2025
			0				
			2025/02/07				1471622116

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 562.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 562.900	$ 0	$ 562.900
SUBTOTALES:										$ 562.900	$ 0	$ 562.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 439.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 439.800	$ 0	$ 0	$ 439.800
SUBTOTALES:													$ 439.800	$ 0	$ 0	$ 439.800

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 85.700	$ 85.700	$ 0	$ 0	$ 85.700
SUBTOTALES:									$ 85.700	$ 0	$ 0	$ 85.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CON	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD							ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
1	CC 7711430	PERDOMO POLANIA FAIVER EDUARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 3.517.850				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 3.517.850	$ 562.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 562.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.517.850	$ 439.800	$ 0	$ 439.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.517.850	7711430	$ 85.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.088.400

Planilla Pagada
