INFORME No. 8

Contrato Obra N. CLPIH401-2023

Objeto es el **"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA"**


Dirección: Cra. 3 w N. 64-37 Barrio Chicalá
Email: consorciocivilheinder@gmail.com
Teléfonos: 3187167087
Ciudad: Neiva Huila

CONTRATO DE OBRA No. CLPIH401 DE 2023

INFORME DE OBRA No. 8

MENSUAL [X] **FINAL** [ ]

Objeto Contrato: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ, DEPARTAMENTO DEL HUILA

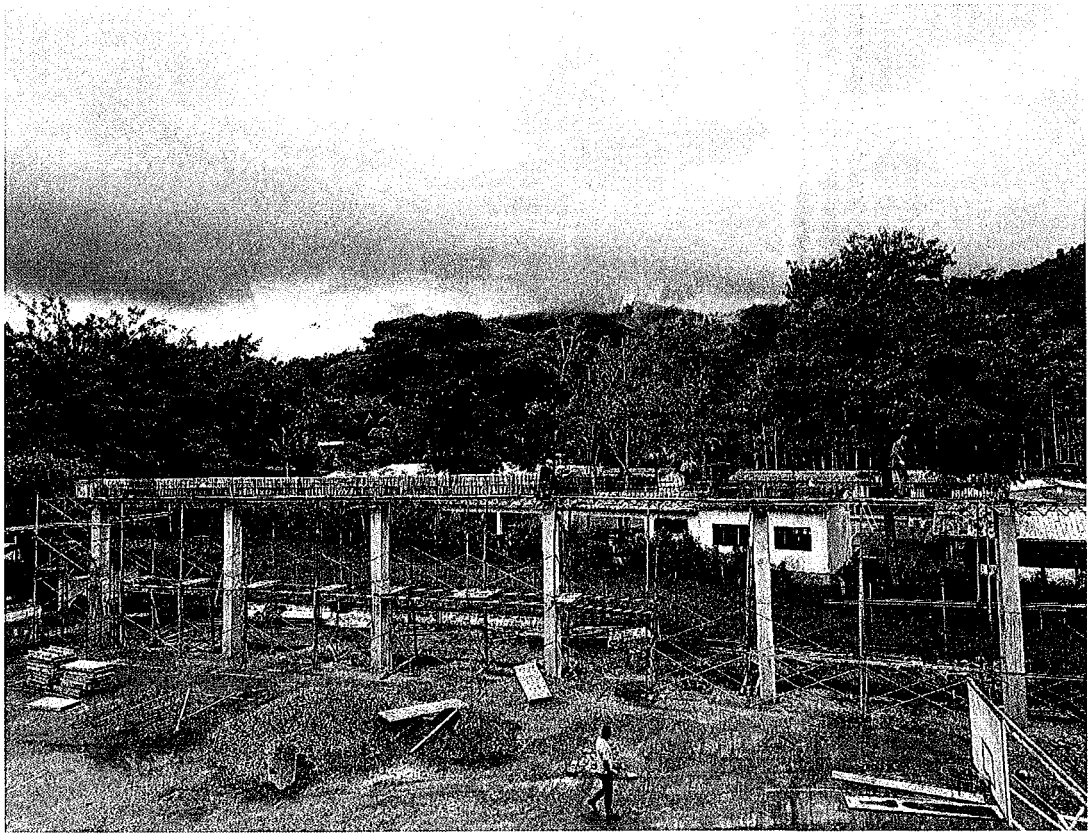

MUNICIPIO: Timana, Vereda Pantanos.

DEPARTAMENTO: HUILA


CONTRATO DE OBRA No. CLPIH401 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO CIVIL H&E


APOYO A LA SUPERVISIÓN	ARQ. JUAN ALARCON	**ENTIDAD**	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	CLPIH401 DE 2023		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ, DEPARTAMENTO DEL HUILA	**PERIODO DEL INFORME**	Entre 01 de febrero al 28 De febrero de 2025.
CONTRATISTA	CONSORCIO CIVIL H&E	**NIT**	901.767.013-6
REPRESENTANTE LEGAL:	HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON	**C.C**	79.944.179 de Bogotá D.C.


FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	2 DE NOVIEMBRE DEL 2023
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16 DE NOVIEMBRE DEL 2023
FECHA DE SUSPENSIÒN No. 1	26 de diciembre del 2023
FECHA DE REINICIO No. 1	24 de septiembre del 2024
OTROSI No. 1 24/09/2024	MODIFICACIÓN CLÁUSULA 3 -PLAZO DEL CONTRATO – VIGENCIA FISCAL
OTROSI No. 2 12/11/2024	Prorroga: Un (1) mes. Adición: Setenta y cinco millones ciento setenta y nueve mil trescientos cincuenta y siete pesos ($75.179.357) M/CTE
OTROSI No. 3 13/12/2024	Prorroga: Un (1) mes.
OTROSI No. 4 10/01/2025	Prorroga: Dos (2) mes.
PLAZO INICIAL	Tres (3) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones.
PLAZO TOTAL:	Siete (7) meses contando a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones sin superar la presente vigencia fiscal 2025.
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS cincuenta y un millones cuatrocientos ochenta y tres mil ciento ochenta y tres pesos ($551.483.183,00) M/CTE.
VALOR ADICIONAL (12/11/2024):	Setenta y cinco millones ciento setenta y nueve mil trescientos cincuenta y siete pesos ($75.179.357) M/CTE.
VALOR TOTAL:	Seiscientos veintiséis millones seiscientos sesenta y dos mil quinientos cuarenta pesos ($626.662.540) M/CTE.

INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	**NIT:**	Nit. 901.769.619-8
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	**C.C:**	7.711.430

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

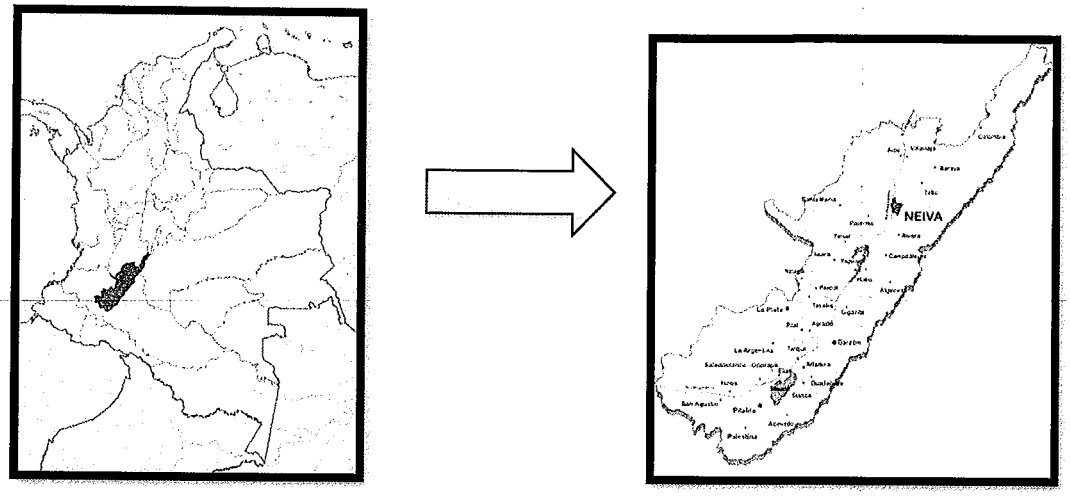

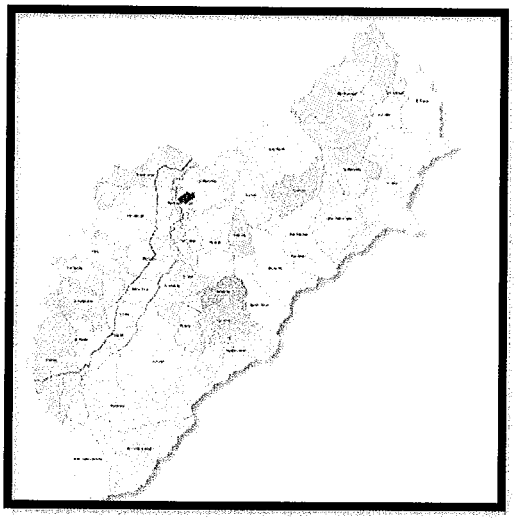

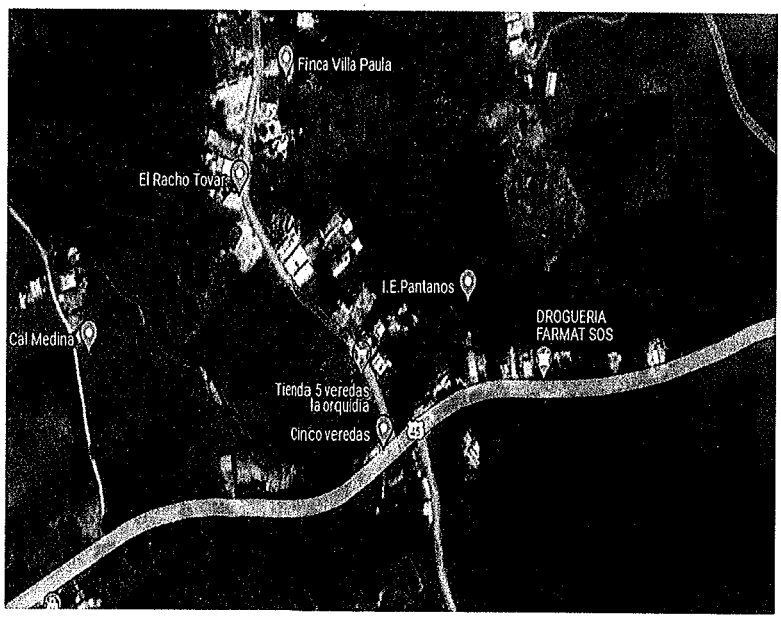

ILUSTRACIÒN 1. LOCALIZACIÒN MUNICIPIO DE TIMANA

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de (1) cubierta autoportante con iluminación para la vereda pantanos de la zona rural del Municipio de Timana Departamento del Huila
Es un sistema de estructura en concreto y teja auto portante a base de lámina de acero cal. 22:
- Área Total replanteo: 937,20 M2
- Actividades preliminares.
- Cimentación en concreto.
- Estructura en concreto.
- Cubierta.
- Instalaciones hidrosanitarias.
- Instalaciones eléctricas.

4. INFORME CONCRETO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DURANTE EL PERIODO

N/A

5. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION
Iniciación	16 de Noviembre de 2023	40		
Suspensión No. 1	26 de diciembre de 2023			
Reiniciación No. 1	24 de septiembre de 2024	37	273	
OTROSI No. 2	12 noviembre del 2024.	30		
OTROSI No.3	13 diciembre del 2024	30		
OTROSI No. 4	10 enero del 2025	30		
TERMINACIÓN Cto.	13 de marzo de 2025	30		13 de marzo de 2025
TOTAL DIAS		197	273	

6. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA INICIO	1	16 de noviembre del 2023
ACTA DE SUSPENSION	1	26 de diciembre del 2023
ACTA DE JUSTIFICACION	1	26 de diciembre del 2023
ACTA DE REINICIO	1	24 de septiembre del 2024
ACTA DE JUSTIFICACION	2	24 de septiembre del 2024
ACTA DE JUSTIFICACION	3	24 de septiembre del 2024
OTROSI MODIFICATORIO	1	24 de septiembre del 2024


ACTA DE JUSTIFICACION	4	12 de noviembre del 2024
OTROSI MODIFICATORIO	2	12 de noviembre del 2024
OTROSI MODIFICATORIO	3	13 de diciembre del 2024
ACTA DE JUSTIFICACION	5	13 de diciembre del 2024
OTROSI MODIFICATORIO	4	10 de enero del 2025.
ACTA DE JUSTIFICACION	6	10 de enero del 2025.

7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

a). **Actividades administrativas**	Capacitaciones por parte la siso Comité de obra, interventoría, entidad contratante, contratista
b.) **Actividades operativas**	- Compactación manual de recebo - Armado de estructura para formaleta Eje B - Armada de canastas para viga canal eje B - Fundición de Vigas corona Ejes A y B - Instalación de manto zetal viga canal - Instalación de bajantes en tubería de 4" - Instalación de filtros en tubería tipo pesada pvc de 6" - Construcción de placa para anden anden - Construcción de cajas de inspección .70*.70 - Mantenimiento de cancha multifuncional - Demarcación de cancha en pintura trafico - Construcción de cuneta en concreto - Excavación manual par tubería eléctrica - Fabricación de cajas de inspección alumbrado publico .40*.40

8. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

Las temperaturas mínimas diarias son alrededor de 18 °C, rara vez bajan a menos de *16 °C* o exceden *19 °C*.El promedio de lluvia durante un periodo de 31 días en una escala móvil en febrero en Timaná *aumenta.El mes de febrero, Timaná tiene nubosidad que aumenta gradualmente y el porcentaje de tiempo que el cielo está nublado o mayormente nublado aumenta del 85 % al 89 %.*

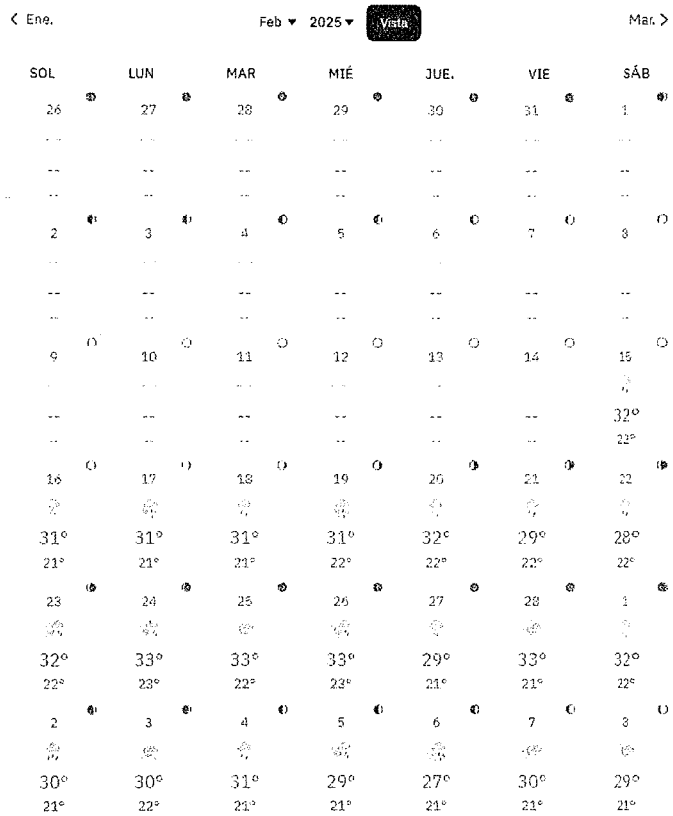

ILUSTRACIÒN 2. TIEMPO MUNICIPIO DE TIMANA

9. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Tipo Prueba de Laboratorio	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
Diseños de mezcla para los concretos.	N/A	N/A
Diseños de mezcla para base.	N/A	N/A
Compresión simple al concreto.	N/A	N/A
Ensayo de compactación de campo	N/A	N/A

NOTA: *Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Articulo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.*

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
N/A	N/A	N/A	7	14	28	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A				N/A	N/A	N/A
		N/A				N/A	N/A	N/A
		N/A				N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A				N/A	N/A	N/A
		N/A				N/A	N/A	N/A
		N/A				N/A	N/A	N/A

10. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo (25%)	23/10/2024	$130.977.256		$130.977.256
Acta Parcial No. 1		$	$	$
Acta Parcial No. 2		$	$	$
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$551.483.183	$75.179.357	$626.662.540	$	$495.685.334

11. COMITES DE OBRA

Fecha de Realización	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
07/02/2025	OBRA	Finiquitar las columnas, iniciando con el encofrado de la VIGA y terminar la compactación mecánica.
14/02/2025	OBRA	Finalizar columnas del eje A, Compactación mecánica.
21/02/2025	OBRA	Fundir las vigas con concreto premezclado, desencofrar e impermeabilizar las vigas.
28/02 /2025	OBRA	Solicitud de seguimiento de suspensión, programación de cubierta autoportante.

12. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD	No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)	FORMATO (Físico/Digital)
Pólizas de cumplimiento (Endoso 3 (No61-44-101051701.)			DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso 3 (No. 61-40-101018824))			DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso 4 (No61-44-101051701.)			DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso 4 (No. 61-40-101018824))			DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso 5 (No. 61-40-101018824))			DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso 5, 6, 7 (No61-44-101051701.)			DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso 4 (No. 61-40-101018824))			DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso 9 (No 61-44-101051701.)			DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso 6, 7 (No. 61-40-101018824))			DIGITAL
Copias de Bitácora de Obra (periodo del 01/02/2025) al (28/02/2025)	07/03/2025		FISICO

Informe HSEQ (periodo del 01/02/2025) al (28/02/2025)	07/03/2025		FISICO
Actas de socialización e inicio de obra			FISICO
Actas de conformación de veeduría ciudadana			FISICO
Acta de vecindad			FISICO
Actas de comités (periodo del 01/02/2025) al (28/02/2025)	07/03/2025		FISICO
Planillas de aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP) periodo del 01/02/2025) al (28/02/2025)	07/03/2025		FISICO
Correspondencia periodo del 01/02/2025) al (28/02/2025)	07/03/2025		FISICO
Registros de ensayos de calidad periodo del 01/02/2025) al (28/02/2025)	07/03/2025		FISICO
Registros de ensayos de calidad periodo del 01/02/2025) al (28/02/2025)	07/03/2025		FISICO

13. RELACION DE PERSONAL (Profesional y Mano de obra)

NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON	79944179	DIRECTOR	PRESTACION DE SERVICIOS
WILSON REINALDO PARRA TOVAR	79500020	RESIDENTE	PRESTACION DE SERVICIOS
LIZETH NAIROBY LUNA CUELLAR	1077862501	SISO	PRESTACION DE SERVICIOS
ADRIAN DIYER CHALA MEDINA	1080933023	AYUDANTE	PRESTACION DE SERVICIOS
LUIS MIGUEL CORREA ORTIZ	1084251953	AYUDANTE	PRESTACION DE SERVICIOS
YONEISON CORREA ORTIZ	1004440666	AYUDANTE	PRESTACION DE SERVICIOS
SEBASTIAN ESPAÑA ARDILA	1083876435	AYUDANTE	PRESTACION DE SERVICIOS
JONATHAN ESPAÑA MEDINA	1080935714	AYUDANTE	PRESTACION DE SERVICIOS
LEONARDO GOMEZ QUINAYAS	1004208423	AYUDANTE	PRESTACION DE SERVICIOS
WILMAR SANTIAGO IDROBO CLAROS	1004034509	AYUDANTE	PRESTACION DE SERVICIOS
JOSE DUBERNEY VILLAREAL CUERVO	12241157	AYUDANTE	PRESTACION DE SERVICIOS

WILSON JAVIER VILLARREAL CUERVO	1080931990	OFICIAL	PRESTACION DE SERVICIOS
CARLOS ALBERTO LOPEZ CHAUX	1007361202	OFICIAL	PRESTACION DE SERVICIOS

14. RELACIÓN DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA
ANTICIPO	2024001265	23 DE OCTUBRE DE 2024

15. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON	$480,000	$375,000	$73,100	$60.000	$0	9483496335	27/03/2025
WILSON REINALDO PARRA TOVAR	$227.800	$178.000	$99.100	$57.000	$71.300	32882186	26/03/2025
LIZETH NAIROBY LUNA CUELLAR	$227.800	$178.000	$99.100	$57.000	$71.300	32882186	26/03/2025
ADRIAN DIYER CHALA MEDINA	$227.800	$178.000	$99.100	$57.000	$71.300	32882186	26/03/2025
LUIS MIGUEL CORREA ORTIZ	$227.800	$178.000	$99.100	$57.000	$71.300	32882186	26/03/2025
YONEISON CORREA ORTIZ	$227.800	$178.000	$99.100	$57.000	$71.300	32882186	26/03/2025
SEBASTIAN ESPAÑA ARDILA	$227.800	$178.000	$99.100	$57.000	$71.300	32882186	26/03/2025
JONATHAN ESPAÑA MEDINA	$227.800	$178.000	$99.100	$57.000	$71.300	32882186	26/03/2025
LEONARDO GOMEZ QUINAYAS	$227.800	$178.000	$99.100	$57.000	$71.300	32882186	26/03/2025
WILMAR SANTIAGO IDROBO CLAROS	$227.800	$178.000	$99.100	$57.000	$71.300	32882186	26/03/2025
JOSE DUBERNEY VILLAREAL CUERVO	$227.800	$178.000	$99.100	$57.000	$71.300	32882186	26/03/2025
WILSON JAVIER VILLARREAL CUERVO	$227.800	$178.000	$99.100	$57.000	$71.300	32882186	26/03/2025
CARLOS ALBERTO LOPEZ CHAUX	$227.800	$178.000	$99.100	$57.000	$71.300	32882186	26/03/2025

16. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

Póliza legalización del CONTRATO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-101051701	0	02/11/2023	Cumplimiento del contrato	02/11/2023	02/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	02/11/2023	02/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/11/2023	02/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-101018824	0	02/11/2023	02/11/2023	02/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-101051701	1 Y 2	20/11/2023	Cumplimiento del contrato	02/11/2023	02/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	02/11/2023	02/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/11/2023	02/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-101018824	1 Y 2	20/11/2023	02/11/2023	02/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION No. 1 - ACTA DE REINICIO No. 1:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-101051701	3 Y 4	20/11/2023	Cumplimiento del contrato	16/11/2023	16/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	16/11/2023	16/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/11/2023	16/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)

SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-101018824	3,4 Y 5	02/10/2024	16/11/2024	20/11/2024

Póliza actualizada x OTROSI MODIFICATORIO No.2

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-101051701	5, 6 Y 7	18/11/2024	Cumplimiento del contrato	16/11/2023	20/06/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	16/11/2023	02/06/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/11/2023	20/12/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-101018824		18/11/2024	16/11/2024	20/11/2024

Póliza actualizada x OTROSI MODIFICATORIO No.3

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-101051701	8	19/12/2024	Cumplimiento del contrato	16/11/2023	25/07/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	16/11/2023	25/07/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/11/2023	25/01/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días	


POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-101018824	8	19/12/2024	16/11/2024	25/07/2025

Póliza actualizada x OTROSI MODIFICATORIO No.4						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-101051701	9	21/01/2025	Cumplimiento del contrato	16/11/2023	25/09/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	16/11/2023	25/09/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/11/2023	30/03/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN		VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-101018824	6, 7	21/01/2025		16/11/2024	25/06/2025

17. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

(Describir el contenido del plano)

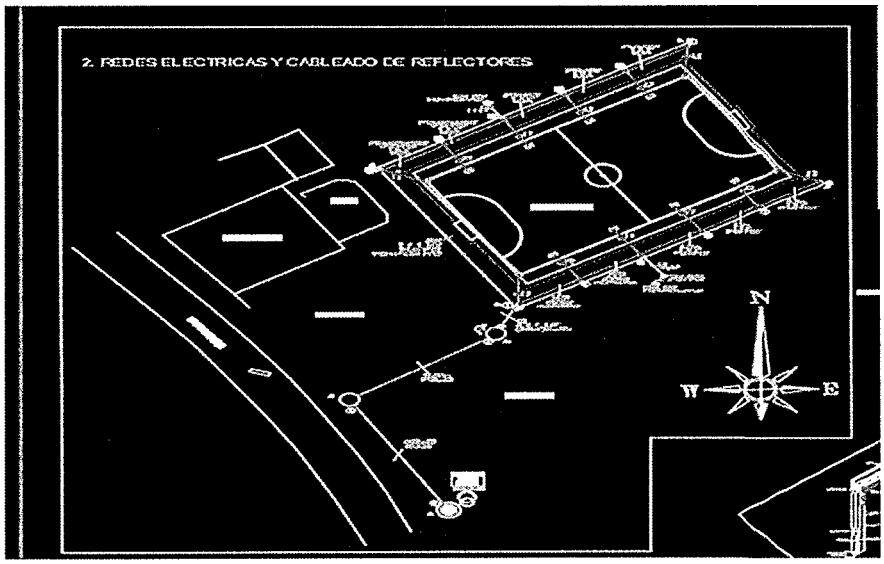

ESQUEMA 1. Concreto Ciclopeo - 2500 PSI (175 KG/CM2) 60% Concreto 2500 PSI + 40% Piedra media zonga

18. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

	CONDICIONES CONTRACTUALES					EJECUCIÓN DE OBRA MENSUAL			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR		CANT	% EJECUCION
1	**Preliminares**									
1.1	Localización y replanteo.	M2	900.42	$ 3,558.00	$ 3,203,694.00		$ -	0.00000000000000%	900.42	0.63903891558605%
1.2	Corte de Placa de concreto e= 0.10 mts.	ML	157.80	$ 26,280.00	$ 4,146,984.00		$ -	0.00000000000000%	74.90	0.39262997912720%
1.3	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	108.84	$ 116,723.00	$ 12,704,131.00		$ -	0.00000000000000%	108.84	2.53408537073239%
1.4	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	217.73	$ 46,003.00	$ 10,016,233.00		$ -	0.00000000000000%	217.73	1.99793197308395%
1.5	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	201.44	$ 83,849.00	$ 16,890,543.00	39.44	$ 3,307,005.00	0.65964629862829%	201.44	3.36914645480485%
1.06 NP	Relleno, crudo de rio para filtrar y compactar, mecanicamente.	M3	54.49	$ 127,780.00	$ 6,962,732.00		$ -	0.00000000000000%	54.49	1.38885196488688%
1.07 NP	Filtro en tuberia de drenaje de 4" PVC perforada	ML	94.50	$ 138,014.00	$ 13,042,323.00		$ -	0.00000000000000%	94.50	2.60154432559508%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 66,966,640.00**		**$ 3,307,005.00**			
2	**CIMENTACIÓN**									
2.1	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	16.40	$ 34,012.00	$ 557,797.00		$ -	0.00000000000000%	16.40	0.11126343214962%

2.2	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	34.56	$ 619,063.00	$ 21,394,817.00		$ -	0.00000000000000%	34.56	4.26761128086578%
2.3	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	2,462.20	$ 7,116.00	$ 17,521,015.00		$ -	0.00000000000000%	2462.20	3.49490632550016%
2.4	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño,	M3	12.20	$ 742,041.00	$ 9,052,900.00		$ -	0.00000000000000%	12.20	1.80577651889006%
2.5	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación.	KG	1,257.66	$ 7,116.00	$ 8,949,509.00	154.28	$ 1,097,856.00	0.21898867610628%	1257.66	1.78515317829593%
2.6	Concreto Ciclopeo - 2500 PSI (175 KG/CM2) 60% Concreto 2500 PSI + 40% Piedra media zonga	M3	76.03	$ 360,003.00	$ 27,371,028.00		$ -	0.00000000000000%	76.03	5.45968249514324%
2.07 NP	Suministro e instalacion de plastico negro 3,5 impermehabilizacion.	M2	138.72	$ 15,257.00	$ 2,116,451.00		$ -	0.00000000000000%	138.72	0.42216720820747%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 86,963,517.00**		**$ 1,097,856.00**			
3	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**									
3.1	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	17.04	$ 920,829.00	$ 15,690,926.00		$ -	0.00000000000000%	17.04	3.12985957322421%
3.2	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	3,894.25	$ 7,116.00	$ 27,711,483.00		$ -	0.00000000000000%	3894.25	5.52759284925504%
3.3	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.	M3	19.37	$ 1,004,876.00	$ 19,464,448.00	19.37	$ 19,464,448.00	3.88256173729484%	19.37	3.88256173729484%
3.4	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	2,348.55	$ 7,116.00	$ 16,712,282.00	1348.55	$ 9,596,282.00	1.91416459965837%	2348.55	3.33358884033502%
3.5	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	65.80	$ 40,347.00	$ 2,654,833.00	65.80	$ 2,654,833.00	0.52955794198262%	65.80	0.52955794198262%

	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 82,233,972.00**		**$ 31,715,563.00**			
4	**CUBIERTA**									
4.1	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	845.53	$ 211,559.00	$ 178,879,481.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 178,879,481.00**		**$**			
5	**ACABADOS - PLACA EN CONCRETO**									
5.1	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	307.11	$ 14,798.00	$ 4,544,614.00	0	$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
5.2	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	0.00	$ 3,710,773.00	$ -		$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
5.3	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	140.28	$ 73,943.00	$ 10,372,724.00	0	$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
5.4	Cuneta en concreto de 3.000psi, segun diseño	ML	69.80	$ 83,852.00	$ 5,852,870.00	0	$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
5.05 NP	Mantenimiento de cancha multifuncional Futbol de Salón, Baloncesto, incluye pintura, mallas, demarcado y logos.	UND	2.00	$ 736,291.00	$ 1,472,582.00	0.00	$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 22,242,790.00**		**$ -**			
6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**									
6.1	Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	49.60	$ 80,145.00	$ 3,975,192.00	0	$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%

6.2	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.	ML	23.68	$ 107,091.00	$ 2,535,915.00	0	$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
6.3	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	24.00	$ 219,053.00	$ 5,257,272.00	0.00	$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
6.4	Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	2.00	$ 349,989.00	$ 699,978.00	0.00	$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
6.5	Construcción de filtros laterales externos en un ancho de 0,40 mts, con altura variable menor a 0,50 mts, recubrimiento en geotextil no tejido NT-1600, con gravilla común o triturado de 1 1/2" a 4"+ tubería PVC drenaje de 6"	ML	91.04	$ 63,617.00	$ 5,791,692.00	0	$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 18,260,049.00**		**$ -**			
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**									
7.1	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	3.00	$ 638,903.00	$ 1,916,709.00	3.00	$ 1,916,709.00	0.38232479158560%	3.00	0.38232479158560%
7.2	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	16.24	$ 46,003.00	$ 747,089.00	0	$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.3	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	ML	29.00	$ 49,342.00	$ 1,430,918.00		0	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.4	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2.00	$ 304,503.00	$ 609,006.00		0	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.5	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	2.00	$ 282,276.00	$ 564,552.00		0	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
7.6	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1.00	$ 1,016,827.00	$ 1,016,827.00		0	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%

7.7	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1.00	$ 4,701,216.00	$ 4,701,216.00		0	0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%
7.8	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 AL ser8000 + 1x8 CU.	ML	12.00	$ 88,535.00	$ 1,062,420.00		0	0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%
7.9	Suministro e instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12.00	$ 368,969.00	$ 4,427,628.00		0	0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%
7.10	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	64.00	$ 58,153.00	$ 3,721,792.00		0	0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%
7.11	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12.00	$ 1,018,790.00	$ 12,225,480.00		0	0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%
7.12	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1.00	$ 975,015.00	$ 975,015.00		0	0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%
7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	1.00	$ 1,035,368.00	$ 1,035,368.00		0	0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%
7.14	Excavación, hincada y plomada de postes de concreto de 8 mts x 510 kg armado y centrifugado.	UND	2.00	$ 2,252,908.00	$ 4,505,816.00	2	4505816	0.898772407873622%	2.00	0.898772407873622%
7.15	Vestida de estructura de retencion en baja tensiòn con grapa de retencion para cable trenzado y percha de gancho abierto.	UND	1.00	$ 340,951.00	$ 340,951.00		0	0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%
7.16	Vestida de estructura de retención doble en baja tensión con dos grapas de retención para cable trenzado con perno de gancho abierto y percha de gancho abierto para sujeción de la red trenzada.	UND	1.00	$ 236,067.00	$ 236,067.00		0	0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%
7.17	Vestida de estructura de retención en baja tensión con grapa de retención para cable trenzado y perno de gancho abierto.	UND	1.00	$ 340,951.00	$ 340,951.00		0	0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%
7.18	Tendido y tensionado en conductor trenzado de aluminio aislado 2x35 mm + 50 mm tipo PE-XLPE - 600 VAC.	ML	55.00	$ 46,080.00	$ 2,534,400.00		0	0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%


	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 42,392,205.00**		**$ 6,422,525.00**			
8	TRANSPORTE									
8.1	Transporte de materiales petreos	M3-Km	3,083.07	$ 1,100.00	$ 3,391,377.00			0.000000000000000%	3083.07	0.676475930729799%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 3,391,377.00**		**$**			
% AVANCE DE OBRA								**8.486016453129620%**		**48.630523535043300%**


NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON
DIRECTOR DE OBRA

JAVIER HUMBERTO GIRALDO JIMÉNEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

19. REGISTRO FOTOGRAFICO

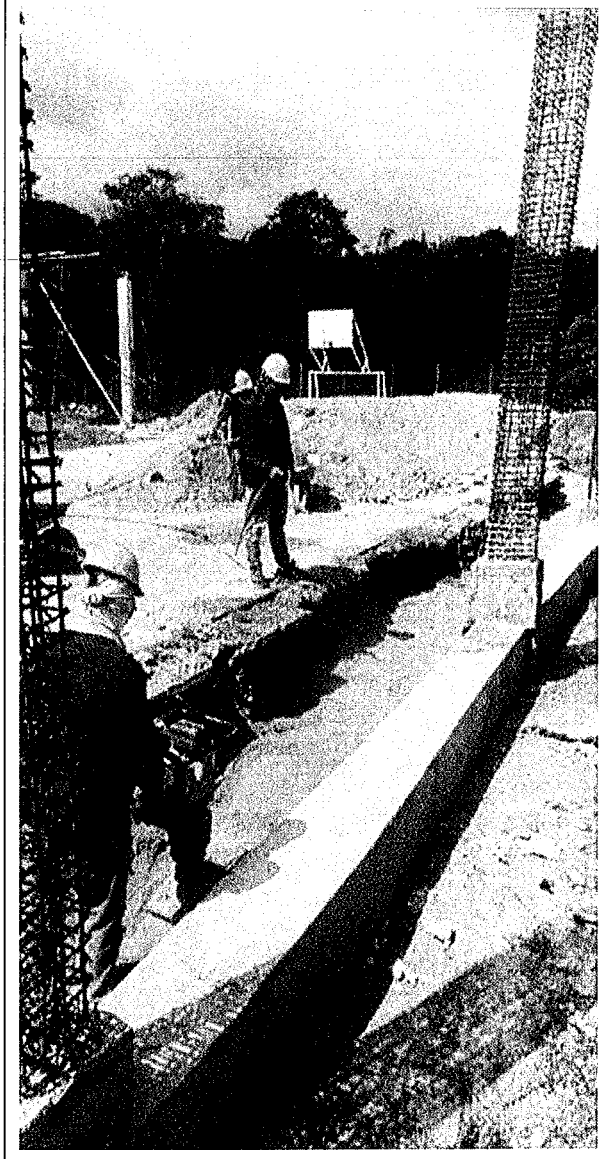


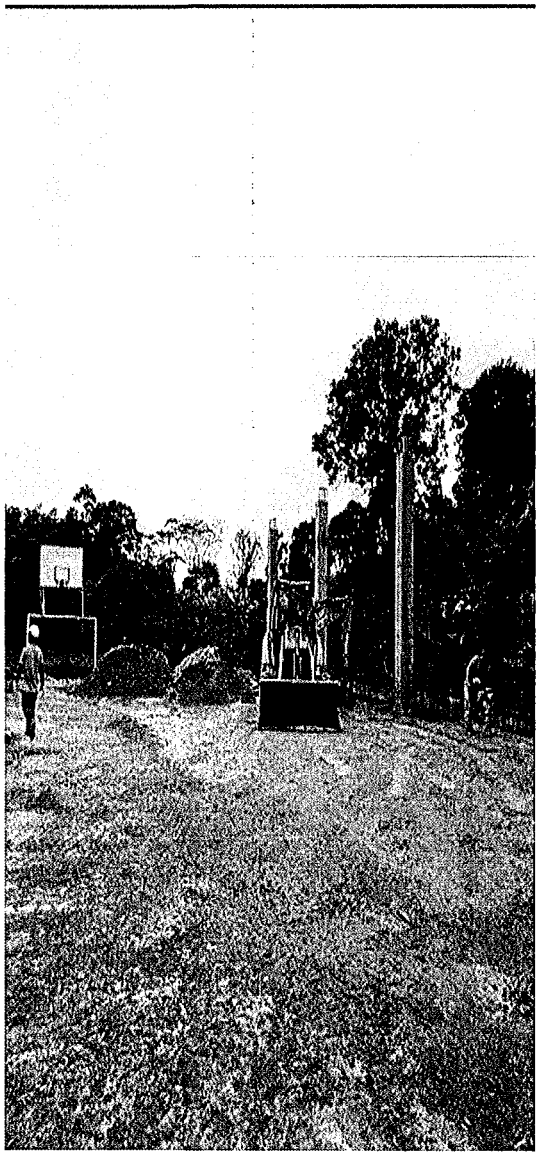


ILUSTRACIÒN 3 y 4. Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.




ILUSTRACIÒN 5 y 6 . Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación.

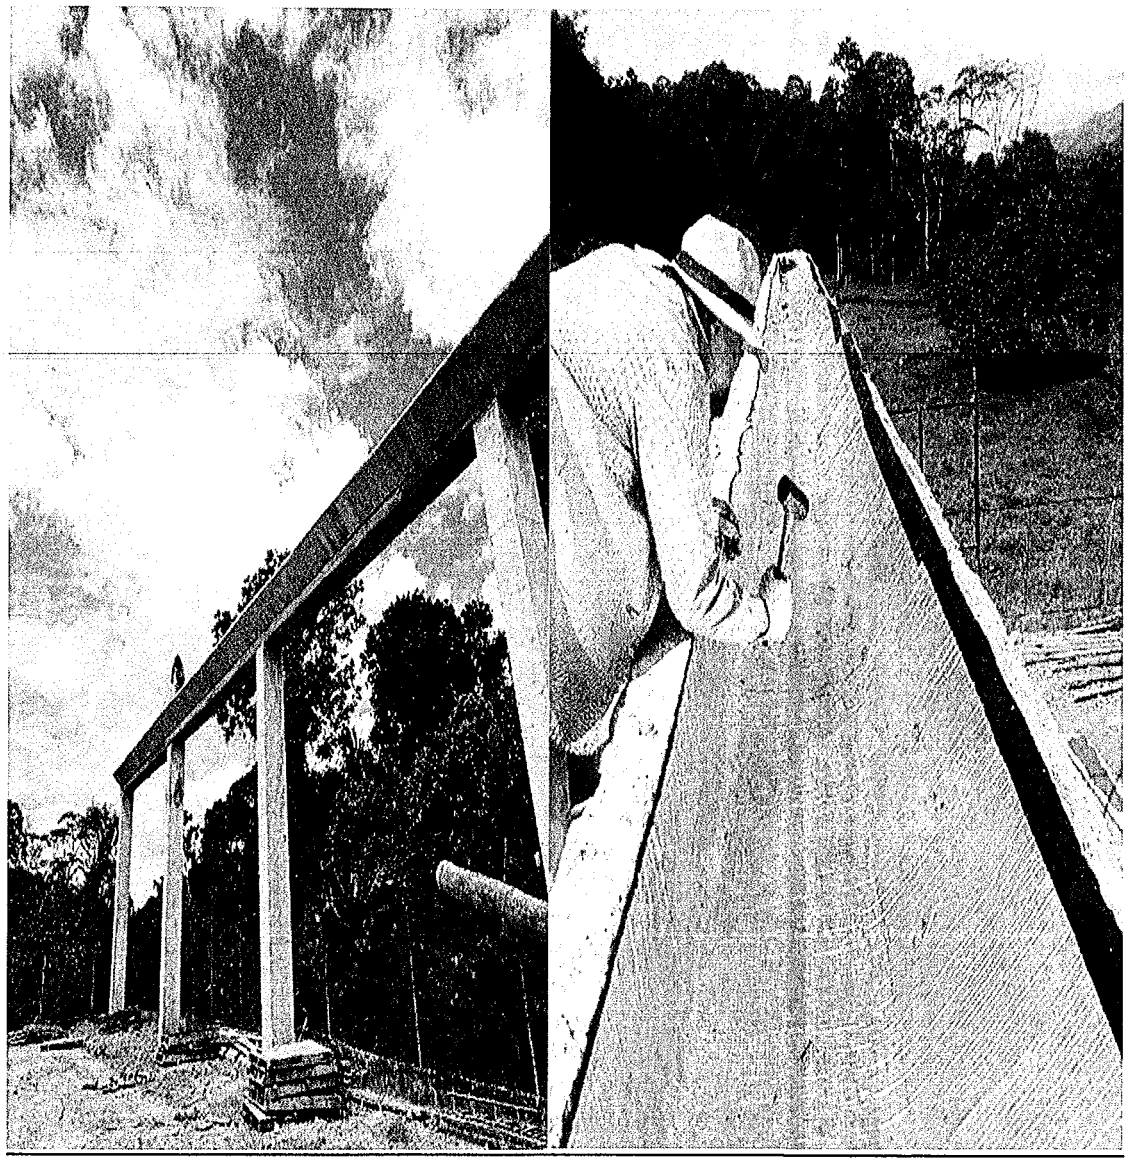


ILUSTRACIÒN 7 y 8. Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2- 3000 PSI. Incluye impermeabilización.

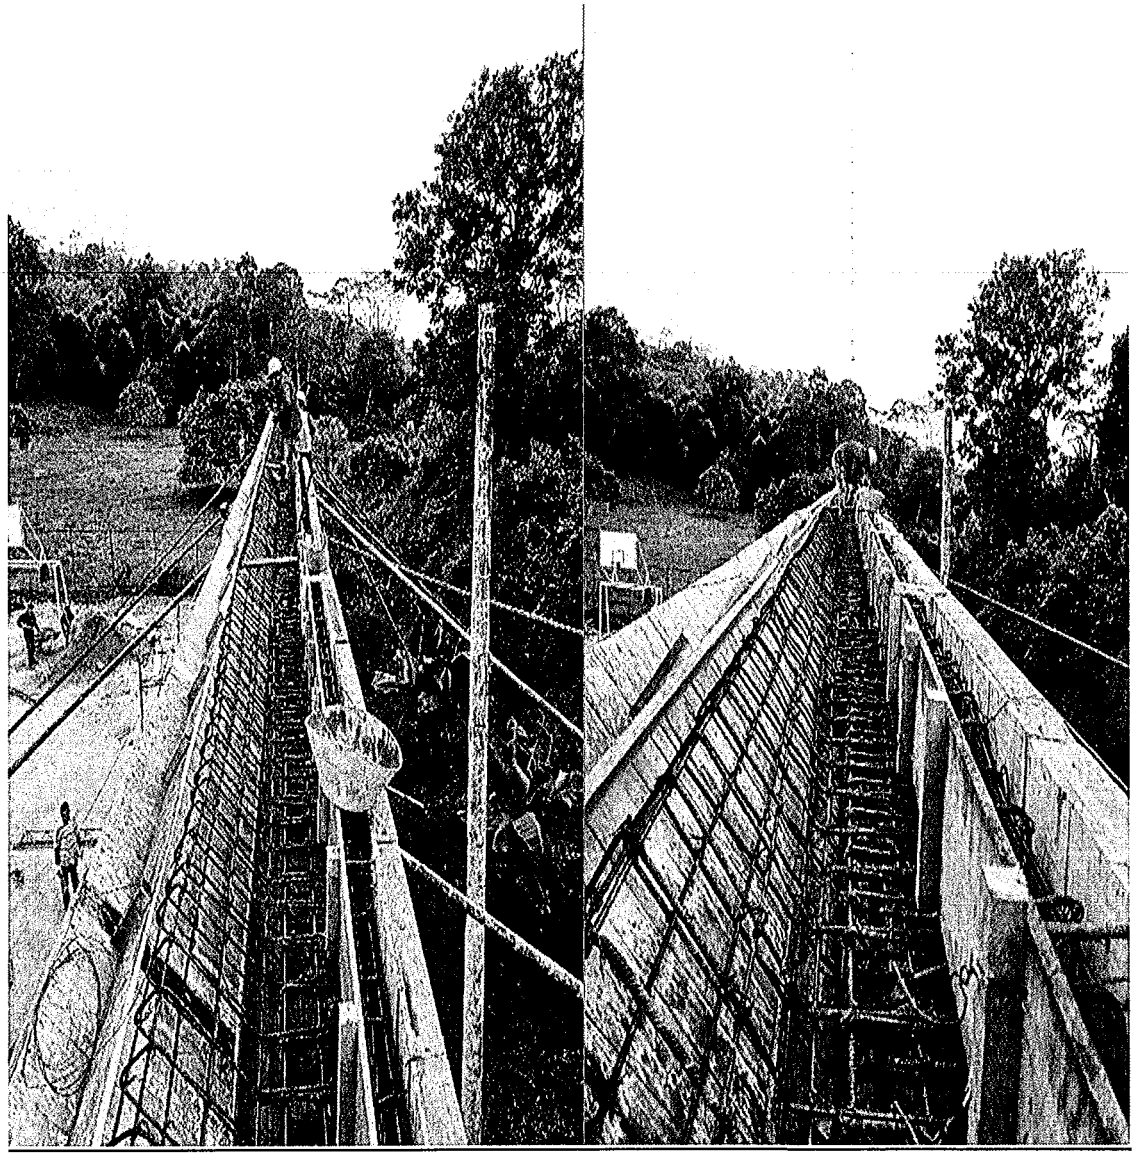


ILUSTRACIÒN 9 y 10. Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal

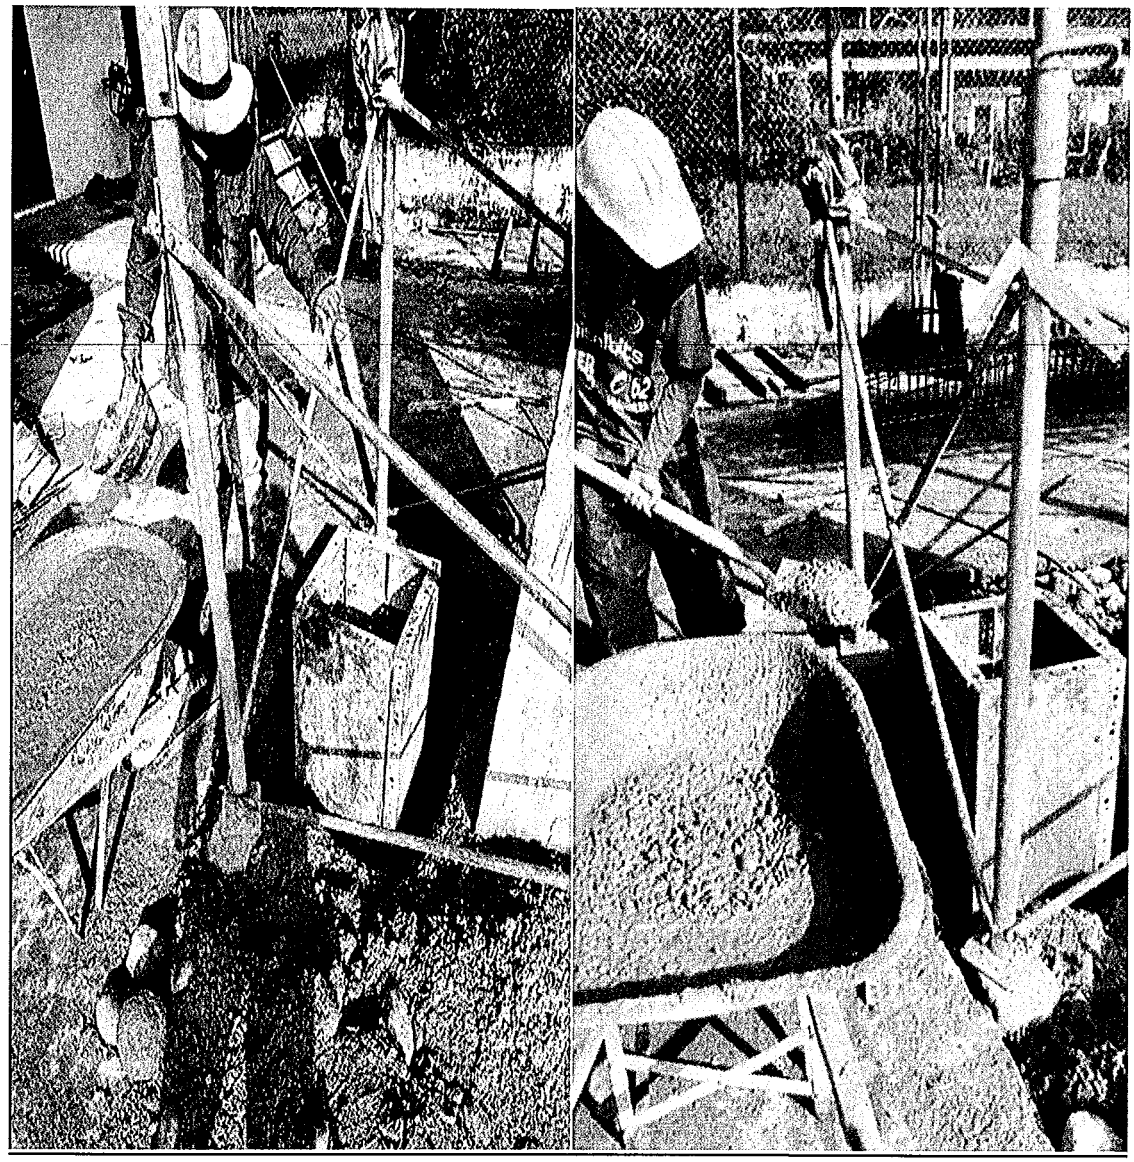

ILUSTRACIÒN 11 y 12. Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.

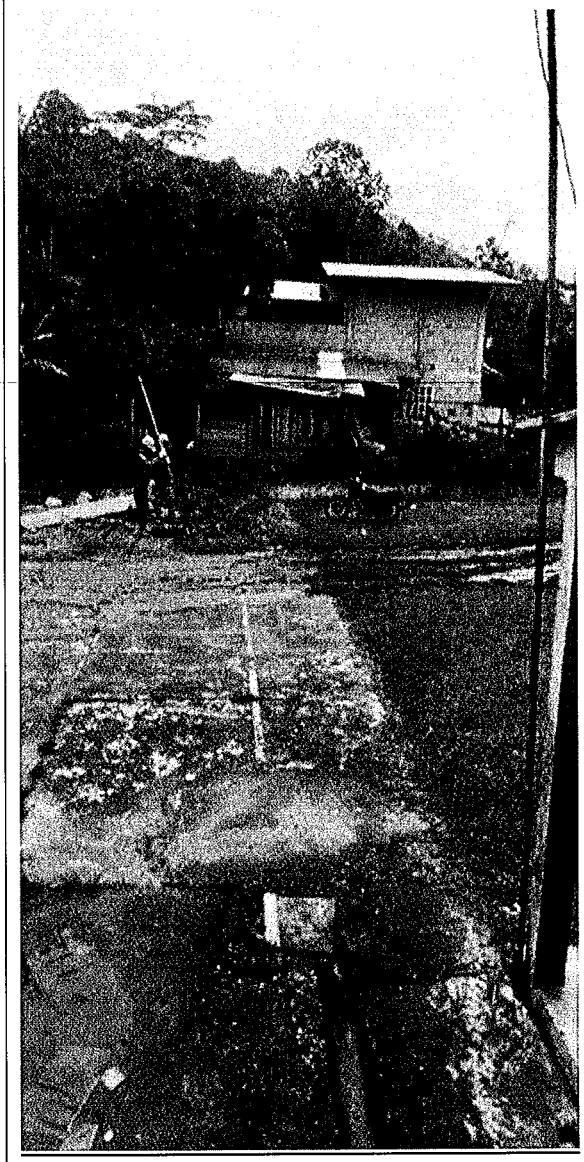

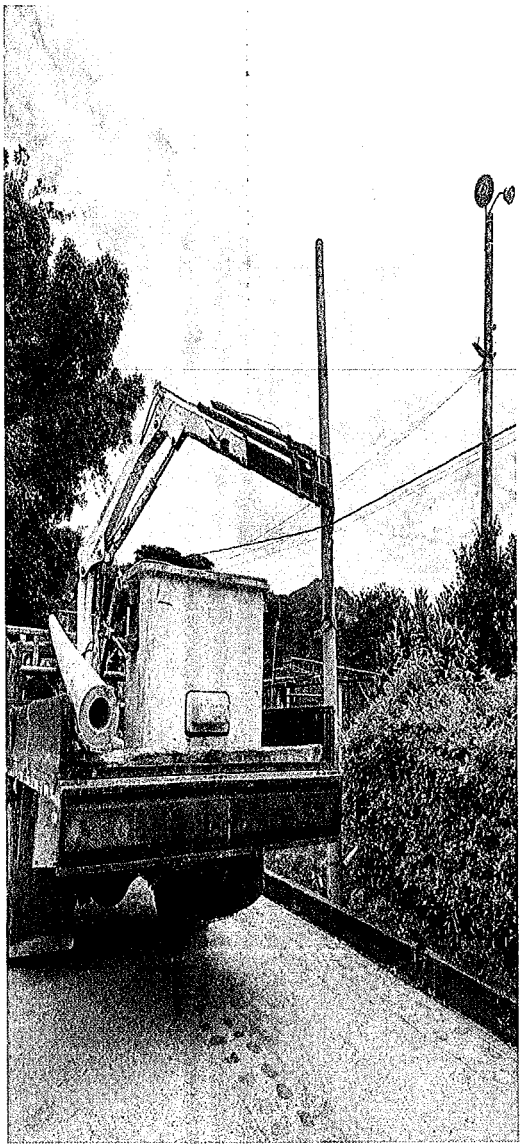

ILUSTRACIÒN 13 y 14. Excavación, hincada y plomada de postes de concreto de 8 mts x 510 kg armado y centrifugado.

20. ANEXOS

- INFORME HSEQ.
- ACTAS DE COMITÉS.
- BITACORA DE OBRA.
- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP).
- CERTIFICADO VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA REALIZADO POR EL INTERVENTOR (Vo.Bo. Interventor).
- CORRESPONDENCIA GENERADA DURANTE EL PERIODO.

ING. HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON	(07/03/2025)	ING. PAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
FIRMA ORIGINAL **DIRECTOR DE OBRA**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**

ACTA DE COMITÉ

Dirección: Cra. 3 w N. 64-37 Barrio Chicalá
Email: consorciocivilheinder@gmail.com
Teléfonos: 3187167087
Ciudad: Neiva Huila

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F02
Fecha Aprobación: 13/02/2023	ACTA COMITÉ DE OBRA	Versión: 2

Nombre Proyecto		"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMANETO DEL HUILA"		Acta No.	
No. De Contrato obra		CLPIH 401 DEL 2023	Lugar:	VEREDA PANTANOS (TIMANA HUILA)	
No. De Contrato Interventoría		CIHCM 420 - 2023			
Fecha	07 DE FEBRERO 2025	Hora Inicio	2: PM	Hora Final	5:PM

OBJETO DE LA REUNION
EVALUAR EL ESTADO Y AVANCE DE LA OBRA

AGENDA	
	1-Verificar el avance de la fundición de las columna
	2- Verificar conexiones de los filtros de tubería perforada entre ejes
	3- Compromisos

DESARROLLO

- Se inicia la fundición de columnas para el eje A, verificación de dosificación, agregados, espaciamiento entre estribos, nuevamente con un porcentaje en el avance más significativo, aun, cuando seguimos teniendo dificultades por temas de las lluvias.

- Se realizo compactación de la excavación entre ejes del filtro.

- Se inicia el desprecie del acero para las vigas corona eje B, actividad que podemos ir desarrollando, ya que esta es bajo techo, debido a las altas precipitaciones no se ha podido realizar la compactación manual, y/o mecánica

DESARROLLO

TAREAS – COMPROMISOS – TEMAS PROXIMAS REUNIONES			
Tema	**Tarea**	**Responsable**	**Fecha de Control**
1	Finiquitar las columnas del eje A		
2	Iniciar el armado la estructura de para encofrado de la viga corona		
3	Terminar la Compactación mecánica		

EN CONSTANCIA FIRMAN EL ACTA:		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Heiman Jose Trujillo	Director	
Wilson Parra	Residente	
JAVIER GRAJALES.	RESIDENTE INTERVENTORIA.	

Nombre Proyecto		***"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMANETO DEL HUILA"***		**Acta No.**	
No. De Contrato obra		CLPIH 401 DEL 2023	**Lugar:**	VEREDA PANTANOS (TIMANA HUILA)	
No. De Contrato Interventoría		CIHCM 420 - 2023			
Fecha	14 DE FEBRERO 2025	**Hora Inicio**	2: PM	**Hora Final**	5:PM

OBJETO DE LA REUNION
Socializar el avance de la obra

AGENDA	
	1- Verificar la fundición de las columnas
	2- Verificar el amarrado y despiece de las canastas de las vigas corona
	3- Compromisos

DESARROLLO

- Se logra avanzar en la fundición de las columnas, aunque no es suficiente y aunque es entendible por las condiciones del estado del clima, se determina iniciar labores extras con el fin de lograr un avance mas coherente

- Se programa el armado de la estructura para el encofrado de la viga.

- Contratar maquinaria con el fin de que nos ayude a compactar el recebo faltante y de esta manera empezar encofrado de vigas para los dos ejes

DESARROLLO

TAREAS – COMPROMISOS – TEMAS PROXIMAS REUNIONES			
Tema	**Tarea**	**Responsable**	**Fecha de Control**
1	Finalización de columnas, y compactación eje A		
2	Iniciar las formaletas del eje A		
3	Terminar la Compactación mecánica		

EN CONSTANCIA FIRMAN EL ACTA:		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Heinan Jose Trujillo C.	Director	
Wilson Parra	Residente	
Jhon Cadoo	Residente Interventoria	

Nombre Proyecto		***"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMANETO DEL HUILA"***		**Acta No.**	
No. De Contrato obra		CLPIH 401 DEL 2023	**Lugar:**	VEREDA PANTANOS (TIMANA HUILA)	
No. De Contrato Interventoría		CIHCM 420 - 2023			
Fecha	21 DE FEBRERO 2025	**Hora Inicio**	2: PM	**Hora Final**	5:PM

OBJETO DE LA REUNION
VERIFICAR QUE LAS TAREAS SE HAYAN CUMLIDO A CABALIDAD

AGENDA	
	1- Cuantificar cuantas columnas quedan por fundir
	2- Verificar que las estructuras de los dos ejes hayan empezado para encofrar
	3- Compromisos

DESARROLLO

- Se logro establecer que las columnas del eje A, ya están fundidas, que el armado de las formaletas para encofrar las vigas ya está listo, por lo que se procederá a realizar encofrado y armado de las vigas, ganchos de aletas, programar el concreto premezclado para tener un mejor avance en las vigas coronas

- Se verifico que la maquinaria hizo presencia y realizo la compactación mecánica, del recebo, con estas indicaciones se establece dos frentes de trabajo para sacar las vigas al mismo tiempo

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F02
Fecha Aprobación: 13/02/2023	ACTA COMITÉ DE OBRA	Versión: 2

DESARROLLO

TAREAS – COMPROMISOS – TEMAS PROXIMAS REUNIONES			
Tema	**Tarea**	**Responsable**	**Fecha de Control**
1	Fundir las vigas coronas con concreto premezclado		
2	Desencofrar aletas, e impermeabilizar las vigas		
3	Programar la instalación de cubierta		

EN CONSTANCIA FIRMAN EL ACTA:		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Heinan Jose Trujillo	Director	
Wilson Parra	Residente	
JAVIER GRADO.	RESIDENTE INTERVENTORIA	

Nombre Proyecto		***"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMANETO DEL HUILA"***		**Acta No.**	
No. De Contrato obra		CLPIH 401 DEL 2023	**Lugar:**	VEREDA PANTANOS (TIMANA HUILA)	
No. De Contrato Interventoría		CIHCM 420 - 2023			
Fecha	28 DE FEBRERO 2025	**Hora Inicio**	2: PM	**Hora Final**	5:PM

OBJETO DE LA REUNION
Solicitar suspensión de obra, debido a demora en la cubierta por múltiples factores, además de los altos niveles de lluvias que afectan al sur del país

AGENDA	
	1- Verificar solicitud de suspensión
	2- Socializar el estado de la viga después de la fundición e impermeabilización
	3- Compromisos

DESARROLLO

- Se eleva una solicitud de suspensión temporal de obra debido a retrasos en la llegada de la cubierta, ola invernal que azota a la región, y por temas de paros por diferentes agremiaciones en este caso puntual la del arroz

- Después de fundidas las vigas con el concreto premezclado, se realiza el desencofrado y su impermeabilización, también la instalación de los dos postes para la cubierta de pantanos

DESARROLLO

TAREAS – COMPROMISOS – TEMAS PROXIMAS REUNIONES			
Tema	**Tarea**	**Responsable**	**Fecha de Control**
1	Realizar seguimiento a la solicitud de suspensión		
2	Instalación de cubierta autoportante		
3	Programar las conexiones eléctricas		

EN CONSTANCIA FIRMAN EL ACTA:		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Heinan Jose Trujillo C	Director	
Wilson Para	Residente	
JAVIER GRADO	RESIDENTE INTERVENTORIA	

SEGURIDAD SOCIAL

Dirección: Cra. 3 w N. 64-37 Barrio Chicalá
Email: consorciocivilheinder@gmail.com
Teléfonos: 3187167087
Ciudad: Neiva Huila

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 32882186
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-03-26

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO CIVIL H&E	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901767013	D.V.	6	TIPO DE APORTANTE	A mayor o igual a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 3W 64 37	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	HERNANTRUJILLO@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	31716770
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	79944179	PRIMER APELLIDO	TRUJILLO	SEGUNDO APELLIDO	CALDERON
PRIMER NOMBRE	HERNAN	SEGUNDO NOMBRE	JOSE		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 02	Año: 2025	Mes: 03	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
12		$17.082.000		32882186

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1080933023	01	No	No	No	41	807	5411101	Fijo	CHALA MEDINA DIYER ADRIAN	$1.423.500
CC-1084251953	01	No	No	No	41	807	5411101	Fijo	CORREA ORTIZ LUIS MIGUEL	$1.423.500
CC-1004440666	01	No	No	No	41	807	5411101	Fijo	CORREA ORTIZ YONEISON	$1.423.500
CC-1083876435	01	No	No	No	41	807	5411101	Fijo	ESPAÑA ARDILA SEBASTIAN	$1.423.500
CC-1080935714	01	No	No	No	41	807	5411202	Fijo	ESPAÑA MEDINA JONATHAN	$1.423.500
CC-1004208423	01	No	No	No	41	807	5411101	Fijo	GOMEZ QUINAYAS LEONARDO	$1.423.500
CC-1004034509	01	No	No	No	41	807	5411101	Fijo	IDROBO CLAROS WILMAR SANTIAGO	$1.423.500
CC-1007361202	01	No	No	No	41	1	5411101	Fijo	LOPEZ CHAUX CARLOS ALBERTO	$1.423.500
CC-1077862501	01	No	No	No	41	807	5429001	Fijo	LUNA CUELLAR LIZETH NAIROBY	$1.423.500
CC-79500020	01	No	No	No	41	807	5429001	Fijo	PARRA TOVAR WILSON REINALDO	$1.423.500
CC-12241157	01	No	No	No	41	807	5429001	Fijo	VILLAREAL CUERVO JOSE DUBERNEY	$1.423.500
CC-1080931990	01	No	No	No	41	807	5411101	Fijo	VILLARREAL CUERVO WILSON JAVIER	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1080933023																													0		
CC - 1084251953	X	2025-02-01																											0		
CC - 1004440666																													0		
CC - 1083876435																													0		
CC - 1080935714																													0		
CC - 1004208423																													0		
CC - 1004034509																													0		
CC - 1007361202	X	2025-02-01																											0		
CC - 1077862501																													0		
CC - 79500020																													0		
CC - 12241157																													0		
CC - 1080931990	X	2025-02-01																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1080933023	COLFONDOS	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1084251953	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1004440666	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1083876435	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1080935714	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1004208423	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1004034509	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1007361202	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1077862501	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 79500020	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 12241157	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1080931990	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1080933023	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4290	0.0696000	$99.100
CC - 1084251953	SANITAS	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4290	0.0696000	$99.100
CC - 1004440666	SANITAS	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4290	0.0696000	$99.100
CC - 1083876435	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4290	0.0696000	$99.100
CC - 1080935714	ESSC ASMET SALUD	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4290	0.0696000	$99.100
CC - 1004208423	EPS-S CAPITAL	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4290	0.0696000	$99.100
CC - 1004034509	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4290	0.0696000	$99.100
CC - 1007361202	ESSC ASMET SALUD	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4290	0.0696000	$99.100
CC - 1077862501	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4290	0.0696000	$99.100
CC - 79500020	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4290	0.0696000	$99.100

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 12241157	ESSC ASMET SALUD	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4290	0.0696000	$99.100
CC - 1080931990	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4290	0.0696000	$99.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1080933023	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1084251953	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004440666	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1083876435	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1080935714	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004208423	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004034509	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007361202	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1077862501	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-79500020	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12241157	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1080931990	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 02

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	5	$1.139.000	$0	$0	$0	$0	21	$15.000	$0	$0	$1.154.000
COLPENSIONES	4	$911.200	$0	$0	$0	$0	21	$12.000	$0	$0	$923.200
PROTECCION	2	$455.600	$0	$0	$0	$0	21	$6.000	$0	$0	$461.600
COLFONDOS	1	$227.800	$0	$0	$0	$0	21	$3.000	$0	$0	$230.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
ESSC ASMET SALUD	3	$534.000	$0	0	$0	0	$0	$534.000	21	$7.100	$0	$541.100	$0	0	$0	$0	$541.100	$0	$0	$541.100
EPS-S CAPITAL	1	$178.000	$0	0	$0	0	$0	$178.000	21	$2.400	$0	$180.400	$0	0	$0	$0	$180.400	$0	$0	$180.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	$534.000	$0	0	$0	0	$0	$534.000	21	$7.100	$0	$541.100	$0	0	$0	$0	$541.100	$0	$0	$541.100
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$534.000	$0	0	$0	0	$0	$534.000	21	$7.100	$0	$541.100	$0	0	$0	$0	$541.100	$0	$0	$541.100
SANITAS	2	$356.000	$0	0	$0	0	$0	$356.000	21	$4.700	$0	$360.700	$0	0	$0	$0	$360.700	$0	$0	$360.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	12	$1.189.200	0	$0	$0	$1.189.200	21	$15.700	$1.204.900	0	$0	$12.049	$1.204.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$684.000	21	$9.000	$693.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SENA	12	$342.000	21	$4.500	$346.500
ICBF	12	$513.600	21	$6.800	$520.400
ESAP	0	$0	21	$0	$0
MinEdu	0	$0	21	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	$2.164.400
PENSIONES	4	$2.769.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.204.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$693.000
SENA	1	$346.500
ICBF	1	$520.400
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$7.698.800

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79944179		TRUJILLO CALDERON HERNAN JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 3 W N 64 37	NEIVA-HUILA	8601919	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1364487410	9483496335	I	2025/03/19	2025/03/27	BANCOLOMBIA	8	$993,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$2,500	$0	$482,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$480,000	$2,500	$0	$482,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$73,100	$400	$0	$73,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$73,100	$400	$0	$73,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,000	$400	$0	$60,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$60,000	$400	$0	$60,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$1,900	$0	$376,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$375,000	$1,900	$0	$376,900
TOTAL				1	$988,100	$5,200	$0	$993,300

2025/03/27 08:29 AM

Consorcio Civil H&E
NIT. 901.767.013-6

BITACORA

Dirección: Cra. 3 w N. 64-37 Barrio Chicalá
Email: consorciocivilheinder@gmail.com
Teléfonos: 3187167087
Ciudad: Neiva Huila

Timana Huila, 31 enero de 2025

Hora 7:00 am Hora Final 5:00pm.

Clima soleado

Personal en obra ing residente, oficiales ayudantes SISO

Herramientas y equipos.

Se acaban de amarra los traslapes faltantes de las vigas.

Wilson Parra.

Residente inter.

Timana Huila 1 Feb de 2025

Hora inicial 7:am Hora Final. 5:Pm.

Clima Frio

Personal en obra. ing residente, oficiales ayudantes

Herramientas y equipos

Se empieza amarrar estribos de columnas eje A.

Wilson Parra

Residente inter.

Timana Huila 3 Febrero 2025.

Hora inicial 7:am Hora Final. 5:Pm.

Clima soleado

Personal en obra ing residente, oficiales ayudantes SISO

Se continua con el armado de canastas para las columnas eje A.

Wilson Parra.

Residente inter.

Timana Huila 4 Febrero 2025.

Hora inicial 7:00 am Hora Final 5 Pm
Clima lluvioso, lluvias Tenues.
Personal en obra, ing residente, ayudantes
Oficiales.
Herramientas y equipos.
Se continuan amarrando columnas eje
A.

Residente Inter.

Timana Huila 5 de Febrero 2025.
Hora inicial 7:am. Hora Final 5: Pm
se encuentra un clima lluvioso
Personal en obra, ing residente, ayudantes
Oficiales
Herramientas y equipos.

se continuan Fundiendo columnas eje
B. Wilson Parra

Residente inter.

Timana Huila 6 de Febrero de 2025
Hora Inicial 7:am. Hora Final 5: Pm.
clima lluvioso,
Personal en obra, ing residente, siso
Oficiales y maestro

Se empiezan a amarrar traslapes de
Columnas para Eje A.

Wilson Parra.

Residente Inter.

Timana Huila 7 de Feb de 2025.
Hora Inicial 7:am Hora Final 5:Pm.
Clima soleado en la mañana, lluvias en horas de la tarde.
Personal en obra Ing residente, ayudantes SISO, OFicoles.
Herramientos y equipos

Se continua Figurando acero para los traslapes de las columnas

Wilson Parra. Residente Inter.

Timana Huila 8 de Febrero de 2025.
Hora Inicial 7:am. Hora Final 13:Pm.
Clima soleado
Personal en obra: Ing Residente, oficoles ayudantes, SISO
Herramientos y equipos.

Se continua Fundiendo columnas eje B.

Wilson Parra. Residente Inter.

Timana Huila 10 de Febrero de 2025
Hora Inicial 7:am Hora Final 5:Pm.
Clima lluvioso lluvias Fuertes
Personal en obra: Ing residente, oficoles ayudantes. SISO

Se inicia instalacion de traslapes de columnas eje A.

Wilson Parra. Residente Inter.

Timana Huila 11 de Febrero de 2025
Hora Inicial 7:00 am Hora Final 5: Pm
Clima lluvioso
Personal en obra ing residente, oficiales ayudantes
Herramientas y equipos

Se continua amarrando columnas eje A Estribos cada 6 cm segun Planos y Especificaciones

Wilson Parra

residente inter

Timana Huila 12 de Febrero de 2025
Hora Inicial 7:00 am Hora Final 5:00 Pm
Clima lluvioso, lluvias fuertes toda la mañana
Personal en obra ing residente; oficiales ayudantes

se recibe material de Playa Grava 3/4
se continua con el amarre de los traslapes de las columnas eje B, se empieza a compactar eje B

Wilson Parra.

residente inter.

Timana Huila Febrero 13 de 2025
Hora Inicial 7:am Hora Final 5: Pm.
Clima lluvioso, en horas de la tarde.
Personal en obra: Ing residente, oficiales ayudantes
Herramientas y equipos
Se continuan amarrando traslapes de Columnas eje A.

Wilson Parra.

residente inter

Timana Huila 14 de Febrero 2025
Hora inicial: 7:00 am Hora Final 5:00Pm.
Clima lluvioso; en horas de la mañana.
Personal en obra: Ing residente, OFICIALES
Obreros
Herramientas y equipos
llega recebo para compactar eje
A 140m3, se comienza a compactar
eje A, se desencofra columnas eje B.

Wilson Parra. Residente inter.

Timana Huila 15 de Febrero de 2025
Clima lluvioso
Hora inicial 7:am, Hora Final 17 Pm.
Personal en obra. Ing residente, OFICIALES
Obreros.
Herramientas y equipos

se realiza desencofrado de columnas
se Funde columna eje A AG,
Fundicion de Pedestales.

Wilson Parra. Residente inter.

Timana Huila 16 de Febrero 2025
Hora inicial 7:am. Hora Final 12 Pm.
Clima lluvioso; lluvias Fuertes
Toda la mañana no pudimos realizar
actividades.

Wilson Parra. Residente inter.

Timana Huila 17 de Febrero 2025
Hora Inicial 7:am Hora Final 5:Pm.
clima lluvioso en horas de la mañana
Personal en obra · Ing residente, oficiales
ayudantes,
Herramientos y equipos
se realiza fundicion de columnas
Faltantes eje B, compactacion
mecanica eje A)

Wilson PARRA.

Residente
Inter

Timana Huila 18 de Febrero de 2025
Hora Inicial 7:00 am hora Final 5:Pm.
Clima · lluvioso, lluvias Fuertes horas de la
mañana.
Personal en obra: Ing residente, oficiales
ayudantes
Herramientos y equipos.

Descofrado de columnas eje B,
compactacion mecanica eje A,
Capacitacion SISO

Wilson Parra.

Residente
Inter.

Timana Huila 19 de Febrero de 2025.
Hora Inicial 7:00 am hora Final 5:Pm
Clima lluvioso Fuertes lluvias en horas
de la mañana.
Personal en obra. Ing residente, SISO
oficiales, ayudantes
Herramientos y equipos,
se comienza a encofrar columnas ejeA
se comienza excavacion para Filtro de tuberia

Perforada de 4", conexion BG, AG
se inicia armare de canastas para
viga corona.

Wilson Parra.

Residente inter.

Timana Huila, 20 de Febrero de 2025.
Hora inicial 7:00 am Hora Final 17 Pm.
clima lluvioso, lluvias fuertes en horas
de la mañana.
Personal en obra. Ing. residente, Ayudantes
oficiales 5,50.

Se continua excavacion para filtro
en tubera perforada, continuamos
montando formaleta para columnas

Wilson Parra.

Residente inter.

Timana Huila 21 de Febrero de 2025
Hora ingreso 6.00 Am Hora Final 5 Pm.
Clima lluvioso, lluvias fuertes
Personal en obra. Ing residente,
oficiales, ayudantes
Herramientas y equipos
llegan formaletas a la obra para ar
mado de vigas corona,
Se inicia formaleteado de columnas
Pardientes eje A,

Wilson Parra.

Residente inter.

NKB

Escaneado con AnyScanner

Timana Huila 22 Febrero 2025

Hora ingreso 7:am Hora Final 12:Pm
Clima Fuertes lluvios Toda la jornada
Personal en obra, Ing residente, OFICIALES
ayudantes 5;50
Herramientas y equipos

No se Pueden realizar actividades Por
Fuertes lluvios

Wilson Parra

Residente inter

Timana Huila 24 de Febrero de 2025
Hora ingreso 7:00am Hora Final 5:Pm
clima soleado.
Personal en obra; Ing residente, OFICIALES
ayudantes
Herramientas y equipos

Se continua Fornaleteando columnas
eje A, se instala Filtro perforado
4" se tapa excavacion de Filtro; con
Crudo de Rio.

Wilson parra -

Residente inter

Timana Huila 25 de Febrero 2025
Hora ingreso 7; am hora Final 17 Pm
Se inicia el dia con un clima soleado
Personal en obra Ing residente, 5;50
OFICIALES, ayudantes
Herramientas y equipos

Se inicia a Fundir columnas eje A
compactacion mecanica eje A.

NKB

hizo Presencia la interventoria.

Wilson Parra.

Timana Huila 26 Febrero 2025.
Hora 7 am ingreso Hora Final 5: Pm.
Clima Soleado
Personal en obren ing residente, oficiales
ayudantes, SISO.
Herramientas y equipos.

Se continua fundiendo columnas.
Eje A; compactacion manual.

Wilson Parra.

Timana huila 27 febrero de 2025
Hora ingreso 7:00m Hora Final 5: Pm
Clima lluvioso, Lluvios Fuertes en
horas de la mañana.
Personal en obra. ing residente, oficiales,
ayudantes, SISO
Herramientas y equipos.

se continuan Fundiendo columnas eje A.

Wolfson Perra.

Timana Huila Feb. 28 de 2025.
Hora ingreso 7:00 am Hora Final 17 Pm.
clima lluvioso en horas de la tarde
Personal en obra: ing residente, SISO
Oficiales, ayudantes
Herramientas en obra y equipos


se Continua Fundiendo columnas eje A
Grava, arena, dosificacion 3000PSI

Wilson Parra.




Timana Huila 1 marzo de 2025.
Hora entrada 7:00 am Hora Final 17:00Pm
Clima soleado en la mañana, lluvias
Fuertes horas de la tarde
Personal en obra ing residente, oficiales
ayudantes, siso
se inicia encamillado para vigas de ex
B, llega maquina para negar recebo, pero
la lluvias no lo permitio.

Wilson Parra.



Timana Huila 3 de marzo de 2025
Hora ingreso 7:am. Hora Final 17:Pm
Clima lluvioso horas de la mañana
Personal en obra. Ing residente, Oficoles
ayudantes siso
Se realzo desencofrado de columnas
Eje D, se funde cajillos electricos

Wilson Parra.



Timana Huila 4 de marzo de 2025
Timana Huila. Hora ingreso 7:am horaFinal 5.Pm.
Clima soleado, lluvioso en horas de la tarde
Personal en obra Ing residente, oficiales
ayudantes. siso.
se realizan excavaciones para Pozos
se funde cajillos electricos
se continua armando encamillado para viga

Consorcio Civil H&E
NIT. 901.767.013-6

CORRESPONDENCIA

Dirección: Cra. 3 w N. 64-37 Barrio Chicalá
Email: consorciocivilheinder@gmail.com
Teléfonos: 3187167087
Ciudad: Neiva Huila

NIT. 901.769.619-8

CONSORCIO WF

Neiva, 24 de Febrero de 2025.

MUN.TIM. WF42023-045

Ingeniero
HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON
Representante Legal
CONSORCIO CIVIL H&E
Ciudad

REFERENCIA: *CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CLPIH401-2023, que tiene por Objeto: "CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA PANTANOS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA, DEPARTAMENTO DEL HUILA".*

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO CUB-020-2025 – EMITIDO POR CONSORCIO CIVIL H&E.

Cordial saludo,

En atención a las reiteradas solicitudes de documentación y requisitos necesarios para el adecuado desarrollo de la obra No. CLPIH401-2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ, DEPARTAMENTO DEL HUILA", se procede a realizar la revisión de la documentación entregada el día **20 de febrero de 2025.**

En primer lugar, se hace referencia al oficio que se remite en respuesta, en el cual se menciona la ejecución de actividades como el amarre de hierro

debido a las constantes lluvias. No obstante, la interventoría considera que esta medida resulta insuficiente, ya que el considerable atraso acumulado no podrá ser nivelado únicamente con estas acciones. Además, en el mismo oficio se hace referencia a la entrega de los documentos solicitados, pero no se especifica ni la cantidad de folios ni el contenido de los mismos.

La interventoría ha procedido a revisar la documentación entregada y ha observado lo siguiente:

1. Se entregan únicamente tres informes correspondientes a los períodos de septiembre, octubre y noviembre de 2024, cada uno acompañado de anexos que, en algunos casos, también se encuentran incompletos.

2. No se presentan los informes de los periodos de diciembre del 2024 y enero del 2025.

3. Para el informe de septiembre que corresponde del 24 de septiembre al 30 de septiembre del 2024:

   a) Se presentó el formato del informe, pero con escaso o nulo registro fotográfico, además de carecer de firma y fecha de presentación.

   b) Respecto a los anexos mencionados
      - Informe HSEQ: Se entregaron 3 hojas sin anexos adicionales.
      - Actas de comité: No se generaron.
      - Bitácora de obra: No fue diligenciada.
      - Planillas: Se presentan las planillas correspondientes al director, residente y SISO, pero no se incluyen las de los ayudantes ni la del operador, a pesar de haberse realizado labores dentro de la obra.

- Correspondencia: Se presentó una solicitud de cambio de residente sin la debida aprobación.

4. Para el informe de octubre que corresponde del 01 de octubre al 31 de octubre del 2024.

   a) Se presenta un cuadro sobre el estado del tiempo o clima, pero el contenido no es claro ni fácil de interpretar.

   b) Presenta un registro fotográfico de actividades sin los elementos de protección personal.

   c) Presenta el informe sin firma ni fecha de presentación.

   d) Se mencionan los siguientes anexos:
      - Informe HSEQ: Tiene un formato de numeración incorrecto, pero presenta sus anexos.
      - Presenta un diseño de mezcla de 3000psi de arena y grava de INDUCON: No se incluyen la licencia ni los permisos ambientales correspondientes. En la obra se están utilizando materiales adicionales como piedra filtro, recebo y mixto, los cuales no han sido caracterizados.
      - Comités realizados durante el período: En las actas se menciona un compromiso para realizar ajustes en detalles de acero en vigas y columnas, los cuales aún no han sido entregados.
      - Presenta ensayos de concreto de 3, 7 y 14 días, así como la caracterización de grava y arena. Sin embargo, faltan los análisis de recebo, mixto, piedra filtro y acero, junto con sus respectivas fichas técnicas.
      - Presenta la bitácora: No está registrada en la forma correspondiente, ni tiene la firma del residente o director de obra.

- Las planillas Están completas, pero hay dudas sobre la identidad del operador de la máquina y si está registrado en la planilla.
- En correspondencia presenta dos oficios enviados por la interventoría sin la debida respuesta.

5. Para el informe de noviembre que corresponde del 01 de noviembre al 30 de noviembre del 2024:

a) Se presenta un cuadro del estado del tiempo o clima, pero no se entiende o no es claro su detalle.

b) Presenta un registro fotográfico de actividades sin los elementos de protección personal.

c) El informe está incompleto, ya que no tiene firma ni fecha de presentación.

d) No se mencionan ensayos de concreto y Faltan los ensayos de concreto de 28 días correspondientes al mes de octubre y las actividades de fundición realizadas en noviembre.

e) Anexos mencionados:

- Informe HSEQ, El formato de numeración es incorrecto.
- En actas de comité presentan el otro si, donde anexan pólizas nuevas sin aprobación de la entidad.
- Bitácora: No tiene las firmas de la interventoría ni las del residente o director de obra.
- Planillas: Están completas, pero sigue existiendo incertidumbre sobre la identidad del operador de la máquina y su registro en la planilla.

- En correspondencia: Se incluye el oficio remisorio de las pólizas a la interventoría para su aprobación, pero este no está firmado.

6. Por último, A pesar de los reiterados oficios solicitando la entrega de documentos y elementos necesarios para el adecuado desarrollo de la obra, persisten los siguientes incumplimientos:

   a) Hojas de vida del personal inicial de obra, con su respectiva aprobación.

   b) Cronogramas aprobados, tanto el inicial como los cronogramas ajustados según cada modificación.

   c) Análisis de precios unitarios del contratista.

   d) Informes pendientes de diciembre de 2024, enero de 2025 y, en menos de 10 días, el informe correspondiente a febrero de 2025.

   e) No hay informe de manejo del anticipo y sus rendimientos.

   f) Oficios y planos de las modificaciones aprobadas de aceros y detalles.

Conclusión

Ante el incumplimiento persistente de los requerimientos y las obligaciones contractuales, y considerando que el **viernes 21 de febrero de 2025**, en reunión virtual, el **CONSORCIO CIVIL H&E** se comprometió a entregar los documentos e informes pendientes a más tardar el lunes 24 de febrero de 2025. Siendo las 5:30 pm, horario en que atienden las oficinas de la interventoría, **el contratista no realizó la entrega física de los documentos pendientes y pactados en la reunión,** por lo tanto, esta interventoría reitera

su solicitud a la **ENTIDAD - INDERHUILA** para que inicie el trámite correspondiente para aplicar las sanciones establecidas en el contrato, conforme a la cláusula 13 (MULTAS).

Agradezco la atención prestada y solicito a la entidad realizar el trámite correspondiente.

Atentamente,

ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO P.
Representante Legal

C.C. Doctor FELIPE VICTORIA BARRAGAN – Supervisor
C.C. Juan Felipe Alarcón – Apoyo a la supervisión
C.C. Aseguradora Seguros del Estado S.A. – CRA 4 No. 11-29 local 101 - contactenos@segurosdelestado.com

IH **2-2025-0164**
Neiva, 13 de febrero de 2025

Interventor
CONSORCIO WF
R.L. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
Consorciowf23@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVETORIA No. CIHCM-420-2023 QUE TIENE COMO OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANÁ Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA."

Asunto: respuesta a oficio de fecha 10/02/2025 con No. de radicado **1-2025-231** que tiene como asunto: SOLICITUD DE INCUMPLLIMIENTO Y MULTAS CORRESPONDIENTES.

Cordial saludo,

En atención a los inconvenientes identificados durante la ejecución del proyecto correspondiente al contrato de obra pública N.º CLPIH401-2023, como al contrato de interventoría N.º CIHCM420-2023, y con el fin de dar respuesta a los puntos demarcados en el oficio con No. De radicado **1-2025-231**, se convoca a una reunión de Comité Técnico con el fin de analizar las dificultades presentadas y determinar las acciones necesarias para su resolución.
La reunión se llevará a cabo el día viernes 14 de febrero de 2025, a las 10:30 a. m., en las instalaciones del Inderhuila, ubicadas en la Carrera 18, Calle 17 esquina, Unidad Deportiva-Sede infraestructura, es importante tener en cuenta que el contrato de obra tiene una fecha de terminación establecida para el 11 de marzo de 2025, lo cual nos exige establecer compromisos claros y efectivos que permitan avanzar en la ejecución de las actividades pendientes dentro de los plazos estipulados.
Se solicita la asistencia puntual y la presentación de la documentación necesaria para soportar las decisiones que se tomen en el marco del comité técnico.

Quedamos atentos a su confirmación.

Atentamente,

FELIPE VICTORIA BARRAGAN
Director INDERHUILA

Ing. XIMENA ADELINDA JIMENEZ ZUÑIGA
Contratista INDERHUILA

No.Bo: ARQ. JUAN FELIPE ALARCON QUIROGA
Contratista – Apoyo a la Supervisión

Consorcio Civil H&E
NIT. 901.767.013-6

INFORME HSEQ

Dirección: Cra. 3 w N. 64-37 Barrio Chicalá
Email: consorciocivilheinder@gmail.com
Teléfonos: 3187167087
Ciudad: Neiva Huila

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT. 901.767.013-6

Timaná-Huila

Señores
CONSORCIO WF
Ciudad

REF: Contrato de obra pública CLIPH401 de 2023, Construcción de la cubierta autoportante con iluminación para la vereda Pantanos de la zona rural del municipio de Timaná departamento del Huila.

ASUNTO: Informe mensual

Cordial saludo.

Por medio del presente nos permitimos remitir el informe de las actividades del mes de febrero de 2025

Anexos

1. Control de afiliaciones.
2. Informe
3. Inspección de camilla, botiquín y extintor
4. Herramientas menores y equipo
5. ATS
6. Lista del personal
7. Acta de capacitación Manipulación Manual de Cargas

Cortésmente,

Hernán Jose Trujillo Calderón
C.C. 79944179.
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO CIVIL H&E.
Elaboro: LIZETH NAIROBY LUNA CUELLAR
Anexo: documentos citados

INFORME MENSUAL

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

AVANCES EN PROCESO DEL SISTEMA DE GESTION SST

ACTIVIDADES REALIZADA POR CONTRATISTA

1. Entrega de EPP
2. Inspección de herramienta menor
3. Inspección de maquinaria y equipo
4. Inspección a equipos de emergencia
5. Manejo ambiental de obra
6. Capacitación manipulación manual de cargas

DESCRIPCÓN DE LAS ACTIVIDADES

- Se realiza entrega de dotación inicial y EPP (Elementos de protección personal) para la ejecución de sus labores, los cuales se suministran cada que los requieran.
- Se realiza inspección pre operacional semanal de las herramientas menores utilizadas para la realización de las actividades diarias, verificando que se encuentren aptas para su uso o si es necesario realizar los ajustes pertinentes.
- Inspección pre-operacional de maquinaria, esto se realiza con el propósito de verificar el adecuado estado de los mismos durante la ejecución de sus labores, y si, se llegase a presentar alguna falla detectar a tiempo y realizar sus respectivos ajustes.
- Se realizó inspección de equipo de emergencias extintor, botiquín y camilla, los cuales se encuentran ubicado en obra y en adecuadas condiciones para el momento que sean requeridos hacer uso de estos.

- Durante la ejecución del proyecto se manejaron las siguientes actividades:


  Se generaron aguas residuales domésticas, provenientes del lavado de manos y uso de los baños, las cuales fueron dispuestas directamente al sistema de alcantarillado. Además, se mantiene el sitio para acopiar materiales de construcción y/o agregados pétreos los cuales se cubre con plástico negro.

- Se realizó capacitación sobre manipulación manual de cargas (MMC), para evitar lesiones, incidentes y/o accidentes laborales en el cual se explica el método de levantamiento adecuado, basados según normatividad de la guía técnica I.N.S.H.T .

REGISTRO FOTOGRAFICO SST





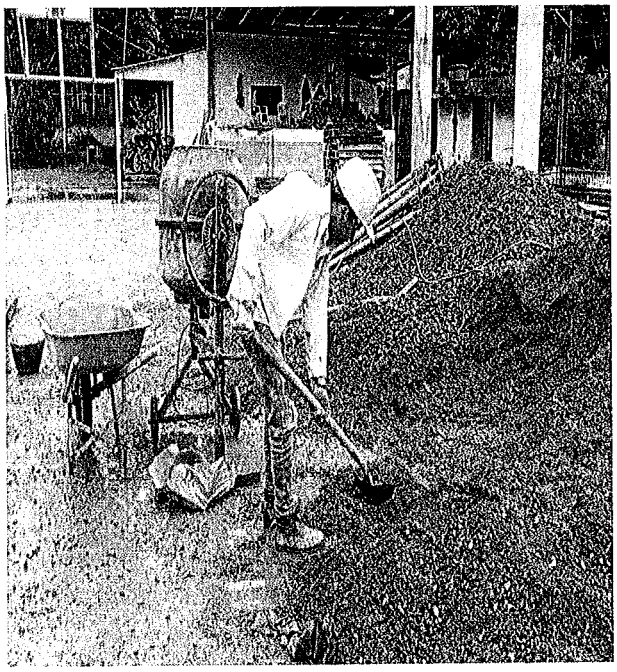



TEMAS PENDIENTES:

- Continuar capacitación para el personal

COMPROMISOS

- Continuar con las charlas pre operacionales

ANEXOS

1. Control de afiliaciones.
2. Informe
3. Inspección de camilla, botiquín y extintor
4. Inspección de herramienta menor y equipo
5. ATS
6. Listado de personal
7. Acta de capacitación manipulación manual de cargas (MMC)


ACTA DE INSPECCIÓN EQUIPOS DE EMERGENCIA		
OBJETIVO: Inspección de botiquín, camilla y extintor		
FECHA: 21 de febrero de 2025		**HORA DE INICIO:** 8:00a.m
LUGAR: Obra	**Pantanos**	

NOMBRE	CARGO	FIRMA
LIZETH LUNA CUELAR	PROFESIONAL SST	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se realizó inspección mensual a botiquín, camilla y extintor, los cuales se encuentran en obra ubicados en lugar estratégico y en óptimas condiciones para el momento de ser requeridos y estos puedan ser utilizados en caso de presentarse alguna emergencia.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

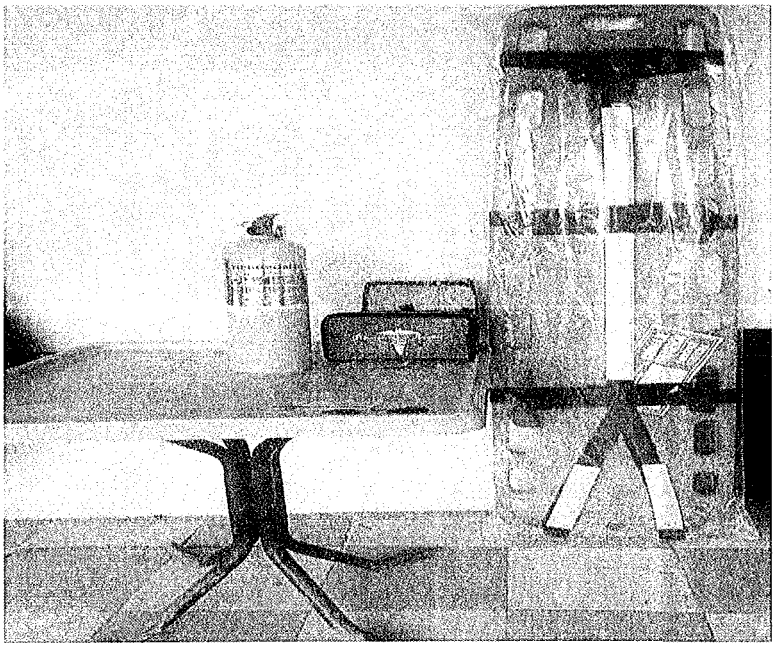

HORA DE FINALIZACION: 10:00 a.m

ELABORADO POR: LIZETH NAIROBY LUNA CUELLAR

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT. 901.767.013-6

CONSORCIO CIVIL H&E

NIT: 901 767.013-6

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

VERSIÓN. 01

FECHA: NOV 2023

INSPECCIÓN MENSUAL DE EXTINTORES

CONTRATO: CLIPH 401 DE 2023

AREA DE INSPECCION: OBRA PANTANOS

FECHA. 21 Febrero 2025

DATOS GENERALES					RESULTADOS DE LA INSPECCION MENSUAL												
N° de Inventario/A	Ubicación en el Área	Capacidad Lbs.	Tipo	Fecha Recarga	Presión del manómetro		Pasador y Sujetador		Estado Manguera		Estado válvulas		Estado Boquilla		Marcación Placa		OBSERVACIONES
					Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Si	No	
#1	OBRA			01/2026	X		X		X		X		X		X		

OBSERVACIONES GENERALES:

Inspección Realizada por: Dizzeth Cura Cortés

Firma

Nombre Aclarado:

Tipo de extintores.
CO2=Gas Carbonico
PRE=Presurizado (PQS).
CAP=Capsula (PQS-CO2)
CRT=Carretilla(PQS-N2)
MP=Multipropósito (PQS-ABC)
A.L.=Agente Limpio

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO CIVIL H&E	
	NIT: 901 767.013-6	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV. 2023

INSPECCIÓN DE CAMILLA

FECHA	febrero 2025	HORA	
RESPONSABLE	Lizeth Luna Cortés	CARGO	SST.
UBICACIÓN DE CAMILLA	Obra		

ITEN	ELEMENTO	ESTADO (B/M)	OBSERVACIONES
1	¿Se encuentra la camilla debidamente ubicada y señalizada?	B	
2	¿En qué estado se encuentra la camilla a la hora de la inspección?	B	
3	¿Cuenta la camilla con sus respetivas correas de ajuste para traslado de paciente?	B	
4	¿En que estado se encuentran las camillas?	B	
5	¿Cuenta la camilla con su respectivo inmovilizador cervical?	B	
6	¿En qué estado se encuentra el cervical?	B	
7	¿En que condiciones de limpieza se encuentra la camilla al momento de inspección?	B.	
8	¿La camilla cuenta con algún otro elemento?	N/A	

Hallazgos encontrados	Plana de acción	Fecha programada	Fecha ejecutada

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO CIVIL H&E	
	NIT: 901 767.013-6	VERSION 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA NOV 2023
		PAG. 1 DE 1

INSPECCION CONTENIDO DE BOTIQUINES

ELEMENTO	SI	NO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACION
ISODINE ESPUMA	X			
AGUA OXIGENADA	X			
SUERO FISIOLOGICO		X		
GUANTES QUIRURGICOS	X			
GASA ESTERIL	X			
VENDAS TRIANGULARES	X			
VENDA ELASTICA	X			
APLICADORES	X			
BAJA LENGUA	X			
ESPARADRAPO	X			
CURAS	X			
TIJERAS	X			
SUERO ORAL	X			
APOSITO OCULAR	X			
TOALLAS HIGIENICAS				

RESPONSABLE	Lizeth Luna C.	FECHA	21 Febrero 205
UBICACION	obra - Pantanos.		
RESPONSABLE INSPECCION	Lizeth Luna Aella1		

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO VIAS H&E	
	NIT: 901.767.013-6	VERSION 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV. 2023
	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MENORES 007	FTO-SST-

FECHA:	SEMANA DEL 3 AL 8 FEBRERO DE 2025
OBRA	PANTANOS
AREA INSPECCIONADA	OBRA
NOMBRE DE QUIEN REPORTA:	DIYER ADRIAN CHALA

B = BUENO | M = MALO | N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO		
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**	**B**	**M**	**NA**
1	Se usa la adecuada al trabajo	X		
2	Se encuentran en buen estado	X		
3	Se guardan y portan adecuadamente	X		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	X		
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**	**B**	**M**	**NA**
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo			X
2	Los cinceles se encuentran afilados			X
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	X		
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			X
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	X		
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			X
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**	**B**	**M**	**NA**
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	X		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	X		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	X		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**	**B**	**M**	**NA**
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas			X
2	Se observan en la llave huellas y palancas			X
3	Se dispone de llaves para golpear			X
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas			X
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	X		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	X		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			X
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**	**B**	**M**	**NA**
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	X		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X		
3	Están limpia y lubricadas	X		
4	Tienen sus guardas	X		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X		
6	El cable y enchufe no presentan daños			X
7	En los taladros se observa el mandil con golpes			X
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			X
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			X
10	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			X
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	X		
F	**HERRAMIENTA NEUMATICA**	**B**	**M**	**NA**
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			X
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			X
3	Se trabaja a las presiones indicadas			X
4	La herramienta es descargada al terminar.			X

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	RESPONSABLE DEL SG-SST

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO VIAS H&E	
	NIT: 901.767.013-6	VERSION 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV. 2023
	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MENORES 007	FTO-SST-

FECHA:	SEMANA DEL 10 AL 15 DE FEBRERO 2025
OBRA	PANTANOS
AREA INSPECCIONADA	OBRA
NOMBRE DE QUIEN REPORTA:	DIYER ADRIAN CHALA

B = BUENO | M = MALO | N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO		
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**	**B**	**M**	**NA**
1	Se usa la adecuada al trabajo	X		
2	Se encuentran en buen estado	X		
3	Se guardan y portan adecuadamente	X		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	X		
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**	**B**	**M**	**NA**
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo			
2	Los cinceles se encuentran afilados			X
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	X		
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			X
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	X		
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			X
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**	**B**	**M**	**NA**
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	X		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	X		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	X		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**	**B**	**M**	**NA**
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas			X
2	Se observan en la llave huellas y palancas			X
3	Se dispone de llaves para golpear			X
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas			X
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	X		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	X		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			X
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**	**B**	**M**	**NA**
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	X		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X		
3	Están limpia y lubricadas	X		
4	Tienen sus guardas	X		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X		
6	El cable y enchufe no presentan daños			X
7	En los taladros se observa el mandil con golpes			X
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			X
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			X
10	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			X
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	X		
F	**HERRAMIENTA NEUMATICA**	**B**	**M**	**NA**
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			X
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			X
3	Se trabaja a las presiones indicadas			X
4	La herramienta es descargada al terminar.			X

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	RESPONSABLE DEL SG-SST

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO VIAS H&E	
	NIT: 901.767.013-6	VERSION 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV. 2023
	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MENORES 007	FTO-SST-

FECHA:	SEMANA DEL 17 AL 22 DE FEBRERO DE 2025
OBRA	PANTANOS
AREA INSPECCIONADA	OBRA
NOMBRE DE QUIEN REPORTA:	YONEISON CORREA ORTIZ

B = BUENO | M = MALO | N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO		
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**	**B**	**M**	**NA**
1	Se usa la adecuada al trabajo	X		
2	Se encuentran en buen estado	X		
3	Se guardan y portan adecuadamente	X		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	X		
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**	**B**	**M**	**NA**
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo			
2	Los cinceles se encuentran afilados			X
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	X		
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			X
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	X		
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			X
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**	**B**	**M**	**NA**
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	X		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	X		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	X		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**	**B**	**M**	**NA**
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas			X
2	Se observan en la llave huellas y palancas			X
3	Se dispone de llaves para golpear			X
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas			X
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	X		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	X		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			X
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**	**B**	**M**	**NA**
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	X		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X		
3	Están limpia y lubricadas	X		
4	Tienen sus guardas	X		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X		
6	El cable y enchufe no presentan daños			X
7	En los taladros se observa el mandil con golpes			X
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			X
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			X
10	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			X
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	X		
F	**HERRAMIENTA NEUMATICA**	**B**	**M**	**NA**
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			X
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			X
3	Se trabaja a las presiones indicadas			X
4	La herramienta es descargada al terminar.			X

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	RESPONSABLE DEL SG-SST

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO VIAS H&E	
	NIT: 901.767.013-6	VERSION 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV. 2023
	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MENORES 007	FTO-SST-

FECHA:	SEMANA DEL 24 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2025
OBRA	PANTANOS
AREA INSPECCIONADA	OBRA
NOMBRE DE QUIEN REPORTA:	YONEISON CORREA ORTIZ

B = BUENO | M = MALO | N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**	**B**	**M**	**NA**
1	Se usa la adecuada al trabajo	X		
2	Se encuentran en buen estado	X		
3	Se guardan y portan adecuadamente	X		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	X		
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**	**B**	**M**	**NA**
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo			
2	Los cinceles se encuentran afilados			X
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	X		
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			X
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	X		
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			X
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**	**B**	**M**	**NA**
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	X		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	X		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	X		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**	**B**	**M**	**NA**
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas			X
2	Se observan en la llave huellas y palancas			X
3	Se dispone de llaves para golpear			X
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas			X
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	X		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	X		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			X
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**	**B**	**M**	**NA**
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	X		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X		
3	Están limpia y lubricadas	X		
4	Tienen sus guardas	X		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X		
6	El cable y enchufe no presentan daños			X
7	En los taladros se observa el mandil con golpes			X
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			X
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			X
10	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			X
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	X		
F	**HERRAMIENTA NEUMATICA**	**B**	**M**	**NA**
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			X
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			X
3	Se trabaja a las presiones indicadas			X
4	La herramienta es descargada al terminar.			X

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	RESPONSABLE DEL SG-SST

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	**CONSORCIO CIVIL H&E**	
	NIT: 901 767.013-6	VERSIÓN: 01
		FECHA: NOV. 2023
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	PÁG.: 1
	INSPECCION A MEZCLADORA	**FTO-SST-006**

AREA: OBRA PANTANOS	**FECHA:** SEMANA DEL 03 AL 08 DE FEBRERO 2025
INSPECCION RELAIZADA POR: YONEISON CORREA	

#	ELEMENTOS DE OERACION	ESTADO			OBSERVACIONES
		B	M	N. A	
1	Poleas	X			
2	Medidor de aceite	X			
3	Tapa de combustible			X	
4	Bujía	X			
5	Tubo de escape	X			
6	Correas	X			
7	Choque	X			
8	Yoyo			X	
9	Acelerador	X			
10	Volante de operación	X			
11	Motor	X			
12	Filtro de combustible			X	
13	Tapón de aceite	X			
14	Tornillos en general	X			
15	Guarda de los piñones	X			
16	Tapa protectora motor	X			
17	Tambor	X			
18	Estrías de compactación(interno)	X			
19	Llantas	X			
20	Engrase en general	X			
21	Balineras	X			
22	Freno de seguridad(tambor)	X			
23	Pintura	X			
24	Aseo	X			

Observaciones:

Responsable de acciones correctivas:	Fecha:
Firma:	Fecha de verificación de compromisos:

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	**CONSORCIO CIVIL H&E**	
	NIT: 901 767.013-6	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV. 2023
		PÁG.: 1

INSPECCION A MEZCLADORA

FTO-SST-006

AREA: OBRA PANTANOS **FECHA:** SEMANA DEL 24 FEBRERO AL 01 DE MARZO 2025

INSPECCION RELAIZADA POR: JONATHAN ESPAÑA

#	ELEMENTOS DE OERACION	ESTADO			OBSERVACIONES
		B	M	N. A	
1	Poleas	X			
2	Medidor de aceite	X			
3	Tapa de combustible			X	
4	Bujía	X			
5	Tubo de escape	X			
6	Correas	X			
7	Choque	X			
8	Yoyo			X	
9	Acelerador	X			
10	Volante de operación	X			
11	Motor	X			
12	Filtro de combustible			X	
13	Tapón de aceite	X			
14	Tornillos en general	X			
15	Guarda de los piñones	X			
16	Tapa protectora motor	X			
17	Tambor	X			
18	Estrías de compactación(interno)	X			
19	Llantas	X			
20	Engrase en general	X			
21	Balineras	X			
22	Freno de seguridad(tambor)	X			
23	Pintura	X			
24	Aseo	X			

Observaciones:

Responsable de acciones correctivas:	Fecha:
Firma:	Fecha de verificación de compromisos:

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO CIVIL H&E	Versión 01
	NIT: 901.767.013-6	Codigo
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FTO-SST-001
	LIZETH NAIROBY LUNA CUELLAR	Fecha
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	28/11/2023

ÁREA/PLANTA Y/O LUGAR DE OPERACION:	OBRA - PANTANOS	FECHA DE ELABORACION	3 DE FEBRERO 2025		
DESCRIBA LA ACTIVIDAD A REALIZAR:	FUNDICIÓN DE COLUMNAS			RESPONSABLE DEL ÁREA	
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	HERRAMIENTAS MENORES , MEZCLADORA Y VIBRO			RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	
CONTACTOS DE EMERGENCIA:					

DESCRIPCION EXACTA O MAS PROXIMA DEL LUGAR DE OPERACIÓN Y DESCRIBA LAS ACTIVIDADES DE COMIENZO A FIN	No	PELIGRO	RIESGO	CONTROLES REQUERIDOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS (Preventivos/Protectivos/Reactivos)	CUMPLE: SI / NO / NA
INSPECCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO INSPECCIÓN DE LA HERRAMINETA Y EQUIPO A UTILIZAR TRASLADO DEL MATERIAL PETREO, CEMENTO Y AGUA AL PUNTO SE AGREGA EL CEMENTO, AGUA, Y MATERIAL PETREO EN LA MEZCLADORA LA MEZCLA SE VACIA AL BUGGY Y ESTE ES TRALADADO AL PUNTO DE FUNDIR SE CASA EN BALDES LA MEZCLA Y ESTA SE VACIA AL PUNTO A FUNDIR, SE APLICA VIBRO AL TERMINAR ACTIVIDADES DE DEJA EL LUGAR EN ORDEN Y ASEO	1	Físico - Temperaturas externas (Calor o frío) Radiaciones	Quemadura Insolación Cefalea Mareo Deshidratación Estado Gripales	Uso de los EPP - Uso camisa manga larga y Capuchón tipo monja.	SI
				Hidratación.	SI
	2	Condiciones de Seguridad - Locativo: Orden y Aseo	Caidas Esguinces Pérdida de Materiales Golpes	Jornada de orden y aseo	SI
				Divulgación del procedimiento	SI
	3	Condiciones de seguridad - Locativo - Superficies de Trabajo: Terreno escabroso	Caídas del personal Resbalones Fracturas Esguinces Contusión	Inspección del terreno	SI
				Señalización	SI
				Uso de EPP..	SI
	4	Condiciones de Seguridad - Locativos: Trabajos en alturas	Pérdida humana	Programa de protección contra caídas	NA
				Capacitación y entrenamiento en trabajo en alturas	NA
			Caida Fractura Accidentes Graves	Programa de protección contra caídas	NA
				Uso de EPP para trabajos en alturas	NA
				Lista de verificacion para tareas de alto riesgo arnes y eslinga	NA
	5	Condiciones de seguridad - Locativos: Espacios Confinados	Pérdida humana, Caida Fractura Accidentes Graves	Verificación de atmosferas peligrosas	NA
				Programa De Protección Espacios Confinados	NA
				Capacitación de personal en espacios confinados	NA
				Uso de EPP.	NA
	6	Condiciones de seguridad - Mecánico: Uso de Herramientas Limpieza del área de trabajo	Lesiones por manejo inadecuado de herramientas manuales y equipos	Uso de los EPP	SI
				Verificación de Herramienta	SI
	7	Biomecánico - Posturas inadecuadas y movimientos repetitivos Sobreesfuezo	Hernias Esguinces Calambres Trauma muscular Fatiga Muscular	PVE Osteomuscular (Charla y capacitación en manejo de cargas)	SI
				Charla en uso y manejo de herramientas	SI
				Pausas activas	SI
	8	Psicosocial - Acoso laboral y sobrecarga laboral	Estrés laboral Bajo desempeño Bajo rendimiento Baja motivación	Programación de actividades: Bienestar	NA
				Calistenia	SI
				Programa de Riesgo Psicosocial	NA
	14	Fenomenos Naturales - Terremoto Derrumbe Tormenta Eléctrica Vendaval	Atrapamiento Electrocución Caidas	Plan de Emergencia	SI
	15	Orden Publico: Presencia de grupos armados al margen de la ley	Muerte Secuestro Atentado Robos	Plan de Emergencias	SI





SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA OPERACIÓN CUENTE CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LAS HERRAMIENTAS O EQUPOS ESTEN INSPECCIONADOS ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD

CASCO	X	CAMISA MANGA LARGA	X	RESPIRADORES		ESLINGAS Y ELEMENTOS DE AMARRE		HERRAMIENTA MENOR	X
GUANTES	X	PANTALON LARGO JEAN	X	TAPABOCAS		ARNES		HERRAMIENTAS ELECTRICAS	
BOTAS DE SEGURIDAD	X	OVEROL		TAPAOIDOS		GUAYAS -		MAQUINARIA Y VEHICULOS	
GAFAS	X	GUANTES DE NITRILO	X	PETOS		MOSQUETONES		EQUIPOS	X

DIVULGACION DEL ANALISIS DE EVALACION DE RIESGOS EJECUTORES.

Declaramos haber entendido la divulagacion del analisis de evalacion de riesgos, y nos comprometemos a cumplir las condiciones de seguridad contempladas e informar sobre cualquier desviacion que se pueda presentar.

NOMRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	OBSERVACIONES
DIYER CHALA MEDINA	1080933023	MAESTRO	
YONEISON CORREA	1004440666	OFICIAL	
SEBASTIAN ESPAÑA	1083876435	AYUDANTE	
WILMAR SANTIAGO IDROBO	1004034509	AYUDANTE	
LEONARDO GOMEZ QUINAYAS	1004208423	OFICIAL	
JONATHAN ESPAÑA	1080935714	OFICIAL	
JOSE DUBERNEY VILLAREAL	12241157	OFICIAL	
WILSON JAVIER VILLAREAL	1080931990	OFICIAL	

	LUNES	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado
FECHA	3/02/2025	4/02/2025	5/02/2025	6/02/2025	7/02/2025	8/02/2025
FIRMA LIDER DE LA ACTIVIDAD						
FIRMA S.S.T.						

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO CIVIL H&E	Versión 01
	NIT: 901.767.013-6	Codigo
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FTO-SST-001
	LIZETH NAIROBY LUNA CUELLAR	Fecha
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	28/11/2023

ÁREA/PLANTA Y/0 LUGAR DE OPERACION:	OBRA - PANTANOS	FECHA DE ELABORACION	10 DE FEBRERO 2025		
DESCRIBA LA ACTIVIDAD A REALIZAR:	DESENCOFRE Y ENCOFRADO DE COLUMNAS			RESPONSABLE DEL ÁREA	
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	HERRAMIENTAS MENORES			RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	
CONTACTOS DE EMERGENCIA:					

DESCRIPCION EXACTA O MAS PROXIMA DEL LUGAR DE OPERACIÓN Y DESCRIBA LAS ACTIVIDADES DE COMIENZO A FIN	No	PELIGRO	RIESGO	CONTROLES REQUERIDOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS (Preventivos/Protectivos/Reactivos)	CUMPLE: SI / NO / NA
INSPECCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO	1	Físico - Temperaturas externas (Calor o frío) Radiaciones	Quemadura Insolación Cefalea Mareo Deshidratación Estado Gripales	Uso de los EPP - Uso camisa manga larga y Capuchón tipo monja.	SI
				Hidratación.	SI
INSPECCIÓN DE LA HERRAMINETA Y EQUIPO A UTILIZAR	2	Condiciones de Seguridad - Locativo: Orden y Aseo	Caidas Esguinces Pérdida de Materiales Golpes	Jornada de orden y aseo	SI
				Divulgación del procedimiento	SI
DESENCOFRE DE LAS COLUMNAS	3	Condiciones de seguridad - Locativo - Superficies de Trabajo: Terreno escabroso	Caídas del personal Resbalones Fracturas Esguinces Contusión	Inspección del terreno	SI
				Señalización	SI
				Uso de EPP..	SI
LA FORMALETA DE LIMPIA DEL RESIDUO DE MEZCLA Y SE UBICA EN EL PUNTO DE ACOPIO	4	Condiciones de Seguridad - Locativos: Trabajos en alturas	Pérdida humana	Programa de protección contra caídas	NA
				Capacitación y entrenamiento en trabajo en alturas	NA
POSTERIORMENTE SE APLICA GRASA A CADA FORMALETA Y SE TRASLADA NUEVAMENTE AL PUNTO A INSTALAR			Caida Fractura Accidentes Graves	Programa de protección contra caídas	NA
				Uso de EPP para trabajos en alturas	NA
				Lista de verificacion para tareas de alto riesgo arnes y eslinga	NA
SE INSTALA LA FORMALETA Y SE ASEGURA	5	Condiciones de seguridad - Locativos: Espacios Confinados	Pérdida humana, Caida Fractura Accidentes Graves	Verificación de atmosferas peligrosas	NA
				Programa De Protección Espacios Confinados	NA
				Capacitación de personal en espacios confinados	NA
				Uso de EPP.	NA
AL TERMINAR ACTIVIDADES DE DEJA EL LUGAR EN ORDEN Y ASEO	6	Condiciones de seguridad - Mecánico: Uso de Herramientas Limpieza del área de trabajo	Lesiones por manejo inadecuado de herramientas manuales y equipos	Uso de los EPP	SI
				Verificación de Herramienta	SI
	7	Biomecánico - Posturas inadecuadas y movimientos repetitivos Sobreesfuezo	Hernias Esguinces Calambres Trauma muscular Fatiga Muscular	PVE Osteomuscular (Charla y capacitación en manejo de cargas)	SI
				Charla en uso y manejo de herramientas	SI
				Pausas activas	SI
	8	Psicosocial - Acoso laboral y sobrecarga laboral	Estrés laboral Bajo desempeño Bajo rendimiento Baja motivación	Programación de actividades: Bienestar	NA
				Calistenia	SI
				Programa de Riesgo Psicosocial	NA
	14	Fenomenos Naturales - Terremoto Derrumbe Tormenta Eléctrica Vendaval	Atrapamiento Electrocución Caidas	Plan de Emergencia	SI
	15	Orden Publico: Presencia de grupos armados al margen de la ley	Muerte Secuestro Atentado Robos	Plan de Emergencias	SI









SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA OPERACIÓN CUENTE CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LAS HERRAMIENTAS O EQUPOS ESTEN INSPECCIONADOS ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD

CASCO	X	CAMISA MANGA LARGA	X	RESPIRADORES		ESLINGAS Y ELEMENTOS DE AMARRE		HERRAMIENTA MENOR	X
GUANTES	X	PANTALON LARGO JEAN	X	TAPABOCAS		ARNES		HERRAMIENTAS ELECTRICAS	
BOTAS DE SEGURIDAD	X	OVEROL		TAPAOIDOS		GUAYAS		MAQUINARIA Y VEHICULOS	
GAFAS	X	GUANTES DE NITRILO	X	PETOS		MOSQUETONES		EQUIPOS	

DIVULGACION DEL ANALISIS DE EVALACION DE RIESGOS EJECUTORES.

Declaramos haber entendido la divulagacion del analisis de evalacion de riesgos, y nos comprometemos a cumplir las condiciones de seguridad contempladas e informar sobre cualquier desviacion que se pueda presentar.

NOMRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	OBSERVACIONES
DIYER CHALA MEDINA	1080933023	MAESTRO	
YONEISON CORREA	1004440666	OFICIAL	
SEBASTIAN ESPAÑA	1083876435	AYUDANTE	
WILMAR SANTIAGO IDROBO	1004034509	AYUDANTE	
LEONARDO GOMEZ QUINAYAS	1004208423	OFICIAL	
JONATHAN ESPAÑA	1080935714	OFICIAL	
JOSE DUBERNEY VILLAREAL	12241157	OFICIAL	
WILSON JAVIER VILLAREAL	1080931990	OFICIAL	

	LUNES	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado
FECHA	10/02/2025	11/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	14/02/2025	15/02/2025
FIRMA LIDER DE LA ACTIVIDAD						
FIRMA S.S.T.						

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO CIVIL H&E	Versión 01
	NIT: 901.767.013-6	Codigo
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FTO-SST-001
	LIZETH NAIROBY LUNA CUELLAR	Fecha
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	28/11/2023

ÁREA/PLANTA Y/O LUGAR DE OPERACION:	OBRA - PANTANOS	FECHA DE ELABORACION	17 DE FEBRERO 2025		
DESCRIBA LA ACTIVIDAD A REALIZAR:	ENCOFRADO DE COLUMNAS			RESPONSABLE DEL ÁREA	
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	HERRAMIENTAS MENORES			RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	
CONTACTOS DE EMERGENCIA:					

DESCRIPCION EXACTA O MAS PROXIMA DEL LUGAR DE OPERACIÓN Y DESCRIBA LAS ACTIVIDADES DE COMIENZO A FIN	No	PELIGRO	RIESGO	CONTROLES REQUERIDOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS (Preventivos/Protectivos/Reactivos)	CUMPLE: SI / NO / NA
INSPECCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO	1	Físico - Temperaturas externas (Calor o frío) Radiaciones	Quemadura Insolación Cefalea Mareo Deshidratación Estado Gripales	Uso de los EPP - Uso camisa manga larga y Capuchón tipo monja.	SI
				Hidratación.	SI
INSPECCIÓN DE LA HERRAMINETA Y EQUIPO A UTILIZAR	2	Condiciones de Seguridad - Locativo: Orden y Aseo	Caidas Esguinces Pérdida de Materiales Golpes	Jornada de orden y aseo	SI
				Divulgación del procedimiento	SI
LA FORMALETA SE TRASLADA AL PUNTO QUE SE VA A INSTALAR	3	Condiciones de seguridad - Locativo - Superficies de Trabajo: Terreno escabroso	Caídas del personal Resbalones Fracturas Esguinces Contusión	Inspección del terreno	SI
				Señalización	SI
				Uso de EPP..	SI
	4	Condiciones de Seguridad - Locativos: Trabajos en alturas	Pérdida humana	Programa de protección contra caídas	NA
				Capacitación y entrenamiento en trabajo en alturas	NA
			Caida Fractura Accidentes Graves	Programa de protección contra caídas	NA
POSTERIORMENTE SE APLICA GRASA A CADA FORMALETA				Uso de EPP para trabajos en alturas	NA
				Lista de verificacion para tareas de alto riesgo arnes y eslinga	NA
	5	Condiciones de seguridad - Locativos: Espacios Confinados	Pérdida humana, Caida Fractura Accidentes Graves	Verificación de atmosferas peligrosas	NA
				Programa De Protección Espacios Confinados	NA
				Capacitación de personal en espacios confinados	NA
				Uso de EPP.	NA
SE INSTALA LA FORMALETA Y SE ASEGURA	6	Condiciones de seguridad - Mecánico: Uso de Herramientas Limpieza del área de trabajo	Lesiones por manejo inadecuado de herramientas manuales y equipos	Uso de los EPP	SI
				Verificación de Herramienta	SI
AL TERMINAR ACTIVIDADES DE DEJA EL LUGAR EN ORDEN Y ASEO	7	Biomecánico - Posturas inadecuadas y movimientos repetitivos Sobreesfuezo	Hernias Esguinces Calambres Trauma muscular Fatiga Muscular	PVE Osteomuscular (Charla y capacitación en manejo de cargas)	SI
				Charla en uso y manejo de herramientas	SI
				Pausas activas	SI
	8	Psicosocial - Acoso laboral y sobrecarga laboral	Estrés laboral Bajo desempeño Bajo rendimiento Baja motivación	Programación de actividades: Bienestar	NA
				Calistenia	SI
				Programa de Riesgo Psicosocial	NA
	14	Fenomenos Naturales - Terremoto Derrumbe Tormenta Eléctrica Vendaval	Atrapamiento Electrocución Caidas	Plan de Emergencia	SI
	15	Orden Publico: Presencia de grupos armados al margen de la ley	Muerte Secuestro Atentado Robos	Plan de Emergencias	SI

SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA OPERACIÓN CUENTE CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LAS HERRAMIENTAS O EQUPOS ESTEN INSPECCIONADOS ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD

CASCO	X	CAMISA MANGA LARGA	X	RESPIRADORES		ESLINGAS Y ELEMENTOS DE AMARRE		HERRAMIENTA MENOR	X
GUANTES	X	PANTALON LARGO JEAN	X	TAPABOCAS		ARNES -		HERRAMIENTAS ELECTRICAS	
BOTAS DE SEGURIDAD	X	OVEROL		TAPAOIDOS		GUAYAS		MAQUINARIA Y VEHICULOS	
GAFAS	X	GUANTES DE NITRILO	X	PETOS		MOSQUETONES		EQUIPOS	

DIVULGACION DEL ANALISIS DE EVALACION DE RIESGOS EJECUTORES.

Declaramos haber entendido la divulagacion del analisis de evalacion de riesgos, y nos comprometemos a cumplir las condiciones de seguridad contempladas e informar sobre cualquier desviacion que se pueda presentar.

NOMRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	OBSERVACIONES
DIYER CHALA MEDINA	1080933023	MAESTRO	
YONEISON CORREA	1004440666	OFICIAL	
SEBASTIAN ESPAÑA	1083876435	AYUDANTE	
WILMAR SANTIAGO IDROBO	1004034509	AYUDANTE	
LEONARDO GOMEZ QUINAYAS	1004208423	OFICIAL	
JONATHAN ESPAÑA	1080935714	OFICIAL	
JOSE DUBERNEY VILLAREAL	12241157	OFICIAL	
WILSON JAVIER VILLAREAL	1080931990	OFICIAL	

	LUNES	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado
FECHA	17/02/2025	18/02/2025	19/02/2025	20/02/2025	21/02/2025	22/02/2025
FIRMA LIDER DE LA ACTIVIDAD						
FIRMA S.S.T.						

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO CIVIL H&E	Versión 01
	NIT: 901.767.013-6	Codigo
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FTO-SST-001
	LIZETH NAIROBY LUNA CUELLAR	Fecha
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	28/11/2023

ÁREA/PLANTA Y/0 LUGAR DE OPERACION:	OBRA - PANTANOS	FECHA DE ELABORACION	24 DE FEBRERO 2025		
DESCRIBA LA ACTIVIDAD A REALIZAR:	FUNDICIÓN DE COLUMNAS			RESPONSABLE DEL ÁREA	
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	HERRAMIENTAS MENORES Y MEZCLADORA			RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	
CONTACTOS DE EMERGENCIA:					

DESCRIPCION EXACTA O MAS PROXIMA DEL LUGAR DE OPERACIÓN Y DESCRIBA LAS ACTIVIDADES DE COMIENZO A FIN	No	PELIGRO	RIESGO	CONTROLES REQUERIDOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS (Preventivos/Protectivos/Reactivos)	CUMPLE: SI / NO / NA
INSPECCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO	1	Físico - Temperaturas externas (Calor o frío) Radiaciones	Quemadura Insolación Cefalea Mareo Deshidratación Estado Gripales	Uso de los EPP - Uso camisa manga larga y Capuchón tipo monja.	SI
				Hidratación.	SI
INSPECCIÓN DE LA HERRAMINETA Y EQUIPO A UTILIZAR	2	Condiciones de Seguridad - Locativo: Orden y Aseo	Caídas Esguinces Pérdida de Materiales Golpes	Jornada de orden y aseo	SI
				Divulgación del procedimiento	SI
	3	Condiciones de seguridad - Locativo - Superficies de Trabajo: Terreno escabroso	Caídas del personal Resbalones Fracturas Esguinces Contusión	Inspección del terreno	SI
				Señalización	SI
				Uso de EPP..	SI
ALISTAMIENTO DEL MATERIAL PETREO Y CEMENTO	4	Condiciones de Seguridad - Locativos: Trabajos en alturas	Pérdida humana	Programa de protección contra caídas	NA
				Capacitación y entrenamiento en trabajo en alturas	NA
			Caída Fractura Accidentes Graves	Programa de protección contra caídas	NA
				Uso de EPP para trabajos en alturas	NA
				Lista de verificacion para tareas de alto riesgo arnes y eslinga	NA
EN LA MEZCLADORA SE AGREGAN LOS MATERIALES, POSTERIOR SE VACIA AL BUGGY LA MEZCLA Y ESTA ES TRASLADADA AL PUTNO	5	Condiciones de seguridad - Locativos: Espacios Confinados	Pérdida humana, Caída Fractura Accidentes Graves	Verificación de atmosferas peligrosas	NA
				Programa De Protección Espacios Confinados	NA
				Capacitación de personal en espacios confinados	NA
				Uso de EPP.	NA
SE REALIZA VACIADO DE LA MEZCLA EN BALDES Y ESTOS DE VACIAN A LA COLUMNA A FUNDIR	6	Condiciones de seguridad - Mecánico: Uso de Herramientas Limpieza del área de trabajo	Lesiones por manejo inadecuado de herramientas manuales y equipos	Uso de los EPP	SI
				Verificación de Herramienta	SI
	7	Biomecánico - Posturas inadecuadas y movimientos repetitivos Sobreesfuezo	Hernias Esguinces Calambres Trauma muscular Fatiga Muscular	PVE Osteomuscular (Charla y capacitación en manejo de cargas)	SI
				Charla en uso y manejo de herramientas	SI
				Pausas activas	SI
AL TERMINAR ACTIVIDADES DE DEJA EL LUGAR EN ORDEN Y ASEO	8	Psicosocial - Acoso laboral y sobrecarga laboral	Estrés laboral Bajo desempeño Bajo rendimiento Baja motivación	Programación de actividades: Bienestar	NA
				Calistenia	SI
				Programa de Riesgo Psicosocial	NA
	14	Fenomenos Naturales - Terremoto Derrumbe Tormenta Eléctrica Vendaval	Atrapamiento Electrocución Caídas	Plan de Emergencia	SI
	15	Orden Publico: Presencia de grupos armados al margen de la ley	Muerte Secuestro Atentado Robos	Plan de Emergencias	SI

SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA OPERACIÓN CUENTE CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LAS HERRAMIENTAS O EQUPOS ESTEN INSPECCIONADOS ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD

CASCO	X	CAMISA MANGA LARGA	X	RESPIRADORES		ESLINGAS Y ELEMENTOS DE AMARRE		HERRAMIENTA MENOR	X
GUANTES	X	PANTALON LARGO JEAN	X	TAPABOCAS		ARNES		HERRAMIENTAS ELECTRICAS	
BOTAS DE SEGURIDAD	X	OVEROL		TAPAOIDOS		GUAYAS		MAQUINARIA Y VEHICULOS	
GAFAS	X	GUANTES DE NITRILO	X	PETOS		MOSQUETONES		EQUIPOS	

DIVULGACION DEL ANALISIS DE EVALACION DE RIESGOS EJECUTORES.

Declaramos haber entendido la divulagacion del analisis de evalacion de riesgos, y nos comprometemos a cumplir las condiciones de seguridad contempladas e informar sobre cualquier desviacion que se pueda presentar.

NOMRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	OBSERVACIONES
DIYER CHALA MEDINA	1080933023	MAESTRO	
YONEISON CORREA	1004440666	OFICIAL	
SEBASTIAN ESPAÑA	1083876435	AYUDANTE	
WILMAR SANTIAGO IDROBO	1004034509	AYUDANTE	
LEONARDO GOMEZ QUINAYAS	1004208423	OFICIAL	
JONATHAN ESPAÑA	1080935714	OFICIAL	
JOSE DUBERNEY VILLAREAL	12241157	OFICIAL	
WILSON JAVIER VILLAREAL	1080931990	OFICIAL	

	LUNES	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado
FECHA	24/02/2025	25/2/2025	26/02/2025	27/02/2025	28/02/2025	01/03/2025
FIRMA LIDER DE LA ACTIVIDAD						
FIRMA S.S.T.						

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT. 901.767.013-6

CONSORCIO CIVIL H&E

NIT: 901767013-6

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

FECHA: SEMANA DEL 3 AL 8 FEBRERO 2025

LUGAR: OBRA PANTANOS

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	L	M	M	J	V	S	FIRMA
1	CHALA MEDINA DIYER	1080933023	Maestro	x	x	x	x	x	x	
2	YONEISON CORREA	1004440666	oficial	x	x	x	x	x	x	Yoneison Correa Ortiz.
3	SEBASTIAN ESPAÑA	1083876435	AYUDANTE	x	x	x	x	x	x	
4	WILMAR SANTIAGO IORDO	1004034509	AYUDANTE	x	x	x	x	x	x	
5	LEONARDO GOMEZ Q	1004208423	OFICIAL	x	x	x	x	x	x	Leonardo Gomez.
6	JONATHAN ESPAÑA	1080935714	OFICIAL	x	x	x	x	x	x	Jonathan España Medina.
7	JOSE DOBERNEY VILLAREAL	12241157	OFICIAL	x	x	x	x	x	x	Doberney Villarreal C.
8	WILSON JAVIER VILLAREAL	1080981990	OFICIAL	x	x	x	x	x	x	Wilson Villareal.
9										
10										
11										
12										

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT. 901.767.013-6

CONSORCIO CIVIL H&E

NIT 901767013-6

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

FECHA: SEMANA DEL 10 AL 15 DE FEBRERO 2025

LUGAR: OBRA - PANTANOS.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	L	M	M	J	V	S	FIRMA
1	Sebastian Españo Ardila	1083876435	Ayudante	X	X	X	X	X	X	
2	Wilmar Santiago Idrobo	1004024509	Ayudante	X	X	X	X	X	X	
3	[illegible]	1080731990	oficial	X	X	X	X	X	X	[illegible]
4	Luis Miguel Correa O.	1084251953	Ayudante	X	X	X	X	X	X	Luis Correa.
5	Yonelson Correa Ortiz	1004440666	Oficial	X	X	X	X	X	X	Yonelson Correa
6	Leonardo Gomez	1004208423	Oficial	X	X	X	X	X	X	Leonardo Gomez
7	Jonathan Esparza M.	1080935714	Oficial	X	X	X	X	X	X	Jonathan Esparza Medina
8	Carlos Alberto Lopez	1007361202	Oficial	X	X	X	X	X	X	
9	Dyer Adrian Chala	0809133023	Maestro	X	X	X	X	X	X	
10										
11										
12										

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT. 901.767.013-6

CONSORCIO CIVIL H&E

NIT. 901767013-6

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

FECHA: SEMANA DEL 17 AL 22 DE FEBRERO 2025

LUGAR: OBRA PANTANOS

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	L	M	M	J	V	S	FIRMA
1	Leonardo Gomez Carayos	1004208423	oficial	x	x	x	x	x	x	Leonardo Gomez.
2	Jonathan España Medina	1080935714	oficial	x	x	x	x	x	x	Jonathan España Medina
3	Yoneison Correa ortiz	1004440666	oficial	x	x	x	x	x	x	Yoneison Correa Ortiz
4	Dayer Adrian Chala	1080933023	Maestro.	x	x	x	x	x	x	
5	Jose Dubernes Villareal	12241157		x	x	x	x	x	x	Dubarney Villareal C.
6	Carlos Alberto Lopez choux	1007361202	oficial	x	x	x	x	x	x	Carlos alberto
7	wilmar Santiago Idiobo	1004034509	Ayudante.	x	x	x	x	x	x	
8	wilson Javier Villareal	1080931990	Oficial	x	x	x	x	x	x	Wilson Villareal
9	Luis Miguel Correa ortiz	1084251953	Ayudante.	x	x	x	x	x	x	Luis Correa
10	Sebastian España Avila	1083876455	Ayudante.	x	x	x	x	x	x	
11										
12										

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E
NIT. 901.767.013-6

CONSORCIO CIVIL H&E

NIT: 901767013-6

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

FECHA: SEMANA DEL 24 FEBRERO AL 01 MARZO 2025 LUGAR: OBRA PANTANOS

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	L	M	M	J	V	S	FIRMA
1	Leonardo Gomez Quinayas	1004208423	Oficial	X	X	X	X	X	X	Leonardo Gomez.
2	Jonathan España Medina	1080935714	Oficial	X	X	X	X	X	X	Jonathan España Medina
3	Yoneison Correa ortiz	1004440666	Oficial	X	X	X	X	X	X	Yoneison Correa Ortiz
4	Dyer Adrian Chala	1080933023	Maestro	X	X	X	X	X	X	
5	Jose Dubernes villareal	12241157		X	X	X	X	X	X	Dubernes Villareal C.
6	Carlos Alberto Lopez Chaux	1007361202	Oficial	X	X	X	X	X	X	Carlos Alberto
7	Wilmar Santiago Idrobo	1004034509	Ayudante	X	X	X	X	X	X	
8	Wilson Javier villareal	1080931990	Oficial	X	X	X	X	X	X	Wilson Villareal.
9	Luis Miguel Correa ortiz	1084251953	Ayudante	X	X	X	X	X	X	Luis Correa
10	Sebastian España Avila	1083876435	Ayudante	X	X	X	X	X	X	
11										
12										

Powered by CamScanner

CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6	CONSORCIO VIAS H&E	
	NIT: 901 767.013-6	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	FECHA: NOV 2023
		PÁG.: 1 DE 1
ACTA DE CAPACITACIÓN		FTO-SST-014

-ACTA DE CAPACITACION SG-SST-

OBJETIVO: Capacitación Manipulación Manual de Cargas

FECHA: 20 de febrero de 2025	**HORA DE INICIO:** 7:00 am
LUGAR: Obra	**Pantanos**

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
TRABAJADORES	TRABAJADORES	ANEXO ASISTENCIA DE CADA DIA
LIZETH NAIROBY LUNA CUELLAR	PROFESIONAL SST	


DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se realizó capacitación sobre manipulación manual de cargas (MMC), para evitar lesiones, incidentes y/o accidentes laborales en el cual se explica el método de levantamiento adecuado.

- Evalué si necesita ayuda
- Ubique los pies separados
- Doble las rodillas y mantenga la espalda recta, suba la carga haciendo peso con las rodillas
- Mantenga la carga lo más pegado al cuerpo
- Baje la carga flexionando las rodillas y espalda recta

|Se explica según normatividad de la guía técnica I.N.S.H.T." El peso máximo que se recomienda, no sobrepasar(en condiciones ideales de manipulación) es de 25 Kg, en caso de ser mayor la carga trabajar en equipo (entre dos).

REGISTRO FOTOGRÁFICO

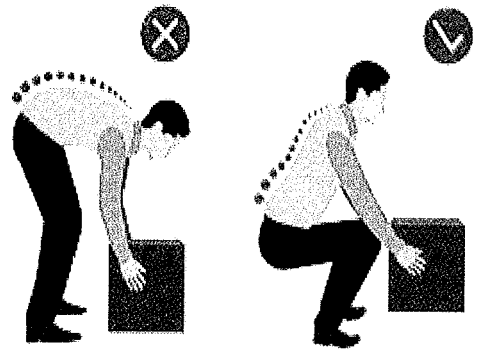



HORA DE FINALIZACION: 8:00 am

ELABORADO POR: LIZETH NAIROBY LUNA CUELLAR

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. _ **CIHCM420 DE de 2023**_

INFORME DE INTERVENTORIA No. _08

MENSUAL [X] **FINAL** [ ]

Objeto Contrato: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA.



MUNICIPIO: TIMANA – VEREDA PANTANOS

DEPARTAMENTO: **HUILA**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM420 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO WF.

APOYO A LA SUPERVISIÓN	1. Arq. JUAN ALARCON	**ENTIDAD**	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	**___CIHCM420____** DE 2023___		
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA.	**PERIODO DEL INFORME**	Entre 01 de febrero al 28 De febrero de 2025.
CONTRATISTA	CONSORCIO WF	**NIT:**	901.769.619 - 8.
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	**C.C:**	7.711.430 DE NEIVA

FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	09 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.
FECHA DE SUSPENSION 1:	26 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO 1:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024
OTROSÍ No.1: 24/09/2024	MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA 4 -PLAZO DEL CONTRATO- VIGENCIA FISCAL.
OTROSÍ No.2: 12/11/2024	Prórroga: VEINTE (20) DÍAS.
OTROSÍ No.3: 02/12/2024	**Prórroga:** UN (1) MES-. **Adicional:** DOCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 12.573.718,00) M/CTE.
OTROSÍ No.4: 27/12/2024	Prórroga: UN (1) MES- y TRES (3) DIAS.
OTROSÍ No.5: 04/02/2025	Prórroga: UN (1) MES- y SIETE (7) DIAS.
PLAZO ADICIONAL:	CUATRO (4) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.
VALOR INICIAL:	OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($88.657.430,00) M/CTE

VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	DOCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 12.573.718,00) M/CTE.
VALOR TOTAL:	CIENTO UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 101.231.148) M/CTE.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA


CONTRATO DE OBRA No.	CLPIH401 DE 2023		
OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA **VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA** DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATISTA	CONSORCIO CIVIL H&E	**NIT:**	901.767.013-6
REPRESENTANTE LEGAL:	HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON	**C.C:**	79.944.179

FECHA SUSCRIPCIÓN	02 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.
FECHA DE SUSPENSION 1:	26 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO 1:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024
OTROSÍ No.1: 24/09/2024	MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA 4 -PLAZO DEL CONTRATO- VIGENCIA FISCAL.
OTROSÍ No.2: 12/11/2024	**Prorroga:** UN (1) MES. **Adición:** SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO ($ 75.179.371) M/CTE.
OTROSI No. 3: 13/12/2024	Prorroga: Un (1) mes.
OTROSI No. 4: 10/01/2025	Prorroga: DOS (2) mes.
PLAZO ADICIONAL	CUATRO (4) MES
PLAZO TOTAL:	SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.
VALOR ADICIONAL (12/11/2024):	Setenta y cinco millones ciento setenta y nueve mil trescientos cincuenta y siete pesos ($75.179.357) M/CTE.
VALOR TOTAL:	**SEISCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS ($ 626.662.540) M/CTE.**

INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	**NIT:**	Nit. 901.769.619-8
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	**C.C:**	7.711.430

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Cubierta Autoportante con Iluminación para la Vereda Pantanos de la Zona Rural del Municipio Timana - Departamento Del Huila

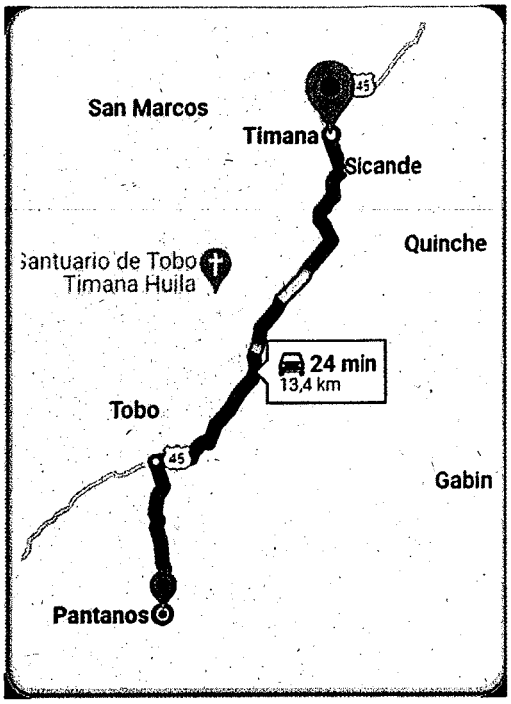

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La misión del INDERHUILA es generar y brindar a la comunidad oportunidades de participación en los procesos de iniciación, formación, fomento y práctica del deporte, la educación física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, como contribución al desarrollo integral del individuo, para el mejoramiento de la calidad de vida de la población del Departamento del Huila, por medio de la masificación, la promoción y el apoyo a la práctica deportiva.

En consecuencia, de lo anterior se requiere la adecuación locativa de los terrenos existentes para llevar a cabo la CONSTRUCCIÓN **DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA;** lo permitirán a la población realizar las prácticas deportivas, que van a contribuir con la mejora de la calidad de vida de las personas que acuden a estos escenarios recreo deportivos. Se resalta que este tipo de obras contribuyen a minimizar el déficit de espacios deportivos que existe en el Departamento del Huila.

El objetivo principal es promover la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre hacia el desarrollo humano integral; donde se promuevan y estimulen los valores para la convivencia, participación, disminución de la violencia, y

construcción del tejido social: apoyado en estrategias que beneficien los habitantes de la ciudad para fortalecer el desarrollo del deporte la recreación y la educación física, con la implementación de programas orientados a' la construcción de tejido social y convivencia ciudadana en la totalidad de la población Huilense con una infraestructura deportiva técnicamente adecuada, desarrollando acciones articuladas entre sí, que mejoren la calidad de vida de todas y todos los habitantes del Departamento del Huila, bajo los principios de sostenibilidad ambiental, participación ciudadana, democracia, equidad e inclusión de personas con movilidad reducida y respeto por las libertades individuales y que permitan posicionar al Departamento en el contexto regional, nacional y mundial, en concordancia con las Políticas Departamentales y Nacionales.

Las presentes especificaciones contienen el alcance para la ejecución de las obras de construcción de las cubiertas en el Departamento del Huila.

El proyecto arquitectónico contempla un área construida de 937.20 M2 por cubierta aproximadamente. en que se encuentra contemplada la construcción de la cubierta autoportante con teja metálica cal. 22 para el polideportivo ubicado fa vereda pantanos de la zona rural del municipio de Timana departamento del Huila la cual tiene una destinación de uso recreativo, deportivo y cultural; correspondientes a estructura, cubierta, iluminación y sistema hidráulico para el manejo de aguas lluvias.

La cubierta será con sistema auto portante, sostenida con columnas en concreto de 3000 PSI. sistema estructural propuesto consiste en columnas y vigas aéreas en concreto reforzado en 3000 PSI y una cimentación tipo zapatas, vigas de cimentación y viga canal. Todas las obras deberán atender lo establecido en la NORMA SISMORESITENTE de 2010 - NSR-10.

Es un sistema de estructura en concreto y teja auto portante a base de lámina de acero cal. 22:

- Área Total replanteo: 937,20 M2
- Actividades preliminares.
- Cimentación en concreto.
- Estructura en concreto.
- Cubierta.
- Instalaciones hidrosanitarias.
- Instalaciones eléctricas.

5. INFORME CONCRETO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DURANTE EL PERIODO

Se realizan diversas tareas de construcción y mantenimiento, incluyendo la compactación manual de recebo, el armado de estructuras para formaletas y canastas de acero en el eje B, y la fundición de vigas corona en los ejes A y B. Se instala el manto zetal en la viga canal y se colocan bajantes y filtros en las tuberías de PVC. Además, se construyen placas para andenes, cajas de inspección de 0.70 x 0.70 metros, y cunetas de concreto, así como la excavación para la instalación de tubería eléctrica. También se lleva a cabo el mantenimiento de la cancha multifuncional, la demarcación de la misma con pintura de tráfico y la fabricación de cajas de inspección para alumbrado público de 0.40 x 0.40 metros.

6. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	**16/11/2023**	**40**		
Suspensión No. 1	26/12/2023		**273**	
Reiniciación No. 1	24/09/2024	**37**		
Otrosi No. 2	12/11/2024	**30**		
Otrosi No. 3	13/12/2024	**30**		
Otrosi No. 4	10/01/2025	**30**		
TERMINACIÓN Cto.		**30**		**13/03/2025**
TOTAL DIAS		**197**	**273**	

7. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
	CLPIH401 DE 2023	
ACTA DE INICIO	**1**	16/11/2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN – SUSPENSIÓN 1	**1**	26/12/2023
ACTA DE SUSPENSIÓN	**1**	26/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN - REINICIO 1	**2**	24/09/2024
ACTA DE REINICIO	**1**	24/09/2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN - OTROSÍ No.01	**3**	24/09/2024
OTROSÍ	**1**	24/09/2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN - OTROSÍ No.02	**4**	12/11/2024
OTROSÍ No.02	**2**	12/11/2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN - OTROSÍ No.03	**5**	13/12/2024
OTROSÍ No.03	**3**	13/12/2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN - OTROSÍ No.04	**6**	10/01/2024
OTROSÍ No.04	**4**	10/01/2024

8. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO

(Cumplimiento Obligaciones del contrato).

a). Obligaciones de Carácter General.

1. Se he realizado la entrega de documentación en papel reciclado.
2. Durante el periodo la interventoria informa a la entidad el cambio de equipo de trabajo propuesto en la interventoría, el residente establecido para la obra en San Agustín se trasladó a Timana debido a que el otro contrato se encuentra suspendido y solo le queda un día de ejecución.
3. se verifican pagos de aportes de seguridad social del personal (Salud, Pensión y riesgos).

b). Actividades Administrativas.

1. se realiza control y seguimiento del personal que ejecuta la obra

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL	CARGO
HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON	Director de Obra
WILSON REINALDO PARRA TOVAR	Residente de Obra
LIZETH NAIROBY LUNA CUELLAR	Siso
ADRIAN DIYER CHALA MEDINA	AYUDANTE
LUIS MIGUEL CORREA ORTIZ	AYUDANTE
YONEISON CORREA ORTIZ	AYUDANTE
SEBASTIAN ESPAÑA ARDILA	AYUDANTE
JONATHAN ESPAÑA MEDINA	AYUDANTE
LEONARDO GOMEZ QUINAYAS	AYUDANTE
WILMAR SANTIAGO IDROBO CLAROS	AYUDANTE

	JOSE DUBERNEY VILLAREAL CUERVO	AYUDANTE
	WILSON JAVIER VILLARREAL CUERVO	OFICIAL
	CARLOS ALBERTO LOPEZ CHAUX	OFICIAL
	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS	Se hace control y seguimiento a los equipos en obra.
	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	Se le realiza control y seguimiento al diseño de mezcla de concreto.
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	Planillas relacionadas

PERSONAL	PENSION	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	Nº PLANILLA	FECHA DE PAGO
HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON	$480,000	$375,000	$73,100	$60.000	$0	9483496335	27/03/2025
WILSON REINALDO PARRA TOVAR	$227.800	$178.000	$99.100	$57.000	$71.300	32882186	26/03/2025
LIZETH NAIROBY LUNA CUELLAR	$227.800	$178.000	$99.100	$57.000	$71.300	32882186	26/03/2025
ADRIAN DIYER CHALA MEDINA	$227.800	$178.000	$99.100	$57.000	$71.300	32882186	26/03/2025
LUIS MIGUEL CORREA ORTIZ	$227.800	$178.000	$99.100	$57.000	$71.300	32882186	26/03/2025
YONEISON CORREA ORTIZ	$227.800	$178.000	$99.100	$57.000	$71.300	32882186	26/03/2025
SEBASTIAN ESPAÑA ARDILA	$227.800	$178.000	$99.100	$57.000	$71.300	32882186	26/03/2025
JONATHAN ESPAÑA MEDINA	$227.800	$178.000	$99.100	$57.000	$71.300	32882186	26/03/2025
LEONARDO GOMEZ QUIHAYAS	$227.800	$178.000	$99.100	$57.000	$71.300	32882186	26/03/2025
WILMAR SANTIAGO IDROBO CLAROS	$227.800	$178.000	$99.100	$57.000	$71.300	32882186	26/03/2025
JOSE DUBERNEY VILLAREAL CUERVO	$227.800	$178.000	$99.100	$57.000	$71.300	32882186	26/03/2025
WILSON JAVIER VILLARREAL CUERVO	$227.800	$178.000	$99.100	$57.000	$71.300	32882186	26/03/2025
CARLOS ALBERTO LOPEZ CHAUX	$227.800	$178.000	$99.100	$57.000	$71.300	32882186	26/03/2025

c). Actividades Operativas.	La interventoría, en calidad de ente supervisor, gestiono, reviso y aprobó las siguientes actividades: Compactación manual de recebo: Se lleva a cabo la compactación manual del material de recebo en las áreas correspondientes, asegurando la estabilidad y firmeza del terreno para futuras construcciones. Armado de estructura para formaleta en el eje B: Se realiza el armado de la estructura metálica necesaria para las formaletas en el eje B, garantizando la correcta conformación de las vigas y elementos de cimentación. Armado de canastas para viga canal en el eje B: Se prepara y ensambla el refuerzo de acero en forma de canastas para la viga canal ubicada en el eje B, cumpliendo con las especificaciones de diseño estructural.

	Fundición de vigas corona en los ejes A y B: Se procede con el vaciado de concreto en las vigas corona de los ejes A y B, siguiendo los procedimientos técnicos adecuados para asegurar la resistencia y durabilidad de las mismas. Instalación de manto zetal en viga canal: Se instala el manto de material zetal sobre la viga canal, garantizando la impermeabilización y protección de las estructuras de concreto contra filtraciones. Instalación de bajantes en tubería de 4": Se lleva a cabo la instalación de las bajantes en la tubería de 4", asegurando el adecuado drenaje y evacuación de aguas pluviales o residuales. Instalación de filtros en tubería tipo pesada PVC de 6": Se instalan los filtros en las tuberías de PVC de 6" para asegurar un adecuado sistema de drenaje y filtrado en las conducciones de agua. Construcción de placa para andén: Se ejecuta la construcción de la placa de concreto para el andén, siguiendo las dimensiones y especificaciones requeridas para su funcionalidad y durabilidad. Construcción de cajas de inspección de 0.70 x 0.70: Se realizan las obras de excavación y construcción de cajas de inspección de 0.70 x 0.70 metros, que permitirán el acceso para mantenimiento y revisión de las instalaciones subterráneas. Mantenimiento de cancha multifuncional: Se efectúa el mantenimiento periódico de la cancha multifuncional, asegurando su adecuado estado para el uso recreativo y deportivo. Demarcación de cancha con pintura de tráfico: Se realiza la demarcación de las líneas y áreas de la cancha utilizando pintura de tráfico, asegurando la visibilidad y durabilidad del trazado. Construcción de cuneta de concreto: Se lleva a cabo la construcción de cunetas de concreto para garantizar un sistema eficiente de drenaje en el área, evitando acumulaciones de agua en las vías. Excavación manual para tubería eléctrica: Se realiza la excavación manual de zanjas para la instalación de tubería eléctrica, asegurando la correcta colocación y protección de las conducciones. Fabricación de cajas de inspección para alumbrado público de 0.40 x 0.40: Se fabrican y colocan cajas de inspección de 0.40 x 0.40 metros para el alumbrado público, que permitirán la conexión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas.
d). **Actividades Logísticos.**	1. Se realiza la revisión diaria de los avances de la bitácora de obra. 2. Se realiza la medición de las actividades realizadas en la ejecución del contrato 3. Se inician actividades de proyección de acta parcial de obra. 4. Se realizó la revisión de las vigencias de las pólizas del contrato de obra las cuales fueron remitidas a la entidad y cargadas al SECOP II. 5. Se verifica en obra el cumplimiento legal de seguridad industrial y salud ocupacional. Entrega de dotación y afiliaciones del personal. 6. Se realizaron comités de obra donde se expone actividades logísticas y administrativas realizadas.

e). Obligaciones de Carácter Ambiental.

1. Se hace control y seguimiento al Informe HSEQ entregado por el contratista para verificar su cumplimiento en obra.

f). Actividades Financieras.

1. Se proyecta acta parcial para cobro de obra e interventoría.

g). Actividades Jurídicos.

1. Se realiza seguimiento a pólizas y garantías

Póliza legalización del CONTRATO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-101051701	0	02/11/2023	Cumplimiento del contrato	02/11/2023	02/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	02/11/2023	02/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/11/2023	02/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-101018824	0	02/11/2023	02/11/2023	02/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-101051701	1 Y 2	20/11/2023	Cumplimiento del contrato	02/11/2023	02/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	02/11/2023	02/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/11/2023	02/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-101018824	1 Y 2	20/11/2023	02/11/2023	02/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION No. 1 - ACTA DE REINICIO No. 1:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-101051701	3 Y 4	20/11/2023	Cumplimiento del contrato	16/11/2023	16/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	16/11/2023	16/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/11/2023	16/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-101018824	3,4 Y 5	02/10/2024	16/11/2024	20/11/2024

Póliza actualizada x OTROSI MODIFICATORIO No.2

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISION	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-101051701	5, 6 Y 7	18/11/2024	Cumplimiento del contrato	16/11/2023	20/06/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	16/11/2023	02/06/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/11/2023	20/12/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISION (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-101018824		18/11/2024	16/11/2024	20/11/2024

Póliza actualizada x OTROSI MODIFICATORIO No.3

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-101051701	8	19/12/2024	Cumplimiento del contrato	16/11/2023	25/07/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	16/11/2023	25/07/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/11/2023	25/01/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-101018824	8	19/12/2024	16/11/2024	25/07/2025

Póliza actualizada x OTROSI MODIFICATORIO No.4

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-44-101051701	9	21/01/2025	Cumplimiento del contrato	16/11/2023	25/09/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	16/11/2023	25/09/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/11/2023	30/03/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si ampara 5 años,0 meses y 0 días	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS DEL ESTADO SA	61-40-101018824	6,7	21/01/2025	16/11/2024	25/06/2025

9. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

Las temperaturas máximas diarias son alrededor de 26 °C, rara vez bajan a menos de 24 °C o exceden 28 °C.

Las temperaturas mínimas diarias son alrededor de 18 °C, rara vez bajan a menos de 16 °C o exceden 19 °C. La temperatura baja promedio diaria más alta es 18 °C el 24 de enero.

< Ene. Feb 2025 Vista Mar. >

SOL	LUN	MAR	MIÉ	JUE.	VIE	SÁB
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15 32° 22°
16 31° 21°	17 31° 21°	18 31° 21°	19 31° 22°	20 32° 22°	21 29° 22°	22 28° 22°
23 32° 22°	24 33° 23°	25 33° 22°	26 33° 23°	27 29° 21°	28 33° 21°	1 32° 22°
2 30° 21°	3 30° 22°	4 31° 21°	5 29° 21°	6 27° 21°	7 30° 21°	8 29° 21°

ILUSTRACIÒN 2. TIEMPO MUNICIPIO DE TIMANÁ

10. ENSAYOS DE LABORATORIO

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
			7	14	28			
CONCRETOS COLUMNAS	20/01/2025	27/01/2025	X			2100 PSI	2188 PSI	CUMPLE
		27/01/2025	X			2100 PSI	2225 PSI	CUMPLE
		03/02/2025		X		2700 PSI	2811 PSI	CUMPLE
		03/02/2025		X		2700 PSI	2859 PSI	CUMPLE
		17/02/2025			X	3000 PSI	3407 PSI	CUMPLE
		17/02/2025			X	3000 PSI	3450 PSI	CUMPLE

11. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo (25%)	N/A			
Acta Parcial No. 1				
Acta Parcial No. 2		$	$	$
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 88.657.430,00	$ 0	$ 88.657.430,00	$	$ 88.657.430,00

12. COMITES DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
07/02/2025	OBRA	Finiquitar las columnas, iniciando con el encofrado de la VIGA y terminar la compactación mecánica.

14/02/2025	OBRA	Finalizar columnas del eje A, Compactación mecánica.
21/02/2025	OBRA	Fundir las vigas con concreto premezclado, desencofrar e impermeabilizar las vigas.
28/02 /2025	OBRA	Solicitud de seguimiento de suspensión, programación de cubierta autoportante.

13. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

Pólizas de cumplimiento (Endoso 3 (No61-44-101051701.)			DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso 3 (No. 61-40-101018824))			DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso 4 (No61-44-101051701.)			DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso 4 (No. 61-40-101018824))			DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso 5 (No. 61-40-101018824))			DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso 5, 6, 7 (No61-44-101051701.)			DIGITAL
Pólizas R.C. (Endoso 4 (No. 61-40-101018824))			DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso 9 (No 61-44-101051701.)			DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso 6, 7 (No. 61-40-101018824))			DIGITAL
Copias de Bitácora de Obra (periodo del 01/02/2025) al (28/02/2025)	07/03/2025		FISICO
Actas de comités (periodo del 01/02/2025) al (28/02/2025)	07/03/2025		FISICO
Planillas de aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP) periodo del 01/02/2025) al (28/02/2025)	07/03/2025		FISICO
Correspondencia periodo del 01/02/2025) al (28/02/2025)	07/03/2025		FISICO
Registros de ensayos de calidad periodo del 01/02/2025) al (28/02/2025)	07/03/2025		FISICO

14. RELACION DE PERSONAL (Profesional Interventoría)

NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	7.711.430	REPRESENTANTE LEGAL	PRESTACIÓN DE SERVICIO
JOSE WILMER CHILITO	76.320.749	CONSORCIADO	PRESTACIÓN DE SERVICIO
JAVIER HUMBERTO GIRALDO JIMENEZ	1.083.886.304	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	PRESTACIÓN DE SERVICIO

15. RELACIÓN DE PAGOS (OBRA)

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA
ANTICIPO	2024001265	23 DE OCTUBRE DE 2024

16. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	562.900	439.800	85.700	0	0	7965577178	3103/2025
JAVIER HUMBERTO GIRALDO JIMENEZ	$227.800	$178.000	$34.700	0	0	9483029204	12/03/2025

17. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

LEGALIZACION DEL CONTRATO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010098	0	09/11/2023	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	09/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	09/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	09/02/2024	09/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	0	Amparo Básico, Predios, Labores y Operaciones	09/11/2023	09/02/2024

POLIZA ANULADA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010098	1	21/11/2023	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	09/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	09/02/2027
				Calidad del Servicio	09/02/2024	09/02/2029
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	AMPARO		VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002028	1	Amparo Básico, Predios, Labores y Operaciones		09/11/2023	09/02/2024

PÓLIZA ACTUALIZADA – INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010098	2	21/11/2023	Cumplimiento del contrato	16/11/2023	16/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/11/2023	16/02/2027
				Calidad del Servicio	16/02/2024	16/02/2029
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	AMPARO		VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002028	2	Amparo Básico, Predios, Labores y Operaciones		16/11/2023	16/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100010098	3	28/09/2024	Cumplimiento del contrato	17/09/2024	17/05/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/09/2024	17/11/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2024	17/11/2029

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)					
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100002028	3	28/09/2024	16/11/2023	17/11/2024

Póliza actualizada X otrosi 1

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100010898	4	28/09/2024	Cumplimiento del contrato	17/09/2024	17/05/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/09/2024	17/11/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2024	17/11/2029

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)					
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100002028	4	28/09/2024	16/11/2023	17/11/2024

Póliza actualizada X otrosi 2

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100010098	5	02/12/2024	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	07/06/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	12/11/2024	07/12/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	07/11/2024	07/12/2029

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)					
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100002028	5	02/12/2024	16/11/2023	07/12/2024

Póliza actualizada X otrosi 3

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100010898	6	18/12/2024	Cumplimiento del contrato	02/12/2024	07/07/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	02/12/2024	07/01/2028
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	07/01/2025	07/01/2030

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)					
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100002028	6	18/12/2024	16/11/2023	07/01/2025

Póliza actualizada X otrosi 4

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100010098	7	22/01/2025	Cumplimiento del contrato	27/12/2024	10/08/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	27/12/2024	10/12/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10/02/2025	10/02/2030


PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)					
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100002028	7	22/01/2025	16/11/2023	10/02/2025

Póliza actualizada X otrosi 5

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100010098	7	22/01/2025	Cumplimiento del contrato	27/12/2024	10/08/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	27/12/2024	10/12/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10/02/2025	10/02/2030

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)					
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100002028	7	22/01/2025	16/11/2023	10/02/2025

18. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
(Describir el contenido del plano)

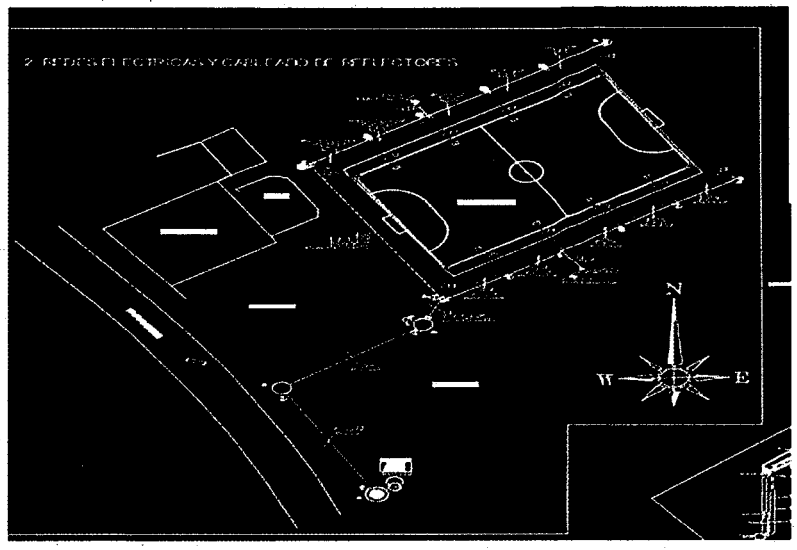

Concreto Ciclopeo - 2500 PSI (175 KG/CM2) 60% Concreto 2500 PSI + 40% Piedra media zonga

19. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

	CONDICIONES CONTRACTUALES					EJECUCIÓN DE OBRA MENSUAL			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR		CANT	% EJECUCION
1	**Preliminares**									
1.1	Localización y replanteo.	M2	900.42	$ 3,558.00	$ 3,203,694.00		$ -	0.000000000000%	900.42	0.63903891558605%
1.2	Corte de Placa de concreto e= 0.10 mts.	ML	157.80	$ 26,280.00	$ 4,146,984.00		$ -	0.000000000000%	74.90	0.39262997912720%
1.3	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	108.84	$ 116,723.00	$ 12,704,131.00		$ -	0.000000000000%	108.84	2.53408537073239%
1.4	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	217.73	$ 46,003.00	$ 10,016,233.00		$ -	0.000000000000%	217.73	1.99793197308395%
1.5	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	201.44	$ 83,849.00	$ 16,890,543.00	39.44	$ 3,307,005.00	0.659646298629%	201.44	3.36914645480485%
1.06 NP	Relleno, crudo de rio para filtrar y compactar, mecanicamente.	M3	54.49	$ 127,780.00	$ 6,962,732.00		$ -	0.000000000000%	54.49	1.38885196488688%
1.07 NP	Filtro en tuberia de drenaje de 4" PVC perforada	ML	94.50	$ 138,014.00	$ 13,042,323.00		$ -	0.000000000000%	94.50	2.60154432559508%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 66,966,640.00**		**$ 3,307,005.00**			
2	**CIMENTACIÓN**									
2.1	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	16.40	$ 34,012.00	$ 557,797.00		$ -	0.000000000000%	16.40	0.11126343214962%
2.2	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	34.56	$ 619,063.00	$ 21,394,817.00		$ -	0.000000000000%	34.56	4.26761128086578%
2.3	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	2,462.20	$ 7,116.00	$ 17,521,015.00		$ -	0.000000000000%	2462.20	3.49490632550016%
2.4	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño,	M3	12.20	$ 742,041.00	$ 9,052,900.00		$ -	0.000000000000%	12.20	1.80577651889006%

2.5	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación.	KG	1,257.66	$ 7,116.00	$ 8,949,509.00	154.28	$ 1,097,856.00	0.21898867610628%	1257.66	1.78515317829593%
2.6	Concreto Ciclopeo - 2500 PSI (175 KG/CM2) 60% Concreto 2500 PSI + 40% Piedra media zonga	M3	76.03	$ 360,003.00	$ 27,371,028.00		$ -	0.00000000000000%	76.03	5.45968249514324%
2.07 NP	Suministro e instalacion de plastico negro 3,5 impermehabilizacion.	M2	138.72	$ 15,257.00	$ 2,116,451.00		$ -	0.00000000000000%	138.72	0.42216720820747%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 86,963,517.00**		**$ 1,097,856.00**			
3	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**									
3.1	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	17.04	$ 920,829.00	$ 15,690,926.00		$ -	0.00000000000000%	17.04	3.12985957322421%
3.2	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	3,894.25	$ 7,116.00	$ 27,711,483.00		$ -	0.00000000000000%	3894.25	5.52759284925504%
3.3	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.	M3	19.37	$ 1,004,876.00	$ 19,464,448.00	19.37	$ 19,464,448.00	3.88256173729484%	19.37	3.88256173729484%
3.4	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	2,348.55	$ 7,116.00	$ 16,712,282.00	1348.55	$ 9,596,282.00	1.91416459965837%	2348.55	3.33358884033502%
3.5	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	65.80	$ 40,347.00	$ 2,654,833.00	65.80	$ 2,654,833.00	0.52955794198262%	65.80	0.52955794198262%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 82,233,972.00**		**$ 31,715,563.00**			
4	**CUBIERTA**									
4.1	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	845.53	$ 211,559.00	$ 178,879,481.00			0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 178,879,481.00**		**$**			
5	**ACABADOS - PLACA EN CONCRETO**									
5.1	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	307.11	$ 14,798.00	$ 4,544,614.00	0	$ -	0.00000000000000%	0.00	0.00000000000000%

5.2	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	0.00	$ 3,710,773.00	$ -		$ -	0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%
5.3	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	140.28	$ 73,943.00	$ 10,372,724.00	0	$ -	0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%
5.4	Cuneta en concreto de 3.000psi, segun diseño	ML	69.80	$ 83,852.00	$ 5,852,870.00	0	$ -	0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%
5.05 NP	Mantenimiento de cancha multifuncional Futbol de Salón, Baloncesto, incluye pintura, mallas, demarcado y logos.	UND	2.00	$ 736,291.00	$ 1,472,582.00	0.00	$ -	0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 22,242,790.00**		**$ -**			
6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**									
6.1	Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión;. para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	49.60	$ 80,145.00	$ 3,975,192.00	0	$ -	0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%
6.2	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.	ML	23.68	$ 107,091.00	$ 2,535,915.00	0	$ -	0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%
6.3	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	24.00	$ 219,053.00	$ 5,257,272.00	0.00	$ -	0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%
6.4	Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	2.00	$ 349,989.00	$ 699,978.00	0.00	$ -	0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%
6.5	Construcción de filtros laterales externos en un ancho de 0,40 mts, con altura variable menor a 0,50 mts, recubrimiento en geotextil no tejido NT-1600, con gravilla común o triturado de 1 1/2" a 4"+ tubería PVC drenaje de 6"	ML	91.04	$ 63,617.00	$ 5,791,692.00	0	$ -	0.000000000000000%	0.00	0.000000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 18,260,049.00**		**$ -**			
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**									
7.1	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	3.00	$ 638,903.00	$ 1,916,709.00	3.00	$ 1,916,709.00	0.382324791585560%	3.00	0.382324791585560%

7.2	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	16.24	$ 46,003.00	$ 747,089.00	0	$ -	0.000000000000%	0.00	0.000000000000%
7.3	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	ML	29.00	$ 49,342.00	$ 1,430,918.00		0	0.000000000000%	0.00	0.000000000000%
7.4	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2.00	$ 304,503.00	$ 609,006.00		0	0.000000000000%	0.00	0.000000000000%
7.5	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	2.00	$ 282,276.00	$ 564,552.00		0	0.000000000000%	0.00	0.000000000000%
7.6	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1.00	$ 1,016,827.00	$ 1,016,827.00		0	0.000000000000%	0.00	0.000000000000%
7.7	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1.00	$ 4,701,216.00	$ 4,701,216.00		0	0.000000000000%	0.00	0.000000000000%
7.8	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 AL ser8000 + 1x8 CU.	ML	12.00	$ 88,535.00	$ 1,062,420.00		0	0.000000000000%	0.00	0.000000000000%
7.9	Suministro e instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12.00	$ 368,969.00	$ 4,427,628.00		0	0.000000000000%	0.00	0.000000000000%
7.10	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	64.00	$ 58,153.00	$ 3,721,792.00		0	0.000000000000%	0.00	0.000000000000%
7.11	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12.00	$ 1,018,790.00	$ 12,225,480.00		0	0.000000000000%	0.00	0.000000000000%
7.12	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1.00	$ 975,015.00	$ 975,015.00		0	0.000000000000%	0.00	0.000000000000%
7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	1.00	$ 1,035,368.00	$ 1,035,368.00		0	0.000000000000%	0.00	0.000000000000%
7.14	Excavación, hincada y plomada de postes de concreto de 8 mts x 510 kg armado y centrifugado.	UND	2.00	$ 2,252,908.00	$ 4,505,816.00	2	4505816	0.898772407873623%	2.00	0.898772407873623%
7.15	Vestida de estructura de retencion en baja tensiòn con grapa de retencion para cable trenzado y percha de gancho abierto.	UND	1.00	$ 340,951.00	$ 340,951.00		0	0.000000000000%	0.00	0.000000000000%
7.16	Vestida de estructura de retención doble en baja tensión con dos grapas de retención para cable trenzado con perno de gancho abierto y percha de gancho abierto para sujeción de la red trenzada.	UND	1.00	$ 236,067.00	$ 236,067.00		0	0.000000000000%	0.00	0.000000000000%


7.17	Vestida de estructura de retención en baja tensión con grapa de retención para cable trenzado y perno de gancho abierto.	UND	1.00	$ 340,951.00	$ 340,951.00		0	0.000000000000%	0.00	0.000000000000%
7.18	Tendido y tensionado en conductor trenzado de aluminio aislado 2x35 mm + 50 mm tipo PE-XLPE - 600 VAC.	ML	55.00	$ 46,080.00	$ 2,534,400.00		0	0.000000000000%	0.00	0.000000000000%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 42,392,205.00**		**$ 6,422,525.00**			
8	TRANSPORTE									
8.1	Transporte de materiales petreos	M3-Km	3,083.07	$ 1,100.00	$ 3,391,377.00			0.000000000000%	3083.07	0.676475930729799%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 3,391,377.00**		**$**			
% AVANCE DE OBRA								**8.486016453129620%**		**48.630523535044330%**


NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.


ING. HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON
DIRECTOR DE OBRA


JAVIER HUMBERTO GIRALDO JIMÉNEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

1. REGISTRO FOTOGRAFICO

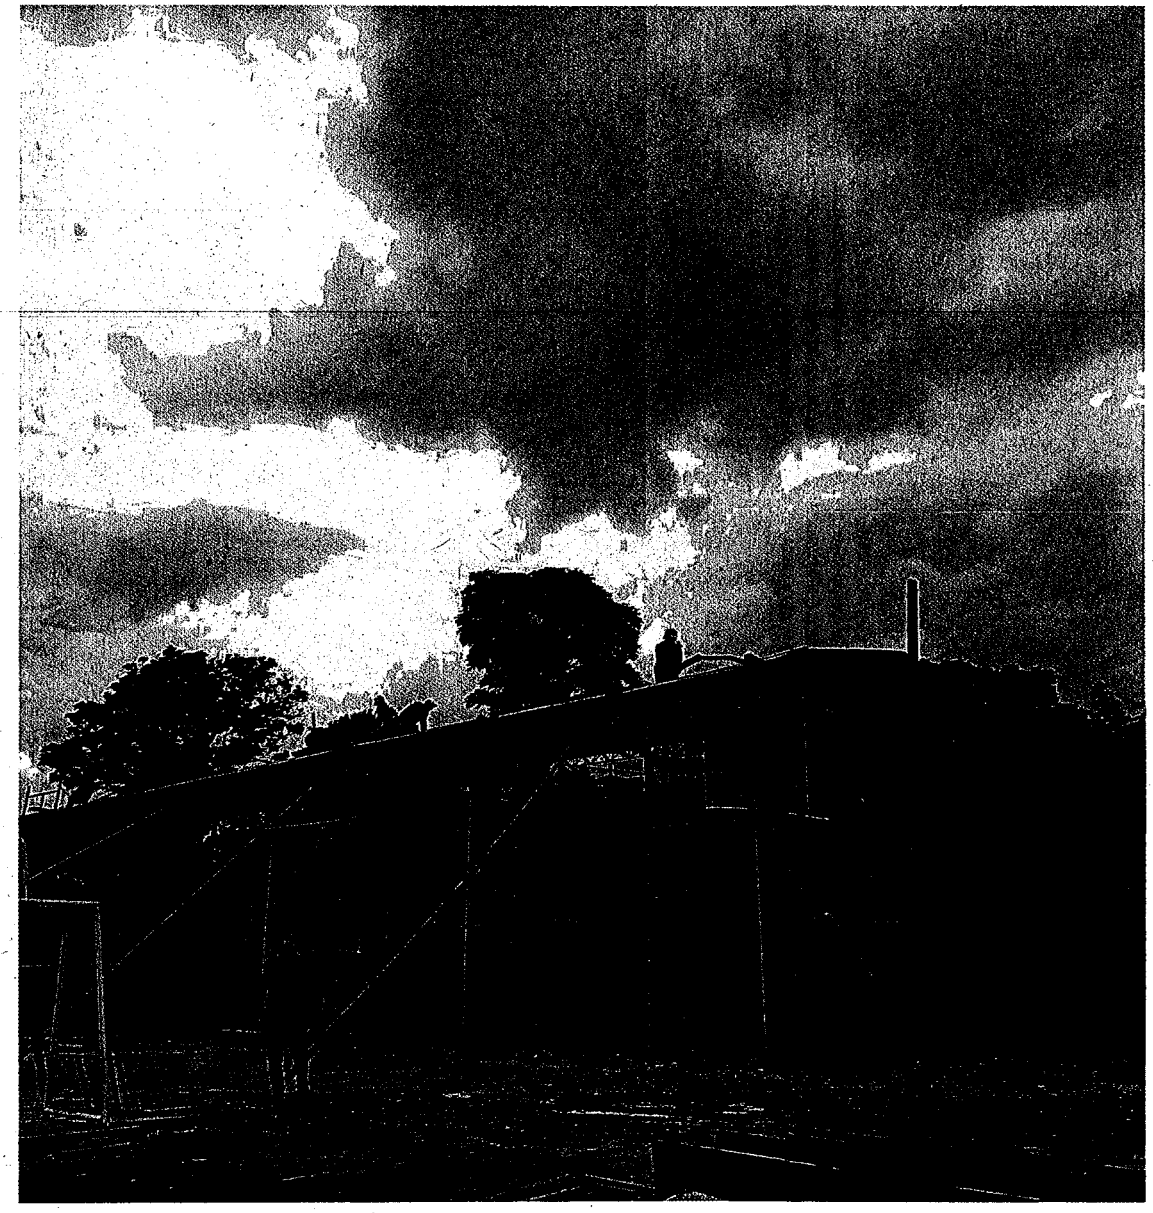

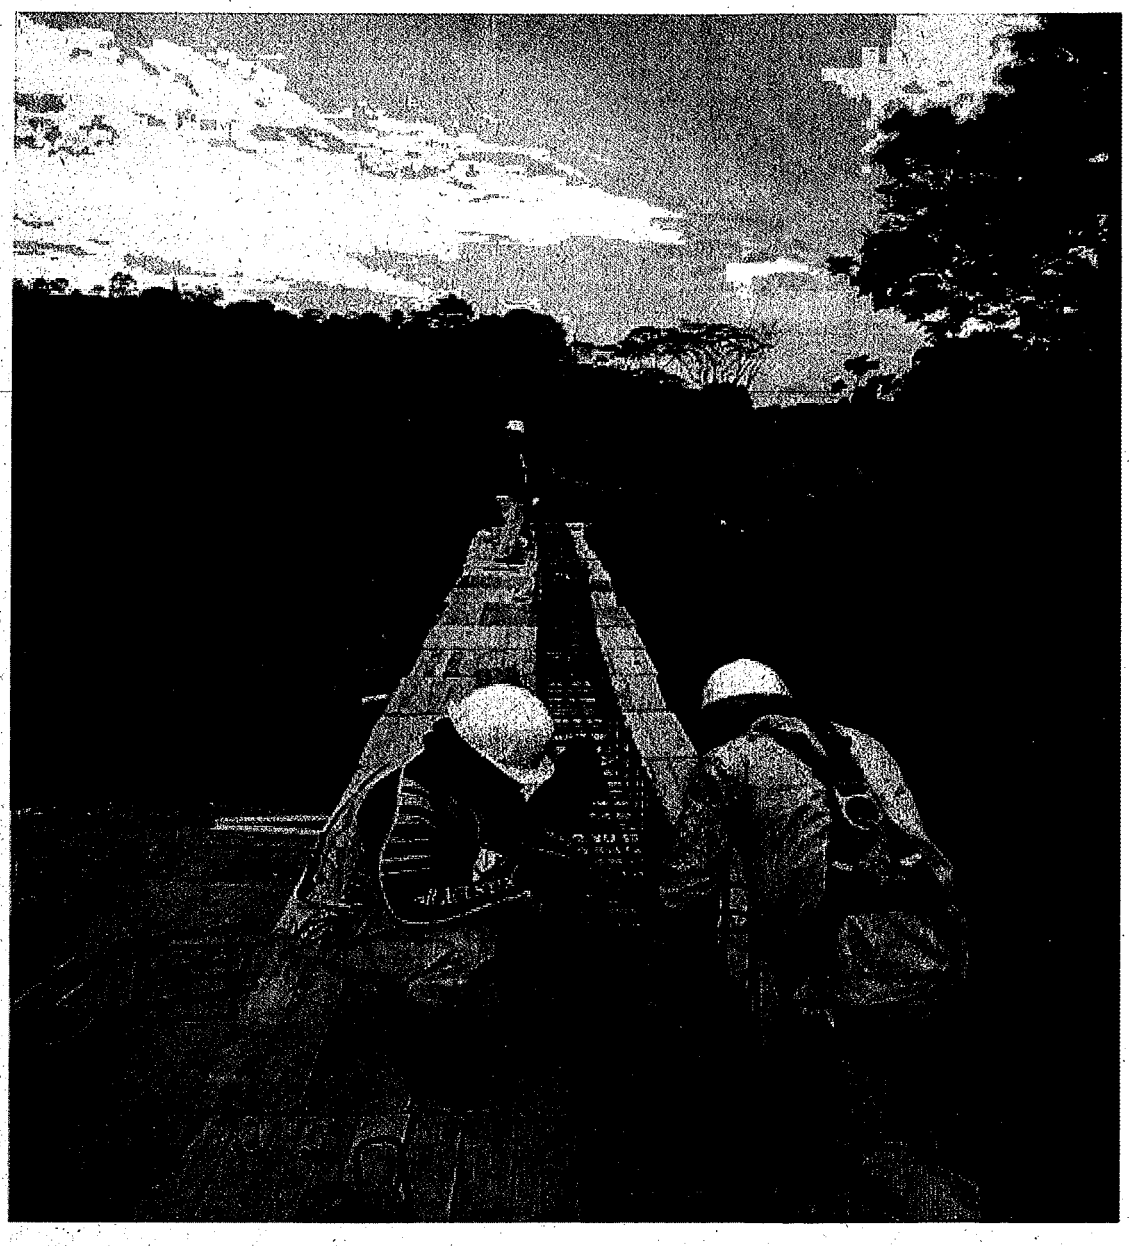


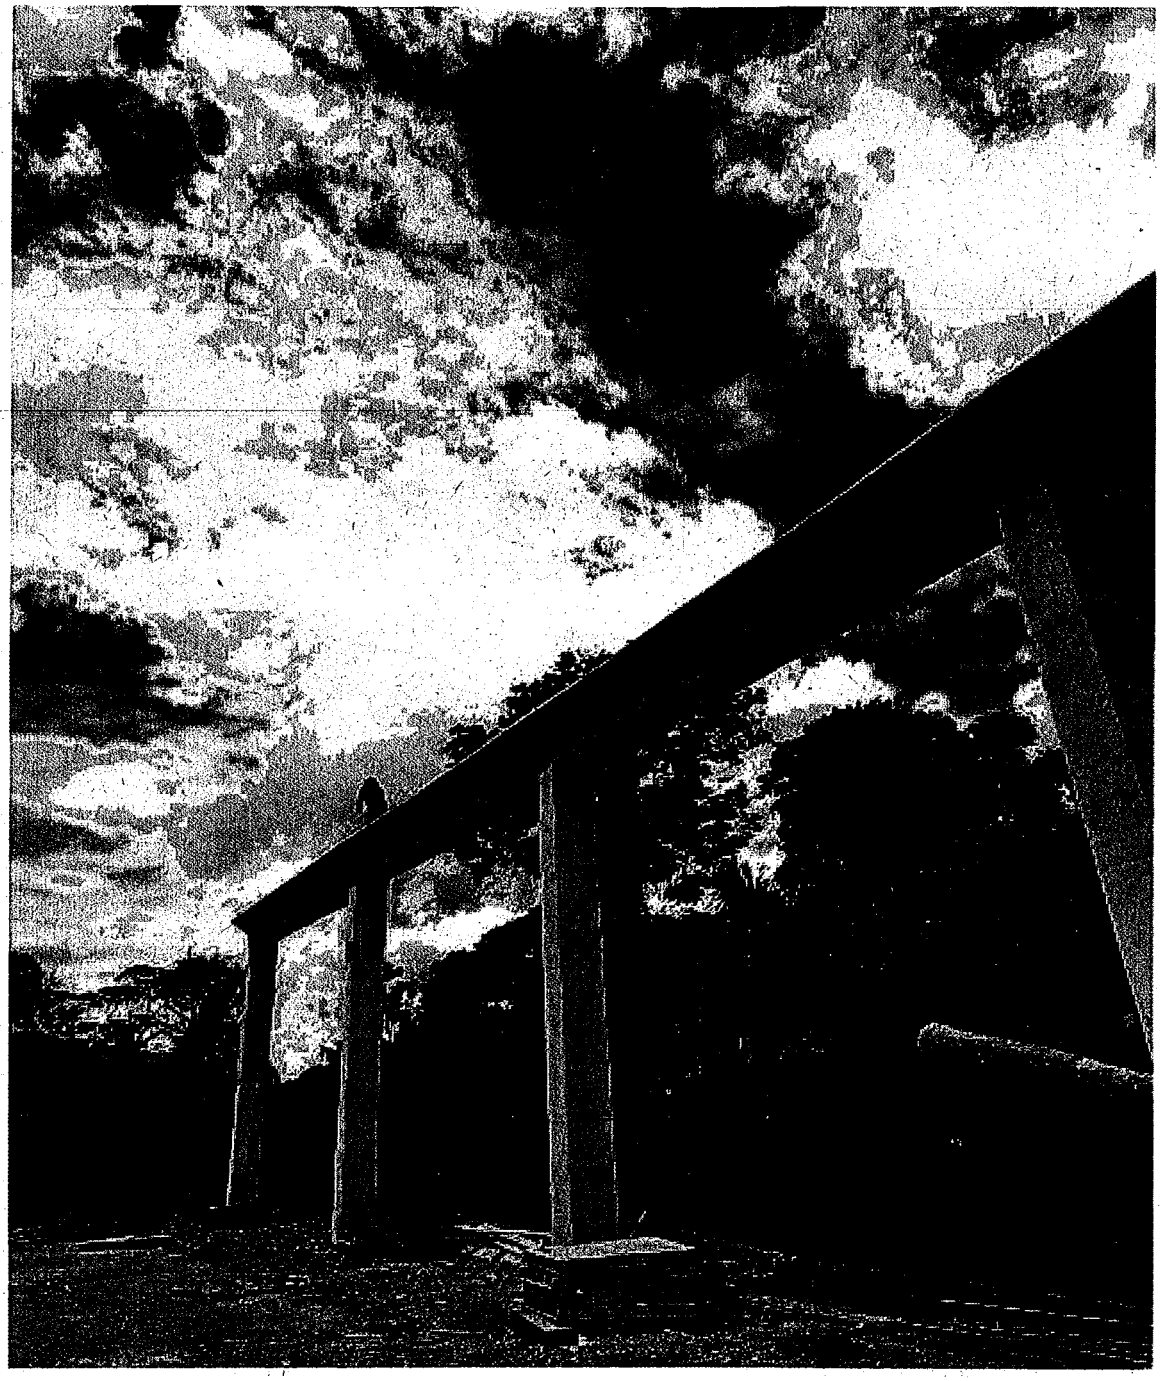

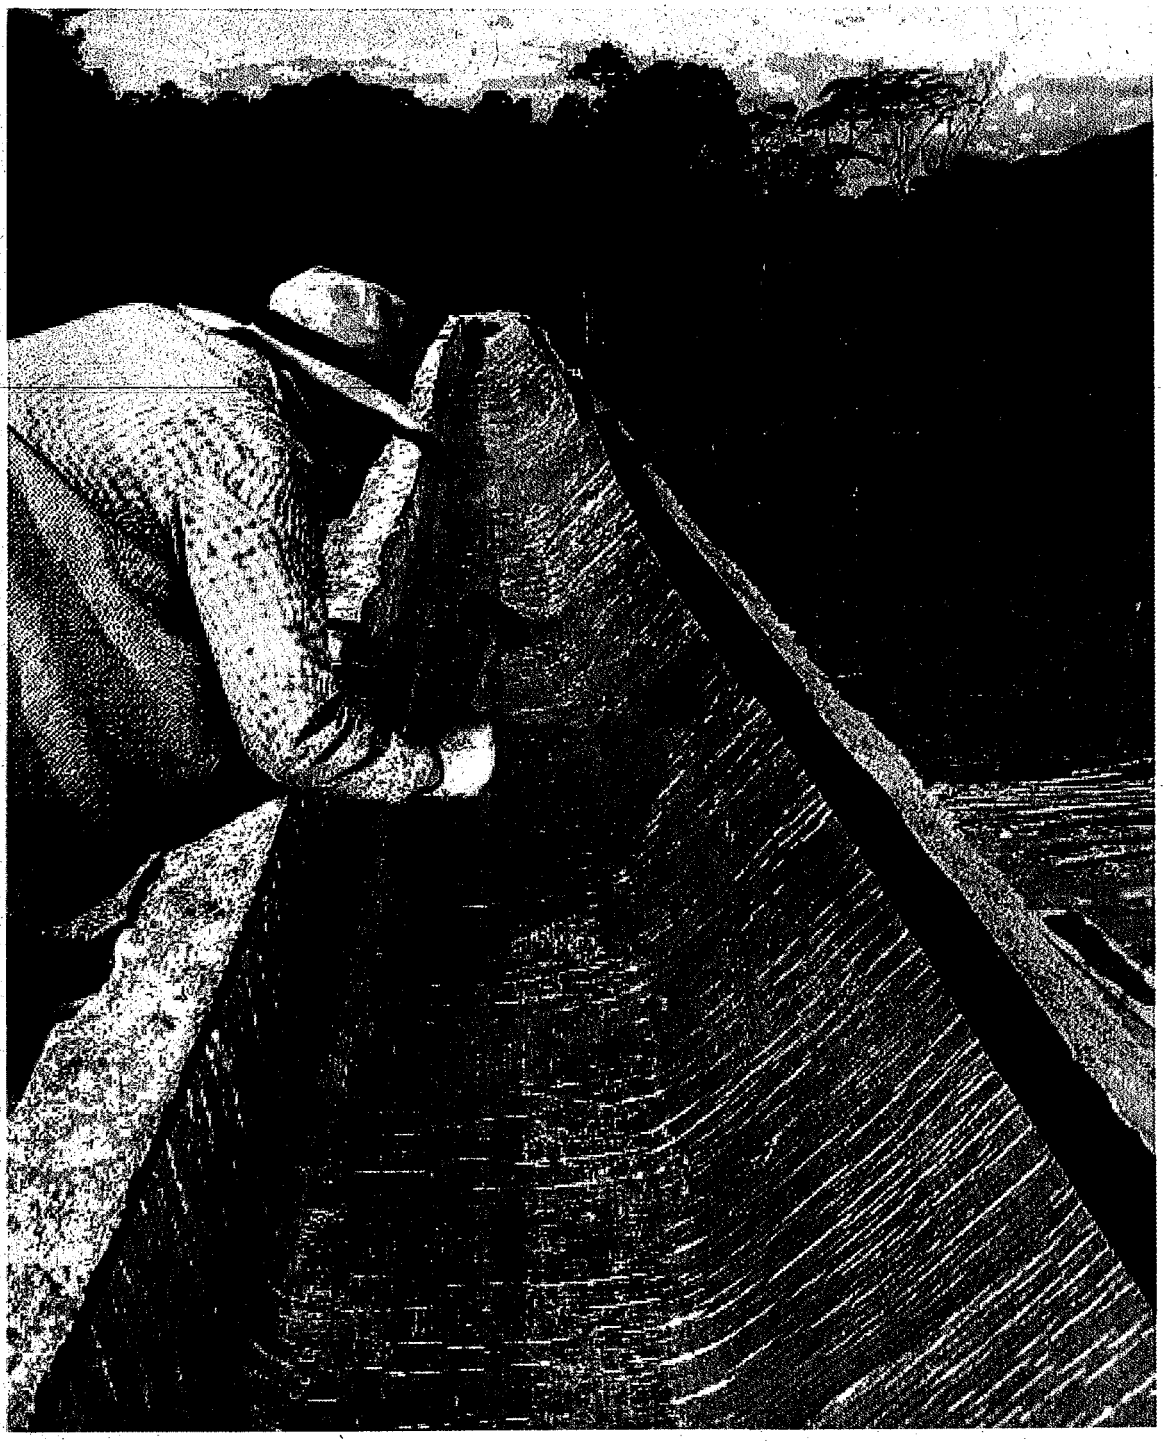





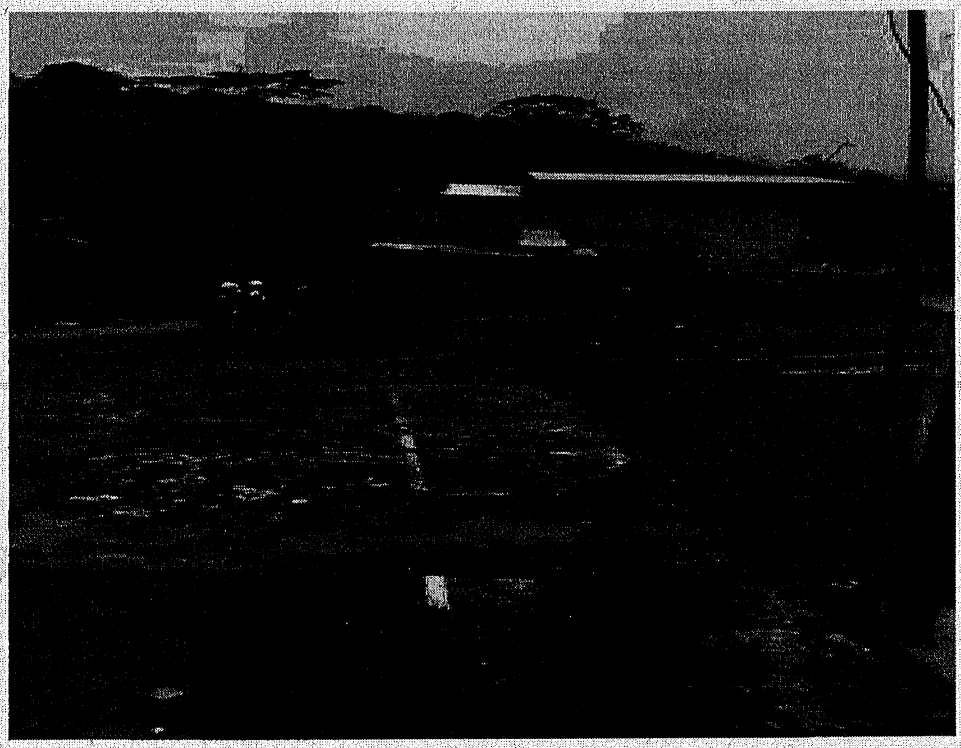

1. ANEXOS

- BITÁCORA DE OBRA.
- ACTAS DE COMITÉS.
- RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIOS
- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP).

R.L. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	(12/03/24)	ARQ. JUAN ALARCON
FIRMA ORIGINAL **INTERVENTOR**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo.Bo APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Timana Huila, 31 enero de 2025

Hora 7:00 am Hora Final 5:00pm.

Clima soleado

Personal en obra ing residente, oficiales ayudantes SISO

Herramientas y equipos.

Se acaban de amarra los traslapes faltantes de las vigas.

Wilson Parra.

Residente inter.

Timana Huila 1 Feb de 2025

Hora inicial 7:am Hora Final. 5:Pm.

Clima Frio

Personal en obra. ing residente, oficiales ayudantes

Herramientas y equipos

Se empieza amarrar estribos de columnas eje A.

Wilson Parra

Residente inter.

Timana Huila 3 Febrero 2025.

Hora inicial 7:am Hora Final. 5:Pm.

Clima soleado

Personal en obra ing residente, oficiales ayudantes SISO

Se continua con el armado de canastas para las columnas eje A.

Wilson Parra.

Residente inter.

Timana Huila 4 Febrero 2025.

Hora inicial 7:00 am Hora Final 5 Pm
Clima lluvioso, lluvias Tenues.
Personal en obra, ing residente, ayudantes
Oficiales.
Herramientas y equipos.
Se continuan amarrando columnas eje
A.

Residente Inter.

Timana Huila 5 de Febrero 2025.
Hora inicial 7:am. Hora Final 5: Pm
se encuentra un clima lluvioso
Personal en obra, ing residente, ayudantes
Oficiales
Herramientas y equipos.

se continuan Fundiendo columnas eje
B. Wilson Parra

Residente inter.

Timana Huila 6 de Febrero de 2025
Hora Inicial 7:am. Hora Final 5: Pm.
clima lluvioso,
Personal en obra, ing residente, siso
Oficiales y maestro

Se empiezan a amarrar traslapes de
Columnas para Eje A.

Wilson Parra.

Residente Inter.

Timana Huila 7 de Feb de 2025.
Hora inicial 7:am Hora Final 5:Pm.
Clima soleado en la mañana, lluvias en horas de la tarde.
Personal en obra ing residente, ayudantes SISO, OFicoles.
Herramientos y equipos

Se continua Figurando acero para los traslapes de las columnas

Wilson Parra. Residente Inter.

Timana Huila 8 de Febrero de 2025.
Hora Inicial 7:am. Hora Final 13:Pm.
Clima soleado
Personal en obra: Ing Residente, oficoles ayudantes, SISO
Herramientos y equipos.

Se continua Fundiendo columnas eje B.

Wilson Parra. Residente Inter.

Timana Huila 10 de Febrero de 2025
Hora inicial 7:am Hora Final 5:Pm.
Clima lluvioso lluvias Fuertes
Personal en obra: ing residente, oficoles ayudantes. SISO

Se inicia instalacion de traslapes de columnas eje A.

Wilson Parra. Residente Inter.

Timana Huila 11 de Febrero de 2025
Hora Inicial 7:00 am Hora Final 5: Pm
Clima lluvioso
Personal en obra ing residente, oficiales ayudantes
Herramientas y equipos

Se continua amarrando columnas eje A Estribos cada 6 cm segun Planos y Especificaciones

Wilson Parra

residente inter

Timana Huila 12 de Febrero de 2025
Hora Inicial 7:00 am Hora Final 5:00 Pm
Clima lluvioso, lluvias fuertes toda la mañana
Personal en obra ing residente; oficiales ayudantes

se recibe material de Playa Grava 3/4
se continua con el amarre de los traslapes de las columnas eje B, se empieza a compactar eje B

Wilson Parra.

residente inter.

Timana Huila Febrero 13 de 2025
Hora Inicial 7:am Hora Final 5: Pm.
Clima lluvioso, en horas de la tarde.
Personal en obra: Ing residente, oficiales ayudantes
Herramientas y equipos
Se continuan amarrando traslapes de Columnas eje A.

Wilson Parra.

residente inter

Timana Huila 14 de Febrero 2025
Hora inicial: 7:00 am Hora Final 5:00Pm.
Clima lluvioso; en horas de la mañana.
Personal en obra: Ing residente, OFICIALES
Obreros
Herramientas y equipos
llega recebo para compactar eje
A 140m3, se comienza a compactar
eje A, se desencofra columnas eje B.

Wilson Parra. Residente inter.

Timana Huila 15 de Febrero de 2025
Clima lluvioso
Hora inicial 7:am, Hora Final 17 Pm.
Personal en obra. Ing residente, OFICIALES
Obreros.
Herramientas y equipos

se realiza desencofrado de columnas
se Funde columna eje A AG,
Fundicion de Pedestales.

Wilson Parra. Residente inter.

Timana Huila 16 de Febrero 2025
Hora inicial 7:am. Hora Final 12 Pm.
Clima lluvioso; lluvias Fuertes
Toda la mañana no pudimos realizar
actividades.

Wilson Parra. Residente inter.

Timana Huila 17 de Febrero 2025
Hora Inicial 7:am Hora Final 5:Pm.
clima lluvioso en horas de la mañana
Personal en obra · Ing residente, oficiales
ayudantes,
Herramientos y equipos
se realiza fundicion de columnas
Faltantes eje B, compactacion
mecanica eje A)

Wilson PARRA.

Residente
Inter

Timana Huila 18 de Febrero de 2025
Hora Inicial 7:00 am hora Final 5:Pm.
Clima · lluvioso, lluvias Fuertes horas de la
mañana.
Personal en obra: Ing residente, oficiales
ayudantes
Herramientos y equipos.

Descofrado de columnas eje B,
compactacion mecanica eje A,
Capacitacion SISO

Wilson Parra.

Residente
Inter.

Timana Huila 19 de Febrero de 2025.
Hora Inicial 7:00 am hora Final 5:Pm
Clima lluvioso Fuertes lluvias en horas
de la mañana.
Personal en obra. Ing residente, SISO
oficiales, ayudantes
Herramientos y equipos,
se comienza a encofrar columnas ejeA
se comienza excavacion para Filtro de tuberia

Perforada de 4", conexion BG, AG
se inicia armare de canastas para
viga corona.

Wilson Parra.

Residente inter.

Timana Huila, 20 de Febrero de 2025.
Hora inicial 7:00 am Hora Final 17 Pm.
clima lluvioso, lluvias fuertes en horas
de la mañana.
Personal en obra. Ing. residente, Ayudantes
oficiales 5,50.

Se continua excavacion para filtro
en tubera perforada, continuamos
montando formaleta para columnas

Wilson Parra.

Residente inter.

Timana Huila 21 de Febrero de 2025
Hora ingreso 6.00 Am Hora Final 5 Pm.
Clima lluvioso, lluvias fuertes
Personal en obra. Ing residente,
oficiales, ayudantes
Herramientas y equipos
llegan formaletas a la obra para ar
mado de vigas corona,
Se inicia formaleteado de columnas
Pardientes eje A,

Wilson Parra.

Residente inter.

NKB

Escaneado con AnyScanner

Timana Huila 22 Febrero 2025

Hora ingreso 7:am Hora Final 12:Pm
Clima Fuertes lluvios Toda la jornada
Personal en obra, Ing residente, OFICIALES
ayudantes 5;50
Herramientas y equipos

No se Pueden realizar actividades Por
Fuertes lluvios

Wilson Parra

Residente inter

Timana Huila 24 de Febrero de 2025
Hora ingreso 7:00am Hora Final 5:Pm
clima soleado.
Personal en obra; Ing residente, OFICIALES
ayudantes
Herramientas y equipos

Se continua Fornaleteando columnas
eje A, se instala Filtro perforado
4" se tapa excavacion de Filtro; con
Crudo de Rio.

Wilson parra -

Residente inter

Timana Huila 25 de Febrero 2025
Hora ingreso 7; am hora Final 17 Pm
Se inicia el dia con un clima soleado
Personal en obra Ing residente, 5;50
OFICIALES, ayudantes
Herramientas y equipos

Se inicia a Fundir columnas eje A
compactacion mecanica eje A.

NKB

hizo Presencia la interventoria.

Wilson Parra.

Timana Huila 26 Febrero 2025.
Hora 7 am ingreso Hora Final 5: Pm.
Clima Soleado
Personal en obren ing residente, oficiales
ayudantes, SISO.
Herramientas y equipos.

Se continua fundiendo columnas.
Eje A; compactacion manual.

Wilson Parra.

Timana huila 27 febrero de 2025
Hora ingreso 7:00m Hora Final 5: Pm
Clima lluvioso, Lluvios Fuertes en
horas de la mañana.
Personal en obra. ing residente, oficiales,
ayudantes, SISO
Herramientas y equipos.

se continuan Fundiendo columnas eje A.

Wolfson Perra.

Timana Huila Feb. 28 de 2025.
Hora ingreso 7:00 am Hora Final 17 Pm.
clima lluvioso en horas de la tarde
Personal en obra: ing residente, SISO
Oficiales, ayudantes
Herramientas en obra y equipos


se Continua Fundiendo columnas eje A
Grava, arena, dosificacion 3000PSI

Wilson Parra.




Timana Huila 1 marzo de 2025.
Hora entrada 7:00 am Hora Final 17:00Pm
Clima soleado en la mañana, lluvias
Fuertes horas de la tarde
Personal en obra ing residente, oficiales
ayudantes, siso
se inicia encamillado para vigas de ex
B, llega maquina para negar recebo, pero
la lluvias no lo permitio.

Wilson Parra.



Timana Huila 3 de marzo de 2025
Hora ingreso 7:am. Hora Final 17:Pm
Clima lluvioso horas de la mañana
Personal en obra. Ing residente, Oficoles
ayudantes siso
Se realzo descopotroido de columnas
Eje D, se funde cajillos electricos

Wilson Parra.



Timana Huila 4 de marzo de 2025
Timana Huila. Hora ingreso 7:am horaFinal 5.Pm.
Clima soleado, lluvioso en horas de la tarde
Personal en obra Ing residente, oficiales
ayudantes. siso.
se realizan excavaciones para Pozos
se funde cajillos electricos
se continua armando encamillado para viga

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F02
Fecha Aprobación: 13/02/2023	ACTA COMITÉ DE OBRA	Versión: 2

Nombre Proyecto		"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMANETO DEL HUILA"		Acta No.	
No. De Contrato obra		CLPIH 401 DEL 2023	Lugar:	VEREDA PANTANOS (TIMANA HUILA)	
No. De Contrato Interventoría		CIHCM 420 - 2023			
Fecha	07 DE FEBRERO 2025	Hora Inicio	2: PM	Hora Final	5:PM

OBJETO DE LA REUNION
EVALUAR EL ESTADO Y AVANCE DE LA OBRA

AGENDA	
	1-Verificar el avance de la fundición de las columna
	2- Verificar conexiones de los filtros de tubería perforada entre ejes
	3- Compromisos

DESARROLLO

- Se inicia la fundición de columnas para el eje A, verificación de dosificación, agregados, espaciamiento entre estribos, nuevamente con un porcentaje en el avance más significativo, aun, cuando seguimos teniendo dificultades por temas de las lluvias.

- Se realizo compactación de la excavación entre ejes del filtro.

- Se inicia el desprecie del acero para las vigas corona eje B, actividad que podemos ir desarrollando, ya que esta es bajo techo, debido a las altas precipitaciones no se ha podido realizar la compactación manual, y/o mecánica

DESARROLLO

TAREAS – COMPROMISOS – TEMAS PROXIMAS REUNIONES			
Tema	**Tarea**	**Responsable**	**Fecha de Control**
1	Finiquitar las columnas del eje A		
2	Iniciar el armado la estructura de para encofrado de la viga corona		
3	Terminar la Compactación mecánica		

EN CONSTANCIA FIRMAN EL ACTA:		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Heiman Jose Trujillo	Director	
Wilson Parra	Residente	
JAVIER GRAJALES.	RESIDENTE INTERVENTORIA.	

Nombre Proyecto		***"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMANETO DEL HUILA"***		**Acta No.**	
No. De Contrato obra		CLPIH 401 DEL 2023	**Lugar:**	VEREDA PANTANOS (TIMANA HUILA)	
No. De Contrato Interventoría		CIHCM 420 - 2023			
Fecha	14 DE FEBRERO 2025	**Hora Inicio**	2: PM	**Hora Final**	5:PM

OBJETO DE LA REUNION
Socializar el avance de la obra

AGENDA	
	1- Verificar la fundición de las columnas
	2- Verificar el amarrado y despiece de las canastas de las vigas corona
	3- Compromisos

DESARROLLO

- Se logra avanzar en la fundición de las columnas, aunque no es suficiente y aunque es entendible por las condiciones del estado del clima, se determina iniciar labores extras con el fin de lograr un avance mas coherente

- Se programa el armado de la estructura para el encofrado de la viga.

- Contratar maquinaria con el fin de que nos ayude a compactar el recebo faltante y de esta manera empezar encofrado de vigas para los dos ejes

DESARROLLO

TAREAS – COMPROMISOS – TEMAS PROXIMAS REUNIONES			
Tema	**Tarea**	**Responsable**	**Fecha de Control**
1	Finalización de columnas, y compactación eje A		
2	Iniciar las formaletas del eje A		
3	Terminar la Compactación mecánica		

EN CONSTANCIA FIRMAN EL ACTA:		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Heinan Jose Trujillo C.	Director	
Wilson Parra	Residente	
Jhon Cadoo	Residente Interventoria	

Nombre Proyecto		***"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMANETO DEL HUILA"***		**Acta No.**	
No. De Contrato obra		CLPIH 401 DEL 2023	**Lugar:**	VEREDA PANTANOS (TIMANA HUILA)	
No. De Contrato Interventoría		CIHCM 420 - 2023			
Fecha	21 DE FEBRERO 2025	**Hora Inicio**	2: PM	**Hora Final**	5:PM

OBJETO DE LA REUNION
VERIFICAR QUE LAS TAREAS SE HAYAN CUMLIDO A CABALIDAD

AGENDA	
	1- Cuantificar cuantas columnas quedan por fundir
	2- Verificar que las estructuras de los dos ejes hayan empezado para encofrar
	3- Compromisos

DESARROLLO

- Se logro establecer que las columnas del eje A, ya están fundidas, que el armado de las formaletas para encofrar las vigas ya está listo, por lo que se procederá a realizar encofrado y armado de las vigas, ganchos de aletas, programar el concreto premezclado para tener un mejor avance en las vigas coronas

- Se verifico que la maquinaria hizo presencia y realizo la compactación mecánica, del recebo, con estas indicaciones se establece dos frentes de trabajo para sacar las vigas al mismo tiempo

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F02
Fecha Aprobación: 13/02/2023	ACTA COMITÉ DE OBRA	Versión: 2

DESARROLLO

TAREAS – COMPROMISOS – TEMAS PROXIMAS REUNIONES			
Tema	**Tarea**	**Responsable**	**Fecha de Control**
1	Fundir las vigas coronas con concreto premezclado		
2	Desencofrar aletas, e impermeabilizar las vigas		
3	Programar la instalación de cubierta		

EN CONSTANCIA FIRMAN EL ACTA:		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Heinan Jose Trujillo	Director	
Wilson Parra	Residente	
JAVIER GRADO.	RESIDENTE INTERVENTORIA	

Nombre Proyecto		***"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMANETO DEL HUILA"***		**Acta No.**	
No. De Contrato obra		CLPIH 401 DEL 2023	**Lugar:**	VEREDA PANTANOS (TIMANA HUILA)	
No. De Contrato Interventoría		CIHCM 420 - 2023			
Fecha	28 DE FEBRERO 2025	**Hora Inicio**	2: PM	**Hora Final**	5:PM

OBJETO DE LA REUNION
Solicitar suspensión de obra, debido a demora en la cubierta por múltiples factores, además de los altos niveles de lluvias que afectan al sur del país

AGENDA	
	1- Verificar solicitud de suspensión
	2- Socializar el estado de la viga después de la fundición e impermeabilización
	3- Compromisos

DESARROLLO

- Se eleva una solicitud de suspensión temporal de obra debido a retrasos en la llegada de la cubierta, ola invernal que azota a la región, y por temas de paros por diferentes agremiaciones en este caso puntual la del arroz

- Después de fundidas las vigas con el concreto premezclado, se realiza el desencofrado y su impermeabilización, también la instalación de los dos postes para la cubierta de pantanos


DESARROLLO

TAREAS – COMPROMISOS – TEMAS PROXIMAS REUNIONES			
Tema	**Tarea**	**Responsable**	**Fecha de Control**
1	Realizar seguimiento a la solicitud de suspensión		
2	Instalación de cubierta autoportante		
3	Programar las conexiones eléctricas		

EN CONSTANCIA FIRMAN EL ACTA:		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Heinan Jose Trujillo C	Director	
Wilson Para	Residente	
JAVIER GRADO	RESIDENTE INTERVENTORIA	

AOLAB INGENIERIAS SAS

INFORME DEL ENSAYO COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS

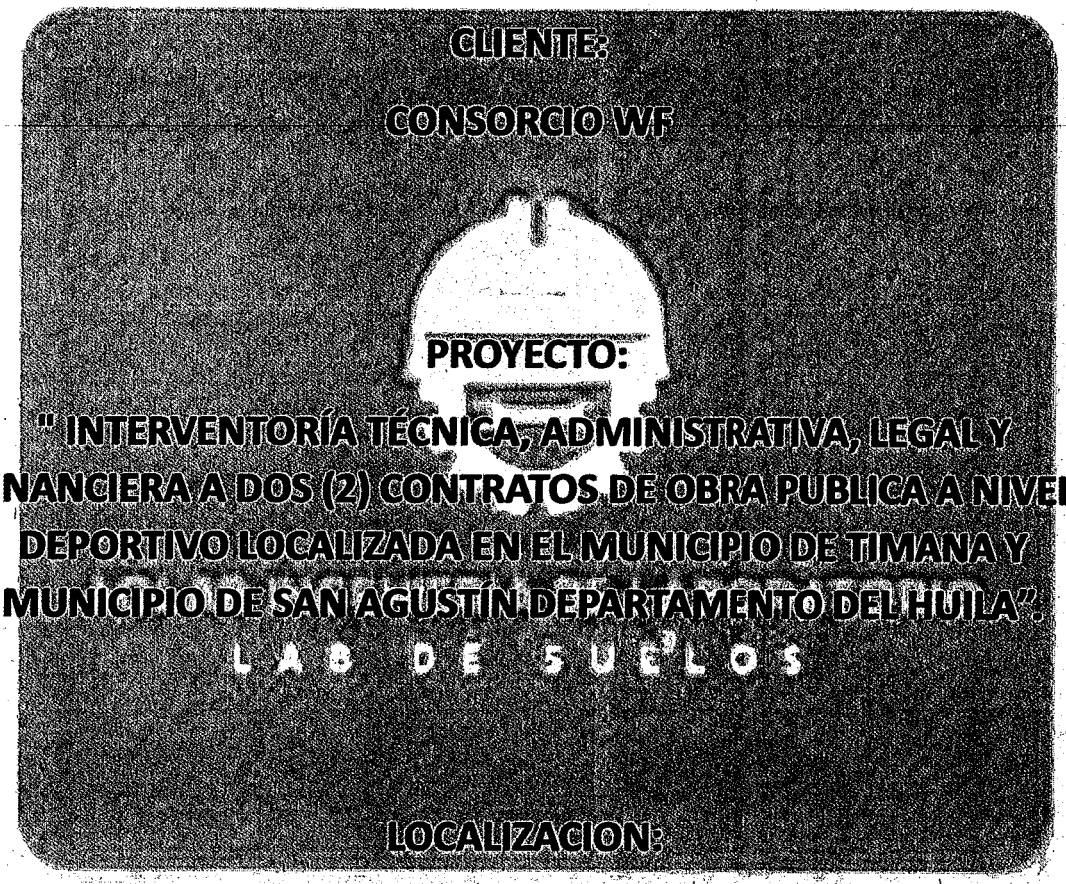

MUNICIPIO DE TIMANA – VEREDA PANTANOS

FEBRERO DEL 2025

ingenieriadesuelosaolab@gmail.com / calle 76 # 1ª bis -33 puertas del edén /3115955822

AOLAB INGENIERIAS SAS

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

CONTRATISTA CONSORCIO WF

PROYECTO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA

UBICACIÓN MUNICIPIO DE TIMANA – VEREDA PANTANOS

FECHA EMISION INFORME: FEBRERO DEL 2025

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD. LAB	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Edad (Días)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	% de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
			Diámetro	Longitud	KN							
22/01/2025	20/01/2025	2	10.00	20.00	118.5	7	27/01/2025	2188	73%	5	3000	CONCRETOS COLUMNAS
	20/01/2025		10.00	20.00	120.5	7	27/01/2025	2225	74%	6	3000	
	20/01/2025		10.00	20.00	152.2	14	03/02/2025	2811	94%	6	3000	
	20/01/2025		10.00	20.00	154.8	14	03/02/2025	2859	95%	4	3000	
	20/01/2025		10.00	20.00	184.5	28	17/02/2025	3407	114%	5	3000	
	20/01/2025		10.00	20.00	186.8	28	17/02/2025	3450	115%	5	3000	

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS HAN SIDO TOMADAS POR EL CLIENTE Y TRANSPORTADAS POR LABORATORIO. EL COMPORTAMIENTO PARA UN CONCRETO CONVENCIONAL (SIN ADITIVO) SERA: A LOS 1d= 15%; 3d= 40%; 7d= 70%; 14d= 90%; 28d= 100% CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5%

CALCULO
JEFE DE LABORATORIO

ingenieriadesuelosaolab@gmail.com / calle 76 # 19 bis -33 puertas del edén /3115955822

AOLAB INGENIERIAS SAS-ORDEN DE SERVICIO

AOLAB INGENIERIAS SAS
calle 76 # 1ª bis -33
puertas del edén
Neiv-Huila
3115955822
ingenieriadesuelosaolab@gmail.com

ORDEN DE SERVICIO 03-1124

NOMBRE DEL CLIENTE	CONSORCIO W.F	**NÚMERO DE PEDIDO**	03-1124
TELÉFONO DEL CLIENTE	316 5373582	**ID DE CLIENTE**	901769619-8
CORREO ELECTRÓNICO DEL	consorciowf23@gmail.com	**PEDIDO RECIBIDO POR**	AOLAB INGENIERIAS SAS

TRABAJO DESCRIPCIÓN	OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA
COMENTARIOS ADICIONALES	MUESTRAS DE CONCRETO-MUNICIPIO TIMANA – VEREDA PANTANOS

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y LA MANO DE OBRA	Ingreso de muestras	fechas de fundicion	resistencia (psi)
CONCRETOS ZAPATAS	13/11/2024	11/11/2024	3000
CONCRETOS COLUMNAS	22/01/2025	20/01/2025	3000

Cordialmente

AOLAB INGENIERÍA DE LABORATORIO

COORDINADOR DE LABORATORIO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14972266463

(415)7707212489984(8020) 000001497226646 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 7 7 9 0	6	Impuestos y Aduanas de Neiva	3

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
AOLAB INGENIERIA SAS BIC

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CL 76 1 A 33

42. Correo electrónico INGENIERIADESUELOSAOLAB@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 6 9 9 5 7 0 3	3 1 1 5 9 5 5 8 2 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 4 0 1 0 5	7 1 2 0	2 0 2 4 0 1 0 5	4 2 1 0	4 2 9 0		0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	1	4	4	2	4	7	4	8	5	5																

14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 15 / 07 : 07: 57

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PERAFAN ORDOÑEZ OSCAR ESTEBAN

985. Cargo REPRESENTANTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7711430
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 4 9 25 OF 507	TELÉFONO:	8668020
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7965577178			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	21						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/03/31			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1370591720		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 562.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 0	$ 562.900	$ 7.500	$ 570.400
SUBTOTALES:										$ 562.900	$ 7.500	$ 570.400

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0	-	$ 0	$ 439.800	$ 0	$ 5.800	$ 0	$ 439.800	$ 5.800	$ 0	$ 445.600
SUBTOTALES:													$ 439.800	$ 5.800	$ 0	$ 445.600

planilla pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 85.700	$ 85.700	$ 1.200	$ 0	$ 86.900
SUBTOTALES:									$ 85.700	$ 1.200	$ 0	$ 86.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP							COF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7711430	PERDOMO POLANIA FAIVER EDUARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 3.517.650				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 3.517.650	$ 562.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 562.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.517.650	$ 439.800	$ 0	$ 439.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.517.650	$ 7711430	$ 85.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.102.900

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1083886304		GIRALDO JIMENEZ JAVIER HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA LLANOGRANDE	PITALITO-HUILA	8361000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1330211396	9483029204	I	2025/03/04	2025/03/12	BANCOLOMBIA	8	$442,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500
Ciudad: PITALITO Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500
1	CC	1083886304	GIRALDO JAVIER									X							23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	0	$0	$0	No	$440,500
Total		Afiliados(1)																				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1083886304		GIRALDO JIMENEZ JAVIER HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA LLANOGRANDE	PITALITO-HUILA	8361000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1330211396	9483029204	I	2025/03/04	2025/03/12	BANCOLOMBIA	8	$442,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,200	$0	$229,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$1,200	$0	$229,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$200	$0	$34,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,700	$200	$0	$34,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$900	$0	$178,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$900	$0	$178,900
TOTAL				**1**	**$440,500**	**$2,300**	**$0**	**$442,800**

2025/03/11 08:47 PM
