	FORMATO **INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS** **CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **2057 de 2021**, MUNICIPIO DE **LOPEZ DE MICAY, CAUCA**
• INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **ABRIL-2025.**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover los estudios, diseños y construcción (obra) de la sede administrativa de la alcaldía municipal de López de Micay–Cauca.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: Dirección: Cra 2 # 5-07, Calle las Flores – López de Micay (Urbano)	Departamento del Cauca, Municipio de López de Micay. Coordenadas: 2°50′47″N 77°14′50″O  Localización de López de Micay en Cauca		
BENEFICIARIO:	**Directos:** Municipio de López de Micay, Departamento del Cauca – 18.932 Habitantes.		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$4.813.963.309,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$849.522.937,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 5.663.486.246,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	11 de Noviembre de 2021.		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	29 de noviembre del 2022	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	Hasta el 31 de Agosto de 2024
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Ing. Iván Darío Castillo	**DESDE:** 9 Enero 2024	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	JAIRO OCORO BONILLA	29 de noviembre del 2021	31 de Diciembre 2023
	Ing.		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. 43521	19/08/2021	
	No. 14822	16/01/2022	
	No 16023	19/01/2023	
	No 16424	16/01/2024	
	No 16524	16/01/2024	
	No 21294	16/01/2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO OBRA.	No. 129221	29/11/2021	
	No 6322	16/01/2022	
	No 10423	19/01/2023	
	No 8424	16/01/2024	
	No 8524	16/01/2024	
	No 14024	16/01/2024	

FORMATO
INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS
CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON

COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	**No. 2-2023-042664**	**Fecha: 14/08/2023**
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL (MINISTERIO DEL INTERIOR)	**N/A**	**N/A**
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	23/11/2021	No. 435-47-994000047251

FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	19/11/2021	
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA Se extendió la fecha de terminación del convenio hasta 31 Diciembre de 2022.	**FECHA: 29/07/2022**
	SEGUNDA PRÓRROGA Se extendió la fecha de terminación del convenio hasta 31 Diciembre de 2023.	**FECHA: 12/09/2022**
	TERCERA PRÓRROGA Se extendió la fecha de terminación del convenio hasta 31 Agosto de 2024. Sustitución presupuestal vigencia 2024.	**FECHA: 31/08/2023**
	CUARTA PRORROGA. Se extendió la fecha de terminación del convenio hasta 31 Agosto de 2025.	**FECHA: 16/12/2024**
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**SUSPENSIÓN 01** Suspendido por 2meses. Nueva fecha de terminación:31 Octubre de 2024	**FECHA: 21/08/2024**
	REINICIO 01	**FECHA: 21/10/2024**
	SUSPENSIÓN 02 Suspendido por 45 dias. Nueva fecha de terminación 16 Diciembre 2024.	**FECHA: 31/10/2024**
	REINICIO 02	**FECHA: 16/12/2024**
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**POLIZA INICIAL:** **(No 435-47-994000047251)**	**FECHA DE APROBACION:** **24/11/2021**
	VIGENCIA DEL AMPARO: 31/01/2023	
	POLIZA PRIMERA PRORROGA PRIMERA MODIFICACION	**FECHA DE APROBACION:** **30/11/2022**
	VIGENCIA DEL AMPARO: 30/06/2023	
	POLIZA SEGUNDA PRORROGA SEGUNDA MODIFICACION	**FECHA DE APROBACION:** **23/03/2023**
	VIGENCIA DEL AMPARO:28/02/2023	
	POLIZA TERCERA PRORROGA TERCERA MODIFICACION.	**FECHA DE APROBACION:** **23/03/2023**
	VIGENCIA DEL AMPARO:28/02/2025	
	Reinicio 02	**FECHA DE APROBACION:** **16/12/2024**
	VIGENCIA DEL AMPARO:16/06/2025	
	POLIZA CUARTA PRORROGA CUARTA MODIFICACION	**FECHA DE APROBACION:** **PENDIENTE**
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ 181.764.470,00
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ 64.490.034,00
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)		N/A
VALOR DE OBRA		$ 5.224.928.745,00
VALOR INTERVENTORÍA		$ 191.954.096,00
VALOR ADICIONAL ESTUDIOS Y DISEÑOS		$108.000.000,00

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	SUSCRIPCION ACTA DE INICIO.	N/A	09/12/2021	$ 2.888.377.985,00
SEGUNDO DESEMBOLSO				
TERCER DESEMBOLSO				
ÚLTIMO DESEMBOLSO				
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 2.888.377.985,00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				**$ 0**

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria, NIT: 860.524.654-6

Cumplimiento

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
435-47-994000047251-6	Cumplimiento	$ 1.132.697.249,20	11/11/2021	30/06/2026
	N.A.			

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato: F2-F14-243-2022 del 23 de mayo del 2022	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY-CAUCA.		$5.406.693.215,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-21-30535&g-recaptcha-response=03AIIukzgKuLJgbtTA1_zV67aQzJzK2EObPakV0CyLtSGxiDLkdrWu7z_yuWB1JiAod3XTrZDIT7zY584k4-jdHo2-EMZk0oX47ZdY7byzhFVRN5yY1JggptZBSki4VuG5pC6vV5SdhPfPIZr5Hn-tDihbIxvPASY9gKqyYbNsczuvgdFO4081JLRW59lEFGDIX4haXFU-PAWT7vbXx74-aVLVjRZrQ-_h7UvvuudKCYvOzHoAG73C8KabRhMcqQbEqMqg49QBLEZRwlpcf5fhV4ScUlVGt6-qg4wkakZQorDp1SLgNx8nD1udOl_KrPmaxl56GmCgMtwD46A9GT8mxXPlh_4p4DmFzIs_MqpAYjurW7mguRdXYU0IWntb7qrrobXrAQd_jeguF08UK0sSWeFDDt8Kixb16ekUiYE3KhChJJo6QqAyQO3rw561LwXmzdhmmXqMCIEVJuZcqtUV70uyHEpbmZFQiZx1sBWkGmx0aijmzSqz3xp500Ps4dZHQI6PDVWHQeCb6itV5TspupLwkGnpeOAxwlM8JLaZWkKIKL21b-ytoH94h1Okb2Ip4oN2FZxtUhIzr1nhvTTxZtURISHIebYOfw		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	19/07/2022		$ 108.000.000,00
Nombre contratista	CONSORCIO MICAY 2022 Representante Legal: HERNÁN ALFREDO VALLEJO MARTÍNEZ.		NIT: 901.594.340-6 C.C. 10.538.757 de Popayán
Fecha de Acta de inicio del contrato	17/06/2022		6.5 Meses
	OTRO SI No 1	19/07/2022	Adición ($108.000.000)
	SUSPENSIÓN No 1	21/11/2022	5.5 Meses

Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	REINICIO No 1	02/05/2023	-
	SUSPENSIÓN No 2	8/05/2023	2.5 meses
	REINICIO No 2	20/07/2023	-
	Otro si No 2	23/08/2023	Prorroga
	SUSPENSION No 3	7/12/2023	3 Meses
	REINICIO No 3	1/03/2024	-
	OTRO SI No 3	1/04/2024	Prorroga
	SUSPENSION No 4	12/07/2024	1 Mes
Fecha Inicial de terminación del contrato	**30/12/2022**	**Fecha Actual de terminación del contrato.**	-
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 5.514.693.215
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		
PÓLIZA No.	Cumplimiento 45-44-101138910. Responsabilidad civil extracontractual 4540-101076269		
FECHA DE LA PÓLIZA	08/06/2022		

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra.***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR**
No. del contrato: 257 del 9 de junio de 2022	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMIISTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LÓPEZ DE MICAY- CAUCA	$ 256,615,155

Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-12972268&g-recaptcha-response=03AIIukzgpk_g1sQzJdd9hlYgtWa-8tMkTFGVfQExrg_y-qWh82y_bGSTsgF-7RrERpaYuaHa1qHcY8cxRgXiPC6iQRkpPAKSU_cysZJDXeW62RSK7KhI3ZwjdL60zGEHSsdguEz-d4IOeUssRaEPRcCG8Gt7xeTYC2_IYwazn9tKMzmxsb05WVx54wFk-i3ifX4UYLdsqZvFh8hdiRcMGFtSPQ7j02YeMiEEZYvjEQijZBQeSnLcemZTCXzAbjqh609e9aM9lqaRcouOQ88-BOrZCNFR-RLEVjBTiax3YmHcM2U6c3VRsDmqz6b_L_EoMzLZYLr058syO2YLS32ynnKON_dB8OAAi-z9_AnKGj-kUFUJk6WzW-6YpKk2OteHMwNRPh4T6XvBKO3m4o5ShKXBI9064_bM5QROZsQpJF9hb_Pnko3kqAxVloPMOsq83zztzNnUizs6wRIy6TF6SuqKCGPT4nILZTL4o4QOKfticTZJft94nyET3JsV-iuv6_8EpiO8KLTEVVZ89ks6CIE4CMGOByAgWdbeXtOUwmmGNyPUisc37eNWqAW2heLkoHOxcNHwYGqjmTWmZJAHjHTJJFiTDc19y1g	
Nombre contratista	CONSORCIO VALLECA Representante Legal: Tatiana Janeth Cerón Díaz	NIT. 901.602320-4 C.C. 1.143.832.729

Fecha de Acta de inicio del Contrato	17/06/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN No 1	21/11/2022	5.5 Meses
	REINICIO No 1	02/05/2023	-
	SUSPENSIÓN No 2	8/05/2023	2.5 Meses
	REINICIO No 2	20/07/2023	-
	SUSPENSION No 3	7/12/2023	3 Meses
	REINICIO No 3	1/03/2024	-
	OTRO SI No 1	1/04/2024	Prorroga
	SUSPENSION No 4	12/07/2024	1 Mes
Fecha Inicial de terminación del contrato.	16/06/2023	**Fecha Actual de terminación del Contrato.**	
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 256.444.130,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		
PÓLIZA No.	Cumplimiento 45-44-101139110. Responsabilidad civil extracontractual 45-40-101076438		
FECHA DE LA PÓLIZA	14/06/2022		

5. INFORME TECNICO

INFORME DE ACTIVIDADES.	El avance físico acumulado del proyecto se sitúa en **25,62 %**, frente al **33 %** contemplado en el cronograma maestro; esto supone un retraso de **7,38 puntos porcentuales**. El desfase obedece a la suspensión de las actividades en obra. Si bien se han tramitado las solicitudes de financiamiento, los fondos aún no han sido desembolsados. Las actividades de ejecución no podrán reanudarse hasta que se disponga de los fondos necesarios para el cierre financiero.

- ***Avance de Estudios, Diseños y de Obra***

Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y de Obra No: F2-F14-243-2022 del 23 de mayo del 2022	
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	33%
AVANCE FISICO EJECUTADO:	25,62%
OBSERVACIONES: El proyecto presenta un avance físico de **25,62 %** frente al **33 %** previsto en el cronograma. La brecha de **7,38 puntos porcentuales** obedece a la paralización de las actividades críticas: si bien ya se tramitaron las solicitudes de financiamiento ante diferentes entidades, aun no se cuenta con los fondos para cierre financiero del proyecto. Hasta que dichos recursos se materialicen, no es posible autorizar nuevos hitos de obra, lo que mantiene la ejecución en pausa y expone el proyecto a retrasos adicionales.	

- ***Avance de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

Contrato de Interventoría N° 257 del 9 de junio del 2022	
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	33%
AVANCE FISICO EJECUTADO:	25,62%
OBSERVACIONES: El proyecto presenta un avance físico de **25,62 %** frente al **33 %** previsto en el cronograma. La brecha de **7,38 puntos porcentuales** obedece a la paralización de las actividades críticas: si bien ya se tramitaron las solicitudes de financiamiento ante diferentes entidades, aun no se cuenta con los fondos para cierre financiero del proyecto. Hasta que dichos recursos se materialicen, no es posible autorizar nuevos hitos de obra, lo que mantiene la ejecución en pausa y expone el proyecto a retrasos adicionales.	

- ***Gestión técnica y documental.***

Oficios y documentos elaborados por la supervisión sobre el desarrollo de la interventoría, Comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.

FECHA COMITÉ E INFORMES	ASUNTO	OBSERVACIONES / ACCIONES


FECHA OFICIO	REFERENCIA -RADICADO	ASUNTO	QUIEN ENVIA	OBSERVACION
4/04/2025	2025-3-004010-011461	SOLICITUD INFORME - TRÁMITE ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2057 DE 2021.	SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL	SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
24/04/2025	Correo electronico	AUDIENCIA DE REANUDACIÓN POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 2057 DE 2021 LÓPEZ DE MICAY, CAUCA.	Cristian Alejandro Leguizamon Betancourt	Anexos

➢ ***personal actual vigente aprobado por la Supervisión del Municipio.***

NOMBRE	CARGO
Ing. Ivan Dario Castillo	Supervisor del Municipio deLópez de Micay y secretario de planeación municipal.

➢ ***Información Avance Físico – Avance Financiero***

GRAFICA AVANCE FISICO.

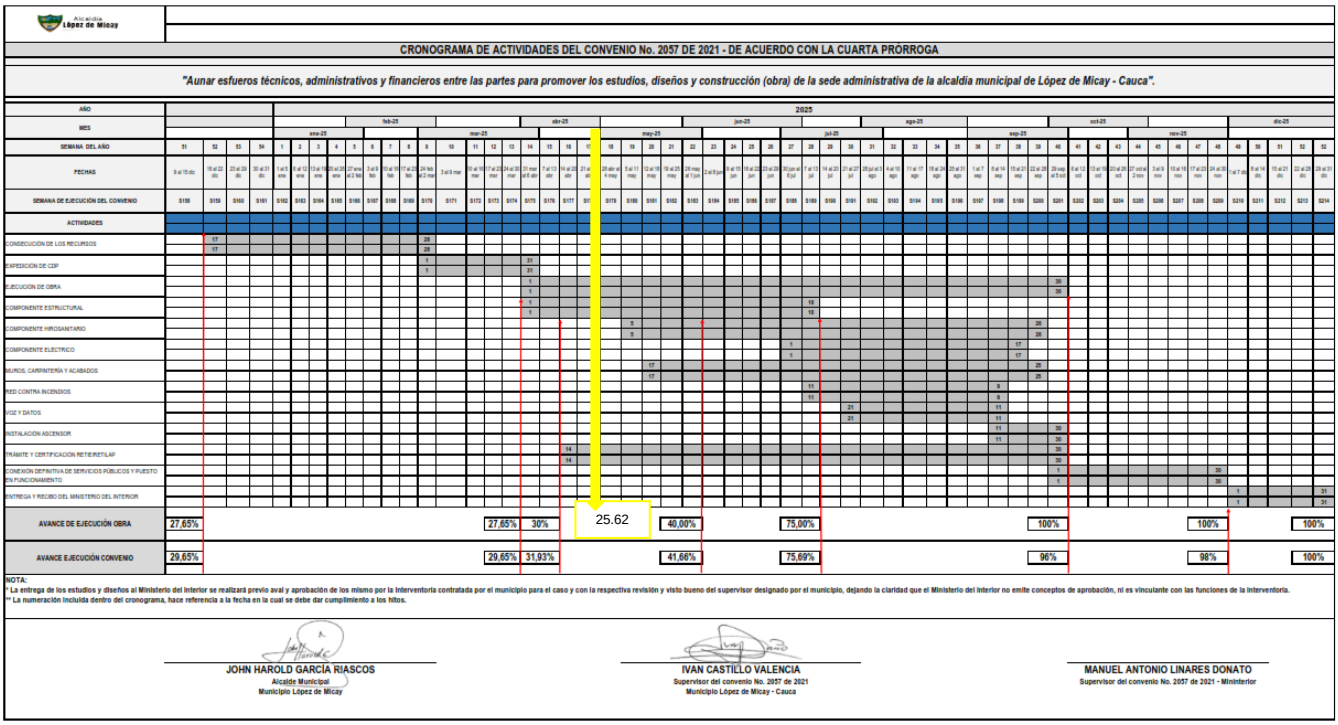


6. REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD

1.1	**VISITAS TECNICAS:** No se realizaron visitas en el periodo reportado.	**EJECUTADO**	25,62%
	OBSERVACIONES:		

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

8. SUPERVISOR.

 Ing. IVAN DARIO CASTILLO Secretario de Infraestructura y Planeación.	



61 de muchas

Fwd: AUDIENCIA DE REANUDACIÓN POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 2057 DE 2021 LÓPEZ DE MICAY, CAUCA Externo Recibidos ×

Alcaldía López de Micay - Cauca
para tesoreria, Carmen, Oficina, jgrkiko, mí

24 abr 2025, 17:52

jun 10 mar

AUDIENCIA DE REANUDACIÓN POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 2057 DE 2021 LÓPEZ DE MICAY, CAUCA
De Google Calendar

Ya no estás invitado a este evento
Ver datos actualizados en Google Calendar

---------- Forwarded message ---------
De: **Cristian Alejandro Leguizamon Betancourt** <cristian.leguizamon@mininterior.gov.co>
Date: jue, 24 abr 2025 a las 15:41
Subject: AUDIENCIA DE REANUDACIÓN POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 2057 DE 2021 LÓPEZ DE MICAY, CAUCA
To: Pedro Jovanny Tenjo Sanchez <pedro.tenjo@mininterior.gov.co>, Sergio Andres Daza Gomez <sergio.daza@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>, Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>, jbobadilla@gha.com.co <jbobadilla@gha.com.co>, 5066_JOHN HAROLD GARCIA RIASCOS <contactenos@lopezdemicay-cauca.gov.co>, notificaciones@gha.com.co <notificaciones@gha.com.co>, gestioncontractual <gestioncontractual@mininterior.gov.co>
Cc: Carmen Lia Mera Mera <calimejuridica@hotmail.com>

Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?

Unirse a la reunión ahora

Id. de reunión: 222 142 929 782

Código de acceso: Fk3Vm9SV

Para organizadores: Opciones de la reunión

Interior

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Al contestar cite Radicado 2025-3-004010-011461 Id: 519010
Folios: 1 Fecha: 04-04-2025 15:49:58
Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA GENERAL
Destinatario: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

MEMORANDO

PARA: **MANUEL ANTONIO LINARES DONATO**
Supervisor convenio 2057 de 2021

DE: **SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL**

ASUNTO: **SOLICITUD INFORME - TRÁMITE ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2057 DE 2021.**

Cordial saludo,

En el marco del trámite del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 2030 del 31 de octubre de 2024 “Por medio de la cual se resuelve una solicitud de presunto incumplimiento del Convenio 2057 de 2021 celebrado entre la Nación – Ministerio del Interior y Municipio de López de Micay, Cauca”, le solicitamos de manera respetuosa, en su condición de supervisor del convenio 2057 de 2021, un informe detallados del estado actual del convenio, en el que se indique de manera puntual si derivado de la cuarta prórroga y cuarta modificación al convenio suscrita el dieciséis (16) de diciembre de 2024, se superaron los hechos que dieron origen al trámite de presunto incumplimiento y que fue solicitado ante la Subdirección de Gestión Contractual memorando con radicado No. 2024-2-003122-030875 ID 360339 del 13 de julio de 2024.

Lo anterior, se solicita con carácter urgente, de modo que se pueda convocar a la reanudación de la audiencia de presunto incumplimiento, con el fin de resolver el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 2030 del 31 de octubre de 2024, razón por la cual, y para ello se le otorga un término de díez (10) días hábiles contados desde el día siguiente al recibo del presente memorando.

Cordialmente,

PEDRO TENJO SÁNCHEZ
Subdirector Técnico (e)
Subdirección de Gestión Contractual

Ministerio del Interior
Dirección: Carrera 8 No.7 - 26, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 562 9300 - 601 382 2800
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 913666

Interior

MUNICIPIO LÓPEZ DE MICAY
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
NIT.800.051.168-9
SECRETARÍA DE HACIENDA

INFORME FINANCIERO ABRIL 2025 - CONVENIO No. 2057 DE 2021

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN (OBRA) DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY CAUCA

CUENTA (AHORROS) No.: **42139300266-8** DEL BANCO: **AGRARIO DE COLOMBIA**

VALOR INICIAL DEL CONVENIO			**$ 5.663.486.246,00**
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			**$ 4.813.963.309,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO			**$ 849.522.937,00**
	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	9/12/2021	GIRO 1	**$ 2.888.377.985,00**
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO:	22/06/2022	GIRO 2	**$ 849.522.937,00**
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 3	**$ 0,00**
		GIRO 4	**$ 0,00**
	TOTAL RECURSOS GIRADOS PARA EL CONVENIO		**$ 3.737.900.922,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 3.737.900.922,00**

BALANCE CONTRATOS CELEBRADOS MUNICIPIO
VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICIÓN MUNICIPIO	TOTAL CONTRATADO
F2-F14-243-2022 DEL 23-05-2022	CONSORCIO MICAY 2022 - **(ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA)**	$ 5.406.693.215,00	$ 108.000.000,00	$ 5.514.693.215,00
257 DEL 09-06-2022	CONSORCIO VALLECA - **(INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA)**	$ 256.444.130,00	$ 0,00	$ 256.444.130,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 5.771.137.345,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACIÓN RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE	AFECTACIÓN RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
F2-F14-243-2022 DEL23-05-2022	PAGO ANTICIPO DEL 40% DEL CONTRATO F2-F14-243-2022 COMPONENTE 1 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA	COP-12651	ECP-14125	25/08/2022	$ 115.905.787,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.905.787,00
F2-F14-243-2022 DEL23-05-2022	PAGO PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO F2-F14-243-2022 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA	COP-129	ECP-16565	29/03/2023	$ 65.662.898,00	$ 18.726.738,00	$ 0,00	$ 46.936.160,00
F2-F14-243-2022 DEL23-05-2022	PAGO PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO F2-F14-243-2023 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA	COP-143	ECP-18906	17/10/2023	$ 99.107.560,00	$ 23.539.149,00	$ 0,00	$ 75.568.411,00
F2-F14-243-2022 DEL23-05-2022	PAGO ANTICIPO DEL 40% (CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA) DEL CONTRATO F2-F14-243-2023 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA	COP-16986	ECP-18904	17/10/2023	$ 98.911.776,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.911.776,00
F2-F14-243-2022 DEL23-05-2022	PAGO ANTICIPO DEL 40% (CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA) DEL CONTRATO F2-F14-243-2023 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA	COP-144	ECP-18905	19/10/2023	$ 1.991.059.722,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.991.059.722,00
257 DEL 09-06-2022	PAGO PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO 257 DE 2022 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA	COP-148	ECP-20008	29/12/2023	$ 13.463.316,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.463.316,00
257 DEL 09-06-2022	PAGO PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO F4-F36-257-2022 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA (VIGENCIA FUTURA)	COP-17986	ECP-20007	29/12/2023	$ 50.881.306,00	$ 8.311.816,00	$ 0,00	$ 42.569.490,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 2.434.992.365,00**	**$ 50.577.703,00**	**$ 0,00**	**$ 2.384.414.662,00**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
dic-21	$ 1.380.349,00
ene-22	$ 1.602.032,00
feb-22	$ 1.653.861,00
mar-22	$ 2.111.717,00
abr-22	$ 2.447.705,00
may-22	$ 2.370.716,00
jun-22	$ 2.581.109,00
jul-22	$ 3.172.191,00
ago-22	$ 3.152.752,00
sep-22	$ 3.435.922,00
oct-22	$ 5.031.570,00
nov-22	$ 5.947.152,00
dic-22	$ 6.354.306,00
ene-23	$ 5.967.190,00
feb-23	$ 6.907.649,00
mar-23	$ 8.200.152,00
abr-23	$ 7.143.105,00
may-23	$ 7.404.179,00
jun-23	$ 8.161.973,00
jul-23	$ 6.921.870,00
ago-23	$ 7.659.140,00
sep-23	$ 7.675.219,00
oct-23	$ 5.581.068,00
nov-23	$ 3.054.759,00
dic-23	$ 3.229.372,00
ene-24	$ 2.905.835,00
feb-24	$ 2.814.590,00
mar-24	$ 3.070.361,00
abr-24	$ 3.076.859,00
may-24	$ 3.123.152,00
jun-24	$ 2.655.421,00
jul-24	$ 2.850.677,00
ago-24	$ 3.047.109,00
sep-24	$ 2.767.145,00
oct-24	$ 2.963.992,00
nov-24	$ 2.970.215,00
dic-24	$ 2.976.455,00
ene-25	$ 3.079.022,00
feb-25	$ 2.699.615,00
mar-25	$ 2.801.427,00
abr-25	$ 3.000.713,00
TOTAL (3)	**$ 165.949.646,00**

DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACIÓN DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS
17/04/2024	$ 32.000.000,00	65916
19/04/2024	$ 32.000.000,00	66123
30/04/2024	$ 32.000.000,00	67034
2/05/2024	$ 6.231.180,00	EN TRAMITE EL SOPORTE
TOTAL (7)	**$ 102.231.180,00**	

DEVOLUCIÓN VALOR NO EJECUTADO A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCIÓN VALOR NO EJECUTADO	VALOR DEVOLUCIÓN VALOR NO EJECUTADO	No. DE RECIBO DE CONSIGNACIÓN DEVOLUCIÓN VALOR NO EJECUTADO
TOTAL (7)	**$ 0,00**	

CONSIGNACIONES A LA CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO

DESCRIPCIÓN SEGÚN EXTRACTO	ABONO TRASLADO PROPIO O DB ORG
FECHA	18 DE MARZO DE 2024
VALOR (11)	**$ 65.747.187,13**

ACTIVACIÓN DE CUENTA (0)	**$ 20.000,00**
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 3.737.900.922,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 2.384.414.662,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	**$ 165.949.646,00**
TOTAL DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	**$ 102.231.180,00**
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 63.718.466,00**
RECURSOS FONSECON NO EJECUTADOS (1-2)=6	**$ 1.353.486.260,00**
DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJECUTADOS (7)	**$ 0,00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES MUNICIPIO (8)	**$ 50.577.703,00**
RETIRO RETENCIONES Y DEDUCCIONES MUNICIPIO (9)	**$ 50.577.703,00**
SALDO EN LA CUENTA RETENCIONES Y DEDUCCIONES MUNICIPIO (8-9)=(10)	**$ 0,00**
CONSIGNACIÓN A LA CUENTA BANCARIA (11)	**$ 65.747.187,13**
TOTAL DESCUENTOS BANCARIOS POR DEVOLVER AL MINISTERIO (12)	**$ 61.384,00**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO A CORTE DEL MES DEL INFORME (0) + (1) - (2) + (5) - (9) + (11) - (12) = (13)	**$ 1.432.332.826,13**

OBSERVACIONES:

JOSE ADEMIR VALENCIA MOSQUERA
Secretario de Hacienda Municipal

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

Banco Agrario de Colombia

ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

Hasta 20 millones, su dinero está asegurado — Depósito seguro de Fogafin — www.fogafin.gov.co

NOMBRE MUNICIPIO LOPEZ DE MICAY ,

DIRECCIÓN CALLE LAS FLORES PALACIOS MUNICIPAL LOPEZ DE MICAY

CIUDAD CAUCA, LOPEZ DE MICAY

MES	ABRIL	AÑO	2025

NÚMERO DE CUENTA:
421393002668


OFICINA: 2139 LOPEZ DE MICAY

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor		Valor
SALDO ANTERIOR		1.429.332.113,13	SALDO ACTUAL	1.432.332.826,13
TOTAL ABONOS	20	3.000.713,00	PROMEDIO MES	1.430.896.469,13
TOTAL CARGOS	0	0,00	INTERESES	3.000.713,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.



www.bancoagrario.gov.co
· Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
01/04	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		96.699,00	1.429.428.812,13
02/04	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		96.706,00	1.429.525.518,13
03/04	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		96.712,00	1.429.622.230,13
04/04	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		290.176,00	1.429.912.406,13
07/04	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		96.738,00	1.430.009.144,13
08/04	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		96.745,00	1.430.105.889,13
09/04	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		96.751,00	1.430.202.640,13
10/04	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		96.758,00	1.430.299.398,13
11/04	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		290.313,00	1.430.589.711,13
14/04	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		96.784,00	1.430.686.495,13
15/04	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		96.791,00	1.430.783.286,13
16/04	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		484.051,00	1.431.267.337,13
21/04	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		96.830,00	1.431.364.167,13
22/04	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		96.836,00	1.431.461.003,13
23/04	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		96.843,00	1.431.557.846,13
24/04	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		96.850,00	1.431.654.696,13
25/04	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		290.588,00	1.431.945.284,13
28/04	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		96.876,00	1.432.042.160,13
29/04	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		96.882,00	1.432.139.042,13
30/04	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	LOPEZ DE MICAY		193.784,00	1.432.332.826,13

NIT. 800.037.800-8
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
Autorregulado amv
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418

Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal PricewaterhouseCoopers LTDS | http://www.pwc.com/co | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 | Office: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez · Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales · Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quintero o al e-mail: Raquel.viveros@co.pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electronico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña González: (1) 2131370 - Fax (1) 2130495. Correo electrónico: defensorbanco@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.
