Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE SUPERVISIÓN No:	**11**				FECHA:	**18**	de	**MARZO**	de	**2025**
PERIODO: DEL	19	de	FEBRERO	de	2025	AL	17	de	MARZO	de	2025

CONTRATO No:	**3230**	DE	**2023**	REGISTRO BP Y P No	**2022004150318**

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGÜI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

LOCALIZACIÓN:

El proyecto se ubica en el corredor vial que conduce de Moniquirá al municipio de Togüi, en el departamento de Boyacá

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

MEJORES VIAS PARA BOYACA QUE AVANZA

NOMBRE DEL CONTRATISTA INTERVENTORÍA:	REPRESENTANTE LEGAL:
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS NIT 900.916.608-4	**LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR - CC.52.461.611**
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA Y/O CONSULTORÍA:	NOMBRE DEL SUPERVISOR
CONSORCIO MONIQUIRA NIT 901.740.222-1	**JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA**

ADICIONALES Y PRÓRROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	ADICIONAL EN VALOR No. 01, Y ADICIONAL EN PLAZO No. 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3230 DE 2023	$ 175,669,652.93	03 MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 175,669,652.93	

VALOR INICIAL:	**$ 361,963,536.00**	VALOR ADICIONALES:	**$ 175,669,652.93**	VALOR TOTAL:	**$ 537,633,188.93**

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	**7**	de	**DICIEMBRE**	de	**2024**
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	**18**	de	**MARZO**	de	**2025**

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO INTERV.	**100.00%**	% DE AVANCE CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**84.00%**	% PROGRAMADO CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**98.60%**



Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA						
No PÓLIZA	CSC-100035562	3/12/2024	ANEXO No.	7	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO	19	12	2024	19	9	2025	$ 107,526,637.79
PRESTACIONES SOCIALES	19	12	2024	19	3	2028	$ 26,881,659.45
CALIDAD DEL SERVICIO	19	3	2025	19	3	2030	$ 107,526,637.79

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)			
DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIACIÓN	8	4	2024
ACTA DE SUSPENSIÓN	7	12	2024
ACTA DE REINICIACIÓN	19	12	2024

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA	
DESCRIPCIÓN	**LOCALIZACIÓN**
Verificación de actividades ejecutadas en obra	K4+090-K6+270
RevisiÛn de documentaciÛn entregada por el contratista	N/A
VerificaciÛn de afiliaciones del personal a seguridad social	N/A
Registro diario en bit·cora de obra	N/A

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
Automovil EIQ365	Transporte	100%	
Campamento Oficina		100%	

Observaciones y aclaraciones: Para el presente informe se registra utilización de equipos por parte de la interventoria, de acuerdo al contenido y evidencias del informe mensual.

SEGUIMIENTO FINANCIERO				
DESCRIPCIÓN	FECHA ACTA			VALOR
ACTA PARCIAL No. 1	6	9	2024	$ 117,239,989.00
ACTA PARCIAL No. 2	11	10	2024	$ 64,972,455.00
ACTA PARCIAL No. 3	28	11	2024	$ 17,555,232.00
ACTA PARCIAL No. 4	5	2	2025	$ 93,618,755.00
ACTA PARCIAL No. 5	18	2	2025	$ 70,483,711.00
ACTA PARCIAL No. 6	17	2	2025	$ 38,602,063.00
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 402,472,205.00**

Observaciones y aclaraciones:

SOLICITUDES PRESENTADAS			
FECHA RADICADO	**INTERESADO**	**ASUNTO**	**RESPUESTA O TRÁMITE**
CMONIQUIRA-CE-224	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	ENTREGA INFORMES SEMANALES 43 Y 44	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA
CMONIQUIRA-CE-225	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	ENTREGA INFORME MENSUAL NO 10	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA
GIC-CB-293-23 19/02/24	CONSORCIO MONIQUIRÁ	OBSERVACIONES SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA	SE REMITE AL CONTRATISTA
CMONIQUIRA-CE-226	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	MODIFICACIÓN NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA Y ADICIÓN DE RECURSOS	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA
CMONIQUIRA-CE-227	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	ENTREGA INFORME SEMANAL 45	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA
GIC-CB-294-23 22/02/24	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	MODIFICACIÓN NO. 2 DEL CONTRATO DE OBRA - ADICIÓN Y	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC-CB-295-23 24/02/24	CONSORCIO MONIQUIRÁ	ALCANCE COMUNICACIÓN GIC-CB-293 25 OBSERVACIONES	SE REMITE AL CONTRATISTA
GIC-CB-296-23 24/02/24	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	REMISIÓN INFORME MENSUAL NO. 9 DE INTERVENTORÍA	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC-CB-297-23 24/02/24	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	REMISIÓN INFORMES SEMANALES NO. 43 A NO. 44 DE OBRA	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC-CB-298-23 25/02/24	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	ENTREGA INFORME SEMANAL NO. 45 CTO 3230-2023	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC-CB-299-23 27/02/24	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	REMISIÓN INFORME SEMANAL NO. 45 DE OBRA	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
S-2025-000129-SECINF	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	TRASLADO DE COMUNICACIÓN	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA
GIC–CB–300–23 05/03/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	REMISIÓN INFORME SEMANAL NO. 46 DE OBRA	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC–CB–301–23 05/03/24	CONSORCIO MONIQUIRÁ	COMUNICACIÓN S–2025–000129–SECINF – CONTRATO 3230 DE 2023– TRASLADO DE COMUNICADO	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
CMONIQUIRA–CE–229	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RESPUESTA– TRASLADO DE COMUNICADO DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.
CMONIQUIRÁ–CE–230	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RESPUESTA COMUNICADO FORMATO DE REGISTRO DE DEVOLUCIONES ÓRDENES DE PAGO	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.
GIC–CB–302–23 07/03/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	SUBSANACION ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 5	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC–CB–303–23 10/03/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	RESPUESTA COMUNICACIÓN S–2025–000129–SECINF	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC–CB–304–23 11/03/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	REMISIÓN INFORME SEMANAL NO. 46 DE OBRA	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC–CB–305–23 12/03/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	SUBSANACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 5	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
S–2025–000164–SECINF	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONTRATO 3269 DE 2023– DEVOLUCIÓN N°02 DE ACTA PARCIAL DE OBRA	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

GIC–CB–306–23 13/03/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	SUBSANACIÓN ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA NO. 5	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC–CB–307–23 14/03/24	CONSORCIO MONIQUIRÁ	SOLICITUD INCREMENTO DE PERSONAL DE OBRA	SE REMITE AL CONTRATISTA
GIC–CB–308–23 14/03/24	CONSORCIO MONIQUIRÁ	SOLICITUD LIMPIEZA MURO 15	SE REMITE AL CONTRATISTA
GIC–CB–309–23 14/03/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	REITERACIÓN COMUNICACIÓN NECESIDAD DE ACTIVIDADES DE DESMONTE, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS EN EL CORREDOR VIAL QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE MONIQUIRÁ Y TOGÜI	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
CMONIQUIRÁ–CE–232	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA NO.2_MARZO 2025.	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.
GIC–CB–310–23 17/03/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	COMUNICACIÓN CMONIQUIRÁ–CE–231–ACTA DE OBRA NO. 6	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC–CB–311–23 17/03/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	REMISIÓN ACTA DE INTERVENTORÍA NO. 6	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC–CB–312–23 17/03/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	SOLICITUD DE SUSPENSION CTOS DE OBRA E INTERVENTORIA	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

Observaciones y aclaraciones: Se relaciona la correspondencia acumulada cruzada entre contratista, supervisión y dependencias de la entidad

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO					
					DESDE			HASTA		
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	1.022.363.189	X	X	X	1	2	2025	28	2	2025
CESAR CAMILO PARDO RUIZ	7.176.397	X	X	X	1	2	2025	28	2	2025
NEIMAR ARLEY CASTA—O PELAES	79.758.293	X	X	X	1	2	2025	28	2	2025
JAIRO ANDR…S MEZA ROSAS	13.874.430	X	X	X	1	2	2025	28	2	2025
DIANA PATRICIA APONTE LOZANO	60.422.959	X	X	X	1	2	2025	28	2	2025
IVAN ANDRES PINILLA CORTES	80.174.574	X	X	X	1	2	2025	28	2	2025
RUBIEL EUGENIO ESPITIA	88.210.062	X	X	X	1	2	2025	28	2	2025
IVAN DARÕO CRUZ SANCHEZ	1.016.110.151	X	X	X	1	2	2025	28	2	2025

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO A LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA*		
CARGO	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**DOC. IDENTIFICACIÓN**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	1.022.363.189
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CESAR CAMILO PARDO RUIZ	7.176.397
ESPECIALISTA GEOTECNIA	NEIMAR ARLEY CASTA—O PELAES	79.758.293
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	JAIRO ANDR...S MEZA ROSAS	13.874.430
ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS	DIANA PATRICIA APONTE LOZANO	60.422.959
TOPÓGRAFO	IVAN ANDRES PINILLA CORTES	80.174.574
CADENERO 1	RUBIEL EUGENIO ESPITIA	88.210.062
CADENERO 2	IVAN DARÕO CRUZ SANCHEZ	1.016.110.151

***Se incluyó personal nuevo en el periodo (hoja de vida con aprobación de supervisión)**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Se realiza verificaciÛn diaria del uso de elementos de protecciÛn personal por parte de los trabajadores en obra.	N/A
Se verifica la realizaciÛn de preoperacionales de maquinaria, charlas de seguridad y demas actividades de seguridad y salud ocupacional.	N/A
Observaciones y aclaraciones: Se registran las actividades de control, manejo ambiental y seguridad industrial por parte de la interventoria. Lo anterior teniendo en cuenta el reporte y las evidencias del informe mensual.	

RELACION DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Resistencia concreto pilotes muro No. 15, 3000 psi	6	3	2025	165% de resistencia a los 28 dias

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Comité de obra	6	3	2025	Acta de comité
Comité de obra	13	3	2025	Acta de comité

Nota: Se relacionan los comités realizados en marco de los contratos de obra e interventoría. (ver anexo. Actas de comité en informe cero, informe mensual

RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de supervisión No.1	8	4	2024	7	5	2024	
Informe de supervisión No.2	8	5	2024	7	6	2024	
Informe de supervisión No.3	8	6	2024	7	7	2024	
Informe de supervisión No.4	8	7	2024	7	8	2024	
Informe de supervisión No.5	8	8	2024	7	9	2024	
Informe de supervisión No.6	8	9	2024	7	10	2024	
Informe de supervisión No.7	8	10	2024	7	11	2024	
Informe de supervisión No.8	8	11	2024	7	12	2024	
Informe de supervisión No.9	19	12	2024	18	1	2024	
Informe de supervisión No.10	19	1	2025	18	2	2025	

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES

LISTA DE CHEQUEO INFORME DE INTERVENTORÍA

	VERIFICACIÓN	FOLIOS No
INFORME DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	SI	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación) contrato de Interventoría	SI	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	SI	
El personal de Interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	SI	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	NO	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	SI	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	
Generales		
Registro fotográfico	SI	
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	SI	

FIRMA: Supervisor

NOMBRE: JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA

Gobernación de Boyacá Contratación

TRAMITADO
MARILYN XIOMARA PACHECO BUENO
Fecha: 19/05/2025

GIC-GB-298-25

Bogotá, D.C., 25 de febrero de 2025

Ingeniero
JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA
Supervisor de proyecto
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
GOBERNACIÓN DE BOYACA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Carrera 9 #17-50 Edificio de la Contraloría Piso 2. Tunja – Boyacá
despacho.infraestructura@boyaca.gov.co
Tunja

Referencia: Contrato de interventoría No. 3230 de 2023 “Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Contable y Ambiental al Contrato de Obra cuyo Objeto es “Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Moniquirá – Togüi, Muros de Contención, Departamento De Boyacá".

Asunto: Entrega Informe Semanal No. 45 Contrato de Interventoría No. 3230-2023

Respetado Ingeniero:

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales del Contrato de la referencia, adjunto al presente se remite el informe semanal para el periodo reportado a continuación:

Semana	Periodo
No. 45	Del 17/02/25 al 23/02/25

Lo anterior, se remite para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal
Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S

Anexo: Informe Semanal No. 45
Copia: Archivo
Elaboró: NDG
Revisó: EAO

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

INFORME SEMANAL
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA

FECHA: 23/02/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION — SEMANA No.: 45 (Numeración consecutiva) del 17/02/2025 al 23/02/2025

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE BOYACÁ — **DIRECCIÓN:** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 3269 de 2023 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: Construcción de 15 muros de contención en punto críticos que se encuentran en la vía de Moniquirá a Togui

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO MONIQUIRA			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES		
CONTRATO No.	3269 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 4.936.601.853,14	CONTRATO No.	3230 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 361.963.536
FECHA DE INICIO:	8/04/2024	VALOR ADICIONES:	$ 2.395.852.200,55	FECHA DE INICIO:	8/04/2024	VALOR ADICIONES:	$ 175.669.652,93
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	8/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 7.332.454.053,69	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	4/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 537.633.188,93
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	19/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ 1.480.980.556,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	19/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.200.343.358,77			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 280.637.197,23			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.936.601.853	$ 2.395.852.201		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 4.001.144.729			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 935.457.124	$ 2.395.852.201		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 361.963.536	$ 175.669.653		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 293.386.431	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 68.577.105	$ 175.669.653		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	4.936.601.853,14	
ADICIÓN 1	$	2.395.852.200,55	
VALOR TOTAL CONTRATO	$	7.332.454.053,69	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	6.051.922.732,15	82,54% *
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	5.736.981.495,69	78,24% *
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(314.941.236,46)	-4,30% *
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	-	% *
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	6.051.922.732,15	82,5% *
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	5.736.981.495,69	78,2% *
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(314.941.236,46)	-4,3% *
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	163.496.049,99	2,23% *
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	291.297.586,17	5,90% *

Observaciones: N.A

INTERVENTORÍA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$	361.963.536,00	
ADICIÓN 1	$	175.669.652,93	
VALOR TOTAL CONTRATO	$	537.633.188,93	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	493.744.765,34	91,84%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	493.744.765,34	91,84%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$	10.972.105,90	3,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	10.972.105,90	3,03%

Observaciones: N.A

ANTICIPOS		
Otorgado $	$	1.480.980.555,95
Amortizado $	$	1.200.343.358,77
Saldo $	$	280.637.197,18

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 82,54% — Avance o Atraso Físico %: -4,30%
Meta Física Ejecutada %: 78,24% — Avance tiempo contrato: 94,59%

CAPITULO	PROGRAMADO	EJECUTADO
I. MURO DE CONTENCIÓN N° 1-15	95,33%	86,86%
II. VARIOS	13,97%	22,39%
III. ITEMS NO CONTRATADOS	70,65%	71,24%
TOTAL OBRA	**80,31%**	**78,24%**

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VOLQUETA JTX454	1	1
RETROEXCAVADORA CAT 416D	1	1
COMPRESOR	1	3
MEZCLADORA	1	1
CAMIONETA	1	1
PLANTA ELECTRICA 100 KVA		1
UNIDAD ELECTRICA 50 HP		1
UNIDAD HIDRAULICA 30 HP		1
MEZCLADORA DE CONCRETO AUTOCARGANTE		1
SALTARINES		2
Total	5	13

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO: VIA MONIQUIRA-TOGUI

OBSERVACIONES:


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Se realizaron trabajos de verificación de cotas y niveles con comisión topográfica.
* Se procedió a la instalación de señalización móvil de acuerdo al Plan de Manejo de Tráfico.
* Se llevó acabo las actividades de perforación y fundida de anclajes verticales en cimentación de muro No.14.
* Se realizó amarre de acero de refuerzo y fundida de zapatas en concreto en muro No.1.
* Se ejecutó perforación y fundida de pilotes en concreto en cimentación de muro No. 15.

XI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Se realizarán actividades de perforación y fundida de pilotes en concreto para cimentación de muro No. 15.
* Se ejecutarán amarre de acero de refuerzo y fundida de pantallas en muro No. 1.
* Se realizarán actividades de excavación en roca y perforaciones para anclajes verticales en cimentación de muro No. 14
* Se desarrollaran trabajos de verificación de cotas y niveles con comisión topográfica.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

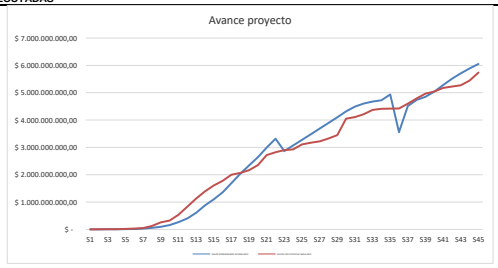

FECHA 23/02/2025 (Día / Mes / Año)

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PLANTA LOCALIZACIÓN PUNTOS CRITICOS VIA MONIQUIRÁ - TOGUI

Muro No. 01 abscisa K4+090



Amarre de acero de refuerzo para zapatas en cimentación de muro No. 1.



Fundida de zapatas en concreto en cimentación de muro No. 1.

Muro No. 02 abscisa K4+320



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 2.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 2.

Muro No. 03 abscisa K4+500



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 3.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 3.

Muro No. 04 abscisa K4+544



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 4.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 4.

Muro No. 05 abscisa K4+600



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 5.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 5.

Muro No. 06 abscisa K4+940





Carpeta asfáltica terminada en muro No. 6. Carpeta asfáltica terminada en muro No. 6.

Muro No. 07 abscisa K5+040





Carpeta asfáltica terminada en muro No. 7. Carpeta asfáltica terminada en muro No. 7.

Muro No. 08 abscisa K5+100





Carpeta asfáltica terminada en muro No. 8. Carpeta asfáltica terminada en muro No. 8.

Muro No. 09 abscisa K5+170





Carpeta asfáltica terminada en muro No. 9. Carpeta asfáltica terminada en muro No. 9.

Muro No. 10 abscisa K5+240





Carpeta asfáltica terminada en muro No. 10. Carpeta asfáltica terminada en muro No. 10.

Muro No. 11 abscisa K5+450





Fundida de zapatas en cimentación de muro No. 11. Fundida de zapatas en cimentación de muro No. 11.

Muro No. 12 abscisa K5+730





Estado actual muro No. 12 Estado actual muro No. 12

Muro No. 13 abscisa K5+910





Fundida de zapatas en cimentación de muro No. 13. Fundida de zapatas en cimentación de muro No. 13.

Boyacá	**INFORME SEMANAL** **MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA**	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

FECHA 23/02/2025
(Día / Mes / Año)

Muro No. 14 abscisa K6+140



Solado de limpieza en cimentación de muro No. 14.



Perforaciones de anclajes verticales en cimentación de muro No. 14.

Muro No. 15 abscisa K6+270



Perforación y fundida de pilotes en concreto en muro No. 15.



Perforación y fundida de pilotes en concreto en muro No. 15.

DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
* Por medio del oficio No.GIC-GB-293-25 del 19 de febrero de 2025, la interventoría remite al contratista Observaciones seguimiento al cronograma de obra. * Mediante comunicado No.CMONIQUIRÁ-CE-225 del 19 de febrero de 2025, el contratista envía a la interventoría el informe mensual No. 10 de obra * Con el oficio No. GIC-GB-290-25 del 18 de febrero de 2025, la interventoría remite a la supervisión del contrato Comunicación CMONIQUIRÁ-CE-223 Acta de obra No. 5 . * Mediante comunicado No. GIC-GB-289-25 del 18 de febrero de 2025, la interventoría remite a la supervisión del contrato Entrega Informe Semanal No. 44 Contrato de Interventoría No. 3230 2023 . * A través del comunicado No.GIC-GB-294-25 del 22 de febrero de 2025, la interventoría remite a la supervisión del contrato Comunicación CMONIQUIRÁ-CE-226 Viabilidad Modificación No. 2 del contrato de obra - Adición y Prorroga	FIRMA NOMBRE: ING. EDGAR ARAGON OTERO Matrícula Profesional No.: 25202226695 CND

GIC-GB-300-25

Bogotá, D.C., 06 de marzo de 2025

Ingeniero
JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA
Supervisor de proyecto
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
GOBERNACIÓN DE BOYACA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Carrera 9 #17-50 Edificio de la Contraloría Piso 2. Tunja – Boyacá
despacho.infraestructura@boyaca.gov.co
Tunja

Referencia: Contrato de interventoría No. 3230 de 2023 “Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Contable y Ambiental al Contrato de Obra cuyo Objeto es “Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Moniquirá – Togüi, Muros de Contención, Departamento De Boyacá".

Asunto: Entrega Informe Semanal No. 46 Contrato de Interventoría No. 3230-2023

Respetado Ingeniero:

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales del Contrato de la referencia, adjunto al presente se remite el informe semanal para el periodo reportado a continuación:

Semana	Periodo
No. 46	Del 24/02/25 al 02/03/25

Lo anterior, se remite para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal
Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S

Anexo: Informe Semanal No. 46
Copia: Archivo
Elaboró: NDG
Revisó: EAO

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

INFORME SEMANAL
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA

FECHA: 2/03/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION — SEMANA No.: 46 (Numeración consecutiva) del 24/02/2025 al 2/03/2025

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE BOYACÁ — **DIRECCIÓN:** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 3269 de 2023 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: Construcción de 15 muros de contención en punto críticos que se encuentran en la vía de Moniquirá a Togui

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO MONIQUIRA			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES		
CONTRATO No.	3269 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 4.936.601.853,14	CONTRATO No.	3230 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 361.963.536
FECHA DE INICIO:	8/04/2024	VALOR ADICIONES:	$ 2.395.852.200,55	FECHA DE INICIO:	8/04/2024	VALOR ADICIONES:	$ 175.669.652,93
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	8/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 7.332.454.053,69	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	4/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 537.633.188,93
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	19/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ 1.480.980.556,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	19/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.200.343.358,77			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 280.637.197,23			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.936.601.853	$ 2.395.852.201		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 4.001.144.729			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 935.457.124	$ 2.395.852.201		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 361.963.536	$ 175.669.653		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 293.386.431	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 68.577.105	$ 175.669.653		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	4.936.601.853,14	
ADICIÓN 1	$	2.395.852.200,55	
VALOR TOTAL CONTRATO	$	7.332.454.053,69	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	6.530.045.075,90	89,06% *
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	5.827.201.396,11	79,47% *
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(702.843.679,79)	-9,59% *
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	-	% *
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	6.530.045.075,90	89,1% *
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	5.827.201.396,11	79,5% *
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(702.843.679,79)	-9,6% *
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	478.122.343,75	6,52% *
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	171.315.895,04	3,47% *

Observaciones: El atraso corresponde a los bajos rendimientos que se han tenido en las actividades de cimentacion del muro 15, las cuales se han visto afectadas debido a las lluvias que se presentaron en la zona durante el mes de febrero de 2025.

INTERVENTORÍA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$	361.963.536,00	
ADICIÓN 1	$	175.669.652,93	
VALOR TOTAL CONTRATO	$	537.633.188,93	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	504.716.871,24	93,88%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	504.716.871,24	93,88%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$	10.972.105,90	3,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	10.972.105,90	3,03%

Observaciones: N.A

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.480.980.555,95
Amortizado $	$ 1.200.343.358,77
Saldo $	$ 280.637.197,18

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 89,06% — Avance o Atraso Físico %: -9,59%
Meta Física Ejecutada %: 79,47% — Avance tiempo contrato: 96,70%

CAPITULO	PROGRAMADO	EJECUTADO
I. MURO DE CONTENCIÓN N° 1-15	97,88%	87,81%
II. VARIOS	22,14%	22,39%
III. ITEMS NO CONTRATADOS	83,53%	73,04%
TOTAL OBRA	**89,06%**	**79,47%**

TRAMO: VIA MONIQUIRA-TOGUI

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VOLQUETA JTX454	1	1
RETROEXCAVADORA CAT 416D	1	1
COMPRESOR	1	3
MEZCLADORA	1	1
CAMIONETA	1	1
PLANTA ELECTRICA 100 KVA		1
UNIDAD ELECTRICA 50 HP		1
UNIDAD HIDRAULICA 30 HP		1
MEZCLADORA DE CONCRETO AUTOCARGANTE		1
SALTARINES		2
Total	5	13

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

OBSERVACIONES:


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Se realizaron trabajos de verificación de cotas y niveles con comisión topográfica.
* Se procedió a la instalación de señalización móvil de acuerdo al Plan de Manejo de Tráfico.
* Se llevó acabo las actividades de perforación y fundida de anclajes verticales en cimentación de muro No.14.
* Se realizó amarre de acero de refuerzo y fundida de pantallas en concreto en muro No.1.
* Se ejecutó perforación y fundida de pilotes en concreto en cimentación de muro No. 15.

XI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Se continuará con la ejecución de actividades de perforación y fundida de pilotes en concreto para cimentación de muro No. 15.
* Se ejecutarán amarre de acero de refuerzo y fundida de pantallas en muro No. 11 y 13.
* Se realizarán actividades de amarre de refuerzo para zapatas en cimentación de muro No. 14
* Se desarrollaran trabajos de verificación de cotas y niveles con comisión topográfica.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

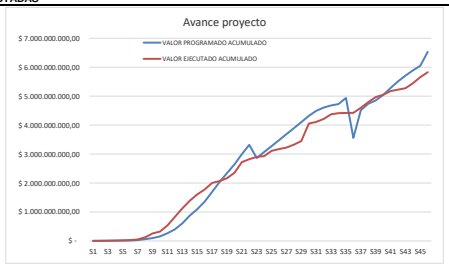

FECHA 2/03/2025 (Día / Mes / Año)

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO



N PUNTOS CRITICOS VIA MONIQUIRÁ - TOGUI

Muro No. 01 abscisa K4+090



Amarre de acero de refuerzo y fundida de pantallas en concreto muro No. 1.



Amarre de acero de refuerzo y fundida de pantallas en concreto muro No. 1.

Muro No. 02 abscisa K4+320



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 2.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 2.

Muro No. 03 abscisa K4+500



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 3.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 3.

Muro No. 04 abscisa K4+544



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 4.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 4.

Muro No. 05 abscisa K4+600



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 5.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 5.

Muro No. 06 abscisa K4+940







Carpeta asfáltica terminada en muro No. 6.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 6.

Muro No. 07 abscisa K5+040

Carpeta asfáltica terminada en muro No. 7.

Carpeta asfáltica terminada en muro No. 7.

Muro No. 08 abscisa K5+100



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 8.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 8.

Muro No. 09 abscisa K5+170



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 9.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 9.

Muro No. 10 abscisa K5+240



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 10.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 10.

Muro No. 11 abscisa K5+450



Fundida de zapatas en cimentación de muro No. 11.



Fundida de zapatas en cimentación de muro No. 11.

Muro No. 12 abscisa K5+730



Estado actual muro No. 12



Estado actual muro No. 12

Muro No. 13 abscisa K5+910



Fundida de zapatas en cimentación de muro No. 13.



Fundida de zapatas en cimentación de muro No. 13.

FECHA 2/03/2025 (Día / Mes / Año)

Muro No. 14 abscisa K6+140



Anclajes verticales para cimentación de muro No. 14.



Anclajes verticales para cimentación de muro No. 14.

Muro No. 15 abscisa K6+270



Perforación y fundida de pilotes en concreto en muro No. 15.



Perforación y fundida de pilotes en concreto en muro No. 15.

DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Por medio del oficio No.GIC-GB-295-25 del 24 de febrero de 2025, la interventoría remite al contratista Alcance comunicación GIC-GB-293-25 Observaciones seguimiento al cronograma de obra .
* Mediante comunicado No.CMONIQUIRÁ-CE-227 del 27 de febrero de 2025, el contratista envía a la interventoría el informe semanal No. 45 de obra.
* Se realiza reunión virtual el 28 de febrero de 2025 con presencia de supervisor, contratista, interventoría y personal de regalías para revisión de observaciones al modificatorio No. 2.
* Con el correo electrónico del 28 de febrero de 2025, la interventoría remite a la supervisión del contrato CORRECCION MODIFICATORIO No. 2 - PROYECTO MONIQUIRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ING. EDGAR ARAGON OTERO
Matrícula Profesional No.: 25202226695 CND

GIC-GB-304-25

Bogotá, D.C., 11 de marzo de 2025

Ingeniero
JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA
Supervisor de proyecto
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
GOBERNACIÓN DE BOYACA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Carrera 9 #17-50 Edificio de la Contraloría Piso 2. Tunja – Boyacá
despacho.infraestructura@boyaca.gov.co
Tunja

Referencia: Contrato de interventoría No. 3230 de 2023 “Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Contable y Ambiental al Contrato de Obra cuyo Objeto es “Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Moniquirá – Togüi, Muros de Contención, Departamento De Boyacá".

Asunto: Entrega Informe Semanal No. 47 Contrato de Interventoría No. 3230-2023

Respetado Ingeniero:

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales del Contrato de la referencia, adjunto al presente se remite el informe semanal para el periodo reportado a continuación:

Semana	Periodo
No. 47	Del 03/03/25 al 09/03/25

Lo anterior, se remite para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal
Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S
Anexo: Informe Semanal No. 47
Copia: Archivo
Elaboró: NDG
Revisó: EAO

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

INFORME SEMANAL
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA

FECHA: 9/03/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION — SEMANA No.: 47 (Numeración consecutiva) del 3/03/2025 al 9/03/2025

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE BOYACÁ — **DIRECCIÓN:** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 3269 de 2023 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: Construcción de 15 muros de contención en punto críticos que se encuentran en la vía de Moniquirá a Togui

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO MONIQUIRA			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES		
CONTRATO No.	3269 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 4.936.601.853,14	CONTRATO No.	3230 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 361.963.536
FECHA DE INICIO:	8/04/2024	VALOR ADICIONES:	$ 2.395.852.200,55	FECHA DE INICIO:	8/04/2024	VALOR ADICIONES:	$ 175.669.652,93
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	8/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 7.332.454.053,69	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	4/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 537.633.188,93
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	19/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ 1.480.980.556,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	19/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.200.343.358,77			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 280.637.197,23			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.936.601.853	$ 2.395.852.201		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 4.001.144.729			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 935.457.124	$ 2.395.852.201		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 361.963.536	$ 175.669.653		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 293.386.431	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 68.577.105	$ 175.669.653		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	4.936.601.853,14	
ADICIÓN 1	$	2.395.852.200,55	
VALOR TOTAL CONTRATO	$	7.332.454.053,69	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	7.063.303.105,46	96,33% *
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	5.883.258.077,15	80,24% *
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(1.180.045.028,31)	-16,09% *
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	-	% *
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	7.063.303.105,46	96,3% *
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	5.883.258.077,15	80,2% *
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(1.180.045.028,31)	-16,09% *
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	533.258.029,56	7,27% *
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	56.056.681,03	1,14% *

Observaciones: El atraso corresponde a los bajos rendimientos que se han tenido en las actividades de cimentación del muro 15, las cuales se han visto afectadas debido a las lluvias que se presentaron en la zona durante el mes de febrero de 2025. A la fecha se encuentra en trámite la solicitud de prorroga y adición del contrato de obra

INTERVENTORÍA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$	361.963.536,00	
ADICIÓN 1	$	175.669.652,93	
VALOR TOTAL CONTRATO	$	537.633.188,93	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	515.688.977,14	95,92%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	515.688.977,14	95,92%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$	10.972.105,90	3,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	10.972.105,90	3,03%

Observaciones: N.A

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.480.980.555,95
Amortizado $	$ 1.200.343.358,77
Saldo $	$ 280.637.197,18

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 96,33% — Avance o Atraso Físico %: -16,09%
Meta Física Ejecutada %: 80,24% — Avance tiempo contrato: 98,80%

CAPITULO	PROGRAMADO	EJECUTADO
I. MURO DE CONTENCIÓN N° 1-15	99,23%	88,28%
II. VARIOS	45,20%	23,66%
III. ITEMS NO CONTRATADOS	98,48%	74,15%
TOTAL OBRA	**89,06%**	**80,24%**

TRAMO: VIA MONIQUIRA-TOGUI

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VOLQUETA JTX454	1	1
RETROEXCAVADORA CAT 416D	1	1
COMPRESOR	1	3
MEZCLADORA	1	1
CAMIONETA	1	1
PLANTA ELECTRICA 100 KVA		1
UNIDAD ELECTRICA 50 HP		1
UNIDAD HIDRAULICA 30 HP		1
MEZCLADORA DE CONCRETO AUTOCARGANTE		1
SALTARINES		2
Total	5	13

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

OBSERVACIONES:


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Se realizaron trabajos de verificación de cotas y niveles con comisión topográfica.
* Se procedió a la instalación de señalización móvil de acuerdo al Plan de Manejo de Tráfico.
* Se realizó instalación de geodren vial en muro No.1.
* Amarre de acero de refuerzo y fundida de cunetas en concreto en muro No. 6.
* Se ejecutaron actividades de amarra de acero de refuerzo y fundida de pantallas en concreto en muro No. 11.
* Se ejecutó perforación y fundida de pilotes en concreto y drenes horizontales en muro No. 15.

XI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Se efectuarán trabajos de relleno con material de afirmado compactado en muro No. 1.
* Se continuará con la ejecución de actividades de perforación de drenes horizontales y amarre de acero de refuerzo para zapatas en muro No. 15.
* Se ejecutarán amarre de acero de refuerzo y fundida de pantallas en muro No. 13.
* Se realizarán actividades de amarre de refuerzo para zapatas en cimentación de muro No. 14
* Se desarrollaran trabajos de verificación de cotas y niveles con comisión topográfica.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

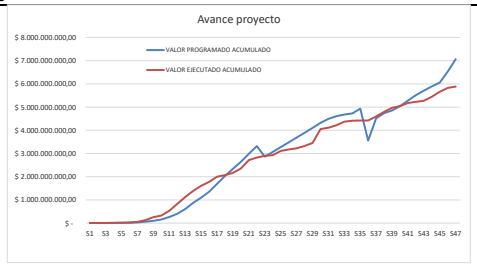

FECHA 9/03/2025 (Día / Mes / Año)

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO



N PUNTOS CRITICOS VIA MONIQUIRÁ - TOGUI

Muro No. 01 abscisa K4+090



Suministro e instalación de geodren vial en muro No. 1.



Verificación de cotas y niveles con topografía en muro No. 1.

Muro No. 02 abscisa K4+320



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 2.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 2.

Muro No. 03 abscisa K4+500



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 3.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 3.

Muro No. 04 abscisa K4+544



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 4.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 4.

Muro No. 05 abscisa K4+600



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 5.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 5.

Muro No. 06 abscisa K4+940





Amarre de acero de refuerzo y fundida de cunetas en concreto en muro No. 6.



Amarre de acero de refuerzo y fundida de cunetas en concreto en muro No. 6.

Muro No. 07 abscisa K5+040



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 7.

Carpeta asfáltica terminada en muro No. 7.

Muro No. 08 abscisa K5+100



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 8.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 8.

Muro No. 09 abscisa K5+170



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 9.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 9.

Muro No. 10 abscisa K5+240



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 10.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 10.

Muro No. 11 abscisa K5+450



Amarre de acero de refuerzo y fundida de pantallas en concreto muro No. 11.



Amarre de acero de refuerzo y fundida de pantallas en concreto muro No. 11.

Muro No. 12 abscisa K5+730



Estado actual muro No. 12



Estado actual muro No. 12

Muro No. 13 abscisa K5+910



Acero de refuerzo para pantallas en muro No. 13.



Acero de refuerzo para pantallas en muro No. 13.

Boyacá	**INFORME SEMANAL** **MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA**	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

FECHA	9/03/2025 (Día / Mes / Año)

Muro No. 14 abscisa K6+140



Anclajes verticales para cimentación de muro No. 14.



Anclajes verticales para cimentación de muro No. 14.

Muro No. 15 abscisa K6+270



Perforaciones para drenes horizontales en muro No. 15.



Perforación y fundida de pilotes en concreto en muro No. 15.

DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
* Por medio del oficio No.GIC-GB-300-25 del 6 de marzo de 2025, la interventoría remite a la supervisión del contrato el informe semanal de interventoría No. 46. * Mediante comunicado No.GIC-GB-302-25 del 7 de marzo de 2025, la interventoría remite a la supervisión del contrato Subsanación acta parcial de obra No. 5. * Se realiza comité de seguimiento el día 6 de marzo de 2025 con presencia de supervisor, contratista e interventoría cuyos temas quedan consignados en el acta respectiva. * El 7 de marzo de 2025 se realiza socialización del proyecto con la comunidad docente del colegio Haydee Camacho cuyos temas quedaron consignados en el acta respectiva.	FIRMA NOMBRE: ING. EDGAR ARAGON OTERO Matrícula Profesional No.: 25202226695 CND

GIC-GB-313-25

Bogotá, D.C., 31 de marzo de 2025

Ingeniero
JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA
Supervisor de proyecto
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
GOBERNACIÓN DE BOYACA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Carrera 9 #17-50 Edificio de la Contraloría Piso 2. Tunja – Boyacá
despacho.infraestructura@boyaca.gov.co
Tunja

Referencia: Contrato de interventoría No. 3230 de 2023 “Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Contable y Ambiental al Contrato de Obra cuyo Objeto es “Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Moniquirá – Togüi, Muros de Contención, Departamento De Boyacá".

Asunto: Entrega Informe Semanal No. 8 7 Contrato de Interventoría No. 3230-2023

Respetado Ingeniero:

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales del Contrato de la referencia, adjunto al presente se remite el informe semanal para el periodo reportado a continuación:

Semana	Periodo
No. 48	Del 10/03/25 al 17/03/25

Lo anterior, se remite para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal
Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S
Anexo: Informe Semanal No. 48
Copia: Archivo
Elaboró: NDG
Revisó: EAO

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

INFORME SEMANAL
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA

FECHA: 17/03/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION — SEMANA No.: 48 del 10/03/2025 al 17/03/2025 (Numeración consecutiva)

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE BOYACÁ — **DIRECCIÓN:** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 3269 de 2023 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: Construcción de 15 muros de contención en punto críticos que se encuentran en la vía de Moniquirá a Togui

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO MONIQUIRA		
CONTRATO No.	3269 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 4.936.601.853,14
FECHA DE INICIO:	8/04/2024	VALOR ADICIONES:	$ 2.395.852.200,55
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	8/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 7.332.454.053,69
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	19/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ 1.480.980.556,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.200.343.358,77
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 280.637.197,23

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES		
CONTRATO No.	3230 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 361.963.536
FECHA DE INICIO:	8/04/2024	VALOR ADICIONES:	$ 175.669.652,93
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	4/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 537.633.188,93
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	19/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.936.601.853	$ 2.395.852.201		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 4.001.144.729			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 935.457.124	$ 2.395.852.201		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 361.963.536	$ 175.669.653		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 293.386.431	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 68.577.105	$ 175.669.653		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	4.936.601.853,14	
ADICIÓN 1	$	2.395.852.200,55	
VALOR TOTAL CONTRATO	$	7.332.454.053,69	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	7.228.194.633,30	98,58% *
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	6.156.955.965,66	83,97% *
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(1.071.238.667,64)	-14,61% *
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	-	% *
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	7.228.194.633,30	98,6% *
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	6.156.955.965,66	84,0% *
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(1.071.238.667,64)	-14,61% *
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	164.891.527,84	2,25% *
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	273.697.888,51	5,54% *

Observaciones: El atraso corresponde a los bajos rendimientos que se han tenido en las actividades de cimentación del muro 15, las cuales se han visto afectadas debido a las lluvias que se presentaron en la zona durante el mes de febrero de 2025. A la fecha se encuentra en trámite la solicitud de prorroga y adición del contrato de obra

INTERVENTORÍA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$	361.963.536,00	
ADICIÓN 1	$	175.669.652,93	
VALOR TOTAL CONTRATO	$	537.633.188,93	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	526.661.083,03	97,96%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	526.661.083,03	97,96%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$	10.972.105,90	3,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	10.972.105,90	3,03%

Observaciones: N.A

ANTICIPOS		
Otorgado $	$	1.480.980.555,95
Amortizado $	$	1.200.343.358,77
Saldo $	$	280.637.197,18

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 98,58% — Avance o Atraso Físico %: -14,61%
Meta Física Ejecutada %: 83,97% — Avance tiempo contrato: 100,90%

CAPITULO	PROGRAMADO	EJECUTADO
I. MURO DE CONTENCIÓN N° 1-15	99,95%	89,44%
II. VARIOS	71,62%	60,32%
III. ITEMS NO CONTRATADOS	100,00%	77,74%
TOTAL OBRA	**98,58%**	**83,97%**

TRAMO: VIA MONIQUIRA-TOGUI

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VOLQUETA JTX454	1	1
RETROEXCAVADORA CAT 416D	1	1
COMPRESOR	1	3
MEZCLADORA	1	1
CAMIONETA	1	1
PLANTA ELECTRICA 100 KVA		1
UNIDAD ELECTRICA 50 HP		1
UNIDAD HIDRAULICA 30 HP		1
MEZCLADORA DE CONCRETO AUTOCARGANTE		1
SALTARINES		2
Total	5	13

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

OBSERVACIONES:


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Se realizaron trabajos de verificación de cotas y niveles con comisión topográfica.
* Se procedió a la instalación de señalización móvil de acuerdo al Plan de Manejo de Tráfico.
* Se realizó instalación de geodren vial en muro No.11.
* Amarre de acero de refuerzo y fundida de cunetas en concreto en muro No. 6.
* Se ejecutaron actividades de amarre de acero de refuerzo y fundida de pantallas en concreto en muro No. 13.
* Se ejecutó perforación y fundida de pilotes en concreto y drenes horizontales en muro No. 15.
* Se ejecutó la fundida de las zapatas del muro 15.

XI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Se efectuarán trabajos de relleno con material de afirmado compactado en muro No. 11.
* Se continuará con la ejecución de actividades de amarre de acero de refuerzo para zapatas en muro No. 15.
* Se realizarán actividades de amarre de refuerzo y fundida de zapatas en cimentación de muro No. 14
* Se desarrollaran trabajos de verificación de cotas y niveles con comisión topográfica.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

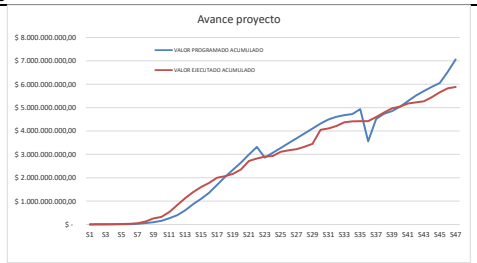

FECHA 17/03/2025
(Día / Mes / Año)

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO



N PUNTOS CRITICOS VIA MONIQUIRÁ - TOGUI

Muro No. 01 abscisa K4+090



Relleno con material de afirmado compactado en muro No. 1.



Relleno con material de afirmado compactado en muro No. 1.

Muro No. 02 abscisa K4+320



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 2.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 2.

Muro No. 03 abscisa K4+500



Fundida de cunetas en concreto en muro No. 3



Fundida de cunetas en concreto en muro No. 3

Muro No. 04 abscisa K4+544



Fundida de cunetas en concreto en muro No. 4



Fundida de cunetas en concreto en muro No. 4

Muro No. 05 abscisa K4+600



Fundida de cunetas en concreto en muro No. 5



Fundida de cunetas en concreto en muro No. 5

Muro No. 06 abscisa K4+940





Fundida de cunetas en concreto en muro No. 6.



Fundida de cunetas en concreto en muro No. 6.

Muro No. 07 abscisa K5+040



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 7.

Perforación de drenes horizontales en muro No. 7.

Muro No. 08 abscisa K5+100



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 8.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 8.

Muro No. 09 abscisa K5+170



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 9.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 9.

Muro No. 10 abscisa K5+240



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 10.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 10.

Muro No. 11 abscisa K5+450



Relleno con material de afirmado compactado en muro No. 11



Relleno con material de afirmado compactado en muro No. 11

Muro No. 12 abscisa K5+730



Estado actual muro No. 12



Estado actual muro No. 12

Muro No. 13 abscisa K5+910



Acero de refuerzo y fundida de concreto para pantallas en muro No. 13.



Acero de refuerzo y fundida de concreto para pantallas en muro No. 13.

Boyacá	**INFORME SEMANAL** **MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA**	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

FECHA 17/03/2025 (Día / Mes / Año)

Muro No. 14 abscisa K6+140



Acero de refuerzo y fundida de concreto para pantallas en muro No. 14



Acero de refuerzo y fundida de concreto para pantallas en muro No. 14

Muro No. 15 abscisa K6+270



Construcción zapatas en muro No. 15.



Construcción zapatas en muro No. 15.

DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Por medio del oficio No.GIC-GB-303-25 del 10 de marzo de 2025, la interventoría remite a la supervisión del contrato Respuesta comunicación S-2025-000129-SECINF Acta de socialización.
* Mediante comunicado No.GIC-GB-304-25 del 11 de marzo de 2025, la interventoría remite a la supervisión del contrato Entrega Informe Semanal No. 47 Contrato de Interventoría No. 3230-2023.
* Con el oficio No. GIC-GB-305-25 del 12 de marzo de 2025, la interventoría remite a la supervisión del contrato Subsanación acta parcial de obra No. 5.
* Mediante comunicación No. GIC-GB-307-25 del 14 de marzo de 2025, la interventoría remite al contratista Solicitud incremento de personal de obra.
* Por medio del oficio No.GIC-GB-308-25 del 14 de marzo de 2025, la interventoría remite al contratista Solicitud de limpieza del muro 15.
* A través del oficio No. GIC-GB-309-25 del 14 de marzo de 2025, la interventoría remite a la supervisión del contrato Reiteración comunicación GIC-GB-267-24 Necesidad de actividades de desmonte, limpieza y mantenimiento de cunetas en el corredor vial que comunica los municipios de Moniquirá y Togüi.
* Se realiza comité de seguimiento y recorrido de obra el día 13 de marzo de 2025 con presencia de supervisor, contratista e interventoría cuyos temas quedan consignados en el acta respectiva.

El 17 de marzo de 2025, se suspende los contratos de obra e interventoría a partir del 18 de marzo de 2025 hasta el 02 de abril del mismo año, debido a que entidad contratante se encuentra adelantando los tramites internos necesarios para la legalización de la solicitud correspondiente a prórroga y adición del contrato en mención.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ING. EDGAR ARAGON OTERO

Matrícula Profesional No.: 25202226695 CND
