INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIO FONSECON
CONVENIO No. 1592, CURUMANI - CESAR
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **ABRIL** DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI - CESAR		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Corregimiento de San Roque Municipio de Curumaní-Cesar		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE CURUMANI, DEPARTAMENTO CESAR		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**	$1.250.000.000,00	
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	$ 20.975.011,72	
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO	$ 1.270.975.011,72	
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/09/2021		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	30/05/2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	ING. VITERBO GÓMEZ CARVAJAL	**DESDE:** 01/10/2024	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Ing. Remberto Martínez Polo	26/10/2021	15/01/2022
	Ing. Luis Fernando Pinzón Galindo	16/01/2022	31/01/2022
	Ing. Juan Carlos Montaña	01/02/2022	05/02/2022
	Ing. Remberto Martínez Polo	06/02/2022	20/03/2023
	Arq. Héctor Iván Ayala Dueñas	21/03/2023	30/06/2023
	Ing. Edgar González Patiño	1/07/2023	20/07/2023
	Ing. Hernando de Jesús Pérez P.	21/07/2023	13/09/2024
	Ing. Sergio Sanjuan Santiago	14/09/2024	30/09/2024
	Ing. Viterbo Gómez Carvajal	01/10/2024	Actual
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Gina Lorena Cruz Calderón	26/10/2021	31/12/2021
	Gina Lorena Cruz Calderón	18/01/2022	01/03/2022
	Rafael Ortiz	01/04/2022	30/09/2022
	Arq. Edwin Andrés Torres Angel	01/10/2022	31/12/2022
	Favio Rosero	15/02/2023	14/08/2023
	Edinson García Díaz	15/09/2023	31/12/2023
	Edinson García Díaz	30/01/2024	30/09/2024
	Ing. Darío Fernando Córdoba J.	01/10/2024	31/12/2024
	Ing. Maria Alejandra Jiménez	01/01/2025	03/02/2025
	Arq. Edwin Andrés Torres Angel	04/02/2025	Actual
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR 2021	No.90121	24/09/2021	31/12/2021
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR 2022	No. 11922	16/01/2022	31/12/2022
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR 2023	No.9323	19/19/2023	31/12/2023
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. AA058523	26/10/2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	26/10/2021		

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA	FECHA: 31/10/2022
	SEGUNDA PRÓRROGA	FECHA: 31/12/2022
	TERCERA PRÓRROGA	FECHA: 30/04/2023
	CUARTA PRORROGA	FECHA: 31/08/2023
	QUINTA PRORROGA	FECHA: 28/02/2024
	SEXTA PRORROGA	FECHA: 20/06/2024
	SEPTIMA PRORROGA (Hasta 31/03/2025) CUARTA MODIFICACIÓN (modificando las clausula quinta y séptima)	FECHA: 20/12/2024
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	FECHA: 27/02/2024
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN	FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO No1	FECHA: 20/06/2024
	SUSPENSIÓN 02	FECHA: 27/08/2024
	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN 02	FECHA: 27/11/2024
	SUSPENSIÓN 03 (Hasta 26/05/2025) Plazo final de ejecución 30/05/2025	FECHA: 27/03/2025
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 01/12/2022 – Inicial	
	FECHA: 01/05/2023 – Primera Prorroga	
	FECHA: 31/07/2023 – Segunda Prorroga y Primera Adición	
	FECHA: 30/11/2023 – Tercera Prorroga	
	FECHA: 31/03/2024 – Cuarta Prorroga	
	FECHA: 31/08/2024 – Quinta Prorroga	
	FECHA: No está publicada en SECOPII – Sexta Prorroga	
	FECHA: No está publicada en SECOPII – Séptima Prorroga	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 83.332.872,42	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 41.666.436,21	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A	
VALOR DE OBRA	$ 1.041.667.306,83	
VALOR INTERVENTORÍA	$ 83.333.384,55	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$ 20.975.011,72	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	12/11/2021	$375.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. Entrega del Acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el Ministerio del Interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del proyecto, en la cual el municipio se compromete con sustento en lo socializado, a entregar a más tardar dentro de los 30 días calendario siguientes, los proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de los estudios, diseño y ejecución de obra, así como el de interventoría. B. Publicación en el aplicativo habilitado por Colombia Compra Eficiente del proyecto de pliegos de condiciones anteriormente descrito.	NO APLICA	30/11/2021	$375.000.000,00
TERCER DESEMBOLSO	Del 20% del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIOI equivalente a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. Certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	40%	30/06/2023	$250.000.000,00

ÚLTIMO DESEMBOLSO	Previa presentación por parte del Supervisor del Convenio designado por el Municipio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP.	100%	DD/MM/AAAA	$ 250.000.000,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 1.000.000.000,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 903.976.914,48,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: EQUIDAD SEGURO

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
AA058523	Cumplimiento	$ 254.195.002,34 0,00	31/08/2023	30/09/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato LPMC 004-2021	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANÍ - CESAR		$ 1.124.991.871,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	23/08/2022		$ 20.975.011,72
Nombre contratista	Consorcio Sacúdete San Roque Nit: 901.557.178-1		
Fecha de Acta de inicio del contrato	24/02/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	OTROSI MODIFICATORIO 1	MODIFICANDO LA FORMA DE PAGO	
	OTROSI MODIFICATORIO 2	31/10/2022	
	OTROSI MODIFICATORIO 3	31/12/2022	
	OTROSI MODIFICATORIO 4	15/04/2023	
	OTROSI MODIFICATORIO 5	30/04/2023	
	OTROSI MODIFICATORIO 6	15/06/2023	
	SUSPENSIÓN 1	19/05/2023	
	REINICIO 1	19/07/2023	
Fecha de terminación del contrato	15/08/2023(CONTRATO VENCIDO)		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 1.145.966.883,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		
PÓLIZA No.	Cumplimiento: 11-44-101183457 / Responsabilidad Civil: 11-40-101045846		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento: 15/12/2023 / Responsabilidad Civil: 15/06/2023		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato CMA 002-2021	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE	$ 124.973.282,35

	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CURUMANÍ - CESAR		
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Consorcio CSC Sacúdete Curumaní Nit: 901.557.688-6		
Fecha de Acta de inicio del contrato	24/02/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA 1	31/10/2022	
	PRÓRROGA 2	31/12/2022	
	PRÓRROGA 3	15/04/2023	
	PRÓRROGA 4	30/04/2023	
	PRÓRROGA 5	15/06/2023	
	SUSPENSIÓN	19/05/2023	
	REINICIO	19/07/2023	
Fecha de terminación del contrato	15/08/2023 (CONTRATO VENCIDO)		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 124.973.282,35
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ZURICH SEGURO S.A.**		
PÓLIZA No.	**SGPL-26867290-1**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**08/02/2022**		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: ABRIL_25	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA: FINAL DE NOVIEMBRE 2024	X	
INFORME FINANCIERO: ABRIL 2025	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$100.314.948,35 (31/12/2024)	X
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	FALTA CONEXIÓN FINAL	TERMINADAS
OTROS		

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**100%**
% EJECUTADO DE OBRA	**99%**

COMPONENTE TECNICO

- El convenio se encuentra en ejecución con un 100% de ejecución física de la obra, sin embargo, cuenta con RETIE y RETILAP, está pendiente la conexión final del proyecto.

COMPONENTE FINCANCIERO

- Durante el periodo informado no hubo movimientos financieros. A la fecha el Ministerio ha desembolsado mil millones de pesos ($1.000.000.000), quedando pendiente el ultimo desembolso por valor de doscientos cincuenta millones de pesos ($250.000.000).

COMPONENTE JURIDICO

- Mediante memorando con Radicado 2025-3-003122-008751 Id: 498410 del 25 de febrero de 2025, se presentó a gestión contractual “SOLICITUD DE TRÁMITE ADMINISTRATIVO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO. Convenio Interadministrativo No.1592 de 2021, Curumaní – Cesar.”

SEGUIMIENTO:

07/04/2025, Mediante correo electrónico enviado al municipio de Curumaní con asunto: CARACTER PRORITARIO - Citación No. 3 a reunión virtual en el marco del seguimiento a la ejecución del Convenio No. 1592 del 2021."

(…)"En atención a la ejecución del Convenio No. 1592 del 2021, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR", la supervisión del convenio por parte del Ministerio del Interior, convoca a reunión virtual con CARACTER PRIORITARIO con el propósito de realizar el seguimiento frente al avance de los hechos que motivaron la 3a suspensión de convenio. En ese sentido, se alerta sobre la finalización del plazo del convenio está pactado para el 30/05/2025.

Dicho lo anterior, se solicita de la conexión a través de la plataforma Teams por parte de la Entidad Territorial y a su vez, hacer extensiva la presente convocatoria al representante legal de las firmas contratista de obra e interventoría, bajo la siguiente información:

Datos de la reunión:
Fecha: 08/04/2025
Hora: 11:00 a.m." (…)

23/04/2025, se remite correo electrónico al municipio de Curumaní con asunto: "CARACTER PRORITARIO - Citación No. 4 a reunión virtual en el marco del seguimiento a la ejecución del Convenio No. 1592 del 2021"

(…)"En atención a la ejecución del Convenio No. 1592 del 2021, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR", la supervisión del convenio por parte del Ministerio del Interior, convoca a reunión virtual con CARACTER PRIORITARIO con el propósito de realizar el seguimiento frente al avance de los hechos que motivaron la 3a suspensión de convenio. En ese sentido, se alerta sobre la finalización del plazo del convenio está pactado para el 30/05/2025.

Dicho lo anterior, se solicita de la conexión a través de la plataforma Teams por parte de la Entidad Territorial y a su vez, hacer extensiva la presente convocatoria al representante legal de las firmas contratista de obra e interventoría, bajo la siguiente información:

Datos de la reunión:
Fecha: 24/04/2025
Hora: 11:00 a.m."(…)

23/04/2025, mediante correo electrónico se remite al municipio con asunto: "Remisión Acta de Reunión virtual 08-04-2025 convenio 1592-2021 Curumani-Cesar"

(…)"Cordial saludo, por medio del presente remitimos el Acta de Reunión del asunto realizada el 8 de abril de 2025 por Microsoft Teams, solicitamos dar estricto cumplimiento a los compromisos y devolver firmada en medio digital."(…)

24/04/2025, mediante Acta de Reunión se realiza la reunión de carácter virtual a través de Microsoft Teams con las siguientes conclusiones:

*(…)"**Desarrollo:***

1. ***Revisión de Documentos Pendientes:***
   - *Se revisó el listado de chequeo de los documentos pendientes para el recibo del proyecto.*
   - *Se discutió la entrega de documentos pendientes por parte del municipio de Curumaní, incluyendo el Acta Final firmada, actas de recibo, y certificados de conexión.*
   - *Se estableció el 30 de abril como fecha de compromiso para la entrega de la información completa por parte del municipio.*
2. ***Estado de los Documentos:***
   - *Acta Final: En revisión por la Interventoría.*
   - *Certificado de Conexión: Se recibió oficio de Afinia con información sobre la conexión y medidor instalado. Se coordinará la solicitud a Afinia para la energización del servicio.*
   - *Certificado de Alcantarillado: Ya fue entregado previamente.*
   - *Certificados de Garantía de Calidad: Pendientes de entrega por parte del contratista.*
   - *Planos Récord y Manual de Operación: Pendientes de entrega por parte del contratista.*
   - *Informes Semanales: Se verificarán los cargados en el Secop.*
   - *Registro Fotográfico: En proceso de terminación.*
   - *Informe Financiero: Pendiente la entrega de órdenes y comprobantes de egreso, órdenes de pago y extractos bancarios. Se gestionará con la Secretaría de Hacienda del municipio.*

3. Compromisos:

- *El municipio de Curumaní se compromete a entregar la información completa el 30 de abril de 2025.*
- *El municipio de Curumaní enviará copia de la solicitud de conexión a AFINIA al Ministerio del Interior el 24 de abril de 2025.*
- *Se reitera la importancia de agilizar la entrega de la información financiera para permitir la legalización de los pagos.*

Cierre:

- *Se da por terminada la reunión, agradeciendo a los asistentes por su participación y reiterando la importancia del cumplimiento de los compromisos adquiridos.*

Conforme a la revisión de documentación de recibo en la presente reunión se procede a realizar el listado de chequeo de la documentación pendiente:

DOCUMENTO DE ENTREGA	***SI***	***NO***
1. Acta final firmada por todos los profesionales, con sus respectivas sábanas de actividades ejecutadas (ACTA FINAL DE OBRA). (Contratista Obra, Contratista Interventoría de obra y supervisión del Municipio). FALTA LA SABANA Y LAS MEMORIAS DE CALCULO DE TODAS LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.		*X*
2. Acta de recibo del proyecto a satisfacción por parte de la interventoría al contratista de obra, firmada por los siguientes profesionales (Contratista de Interventoría y contratista de obra). OK.	*X*	
3. Acta de recibo del proyecto a satisfacción por parte de la supervisión del municipio al contratista de interventoría, firmada por los siguientes profesionales (supervisor del Municipio y contratista de interventoría). FALTA ESTA ACTA.		*X*
4. Certificado de conexión eléctrica definitiva. (empresa de energía). FALTA CERTIFICADO.		*X*
5. Certificado de la empresa prestadora del servicio de energía en la cual garantiza la prestación del servicio definitivo de energía al SACUDETE. FALTA CERTIFICADO.		*X*
6. Certificado de que la obra se encuentra ejecutada al 100% del supervisor del convenio. OK.	*X*	
7. Certificado de que la obra se encuentra ejecutada al 100% del contratista de obra e interventoría de obra. OK.	*X*	
8. Certificado conexión acueducto y alcantarillado. FALTA.		*X*
9. Certificado de garantía y calidad de los juegos infantiles. FALTA QUE CERTIFIQUE QUE LOS JUEGOS SON PARA EL PROYECTO SACUDETE CURUMANI (SAN ROQUE)		*X*
10. Certificado de garantía y calidad de los equipos de gimnasio. FALTA CERTIFICADO.		*X*
11. Certificado grama sintética. FALTA CERTIFICADO.		*X*
12. Actualización de póliza cargada y aprobada por el Ministerio en SECOP II según última actuación (séptima prórroga). OK.	*X*	
13. Acta final de cantidades y presupuesto. FALTA		*X*
14. Acta de Inventario por Espacios del SACUDETE. FALTA EL INVENTARIO.		*X*
15. Manual de Operación y Mantenimiento del SACUDETE y las Llaves de los espacios cerrados. FALTA EL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.		*X*
16. Planos récord en PDF firmados por el supervisor del convenio, el contratista de obra y el interventor de obra. FALTAN LOS PLANOS RECORD.		*X*
17. Informe final de interventoría y todos los informes semanales de interventoría ordenados cronológicamente. FALTAN LOS INFORMES SEMANALES.		*X*
18. Registro fotográfico en medio magnético. FALTA EL REGISTRO FOTOGRAFICO.		*X*
19. Informe final de la supervisión del Municipio. OK.	*X*	
a. Informes mensuales de supervisión completos y ordenados cronológicamente debidamente publicados en la plataforma SECOPII. FALTAN PUBLICACIÓN EN SECOPII.		*X*
20. Certificación RETIE. OK.	*X*	
21. Certificación RETILAP. OK.	*X*	
22. Informe financiero Final por parte de tesorero Municipal con sus soportes (comprobantes de egreso, órdenes de pago, extractos bancarios y certificación de rendimientos financieros). FALTAN TODOS LOS INFORMES (ordenes de egreso, órdenes de pago, extractos bancarios y certificación de rendimientos financieros).		*X*

En resumen, los documentos que hacen falta son los que se relacionan en el cuadro anterior, pero los más relevantes son:

Certificados y Actas:

- *Certificado de conexión eléctrica definitiva.*
- *Acta de recibo de satisfacción por parte de la interventoría.*
- *Certificado de que la obra se encuentra ejecutada al 100% por el contratista y la interventoría.*
- *Certificado de garantía de los juegos infantiles y equipos de gimnasio.*

Informes y Planos:

- *Informes semanales de interventoría y supervisión.*
- *Planos récord de construcción y registro fotográfico desde el inicio hasta la finalización de la obra.*

Informe Financiero Final:

- *Solicitud de informe financiero final junto con comprobantes de pago, órdenes de egreso, extractos bancarios, y certificación de rendimientos financieros.*

Conclusión: El municipio debe entregar la documentación completa para que el Ministerio del Interior programe el recibo del proyecto."(…)

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

El 14 de marzo de 2025 se remitió a la Subdirección de Gestión Contractual la **CITACION AUDIENCIA PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONVENIO 1592 DE 2021 - CURUMANI – CESAR,** programada para el 25 de marzo de 2025, la cual se instauró en la fecha citada y el municipio de Curumaní a través de su alcalde HERMES FERNANDO MARTINEZ URSULA solicitó la suspensión del convenio por un término de 2 meses.

Actualmente el convenio tiene vigencia hasta el 30 de mayo de 2025 conforme a la suspensión No. 3, producto de la actividad faltante, es decir, trámite de conexión final pendiente por la empresa de energía AFINIA.

De igual forma, está pendiente el proceso de recibo por parte del Municipio y del Ministerio para finalmente suscribir el acta de recibo y entrega del bien (anexo 26). A la fecha el municipio ha entregado la documentación de manera parcial y conforme a la reunión realizada el 24 de abril de 2025, falta lo siguiente:

- Acta final firmada por todos los profesionales.
- Certificado de conexión eléctrica definitiva.
- Acta de recibo de satisfacción por parte de la interventoría.
- Certificado de que la obra se encuentra ejecutada al 100% por el contratista y la interventoría.
- Certificado de garantía de los juegos infantiles y equipos de gimnasio.
- Acta de Inventario por Espacios del SACUDETE.
- Informes semanales de interventoría y supervisión del municipio.
- Planos récord de construcción y registro fotográfico desde el inicio hasta la finalización de la obra.
- Registro fotográfico en medio magnético.
- Informe financiero final junto con comprobantes de pago, órdenes de egreso, extractos bancarios, y certificación de rendimientos financieros.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

04/10/2023	22/11/2023	20/03/2024	14/11/2024	12/12/2024	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ING. VITERBO GOMEZ CARVAJAL Supervisor Convenio Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON	**ARQ. EDWIN ANDRES TORRES ANGEL** Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON

Outlook

CARACTER PRORITARIO - Citación a reunión virtual en el marco del seguimiento a la ejecución del Convenio No. 1592 del 2021

Organizer	Edwin Andres Torres Angel <edwin.torres@mininterior.gov.co>
Hora de la reunión	Este evento ocurrió el Hace 1 mes (Mar 08/04/2025, 'de' 15:00 a 15:30)
Ubicación	Reunión de Microsoft Teams
Mi respuesta	Aún no respondido
Asistentes necesarios	planeacion curumani-cesar.gov.co, Viterbo Gomez Carvajal, Hermes Mauricio Guarnizo Lopera, Diana Carolina Guerra Urbina, 585_ALC, Jaime Luis Berdugo Perez
Mensaje enviado	Lun 07/04/2025 9:42

Bogotá D.C.

HERMES MARTINEZ URSULA
Alcalde
Municipio de Curumani - Departamento del Cesar
Calle 7 # 15-104
despacho@curumani-cesar.gov.co

JESUS EDUARDO MANZANO PORTILLO
Supervisor del Convenio por el Municipio
Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal
planeacion@curumani-cesar.gov.co

ASUNTO: CARACTER PRORITARIO - Citación a reunión virtual No. 3 en el marco del seguimiento a la ejecución contractual del Convenio Interadministrativo No. 1592 del 2021, suscrito entre la Nación- Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON con el municipio de Curumaní / Cesar.

REF.: Convenio Interadministrativo No. 1592 del 2021, Curumani - Cesar.

Cordial saludo,

En atención a la ejecución del Convenio No. 1592 del 2021, cuyo objeto es: *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR"*, la supervisión del convenio por parte del Ministerio del Interior, convoca a reunión virtual con CARACTER

PRIORITARIO con el propósito de realizar el seguimiento frente al avance de los hechos que motivaron la 3a suspensión de convenio. En ese sentido, se alerta sobre la finalización del plazo del convenio está pactado para el 30/05/2025.

Dicho lo anterior, se solicita de la conexión a través de la plataforma Teams por parte de la Entidad Territorial y a su vez, hacer extensiva la presente convocatoria al representante legal de las firmas contratista de obra e interventoría, bajo la siguiente información:

Datos de la reunión:
Fecha: 08/04/2025
Hora: 11:00 a.m.

Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?

Unirse a la reunión ahora

Id. de reunión: 254 529 915 39

Código de acceso: Mi28wk9R

Para organizadores: Opciones de la reunión

Interior

MINISTERIO DEL INTERIOR

Privacidad y seguridad

ACTA No.	3
FECHA	08-04-2025
CIUDAD	Virtual Microsoft Teams
No. CONTRATO y/o CONVENIO	1592 de 2021
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI – CESAR.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	99%
MOTIVO:	**Reunión virtual en el marco del seguimiento a la ejecución del Convenio No. 1592 del 2021:** Terminación de los pendientes de obra evidenciados en visita realizada en noviembre 14 de 2024, conexión eléctrica definitiva y último desembolso del convenio.

PARTES

Ministerio del Interior	Contratista/Convenido
Nombre: Viterbo Gómez Carvajal Cargo: Grupo de Supervisión Ministerio del Interior	Nombre: Numis Cárcamo Cargo: Apoyo a la Supervisión Municipio de Curumani
Nombre: Edwin Andrés Torres Angel Cargo: Profesional de Apoyo a la Supervisión Ministerio del Interior	Nombre: Eduardo Manzano Cargo: Secretario de Planeación Municipio de Curumani
N.A.	Nombre: Heráclito Torres Cargo: Asesor Jurídico Municipio de Curumani

DESARROLLO DE LA REUNION

Contexto: El convenio finaliza el 30 de mayo de 2025. No se ha verificado la terminación de los pendientes de obra evidenciados en la visita del 14 de noviembre de 2024 puesto que no existe el último informe de interventoría. El proyecto Sacúdete al Parque aún no tiene conexión eléctrica definitiva. Se reprogramó el último desembolso del convenio para 2025 a solicitud del municipio.

Desarrollo de la Reunión:

1. **Inquietudes de la Supervisión del Ministerio:**
   - Necesidad de información para hacer el recibo del proyecto antes de la finalización del plazo.
2. **Situación del Municipio:**
   - El municipio envía documentación parcial al supervisor del Ministerio del Interior el 25 de marzo de 2025.
3. **Acuerdo con AFINIA:**
   - El municipio manifiesta que el Certificado de conexión eléctrica final debe emitirlo AFINIA en el término de 8 días, pues a la fecha no se tiene. Se espera la gestión de los eléctricos del municipio y del contratista de obra.
4. **Documentación pendiente de entrega del Municipio:**
   - Se realiza la revisión de la documentación recibida mediante correo del 25 de marzo de 2025 y se elabora el listado de chequeo de la revisión realizada. Pendientes de entrega y revisión de varios documentos, incluyendo actas firmadas, memorias de cálculo, y certificados de conexión eléctrica.

DOCUMENTO DE ENTREGA	SI	NO
1. Acta final firmada por todos los profesionales, con sus respectivas sábanas de actividades ejecutadas (ACTA FINAL DE OBRA). (Contratista Obra, Contratista Interventoría de obra y supervisión del Municipio). **FALTA LA SABANA Y LAS MEMORIAS DE CALCULO DE TODAS LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.**		**X**

2. Acta de recibo del proyecto a satisfacción por parte de la interventoría al contratista de obra, firmada por los siguientes profesionales (Contratista de Interventoría y contratista de obra). **OK.**	X	
3. Acta de recibo del proyecto a satisfacción por parte de la supervisión del municipio al contratista de interventoría, firmada por los siguientes profesionales (supervisor del Municipio y contratista de interventoría). **FALTA ESTA ACTA.**	X	
4. Certificado de conexión eléctrica definitiva. (empresa de energía). **FALTA CERTIFICADO.**		X
5. Certificado de la empresa prestadora del servicio de energía en la cual garantiza la prestación del servicio definitivo de energía al SACUDETE. **FALTA CERTIFICADO.**		X
6. Certificado de que la obra se encuentra ejecutada al 100% del supervisor del convenio. **OK.**	X	
7. Certificado de que la obra se encuentra ejecutada al 100% del contratista de obra e interventoría de obra. **OK.**	X	
8. Certificado conexión acueducto y alcantarillado. **FALTA.**		X
9. Certificado de garantía y calidad de los juegos infantiles. **FALTA QUE CERTIFIQUE QUE LOS JUEGOS SON PARA EL PROYECTO SACUDETE CURUMANI (SAN ROQUE)**		X
10. Certificado de garantía y calidad de los equipos de gimnasio. **FALTA CERTIFICADO.**		X
11. Certificado grama sintética. **FALTA CERTIFICADO.**		X
12. Actualización de póliza cargada y aprobada por el Ministerio en SECOP II según última actuación (séptima prórroga). **OK.**	X	
13. Acta final de cantidades y presupuesto. **FALTA**		X
14. Acta de Inventario por Espacios del SACUDETE. **FALTA EL INVENTARIO.**		X
15. Manual de Operación y Mantenimiento del SACUDETE y las Llaves de los espacios cerrados. **FALTA EL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.**		X
16. Planos récord en PDF firmados por el supervisor del convenio, el contratista de obra y el interventor de obra. **FALTAN LOS PLANOS RECORD.**		X
17. Informe final de interventoría y todos los informes semanales de interventoría ordenados cronológicamente. **FALTAN LOS INFORMES SEMANALES.**		X
18. Registro fotográfico en medio magnético. **FALTA EL REGISTRO FOTOGRAFICO.**		X
19. Informe final de la supervisión del Municipio. **OK.**	X	
a. Informes mensuales de supervisión completos y ordenados cronológicamente debidamente publicados en la plataforma SECOPII. **FALTAN PUBLICACIÓN EN SECOPII.**		X
20. Certificación RETIE. **OK.**	X	
21. Certificación RETILAP. **OK.**	X	
22. Informe financiero Final por parte de tesorero Municipal con sus soportes (comprobantes de egreso, órdenes de pago, extractos bancarios y certificación de rendimientos financieros). **FALTAN TODOS LOS INFORMES (ordenes de egreso, órdenes de pago, extractos bancarios y certificación de rendimientos financieros).**		X

En resumen, los documentos que hacen falta son los que se relacionan en el cuadro anterior, pero los más relevantes son:

Certificados y Actas:

- Certificado de conexión eléctrica definitiva.
- Acta de recibo de satisfacción por parte de la interventoría y el contratista.
- Certificado de que la obra se encuentra ejecutada al 100% por el contratista y la interventoría.
- Certificado de garantía de los juegos infantiles y equipos de gimnasio.

Informes y Planos:

- Informes semanales de interventoría y supervisión.
- Planos de construcción y registro fotográfico desde el inicio hasta la finalización de la obra.

Informe Financiero Final:

- Solicitud de informe financiero final junto con comprobantes de pago, órdenes de egreso, extractos bancarios, y certificación de rendimientos financieros.

Conclusión: El municipio debe entregar la documentación completa para que el Ministerio del Interior programe el recibo del proyecto.


COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Municipio de Curumani	Entrega de la documentación pendiente para recibo del proyecto	11/04/2025
Municipio de Curumani	Programación nueva reunión 24 de abril de 2025	14/04/2025

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

Ministerio del Interior	Contratista/Convenido
Firma Nombre: Viterbo Gómez Carvajal Cargo: Grupo de Supervisión Ministerio del Interior	Firma Nombre: Eduardo Manzano Cargo: Secretario de Planeación - Municipio de Curumani
Firma Nombre: Edwin Andrés Torres Angel Cargo: Profesional de Apoyo a la Supervisión Mininterior	Firma Nombre: Numis Cárcamo Cargo: Apoyo a la Supervisión - Municipio de Curumani
N.A.	Firma Nombre: Heráclito Torres Cargo: Asesor Jurídico - Municipio de Curumani

Anexos: Listado de asistencia a través de Microsoft Teams.

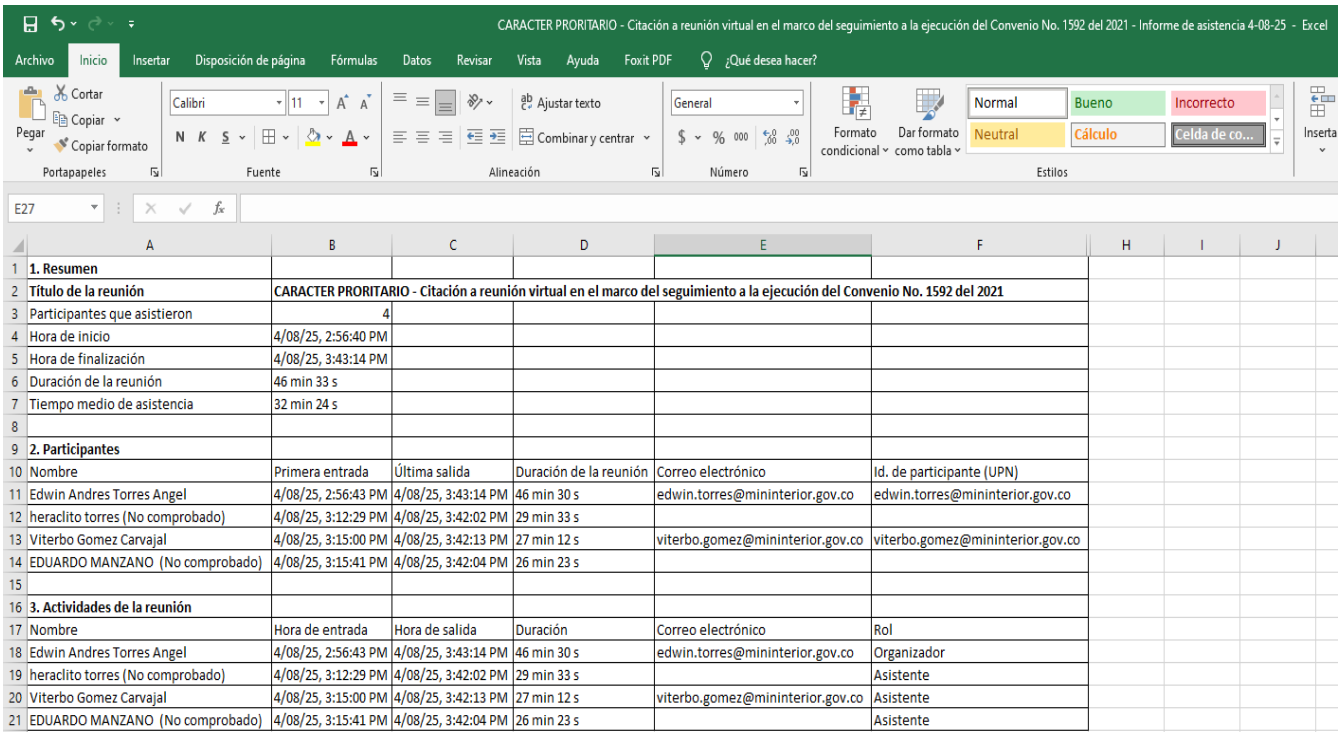

	A	B	C	D	E	F
1	**1. Resumen**					
2	**Título de la reunión**	**CARACTER PRORITARIO - Citación a reunión virtual en el marco del seguimiento a la ejecución del Convenio No. 1592 del 2021**				
3	Participantes que asistieron	4				
4	Hora de inicio	4/08/25, 2:56:40 PM				
5	Hora de finalización	4/08/25, 3:43:14 PM				
6	Duración de la reunión	46 min 33 s				
7	Tiempo medio de asistencia	32 min 24 s				
8						
9	**2. Participantes**					
10	Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)
11	Edwin Andres Torres Angel	4/08/25, 2:56:43 PM	4/08/25, 3:43:14 PM	46 min 30 s	edwin.torres@mininterior.gov.co	edwin.torres@mininterior.gov.co
12	heraclito torres (No comprobado)	4/08/25, 3:12:29 PM	4/08/25, 3:42:02 PM	29 min 33 s		
13	Viterbo Gomez Carvajal	4/08/25, 3:15:00 PM	4/08/25, 3:42:13 PM	27 min 12 s	viterbo.gomez@mininterior.gov.co	viterbo.gomez@mininterior.gov.co
14	EDUARDO MANZANO (No comprobado)	4/08/25, 3:15:41 PM	4/08/25, 3:42:04 PM	26 min 23 s		
15						
16	**3. Actividades de la reunión**					
17	Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
18	Edwin Andres Torres Angel	4/08/25, 2:56:43 PM	4/08/25, 3:43:14 PM	46 min 30 s	edwin.torres@mininterior.gov.co	Organizador
19	heraclito torres (No comprobado)	4/08/25, 3:12:29 PM	4/08/25, 3:42:02 PM	29 min 33 s		Asistente
20	Viterbo Gomez Carvajal	4/08/25, 3:15:00 PM	4/08/25, 3:42:13 PM	27 min 12 s	viterbo.gomez@mininterior.gov.co	Asistente
21	EDUARDO MANZANO (No comprobado)	4/08/25, 3:15:41 PM	4/08/25, 3:42:04 PM	26 min 23 s		Asistente

Copia: Subdirección de Gestión Contractual

Outlook

Citación a reunión virtual No. 4 en el marco del seguimiento a la ejecución contractual del Convenio Interadministrativo No. 1592 del 2021, suscrito entre la Nación- Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON

Organizer	Edwin Andres Torres Angel <edwin.torres@mininterior.gov.co>
Hora de la reunión	Este evento ocurrió el hace 3 semanas (Jue 24/04/2025, 'de' 11:00 a 11:30)
Ubicación	Reunión de Microsoft Teams
Mi respuesta	Aún no respondido
Asistentes necesarios	planeacion curumani-cesar.gov.co, Viterbo Gomez Carvajal, Jaime Luis Berdugo Perez, Diana Carolina Guerra Urbina
Mensaje enviado	Mié 23/04/2025 11:13

Bogotá D.C.

HERMES MARTINEZ URSULA
Alcalde
Municipio de Curumani - Departamento del Cesar
Calle 7 # 15-104
despacho@curumani-cesar.gov.co

JESUS EDUARDO MANZANO PORTILLO
Supervisor del Convenio por el Municipio
Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal
planeacion@curumani-cesar.gov.co

ASUNTO: CARACTER PRORITARIO - Citación a reunión virtual No. 3 en el marco del seguimiento a la ejecución contractual del Convenio Interadministrativo No. 1592 del 2021, suscrito entre la Nación- Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON con el municipio de Curumaní / Cesar.

REF.: Convenio Interadministrativo No. 1592 del 2021, Curumani - Cesar.

Cordial saludo,

En atención a la ejecución del Convenio No. 1592 del 2021, cuyo objeto es: *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR"*, la supervisión del convenio por parte del Ministerio del Interior, convoca a reunión virtual con CARACTER

PRIORITARIO con el propósito de realizar el seguimiento frente al avance de los hechos que motivaron la 3a suspensión de convenio. En ese sentido, se alerta sobre la finalización del plazo del convenio está pactado para el 30/05/2025.

Dicho lo anterior, se solicita de la conexión a través de la plataforma Teams por parte de la Entidad Territorial y a su vez, hacer extensiva la presente convocatoria al representante legal de las firmas contratista de obra e interventoría, bajo la siguiente información:

Datos de la reunión:
Fecha: 24/04/2025
Hora: 11:00 a.m.

Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?

Unirse a la reunión ahora

Id. de reunión: 261 613 521 173 4

Código de acceso: Ah9vi7Z8

Para organizadores: Opciones de la reunión

Interior

MINISTERIO DEL INTERIOR

Privacidad y seguridad

Outlook

Remisión Acta de Reunión virtual 08-04-2025 convenio 1592-2021 Curumani-Cesar

Desde Edwin Andres Torres Angel <edwin.torres@mininterior.gov.co>
Fecha Mié 23/04/2025 14:29
Para planeacion curumani-cesar.gov.co <planeacion@curumani-cesar.gov.co>; 585_ALC <despachoalcalde@curumani-cesar.gov.co>
CC Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (192 KB)
anexo-7-acta-de-reunion-de-seguimiento-a-la-ejecucion-contractual-vr04 Curumani 08 abril 2025.pdf;

Cordial saludo, por medio del presente remitimos el Acta de Reunión del asunto realizada el 8 de abril de 2025 por Microsoft Teams, solicitamos dar estricto cumplimiento a los compromisos y devolver firmada en medio digital.

Gracias.

Interior

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Edwin Andrés Torres Angel
edwin.torres@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 ext. 2800
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

ACTA No.	4
FECHA	24-04-2025
CIUDAD	Virtual Microsoft Teams
No. CONTRATO y/o CONVENIO	1592 de 2021
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI – CESAR.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	99%
MOTIVO:	**Reunión virtual en el marco del seguimiento a la ejecución del Convenio No. 1592 del 2021:** Terminación de los pendientes de obra evidenciados en visita realizada en noviembre 14 de 2024, conexión eléctrica definitiva y último desembolso del convenio.

PARTES

Ministerio del Interior	Contratista/Convenido
Nombre: Viterbo Gómez Carvajal Cargo: Grupo de Supervisión Ministerio del Interior	Nombre: Numis Cárcamo Cargo: Apoyo a la Supervisión Municipio de Curumani
Nombre: Edwin Andrés Torres Angel Cargo: Profesional de Apoyo a la Supervisión Ministerio del Interior	Nombre: Eduardo Manzano Cargo: Secretario de Planeación Municipio de Curumani
N.A.	Nombre: Heráclito Torres Cargo: Asesor Jurídico Municipio de Curumani

DESARROLLO DE LA REUNION

Contexto: El convenio finaliza el 30 de mayo de 2025. No se ha verificado la terminación de los pendientes de obra evidenciados en la visita del 14 de noviembre de 2024 puesto que no existe el último informe de interventoría. El proyecto Sacúdete al Parque aún no tiene conexión eléctrica definitiva. Se reprogramó el último desembolso del convenio para 2025 a solicitud del municipio.

Desarrollo:

1. **Revisión de Documentos Pendientes:**
   - Se revisó el listado de chequeo de los documentos pendientes para el recibo del proyecto.
   - Se discutió la entrega de documentos pendientes por parte del municipio de Curumaní, incluyendo el Acta Final firmada, actas de recibo, y certificados de conexión.
   - Se estableció el 30 de abril como fecha de compromiso para la entrega de la información completa por parte del municipio.
2. **Estado de los Documentos:**
   - Acta Final: En revisión por la Interventoría.
   - Certificado de Conexión: Se recibió oficio de Afinia con información sobre la conexión y medidor instalado. Se coordinará la solicitud a Afinia para la energización del servicio.
   - Certificado de Alcantarillado: Ya fue entregado previamente.
   - Certificados de Garantía de Calidad: Pendientes de entrega por parte del contratista.
   - Planos Récord y Manual de Operación: Pendientes de entrega por parte del contratista.
   - Informes Semanales: Se verificarán los cargados en el Secop.
   - Registro Fotográfico: En proceso de terminación.

- Informe Financiero: Pendiente la entrega de órdenes y comprobantes de egreso, órdenes de pago y extractos bancarios. Se gestionará con la Secretaría de Hacienda del municipio.

3. Compromisos:

- El municipio de Curumaní se compromete a entregar la información completa el 30 de abril de 2025.
- El municipio de Curumaní enviará copia de la solicitud de conexión a Afinia al Ministerio del Interior el 24 de abril de 2025.
- Se reitera la importancia de agilizar la entrega de la información financiera para permitir la legalización de los pagos.

Cierre:

- Se da por terminada la reunión, agradeciendo a los asistentes por su participación y reiterando la importancia del cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Conforme a la revisión de documentación de recibo en la presente reunión se procede a realizar el listado de chequeo de la documentación pendiente:

DOCUMENTO DE ENTREGA	SI	NO
1. Acta final firmada por todos los profesionales, con sus respectivas sábanas de actividades ejecutadas (ACTA FINAL DE OBRA). (Contratista Obra, Contratista Interventoría de obra y supervisión del Municipio). **FALTA LA SABANA Y LAS MEMORIAS DE CALCULO DE TODAS LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.**		X
2. Acta de recibo del proyecto a satisfacción por parte de la interventoría al contratista de obra, firmada por los siguientes profesionales (Contratista de Interventoría y contratista de obra). **OK.**	X	
3. Acta de recibo del proyecto a satisfacción por parte de la supervisión del municipio al contratista de interventoría, firmada por los siguientes profesionales (supervisor del Municipio y contratista de interventoría). **FALTA ESTA ACTA.**		X
4. Certificado de conexión eléctrica definitiva. (empresa de energía). **FALTA CERTIFICADO.**		X
5. Certificado de la empresa prestadora del servicio de energía en la cual garantiza la prestación del servicio definitivo de energía al SACUDETE. **FALTA CERTIFICADO.**		X
6. Certificado de que la obra se encuentra ejecutada al 100% del supervisor del convenio. **OK.**	X	
7. Certificado de que la obra se encuentra ejecutada al 100% del contratista de obra e interventoría de obra. **OK.**	X	
8. Certificado conexión acueducto y alcantarillado. **FALTA.**		X
9. Certificado de garantía y calidad de los juegos infantiles. **FALTA QUE CERTIFIQUE QUE LOS JUEGOS SON PARA EL PROYECTO SACUDETE CURUMANI (SAN ROQUE)**		X
10. Certificado de garantía y calidad de los equipos de gimnasio. **FALTA CERTIFICADO.**		X
11. Certificado grama sintética. **FALTA CERTIFICADO.**		X
12. Actualización de póliza cargada y aprobada por el Ministerio en SECOP II según última actuación (séptima prórroga). **OK.**	X	
13. Acta final de cantidades y presupuesto. **FALTA**		X
14. Acta de Inventario por Espacios del SACUDETE. **FALTA EL INVENTARIO.**		X
15. Manual de Operación y Mantenimiento del SACUDETE y las Llaves de los espacios cerrados. **FALTA EL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.**		X

16. Planos récord en PDF firmados por el supervisor del convenio, el contratista de obra y el interventor de obra. **FALTAN LOS PLANOS RECORD.**		**X**
17. Informe final de interventoría y todos los informes semanales de interventoría ordenados cronológicamente. **FALTAN LOS INFORMES SEMANALES.**		**X**
18. Registro fotográfico en medio magnético. **FALTA EL REGISTRO FOTOGRAFICO.**		**X**
19. Informe final de la supervisión del Municipio. **OK.**	**X**	
a. Informes mensuales de supervisión completos y ordenados cronológicamente debidamente publicados en la plataforma SECOPII. **FALTAN PUBLICACIÓN EN SECOPII.**		**X**
20. Certificación RETIE. **OK.**	**X**	
21. Certificación RETILAP. **OK.**	**X**	
22. Informe financiero Final por parte de tesorero Municipal con sus soportes (comprobantes de egreso, órdenes de pago, extractos bancarios y certificación de rendimientos financieros). **FALTAN TODOS LOS INFORMES (ordenes de egreso, órdenes de pago, extractos bancarios y certificación de rendimientos financieros).**		**X**

En resumen, los documentos que hacen falta son los que se relacionan en el cuadro anterior, pero los más relevantes son:

Certificados y Actas:

- Certificado de conexión eléctrica definitiva.
- Acta de recibo de satisfacción por parte de la interventoría.
- Certificado de que la obra se encuentra ejecutada al 100% por el contratista y la interventoría.
- Certificado de garantía de los juegos infantiles y equipos de gimnasio.

Informes y Planos:

- Informes semanales de interventoría y supervisión.
- Planos récord de construcción y registro fotográfico desde el inicio hasta la finalización de la obra.

Informe Financiero Final:

- Solicitud de informe financiero final junto con comprobantes de pago, órdenes de egreso, extractos bancarios, y certificación de rendimientos financieros.

Conclusión: El municipio debe entregar la documentación completa para que el Ministerio del Interior programe el recibo del proyecto.

Fecha de nueva reunión: 8 de mayo de 2025.


COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Municipio de Curumani	Entrega de la documentación pendiente para recibo del proyecto	30/04/2025
Municipio de Curumani	Entregar copia de la solicitud de conexión a Afinia al Ministerio del Interior.	24/05/2025

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

Ministerio del Interior	Contratista/Convenido
Firma Nombre: Viterbo Gómez Carvajal Cargo: Grupo de Supervisión Ministerio del Interior	Firma Nombre: Eduardo Manzano Cargo: Secretario de Planeación - Municipio de Curumani
Firma Nombre: Edwin Andrés Torres Angel Cargo: Profesional de Apoyo a la Supervisión Mininterior	Firma Nombre: Numis Cárcamo Cargo: Apoyo a la Supervisión - Municipio de Curumani
N.A.	Firma Nombre: Heráclito Torres Cargo: Asesor Jurídico - Municipio de Curumani

Anexos: Listado de asistencia a través de Microsoft Teams.

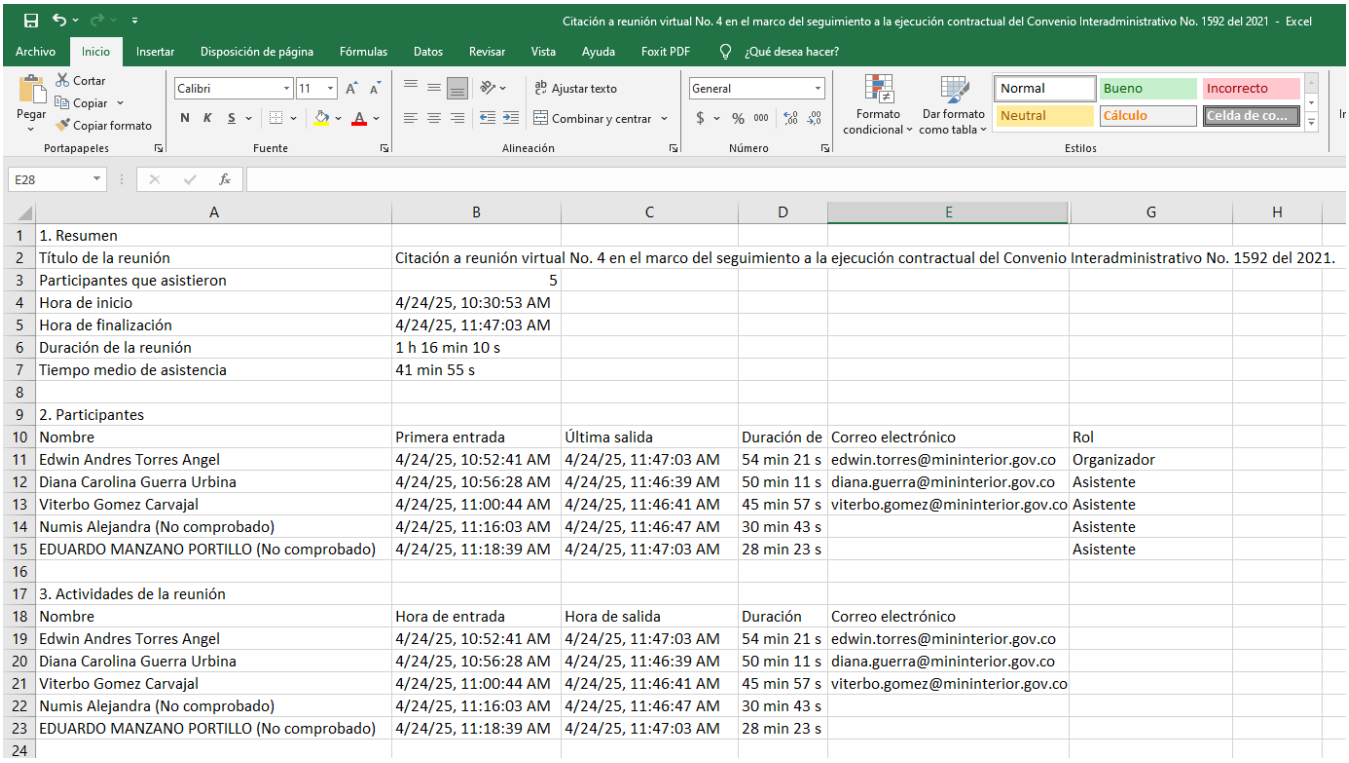

	A	B	C	D	E	G	H
1	1. Resumen						
2	Título de la reunión	Citación a reunión virtual No. 4 en el marco del seguimiento a la ejecución contractual del Convenio Interadministrativo No. 1592 del 2021.					
3	Participantes que asistieron	5					
4	Hora de inicio	4/24/25, 10:30:53 AM					
5	Hora de finalización	4/24/25, 11:47:03 AM					
6	Duración de la reunión	1 h 16 min 10 s					
7	Tiempo medio de asistencia	41 min 55 s					
8							
9	2. Participantes						
10	Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de	Correo electrónico	Rol	
11	Edwin Andres Torres Angel	4/24/25, 10:52:41 AM	4/24/25, 11:47:03 AM	54 min 21 s	edwin.torres@mininterior.gov.co	Organizador	
12	Diana Carolina Guerra Urbina	4/24/25, 10:56:28 AM	4/24/25, 11:46:39 AM	50 min 11 s	diana.guerra@mininterior.gov.co	Asistente	
13	Viterbo Gomez Carvajal	4/24/25, 11:00:44 AM	4/24/25, 11:46:41 AM	45 min 57 s	viterbo.gomez@mininterior.gov.co	Asistente	
14	Numis Alejandra (No comprobado)	4/24/25, 11:16:03 AM	4/24/25, 11:46:47 AM	30 min 43 s		Asistente	
15	EDUARDO MANZANO PORTILLO (No comprobado)	4/24/25, 11:18:39 AM	4/24/25, 11:47:03 AM	28 min 23 s		Asistente	
16							
17	3. Actividades de la reunión						
18	Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico		
19	Edwin Andres Torres Angel	4/24/25, 10:52:41 AM	4/24/25, 11:47:03 AM	54 min 21 s	edwin.torres@mininterior.gov.co		
20	Diana Carolina Guerra Urbina	4/24/25, 10:56:28 AM	4/24/25, 11:46:39 AM	50 min 11 s	diana.guerra@mininterior.gov.co		
21	Viterbo Gomez Carvajal	4/24/25, 11:00:44 AM	4/24/25, 11:46:41 AM	45 min 57 s	viterbo.gomez@mininterior.gov.co		
22	Numis Alejandra (No comprobado)	4/24/25, 11:16:03 AM	4/24/25, 11:46:47 AM	30 min 43 s			
23	EDUARDO MANZANO PORTILLO (No comprobado)	4/24/25, 11:18:39 AM	4/24/25, 11:47:03 AM	28 min 23 s			
24							

Copia: Subdirección de Gestión Contractual

ALCALDÍA DE CURUMANÍ	**FORMATO** **INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS** **CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1592**, MUNICIPIO DE **CURUMANI**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **ABRIL DE 2025**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	ANUAR ESFUERZOS TÉCNICO, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI – CESAR.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Corregimiento de San Roque Municipio de Curumaní-Cesar.		
BENEFICIARIO:	Municipio de Curumaní-Cesar		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($1.250.000.000)
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		Para la ejecución del proyecto, aporta un lote de su propiedad, en el cual se construirá la obra objeto del precitado proyecto.
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 1.250.000.000
FECHA SUSCRIPCIÓN	24-09-2021		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31/05/2021	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	30/08/2024
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	HERMES FERNANDO MARTINEZ URSULA	**DESDE:** 5 de diciembre de 2024	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ING. JESUS EDUARDO MANZANO PORTILLO	18-12-2023	4-12-2024
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Arq. NUMIS CARCAMO		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. 42021	2021-08-19	
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No.		
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	AA058523	26-10-2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	11-06-2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	1 PRÓRROGA	**FECHA:** 31/10/2022	
	2 PRÓRROGA	**FECHA:** 31/12/2022	
	3 PRÓRROGA	**FECHA:** 30/04/2023	
	4 PRÓRROGA	**FECHA:** 31/08/2023	
	5 PRÓRROGA	**FECHA:** 28/02/2024	
	SUSPENSION (solicitud el 23 de febrero de 2024)	**FECHA:** 27/02/2024 (114 días)	

	REINICIO (Acta No. 1)	**FECHA:** 20/06/2024
6 PRÓRROGA	Solicitud de ampliación o prórroga (solicitud el 5 de junio de 2024)	**FECHA:** 30/08/2024
7 PRÓRROGA	Solicitud de ampliación o prórroga (solicitud el 5 de diciembre de 2024)	**FECHA:** 30/03/2025
PRÓRROGA REPROGRAMACION DE RECURSOS		**FECHA:** 30/03/2025
SOLICITUD DE SUSPENSION	El día 19 de marzo se solicita suspensión por 60 días.	**FECHA: Hasta el 31 de mayo**
PÓLIZA No. AA058523 SEGÚN ACTUACIÓN	**FECHA:** 11/05/2022 – 1/05/2023	
	FECHA: 1/10/2022 – 31/07/2023	
(Vigencia nueva del amparo) **EQUIDAD SEGUROS**	**FECHA:** 13/10/2022 – 30/11/2023	
	FECHA: 30/04/2023 – 31/03/2024	
	FECHA: 31/08/2023 – 31/08/2024	
	FECHA: 20/12/2024 – 30/09/2025	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 83.332.872,42	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 41.666.436,21	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$ 0.	
VALOR DE OBRA	$ 1.041.667.306,83	
VALOR INTERVENTORÍA	$ 83.333.384,55	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$ 0	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	12-11-2021	$375.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. Entrega del Acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el Ministerio del Interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del proyecto, en la cual el municipio se compromete con sustento en lo socializado, a entregar a más tardar dentro de los 30 días calendario siguientes, los proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de los estudios, diseño y ejecución de obra, así como el de interventoría. B. Publicación en el aplicativo habilitado por Colombia Compra Eficiente del proyecto de pliegos de condiciones anteriormente descrito.	NO APLICA	30-11-2021	$375.000.000,00
TERCER DESEMBOLSO	Del 20% del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIOl equivalente a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. Certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance	20%	30-06-2023	$250.000.000

	C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP			
ÚLTIMO DESEMBOLSO	Previa presentación por parte del Supervisor del Convenio designado por el Municipio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP.	%	DD/MM/AAAA	$
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 1.000.000.000
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
AA058523	Cumplimiento	$ 254.195.002,34	31/08/2023	31/08/2024

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato: LPMC 004-2021	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANÍ - CESAR		$ 1.124.991.871,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28337&g-recaptcha-response=03AGdBq25TAwMVwL0OT-JytFybeOj8CltYOps-iUIaRI-oI4y6fT8mDbaUf6H9HOc9FbMwKnWawdVYnccP1QEbEoV9trJYOdQT5LTUmdEOXDgeR0kbK4pzpFHrH1h9Q-UOMSADX2OJKnYuaD3_7Krz18e6Vc6zvRJKQqlVaRsAGYApWr2vqgNWrkpMdh9fK8O_148Wahg8ll6YRRLfO87bnKMhOcZz9K07YAl8r96qlySJQ2GMu7pby5Vpmaz9IQ1FcavQl4BGLHUFVMuqM5EcsUn7ujRkrg_Y5iWhXj6Urd-REN6YJeLx8uyRhFRJSE7hv2TeL0vgERhthzlZtj_yMKvk3g9CTOGKliMSV6zMI7DB2JAVC7KXCu6V6lGqPl4jaQl-9zzsvp0PIVIMXHUgyi56tLSaBVrdEPrzg8Glo4xayOLkl2vLDzjBnjFCPb0nI7W7ITYUVF-ER3N_ZdqR_oaTm7tcpjp5bw		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	**OTRO –SI MODIFICATORIO No.001** **Para adicionar en valor:** VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ONCE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS		**$ 20.975.011,72 (valor adicional)**
	23/08/2022		$ 0,00
Nombre contratista	Consorcio Sacúdete San Roque Nit: 901.557.178-1		
Fecha de Acta de inicio del contrato	**24 de febrero de 2022**		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	OTROSI MODIFICATORIO 1	MODIFICANDO LA FORMA DE PAGO	
	OTROSI MODIFICATORIO 2	31/10/2022	

	OTROSI MODIFICATORIO 3		31/12/2022	
	OTROSI MODIFICATORIO 4		15/04/2023	
	OTROSI MODIFICATORIO 5		30/04/2023	
	OTROSI MODIFICATORIO 6		15/06/2023	
Fecha Inicial de terminación del contrato	**20-08-2022**	**Fecha Actual de terminación del contrato**		**15-08-2023**
SUSPENSION 1	19 de mayo de 2023			Ver anexo
REINICIO 1	19 de julio de 2023			Ver anexo
VALOR TOTAL CONTRATADO:				**$ 1.145.966.883,00**

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	**11-44-101183457**
Ciudad y fecha de expedición	Bogotá, 31 de mayo de 2023
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No.	**11-40-101045846**

Ciudad y fecha de expedición	Bogotá, 29 de junio de 2023		
TIPO DE AMPARO	**COBERTURA**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 229.193.376,60	20/01/2022 – 15/12/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	$ 16.665.022,00	20/07/2022 – 20/07/2027
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	20%	$ 229.193.376,60	Ampara 5 años a partir del acta de entrega a satisfacción de la obra
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$ 57.298.344,15	20/01/2022 – 15/06/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	$ 343.790.064,90	Ampara 5 años a partir del acta de entrega a satisfacción de la obra
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	100%	$ 337.497.561,30	20/01/2022 – 15/06/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	300 SMMLV	$ 300.000.000	20/01/2022 – 15/06/2023

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR**
No. del contrato: CMA 002-2021	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CURUMANÍ - CESAR	$ 124.973.282,35
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12524021&g-recaptcha-response=03AGdBq26MGM-gvX23l2AlqhALu7L3suCHFkX4zbsY4y2wVxxoGUk9ubtKCFf0YplhDOlcRvq9HgdEzFvwiBQuvrji9UMPE4ZL88z0FJfD_8UFu_uUY6V56wdMdhv4SZombKQ6K6cfXU6AqZzpTDeTMknak9d61-xNVzy4xPxndQKlZIoVkTavnBQX-OpxwMArdxNyuC1wDtfJzPPwvu2DkgZ98gzurhOmXUp_bNZlVeVR0AZiF9C9ppPj0n97V4bU3aeiOJyLbolorflnju1p_MHVY8fj3CWh5	

	kybSvJwwvsMM5OISpwsNBNS6NRg3PBDF_TiRjewA6huvUwzqGCKE8TC2opT4nnPWWdT9sEVZDpSu63WdtDMkp-QlNuqUYpXF1cNF0oV0KPgsWbKTxKwXmPaTSsE54kWVvvTtDy7Yn6MdZWzI_eR-1sOhTOy9ePe4cRMo3x1ds4A10s8sJo5YGR3kmPJuyBTMw		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	N/A		$ 0,00
	N/A		$ 0,00
Nombre contratista	Consorcio CSC Sacúdete Curumaní Nit: 901.557.688-6		
Fecha de Acta de inicio del contrato	**24 de febrero de 2022**		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA 1	31/10/2022	
	PRÓRROGA 2	31/12/2022	
	PRÓRROGA 3	15/04/2023	
	PRÓRROGA 4	30/04/2023	
	PRÓRROGA 5	15/06/2023	
SUSPENSION 1	19 DE MAYO	**REINICIO:** 19 DE JULIO DE 2023	
Fecha Inicial de terminación del contrato	21/08/2022	**Fecha Actual de terminación del contrato**	15/08/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 124.973.282,35
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ZURICH SEGURO S.A**		
PÓLIZA No.	**SGPL-26867290-1**		
FECHA DE LA PÓLIZA	8 de febrero de 2022		
	Barranquilla - Atlántico		

5. INFORME TECNICO

INTRODUCCION	

- ***Avance de Estudios, Diseños y de Obra***

CONTRATO DE OBRA No. 092 de 2022	
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	**100%**
AVANCE FISICO EJECUTADO:	**100%**
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	**$ 1.062.641.773,96** (COMPONENTE OBRA)
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	**$ 1.145.966.882,72** (ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA)
OBSERVACIONES:	

- ***Avance de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 093 de 2022	
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	100%
AVANCE FISICO EJECUTADO:	100 %
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	$ 124.973.282,35
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	$ 41.657.590,03 (pago estudios y diseños)
OBSERVACIONES:	

- ***Gestión técnica y documental.***

Oficios y documentos elaborados por la supervisión sobre el desarrollo de la interventoría, Comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.

FECHA COMITÉ	ASUNTO	OBSERVACIONES / ACCIONES
8 de ABRIL	Citación a reunión virtual del Convenio Interadministrativo No. 1592 del 2021, suscrito entre la Nación-Ministerio del Interior – FONSECON con el municipio de Curumaní / Cesar.	
24 de ABRIL	Citación a reunión virtual en el marco del seguimiento a la ejecución contractual del Convenio Interadministrativo No. 1592 del 2021.	

FECHA OFICIO	ASUNTO	CARGO QUIEN ENVIA	CARGO QUIEN RECIBE

- ***Personal actual vigente aprobado por la Supervisión del Municipio.***

NOMBRE	CARGO
HERMES F. MARTINEZ U.	Alcalde municipal

- ***Información Avance Físico – Avance Financiero***

ACTA N°	CONCEPTO	EGRESO N°	FECHA	VALOR	AMORTIZADO
1	Estudios y diseños	341	4 de abril de 2022	$ 83.325.108,96	
2	Anticipo 30%	828	15 de junio de 2022	$337.497.561.30	
3	Acta parcial de pago No. 1	1840	Diciembre de 2022	$ 432.208.914,01	$129.314.971,65
4	Acta parcial de pago No. 2		Julio de 2023	$ 198.500.592,04	$ 59.204.061,56

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.1	Durante este mes de abril se hacen todas las gestiones necesarias para obtener el certificado de conexión eléctrica definitiva por parte de AFINIA y así mismo el certificado de la empresa prestadora del servicio de energía (AFINIA) en la cual garantiza la prestación del servicio definitivo de energía al SACUDETE. **El 24 de abril del 2025 por correo electrónico la empresa de energía AFINIA remite documentación de conexión final sobre el predio NIC 1391762 ubicado en la calle 4 No 9-51 del Corregimiento de San Roque, jurisdicción de Curumaní.** **El 24 de abril durante la reunión, se acordó que para el día 30 del mismo mes se enviaría una segunda parte de la documentación requerida por parte de la supervisión del convenio; por lo cual el día 30 de abril se envía por correo electrónico al ministerio del interior:** **- Informes semanales de interventoría (2022,2023)** **- Acta final con actividades ejecutadas** **- Garantía de la grama sintética de san roque** **- Registro fotográfico del proyecto** **- Certificado de conexión eléctrica definitiva**	**EJECUTADO**	**100%**
	OBSERVACIONES:		

PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCION PROPUESTOS.	Se ha tenido demoras en la entrega de la certificación de conexión eléctrica final por parte de la empresa de energía – **Afinia** y la terminación de los planos récord y manual de operación y mantenimiento por parte del contratista.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

16/04/2025	16/04/2025				

8. SUPERVISOR

HERMES FERNANDO MARTINEZ URSULA SUPERVISOR	**JESUS EDUARDO MANZANO PORTILLO** APOYO A LA SUPERVISION **NUMIS ALEJANDRA CARCAMO CAMACHO** APOYO A LA SUPERVISION

Se Anexan ( ) Folios

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1592 DEL 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR

INFORME FINANCIERO DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE ABRIL DE 2025
MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR

PROYECTO (S): Estudios diseño y construcción del proyecto Sacudete al parque Tipo 1, opción 1 en el corregimiento de San Roque, del municipio de Curumani – Cesar

CUENTA (AHORROS) No.: 29725056093 — DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO $ 1.250.000.000,00

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR $ 1.250.000.000,00
VALOR APORTE MUNICIPIO $ 0,00

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

FECHA DE GIRO		
12/11/2021	GIRO 1	$ 375.000.000,00
30/11/2021	GIRO 2	$ 375.000.000,00
30/06/2023	GIRO 3	$ 250.000.000,00
	GIRO 4	$ 0,00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 1.000.000.000,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 29725056093 A LA FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 $ 1.000.000.000,00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
092	CONSORCIO SACUDETE SAN ROQUE	$ 1.124.991.871,00	$ 0,00	$ 1.124.991.871,00
093	CONSORCIO CSC SACUDETE CURUMANI	$ 124.973.282,35	$ 0,00	$ 124.973.282,35
	TOTAL CONTRATADO			**$ 1.249.965.153,35**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
092	ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CURUMANI-CESAR	369	341	4/04/2022	$ 69.495.942,96		$ 69.495.942,96
092	VALOR QUE SE CANCELA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA ACTA DEL CONTRATO DE DEL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NUMERO 092-2022 PARA REMPLAZAR CDP N. 483 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CURUMANI-CESAR	875	828	15/06/2022	$ 337.497.561,30		$ 337.497.561,30
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			6/10/2022	$ 13.829.166,00		$ 13.829.166,00
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			29/11/2022	$ 8.208.966,00		$ 8.208.966,00
092	DEVOLUCION TRASLADO DE ESTAMPILLAS			6/12/2022	-$ 8.208.966,00		-$ 8.208.966,00
092	VALOR QUE SE CANCELA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA ACTA DEL CONTRATO LLAVE EN MANO NUMERO 092-2022 PARA REEMPLAZAR CDP N. 483 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBI	1958	1840		$ 229.536.537,79		$ 229.536.537,79
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			27/02/2023	$ 73.009.702,00		$ 73.009.702,00
092	VALOR QUE SE CANCELA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA ACTA DEL CONTRATO LLAVE EN MANO NUMERO 092-2022 PARA REEMPLAZAR CDP N. 483 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBI	928	956	27/07/2023	$ 105.422.234,43		$ 105.422.234,43
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			29/08/2023	$ 33.528.180,00		$ 33.528.180,00
092	PASIVO EXIGIBLE DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUN	1243	1282	8/08/2024	$ 34.463.778,00		$ 34.463.778,00
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			5/11/2024	$ 7.193.812,00		$ 7.193.812,00
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 903.976.914,48**	**$ 0,00**	**$ 903.976.914,48**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
20/11/2021	$ 73.794,42
30/11/2021	$ 10.254,43
31/12/2021	$ 317.956,79
31/01/2022	$ 318.091,62
28/02/2022	$ 287.424,45
31/03/2022	$ 318.348,28
30/04/2022	$ 282.550,35
31/05/2022	$ 289.144,01
30/06/2022	$ 224.334,97
31/07/2022	$ 116.974,99
31/08/2022	$ 117.014,64
30/09/2022	$ 1.047.403,66
31/10/2022	$ 113.478,28
30/11/2022	$ 108.943,12
31/12/2022	$ 103.979,97
31/01/2023	$ 26.341,33
28/02/2023	$ 22.264,52
31/03/2023	$ 2.582,63
30/04/2023	$ 2.499,60
31/05/2023	$ 2.583,11
30/06/2023	$ 5.482,01
31/07/2023	$ 88.534,75
31/08/2023	$ 43.790,30
30/09/2023	$ 34.920,20
31/10/2023	$ 36.093,21
30/11/2023	$ 34.937,69
31/12/2023	$ 36.111,36
31/01/2024	$ 36.120,51
29/02/2024	$ 33.798,50
31/03/2024	$ 18.067,97
30/04/2024	$ 17.487,34
31/05/2024	$ 18.072,52
30/06/2024	$ 17.491,72
31/07/2024	$ 18.077,04
31/08/2024	$ 14.680,02
30/09/2024	$ 13.248,71
31/10/2024	$ 13.692,05
30/11/2024	$ 12.512,91
31/12/2024	$ 12.778,85
31/01/2025	$ 12.780,49
28/02/2025	$ 11.545,05
31/03/2025	$ 12.783,59
30/04/2025	$ 12.372,75
TOTAL (3)	$ 4.341.344,71

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. _____

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	$ 0,00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) $ 1.000.000.000,00

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) $ 903.976.914,48

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 4.341.344,71

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) $ 4.341.344,71

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) $ 100.364.430,23

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL)

OBSERVACIONES

FIRMA

JANIS LEONOR DAZA TORRES
Secretaria de Hacienda

* SE ADJUNTAN COPIAS DE EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1592 DEL 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR

INFORME FINANCIERO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE ENERO DE 2025
MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR

PROYECTO (S): Estudios diseño y construcción del proyecto Sacudete al parque Tipo 1, opción 1 en el corregimiento de San Roque, del municipio de Curumaní – Cesar

CUENTA (AHORROS) No.: 29725056093 — DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO **$ 1.250.000.000,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 1.250.000.000,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 0,00**

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

FECHA DE GIRO		
12/11/2021	GIRO 1	$ 375.000.000,00
30/11/2021	GIRO 2	$ 375.000.000,00
30/06/2023	GIRO 3	$ 250.000.000,00
	GIRO 4	$ 0,00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 1.000.000.000,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 29725056093 A LA FECHA 31 DE ENERO DE 2025 **$ 1.000.000.000,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
092	CONSORCIO SACUDETE SAN ROQUE	$ 1.124.991.871,00	$ 0,00	$ 1.124.991.871,00
093	CONSORCIO CSC SACUDETE CURUMANI	$ 124.973.282,35	$ 0,00	$ 124.973.282,35
	TOTAL CONTRATADO			**$ 1.249.965.153,35**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
092	ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CURUMANI-CESAR	369	341	4/04/2022	$ 69.495.942,96		$ 69.495.942,96
092	VALOR QUE SE CANCELA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA ACTA DEL CONTRATO DE DEL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NUMERO 092-2022 PARA REMPLAZAR CDP N. 483 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CURUMANI-CESAR	875	828	15/06/2022	$ 337.497.561,30		$ 337.497.561,30
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			6/10/2022	$ 13.829.166,00		$ 13.829.166,00
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			29/11/2022	$ 8.208.966,00		$ 8.208.966,00
092	DEVOLUCION TRASLADO DE ESTAMPILLAS			6/12/2022	-$ 8.208.966,00		-$ 8.208.966,00
092	VALOR QUE SE CANCELA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA ACTA DEL CONTRATO LLAVE EN MANO NÚMERO 092-2022 PARA REEMPLAZAR CDP N. 483 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBI	1958	1840		$ 229.536.537,79		$ 229.536.537,79
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			27/02/2023	$ 73.009.702,00		$ 73.009.702,00
092	VALOR QUE SE CANCELA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA ACTA DEL CONTRATO LLAVE EN MANO NÚMERO 092-2022 PARA REEMPLAZAR CDP N. 483 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBI	928	956	27/07/2023	$ 105.422.234,43		$ 105.422.234,43
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			29/08/2023	$ 33.528.180,00		$ 33.528.180,00
092	PASIVO EXIGIBLE DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUN	1243	1282	8/08/2024	$ 34.463.778,00		$ 34.463.778,00
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			5/11/2024	$ 7.193.812,00		$ 7.193.812,00
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 903.976.914,48**	**$ 0,00**	**$ 903.976.914,48**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
20/11/2021	$ 73.794,42
30/11/2021	$ 10.254,43
31/12/2021	$ 317.956,79
31/01/2022	$ 318.091,62
28/02/2022	$ 287.424,45
31/03/2022	$ 318.348,28
30/04/2022	$ 282.550,35
31/05/2022	$ 289.144,01
30/06/2022	$ 224.334,97
31/07/2022	$ 116.974,99
31/08/2022	$ 117.014,64
30/09/2022	$ 1.047.403,66
31/10/2022	$ 113.478,28
30/11/2022	$ 108.943,12
31/12/2022	$ 103.979,97
31/01/2023	$ 26.341,33
28/02/2023	$ 22.264,52
31/03/2023	$ 2.582,63
30/04/2023	$ 2.499,60
31/05/2023	$ 2.583,11
30/06/2023	$ 5.482,01
31/07/2023	$ 88.534,75
31/08/2023	$ 43.790,30
30/09/2023	$ 34.920,20
31/10/2023	$ 36.093,21
30/11/2023	$ 34.937,69
31/12/2023	$ 36.111,36
31/01/2024	$ 36.120,51
29/02/2024	$ 33.798,50
31/03/2024	$ 18.067,97
30/04/2024	$ 17.487,34
31/05/2024	$ 18.072,52
30/06/2024	$ 17.491,72
31/07/2024	$ 18.077,04
31/08/2024	$ 14.680,02
30/09/2024	$ 13.248,71
31/10/2024	$ 13.692,05
30/11/2024	$ 12.512,91
31/12/2024	$ 12.778,85
31/01/2025	$ 12.780,49
TOTAL (3)	**$ 4.304.643,32**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. _____

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1592 DEL 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR

INFORME FINANCIERO DEL 1 DE OCTUBRE AL 28 DE FEBRERO DE 2025
MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR

PROYECTO (S): Estudios diseño y construcción del proyecto Sacudete al parque Tipo 1, opción 1 en el corregimiento de San Roque, del municipio de Curumani – Cesar

CUENTA (AHORROS) No.: 29725056093 — DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO **$ 1.250.000.000,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 1.250.000.000,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 0,00**

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

FECHA DE GIRO		
12/11/2021	GIRO 1	$ 375.000.000,00
30/11/2021	GIRO 2	$ 375.000.000,00
30/06/2023	GIRO 3	$ 250.000.000,00
	GIRO 4	$ 0,00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 1.000.000.000,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 29725056093 A LA FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025 **$ 1.000.000.000,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
092	CONSORCIO SACUDETE SAN ROQUE	$ 1.124.991.871,00	$ 0,00	$ 1.124.991.871,00
093	CONSORCIO CSC SACUDETE CURUMANI	$ 124.973.282,35	$ 0,00	$ 124.973.282,35
	TOTAL CONTRATADO			**$ 1.249.965.153,35**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
092	ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CURUMANI-CESAR	369	341	4/04/2022	$ 69.495.942,96		$ 69.495.942,96
092	VALOR QUE SE CANCELA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA ACTA DEL CONTRATO DE DEL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NUMERO 092-2022 PARA REMPLAZAR CDP N. 483 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CURUMANI-CESAR	875	828	15/06/2022	$ 337.497.561,30		$ 337.497.561,30
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			6/10/2022	$ 13.829.166,00		$ 13.829.166,00
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			29/11/2022	$ 8.208.966,00		$ 8.208.966,00
092	DEVOLUCION TRASLADO DE ESTAMPILLAS			6/12/2022	-$ 8.208.966,00		-$ 8.208.966,00
092	VALOR QUE SE CANCELA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA ACTA DEL CONTRATO LLAVE EN MANO NUMERO 092-2022 PARA REEMPLAZAR CDP N. 483 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBI	1958	1840		$ 229.536.537,79		$ 229.536.537,79
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			27/02/2023	$ 73.009.702,00		$ 73.009.702,00
092	VALOR QUE SE CANCELA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA ACTA DEL CONTRATO LLAVE EN MANO NUMERO 092-2022 PARA REEMPLAZAR CDP N. 483 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBI	928	956	27/07/2023	$ 105.422.234,43		$ 105.422.234,43
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			29/08/2023	$ 33.528.180,00		$ 33.528.180,00
092	PASIVO EXIGIBLE DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUN	1243	1282	8/08/2024	$ 34.463.778,00		$ 34.463.778,00
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			5/11/2024	$ 7.193.812,00		$ 7.193.812,00
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 903.976.914,48**	**$ 0,00**	**$ 903.976.914,48**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
20/11/2021	$ 73.794,42
30/11/2021	$ 10.254,43
31/12/2021	$ 317.956,79
31/01/2022	$ 318.091,62
28/02/2022	$ 287.424,45
31/03/2022	$ 318.348,28
30/04/2022	$ 282.550,35
31/05/2022	$ 289.144,01
30/06/2022	$ 224.334,97
31/07/2022	$ 116.974,99
31/08/2022	$ 117.014,64
30/09/2022	$ 1.047.403,66
31/10/2022	$ 113.478,28
30/11/2022	$ 108.943,12
31/12/2022	$ 103.979,97
31/01/2023	$ 26.341,33
28/02/2023	$ 22.264,52
31/03/2023	$ 2.582,63
30/04/2023	$ 2.499,60
31/05/2023	$ 2.583,11
30/06/2023	$ 5.482,01
31/07/2023	$ 88.534,75
31/08/2023	$ 43.790,30
30/09/2023	$ 34.920,20
31/10/2023	$ 36.093,21
30/11/2023	$ 34.937,69
31/12/2023	$ 36.111,36
31/01/2024	$ 36.120,51
29/02/2024	$ 33.798,50
31/03/2024	$ 18.067,97
30/04/2024	$ 17.487,34
31/05/2024	$ 18.072,52
30/06/2024	$ 17.491,72
31/07/2024	$ 18.077,04
31/08/2024	$ 14.680,02
30/09/2024	$ 13.248,71
31/10/2024	$ 13.692,05
30/11/2024	$ 12.512,91
31/12/2024	$ 12.778,85
31/01/2025	$ 12.780,49
28/02/2025	$ 11.545,05
TOTAL (3)	$ 4.316.188,37

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ————

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	$ 0,00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 1.000.000.000,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 903.976.914,48**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) **$ 4.316.188,37**

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) **$ 0,00**

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 4.316.188,37**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 100.339.273,89**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL)

OBSERVACIONES

FIRMA

JANIS LEONOR DAZA TORRES
Secretaria de Hacienda

* SE ADJUNTAN COPIAS DE EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1592 DEL 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR

INFORME FINANCIERO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MARZO DE 2025
MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR

PROYECTO (S): Estudios diseño y construcción del proyecto Sacudete al parque Tipo 1, opción 1 en el corregimiento de San Roque, del municipio de Curumani – Cesar

CUENTA (AHORROS) No.: 29725056093 — DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO **$ 1.250.000.000,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 1.250.000.000,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 0,00**

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

FECHA DE GIRO		
12/11/2021	GIRO 1	$ 375.000.000,00
30/11/2021	GIRO 2	$ 375.000.000,00
30/06/2023	GIRO 3	$ 250.000.000,00
	GIRO 4	$ 0.00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 1.000.000.000,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 29725056093 A LA FECHA 31 DE MARZO DE 2025 **$ 1.000.000.000,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
092	CONSORCIO SACUDETE SAN ROQUE	$ 1.124.991.871,00	$ 0,00	$ 1.124.991.871,00
093	CONSORCIO CSC SACUDETE CURUMANI	$ 124.973.282,35	$ 0,00	$ 124.973.282,35
	TOTAL CONTRATADO			**$ 1.249.965.153,35**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
092	ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CURUMANI-CESAR	369	341	4/04/2022	$ 69.495.942,96		$ 69.495.942,96
092	VALOR QUE SE CANCELA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA ACTA DEL CONTRATO DE DEL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NUMERO 092-2022 PARA REMPLAZAR CDP N. 483 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CURUMANI-CESAR	875	828	15/06/2022	$ 337.497.561,30		$ 337.497.561,30
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			6/10/2022	$ 13.829.166,00		$ 13.829.166,00
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			29/11/2022	$ 8.208.966,00		$ 8.208.966,00
092	DEVOLUCION TRASLADO DE ESTAMPILLAS			6/12/2022	-$ 8.208.966,00		-$ 8.208.966,00
092	VALOR QUE SE CANCELA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA ACTA DEL CONTRATO LLAVE EN MANO NÚMERO 092-2022 PARA REEMPLAZAR CDP N. 483 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBI	1958	1840		$ 229.536.537,79		$ 229.536.537,79
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			27/02/2023	$ 73.009.702,00		$ 73.009.702,00
092	VALOR QUE SE CANCELA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA ACTA DEL CONTRATO LLAVE EN MANO NÚMERO 092-2022 PARA REEMPLAZAR CDP N. 483 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBI	928	956	27/07/2023	$ 105.422.234,43		$ 105.422.234,43
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			29/08/2023	$ 33.528.180,00		$ 33.528.180,00
092	PASIVO EXIGIBLE DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUN	1243	1282	8/08/2024	$ 34.463.778,00		$ 34.463.778,00
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			5/11/2024	$ 7.193.812,00		$ 7.193.812,00
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 903.976.914,48**	**$ 0,00**	**$ 903.976.914,48**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
20/11/2021	$ 73.794,42
30/11/2021	$ 10.254,43
31/12/2021	$ 317.956,79
31/01/2022	$ 318.091,62
28/02/2022	$ 287.424,45
31/03/2022	$ 318.348,28
30/04/2022	$ 282.550,35
31/05/2022	$ 289.144,01
30/06/2022	$ 224.334,97
31/07/2022	$ 116.974,99
31/08/2022	$ 117.014,64
30/09/2022	$ 1.047.403,66
31/10/2022	$ 113.478,28
30/11/2022	$ 108.943,12
31/12/2022	$ 103.979,97
31/01/2023	$ 26.341,33
28/02/2023	$ 22.264,52
31/03/2023	$ 2.582,63
30/04/2023	$ 2.499,60
31/05/2023	$ 2.583,11
30/06/2023	$ 5.482,01
31/07/2023	$ 88.534,75
31/08/2023	$ 43.790,30
30/09/2023	$ 34.920,20
31/10/2023	$ 36.093,21
30/11/2023	$ 34.937,69
31/12/2023	$ 36.111,36
31/01/2024	$ 36.120,51
29/02/2024	$ 33.798,50
31/03/2024	$ 18.067,97
30/04/2024	$ 17.487,34
31/05/2024	$ 18.072,52
30/06/2024	$ 17.491,72
31/07/2024	$ 18.077,04
31/08/2024	$ 14.680,02
30/09/2024	$ 13.248,71
31/10/2024	$ 13.692,05
30/11/2024	$ 12.512,91
31/12/2024	$ 12.778,85
31/01/2025	$ 12.760,49
28/02/2025	$ 11.545,05
31/03/2025	$ 12.783,59
TOTAL (3)	**$ 4.328.971,96**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. _____

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 1.000.000.000,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 903.976.914,48**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 4.328.971,96

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0.00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 4.328.971,96**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 100.352.057,48**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL)

OBSERVACIONES

FIRMA

JANIS LEONOR DAZA TORRES
Secretaria de Hacienda

* SE ADJUNTAN COPIAS DE EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES
