FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

UNIDAD EJECUTORA:	AERONAUTICA CIVIL			**FECHA:**	19/05/2025
Semana No	**2**	**Del :**	12/05/2025	AL:	18/05/2025
Plazo Total		240	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		12	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		5,00%			
Nombre del Supervisor :		OMAR ESTEVEZ			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

CARTAGENA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**0,00%**	**0,00%**	**(%) Ejecutado**	**0,00%**	**0,00%**
Valor programado ($)	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**0,00%**
				Valor Adelanto	**$ 0,00**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO GYP CARTAGENA	**Contratista:**	INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS
Contrato No:	24001397-H4	**Contrato No:**	24001442-H3
Valor Inicial:	$ 1.298.856.408	**Valor Inicial:**	$ 319.683.453
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:		**Valor actualizado 2:**	
Plazo inicial:	OCHO (8) MESES	**Plazo inicial:**	OCHO (8) MESES
Plazo actualizado:		**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	6-may-25	**Fecha de iniciación:**	6-may-25
Fecha de vencimiento:	6-ene-25	**Fecha de vencimiento:**	6-ene-25
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 1.298.856.408	**Valor total actual del contrato**	$ 319.683.453

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

El contratista remite los APUs y Programacion, mediante oficios SKGC 011 - SKGC 012
Interventoria da respuesta a los comunicados SKGC 011-SKGC012, mediante oficio INCAR 010-2025 (aprobacion APUs contractuales y programacion de obra)

OBRAS LADO AIRE

OBRAS LADO TIERRA

AVANCE DE OBRA: Las actividades de obra se iniciarán una vez se cuente con el NOTAM y demas requerimientos por parte de la concesion

FINANCIERO:


FORMATO				
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página: __1_ de 1**

AMBIENTAL:
Actividades desarrolladas:
- Se solicitó mediante oficio INCAR 009-2025 Solicitud De PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA del Aeropuerto Rafael Nuñez.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
El contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, se encuentra en proceso de elaboración del Plan SST, solicitado hasta el dia viernes 16 de mayo de 2025.

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	**4**
Personal del Contratista	**2**
Total Personal en Obra	**6**

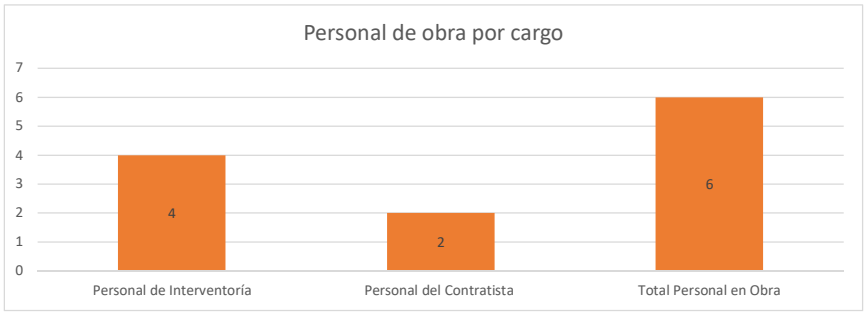

En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.

FORMATO				
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página: __1_ de 1**

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Total Maquinaria			

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado		

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 1.298.856.408,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado		

Valor Total Contrato interventoría
$ 319.683.453,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA AVILA
