CONTRATO DE OBRA No. CLPIH383 DE 2023

INFORME DE OBRA No. 1

MENSUAL [X] **FINAL** [ ]

Objeto Contrato:

"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA"



MUNICIPIO: **SAN AGUSTÍN**

DEPARTAMENTO: **HUILA**


CONTRATO DE OBRA No. CLPIH383 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y DANES INGENIEROS S.A.S

APOYO A LA SUPERVISIÓN	CESAR JOAQUÍN VELÁSQUEZ	**ENTIDAD**	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	CLPIH383 DE 2023		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA"	**PERIODO DEL INFORME**	Del 16 de noviembre al 21 de diciembre de 2023
CONTRATISTA	DANES INGENIEROS S.A.S	**NIT:**	900.219.918-2
REPRESENTANTE LEGAL:	NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA	**C.C:**	7.719.364 de Neiva (H)

FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	01/11/2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16/11/2023		
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES		
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	N.A.		
PLAZO TOTAL:	TRES (03) MESES		
VALOR INICIAL:	$ 506.549.699		
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	N.A.		
VALOR TOTAL:	$ 506.549.699		
INTERVENTOR:	CONSOCIO WF	**NIT:**	901.769.619-8
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANÍA	**C.C:**	7.711.430 de Neiva (H)

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en la vereda Los Andes zona rural del municipio de San Agustín – Departamento del Huila.

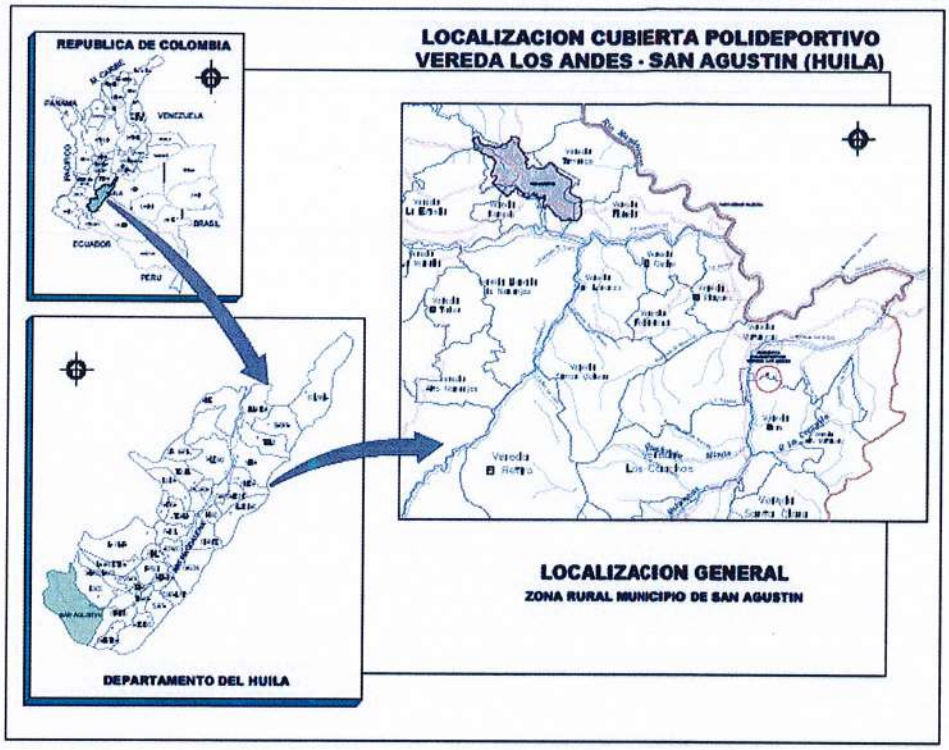

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto arquitectónico contempla un área a intervenir de 632,32 m², en la que se encuentra contemplada la construcción de la cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 20 en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz, para el polideportivo ubicado en la vereda Los Andes del Municipio de San Agustín – Huila, la cual tiene una destinación de uso recreativo, deportivo y cultural; el polideportivo corresponde a estructura de cubierta, iluminación y sistema hidráulico para el manejo de aguas lluvias.

La cubierta será con sistema autoportante, sostenida con columnas en concreto de 3.00 PSI. El sistema estructural propuesto consiste en columnas y vigas aéreas en concreto reforzado en 3.000 PSI y una cimentación tipo zapatas, vigas de cimentación y viga canal. Todas las obras atienden lo establecido en la NORMA SISMORRESISTENTE de 2010 – NSR-10.

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

- ACTIVIDADES PRELIMINARES
- CIMENTACIÓN
- ESTRUCTURA EN CONCRETO

- CUBIERTA
- ACABADOS – PLACA DE CONCRETO
- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
- INSTALACIONES ELÉCTRICAS
- TRANSPORTE

4. INFORME CONCRETO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DURANTE EL PERIODO



Se realizó reunión de socialización del proyecto con la comunidad donde participó la interventoría y el contratista, en la cual, entre otras cosas, se dieron a conocer las dificultades para dar inicio a la construcción por las afectaciones que se puede presentar en la vía de acceso y en la vivienda que se ubica en el costado occidental del polideportivo, al momento de realizar las excavaciones para la cimentación. La comunidad quedó comprometida con dar solución para que esos permisos y afectaciones no interfieran en la obra y se pueda dar inicio a la construcción del proyecto. Este aspecto fue uno de los cuales motivaron la suspensión del contrato.

5. HISTORIA CRONOLÓGICA DEL PROYECTO


ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa)
Iniciación	16/11/2023			
Suspensión No. 1	21/12/2023	36		
Reiniciación No. 1				
Terminación	29/12/2023			
TOTAL DÍAS		**36**		


6. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
INICIO		16/11/2023
ACTA DE COMITÉ DE OBRA	1	30/11/2023
ACTA DE VEEDURIA	1	07/12/2023
ACTA DE CONCETRACION Y SOCIALIZACIÓN INICIO DE OBRA	1	07/12/2023
ACTA DE SUSPENSION	1	21/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN	1	21/12/2023

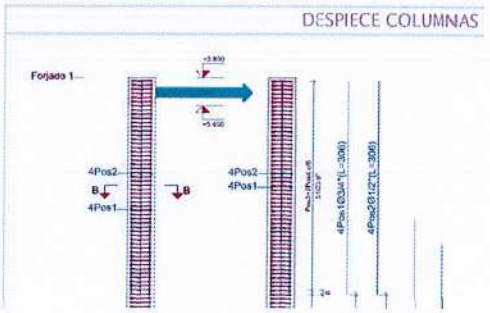
7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	
a). **Actividades administrativas**	- Publicación de pólizas para legalización del contrato, conforme a lo establecido en la CLÁUSULA 18 – GARANTÍAS, del contrato de obra en el secop II. - Suscripción del acta de inicio - Entrega de pólizas actualizadas por el acta de inicio del contrato - entrega de documentos para tramite de anticipo - Suscripción de acta de justificación para la suspensión No.1 - Suscripción acta de suspensión No. 01.
b.) **Actividades operativas**	Las actividades llevadas a cabo en el presente periodo fueron: Se recibe de parte de la entidad contratante la siguiente documentación: • Plano A-01-Implantación San Agustín-Vereda Los Andes • Plano Elec San Agustín-Vereda Los Andes • Plano Estru San Agustín-Vereda Los Andes • Plano HS-01-Aguas lluvias San Agustín-Vereda Los Andes • Plano L-01-Localización San Agustín-Vereda Los Andes Una vez revisados los documentos, se encuentran las siguientes observaciones estructurales: En el plano "Estru San Agustín-Vereda Los Andes_E2" encontramos que la cota y despieces de las columnas no coincide con la mostrada en el plano "Estru San Agustín-Vereda Los Andes_E3" como corte de la estructura, lo que conllevaría a queel despiece del hierro establecido para una altura de columna no sea la que realmente se vaya a construir. Por lo tanto, se requiere una aclaración por parte del diseñador estructural en este caso.  

También se evidencio mediante una visita realizada el día 22 de noviembre del presente año, que la implantación del proyecto generará una afectación en la vía principal del casco urbano de la vereda, ya que dicha se encuentra ubicada en un costado colindante con el polideportivo, donde en el momento de realizar la excavación de la cimentación de la estructura, dicha vía se perdería ya que se requeriría hacer un corte al talud afectado la huella de la ruta.

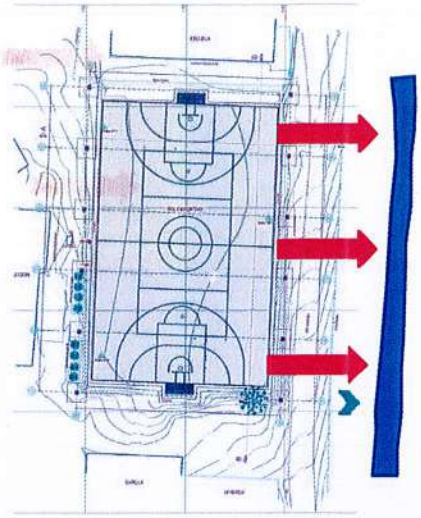

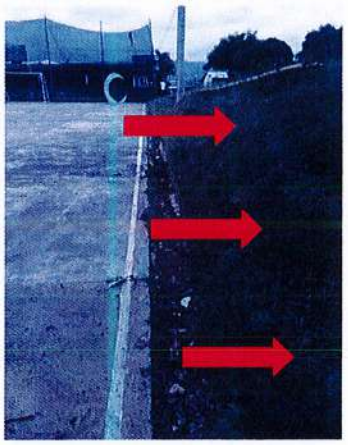





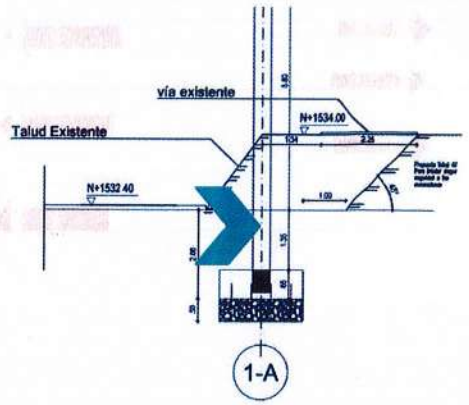


1-A


Igualmente se pudo evidenciar en la visita que se debe considerar la adecuación de una vía de acceso al costado occidental del proyecto para poder acceder con una retroexcavadora sobre llantas y por esa misma vía retirar el material de excavación proveniente del talud de ese costado ya que el sitio de la obra se encuentra rodeado por viviendas y una escuela y por el polideportivo no pueden transitar estos equipos ya que afectarían la placa existente.

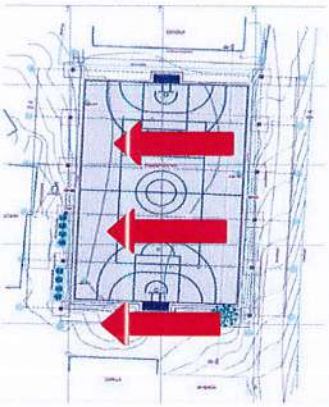

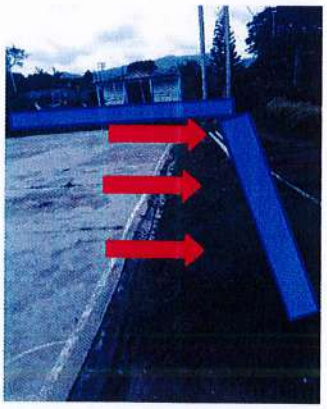

Así también, en el mismo costado occidental se encuentra una vivienda que cuya construcción se verá afectada en el momento de la realización de las actividades de excavación para las zapatas de la estructura, situación que quedó plasmada en la socialización del proyecto ante la comunidad que debe ser solucionada para poder darle arranque al proyecto.

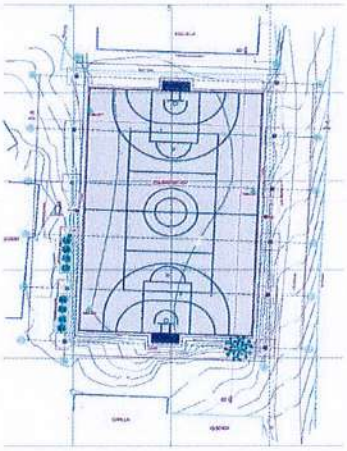

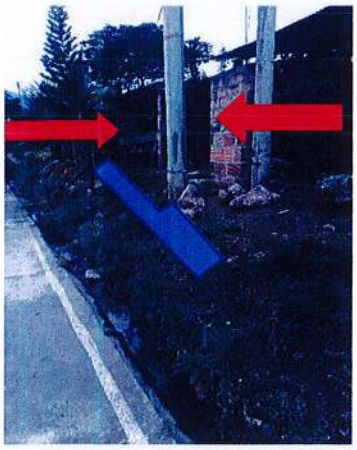

Se envío el respectivo informe a la interventoría y a la entidad contratante de las observaciones encontradas, dichos análisis fueron revisadas por parte del ente interventor solicitando a su vez un comité técnico con el apoyo a la supervisión por parte del INDERHUILA, en donde fueran expuestas las observaciones encontradas en los planos juntos con otras observaciones encontradas en el sitio de la obra, el INDERHUILA.

La Entidad contratante una vez revisó la información presentada por el contratista y avalado por al interventoría, procedió a autorizar la suspensión del contrato de obra por un lapso de 45 días calendarios y/o hasta que se superen las situaciones que dieron lugar a la suspensión, teniendo en cuenta que para cumplir con el objeto del contrato se deben tener aprobados los ajustes a los diseños estructurales y la comunidad cuente con los permisos necesarios para llevar a cabo todas las actividades de la obra.

También se realiza la instalación de la valla respectiva del contrato en el sitio de la obra.

c). Actividades Operativas	- Visita de localización de obra - Se realizo socialización del proyecto con la comunidad

8. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

DURANTE EL PERIODO SE HAN PRESENTADO PERMANENTES PRESIPITACIONES EN LA ZONA, LA PRESENCIA DE LLUVIAS ES CONSTANTE EN LA VEREDA LOS ANDES.

No se adelantaron actividades ni se contó con personal en el sitio de obra.

9. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Tipo Prueba de Laboratorio	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
N/A		

10. COMITÉS DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
30/11/2023	INDERHUILA	Acta de comité; se debate la justificación de la solicitud de suspensión de la obra, dado los hallazgos encontrados por parte del contratista en campo y en los documentos técnicos del proyecto (presupuesto y memorias de cantidades), los cuales fueron avalados por la interventoría, y que requieren ajustes o modificaciones estructurales por parte del diseñador.

11. CONTROL DE ANTICIPO

No ha sido girado por parte de la entidad contratante

12. RELACIÓN DE PERSONAL (Profesional y Mano de obra)

NOMBRE Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA.	C.C. 7.719.364	DIRECTOR DE OBRA	INDEFINIDO
WILMAR ARMANDO JIMENEZ MARULANDA	C.C. 7.719.364	RESIDENTE DE OBRA	CONTRATO OBRA LABOR

13. RELACIÓN DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA
Anticipo	N/A	NO SE HA REALIZADO EL PAGO

14. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
NOVIEMBRE DE 2023							

NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA.	$185.600	$46.400	$6,100	$46.400	EXONERADO	9460090325	06/12/2023
DICIEMBRE DE 2023							
NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA.	$185.600	$46.400	$6,100	$46.400	EXONERADO	9461784678	19/01/2024

15. RELACIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍA

Póliza legalización del CONTRATO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051691	0	02/11/2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	20/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	20/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	20/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 años desde acta de recibo final

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018815	0	02/11/2023	01/11/2023	20/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:


PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)


ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051691	1	22/11/2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	20/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	20/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	20/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 años desde acta de recibo final

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018815	1	22/11/2023	01/11/2023	20/02/2024

17. REGISTRO FOTOGRÁFICO

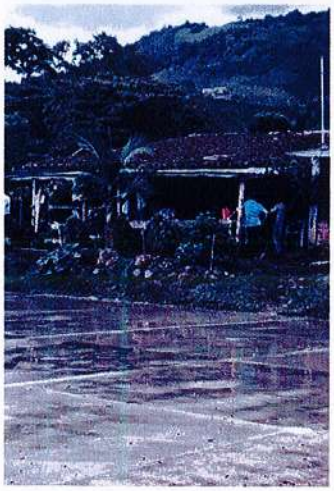16. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	
Instalación de valla en sitio de obra	 
Reunión de socialización	

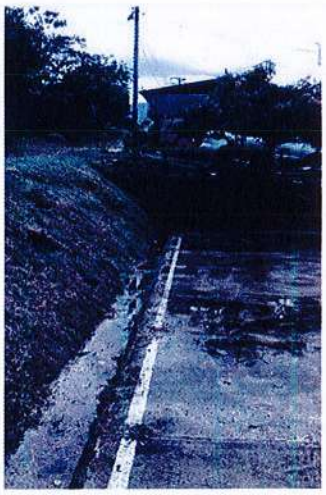Taludes en ambos costados de la obra, que obstaculizan las excavaciones de cimentación, y que pueden afectar la vía y la vivienda en el lado occidental del proyecto.	 

18. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

CONDICIONES CONTRACTUALES						EJECUCIÓN OBRA PRESENTE INFORME			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA		
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	% EJECUCIÓN	CANT.	VR/TOTAL	% EJECUCIÓN
1											
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES										
1.01	Localización y replanteo.	M2	632,32	$ 3.549,00	$ 2.244.104,00						
1.02	Demolición de cuneta existente.	ML	62,80	$ 7.544,00	$ 473.763,00						
1.03	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	2,40	$ 26.210,00	$ 62.904,00						
1.04	Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante.	ML	2,10	$ 20.804,00	$ 43.688,00						
1.05	Desmonte marcos canchas existentes.	UND	2,00	$ 116.413,00	$ 232.826,00						
1.06	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	204,04	$ 45.880,00	$ 9.361.355,00						
1.1.7	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.	M3	92.29	$ 83,375.00	$ 12.712.825,00						
Sub-total					**$ 25.131.465,00**						
2											
2.1	CIMENTACIÓN										
2.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	63,82	$ 33.922,00	$ 2.164.902,00						
2.02	Concreto ciclópeo - 2500 PSI (140 KG/CM2) 60% Concreto 2.000 PSI + 40% Piedra media zonga	M3	21,66	$ 359.045,00	$ 7.776.915,00						
2.03	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	26,71	$ 617.415,00	$ 16.491.155,00						
2.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	1.698,00	$ 7.097,00	$ 12.050.706,00						

2.05	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	8,20	$ 740.066,00	$ 6.068.541,00						
2.06	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	KG	612,00	$ 7.097,00	$ 4.343.364,00						
Sub-total					**$ 48.895.583,00**						
3											
3.1	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**										
3.01	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	14,00	$ 918.378,00	$ 12.857.292,00						
3.02	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	3.491,00	$ 7.097,00	$ 24.775.627,00						
3.03	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.	M3	17,00	$ 1.002.201,00	$ 17.037.417,00						
3.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	1.756,00	$ 7.097,00	$ 12.462.332,00						
3.05	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	57,76	$ 40.240,00	$ 2.324.262,00						
Sub-total					**$ 69.456.930,00**						
4											
4.1	**CUBIERTA**										
4.01	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 20, en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	670,93	$ 285.939,00	$ 191.845.053,00						
Sub-total					**$ 191.845.053,00**						
5											
5.1	**ACABADOS - PLACA EN CONCRETO**										
5.01	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	317,78	$ 14.758,00	$ 4.689.797,00						

5.02	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	2,00	$ 3.700.895,00	$ 7.401.790,00						
5.03	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	2,40	$ 84.509,00	$ 202.822,00						
5.04	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño.	ML	62,80	$ 83.629,00	$ 5.251.901,00						
Sub-total					**$ 17.546.310,00**						
6											
6.1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**										
6.01	Bajantes en tubería PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagües y bajantes de aguas lluvias.	ML	63,20	$ 79.932,00	$ 5.051.702,00						
6.02	Suministro e instalación de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagües.	ML	20,60	$ 106.806,00	$ 2.200.204,00						
6.03	Suministro e instalación de tubería PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	30,00	$ 218.470,00	$ 6.554.100,00						
6.04	Caja de inspección en concreto de F´c=2500 PSI, de sección 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts. según diseño	UND	2,00	$ 349.057,00	$ 698.114,00						
Sub-total					**$ 14.504.120,00**						
7											
7.1	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**										
7.01	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, cableado y demolición de machón en concreto.	UND	2,00	$ 292.572,00	$ 585.144,00						
7.02	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	3,00	$ 637.202,00	$ 1.911.606,00						

7.03	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	5,12	$ 45.880,00	$ 234.906,00						
7.04	Canalización en ductos Conduit PVC tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	ML	32,00	$ 49.210,00	$ 1.574.720,00						
7.05	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2,00	$ 303.693,00	$ 607.386,00						
7.06	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	2,00	$ 281.525,00	$ 563.050,00						
7.07	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1,00	$ 1.014.120,00	$ 1.014.120,00						
7.08	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1,00	$ 4.688.701,00	$ 4.688.701,00						
7.09	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	ML	16,00	$ 88.300,00	$ 1.412.800,00						
7.10	Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12,00	$ 367.987,00	$ 4.415.844,00						
7.11	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	60,00	$ 57.998,00	$ 3.479.880,00						
7.12	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12,00	$ 1.016.078,00	$ 12.192.936,00						
7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 972.420,00	$ 972.420,00						
7.14	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 1.032.612,00	$ 1.032.612,00						
Sub-total					**$ 34.686.125,00**						
8											
8.1	**TRANSPORTE**										
8.01	Transporte de materiales pétreos	M3-Km	2.760,15	$ 1.150,00	$ 3.174.173,00						
Sub-total					**$ 3.174.173,00**						

	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 405.239.759,00**						
	Administración	20%			$ 81.047.952,00						
	Imprevistos	1%			$ 4.052.398,00						
	Utilidad	4%			$ 16.209.590,00						
	VALOR TOTAL				**$ 506.549.699,00**						
	% AVANCE DE OBRA										

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. NESTOR RODRIGO FIERRO LOSADA
DANES INGENIEROS S.A.S.
CONTRATISTA OBRA

ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANÍA
R.L. CONSORCIO WF
CONTRATISTA INTERVENTORIA

1. ANEXOS

- BITÁCORA DE OBRA.
- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP).
- CERTIFICADO VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA REALIZADO POR EL INTERVENTOR (Vo.Bo. Interventor).

ING. NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA	09/02/2024	ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANÍA
FIRMA ORIGINAL CONTRATISTA DE OBRA	FECHA DE ENTREGA	FIRMA ORIGINAL Vo.Bo CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

ANEXOS

Informe 1

ANEXO 2. SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP)

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	41212054	9460090325	E	2023/12/06	2023/12/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,658,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NEIVA (6 Afiliados)							$5,838,667	$934,200			$5,838,667	$233,600			$5,838,667	$233,600			$5,838,667		$257,300		$0	$0		$1,658,700
Centro de Trabajo: PERSONAL ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$569,000
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$569,000
1	CC	7719364	FIERRO NESTOR		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
2	CC	36067241	MEDINA SANDRA		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
Centro de Trabajo: PERSONAL DE OBRA (4 Afiliados)							$3,518,667	$563,000			$3,518,667	$140,800			$3,518,667	$140,800			$3,518,667		$245,100		$0	$0		$1,089,700
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (4 Afiliados)							$3,518,667	$563,000			$3,518,667	$140,800			$3,518,667	$140,800			$3,518,667		$245,100		$0	$0		$1,089,700
3	CC	1080187924	AVILA NICOLAS		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
4	CC	1075280329	LOSADA DIVA		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
5	CC	1075306422	TRUJILLO NICOLAS		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
6	CC	1075263391	YOSA DIEGO	X	23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF32	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	SI	$12,100
Total			**Afiliados(6)**				$5,838,667	$934,200			$5,838,667	$233,600			$5,838,667	$233,600			$5,838,667		$257,300		$0	$0		$1,658,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	41212054	9460090325	E	2023/12/06	2023/12/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,658,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$934,200	$0	$0	$934,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$748,600	$0	$0	$748,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$257,300	$0	$0	$257,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$257,300	$0	$0	$257,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$233,600	$0	$0	$233,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	6	$233,600	$0	$0	$233,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$233,600	$0	$0	$233,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$187,200	$0	$0	$187,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				6	$1,658,700	$0	$0	$1,658,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	94107710	9461784678	E	2024/01/05	2024/01/19	BANCO DE OCCIDENTE	14	$1,667,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NEIVA (5 Afiliados)							$5,800,000	$928,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000		$254,600		$0	$0		$1,646,600
Centro de Trabajo: PERSONAL ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$569,000
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$569,000
1	CC	7719364	FIERRO NESTOR		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
2	CC	36067241	MEDINA SANDRA		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
Centro de Trabajo: PERSONAL DE OBRA (3 Afiliados)							$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000		$242,400		$0	$0		$1,077,600
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (3 Afiliados)							$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000		$242,400		$0	$0		$1,077,600
3	CC	1080187924	AVILA NICOLAS		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
4	CC	1075280329	LOSADA DIVA	X	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
5	CC	1075306422	TRUJILLO NICOLAS		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Total			**Afiliados(5)**				$5,800,000	$928,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000		$254,600		$0	$0		$1,646,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	94107710	9461784678	E	2024/01/05	2024/01/19	BANCO DE OCCIDENTE	14	$1,667,700

RESUMEN DE PAGO


RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$928,000	$11,800	$0	$939,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$742,400	$9,400	$0	$751,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$2,400	$0	$188,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$254,600	$3,300	$0	$257,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$254,600	$3,300	$0	$257,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$232,000	$3,000	$0	$235,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	$232,000	$3,000	$0	$235,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$232,000	$3,000	$0	$235,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$185,600	$2,400	$0	$188,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$600	$0	$47,000
TOTAL				5	$1,646,600	$21,100	$0	$1,667,700

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. _ **CIHCM420 DE de 2023**_

INFORME DE INTERVENTORIA No. _1___

MENSUAL [X] **FINAL** [ ]

Objeto Contrato: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA.

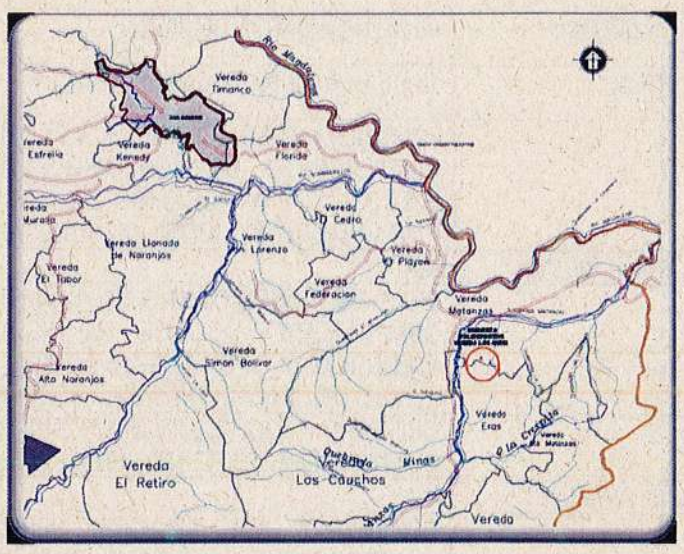

MUNICIPIO: SAN AGUSTIN – VEREDA LOS ANDES

DEPARTAMENTO: HUILA


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM420 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO WF.

APOYO A LA SUPERVISIÓN	1. CESAR JOAQUIN VELASQUEZ	**ENTIDAD**	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	___ **CIHCM420**____ DE 2023___		
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA .	**PERIODO DEL INFORME**	16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
CONTRATISTA	CONSORCIO WF	**NIT:**	901.769.619 - 8.
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	**C.C:**	7.711.430 DE NEIVA
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	09 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16 DE NOVIEMBRE DE 2023		
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.		
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	N.A		
PLAZO TOTAL:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.		
VALOR INICIAL:	OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($ 88.657.430,00) M/CTE.		
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	N.A		
VALOR TOTAL:	OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($ 88.657.430,00) M/CTE.		
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA No.	CLPIH383 DE 2023		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA **VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN** - DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
CONTRATISTA	DANES INGENIEROS S.A.S	**NIT:**	900.219.918-2

REPRESENTANTE LEGAL:	NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA	**C.C:**	7.719.364
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	01 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16 DE NOVIEMBRE DE 2023		
PLAZO INICIAL	3 MESES		
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	N/A		
PLAZO TOTAL:	3 MESES		
VALOR INICIAL:	$ 506.549.699		
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	N/A		

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Cubierta Autoportante con Iluminación para la Vereda Los Andes de la Zona Rural del Municipio San Agustín - Departamento Del Huila

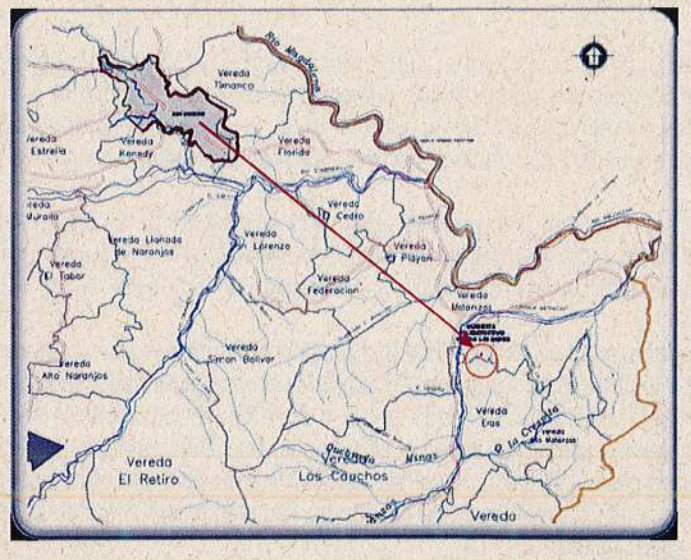

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La misión del INDERHUILA es generar y brindar a la comunidad oportunidades de participación en los procesos de iniciación, formación, fomento y práctica del deporte, la educación física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, como contribución al desarrollo integral del individuo, para el mejoramiento de la calidad de vida de la población del Departamento del Huila, por medio de la masificación, la promoción y el apoyo a la práctica deportiva.

En consecuencia, de lo anterior se requiere la adecuación locativa de los terrenos existentes para llevar a cabo la **CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA;** lo permitirán a la población realizar las prácticas deportivas, que van a contribuir con la mejora de la calidad de vida de las personas que acuden a estos escenarios recreo

deportivos. Se resalta que este tipo de obras contribuyen a minimizar el déficit de espacios deportivos que existe en el Departamento del Huila.

El objetivo principal es promover la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre hacia el desarrollo humano integral; donde se promuevan y estimulen los valores para la convivencia, participación, disminución de la violencia, y construcción del tejido social: apoyado en estrategias que beneficien los habitantes de la ciudad para fortalecer el desarrollo del deporte la recreación y la educación física, con la implementación de programas orientados a' la construcción de tejido social y convivencia ciudadana en la totalidad de la población Huilense con una infraestructura deportiva técnicamente adecuada, desarrollando acciones articuladas entre sí, que mejoren la calidad de vida de todas y todos los habitantes del Departamento del Huila, bajo los principios de sostenibilidad ambiental, participación ciudadana, democracia, equidad e inclusión de personas con movilidad reducida y respeto por las libertades individuales y que permitan posicionar al Departamento en el contexto regional, nacional y mundial, en concordancia con las Políticas Departamentales y Nacionales.

Las presentes especificaciones contienen el alcance para la ejecución de las obras de construcción de las cubiertas en el Departamento del Huila.

El proyecto arquitectónico contempla un área construida de 632,32 m2 por cubierta aproximadamente, en la que se encuentra contemplada la construcción. de la cubierta autoportante a base de lámina de acero cal: 20 para el polideportivo ubicado en la vereda los Andes del municipio de San Agustín — Huila, la cual tiene una destinación de uso recreativo, deportivo y cultural; el polideportivo corresponderá a estructura, cubierta, iluminación y sistema hidráulico para el manejo de aguas lluvias.

La cubierta será con sistema auto portante, sostenida con columnas en concreto de 3000 PSI. sistema estructural propuesto consiste en columnas y vigas aéreas en concreto reforzado en 3000 PSI y una cimentación tipo zapatas, vigas de cimentación y viga canal. Todas las obras deberán atender lo establecido en la NORMA SISMORESITENTE de 2010 - NSR-10.

Actualmente en la vereda Los Andes existe una placa polideportiva en buen estado, la cual se encuentra sin cubierta y con una mala iluminación, lo que impide que la comunidad de lá vereda Los Andes, especialmente de la población juvenil e infantil quienes usan continuamente este espacio, pueda gozar y disfrutar de los espacios recreo deportivos, generando también que los programas no lleguen a la comunidad; en el sitio existen dos (02) postes de iluminación y una línea de energía que pasa por la zona verde entre la placa y vía del costado oriental. Existe espacio entre los dos costados longitudinales oriente y occidente) para la localización de la futura cimentación de columnas. También existe cerca de la esquina de la escuela una cuneta en concreto de evacuación aguas lluvias.

5. DESCRIPCION DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA

Las actividades de avance de obra se han centrado en la formalización y ordenamiento contractual, adecuación del terreno y las actividades preliminares. Tal como se describen en este informe.

SEMANA (16-18 NOVIEMBRE)

Se revisan los diseños en compañía del contratista de obra.
El contratista adelanta trabajos de consecución y organización de documentación del proyecto, análisis de especificaciones técnicas, y revisión de planos.

Una vez revisados los planos estructurales de la obra "Estru San Agustín-Vereda Los Andes_E2" el contratista encontró que la cota y despieces de las columnas no coincide con la mostrada en el plano "Estru San Agustín-Vereda Los Andes_E3" como corte de la estructura, lo que conllevaría a que el despiece del hierro establecido para una altura de columna no sea la que realmente se vaya a construir. Por lo tanto, se requiere una aclaración por parte del diseñador estructural en este caso.

SEMANA (20-25 NOVIEMBRE)

Se realiza visita de inspección al sitio de ejecución del proyecto. Se cuenta con acompañamiento de la comunidad y se realiza la instalación de la Valla Informativa en la vereda los andes con la información correspondiente.

El contratista de acuerdo a la visita de obra realizada el 22 de Noviembre de 2023, se evidencia que la implantación del proyecto generará una afectación en la vía principal del casco urbano de la vereda, ya que dicha se encuentra ubicada en un costado colindante con el polideportivo, donde en el momento de realizar la excavación de la cimentación de la estructura, dicha vía se perdería ya que se requeriría hacer un corte al talud afectado la huella de la ruta.

Igualmente se pudo evidenciar en la visita que se debe considerar la adecuación de una vía de acceso al costado occidental del proyecto para poder acceder con una retroexcavadora sobre llantas y por esa misma vía retirar el material de excavación proveniente del talud de ese costado ya que el sitio de la obra se encuentra rodeado por viviendas y una escuela y por el polideportivo no pueden transitar estos equipos ya que afectarían la placa existente.

Así también, en el mismo costado occidental se encuentra una vivienda que cuya construcción se verá afectada en el momento de la realización de las actividades de excavación para las zapatas de la estructura, situación que quedó plasmada en la socialización del proyecto ante la comunidad que debe ser solucionada para poder darle arranque al proyecto.

SEMANA (27-30 NOVIEMBRE)

Se realiza comité de obra el 30 de Noviembre de 2023 en las instalaciones del INDERHUILA, donde se hicieron presentes el contratista, la interventoría, el ingeniero apoyo a la supervisión por parte del INDERHUILA y analizadas las circunstancias expuestas en el oficio de observaciones se decide invitar a dicha reunión al Ing. Calculista del proyecto, quien concluye que se debe modificar el diseño estructural de la cubierta cambiando de zapatas concéntricas a zapatas excéntricas para tratar de minimizar las actividades adicionales en obra que esto requeriría estando de acuerdo el contratista y la interventoría.

El contratista inicia la consecución y organización de documentos para solicitar el desembolso del anticipo del contrato, teniendo en cuenta que plazo para presentación de documentos es hasta el 05 de Diciembre de 2023.

6. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	16/11/2023	15		
Suspensión No. 1				

Reiniciación No. 1				
TERMINACIÓN Cto.	29/12/2023			
TOTAL DIAS		**15**	**0**	

7. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA DE INICIO 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	1	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA DE COMITÉ DE OBRA	1	30 DE DICIEMBRE 2023

8. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO
(Cumplimiento Obligaciones del contrato).

a). Obligaciones de Carácter General.

1. Se presentó al InderHuila el personal técnico de interventoría Director y Residente.
2. Se he realizado la entrega de documentación en papel reciclado.
3. Se realizó afiliación y pago de seguridad social (Salud, Pensión y riesgos).
4. Se verifico la localización de los trabajos y condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el contrato.
5. Se realiza revisión conjunta de los planos y especificaciones técnicas del contrato de obra.
6. Durante el periodo de inicio se realizó el cambio de equipo de trabajo propuesto en la interventoría. El cual fue entregado a la entidad con sus respectivos anexos.
7. Se suscribió con el contratista de obra el acta de inicio, el cual fue tramitada ante el Inderhuila.
8. Se realizó revisión de pólizas de acuerdo al acta de inicio del contratista de obra, el cual se tramitó a la entidad para su aprobación.
9. La interventoría cuenta con oficina en la carrera 4# 9-25 oficina 507.
10. Una vez suscrito el contrato de interventoría se realizaron los pagos correspondientes a la legalización del contrato y estampillas correspondientes a la Gobernación del Huila el día 9 de noviembre de 2023.

b). Actividades Administrativas.

1. se realiza control y seguimiento del personal que ejecuta la obra

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL	CARGO
NESTOR RODRIGO LOSADA	Director de Obra
WILMAR ARMANDO JIMENEZ MARULANDA	Residente de Obra

	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS	Sin equipos que requieran seguimiento y control a la fecha.
	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	Solo se han realizado actividades administrativas.
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	Planilla relacionada NRO. DE PLANILLA 9460090325 PENSION: $934.200 SALUD: $233.600 ARL: $257.300 CCF: $233.600
		DICIEMBRE 6 DE 2023
	1. La interventoría reviso y suscribió el acta de inicio celebrados entre el contratista de obra, interventoría y entidad el día 16 de noviembre de 2023, Se hace visita de obra inicial el 22 de Noviembre de 2023 y se realiza la instalación de la Valla Informativa en la vereda los andes con la información correspondiente, así mismo se realiza acta de comité de obra el día 30 de Noviembre de 2023; durante el mes ejecutado no se suscribieron demás actas y/o documentos. 2. Durante el mes se presentaron observaciones a los diseños de los planos estructurales y se solicita primera solicitud de suspensión por parte del contratista. 3. Se realizó la revisión de las vigencias de las pólizas del contrato de obra las cuales fueron remitidas a la entidad. 4. la interventoría deja constancia que el contratista de obra no entrega soportes de afiliación del personal en obra y el cumplimiento legal de seguridad industrial y salud ocupacional de Entrega de dotación, alegando que no ha podido iniciar las actividades y, por lo tanto, no ha realizado ninguna actividad contractual.	
c). **Actividades Operativas.**	1. No se llevaron a cabo debido a las inconsistencias encontradas en los diseños de los planos estructurales y en la implantación del proyecto.	
d). **Actividades Logísticos.**	1. Se hace seguimiento a las observaciones presentadas en los planos "Estru San Agustín-Vereda Los Andes_E2" el contratista encontró que la cota y despieces de las columnas no coincide con la mostrada en el plano "Estru San Agustín-Vereda Los Andes_E3".	
e). **Obligaciones de Carácter Ambiental.**	1. Se solicita el plan de Manejo ambiental al contratista para verificar su cumplimiento en obra, el contratista no hizo entrega del plan de manejo ambiental, debido a que no ha podido iniciar actividades.	

f). Actividades Financieras.

1. Se realiza la solicitud del plan de anticipo y la documentación requerida para la gestión del anticipo al contratista de obra para el inicio del proceso de aprobación y gestión por parte de la interventoría.

g). Actividades Jurídicos.

1. Se realiza seguimiento a pólizas y garantías

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):	AMPARO	VIGENCIA DESDE (D/M/A):	VIGENCIA HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051691		22/11/2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	20/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	20/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	20/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 AÑOS

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):	VIGENCIA DESDE (D/M/A):	VIGENCIA HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S.A	61-40-101018815		22/11/2023	01/11/2023	20/02/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)


ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):	AMPARO	VIGENCIA DESDE (D/M/A):	VIGENCIA HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051691		22/11/2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	20/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	20/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	20/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 AÑOS

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):	VIGENCIA DESDE (D/M/A):	VIGENCIA HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S.A	61-40-101018815		22/11/2023	01/11/2023	20/02/2024

9. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

Las temperaturas máximas diarias son alrededor de 22 °C, rara vez bajan a menos de 20 °C o exceden 24 °C. La temperatura máxima promedio diaria más baja es 22 °C el 20 de noviembre. Las temperaturas mínimas diarias son alrededor de 15 °C, rara vez bajan a menos de 14 °C o exceden 16 °C. La temperatura mínima promedio diaria más baja es 15 °C el 8 de noviembre. Como referencia, el 20 de septiembre, el día más caluroso del año, las temperaturas en San Agustín generalmente varían de 15 °C a 23 °C, mientras que el 5 de julio, el día más frío del año, varían de 15 °C a 22 °C.

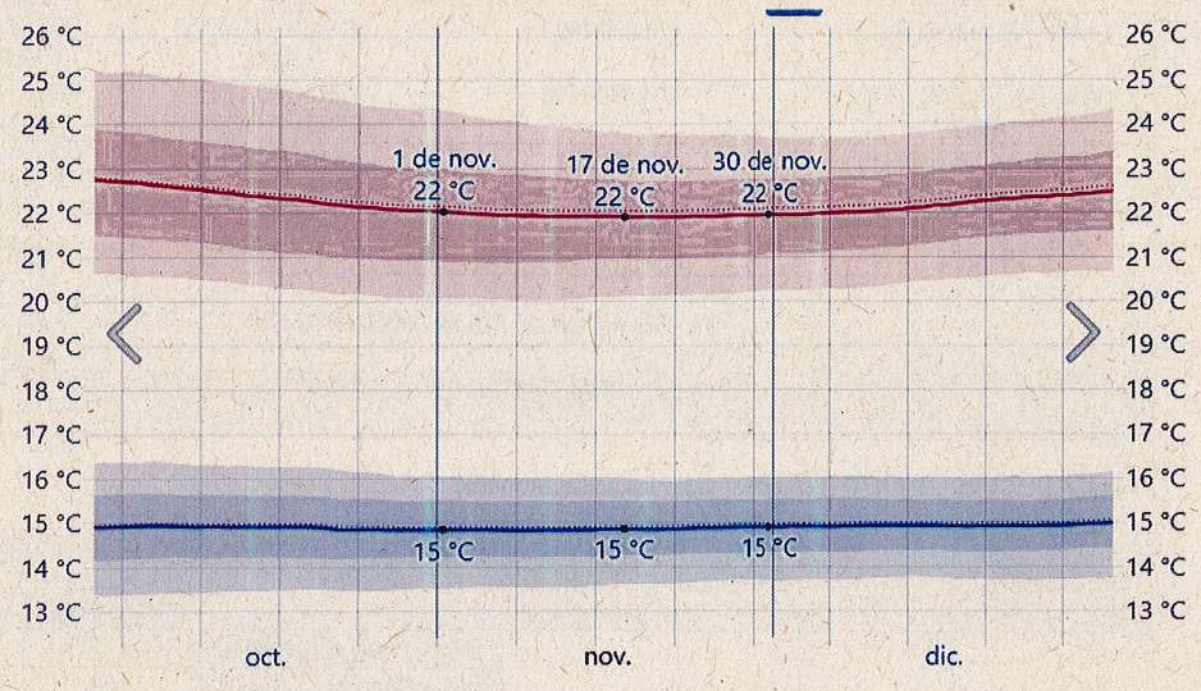

Temperatura máxima y mínima promedio en San Agustín. Tomado de _Weather Spark
https://es.weatherspark.com/s/21464/3/Tiempo-promedio-en-el-invierno-en-San-Agust%C3%ADn-Colombia#Figures-Temperature

10. ENSAYOS DE LABORATORIO

N/A

11. COMITES DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
30-11-2023	INDERHUILA	ACTA DE COMITÉ DE OBRA N 01 (SE ADJUNTA)

12. RELACION DE PERSONAL (Profesional Interventoría)

NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	7.711.430	REPRESENTANTE LEGAL	PRESTACIÓN DE SERVICIO
JOSE WILMER CHILITO	76.320.749	REPRESENTANTE LEGAL	PRESTACIÓN DE SERVICIO
CRISTIAN FABIAN JUNCO AVILA	1.012.354.706	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	PRESTACIÓN DE SERVICIO
JAIME ANDRES CELIS FLORIANO	12.241.491	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	PRESTACIÓN DE SERVICIO
INGRID YOMARA DELGADO RAMOS	1.075.277.887	SECRETARIA	PRESTACIÓN DE SERVICIO

13. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

PÓLIZA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010098	0	09/11/2023	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	09/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	09/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	09/02/2024	09/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	0	Amparo Básico, Predios, Labores y Operaciones	09/11/2023	09/02/2024

PÓLIZA ACTUALIZADA (ANULADA)

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010098	1	21/11/2023	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	09/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	09/02/2027
				Calidad del Servicio	09/02/2024	09/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002028	1	Amparo Básico, Predios, Labores y Operaciones	09/11/2023	09/02/2024

PÓLIZA ACTUALIZADA – INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010098	2	21/11/2023	Cumplimiento del contrato	16/11/2023	16/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/11/2023	16/02/2027
				Calidad del Servicio	16/02/2024	16/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)

SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002028	2	Amparo Básico, Predios, Labores y Operaciones	16/11/2023	16/02/2024

14. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
(Describir el contenido del plano)

N/A

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TRABAJO DE OBRA

DIAGRAMA DE AVANCE

CONDICIONES CONTRACTUALES						EJECUCION DE OBRA MENSUAL			ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT.	VR/UNIT	% DE AVANCE	CANT.	VR/TOTAL	% DE AVANCE
1											
1,1	ACTIVIDADES PRELIMINARES										
1.01	Localización y replanteo.	M2	632,32	$ 3.549,00	$ 2.244.104,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%
1.02	Corte de placa de concreto e= 0.10 mts.	ML	62,80	$ 7.544,00	$ 473.763,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%
1.03	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	2,40	$ 26.210,00	$ 62.904,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%
1.04	Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante.	ML	2,10	$ 20.804,00	$ 43.688,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%
1.05	Desmonte marcos canchas existentes.	UND	2,00	$ 116.413,00	$ 232.826,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%
1.06	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	204,04	$ 45.880,00	$ 9.361.355,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%
1.07	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	152,02	$ 83.626,00	$ 12.712.825,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%
Subtotal					$ 25.131.465,00		$ -			$ -	0%
2											
2,1	CIMENTACIÓN										
2.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	63,82	$ 33.922,00	$ 2.164.902,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
2.02	Concreto ciclópeo - 2500 PSI (140 KG/CM2) 60% Concreto 2.000 PSI + 40% Piedra media zoga	M3	21,66	$ 359.045,00	$ 7.776.915,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
2.03	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	26,71	$ 617.415,00	$ 16.491.155,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
2.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	1698,00	$ 7.097,00	$ 12.050.706,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
2.05	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	8,20	$ 740.066,00	$ 6.068.541,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
2.06	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	KG	612,00	$ 7.097,00	$ 4.343.364,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
Subtotal					$ 48.895.583,00		$ -			$ -	$0
3											
3,1	ESTRUCTURA EN CONCRETO										
3.01	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	14,00	$ 918.378,00	$ 12.857.292,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
3.02	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	3491,00	$ 7.097,00	$ 24.775.627,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
3.03	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.	M3	17,00	$ 1.002.201,00	$ 17.037.417,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
3.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	1756,00	$ 7.097,00	$ 12.462.332,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
3.05	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	57,76	$ 40.240,00	$ 2.324.262,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
Subtotal					$ 69.456.930,00		$ -			$ -	$0

4											
4,1	CUBIERTA										
4.01	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 20, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	670,93	$ 285.939,00	$ 191.845.053,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
Subtotal					$ 191.845.053,00		$ -			$ -	$0
5											
5,1	ACABADOS - PLACA EN CONCRETO										
5.01	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	317,78	$ 14.758,00	$ 4.689.797,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
5.02	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	2,00	$ 3.700.895,00	$ 7.401.790,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
5.03	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	2,40	$ 84.509,00	$ 202.822,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
5.04	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño.	ML	62,80	$ 83.629,00	$ 5.251.901,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
Subtotal					$ 17.546.310,00		$ -			$ -	$0
6											
6,1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS										
6.01	Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	63,20	$ 79.932,00	$ 5.051.702,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
6.02	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.	ML	20,60	$ 106.806,00	$ 2.200.204,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
6.03	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	30,00	$ 218.470,00	$ 6.554.100,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
6.04	Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	2,00	$ 349.057,00	$ 698.114,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
Subtotal					$ 14.504.120,00		$ -			$ -	$0
7											
7,1	INSTALACIONES ELECTRICAS										
7.01	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.	UND	2,00	$ 292.572,00	$ 585.144,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
7.02	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	3,00	$ 637.202,00	$ 1.911.606,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
7.03	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	5,12	$ 45.880,00	$ 234.906,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
7.04	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	ML	32,00	$ 49.210,00	$ 1.574.720,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0

7.05	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2,00	$ 303.693,00	$ 607.386,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
7.06	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	2,00	$ 281.525,00	$ 563.050,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
7.07	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1,00	$ 1.014.120,00	$ 1.014.120,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
7.08	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1,00	$ 4.688.701,00	$ 4.688.701,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
7.09	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	ML	16,00	$ 88.300,00	$ 1.412.800,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
7.10	Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12,00	$ 367.987,00	$ 4.415.844,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
7.11	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	60,00	$ 57.998,00	$ 3.479.880,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
7.12	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12,00	$ 1.016.078,00	$ 12.192.936,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 972.420,00	$ 972.420,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
7.14	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 1.032.612,00	$ 1.032.612,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
Subtotal					$ 34.686.125,00		$ -			$ -	$0
8											
8,1	TRANSPORTE										
8.01	Transporte de materiales petreos	M3-Km	2760,15	$ 1.150,00	$ 3.174.173,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
Subtotal					$ 3.174.173,00		$ -	0%		$ -	$0
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 405.239.759					$0	$0
AVANCE DE OBRA									$ 0		

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

CONSORCIO WF
R.L. ING.FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
INTERVENTORIA

DANES INGENIEROS SAS
ING. NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA
CONTRATISTA

15. REGISTRO FOTOGRAFICO





VISITA DE OBRA E INSTALACIÓN DE VALLA

16. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

1. Se realiza revisión de planos e implantación del proyecto.
2. Se realizan observaciones a los diseños de los planos estructurales y se solicita suspensión.
3. Se continúan con la consecución y entrega de documentos requeridos para el pago de anticipo.
4. El contratista anexo un solo informe correspondiente al periodo 16 de Noviembre al 16 de Diciembre de 2023. No incluye soportes, ya que no ha podido iniciar las actividades y, por lo tanto, no ha realizado ninguna actividad contractual.

R.L. FAVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	(20/02/2024)	ING. CESAR JOAQUIN VELASQUEZ
FIRMA ORIGINAL **INTERVENTOR**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo.Bo APOYO SUPERVISION**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7711430
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 4 9 25 OF 507	TELÉFONO:	8668020
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7907135823	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/12/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		322321281

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 516.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 516.400	$ 0	$ 516.400
SUBTOTALES:										**$ 516.400**	**$ 0**	**$ 516.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 403.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.500	$ 0	$ 0	$ 403.500
SUBTOTALES:													**$ 403.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 403.500**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																														PENSIÓN							SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	ISC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 7711430	PERDOMO POLANIA FAIVER EDUARDO	INDEPEND		$ 3.227.300				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 3.227.300	$ 516.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 516.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.227.300	$ 403.500	$ 0	$ 403.500			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 919.900

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7711430
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 4 9 25 OF 507	TELÉFONO:	8688020
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7908240442	TIPO DE PLANILLA:	N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	3		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/12/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	336674117
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	7907135823	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA	2023/12/06

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA		VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
SUBTOTALES:										$ 0	$ 0		$ 0

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:													$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 16.900	$ 16.900	$ 100	$ 0	$ 17.000
SUBTOTALES:									$ 16.900	$ 100	$ 0	$ 17.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD							ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7711430	PERDOMO POLANIA FAIVER EDUARDO	INDEPEND		$ 3.227.300			NO							A										230201-PROTECCION	30	$ 3.227.300	$ 516.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 516.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.227.300	$ 403.500	$ 0	$ 403.500	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	0	$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 7711430	PERDOMO POLANIA FAIVER EDUARDO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 3.227.300			NO							C										230201-PROTECCION	30	$ 3.227.300	$ 516.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 516.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.227.300	$ 403.500	$ 0	$ 403.500	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 3.227.300	7711430	$ 16.900	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 7711430	PERDOMO POLANIA FAIVER EDUARDO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 3.227.300			NO							R										230201-PROTECCION	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 0	EPS037-NUEVA EPS	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 3.227.300	7711430	$ 16.900	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 17.000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76320749		JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA	INDEPENDIENTE	JOSE WILMER CHILITO RIVADENERIA	CRA 8 CL25N BL G AP 305	POPAYAN-CAUCA	3122879619	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	424567176	9459437094	I	2023/12/11	2024/01/30	NEQUI	50	$428,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: JOSE WILMER CHILITO RIVADENERIA (1 Afiliados)																																								
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$411,400
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$411,400
1	CC	76320749 CHILITO JOSE																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
Total		**Afiliados(1**																				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$411,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76320749		JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA	INDEPENDIENTE	JOSE WILMER CHILITO RIVADENERIA	CRA 8 CL25N BL G AP 305	POPAYAN-CAUCA	3122879619	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	424567176	9459437094	I	2023/12/11	2024/01/30	NEQUI	50	$428,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$8,500	$0	$193,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$8,500	$0	$193,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$ 80,800	$4,800	$0	$84,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$ 80,800	$4,800	$0	$84,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$4,200	$0	$149,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	EPS018	805,001,157	2	1	$145,000	$4,200	$0	$149,500
TOTAL				1	$411,400	$17,500	$0	$428,900

2024/01/30 09:40 AM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7711430
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 4 9 25 OF 507	TELÉFONO:	8668020
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4528232357	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/11/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		807419

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 396.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.000	$ 0	$ 396.000
SUBTOTALES:										$ 396.000	$ 0	$ 396.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 72.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.700	$ 0	$ 0	$ 72.700
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 23.200
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 26.300
SUBTOTALES:													$ 122.200	$ 0	$ 0	$ 122.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 138.100	$ 138.100	$ 0	$ 0	$ 138.100
SUBTOTALES:									$ 138.100	$ 0	$ 0	$ 138.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	2	$ 52.600	$ 0	$ 52.600
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$ 69.600	$ 0	$ 69.600
SUBTOTALES:			$ 122.200	$ 0	$ 122.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES									
																											PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE
1	CC 1075277987	DELGADO RAMOS INGRID YOMARA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.160.000	$ 7711430	$ 6.100	30	$ 1.160.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1075288351	RAMIREZ FARFA MACOL STEEVEN	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	17																230301-PORVENIR	17	$ 657.334	$ 105.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 105.200	EPS005-SANITAS S.A.	17	$ 657.334	$ 26.300	$ 0	$ 26.300	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	17	$ 657.334	$ 7711430	$ 45.800	17	$ 657.334	CCF13-COMFACA	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1075308868	SAENZ DIAZ JONATHAN ALEXANDER	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	17																230301-PORVENIR	17	$ 657.334	$ 105.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 105.200	NUEVA EPS CM	17	$ 657.334	$ 26.300	$ 0	$ 26.300	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	17	$ 657.334	$ 7711430	$ 45.800	17	$ 657.334	CCF13-COMFACA	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 12116671	CARDOZO ANDRADE JAIME	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.160.000	FIJO			SI	15																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 23.200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	15	$ 580.000	$ 7711430	$ 40.400	15	$ 580.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 778.500

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-02-20, 09:14:22 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1066183901

Periodo Cotización: noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** diciembre de 2023

Fecha limite de pago: 2023-12-06

PAGADA 20/02/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO WF				
Documento	NI901769619	**Dirección**	CR 4 #9 - 25 OFICINA 507		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8668020		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	3
Ciudad	NEIVA	**Departamento**	HUILA		
Representante Legal	PERDOMO POLANIA FAIVER EDUARDO	**Identificación**	CC7711430		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1083886304	GIRALDO JIMENEZ JAVIER HUMBERTO	01	00	X															0	15	15	15	15	PORVENIR	$ 1.125.000	$ 180.000	EPS SANITAS	$ 1.125.000	$ 45.000	ARL SURA	$ 1.125.000	$ 78.300	COMFAMILIAR HUILA	$ 1.125.000	$ 45.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 348.300
CC 1012354706	JUNCO AVILA CRISTIAN FABIAN	01	00	X															0	15	15	15	15	COLFONDOS	$ 1.375.000	$ 220.000	EPS SANITAS	$ 1.375.000	$ 55.000	ARL SURA	$ 1.375.000	$ 95.700	COMFAMILIAR HUILA	$ 1.375.000	$ 55.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425.700
CC 1079174293	POLANIA LEIVA YINA CARIME	01	00	X															0	10	10	10	10	PORVENIR	$ 750.000	$ 120.000	EPS SANITAS	$ 750.000	$ 30.000	ARL SURA	$ 750.000	$ 52.200	COMFAMILIAR HUILA	$ 750.000	$ 30.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 232.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 3.250.000	$ 3.250.000	$ 3.250.000	$ 3.250.000	$ 520.000	$ 0	$ 0	$ 130.000	$ 226.200	$ 130.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.006.200	$ 42.400	$ 1.048.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.


¡El Poder de lo SIMPLE!

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. _ **CIHCM420 DE de 2023**_

INFORME DE INTERVENTORIA No. _2___

MENSUAL [X] **FINAL** [ ]

Objeto Contrato: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA.

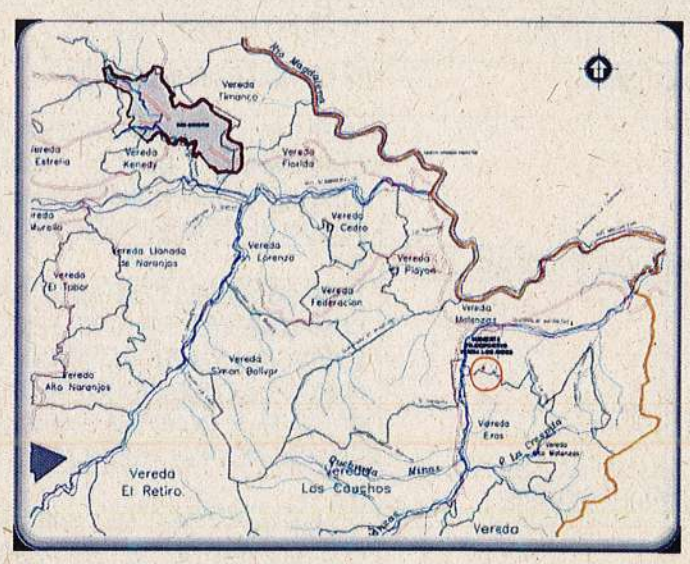

MUNICIPIO: SAN AGUSTIN – VEREDA LOS ANDES

DEPARTAMENTO: HUILA


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM420 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO WF.

APOYO A LA SUPERVISIÓN	1. CESAR JOAQUIN VELASQUEZ	**ENTIDAD**	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	___ **CIHCM420**____ DE 2023___		
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA .	**PERIODO DEL INFORME**	1 DE DICIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.
CONTRATISTA	CONSORCIO WF	**NIT:**	901.769.619 - 8.
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	**C.C:**	7.711.430 DE NEIVA
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	09 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16 DE NOVIEMBRE DE 2023		
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.		
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	N.A		
PLAZO TOTAL:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.		
VALOR INICIAL:	OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($ 88.657.430,00) M/CTE.		
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	N.A		
VALOR TOTAL:	OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($ 88.657.430,00) M/CTE.		
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA No.	CLPIH383 DE 2023		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA **VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN** - DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
CONTRATISTA	DANES INGENIEROS S.A.S	**NIT:**	900.219.918-2
REPRESENTANTE LEGAL:	NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA	**C.C:**	7.719.364
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	01 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16 DE NOVIEMBRE DE 2023		

PLAZO INICIAL	3 MESES
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	N/A
PLAZO TOTAL:	3 MESES
VALOR INICIAL:	$ 506.549.699
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	N/A

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Cubierta Autoportante con Iluminación para la Vereda Los Andes de la Zona Rural del Municipio San Agustín - Departamento Del Huila

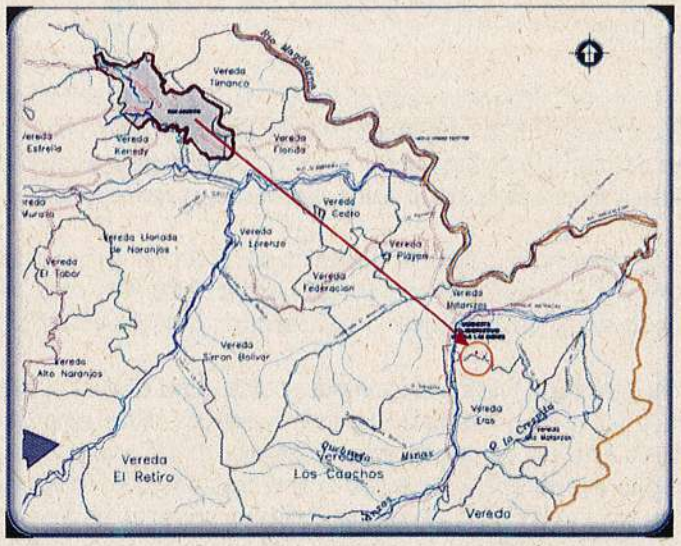

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La misión del INDERHUILA es generar y brindar a la comunidad oportunidades de participación en los procesos de iniciación, formación, fomento y práctica del deporte, la educación física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, como contribución al desarrollo integral del individuo, para el mejoramiento de la calidad de vida de la población del Departamento del Huila, por medio de la masificación, la promoción y el apoyo a la práctica deportiva.

En consecuencia, de lo anterior se requiere la adecuación locativa de los terrenos existentes para llevar a cabo la **CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA;** lo permitirán a la población realizar las prácticas deportivas, que van a contribuir con la mejora de la calidad de vida de las personas que acuden a estos escenarios recreo deportivos. Se resalta que este tipo de obras contribuyen a minimizar el déficit de espacios deportivos que existe en el Departamento del Huila.

El objetivo principal es promover la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre hacia el desarrollo humano integral; donde se promuevan y estimulen los valores para la convivencia, participación, disminución de la violencia, y construcción de! tejido social: apoyado en estrategias que beneficien los habitantes de la ciudad para fortalecer el desarrollo del deporte la recreación y la educación física, con la implementación de programas orientados a' la construcción de tejido social y convivencia ciudadana en la totalidad de la población Huilense con una infraestructura deportiva técnicamente adecuada, desarrollando acciones articuladas entre sí, que mejoren la calidad de vida de todas y todos los habitantes del Departamento del Huila, bajo los principios de sostenibilidad ambiental, participación ciudadana, democracia, equidad e inclusión de personas con movilidad reducida y respeto por las libertades individuales y que permitan posicionar al Departamento en el contexto regional, nacional y mundial, en concordancia con las Políticas Departamentales y Nacionales.

Las presentes especificaciones contienen el alcance para la ejecución de las obras de construcción de las cubiertas en el Departamento del Huila.

El proyecto arquitectónico contempla un área construida de 632,32 m2 por cubierta aproximadamente, en la que se encuentra contemplada la construcción. de la cubierta autoportante a base de lámina de acero cal: 20 para el polideportivo ubicado en la vereda los Andes del municipio de San Agustín — Huila, la cual tiene una destinación de uso recreativo, deportivo y cultural; el polideportivo corresponderá a estructura, cubierta, iluminación y sistema hidráulico para el manejo de aguas lluvias.

La cubierta será con sistema auto portante, sostenida con columnas en concreto de 3000 PSI. sistema estructural propuesto consiste en columnas y vigas aéreas en concreto reforzado en 3000 PSI y una cimentación tipo zapatas, vigas de cimentación y viga canal. Todas las obras deberán atender lo establecido en la NORMA SISMORESITENTE de 2010 - NSR-10.

Actualmente en la vereda Los Andes existe una placa polideportiva en buen estado, la cual se encuentra sin cubierta y con una mala iluminación, lo que impide que la comunidad de lá vereda Los Andes, especialmente de la población juvenil e infantil quienes usan continuamente este espacio, pueda gozar y disfrutar de los espacios recreo deportivos, generando también que los programas no lleguen a la comunidad; en el sitio existen dos (02) postes de iluminación y una línea de energía que pasa por la zona verde entre la placa y vía del costado oriental. Existe espacio entre los dos costados longitudinales oriente y occidente) para la localización de la futura cimentación de columnas. También existe cerca de la esquina de la escuela una cuneta en concreto de evacuación aguas lluvias.

5. DESCRIPCION DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA

Las actividades de avance de obra se han centrado en la formalización y ordenamiento contractual, adecuación del terreno y las actividades preliminares. Tal como se describen en este informe.

SEMANA (1-2 DICIEMBRE)

El 1 de Diciembre el contratista solicita suspensión del contrato de obra, debido a que es necesario realizar unas modificaciones al diseño estructural establecido inicialmente, lo que conlleva a más tiempo sin poder arrancar las actividades de obra, ya que a la fecha llevamos trascurridos 16 días sin ejecutar actividades de obra.

SEMANA (04-09 DICIEMBRE)

El 4 de Diciembre de 2023, la interventoría a cargo del presente proyecto remite a la ENTIDAD INDERHUILA, oficio radicado por el CONTRATISTA DANES INGENIERIA SAS, REITERANDO LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. CLPIH383 de 2023.

Se continua con la consecución de documentos requeridos para la radicación del anticipo de obra.

El 7 de Diciembre de 2023, bajo radicado IH 2-2023-1581 la entidad INDERHUILA da traslado al oficio IH1-2023-4225, para dar solución a la petición presentada por el contratista de obra y la interventoría.

Esta interventoría el 9 de diciembre de 2023, solicita nuevamente la revisión de los diseños estructurales de la cimentación de la estructura de cubierta autoportante, para la Vereda Los Andes zona rural del municipio de San Agustín – departamento del Huila, debido a que se han realizado reuniones con el contratista y la supervisión, en las cuales por parte de esta interventoría considera necesario la revisión y ajuste de esta cimentación, debido a que al realizar la implantación afecta una vía paralela al sitio donde se va a construir las zapatas, además al efectuar la revisión de los aceros, se encontró diferencias en los despieces de los planos E2 y E3 (Estru San Agustín-Vereda Los Andes).

SEMANA (11- 16 DICIEMBRE)

EL 15 de diciembre de 2023, bajo el radicado SANAND. WF42023-006, y recibido por la entidad con No. IH1-2023-4445 la Interventoría aprueba la solicitud de suspensión del contrato de obra No. CLPIH383-2023 por los motivos expuestos con anterioridad por parte del CONTRATISTA, debido a que a la fecha la entidad no ha dado respuesta, a los oficios anteriores.

Adicional a eso y en revisión conjunta de la implantación del proyecto en el área se evidencia la necesidad de realizar mayores cantidades de localización y replanteo por lo cual se suspende la ejecución de dicha actividad hasta tanto se realice la aprobación de mayores y menores cantidades de obra.

SEMANA (18- 21 DICIEMBRE)

En espera por parte de la entidad INDERHUILA que dé respuesta a las observaciones presentadas o suspenda el contrato de obra.

El 21 de Diciembre se efectúa acta de justificación y suspensión del contrato de obra No. CLPIH383-2023.

6. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	16/11/2023	36		
Suspensión No. 1	21/12/2023			
Reiniciación No. 1				
TERMINACIÓN Cto.	29/12/2023			
TOTAL DIAS		**36**	**0**	

7. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA DE INICIO 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	1	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA DE COMITÉ DE OBRA	1	30 DE DICIEMBRE 2023
ACTA DE CONCERTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE OBRA	1	07 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA	1	07 DE DICIEMBRE DE 2023

8. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO
(Cumplimiento Obligaciones del contrato).

a). Obligaciones de Carácter General.

1. Se he realizado la entrega de documentación en papel reciclado.
2. Se continua con la revisión conjunta de los planos y especificaciones técnicas del contrato de obra.
3. Por medio de Oficio SANAND. WF42023-003, se solicita al contratista los documentos del proyecto, según obligaciones del contratista.
4. Se solicita al contratista hacer entrega de la documentación requerida para el desembolso del anticipo de obra, antes del 5 de Diciembre de 2023.
5. Se realiza acta de socialización del proyecto el día 7 de Diciembre de 2023
6. El día 21 de Diciembre de 2023 se suscribe acta e Justificación y Suspensión 1 al contrato de obra pública No. CLPIH383 DE 2023.

b). Actividades Administrativas.

1. se realiza control y seguimiento del personal que ejecuta la obra

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL	CARGO
NESTOR RODRIGO LOSADA	Director de Obra
WILMAR ARMANDO JIMENEZ MARULANDA	Residente de Obra
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS	Sin equipos que requieran seguimiento y control a la fecha.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	Solo se han realizado actividades admirativas.

	CONTROL Y SEGUIMIENTO A APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	Planilla relacionada NRO. DE PLANILLA 9462994590 PENSION: $ 198.000 SALUD: $ 49.600 ARL: $86.200 CCF: $49.600
		FEBRERO 15 DE 2024
	1. El 7 de diciembre de 2023, La Interventoría, junto con el contratista de obra y el apoyo a la supervisión, suscriben acta de concertación y socialización de inicio de obra y acta de conformación de veeduría ciudadana. 2. Durante el mes se siguen presentando las observaciones a los diseños de los planos estructurales y se solicita nuevamente solicitud de suspensión debido a que a la fecha la entidad no ha dado respuesta. 3. La interventoría deja constancia que el contratista de obra no entrega soportes de afiliación del personal en obra y el cumplimiento legal de seguridad industrial y salud ocupacional de Entrega de dotación, alegando que no ha podido iniciar las actividades y, por lo tanto, no ha realizado ninguna actividad contractual.	
c). **Actividades Operativas.**	1. No se llevaron a cabo debido a las inconsistencias encontradas en los diseños de los planos estructurales y en la implantación del proyecto.	
d). **Actividades Logísticos.**	1. Se continúa haciendo seguimiento a las observaciones presentadas en los planos "Estru San Agustín-Vereda Los Andes_E2" el contratista encontró que la cota y despieces de las columnas no coincide con la mostrada en el plano "Estru San Agustín-Vereda Los Andes_E3".	
e). **Obligaciones de Carácter Ambiental.**	1. Se solicita el plan de Manejo ambiental al contratista para verificar su cumplimiento en obra, el contratista no hace entrega del plan de manejo ambiental, debido a que no ha podido iniciar actividades.	
f). **Actividades Financieras.**	1. Se realiza la solicitud del plan de anticipo y la documentación requerida para la gestión del anticipo al contratista de obra para el inicio del proceso de aprobación y gestión por parte de la interventoría.	
g). **Actividades Jurídicos.**	1. Se realiza seguimiento a pólizas y garantías	

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):	AMPARO	VIGENCIA DESDE (D/M/A):	VIGENCIA HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051691		22/11/2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	20/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	20/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	20/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 AÑOS

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):	VIGENCIA DESDE (D/M/A):	VIGENCIA HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S.A	61-40-101018815		22/11/2023	01/11/2023	20/02/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)


ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):	AMPARO	VIGENCIA DESDE (D/M/A):	VIGENCIA HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051691		22/11/2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	20/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	20/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	20/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 AÑOS

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (D/M/A):	VIGENCIA DESDE (D/M/A):	VIGENCIA HASTA (D/M/A):
SEGUROS DEL ESTADO S.A	61-40-101018815		22/11/2023	01/11/2023	20/02/2024

9. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

Las temperaturas máximas diarias son alrededor de 22 °C, rara vez bajan a menos de 20 °C o exceden 24 °C. La temperatura máxima promedio diaria más baja es 22 °C el 20 de noviembre. Las temperaturas mínimas diarias son alrededor de 15 °C, rara vez bajan a menos de 14 °C o exceden 16 °C. La temperatura mínima promedio diaria más baja es 15 °C el 8 de noviembre. Como referencia, el 20 de septiembre, el día más caluroso del año, las temperaturas en San Agustín generalmente varían de 15 °C a 23 °C, mientras que el 5 de julio, el día más frío del año, varían de 15 °C a 22 °C.

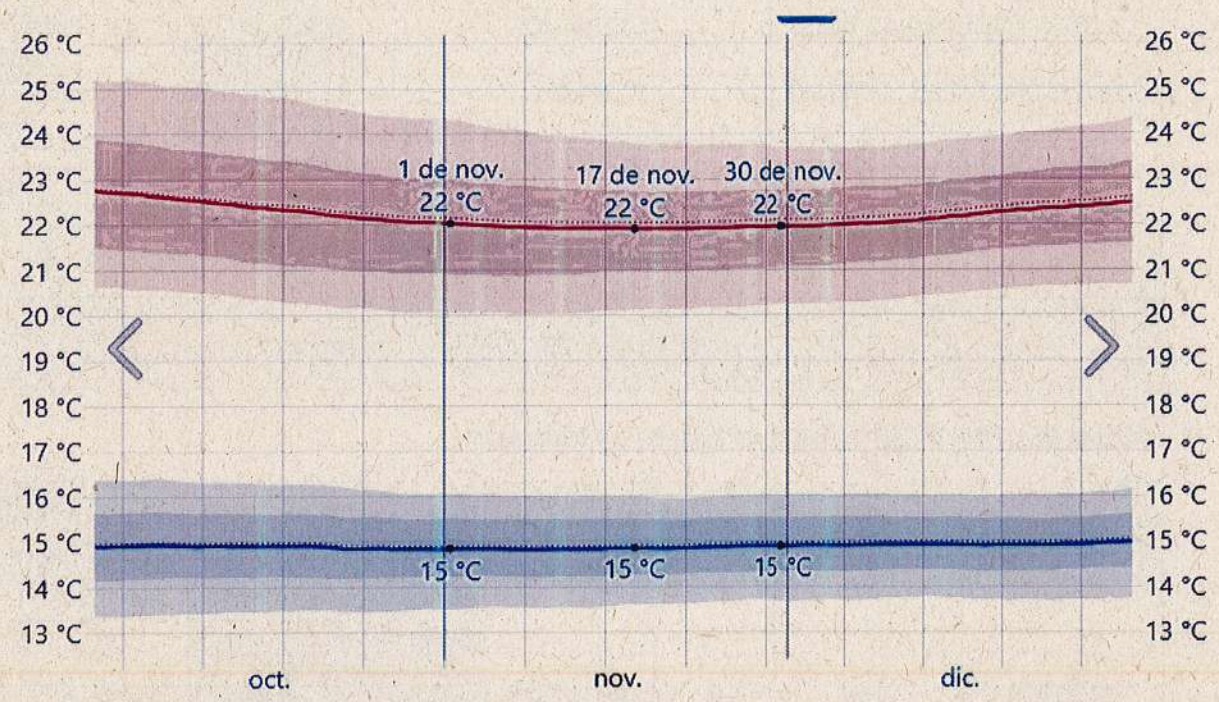

Temperatura máxima y mínima promedio en San Agustín. Tomado de Weather Spark
https://es.weatherspark.com/s/21464/3/Tiempo-promedio-en-el-invierno-en-San-Agust%C3%ADn-Colombia#Figures-Temperature

10. COMITES DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
30-11-2023	INDERHUILA	ACTA DE COMITÉ DE OBRA N 01 (SE ADJUNTA)

11. RELACION DE PERSONAL (Profesional Interventoría)

NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	7.711.430	REPRESENTANTE LEGAL	PRESTACIÓN DE SERVICIO
JOSE WILMER CHILITO	76.320.749	REPRESENTANTE LEGAL	PRESTACIÓN DE SERVICIO
CRISTIAN FABIAN JUNCO AVILA	1.012.354.706	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	PRESTACIÓN DE SERVICIO
JAIME ANDRES CELIS FLORIANO	12.241.491	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	PRESTACIÓN DE SERVICIO
INGRID YOMARA DELGADO RAMOS	1.075.277.887	SECRETARIA	PRESTACIÓN DE SERVICIO

12. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

PÓLIZA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010098	0	09/11/2023	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	09/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	09/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	09/02/2024	09/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	0	Amparo Básico, Predios, Labores y Operaciones	09/11/2023	09/02/2024

PÓLIZA ACTUALIZADA (ANULADA)

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010098	1	21/11/2023	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	09/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	09/02/2027
				Calidad del Servicio	09/02/2024	09/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002028	1	Amparo Básico, Predios, Labores y Operaciones	09/11/2023	09/02/2024

PÓLIZA ACTUALIZADA – INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010098	2	21/11/2023	Cumplimiento del contrato	16/11/2023	16/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/11/2023	16/02/2027
				Calidad del Servicio	16/02/2024	16/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	AMPARO	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002028	2	Amparo Básico, Predios, Labores y Operaciones	16/11/2023	16/02/2024

13. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
(Describir el contenido del plano)

N/A

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TRABAJO DE OBRA

DIAGRAMA DE AVANCE

		CONDICIONES CONTRACTUALES				EJECUCION DE OBRA MENSUAL			ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT.	VR/UNIT	% DE AVANCE	CANT.	VR/TOTAL	% DE AVANCE
1											
1,1	ACTIVIDADES PRELIMINARES										
1.01	Localización y replanteo.	M2	632,32	$ 3.549,00	$ 2.244.104,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%
1.02	Corte de placa de concreto e= 0.10 mts.	ML	62,80	$ 7.544,00	$ 473.763,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%
1.03	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	2,40	$ 26.210,00	$ 62.904,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%
1.04	Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante.	ML	2,10	$ 20.804,00	$ 43.688,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%
1.05	Desmonte marcos canchas existentes.	UND	2,00	$ 116.413,00	$ 232.826,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%
1.06	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	204,04	$ 45.880,00	$ 9.361.355,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%
1.07	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	152,02	$ 83.626,00	$ 12.712.825,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	0%
Subtotal					$ 25.131.465,00		$ -			$ -	0%
2											
2,1	CIMENTACIÓN										
2.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	63,82	$ 33.922,00	$ 2.164.902,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$ 0
2.02	Concreto ciclópeo - 2500 PSI (140 KG/CM2) 60% Concreto 2.000 PSI + 40% Piedra media zoga	M3	21,66	$ 359.045,00	$ 7.776.915,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$ 0
2.03	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	26,71	$ 617.415,00	$ 16.491.155,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$ 0
2.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	1698,00	$ 7.097,00	$ 12.050.706,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$ 0
2.05	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	8,20	$ 740.066,00	$ 6.068.541,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$ 0
2.06	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	KG	612,00	$ 7.097,00	$ 4.343.364,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$ 0
Subtotal					$ 48.895.583,00		$ -			$ -	$ 0
3											
3,1	ESTRUCTURA EN CONCRETO										
3.01	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	14,00	$ 918.378,00	$ 12.857.292,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$ 0
3.02	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	3491,00	$ 7.097,00	$ 24.775.627,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$ 0
3.03	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.	M3	17,00	$ 1.002.201,00	$ 17.037.417,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$ 0
3.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	1756,00	$ 7.097,00	$ 12.462.332,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$ 0
3.05	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	57,76	$ 40.240,00	$ 2.324.262,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$ 0
Subtotal					$ 69.456.930,00		$ -			$ -	$ 0

4											
4,1	CUBIERTA										
4.01	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 20, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	670,93	$ 285.939,00	$ 191.845.053,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
Subtotal					$ 191.845.053,00		$ -			$ -	$0
5											
5,1	ACABADOS - PLACA EN CONCRETO										
5.01	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	317,78	$ 14.758,00	$ 4.689.797,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
5.02	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	2,00	$ 3.700.895,00	$ 7.401.790,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
5.03	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	2,40	$ 84.509,00	$ 202.822,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
5.04	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño.	ML	62,80	$ 83.629,00	$ 5.251.901,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
Subtotal					$ 17.546.310,00		$ -			$ -	$0
6											
6,1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS										
6.01	Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	63,20	$ 79.932,00	$ 5.051.702,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
6.02	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.	ML	20,60	$ 106.806,00	$ 2.200.204,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
6.03	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	30,00	$ 218.470,00	$ 6.554.100,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
6.04	Caja de inspeccion en concreto de F'c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	2,00	$ 349.057,00	$ 698.114,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
Subtotal					$ 14.504.120,00		$ -			$ -	$0
7											
7,1	INSTALACIONES ELECTRICAS										
7.01	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.	UND	2,00	$ 292.572,00	$ 585.144,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
7.02	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	3,00	$ 637.202,00	$ 1.911.606,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
7.03	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	5,12	$ 45.880,00	$ 234.906,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
7.04	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	ML	32,00	$ 49.210,00	$ 1.574.720,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0

7.05	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2,00	$ 303.693,00	$ 607.386,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
7.06	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	2,00	$ 281.525,00	$ 563.050,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
7.07	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1,00	$ 1.014.120,00	$ 1.014.120,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
7.08	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1,00	$ 4.688.701,00	$ 4.688.701,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
7.09	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	ML	16,00	$ 88.300,00	$ 1.412.800,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
7.10	Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12,00	$ 367.987,00	$ 4.415.844,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
7.11	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	60,00	$ 57.998,00	$ 3.479.880,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
7.12	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12,00	$ 1.016.078,00	$ 12.192.936,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 972.420,00	$ 972.420,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
7.14	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 1.032.612,00	$ 1.032.612,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
Subtotal					**$ 34.686.125,00**		**$ -**			**$ -**	**$0**
8											
8,1	**TRANSPORTE**										
8.01	Transporte de materiales petreos	M3-Km	2760,15	$ 1.150,00	$ 3.174.173,00	0,00	$ -	0%	0,00	$ -	$0
Subtotal					**$ 3.174.173,00**		**$ -**	**0%**		**$ -**	**$0**
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 405.239.759**					**$0**	**$0**
AVANCE DE OBRA									**$ 0**		

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

CONSORCIO WF
R.L. ING.FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
INTERVENTORIA

DANES INGENIEROS SAS
ING. NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA
CONTRATISTA

14. REGISTRO FOTOGRAFICO




Fecha: 7 de diciembre de 2023 *– Concertación y socialización de obra, Elección de Veeduría Ciudadana*



Fecha: 7 de diciembre de 2023 *– Concertación y socialización de obra, Elección de Veeduría Ciudadana*



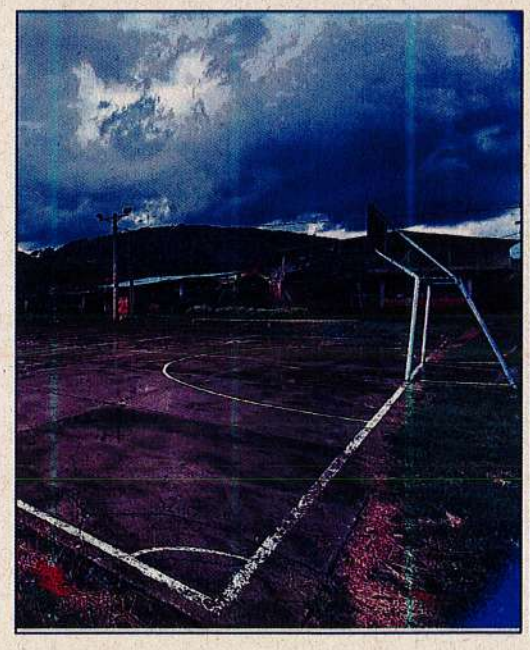



VISITA DE OBRA

15. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

1. Se realiza revisión de planos e implantación del proyecto nuevamente.
2. Se realizan observaciones a los diseños de los planos estructurales y se solicita suspensión.
3. El 7 de Diciembre se realiza la conformación del comité de veeduría con personal del área de influencia y al socialización del contrato.
4. Se continúan con la consecución y entrega de documentos requeridos para el pago de anticipo.
5. El contratista anexo un solo informe correspondiente al periodo 16 de Noviembre al 16 de Diciembre de 2023. No incluye soportes, ya que no ha podido iniciar las actividades y, por lo tanto, no ha realizado ninguna actividad contractual.

Dado lo anterior, el 21 de diciembre se ha decidido suspender temporalmente la ejecución de la obra con el fin de generar los cambios contractuales necesarios y ajustar el alcance del proyecto de acuerdo con las nuevas condiciones encontradas.

R.L. FAVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	(20/02/2024)	ING. CESAR JOAQUIN VELASQUEZ
FIRMA ORIGINAL **INTERVENTOR**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo.Bo APOYO SUPERVISION**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7711430
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 4 9 25 OF 507	TELÉFONO:	8668020
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7907245981	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	27		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/02/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	440940648

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.600	$ 0	$ 185.600	$ 4.600	$ 190.200
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 4.600	$ 190.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 3.600	$ 0	$ 145.000	$ 3.600	$ 0	$ 148.600
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 3.600	$ 0	$ 148.600

Planilla Pagada
aportes en línea SOI
Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																													PENSIÓN							SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 7711430	PERDOMO POLANIA FAIVER EDUARDO	INDEPEND		$ 3.227.300				NO								01-30										230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 338.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7711430
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 4 9 25 OF 507	TELÉFONO:	8668020
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7920151961	TIPO DE PLANILLA:	N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES diciembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	71		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/03/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	527574577
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	7907245981	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	2024/02/06

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:										$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:													$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 28.300	$ 28.300	$ 1.800	$ 0	$ 30.100
SUBTOTALES:									$ 28.300	$ 1.800	$ 0	$ 30.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																														PENSIÓN								SALUD						ARP												
																															FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 7711430	PERDOMO POLANIA FAIVER EDUARDO	INDEPEND		$ 3.227.300				NO							A	D1-30										230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	0	$ 0		$ 0	$ 0																		

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76320749		JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA	INDEPENDIENTE	JOSE WILMER CHILITO RIVADENERIA	CRA 8 CL25N BL G AP 305	POPAYAN-CAUCA	3122879619	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	420212118	9460969549	I	2024/01/11	2024/01/29	NEQUI	18	$417,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: JOSE WILMER CHILITO RIVADENERIA (1 Afiliados)																																										
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																																										
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$411,400
1	CC	76320749	CHILITO JOSE																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
Total			Afiliados(1																				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$411,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76320749		JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA	INDEPENDIENTE	JOSE WILMER CHILITO RIVADENERIA	CRA 8 CL25N BL G AP 305	POPAYAN-CAUCA	3122879619	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	420212118	9460969549	I	2024/01/11	2024/01/29	NEQUI	18	$417,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$3,000	$0	$188,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$3,000	$0	$188,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$ 80,800	$1,800	$0	$82,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$ 80,800	$1,800	$0	$82,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$1,600	$0	$146,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	EPS018	805,001,157	2	1	$145,000	$1,600	$0	$146,600
TOTAL				1	$411,400	$6,400	$0	$417,800

2024/01/29 04:23 PM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7711430
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 4 9 25 OF 507	TELÉFONO:	8666020
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7916968501	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		49			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/02/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		480405999

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.200	$ 0	$ 185.600	$ 8.200	$ 193.800
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 8.200	$ 193.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 6.500	$ 0	$ 145.000	$ 6.500	$ 0	$ 151.500
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 6.500	$ 0	$ 151.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 300	$ 0	$ 6.400
SUBTOTALES:									$ 6.100	$ 300	$ 0	$ 6.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 46.400	$ 2.100	$ 48.500
SUBTOTALES:			$ 46.400	$ 2.100	$ 48.500

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 34.800	$ 1.600	$ 36.400
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 23.200	$ 1.100	$ 24.300
SUBTOTALES:			$ 58.000	$ 2.700	$ 60.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																							PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD						ARP									CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1075277867	DELGADO RAMOS INGRID YOMARA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.160.000	$ 7711430	$ 6.100	30	$ 1.160.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 460.900

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-02-20, 09:41:50 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1066184523

Periodo Cotización: diciembre de 2023 **Periodo Servicio:** enero de 2024

Fecha limite de pago: 2024-01-05

PAGADA 20/02/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO WF				
Documento	NI901769619	**Dirección**	CR 4 #9 - 25 OFICINA 507		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8668020		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	3
Ciudad	NEIVA	**Departamento**	HUILA		
Representante Legal	PERDOMO POLANIA FAIVER EDUARDO	**Identificación**	CC7711430		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1083886304	GIRALDO JIMENEZ JAVIER HUMBERTO	01	00	X															0	26	26	26	26	PORVENIR	$ 1.950.000	$ 312.000	EPS SANITAS	$ 1.950.000	$ 78.000	ARL SURA	$ 1.950.000	$ 135.800	COMFAMILIAR HUILA	$ 1.950.000	$ 78.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 603.800
CC 1012354706	JUNCO AVILA CRISTIAN FABIAN	01	00	X															0	26	26	26	26	COLFONDOS	$ 2.383.334	$ 381.400	EPS SANITAS	$ 2.383.334	$ 95.400	ARL SURA	$ 2.383.334	$ 165.900	COMFAMILIAR HUILA	$ 2.383.334	$ 95.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 736.100
CC 1079174293	POLANIA LEIVA YINA CARIME	01	00	X															0	21	21	21	21	PORVENIR	$ 1.575.000	$ 252.000	EPS SANITAS	$ 1.575.000	$ 63.000	ARL SURA	$ 1.575.000	$ 109.700	COMFAMILIAR HUILA	$ 1.575.000	$ 63.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 487.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 5.908.334	$ 5.908.334	$ 5.908.334	$ 5.908.334	$ 945.400	$ 0	$ 0	$ 236.400	$ 411.400	$ 236.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.829.600	$ 33.000	$ 1.862.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!
