CONTRATO DE OBRA No. CLPIH383 DE 2023

INFORME DE OBRA No. 4

MENSUAL [X] **FINAL** [ ]

Objeto Contrato:

"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA"



MUNICIPIO: **SAN AGUSTÍN**

DEPARTAMENTO: **HUILA**

CONTRATO DE OBRA No. CLPIH383 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y DANES INGENIEROS S.A.S

APOYO A LA SUPERVISIÓN	**XIMENA ADELINDA JIMENEZ ZUÑIGA**	**ENTIDAD**	INDERHUILA

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO


CONTRATO No.	CLPIH383 DE 2023		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA"	**PERIODO DEL INFORME**	Del 01 al 31 de enero de 2025
CONTRATISTA	DANES INGENIEROS S.A.S	**NIT:**	900.219.918-2
REPRESENTANTE LEGAL:	NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA	**C.C:**	7.719.364 DE NEIVA (H)

FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	01/11/2023
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16/11/2023
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:	21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE REINICIO No.1:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSÍ N°1: 12/11/2024	MODIFICACIÓN CLÁUSULA 4 PLAZO DEL CONTRATO – VIGENCIA FISCAL.
OTROSÍ N°2: 27/12/2024	MODIFICACIÓN CLÁUSULA 4 PLAZO DEL CONTRATO – PRÓRROGA DE UN (01) MES. MODIFICACIÓN CLÁUSULA 5 VALOR DEL CONTRATO – VALOR ADICIONAL DE SESENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($62.065.242,00) M/CTE.
PLAZO ADICIONAL:	UN (1) MES
PLAZO TOTAL:	CUATRO (04) MESES
VALOR INICIAL:	$ 506.549.699
VALOR ADICIONAL (27/12/2024):	$ 62.065.242
VALOR TOTAL:	$ 568.614.941

INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	**NIT:**	901.769.619-8
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANÍA	**C.C:**	7.711.430 DE NEIVA (H)

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en la vereda Los Andes zona rural del municipio de San Agustín – Departamento del Huila.

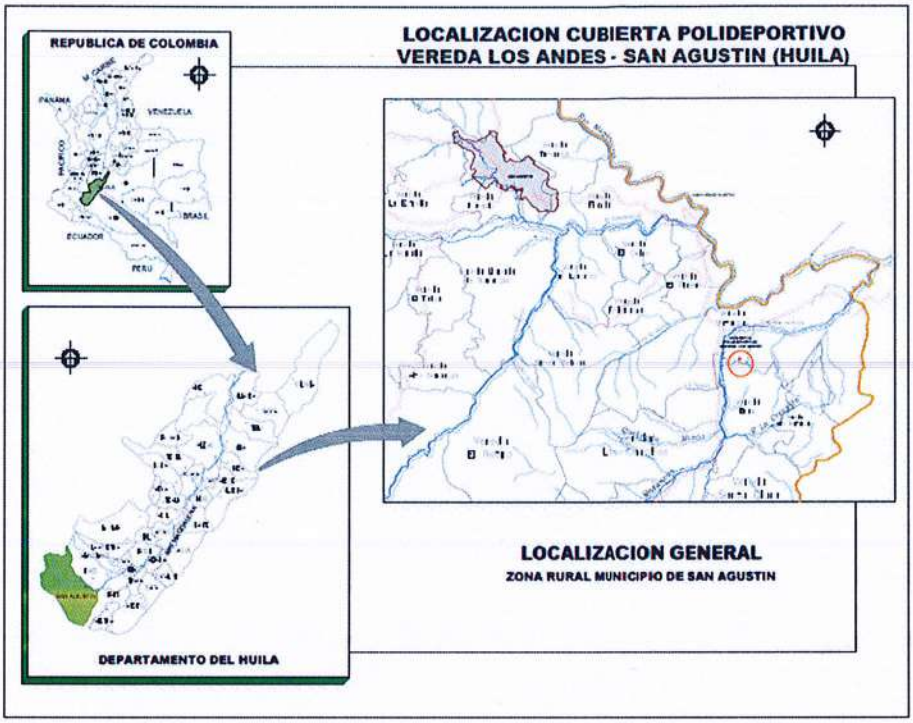

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto arquitectónico contempla un área a intervenir de 632,32 m², en la que se encuentra contemplada la construcción de la cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 20 en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz, para el polideportivo ubicado en la vereda Los Andes del Municipio de San Agustín – Huila, la cual tiene una destinación de uso recreativo, deportivo y cultural; el polideportivo corresponde a estructura de cubierta, iluminación y sistema hidráulico para el manejo de aguas lluvias.

La cubierta será con sistema autoportante, sostenida con columnas en concreto de 3.000 PSI. El sistema estructural propuesto consiste en columnas y vigas aéreas en concreto reforzado en 3.000 PSI y una cimentación tipo zapatas, vigas de cimentación y viga canal. Todas las obras atienden lo establecido en la NORMA SISMORRESISTENTE de 2010 – NSR-10.

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

- ACTIVIDADES PRELIMINARES
- CIMENTACIÓN
- ESTRUCTURA EN CONCRETO

- CUBIERTA
- ACABADOS – PLACA DE CONCRETO
- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
- INSTALACIONES ELÉCTRICAS
- TRANSPORTE

4. INFORME CONCRETO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DURANTE EL PERIODO

Integrantes de la Junta de Acción Comunal – JAC, habitantes de la vereda Los Andes y de las veredas cercanas, realizan acompañamiento permanente a las actividades de obra. Manifiestan con agrado el esfuerzo realizado por el contratista y el personal de la obra para llevar a cabo la construcción de la cubierta y especialmente el desplazamiento de la maquinaria necesaria para esa labor dadas las condiciones climáticas (fuertes lluvias), que han afectado la vía de acceso a la obra.

Muestran el agradecimiento por tan importante proyecto que se desarrolla en la vereda y que brindará muchos beneficios a toda la comunidad. Estas visitas periódicas a la obra, permiten constatar la construcción y el avance, realizando de esta manera control y vigilancia al proyecto en ejecución.

5. HISTORIA CRONOLÓGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa)
Iniciación	16/11/2023	**35**		
Suspensión No. 1	21/12/2023		327	
Reiniciación No. 1	12/11/2024	**80**		
Otrosí No. 2	27/12/2024			
TERMINACIÓN Cto.				05/02/2025
TOTAL DÍAS	**AL 31/12/2024**	**115**	**327**	

6. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
Inicio		16/11/2023
Justificación de Suspensión	1	21/12/2023

Suspensión	1	21/12/2023
Justificación para el Reinicio	2	12/11/2024
Reinicio	1	12/11/2024
Justificación Otrosí	3	12/11/2024
Otrosí	1	12/11/2024
Justificación Otrosí	4	27/12/2024
Otrosí	2	27/12/2024
Acta Parcial	1	20/01/2025

7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

a). **Actividades administrativas**	- Acta parcial No. 1 - Capacitaciones en obra - Pago aportes de seguridad social del personal
b.) **Actividades operativas**	ACTIVIDADES PRELIMINARES - Suministro y proveimiento de materiales para las actividades propias de la obra - Demolición de las cunetas en concreto existentes que se ubicaban a cada lado de la cancha del polideportivo - Desmonte de los dos (2) marcos de las canchas existentes ESTRUCTURA EN CONCRETO - Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI, y Acero de refuerzo Fy=60.000 PSI para viga canal. Se realiza el armado de la estructura de soporte para la formaleta de la viga canal del **EJE B**, utilizando gatos, cerchas y camillas; luego, y se realiza el armado del acero que conforma la misma viga canal (incluyendo flejes de la viga y aceros para la pestaña del canal), siguiendo los diseños estructurales para tal fin. Seguidamente, se instala formaleta en madera dando forma a la viga canal, de acuerdo a los diseños; finalmente, se vierte el concreto haciendo uso del vibrador eléctrico para concreto con el fin de eliminar el aire o vacíos existentes dentro de la mezcla y así lograr una mayor compactación de la misma. Al concreto se le adiciona acelerante SikaSet L, con el fin de disminuir el tiempo de curado; luego se procede a retirar la formaleta y la estructura que lo soporta. - Suministro e instalación de manto zetal viga canal. Con el fin de impermeabilizar las vigas canal de los EJES A y B, se instala manto zetal siguiendo las especificaciones técnicas dadas por el proveedor y de esta manera lograr su mayor efectividad.

	CUBIERTA - Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 20, en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintura poliéster estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz. Una vez alcanzada la resistencia óptima del concreto acelerado de la viga canal en ambos ejes de la estructura, y luego de solventar las fuertes lluvias presentadas en la zona, se logra trasladar todo el equipo y maquinaria hasta el sitio de obra con el fin de fabricar e instalar la cubierta auto soportante, conforme a los diseños aprobados para esta actividad. ACABADOS - PLACA EN CONCRETO - Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño. Se construyen cunetas a lado y lado de la placa del polideportivo a lo largo de los ejes A y B, manteniendo una pendiente del 0.5% la cual permite una adecuada evacuación del agua lluvia recolectada por la cubierta instalada. - Rejillas prefabricadas para cunetas. Sobre las cuentas, son instaladas rejillas prefabricadas en concreto, con el fin de proteger la integridad de las personas que hacen uso del escenario deportivo evitando que caigan en las cunetas. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - Bajantes en tubería PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagües y bajantes de aguas lluvias. Se realiza la instalación de los bajantes de aguas lluvias para la cubierta según el diseño y planos hidrosanitarios del proyecto, garantizando su correcto anclaje a la estructura y correspondiente drenaje hacia la cuneta en concreto sobre el piso. - Suministro e instalación de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagües. Se realiza la instalación de tubería que conecta las dos cajillas de recolección de aguas lluvias, según los diseños y planos suministrados por la entidad contratante para el proyecto. - Suministro e instalación de tubería PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida. Con el fin de evacuar el agua lluvia recolectada en la cajilla, se instala tubería para evacuar el agua hasta un drenaje natural existente para dar una entrega correcta sin causar daños a los vecinos del escenario. - Caja de inspección en concreto de F´c=2500 PSI, de sección 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms, con espesores de paredes de 0.10 mts. según diseño. Se realiza la construcción de las dos cajillas de recolección de aguas lluvias ubicadas en los costados de la cancha multifuncional (Eje A y B), las cuales recolectan y redirigen el agua lluvia proveniente de las cunetas de recolección en concreto hasta su entrega final. INSTALACIONES ELÉCTRICAS - Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor. Se construyen tres cajas de inspección de alumbrado público: una en la base del posta donde se instala el medidor, y las otras dos, al inicio de los Ejes A y B. Las tapas son construidas en concreto con marco metálico en ángulo, ya que la lámina alfajor no cumple con las especificaciones técnicas para este tipo de cajillas.

	- Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada. Se realizan las brechas o excavaciones que permitan disponer la tubería eléctrica que va bajo tierra. - Canalización en ductos conduit PVC tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts. Son instalados los ductos para baja tensión en las brechas y luego se tapan con el fin de protegerlas de futuros daños. - Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2". Se pasa la red subterránea en PVC a red aérea en tubo IMC, que conduce del poste del medidor hasta la caja de automáticos. - Transición aérea-subterránea tubería IMC 1". La red que une los Ejes A y B es subterránea en PVC y luego pasa a red aérea en tubo IMC, las cuales llevaran los cables de la iluminación del escenario. - Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste. Se realiza la instalación del cableado desde la red existente hasta el medidor, el cual es instalado en poste. - Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna. Se instala el cableado y la caja de distribución en la columna A6, para controles de los reflectores y los tomacorrientes. - Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu. Se instala cableado en la los ductos PVC subterráneos para la red de distribución principal. - Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector. Conforme a los diseños eléctricos del proyecto, se instalan los brazos galvanizados en cada columna sobre los cuales se fijan los reflectores. - Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores. Se realiza la instalación del cableado en los tubos IMC para el montaje de los reflectores. - Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v. Se instala tomacorriente a 120 v, en la columna A6 por encima de la caja de distribución. - Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v. Se instala tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v, en la columna A6 por encima de la caja de distribución. - Reubicación de postes eléctricos en concreto. Son reubicados en sitios seguros, dos postes que se encontraban cerca al escenario deportivo.

8. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

El clima durante el periodo de ejecución del presente informe (mes de enero de 2025) ha sido principalmente lluvioso con precipitaciones moderadas a altas dada la ubicación del proyecto, que han afectado el rendimiento de las actividades. Se anexa formato de estado del tiempo para el periodo.

CONTROL DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO


MES ENERO - 2025 CONTRATO No. CLPIH383-2024 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA DANES INGENIEROS S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	ENERO DE 2025																													
DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Clase de tiempo																															
Seco	16	15	14	13	14	9	24	19	21	24	18	24	21	24	24	24	20	22	22	24	24	24	24	18	14	11	17	20	9	19	15
Lluvias moderadas	6	5	7	6	8	11	0	3	3	0	4	0	3	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	4	7	10	5	3	12	4	7
Lluvias intensas	2	4	3	5	2	4	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	3	3	2	1	3	1	2

NOTA: EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

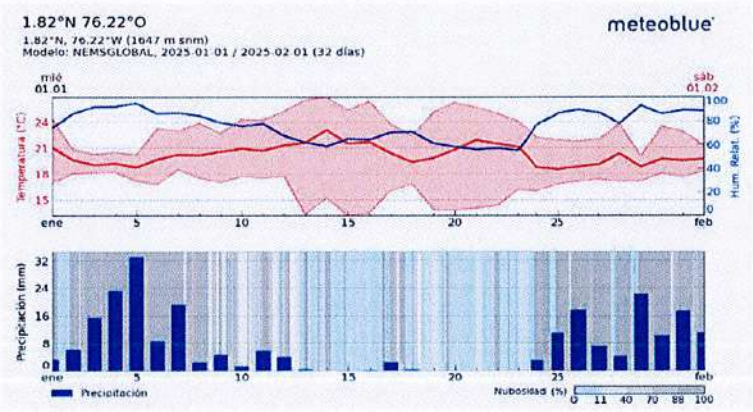

9. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Tipo Prueba de Laboratorio	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
Diseños de mezcla para los concretos.	2500 PSI y 3000 PSI	
Diseños de mezcla para base.	*N.A.*	
Compresión simple al concreto.	3000 PSI	
Ensayo de compactación de campo	*N.A.*	

NOTA: *Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Articulo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.*

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
			7	14	28			
ZAPATAS EJE A	07/12/2024	14/12/2024	X			2100 PSI	2109 PSI	CUMPLE
		21/12/2024		X		2700 PSI	2746 PSI	
		04/01/2025			X	3000 PSI	3124 PSI	
ZAPATAS EJE B	07/12/2024	14/12/2024	X			2100 PSI	2087 PSI	CUMPLE
		21/12/2024		X		2700 PSI	2761 PSI	
		04/01/2025			X	3000 PSI	3087 PSI	
PEDESTAL COLUMNA EJE A	10/12/2024	07/12/2024	X			2100 PSI	2110 PSI	CUMPLE
		24/12/2024		X		2700 PSI	2784 PSI	
		07/01/2024			X	3000 PSI	3114 PSI	
PEDESTAL COLUMNA EJE B	10/12/2024	07/12/2024	X			2100 PSI	2097 PSI	CUMPLE
		24/12/2024		X		2700 PSI	2723 PSI	
		07/01/2024			X	3000 PSI	3060 PSI	
VIGA DE CIMENTACIÓN EJE A	12/12/2024	19/12/2024	X			2100 PSI	2300 PSI	CUMPLE
		26/12/2024		X		2700 PSI	2744 PSI	
		09/01/2025			X	3000 PSI	3095 PSI	
VIGA DE CIMENTACIÓN EJE B	13/12/2024	20/12/2024	X			2100 PSI	2291 PSI	CUMPLE
		27/12/2024		X		2700 PSI	2737 PSI	
		10/01/2025			X	3000 PSI	3113 PSI	
COLUMNA EJE A	19/12/2024	26/12/2024	X			2100 PSI	2291 PSI	CUMPLE
		02/01/2025		X		2700 PSI	2745 PSI	
		16/01/2025			X	3000 PSI	3108 PSI	
COLUMNA EJE B	20/12/2024	27/12/2024	X			2100 PSI	2272 PSI	CUMPLE
		03/01/2025		X		2700 PSI	2719 PSI	
		17/01/2025			X	3000 PSI	3077 PSI	
VIGA CANAL EJE A	27/12/2024	03/01/2025	X			2100 PSI	2258 PSI	CUMPLE
		10/01/2025		X		2700 PSI	2721 PSI	
		24/01/2025			X	3000 PSI	3093 PSI	
VIGA CANAL EJE B	10/01/2025	17/01/2025	X			2100 PSI	2273 PSI	CUMPLE
		24/01/2025		X		2700 PSI	2720 PSI	

10. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor	Amortización	Valor pagado
Valor Contrato	01/11/2023	$ 506.549.699		
Valor Anticipo (25%)	27/11/2024	$ 126.637.424,75		$ 126.637.424,75
Valor Adicional 1	27/12/2024	$ 62.065.242		
Acta Parcial No. 1	20/01/2025	$ 461.971.838,00	$ 102.892.907,61	NO SE HA PAGADO
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 506.549.699	$ 62.065.242	$ 568.614.941	$ 534.388.485,00	$ 34.226.456,00

11. COMITÉS DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
23/01/2025	OBRA	Socialización y avance de obra, de acuerdo a la aprobación de acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos.

12. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD (dd/mm/aaaa)	No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)	FORMATO (Físico/Digital)
Pólizas de cumplimiento (Endoso No. 0)	03/11/2023	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas R.C. (Endoso No. 0)	03/11/2023	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso No. 1)	22/11/2023	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas R.C. (Endoso No. 1)	22/11/2023	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso No. 2)	20/11/2024	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas R.C. (Endoso No. 2)	20/11/2024	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso No. 3)	29/01/2025	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas R.C. (Endoso No. 3)	21/11/2024	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso No. 4)	29/01/2025	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas R.C. (Endoso No. 4)	29/01/2025	S. N	FÍSICO Y DIGITAL

13. RELACIÓN DE PERSONAL (Profesional y Mano de obra)

NOMBRE Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA.	C.C. 7.719.364	DIRECTOR DE OBRA	INDEFINIDO
WILMAR ARMANDO JIMÉNEZ MARULANDA	C.C. 80.926.744	COORDINADOR	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO	C.C. 1.057.304.693	RESIDENTE DE OBRA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CRISTIAN CAMILO LÓPEZ CORDOBA	C.C. 1.075.220.858	RESIDENTE SISO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OSCAR ALEXANDER ZULUAGA	C.C. 76.006.590	MAESTRO DE OBRA	CONTRATO OBRA LABOR
SILVIO QUIÑONEZ SAMBONI	C.C. 1.061.986.149	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO OBRA LABOR
EMIRO SAMBONI MUÑOZ	C.C. 1.061.985.551	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO OBRA LABOR
ROBINSON ARCOS TORRES	C.C. 1.082.772.137	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO OBRA LABOR
WILLIAM ESTIVEN ARCOS HOYOS	C.C. 1.082.772.716	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO OBRA LABOR
JORGE ARMANDO HOYOS PAZ	C.C. 1.082.774.946	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO OBRA LABOR
OSCAR IVÁN GUALÍ CUELLAR	C.C. 1.081.392.872	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO OBRA LABOR

14. RELACIÓN DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA
Anticipo	S.N.	27/12/2024

15. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
ENERO DE 2024							
NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA	$277.800	$57.000	$7.500	$57.000	EXONERADO	9480094655 9481408682	09/01/2025 06/02/2025
WILMAR ARMANDO JIMÉNEZ MARULANDA	$277.800	$57.000	$99.100	$57.000	EXONERADO	9480094655 9481408682	09/01/2025 06/02/2025
JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO	$227.800	$178.000	$99.100	$0	EXONERADO	9481729478	21/02/2025

CRISTIAN CAMILO LÓPEZ CÓRDOBA	$277.800	$57.000	$99.100	$57.000	EXONERADO	9480094655 9481408682	09/01/2025 06/02/2025
OSCAR ALEXANDER ZULUAGA	$220.200	$55.100	$95.800	$50.300	EXONERADO	9481408682	06/02/2025
SILVIO QUIÑONEZ SAMBONI	$41.600 $45.600	$10.400 $11.400	$18.100 $19.900	$10.400 $10.400	EXONERADO	9480094655 9481408682	09/01/2025 06/02/2025
EMIRO SAMBONI MUÑOZ	$34.700 $45.600	$8.700 $11.400	$15.100 $19.900	$8.700 $10.400	EXONERADO	9480094655 9481408682	09/01/2025 06/02/2025
ROBINSON ARCOS TORRES	$48.600 $53.200	$12.200 $13.300	$21.200 $23.200	$12.200 $12.200	EXONERADO	9480094655 9481408682	09/01/2025 06/02/2025
WILLIAM ESTIVEN ARCOS HOYOS	$55.500 $53.200	$13.900 $13.300	$24.200 $23.200	$13.900 $12.200	EXONERADO	9480094655 9481408682	09/01/2025 06/02/2025
JORGE ARMANDO HOYOS PAZ	$48.600 $53.200	$12.200 $13.300	$21.200 $23.200	$12.200 $12.200	EXONERADO	9480094655 9481408682	09/01/2025 06/02/2025
OSCAR IVÁN GUALÍ CUELLAR	$64.800	$17.100	$29.800	$17.100	EXONERADO	9481408682	06/02/2025

16. RELACIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍA

Póliza legalización del CONTRATO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051691	0	02/11/2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	20/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	20/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	20/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 años desde acta de recibo final

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018815	0	02/11/2023	01/11/2023	20/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051691	1	22/11/2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	20/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	20/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	20/02/2027

				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 años desde acta de recibo final

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018815	1	22/11/2023	01/11/2023	20/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE REINICIO No. 1:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051691	2	20/11/2024	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	10/07/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	10/07/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	10/01/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 años desde acta de recibo final

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018815	2	20/11/2024	01/11/2023	24/01/2025

Póliza actualizada OTROSÍ No. 2

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051691	3	29/01/2025	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	10/07/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	10/07/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	10/01/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 años desde acta de recibo final

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018815	3	21/11/2024	01/11/2023	04/02/2025

Póliza actualizada x ACLARACIÓN OTROSÍ No. 2



PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)


ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051691	4	29/01/2025	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	10/08/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	10/08/2025

				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	10/02/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 años desde acta de recibo final

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018815	4	29/01/2025	01/11/2023	04/03/2025

17. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	18. REGISTRO FOTOGRÁFICO
PRELIMINARES Demolición de las cunetas en concreto existentes que se ubicaban a cada lado de la cancha del polideportivo	 
Desmonte de los dos (2) marcos de las canchas existentes	 
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Construcción de vigas canal Eje B (aceros y concreto)  	    

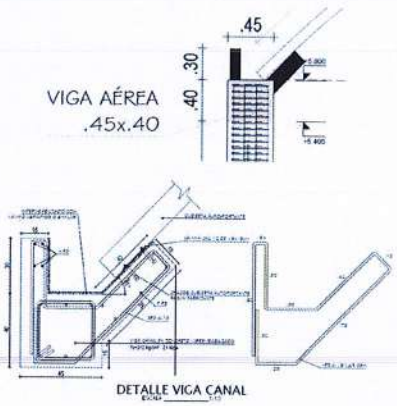






Suministro e instalación de manto zetal viga canal.



CUBIERTA

Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 20, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.














<table>
<tr><td></td><td>  
 </td></tr>
<tr><td>ACABADOS - PLACA EN CONCRETO
Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño.
</td><td>   </td></tr>
<tr><td>Rejillas prefabricadas para cunetas.</td><td>   </td></tr>
<tr><td>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
Bajantes en tubería PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagües y bajantes de aguas lluvias.
</td><td>  </td></tr>
</table>

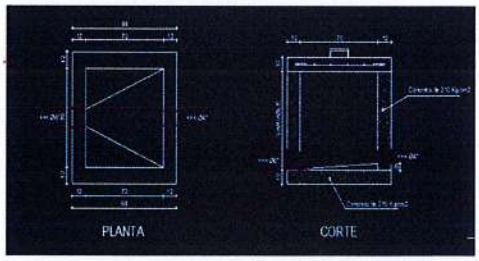	
Suministro e instalación de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagües. 	 
Suministro e instalación de tubería PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida. 	 
Caja de inspección en concreto de F´c=2500 PSI, de sección 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts . según diseño. 	   

INSTALACIONES ELÉCTRICAS


Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.

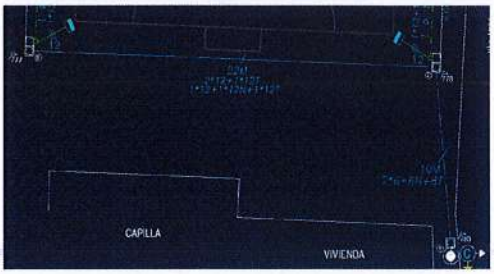








Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.








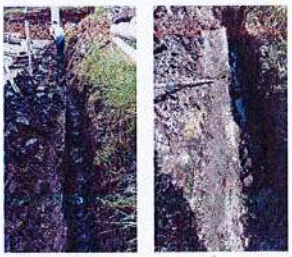




Canalización en ductos conduit PVC tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.



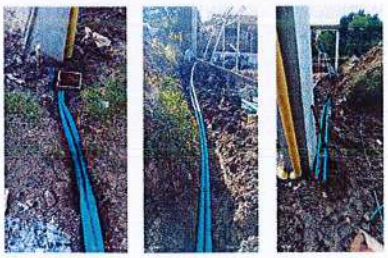

Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2" 	 
Transición aérea-subterránea tubería IMC 1" 	 
Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste. 	  
Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna. 	 

Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	 
Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector. 	 
Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores. 	  
Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v. 	 

Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v. 	 
Reubicación de postes eléctricos en concreto	   

19. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES OTROSI 2 DEL 27/12/2024		EJECUCIÓN OBRA PRESENTE INFORME			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	% EJECUCIÓN	CANT.	VR/TOTAL	% EJECUCIÓN
1													
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
1.01	Localización y replanteo.	M2	632,32	$ 3.549,00	$ 2.244.104,00	733,21	$ 2.602.162,29	0,00	$ 0,00	0,00%	733,21	$ 2.602.162,29	100,00%
1.02	Demolición cuneta existente	ML	62,80	$ 7.544,00	$ 473.763,00	60,80	$ 458.675,20	60,80	$ 458.675,20	100,00%	60,80	$ 458.675,20	100,00%
1.03	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	2,40	$ 26.210,00	$ 62.904,00	27,97	$ 733.093,70	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
1.04	Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante.	ML	2,10	$ 20.804,00	$ 43.688,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
1.05	Desmonte marcos canchas existentes.	UND	2,00	$ 116.413,00	$ 232.826,00	2,00	$ 232.826,00	2,00	$ 232.826,00	100,00%	2,00	$ 232.826,00	100,00%
1.06	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	204,04	$ 45.880,00	$ 9.361.355,00	280,23	$ 12.856.952,40	0,00	$ 0,00	0,00%	280,23	$ 12.856.952,40	100,00%
1.1.7	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.	M3	152,02	$ 83.626,00	$ 12.712.825,00	102,30	$ 8.554.939,80	0,00	$ 0,00	0,00%	102,30	$ 8.554.939,80	100,00%
Sub-total					**$ 25.131.465,00**		**$ 25.438.649,39**		**$ 691.501,20**			**$ 24.705.555,69**	
2													
2.1	CIMENTACIÓN												
2.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	63,82	$ 33.922,00	$ 2.164.902,00	21,60	$ 732.715,20	0,00	$ 0,00	0,00%	21,60	$ 732.715,20	100,00%
2.02	Concreto ciclópeo - 2500 PSI (140 KG/CM2) 60% Concreto 2.000 PSI + 40% Piedra media zonga	M3	21,66	$ 359.045,00	$ 7.776.915,00	29,94	$ 10.749.807,30	0,00	$ 0,00	0,00%	29,94	$ 10.749.807,30	100,00%
2.03	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	26,71	$ 617.415,00	$ 16.491.155,00	38,92	$ 24.029.791,80	0,00	$ 0,00	0,00%	38,92	$ 24.029.791,80	100,00%
2.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	1.698,00	$ 7.097,00	$ 12.050.706,00	2.789,00	$ 19.793.533,00	0,00	$ 0,00	0,00%	2789,00	$ 19.793.533,00	100,00%
2.05	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	8,20	$ 740.066,00	$ 6.068.541,00	11,20	$ 8.288.739,20	0,00	$ 0,00	0,00%	11,20	$ 8.288.739,20	100,00%

2.06	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	KG	612,00	$ 7.097,00	$ 4.343.364,00	1.029,20	$ 7.304.232,40	0,00	$ 0,00	0,00%	1029,20	$ 7.304.232,40	100,00%
Sub-total					**$ 48.895.583,00**		**$ 70.898.818,90**		**$ 0,00**			**$ 70.898.818,90**	
3													
3.1	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**												
3.01	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	14,00	$ 918.378,00	$ 12.857.292,00	16,72	$ 15.355.280,16	0,00	$ 0,00	0,00%	16,72	$ 15.355.280,16	100,00%
3.02	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	3.491,00	$ 7.097,00	$ 24.775.627,00	2.955,17	$ 20.972.841,49	0,00	$ 0,00	0,00%	2955,17	$ 20.972.841,49	100,00%
3.03	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.	M3	17,00	$ 1.002.201,00	$ 17.037.417,00	16,37	$ 16.406.030,37	8,19	$ 8.203.015,19	50,00%	16,37	$ 16.406.030,37	100,00%
3.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	1.756,00	$ 7.097,00	$ 12.462.332,00	2.096,44	$ 14.878.434,68	1.048,22	$ 7.439.217,34	50,00%	########	$ 14.878.434,68	100,00%
3.05	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	57,76	$ 40.240,00	$ 2.324.262,00	60,80	$ 2.446.592,00	60,80	$ 2.446.592,00	100,00%	60,80	$ 2.446.592,00	100,00%
Sub-total					**$ 69.456.930,00**		**$ 70.059.178,70**		**$ 18.088.824,53**			**$ 70.059.178,70**	
4													
4.1	**CUBIERTA**												
4.01	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 20, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	670,93	$ 285.939,00	$ 191.845.053,00	690,38	$ 197.406.566,82	690,38	$ 197.406.566,82	100,00%	690,38	$ 197.406.566,82	100,00%
Sub-total					**$ 191.845.053,00**		**$ 197.406.566,82**		**$ 197.406.566,82**			**$ 197.406.566,82**	
5													
5.1	**ACABADOS - PLACA EN CONCRETO**												
5.01	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	317,78	$ 14.758,00	$ 4.689.797,00	317,78	$ 4.689.797,24	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%

5.02	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	2,00	$ 3.700.895,00	$ 7.401.790,00	2,00	$ 7.401.790,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
5.03	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	2,40	$ 84.509,00	$ 202.822,00	27,97	$ 2.363.547,71	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
5.04	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño.	ML	62,80	$ 83.629,00	$ 5.251.901,00	62,80	$ 5.251.901,20	62,80	$ 5.251.901,20	100,00%	62,80	$ 5.251.901,20	100,00%
NP-5.05	Rejillas prefabricadas para cunetas.	ML		$ 159.779,00	$ 0,00	60,80	$ 9.714.563,20	60,80	$ 9.714.563,20	100,00%	60,80	$ 9.714.563,20	100,00%
Sub-total					**$ 17.546.310,00**		**$ 29.421.599,35**		**$ 14.966.464,40**			**$ 14.966.464,40**	
6													
6.1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**												
6.01	Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	63,20	$ 79.932,00	$ 5.051.702,00	63,20	$ 5.051.702,40	63,20	$ 5.051.702,40	100,00%	63,20	$ 5.051.702,40	100,00%
6.02	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.	ML	20,60	$ 106.806,00	$ 2.200.204,00	20,60	$ 2.200.203,60	20,60	$ 2.200.203,60	100,00%	20,60	$ 2.200.203,60	100,00%
6.03	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	30,00	$ 218.470,00	$ 6.554.100,00	30,00	$ 6.554.100,00	30,00	$ 6.554.100,00	100,00%	30,00	$ 6.554.100,00	100,00%
6.04	Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	2,00	$ 349.057,00	$ 698.114,00	2,00	$ 698.114,00	2,00	$ 698.114,00	100,00%	2,00	$ 698.114,00	100,00%
Sub-total					**$ 14.504.120,00**		**$ 14.504.120,00**		**$ 14.504.120,00**			**$ 14.504.120,00**	
7													
7.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**												
7.01	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.	UND	2,00	$ 292.572,00	$ 585.144,00	3,00	$ 877.716,00	0,00	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 877.716,00	100,00%

7.02	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	3,00	$ 637.202,00	$ 1.911.606,00	3,00	$ 1.911.606,00	3,00	$ 1.911.606,00	100,00%	3,00	$ 1.911.606,00	100,00%
7.03	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	5,12	$ 45.880,00	$ 234.906,00	5,12	$ 234.905,60	5,12	$ 234.905,60	100,00%	5,12	$ 234.905,60	100,00%
7.04	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	ML	32,00	$ 49.210,00	$ 1.574.720,00	32,00	$ 1.574.720,00	32,00	$ 1.574.720,00	100,00%	32,00	$ 1.574.720,00	100,00%
7.05	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2,00	$ 303.693,00	$ 607.386,00	2,00	$ 607.386,00	2,00	$ 607.386,00	100,00%	2,00	$ 607.386,00	100,00%
7.06	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	2,00	$ 281.525,00	$ 563.050,00	2,00	$ 563.050,00	2,00	$ 563.050,00	100,00%	2,00	$ 563.050,00	100,00%
7.07	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1,00	$ 1.014.120,00	$ 1.014.120,00	1,00	$ 1.014.120,00	1,00	$ 1.014.120,00	100,00%	1,00	$ 1.014.120,00	100,00%
7.08	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1,00	$ 4.688.701,00	$ 4.688.701,00	1,00	$ 4.688.701,00	1,00	$ 4.688.701,00	100,00%	1,00	$ 4.688.701,00	100,00%
7.09	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	ML	16,00	$ 88.300,00	$ 1.412.800,00	35,00	$ 3.090.500,00	35,00	$ 3.090.500,00	100,00%	35,00	$ 3.090.500,00	100,00%
7.10	Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12,00	$ 367.987,00	$ 4.415.844,00	12,00	$ 4.415.844,00	12,00	$ 4.415.844,00	100,00%	12,00	$ 4.415.844,00	100,00%
7.11	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	60,00	$ 57.998,00	$ 3.479.880,00	102,80	$ 5.962.194,40	102,80	$ 5.962.194,40	100,00%	102,80	$ 5.962.194,40	100,00%
7.12	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12,00	$ 1.016.078,00	$ 12.192.936,00	12,00	$ 12.192.936,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 972.420,00	$ 972.420,00	1,00	$ 972.420,00	1,00	$ 972.420,00	100,00%	1,00	$ 972.420,00	100,00%
7.14	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 1.032.612,00	$ 1.032.612,00	1,00	$ 1.032.612,00	1,00	$ 1.032.612,00	100,00%	1,00	$ 1.032.612,00	100,00%
NP-7.15	Reubicación de postes eléctricos en concreto	UND		$ 968.000,00	$ 0,00	2,00	$ 1.936.000,00	2,00	$ 1.936.000,00	100,00%	2,00	$ 1.936.000,00	100,00%
Sub-total					**$ 34.686.125,00**		**$ 41.074.711,00**		**$ 28.004.059,00**			**$ 28.881.775,00**	

8													
8.1	**TRANSPORTE**												
8.01	Transporte de materiales petreos	M3-Km	2.760,15	$ 1.150,00	$ 3.174.173,00	5.294,18	$ 6.088.307,00	0,00	$ 0,00	0,00%	#######	$ 6.088.307,00	100,00%
Sub-total					**$ 3.174.173,00**		**$ 6.088.307,00**		**$ 0,00**			**$ 6.088.307,00**	
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 405.239.759,00**		**$ 454.891.951,00**		**$ 273.661.535,00**	**60,16%**		**$ 427.510.787,00**	**93,98%**
	Administración	20%			$ 81.047.952,00		$ 90.978.390,00		$ 54.732.307,00	60,16%		$ 85.502.157,00	93,98%
	Imprevistos	1%			$ 4.052.398,00		$ 4.548.920,00		$ 2.736.615,00	60,16%		$ 4.275.108,00	93,98%
	Utilidad	4%			$ 16.209.590,00		$ 18.195.678,00		$ 10.946.461,00	60,16%		$ 17.100.431,00	93,98%
	VALOR TOTAL				**$ 506.549.699,00**		**$ 568.614.941,00**		**$ 342.076.919,00**	**60,16%**		**$ 534.388.485,00**	**93,98%**
	% AVANCE DE OBRA									**60,16%**			**93,98%**

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA
DIRECTOR DE OBRA
DANES INGENIEROS S.A.S.

ING. JAVIER HUMBERTO GIRALDO JIMENEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO WF

1. ANEXOS

- INFORME HSEQ
- RESULTADO DE ENSAYOS Y PRUEBA DE LABORATORIO
- BITÁCORA DE OBRA
- REGISTRO DEL TIEMPO EN EL SITIO DE OBRA
- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP).
- CERTIFICADO VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA REALIZADO POR EL INTERVENTOR (Vo.Bo. Interventor).
- ENTREGAR UN CD CON LA COPIA DIGITALIZADA DE TODO EL INFORME Y SUS ANEXOS.

ING. NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA	8/01/2025	**ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA**
FIRMA ORIGINAL **DIRECTOR DE OBRA**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo.Bo INTERVENTOR**

ANEXOS

Informe 4

INFORME No. 3

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SGSST

Contrato de obra No.

CLPIH383 DE 2023

Periodo:

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025

Objeto Contrato:

"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN – DEPARTAMENTO DEL HUILA"

REVISÓ Y APROBÓ	
FIRMA	
NOMBRE	NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA
CARGO	Director de Obra
ELABORÓ	
FIRMA	
NOMBRE	CRISTIAN CAMILO LÓPEZ CÓRDOBA
CARGO	Residente SISO

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. OBJETIVOS 6
2.1 OBJETIVO GENERAL 6
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6
3. CONTRATO DE OBRA 7
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 7
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 8
5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 9
6. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO 10
6.1 AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL (EPS, ARL, AFP) 10
6.2 EXÁMENES MEDICO OCUPACIONALES 12
6.3 INDUCCIONES EN SST 12
6.4 ENTREGA DE EPP 13
6.5 CHARLAS PREOPERACIONALES 13
6.6 DILIGENCIAMIENTO DE ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - ATS 15
6.7 INDICADORES DE SEGUIMIENTO 15
7. ACTAS DE VECINDAD 18
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 19
9. ANEXOS 21
ANEXO 1. Pago de seguridad social
ANEXO 2. Exámenes ocupacionales de ingreso
ANEXO 3. Inducciones
ANEXO 4. Entrega de EPP
ANEXO 5. Charlas preoperacionales
ANEXO 6. Análisis de Trabajo Seguro – ATS

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información del contrato de obra 7

Tabla 2. Personal vinculado al proyecto 11

Tabla 3. Charlas preoperacionales 14

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización del área de intervención 8

Ilustración 2. Panorámica Polideportivo Vda. Los Andes – San Agustín, antes de la Intervención..... 8

Ilustración 3. Entrega de EPP a personal de obra..... 13

Ilustración 4. Charlas pre operacionales a personal de obra 14

1. INTRODUCCIÓN

Este documento se presenta para dar cumplimiento a la normatividad contractual en lo correspondiente a la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para el proyecto de la *"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA"*.

El informe mensual No. 3 corresponde al periodo comprendido entre el 01 y el 31 de enero de 2025. Allí se presentan las generalidades de la gestión adelantada referente a las medidas de manejo implementadas en el periodo de ejecución de las obras.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Presentar los registros de cumplimiento a los compromisos establecidos en el aspecto de seguridad y salud en el trabajo, por la empresa DANES INGENIEROS S.A.S de acuerdo al contrato de obra No. CLPIH383 de 2023 cuyo objeto es: *"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN – DEPARTAMENTO DEL HUILA"*, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de enero de 2025.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

✓ Describir las actividades de SST que se desarrollaron durante el periodo, las cuales se encuentran divididas por componentes.
✓ Generar registros que evidencien el cumplimiento de las actividades SST por parte del contratista de obra.
✓ Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente referente a la seguridad y salud en el trabajo.

3. CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

En la tabla 1 se incluye la información general del contrato de obra:

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	CLPIH383 DE 2023		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA"	**PERIODO DEL INFORME**	Del 01 al 31 de enero de 2025.
CONTRATISTA	DANES INGENIEROS S.A.S	**NIT:**	900.219.918-2
REPRESENTANTE LEGAL:	NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA	**C.C:**	7.719.364 DE NEIVA (H)
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	01/11/2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16/11/2023		
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES		
PLAZO ADICIONAL (No.1) (27/12/2024):	UN (01) MES.		
PLAZO TOTAL:	CUATRO (04) MESES		
VALOR INICIAL:	$ 506.549.699		
VALOR ADICIONAL (27/12/2024):	$ 62.065.242		
VALOR TOTAL:	$ 568.614.941		
INTERVENTOR:	CONSOCIO WF	**NIT:**	901.769.619-8
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANÍA	**C.C:**	7.711.430 DE NEIVA (H)

Tabla 1. Información del contrato de obra

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en la vereda Los Andes zona rural del municipio de San Agustín – Departamento del Huila.

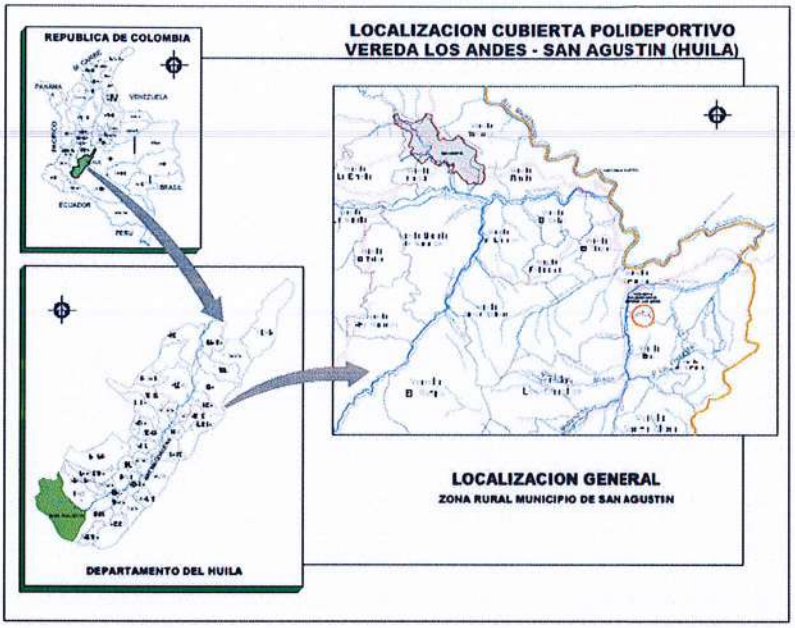


Ilustración 1. Localización del área de intervención



Ilustración 2. Panorámica Polideportivo Vda. Los Andes – San Agustín, antes de la Intervención

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto arquitectónico contempla un área a intervenir de 632,32 m2, en la que se encuentra contemplada la construcción de la cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 20 en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz, para el polideportivo ubicado en la vereda Los Andes del Municipio de San Agustín – Huila, la cual tiene una destinación de uso recreativo, deportivo y cultural; el polideportivo corresponde a estructura de cubierta, iluminación y sistema hidráulico para el manejo de aguas lluvias.

La cubierta será con sistema autoportante, sostenida con columnas en concreto de 3.000 PSI. El sistema estructural propuesto consiste en columnas y vigas aéreas en concreto reforzado en 3.000 PSI y una cimentación tipo zapatas, vigas de cimentación y viga canal. Todas las obras atienden lo establecido en la NORMA SISMORRESISTENTE de 2010 – NSR-10.

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

- Actividades preliminares
- Cimentación
- Estructura en concreto
- Cubierta
- Acabados – placa de concreto
- Instalaciones hidrosanitarias
- Instalaciones eléctricas
- Transporte

6. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO

DANES INGENIEROS S.A.S ha implemento el Sistema de Gestión de Seguridad y la Salud en el Trabajo SG- SST de la obra civil cuyo objeto es: la *"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN – DEPARTAMENTO DEL HUILA"*, con los lineamientos establecidos en el **Decreto 1072 del 2015.**

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

DANES INGENIEROS S.A.S aborda la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar).

Para la implementación del SG-SST la empresa elaboró los siguientes documentos según normatividad aplicable y se adapta al tamaño y características del Proyecto.

- Política y Objetivos Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST.
- Política de no alcohol, no drogas y no tabaquismo.
- Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
- Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
- Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
- Subprogramas de Seguridad y Salud.

Las medidas, actividades y controles SST implementadas en la etapa constructiva son:

6.1 AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL (EPS, ARL, AFP)

De conformidad con la Ley 100 de 1993, DANES INGENIEROS S.A.S da cumplimiento con la realización de la afiliación a la seguridad social al momento de la contratación del personal

igualmente se hace el seguimiento al personal subcontratista que inicie labores solicitando certificados de pagos y verificando oportunamente la afiliación a EPS, AFP y ARL.

Durante el periodo del 01 al 31 de enero de 2025, se realizaron afiliaciones a la seguridad social y también se dio cumplimiento con el pago a la seguridad social del personal administrativo y operativo vinculado al proyecto. (Anexo 1. Pago de la seguridad social).

A continuación, se relaciona el personal activo de MOC y MONC del periodo reportado:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CÉDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	PENSIÓN
1	Néstor Rodrigo Fierro Losada	7.719.364	Director de Obra	12/11/2024	SURA	Nueva EPS	Porvenir
2	Wilmar Armando Jiménez Marulanda	80.826.744	Residente de Obra	12/11/2024	SURA	Nueva EPS	Porvenir
3	Cristian Camilo López Córdoba	1.075.220.858	Residente SST	12/11/2024	SURA	Sanitas	Protección
4	Oscar Alexander Zuluaga	76.006.590	Maestro	07/01/2025	SURA	AIC	Protección
5	Silvio Quiñonez Samboni	1.061.986.149	Ayudante	13/11/2024	SURA	Asmet Salud	Protección
6	Emiro Samboni Muñoz	1.061.985.551	Ayudante	18/11/2024	SURA	Asmet Salud	Porvenir
7	Robinson Arcos Torres	1.082.772.137	Ayudante	18/11/2024	SURA	Nueva EPS	Porvenir
8	William Estiven Arcos Hoyos	1.082.772.716	Ayudante	18/11/2024	SURA	Nueva EPS	Porvenir
9	Jorge Armando Hoyos Paz	1.082.774.946	Ayudante	18/11/2024	SURA	Nueva EPS	Porvenir
10	Oscar Iván Gualí Cuellar	1.081.392.872	Ayudante	07/01/2025	SURA	Nueva EPS	Porvenir

Tabla 2. Personal vinculado al proyecto

Teniendo en cuenta la información suministrada anteriormente, durante el periodo del 01 al 31 de enero de 2025, se mantienen un total de 10 trabajadores, de los cuales 7 trabajadores son MONC y 3 trabajadores son MOC. Es de resaltar que el personal vinculado al proyecto se encuentra afiliado a EPS, ARL Y AFP.

6.2 EXÁMENES MEDICO OCUPACIONALES

De conformidad a la Resolución 2346 del 2007 "Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales (...)". Por lo tanto, DANES INGENIEROS S.A.S., ha realizado los exámenes médicos ocupacionales de ingreso al personal contratado.

Estos exámenes médicos ocupacionales se determinan según las funciones y/o actividades que desempeñara el trabajador y lo establece un Profesiograma para perfiles de cargos según el riesgo ocupacional.

Durante el periodo del 01 al 31 de enero de 2025, se realizaron un total de 2 exámenes médicos ocupacionales de ingreso. (Anexo 2. Exámenes ocupacionales)

6.3 INDUCCIONES EN SST

DANES INGENIEROS S.A.S., realizó inducciones en SST al personal contratado durante este periodo (2 personas); además, se realiza la Notificación de riesgos al cual estarán expuestos en toda la ejecución de sus labores y el desarrollo de la misma. (Anexo 3. Inducciones)

Los temas que se abordan en la inducción se describen a continuación:

1. Políticas en SST, Políticas para el no consumo de tabaco, alcohol y drogas.
2. Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
3. Entidades que conforman la seguridad social.
4. Actividad económica.
5. Peligros y riesgos asociados a la actividad económica.
6. Obligaciones del empleador y de los trabajadores.
7. Incidentes, accidentes de trabajos, actos y condiciones inseguras y enfermedades laborales.
8. Como reportar un accidente de trabajo.
9. Clasificación de agentes de riesgos.
10. Elementos de protección personal EPP.
11. Prevención y respuestas ante una emergencia (Brigadas de emergencias).
12. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y Comité de Convivencia Laboral.
13. Plan de manejo ambiental implementado para la obra.
14. Políticas de igualdad salarial, protocolo de perspectiva de género.

6.4 ENTREGA DE EPP

DANES INGENIEROS S.A.S implementa una Matriz de EPP por Cargos/Actividades, donde facilita la identificación de los EPP que requieren cada uno de los trabajadores según las funciones y/o actividades que desarrollaran. Permitiendo así eliminar y/o minimizar los Factores de riesgos de Seguridad o de Higiene a los que estén expuestos.

Para el periodo del 01 al 31 de enero de 2025, se realizó entrega de los elementos de protección personal al personal nuevo contratado, y se realizó renovación de los elementos de protección personal que presentan desgaste o no estaban aptos para continuar usando, al personal contratado. (Anexo 4. Entrega de EPP).

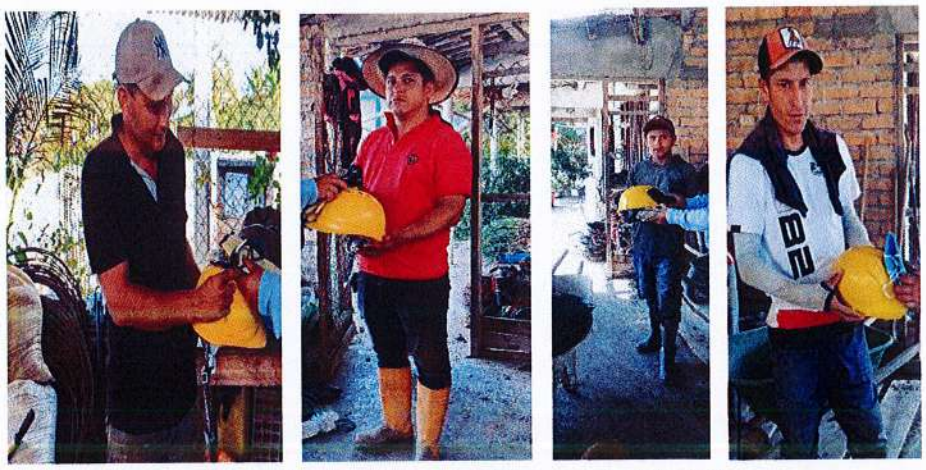


Ilustración 3. Entrega de EPP a personal de obra

6.5 CHARLAS PREOPERACIONALES

Las charlas pre operacionales son uno de los medios más eficaces para corregir las prácticas de trabajo incorrectas y formar una conciencia en prevención de accidentes, tanto en el trabajo como fuera de este.

Por este motivo el DANES INGENIEROS S.A.S realizó Charlas Pre operacionales o de seguridad previo al inicio de las actividades. Sensibilizando, Concienciando e inculcando una cultura de autocuidado; evitando actos y condiciones inseguras lo cual permite mitigar los accidentes, incidentes y enfermedades laborales abarcando temas de Seguridad y Salud en el trabajo.

A continuación, se relaciona las charlas pre operacionales programadas y realizadas para el periodo del 01 al 31 de enero de 2025, cuyos soportes se anexan en el Anexo 5. Charlas preoperacionales.

TEMAS A TRATAR	RESPONSABLE	FECHA
Trabajo en equipo	SISO	08/01/2025
Manejo integrado de Residuos sólidos	SISO	10/01/2025
Uso y cuidado de los EPP	SISO	14/01/2025
Actos inseguros y condiciones inseguras	SISO	17/01/2025
Cuidado y protección de las manos	SISO	21/01/2025
Riesgo ergonómico (manipulación de carga, transporte de carga, higiene postural)	SISO	24/01/2025
Uso y manejo de equipos para trabajo en alturas	SISO	27/01/2025
Equipos para trabajo en alturas	SISO	29/01/2025

Tabla 3. Charlas preoperacionales





Ilustración 4. Charlas pre operacionales a personal de obra

6.6 DILIGENCIAMIENTO DE ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - ATS

Durante el presente periodo, se requirieron los siguientes Análisis de Seguridad en el Trabajo para las actividades desarrolladas y que se adjuntan en el Anexo 6. Análisis de Trabajo Seguro.

ATS – Instalación de acero para viga canal.
ATS – Fundición de concreto para viga canal.

6.7 INDICADORES DE SEGUIMIENTO

- **Accidentes Laborales Presentados en el Periodo:** Para el periodo del 01 al 31 de enero de 2025, no se presentaron accidentes laborales dentro del proyecto.

Indicador	Cumplimiento
Indicador de calificación	(Número de empleados accidentados al mes / Número total de empleados al mes) * 100
	0/10*100=0%

- **No. de días perdidos por AL:** En el periodo del 01 al 31 de enero de 2025, no se presentaron días perdidos por Accidentes Laborales.

- **No. de días perdidos por enfermedad común:** En el periodo del 01 al 31 de enero de 2025, no se presentaron incapacidades por enfermedad común, el personal se encuentra en buenas condiciones de salud.

- **No. de días perdidos por enfermedad laboral:** En el periodo del 01 al 31 de enero de 2025, no se presentaron incapacidades por enfermedad laboral.

- **Tasa de accidentalidad:** En el periodo del 01 al 31 de enero de 2025, la tasa de accidentalidad fue cero.

Indicador	Cumplimiento
Indicador de calificación	(Número de accidentes de trabajo / Número de trabajadores) * 100
	0/10*100=0%

- **Hora de hombres trabajadas:** Se determina que: Durante el periodo del 01 al 31 de enero de 2025 se trabajó 21 días hábiles, de los cuales de lunes a viernes tuvieron jornada laboral de 8 horas diarias y los sábados 4 horas laborales, lo que corresponde a que se tuvo 1.840 HHT.

ÍTEM	No. TRABAJADORES	No. DÍAS Jornada Completa	No. DÍAS Media Jornada	HORAS	TOTAL
HHT	10	21	4	184	1.840

- **Índice de Frecuencia AT:** Durante el periodo del 01 al 31 de enero de 2025, se reportaron 1.840 HHT, para ese mismo periodo no se presentaron accidentes de trabajo.

Indicador	Cumplimiento
Indicador de calificación	(Número total de AT en el mes / Número HHT en el mes) * 100
	0/1840*100= 0%

- **Índice de severidad AT:** De las 1840 HHT reportadas, no se presentaron días perdidos de ninguna índole.

Indicador	Cumplimiento
Indicador de calificación	(Número de días perdidos y cargados por AT en el mes / Número HHT en el mes) * 100
	0/1840*100= 0%

- **Índice lesiones incapacitantes de AT:** El índice de lesión incapacitante es 0, ya que no se presentaron incapacidades durante el periodo.

Indicador	Cumplimiento
Indicador de calificación	IF * IS / 1000
	0*0/1000=0%

- **Tasa de ausentismo general:** Durante el periodo se laboraron 1840 Horas hombres trabajadas, no hubo días perdidos por enfermedad común, accidentes de trabajo, enfermedad

profesional o permisos.

Indicador	Cumplimiento
Indicador de calificación	(Número de días perdidos por (EC + AT + EP + permisos / Numero HHT mes) * 100
	0+0+0+0/1840*100=0%

- **Capacitaciones:** La participación en las charlas pre operacionales fue del 100% del personal contratado en el periodo para el proyecto.

Indicador	Cumplimiento
Indicador de calificación	(Número de empleados que asisten a charlas realizadas / Número total de empleados) * 100
	10/10 * 100= 100%

- **Entrega de los elementos de protección personal:** Se hizo entrega de los EPP a todo el personal vinculado al proyecto, cumpliendo con el 100% del indicador.

Indicador	Cumplimiento
Indicador de calificación	(Número de entrega de EPP nuevos y/o reposición / Número total de trabajadores) * 100
	10/10 * 100 = 100%

- **Afiliaciones:** Se dio cumplimiento en su totalidad con las afiliaciones al Sistema de seguridad social.

Indicador	Cumplimiento
Indicador de calificación	(Certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social / Número total de empleados laborando) * 100
	10/10 * 100 = 100%

7. ACTAS DE VECINDAD

En el periodo del presente informe del 01 al 31 de enero de 2025 no se hizo levantamiento de actas de vecindad, puesto que estas fueron desarrolladas en el mes de noviembre de 2024.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO















9. ANEXOS

ANEXO 1. Pago de seguridad social

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	32850249	9480094655	E	2025/01/08	2025/01/09	BANCO DE OCCIDENTE	1	$2,693,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: NEIVA (11 Afiliados)						$9,230,002	$1,477,000			$9,230,002	$369,400			$9,230,002	$369,400			$9,230,002	$475,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PERSONAL ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
1	CC	7719364	FIERRO NESTOR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	36067241	MEDINA SANDRA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PERSONAL DE OBRA (9 Afiliados)						$6,630,002	$1,061,000			$6,630,002	$265,400			$6,630,002	$265,400			$6,630,002	$461,800		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (9 Afiliados)						$6,630,002	$1,061,000			$6,630,002	$265,400			$6,630,002	$265,400			$6,630,002	$461,800		$0	$0
3	CC	1082772137	ARCOS ROBINSON	230301	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF32	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
4	CC	1082772716	ARCOS WILIAN	230301	8	$346,667	$55,500	EPS037	8	$346,667	$13,900	CCF32	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
5	CC	1082774946	HOYOS JORGE	230301	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF32	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
6	CC	80926744	JIMENEZ WILMAR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
7	CC	1075220858	LOPEZ CRISTIAN	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
8	CC	7705022	MARTINEZ CARLOS	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
9	CC	1061986149	QUIÑONEZ SILVIO	230201	6	$260,000	$41,600	ESSC62	6	$260,000	$10,400	CCF32	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$18,100	6	$0	$0
10	CC	1061985531	SAMBONI EMIRO	230301	5	$216,667	$34,700	ESSC62	5	$216,667	$8,700	CCF32	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0
11	CC	12137587	TOVAR JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(11)**					$9,230,002	$1,477,000			$9,230,002	$369,400			$9,230,002	$369,400			$9,230,002	$475,400		$0	$0

2025/01/09 04:20 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	32850249	9480094655	E	2025/01/08	2025/01/09	BANCO DE OCCIDENTE	1	$2,693,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$1,477,000	$1,100	$0	$1,478,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$200	$0	$208,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$811,400	$600	$0	$812,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$457,600	$300	$0	$457,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$475,400	$300	$0	$475,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$475,400	$300	$0	$475,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$369,400	$300	$0	$369,700
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	$369,400	$300	$0	$369,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$369,400	$400	$0	$369,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$19,100	$100	$0	$19,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$298,300	$200	$0	$298,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$100	$0	$52,100
TOTAL				11	$2,691,200	$2,100	$0	$2,693,300

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/01/09 04:20 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	37650014	9481408682	E	2025/02/06	2025/02/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,604,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: NEIVA (11 Afiliados)						$9,062,950	$1,450,600			$9,062,950	$362,900			$8,560,719	$342,800			$9,062,950	$448,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PERSONAL ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0
1	CC	7719364	FIERRO NESTOR	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
2	CC	36067241	MEDINA SANDRA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PERSONAL DE OBRA (9 Afiliados)						$6,215,950	$995,000			$6,215,950	$248,900			$5,713,719	$228,800			$6,215,950	$433,200		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (9 Afiliados)						$6,215,950	$995,000			$6,215,950	$248,900			$5,713,719	$228,800			$6,215,950	$433,200		$0	$0
3	CC	1082772137	ARCOS ROBINSON	230301	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF32	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
4	CC	1082772716	ARCOS WILIAN	230301	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF32	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
5	CC	1081392872	GUALI OSCAR	230301	9	$427,050	$68,400	EPS037	9	$427,050	$17,100	CCF32	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0
6	CC	1082774946	HOYOS JORGE	230301	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF32	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
7	CC	80926744	JIMENEZ WILMAR	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
8	CC	7705022	MARTINEZ CARLOS	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
9	CC	1061986149	QUIÑONEZ SILVIO	230201	6	$284,700	$45,600	ESSC62	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
10	CC	1061985531	SAMBONI EMIRO	230301	6	$284,700	$45,600	ESSC62	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
11	CC	76006590	ZULUAGA OSCAR	230201	29	$1,376,050	$220,200	EPSIC3	29	$1,376,050	$55,100	CCF32	29	$1,256,667	$50,300	14-11	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0
Total			**Afiliados(11)**			$9,062,950	$1,450,600			$9,062,950	$362,900			$8,560,719	$342,800			$9,062,950	$448,200		$0	$0

2025/02/06 04:23 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	37650014	9481408682	E	2025/02/06	2025/02/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,604,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$1,450,600	$0	$0	$1,450,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$729,200	$0	$0	$729,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$493,600	$0	$0	$493,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$448,200	$0	$0	$448,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$448,200	$0	$0	$448,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$342,800	$0	$0	$342,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	$342,800	$0	$0	$342,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$362,900	$0	$0	$362,900
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$55,100	$0	$0	$55,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$22,800	$0	$0	$22,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$285,000	$0	$0	$285,000
TOTAL				11	$2,604,500	$0	$0	$2,604,500

ANEXO 2. Exámenes ocupacionales de ingreso



DR. ALFONSO BENAVIDES SUAREZ
MEDICO-ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
R.M Registro Médico No. 972/1997 - I.S.O 1180 DE 2022

CERTIFICADO DE APTITUD

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 07-01-2025

NOMBRE Y APELLIDO: OSCAR ALEXANDER ZULUAGA LIZ — **C.C No: 76006590**

CARGO: MAESTRO DE OBRA — **DEPENDENCIA:** — **EDAD: 45 AÑOS**

EMPRESA: DANES INGENIEROS SAS — **DIRECCION: VDA. LOS ANDES - SAN AGUSTIN**

EXAMENES PRACTICADOS

EXAMENES	
EVALUACIÓN MEDICO OCUPACIONAL	☑
OPTOMETRIA	☑
AUDIOMETRIA	☑
RX	☐
OTROS LABORATORIOS	☑
VERTIGO-MANIOBRAS	☑
ESPIROMETRIA	☐
ESPACIOS CONFINADOS	☐
PSICOLOGIA	☐

LABORATORIO: NORMAL: GLUCOSA, COLESTEROL TOTAL,TRIGLICERIDOS

RAYOS X: NO REALIZO

OPTOMETRIA: NORMAL

FONO AUDIOLOGIA: NORMAL

VERTIGO - MANIOBRAS: POSITIVO [ ] NEGATIVO [X]

EXAMEN A REALIZAR DE INGRESO / PERIODICO / EGRESO

APTO PARA EL CARGO: SIN PATOLOGIA APARENTE [X] — CON PATOLOGIA QUE NO LIMITA SU LABOR: [ ]

APTO CON RESTRICCION [ ] — MOTIVO:

APTO PARA MANIPULAR ALIMENTOS [ ] — MOTIVO:

APLAZADO [ ] — MOTIVO:

RECOMENDACIÓN: AL EXAMEN DE INGRESO, SE VALORA EL PACIENTE EN MENCIÓN POR MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL, CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR, AL EXAMEN FISICO GENERAL POR ORGANOS Y SISTEMAS, CARDIOVASCULAR, NEUROLOGICO, PULMONAR: NORMAL. NO PRESENTA SIGNOS, NI SINTOMAS PARA VIRUS COVID-19. USO DE EPP. APTO PARA LABORAR COMO: OBRAS, MANEJO ADECUADO DE CARGAS Y LABORES EN ALTURAS. EMPRESA: DANES INGENIEROS SAS. NOTA: SE APLICA VACUNA TOXOIDE ANTITETANICA LOTE: 220800231A

EXAMEN PERIODICO

PERIODICO: PUEDE CONTINUAR CON SU LABOR [ ]

SE SUGIERE REUBICACIÓN LABORAL TEMPORAL [ ] PERMANENTE [ ] REASIGNAR TAREAS [ ]

OTROS

APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS [X] — NO APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS [ ]

EXAMEN DE EGRESO

SATISFACTORIO [ ] NO SATISFACTORIO [ ] — MOTIVO:

SOSPECHA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL SI [ ] NO [ ]

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

REMISION A E.P.S	[ ]	INICIO DE ACTIVIDAD FISICA	[ ]
CONTINUAR A A.R.P	[ ]	DEJAR DE FUMAR	[ ]
SEGUIMIENTO CASO POR A.R.P	[ ]	REDUCIR CONSUMO DE ALCOHOL	[ ]
CONTROL DE PESO	[ ]		

Incluir en SVE								
	VISUAL	☐	AUDITIVO	☐	RESPIRATORIO	☐	ERGONOMICO	☐
	CARDIOVASCULAR	☐	PSICOLABORAL	☐	BIOLOGICO	☐	QUIMICO	☐

DR. ALFONSO BENAVIDES S.
MEDICO GENERAL
Especialista en Salud Ocupacional
R.M. 972/97 - ISO 1180/2022

FIRMA DEL MEDICO
REGISTRO 972/97
ISO 1180/2022

Oscar A. Zuluaga Liz.

FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C. No: 76006590



DR. ALFONSO BENAVIDES SUAREZ
MEDICO-ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
R.M Registro Médico No. 972/1997 - I.S.O 1180 DE 2022

CERTIFICADO DE APTITUD

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 07-01-2025

NOMBRE Y APELLIDO: OSCAR IVAN GUALI CUELLAR **C.C No: 1081392872**

CARGO: AYUDANTE DE OBRA **DEPENDENCIA:** **EDAD: 39 AÑOS**

EMPRESA: DANES INGENIEROS SAS **DIRECCION: VDA. LOS ANDES - SAN AGUSTIN**

EXAMENES PRACTICADOS

EXAMENES	
EVALUACIÓN MEDICO OCUPACIONAL	☑
OPTOMETRIA	☑
AUDIOMETRIA	☑
RX	☐
OTROS LABORATORIOS	☑
VERTIGO-MANIOBRAS	☑
ESPIROMETRIA	☐
ESPACIOS CONFINADOS	☐
PSICOLOGIA	☐

LABORATORIO: NORMAL: GLUCOSA, COLESTEROL TOTAL,TRIGLICERIDOS

RAYOS X: NO REALIZO

OPTOMETRIA: NORMAL

FONO AUDIOLOGIA: NORMAL

VERTIGO - MANIOBRAS: POSITIVO [ ] NEGATIVO [X]

EXAMEN A REALIZAR DE INGRESO / PERIODICO / EGRESO

APTO PARA EL CARGO: SIN PATOLOGIA APARENTE [X] CON PATOLOGIA QUE NO LIMITA SU LABOR: [ ]

APTO CON RESTRICCION [ ] MOTIVO:

APTO PARA MANIPULAR ALIMENTOS [ ] MOTIVO:

APLAZADO [ ] MOTIVO:

RECOMENDACIÓN: AL EXAMEN DE INGRESO, SE VALORA EL PACIENTE EN MENCIÓN POR MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL, CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR, AL EXAMEN FISICO GENERAL POR ORGANOS Y SISTEMAS, CARDIOVASCULAR, NEUROLOGICO, PULMONAR: NORMAL. NO PRESENTA SIGNOS, NI SINTOMAS PARA VIRUS COVID-19. USO DE EPP. APTO PARA LABORAR COMO: OBRAS, MANEJO ADECUADO DE CARGAS Y LABORES EN ALTURAS. EMPRESA: DANES INGENIEROS SAS. NOTA: SE APLICA VACUNA TOXOIDE ANTITETANICA LOTE: 220800231A

EXAMEN PERIODICO

PERIODICO: PUEDE CONTINUAR CON SU LABOR [ ]

SE SUGIERE REUBICACIÓN LABORAL TEMPORAL [ ] PERMANENTE [ ] REASIGNAR TAREAS [ ]

OTROS

APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS [X] NO APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS [ ]

EXAMEN DE EGRESO

SATISFACTORIO [ ] NO SATISFACTORIO [ ] MOTIVO:

SOSPECHA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL SI [ ] NO [ ]

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

REMISION A E.P.S	[ ]	INICIO DE ACTIVIDAD FISICA	[ ]
CONTINUAR A A.R.P	[ ]	DEJAR DE FUMAR	[ ]
SEGUIMIENTO CASO POR A.R.P	[ ]	REDUCIR CONSUMO DE ALCOHOL	[ ]
CONTROL DE PESO	[ ]		

Incluir	VISUAL	☐	AUDITIVO	☐	RESPIRATORIO	☐	ERGONOMICO	☐
en SVE	CARDIOVASCULAR	☐	PSICOLABORAL	☐	BIOLOGICO	☐	QUIMICO	☐

DR. ALFONSO BENAVIDES S.
MEDICO GENERAL
Especialista en Salud Ocupacional
R.M. 972/97 - I.S.O 1180/2022

FIRMA DEL MEDICO
REGISTRO 972/97
ISO 1180/2022

Oscar Ivan Guali

FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C. No: 1081392872

ANEXO 3. Inducciones

	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	FECHA	VERSION
Dánes		2 DE AGOSTO DE 2023	01
		CODIGO	FT-SST-015

FORMATO DE INDUCCIÓN		
NOMBRE: Oscar Alexander Zuluaga Liz		
CARGO: Maestro de obra		
AREA O SECCIÓN: Cubierta Polideportivo Vda. Los Andes - San Agustín (H)		
PROCESO	**TEMAS**	**RESPONSABLE**
1. INDUCCIÓN GENERAL	Políticas SST	ING. AMBIENTAL
	Política ambiental	ING. AMBIENTAL
	Política seguridad vial	ING. AMBIENTAL
	Política prevención acoso laboral	ING. AMBIENTAL
	Política control cigarrillo, alcohol drogas	ING. AMBIENTAL
	Plan de manejo ambiental	ING. AMBIENTAL
2. INDUCCIÓN AL CARGO O AREA DE TRABAJO	Funciones	JEFE INMEDIATO
	Lugar de trabajo	JEFE INMEDIATO
	Horario laboral	JEFE INMEDIATO
3. ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO AL CARGO U OFICIO	Inducción de 1 día	JEFE INMEDIATO

Oscar A. Zuluaga Liz

Trabajador y/o Contratista
C.C. 76.006.590.

Responsable de Inducción
C.C. 1075.220.858.

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	FECHA	VERSION
Dánes		2 DE AGOSTO DE 2023	01
		CODIGO	FT-SST-015

FORMATO DE INDUCCIÓN		
NOMBRE: Oscar Ivan Guali Cuellar		
CARGO: Ayudante de obra		
AREA O SECCIÓN: Cobertura Polideportivo Vda. los Andes - San Agustin (H)		
PROCESO	**TEMAS**	**RESPONSABLE**
1. INDUCCIÓN GENERAL	Políticas SST	ING. AMBIENTAL
	Política ambiental	ING. AMBIENTAL
	Política seguridad vial	ING. AMBIENTAL
	Política prevención acoso laboral	ING. AMBIENTAL
	Política control cigarrillo, alcohol drogas	ING. AMBIENTAL
	Plan de manejo ambiental	ING. AMBIENTAL
2. INDUCCIÓN AL CARGO O AREA DE TRABAJO	Funciones	JEFE INMEDIATO
	Lugar de trabajo	JEFE INMEDIATO
	Horario laboral	JEFE INMEDIATO
3. ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO AL CARGO U OFICIO	Inducción de 1 día	JEFE INMEDIATO

Oscar Ivan guali

Trabajador y/o Contratista
C.C. 1.081.392.872.

Responsable de Inducción
C.C. 1.075.220.858.

Powered by CamScanner

ANEXO 4. Entrega de EPP

Danes	ENTREGA DE EPP Y/O DOTACION	CODIGO: UC-REG-4.4.1-03 PAGINA: 1 DE 1

Nombre del Trabajador: Wilmar Armando Jimenez Machado **Cargo:** Ingeniero Residente **Proceso:** Obra

Empresa: DANES INGENIEROS S.A.S **Proyecto:** CONSTRUCCIÓN CUBIERTA AUTOPORTANTE VEREDA LOS ANDES - SAN AGUSTÍN (H)

Elementos de Protección Personal

Fecha de entrega	CABEZA		OJOS					CARA			OÍDOS		RESPIRATORIA					MANOS							PIES/PIERNAS				CUERPO							TRABAJOS ALTURA					Firma: Acepto que he recibido los EPP adecuados y me comprometo a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979, Código Sustantivo del Trabajo, Ley 9 Artículo III, Decreto 1295 de 1994 y demás dispociones legales vigentes.
	Casco Dieléctrico	Casco con Barbuquejo	Gafas De Seguridad transparentes	Careta de soldador	Careta de Esmeriar	Monogafas	Gafas de seguridad antes oscuros	Careta soldador	Monja protector de cuello	Careta Para Esmeriar	Protector Auditivo Tipo Tapón	Protector Auditivo Tipo Copa	Respirador Humos Metálicos	Respiradores desechables	Respirador para material particulado (incluye Silice)	Vapores orgánicos	Vapores orgánicos y gases ácidos	Quimicos y pinturas en spray	Guante Recubierto en Nitrilo	Vaqueta o ingeniero largos	Guantes para soldador	Carnaza	Hilaza puntos	Guante de caucho industrial	Guante de nitrilo	guantes dieléctrico	Botas seguridad con puntera reforzada suela	Botas Caucho con puntera reforzada	Calzado dieléctrico	Bota de seguridad caña alta	Delantal en carnaza o vaqueta	Overol de cuerpo entero Con reflectivo	Chaqueta y pantalón en jean	Overol de dos piezas en dril	Impermeable chaqueta y pantalón con material	Chaleco reflectivo	Mangas (Carnaza/Vaqueta)	Arnés Seguridad multipropósito	Eslinga Posicionamiento	Eslinga en Y con absorvedor de energía	Mosquetones	Frenos	Línea de Vida certificada	
12/11/2024	X						X				X			X						X							X						X									
9/01/2025							X							X						X															X	X	X	Y	X	X	

Diligencie en la casillas el numero de elementos entregados.

NOTA: Identifique aquí EPP que no estén en el listado:

ELABORA

Nombre: Cristian Camilo López.

Fecha: 12/11/24.

Firma:

Notas: 1. Una vez recibida la compra, se entregan a los trabajadores los EPP quienes firman en señal de recibido conforme y compromiso de utilizarlos adecuadamente.
2. Con la firma de recibido de estos elementos, "Acepta que ha recibido los EPP adecuados y se compromete a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979, Código Sustantivo del Trabajo, Ley 9 Artículo III, Decreto 1295 de 1994 y demás dispociones legales vigentes".

Powered by CamScanner

Dánes	**ENTREGA DE EPP Y/O DOTACION**	CODIGO: UC-REG-4.4.1-03 PAGINA: 1 DE 1

Nombre del Trabajador: Jorge Armando Hoyos Paz **Cargo:** Ayudante de Obra **Proceso:** Obra

Empresa: DANES INGENIEROS S.A.S **Proyecto:** CONSTRUCCIÓN CUBIERTA AUTOPORTANTE VEREDA LOS ANDES - SAN AGUSTÍN (H)

Elementos de Protección Personal

Fecha de entrega	CABEZA		OJOS					CARA			OÍDOS		RESPIRATORIA						MANOS								PIES/PIERNAS				CUERPO								TRABAJOS ALTURA						Firma: Acepto que he recibido los EPP adecuados y me comprometo a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979, Código Sustantivo del Trabajo, Ley 9 Artículo III, Decreto 1295 de 1994 y demás dispociones legales vigentes.
	Casco Dieléctrico	Casco con Barbuquejo	Gafas De Seguridad transparentes	Careta de soldador	Careta de Esmeriler	Monogafas	Gafas de seguridad lentes oscuros	Careta soldador	Monge protector de cuello	Careta Para Esmeriler	Protector Auditivo Tipo Tapón	Protector Auditivo Tipo Copa	Respirador Humos Metálicos	Respiradores desechables	Respirador para material particulado (incluye Silice)	Vapores orgánicos	Vapores orgánicos y gases ácidos	Químicos y pinturas en spray	Guante Resistente en Nitrilo	Vaqueta o Nylon/cuero largos	Guantes para soldador	Carnaza	Haza puntos	Guante de caucho industrial	Guante de nitrilo	guantes dieléctrico	Bota seguridad con puntera reforzada suela	Botas Caucho con puntera reforzada	Calzado dieléctrico	Bota de seguridad caña alta	Overall en carnaza o vaqueta	Overol de cuerpo entero Con reflectivo	Chaqueta y pantalon en jean	Overol de dos piezas en dril	Impermeable chaqueta y pantalon con material	Chaleco reflectivo	Mangas (Carnaza/Vaqueta)	Arnés Seguridad multipropósito	Eslinga	Posicionamiento	Eslinga en Y con absorvedor de energía	Mosquetones	Frenos	Línea de Vida certificada	
19/11/24	X						X				X			X						X							X						X													Jorge Hoyos
12/12/24			X											X						X			X										X						X	X	X	X	X	X	Jorge Hoyos
17/12/24														X						X			X																							Jorge Hoyos
09/01/2025														X					X																											Jorge Hoyos
22/01/2025							X							X					X																											Jorge Hoyos

Diligencie en la casillas el numero de elementos entregados.

NOTA: Identifique aquí EPP que no estén en el listado:

ELABORA

Nombre: Cristian Camilo López

Fecha: 18/11/24

Firma:

Notas: 1. Una vez recibida la compra, se entregan a los trabajadores los EPP quienes firman en señal de recibido conforme y compromiso de utilizarlos adecuadamente.
2. Con la firma de recibido de estos elementos, "Acepta que ha recibido los EPP adecuados y se compromete a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979, Código Sustantivo del Trabajo, Ley 9 Artículo III, Decreto 1295 de 1994 y demás dispociones legales vigentes".

VERSIÓN 7- FEBRERO 23 DE 2017

Powered by CamScanner

Dánes	**ENTREGA DE EPP Y/O DOTACION**	CODIGO: UC-REG-4.4.1-03 PAGINA: 1 DE 1

Nombre del Trabajador: Robinson Arcos Torres **Cargo:** Ayudante de obra **Proceso:** Obra

Empresa: DANES INGENIEROS S.A.S **Proyecto:** CONSTRUCCIÓN CUBIERTA AUTOPORTANTE VEREDA LOS ANDES - SAN AGUSTÍN (H)

Elementos de Protección Personal

Fecha de entrega	CABEZA		OJOS					CARA			OÍDOS		RESPIRATORIA					MANOS							PIES/PIERNAS				CUERPO							TRABAJOS ALTURA					Firma: Acepto que he recibido los EPP adecuados y me comprometo a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979, Código Sustantivo del Trabajo, Ley 9 Artículo III, Decreto 1295 de 1994 y demás disposiciones legales vigentes.
	Casco Dieléctico	Casco con Barbuquejo	Gafas De Seguridad transparentes	Careta de soldador	Careta de Esmeriar	Monogafas	Gafas de seguridad lentes oscuros	Careta soldador	Monja protector de ruido	Careta Para Esmeriar	Protector Auditivo Tipo Tapón	Protector Auditivo Tipo Copa	Respirador Humos Metálicos	Respiradores desechables	Respirador para material particulado (nokya Silice)	Gases y Vapores: Vapores orgánicos	Gases y Vapores: Vapores orgánicos y gases ácidos	Gases y Vapores: Químicos y pinturas en spray	Guante Recubierto en Nitrilo	Vaqueta o ingeniero largos	Guantes para soldador	Carnaza	Hilaza puntos	Guante de caucho industrial	Guante de nitrilo	guantes dieléctrico	Botas seguridad con puntera reforzada suela	Botas Caucho con puntera reforzada	Calzado dieléctrico	Bota de seguridad carnaza	Delantal en carnaza o vaqueta	Overol de cuerpo entero Con reflectivo	Chaqueta y pantalón en jean	Overol de dos piezas en dril	Impermeable chaqueta y pantalón con material	Chaleco reflectivo	Mangas (Carnaza/Vaqueta)	Arnés Seguridad multipropósito	Eslinga: Eslinga	Posicionamiento	Eslinga en Y con absolvedor de energía	Mosquetones	Frenos	Línea de Vida certificada	
18/11/2024	X						X				X			X						X						X						X										ROBINSON ARCOS
12/12/2024			X											X						Y			Y														X	X	X	Y	X	ROBINSON ARCOS
17/12/2024														Y						Y			X																			ROBINSON ARCOS
08/01/2025														Y					X																							ROBINSON ARCOS
27/01/2025							X							X					Y																							ROBINSON ARCOS

Diligencie en la casillas el numero de elementos entregados.

NOTA: Identifique aquí EPP que no estén en el listado:

ELABORA

Nombre: Cristian Camilo López

Fecha: 18/11/24

Firma:

Notas: 1. Una vez recibida la compra, se entregan a los trabajadores los EPP quienes firman en señal de recibido conforme y compromiso de utilizarlos adecuadamente.
2. Con la firma de recibido de estos elementos, "Acepta que ha recibido los EPP adecuados y se compromete a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979, Código Sustantivo del Trabajo, Ley 9 Artículo III, Decreto 1295 de 1994 y demás disposiciones legales vigentes".

VERSIÓN 7- FEBRERO 23 DE 2017

Powered by CamScanner

Dánes	ENTREGA DE EPP Y/O DOTACION	CODIGO: UC-REG-4.4.1-03 PAGINA: 1 DE 1

Nombre del Trabajador: Emiro Sambori Muñoz **Cargo:** Ayudante de Obra **Proceso:** Obra.

Empresa: DANES INGENIEROS S.A.S **Proyecto:** CONSTRUCCIÓN CUBIERTA AUTOPORTANTE VEREDA LOS ANDES - SAN AGUSTÍN (H)

Elementos de Protección Personal

Fecha de entrega	CABEZA		OJOS					CARA			OÍDOS		RESPIRATORIA					MANOS							PIES/PIERNAS				CUERPO						TRABAJOS ALTURA					Firma: Acepto que he recibido los EPP adecuados y me comprometo a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979, Código Sustantivo del Trabajo, Ley 9 Artículo III, Decreto 1295 de 1994 y demás disposiciones legales vigentes.
	Casco Dieléctrico	Casco con Barbuquejo	Gafas De Seguridad transparentes	Careta de soldador	Careta de Esmeriler	Monogafas	Gafas de seguridad lentes oscuros	Careta soldador	Monga protector de polvo	Careta Para Esmeriler	Protector Auditivo Tipo Tapón	Protector Auditivo Tipo Copa	Respirador Humos Metálicos	Respiradores desechables	Respirador para material particulado (incluye Silice)	Gases y Vapores: Vapores orgánicos	Gases y Vapores: Vapores orgánicos y gases ácidos	Gases y Vapores: Químicos y pinturas en spray	Guante Recubierto en Nitrilo	Vaquetas o ingeniero larga	Guantes para soldador	Carnaza	Hilaza puntos	Guante de caucho industrial	Guante de nitrilo	guantes dieléctrico	Botas seguridad con puntera reforzada suela	Botas Caucho con puntera reforzada	Calzado dieléctrico	Bota de seguridad caña alta	Overol en carnaza o vaquetá	Overol de cuerpo entero Con reflectivo	Chaqueta y pantalon en jean	Overol de dos piezas en dril	Impermeable chaqueta y pantalón con material	Chaleco reflectivo	Mangas (Carnaza/Vaquetá)	Arnés Seguridad multipropósito	Eslinga: Posicionamiento	Eslinga en Y con absorvedor de energía	Mosquetones	Frenos	Línea de Vida certificada	
18/01/2024	X						X				X			X						X							X					X								emiro Sambori
12/12/2024			X											X						X		X												X	X		X	X	X	emiro Sambori
17/12/2024														X						X		X																		emiro Sambori
08/01/2025														X					X																					emiro Sambori
27/01/2025							X							X					X																					emiro Sambori

Diligencie en la casillas el numero de elementos entregados.

NOTA: Identifique aquí EPP que no estén en el listado:

ELABORA

Nombre: Cristian Camilo López

Fecha: 18/11/24

Firma:

Notas: 1. Una vez recibida la compra, se entregan a los trabajadores los EPP quienes firman en señal de recibido conforme y compromiso de utilizarlos adecuadamente.
2. Con la firma de recibido de estos elementos, "Acepta que ha recibido los EPP adecuados y se compromete a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979, Código Sustantivo del Trabajo, Ley 9 Artículo III, Decreto 1295 de 1994 y demás disposiciones legales vigentes".

VERSIÓN 7- FEBRERO 23 DE 2017

Powered by CamScanner

Dánes	**ENTREGA DE EPP Y/O DOTACION**	CODIGO: UC-REG-4.4.1-03 PAGINA: 1 DE 1

Nombre del Trabajador: Silvio Quiñones Samboni **Cargo:** Ayudante de obra **Proceso:** Obra.

Empresa: DANES INGENIEROS S.A.S **Proyecto:** CONSTRUCCIÓN CUBIERTA AUTOPORTANTE VEREDA LOS ANDES - SAN AGUSTÍN (H)

Elementos de Protección Personal

Fecha de entrega	CABEZA		OJOS					CARA			OÍDOS		RESPIRATORIA						MANOS								PIES/PIERNAS				CUERPO							TRABAJOS ALTURA					Firma: Acepto que he recibido los EPP adecuados y me comprometo a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979, Código Sustantivo del Trabajo, Ley 9 Artículo III, Decreto 1295 de 1994 y demás dispociones legales vigentes.
																Gases y Vapores																						Eslinga					
	Casco Dieléctrico	Casco con Barbuquejo	Gafas De Seguridad transparentes	Careta de soldador	Careta de Esmeriler	Monogafas	Gafas de seguridad lentes oscuros	Careta soldador	Monje protector de cuello	Careta Para Esmeriler	Protector Auditivo Tipo Tapón	Protector Auditivo Tipo Copa	Respirador Humos Metálicos	Respiradores desechables	Respirador para material particulado (incluye Silice)	Vapores orgánicos	Vapores orgánicos y gases ácidos	Químicos y pinturas en spray	Guantes Resistente en hierro	Vaqueta o Ingeniero larga	Guantes para soldador	Carnaza	Hilaza puntos	Guante de caucho industrial	Guante de nitrilo	guantes dieléctrico	Botas seguridad con puntera reforzada suela	Botas Caucho con puntera reforzada	Calzado dieléctrico	Bota de seguridad caña alta	Dotación en camiseta o vaqueta	Overol de cuerpo entero Con reflectivo	Chaqueta y pantalón en jean	Overol de dos piezas sin dril	Impermeable chaqueta y pantalón con material	Chaleco reflectivo	Mangas (Camiseta/Vaqueta)	Arnés Seguridad multipropósito	Eslinga posicionamiento	Eslinga en Y con absorvedor de energía	Mosquetones	Frenos	Línea de Vida certificada	
13/11/2024	X						X				X			X						X							X						X										Silvio Quiñones
28/11/2024														X					X																								Silvio Quiñones
12/12/2024			X											X						X			X														X	X		X	X	X	Silvio Quiñones
17/12/2024														X						X			X																				Silvio Quiñones
03/01/2025		-																	X																								Silvio Quiñones
27/01/2025							X							X					X																			X	X		X	X	X	Silvio Quiñones

Diligencie en la casillas el numero de elementos entregados.

NOTA: Identifique aquí EPP que no estén en el listado:

ELABORA

Nombre: Cristian Camilo López

Fecha: 13/11/24

Firma:

Notas: 1. Una vez recibida la compra, se entregan a los trabajadores los EPP quienes firman en señal de recibido conforme y compromiso de utilizarlos adecuadamente.
2. Con la firma de recibido de estos elementos, "Acepta que ha recibido los EPP adecuados y se compromete a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979, Código Sustantivo del Trabajo, Ley 9 Artículo III, Decreto 1295 de 1994 y demás dispociones legales vigentes".

Powered by CamScanner

Dánes

ENTREGA DE EPP Y/O DOTACION

CODIGO: UC-REG-4.4.1-03
PAGINA: 1 DE 1

Nombre del Trabajador: Oscar Ivan Guali Cuellar **Cargo:** Ayudante de obra **Proceso:** Obra.

Empresa: DANES INGENIEROS S.A.S **Proyecto:** CONSTRUCCIÓN CUBIERTA AUTOPORTANTE VEREDA LOS ANDES - SAN AGUSTÍN (H)

Elementos de Protección Personal

Fecha de entrega	CABEZA		OJOS					CARA			OÍDOS		RESPIRATORIA						MANOS								PIES/PIERNAS				CUERPO								TRABAJOS ALTURA					Firma: Acepto que he recibido los EPP adecuados y me comprometo a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979, Código Sustantivo del Trabajo, Ley 9 Artículo III, Decreto 1295 de 1994 y demás dispociones legales vigentes.
	Casco Dieléctrico	Casco con Barbuquejo	Gafas De Seguridad transparentes	Careta de soldador	Careta de Esmeriar	Monogafas	Gafas de seguridad lentes oscuros	Careta soldador	Monja protector de cuello	Careta Para Esmeriar	Protector Auditivo Tipo Tapón	Protector Auditivo Tipo Copa	Respirador Humos Metálicos	Respiradores desechables	Respirador para material particulado (incluye Eicon)	Gases y Vapores	Vapores orgánicos y gases ácidos	Químicos y pinturas en spray	Guante Resistente en Nitrilo	Vaqueta o ingeniero largos	Guantes para soldador	Carnaza	Malla puntos	Guante de caucho industrial	Guante de nitrilo	guantes dieléctrico	Botas seguridad con puntera reforzada suela	Botas Caucho con puntera reforzada	Calzado dieléctrico	Bota de seguridad caña alta	Overol en carnaza o vaqueta	Overol de cuerpo entero Con reflectivo	Chaqueta y pantalón en jean	Overol de dos pazas en gril	Impermeable chaqueta pantalón con material	Chaleco reflectivo	Mangas (Carnaza/Vaqueta)	Arnés Seguridad multipropósito	Eslinga Posicionamiento	Eslinga en Y con absorvedor de energía	Mosquetones	Frenos	Línea de Vida certificada	
03/01/2025	X						X							X						X							X						X											Oscar I. Guali
16/01/2025														X					X																									Oscar I. Guali
27/01/2025			X																X																				X			X	Oscar I. Guali

Diligencie en la casillas el numero de elementos entregados.

NOTA: Identifique aquí EPP que no estén en el listado:

ELABORA

Nombre: Cristian Camilo López.
Fecha: 08/01/25
Firma:

Notas: 1. Una vez recibida la compra, se entregan a los trabajadores los EPP quienes firman en señal de recibido conforme y compromiso de utilizarlos adecuadamente.
2. Con la firma de recibido de estos elementos, "Acepta que ha recibido los EPP adecuados y se compromete a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979, Código Sustantivo del Trabajo, Ley 9 Artículo III, Decreto 1295 de 1994 y demás dispociones legales vigentes".

VERSIÓN 7- FEBRERO 23 DE 2017

Powered by CamScanner

Daves	ENTREGA DE EPP Y/O DOTACION	CODIGO: UC-REG-4.4.1-03 PAGINA: 1 DE 1

Nombre del Trabajador: Oscar Alexander Zuluaga Li7. **Cargo:** Maestro de obra. **Proceso:** Obra.

Empresa: DANES INGENIEROS S.A.S **Proyecto:** CONSTRUCCIÓN CUBIERTA AUTOPORTANTE VEREDA LOS ANDES - SAN AGUSTÍN (H)

Elementos de Protección Personal

Fecha de entrega	CABEZA		OJOS					CARA			OÍDOS		RESPIRATORIA						MANOS								PIES/PIERNAS				CUERPO							TRABAJOS ALTURA					Firma: Acepto que he recibido los EPP adecuados y me comprometo a usarlos conforme a lo establecido por la Resolución 2400 de 1979, Código Sustantivo del Trabajo, Ley 9 Artículo III, Decreto 1295 de 1994 y demás disposiciones legales vigentes.
																Gases y Vapores																					Eslinga					
	Casco Dieléctrico	Casco con Barbuquejo	Gafas De Seguridad transparentes	Careta de soldador	Careta de Esmeriler	Monogafas	Gafas de seguridad lentes oscuros	Careta soldador	Monja protector de polvo	Careta Para Esmeriler	Protector Auditivo Tipo Tapón	Protector Auditivo Tipo Copa	Respirador Humos Metálicos	Respiradores desechables	Respirador para material particulado (media y Silice)	Vapores orgánicos	Vapores orgánicos y gases ácidos	Químicos y pinturas en spray	Guante Recubierto en Nitrilo	Vaqueta o ingeniero largos	Guantes para soldador	Carnaza	Mezza puntos	Guante de caucho industrial	Guante de nitrilo	guantes dieléctrico	Botas seguridad con puntera reforzada suela	Botas Caucho con puntera reforzada	Calzado dieléctrico	Bota de seguridad caña alta	Overol en carnaza o vaqueta	Overol de cuerpo entero Con reflectivo	Chaqueta y pantalón en jean	Overol de dos piezas en dril	Impermeable chaqueta y pantalón con material	Chaleco reflectivo	Mangas (Carnaza/Vaqueta)	Arnés Seguridad multipropósito	Posicionamiento	Eslinga en Y con absorvedor de energía	Mosquetones	Frenos	Línea de Vida certificada	
03/01/2025	X						X				X			X						X							X						X										Oscar D. Zuluaga
20/01/2025														X						X																								Oscar D. Zuluaga.
30/01/2025			X																X																			X	X		X			Oscar D. Zuluaga.

ANEXO 5. Charlas pre operacionales

	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Código:	FT-SST-016
Danes		Código:	2/08/2023
	DANES INGENIEROS S.A.S	Versión	1

OBJETO DE DIVULGACIÓN O REUNIÓN	Lugar	DD	MM	AA
Charla pre operacional	Polideportivo Vda. Los Andes	08	01	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Trabajo en equipo.
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Robinson Arcos	1.082.772.137	Ayudante.	ROBINSON ARCOS
2	Wilmar A. Jimenez M.	80.826.744	Ing. Residente	
3	Oscar Ivan Guali	1.081.392.872	Ayudante	Oscar I. Guali
4	Jorge Armando Hoyos	1.082.774.946	Ayudante	Jorge Hoyos
5	Silvio Quiñones	1.061.986.149	Ayudante	Silvio Quiñones
6	William Arcos Hoyos	1.082.772.716	Ayudante	William Arcos Hoyos
7	Oscar A. Zuluaga	76.006.590	Maestro	Zuluaga.
8	Enilso Samboni	1.061.985.531	Ayudante	EnilsoSamboni.
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	Firma
Cristian Camilo López	

Powered by CamScanner

	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Código:	FT-SST-016
Danes		Código:	2/08/2023
	DANES INGENIEROS S.A.S	Versión	1

OBJETO DE DIVULGACIÓN O REUNIÓN	Lugar	DD	MM	AA
Charla preoperacional	Polideportivo Los Andes	10	01	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Manejo Integral de Residuos Sólidos
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Silvio Quiñonez	1.061.986.149	Ayudante	
2	Jorge Armando Hoyos	1.082.774.946	Ayudante	
3	Enivo Samboni M.	1.061.985.531	Ayudante	
4	Oscar Ivan Guali	1.081.392.872	Ayudante	
5	Oscar A. Zuluaga	76.306.590	Maestro	
6	Wilmar A. Jimenez	80.826.744	Ing. Residente	
7	William Arcos Hoyos	1.082.772.716	Ayudante	
8	Robinson Arcos	1.082.772.137	Ayudante	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Cristian Camilo López	

Powered by CamScanner

	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Código:	FT-SST-016
Dánes		Código:	2/08/2023
	DANES INGENIEROS S.A.S	Versión	1

OBJETO DE DIVULGACIÓN O REUNIÓN	Lugar	DD	MM	AA
Charla pre-operacional	Polideportivo Vda. los Andes	14	01	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Uso y cuidado de los EPP.
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Oscar Ivan Gual!	1.081.392.872	Ayudante	Oscar I. Gual!
2	Wilmer A. Jimenez	80.826.744	Ing. Residente	
3	Oscar A. Zuluaga	76.006.590	Maestro	Oscar A Zuluaga.
4	Silvio Quiñonez	1.061.986.149	Ayudante.	Silvio Quiñones
5	Jorge Armando Hoyos	1.082.774.946	Ayudante	Jorge Hoyos
6	Robinson Arcos	1.082.772.137	Ayudante	ROBINSON ARCOS
7	Emiro Samboni	1.061.985.531	Ayudante	Emiro Sambonì
8	Wilian Arcos Hoyos	1.082.772.716	Ayudante	Wilian Arcos Hoyos
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	**Firma**
Cristian Camilo López	

Powered by CamScanner

	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Código:	FT-SST-016
Danes		Código:	2/08/2023
	DANES INGENIEROS S.A.S	Versión	1

OBJETO DE DIVULGACIÓN O REUNIÓN	Lugar	DD	MM	AA
Charla pre-operacional	Polideportivo Vda. los Andes	17	01	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Actos inseguros y condiciones inseguras
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Jorge Armando Hoyos	1.082.774.946	Ayudante	Jorge Hoyos
2	Willian Arcos Hoyos	1.082.772.716	Ayudante	Willian Arcos Hoyos
3	Silvio Quiñones	1.061.986.149	Ayudante	Silvio Quiñones
4	Oscar A. Zuluaga	76.006.590	Maestro	Oscar A. Zuluaga
5	Wilmer A. Jimenez	80.826.744	Ing. Residente	
6	Emiro Samboni	1.061.785.531	Ayudante	Emiro Samboni
7	Oscar Ivan Guali	1.081.392.872	Ayudante	Oscar I. Guali
8	Robinson Arcos	1.082.772.137	Ayudante	ROBINSON ARCOS
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	**Firma**
Cristian Camilo López	

Powered by CamScanner

	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Código:	FT-SST-016
Danes		Código:	2/08/2023
	DANES INGENIEROS S.A.S	Versión	1

OBJETO DE DIVULGACIÓN O REUNIÓN	Lugar	DD	MM	AA
Charla preoperacional	Polideportivo Vda. Los Andes	21	01	23

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Cuidado y protección de las manos
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	William Arcos	1.082.772.716	Ayudante	William Arcos Hoyos
2	Silvio Quiñones	1.061.986.149	Ayudante	Silvio Quiñones
3	Emiro Samboni	1.061.985.531	Ayudante	emiro Samboni
4	Oscar Ivan Gyal.	1.081.392.872	Ayudante	Oscar I. Gyal.
5	Wilnar A. Jimenez	80.826.744	Ing. Residente	
6	Oscar A. Zuluaga.	76.006.590	Maestro.	Oscar A Zuluaga
7	Robinson Arcos	1.082.772.137	Ayudante	ROBINSON ARCOS
8	Jorge Armando Hoyos	1.082.774.946	Ayudante	Jorge Hoyos
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	**Firma**
Cristian Camilo López	

Powered by CamScanner

	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Código:	FT-SST-016
Danes		Código:	2/08/2023
	DANES INGENIEROS S.A.S	Versión	1

OBJETO DE DIVULGACIÓN O REUNIÓN	Lugar	DD	MM	AA
Charla pre-operacional	Polideportivo Vda. los Andes	24	01	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Riesgo ergonómico (manipulación de carga, transporte de carga, higiene postural).
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación específica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Oscar A. Zuluaga	76.006.590	Maestro	Oscar A. Zuluaga.
2	Jorge Armando Hoyos	1.082.774.946	Ayudante	Jorge Hoyos
3	Robinson Arcos Torres	1.082.772.137	Ayudante	ROBINSON ARCOS
4	Oscar Ivan Guali.	1.082.392.872	Ayudante	Oscar I. Guali
5	Emiro Samboni M.	1.061.985.531	Ayudante	emiro Samboni
6	William Arcos	1.082.772.716	Ayudante	William Arcos Hoyos
7	Wilmar A. Jimnet	80.826.744	Ing. Residente	
8	Silvio Quiñonez	1.061.986.149	Ayudante	Silvio Quiñonez
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Cristian Camilo López	

Powered by CamScanner

	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Código:	FT-SST-016
		Código:	2/08/2023
	DANES INGENIEROS S.A.S	Versión	1

OBJETO DE DIVULGACIÓN O REUNIÓN	Lugar	DD	MM	AA
Charla pre operacional	Polideportivo Vda. Los Andes	27	01	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	Y	Uso y manejo de equipos para trabajo en Alturas
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Emiro Samboni	1.061.985.531	Ayudante	emiro Sambon
2	Silvio Quiñones	1.061.986.149	Ayudante	Silvio Quiñones
3	Wilmar A. Jimenez	80.826.744	Ing. residente	
4	William Arcos	1.082.772.716	Ayudante.	William Arcos Hoyos
5	Oscar Ivan Gual	1.081.392.872	Ayudante.	Oscar I. Gual
6	Robinson Arcos	1.082.772.137	Ayudante	ROBINSON ARCOS
7	Jorge Armando Hoyos	1.082.774.946	Ayudante	Jorge Hoyos
8	Oscar A. Zuluaga	76.006.590	Maestro.	Oscar A. Zuluaga.
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	**Firma**
Cristian Camilo Lopez	

Powered by CamScanner

	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Código:	FT-SST-016
		Código:	2/08/2023
	DANES INGENIEROS S.A.S	Versión	1

OBJETO DE DIVULGACIÓN O REUNIÓN	Lugar	DD	MM	AA
Charla Pre-operacional	Polideportivo Vda. Los Andes	29	01	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Equipos para trabajo en alturas.
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Wilmer Armando Suarez	80.826.744	Ing. Residente	
2	Emiro Sambori M.	1061.985.531	Ayudante	Emiro Sambori
3	Jorge Armando Hoyos	1.082.774.946	Ayudante	Jorge Hoyos
4	Oscar A. Zuluaga.	76.006.590	Maestro	Oscar A. Zuluaga
5	Silvio Quiñonez Sambori	1.061.980.149	Ayudante	Silvio Quiñones
6	Robinson Arcos Torres	1.082.772.137	Ayudante	ROBINSON ARCOS
7	Oscar Ivan Gil.	1.081.392.872	Ayudante	Oscar Ivan Gil
8	William Arcos	1.082.772.716	Ayudante	William Arcos Hoyos
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Cristian Camilo López	

Powered by CamScanner

ANEXO 6. Análisis de Trabajo Seguro – ATS

Dánes	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-094
	☑ SG-SST	
FORMATO DE ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 30/2021
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

ACTIVIDAD/TAREA: Instalación de acero para viga canal.						INSTALACIÓN / LOCACIÓN / SECCIÓN: Polideportivo Vda. Los Andes				
AREA: Obra.			FECHA: 10/01/2025			AST N°: 05	Página 1 de 1			
N°	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	QUE PUEDE FALLAR / PELIGROS / RIESGOS	QUE PUEDE PASAR / CONSECUENCIAS			COMO EVITAR EL INCIDENTE / BARRERAS EXISTENTES	C	P	R	BARRERAS ADICIONALES
			PERSONA	EQUIPO	AMBIENTE					
1	Inspección y alistamiento de acero	Manejo inadecuado de herramientas	Golpes y Fracturas	Daños		Uso de mantillas Uso de EPP		X		
2		Manipulación inadecuada de cargas y masa corporal.	Lesiones musculares.			Higiene Postural		Y		
3		Superficies a distinto nivel	Caída Golpes			Señalización área, orden y aseo		X		
4	Cargue y descargue de materiales.	Izaje de cargas	Aplastamiento Caídas			plan de Izaje Llenar acorde		Y		
5		Movimiento repetitivo y manejo de cargas	Dolor Lumbar Agotamiento			Llenar pero máx. Pausas activas		Y		
6	Corte de varillas	Uso de pulidora.	Heridas Golpes		M.P.	Inspección herramientas Uso guarda Seguridad.		Y		
7	Figurar acero, encofrado y formaletas	Exposición al sol. Manejo sustancias químicas	Insolación Deshidratación			Punto de hidratación Uso de EPP		Y		
8										
9										
10										

QUE HACER SI ALGO FALLA: Dar aviso al supervisor; prestar primeros auxilios; en caso de requerir, trasladar al centro hospitalario cercano.	EL SUPERVISOR ES: Oscar A. Zuluaga - Maestro de obra.		
SOLICITANTE: Oscar A. Zuluaga	APROBÓ: Wilmar A. Jimenez.	PORTADOR: maestro de obra.	RESPONSABLE O AUTORIZADO DEL ÁREA: Wilmar A. Jimenez

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Código: FT-SST-094
			Fecha de modificación: Julio 30/2021

Powered by CamScanner

Dánes	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-094
	☑ SG-SST	
FORMATO DE ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 30/2021
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

ACTIVIDAD/TAREA: fundición de concreto para viga canal.

INSTALACIÓN / LOCACIÓN / SECCIÓN: Polideportivo Vda. Los Andes.

AREA: Obra.

FECHA: 10/01/2025

AST N°: 06

Página 1 de 1

N°	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	QUE PUEDE FALLAR / PELIGROS / RIESGOS	QUE PUEDE PASAR / CONSECUENCIAS			COMO EVITAR EL INCIDENTE / BARRERAS EXISTENTES	C	P	R	BARRERAS ADICIONALES
			PERSONA	EQUIPO	AMBIENTE					
1	Ingreso al área de fundición y alistamiento	Caída de objetos desde las alturas	Lesiones Golpes			Uso de EPP y equipo de Alturas		X		
2	Armado de formaletas	Caídas, golpes, machucones	Lesiones Golpes,			Uso de EPP y equipo trabajo en alturas		X		
3	Fundición	Golpes, cargas, caídas	Lesiones Golpes			Uso de EPP y equipo trabajo en alturas		X		
4	Orden y Aseo	Físicos, locativo, caídas	Golpes, alergias			Socialización áreas, uso EPP		X		
5										
6										
7										
8										
9										
10										

QUE HACER SI ALGO FALLA:
Dar aviso al supervisor; prestar primeros auxilios, en caso de requerir, trasladar al centro hospitalario más cercano.

EL SUPERVISOR ES:
Oscar A. Zuluaga - Maestro de obra.

SOLICITANTE:	APROBÓ:	PORTADOR:	RESPONSABLE O AUTORIDAD DEL ÁREA:
Oscar A. Zuluaga.	Wilmar A. Jimenez Londoño.	Maestro de obra.	Wilmar A. Jimenez

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Código: FT-SST-094
			Fecha de modificación: Julio 30/2021

Powered by CamScanner

ANEXO 1. RESULTADO DE ENSAYOS Y PRUEBA DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO

LEON GROUP

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E 410 - 13 / NTC 673

VERSION N° 1
FECHA VERSION: 19/07/2023
CLA-ECS-NTC673

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA

PERIODO: 7/12/2024 AL 4/01/2025

SOLICITANTE: DANES INGENIEROS S.A.S **NIT:** 900.219.918 - 2 **DIRECCION:** VEREDA LOS ANDES - SAN AGUSTÍN (H)

INFORME 1 **FECHA** 4/01/2025


CILINDRO Nº	ELEMENTO FUNDIDO	ABCISA ELEMENTO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ROTURA	DIAS	RESISTENCIA DE DISEÑO		EDAD (Dias) (digitar x para muestra o t para testigo)				DIAMETRO MUESTRA		LONGITUD MUESTRA		PESO (g)		CARGA APLICADA		TIPO DE FALLA	AREA MUESTRA		VOLUMEN		DENSIDAD		RESISTENCIA OBTENIDA		PORCENTAJE ALCANZADO	RESISTENCIA ESPERADA		PORCENTAJE ESPERADO	ASCENTAMIENTO (SLUMP)	OBSERVACIONES DE LA MUESTRA
						(Psi)	(Mpa)	3	7	14	28	(mm)	(in)	(mm)	(in)	(g)	(Kg)	(Lbf)	(KN)		(mm2)	(in2)	(mm3)	(in3)	(Kg/m3)	(lb/ft3)	(Mpa)	(PSI)		(Mpa)	(PSI)		(In)	
1	ZAPATAS	A3 - B2	7/12/2024	14/12/2024	7	3000	20.67		X			99.0	3.9	201.0	7.9	3550.0	3.55	23578	104.9	5.0	7697.7	11.9	1547235.2	94.4	2294.4	143.2	14.54	2109	71%	14.5	2100.0	70%		
				14/12/2024	7		20.67		X			99.0	3.9	201.0	7.9	3550.0	3.55	24474	108.9	5.0	7697.7	11.9	1547235.2	94.4	2294.4	143.2	14.39	2087	70%	14.5	2100.0	70%		
				21/12/2024	14		20.67			X		99.0	3.9	201.0	7.9	3550.0	3.55	28107	125.0	5.0	7697.7	11.9	1547235.2	94.4	2295.1	143.2	18.94	2746	92%	18.6	2700.0	90%		
				21/12/2024	14		20.67			X		99.0	3.9	201.0	7.9	3550.0	3.55	28499	126.8	3.0	7697.7	11.9	1547235.2	94.4	2295.7	143.3	19.04	2761	93%	18.6	2700.0	90%		
				4/01/2025	28		20.67				X	99.0	3.9	201.0	7.9	3550.0	3.55	32172	143.1	5.0	7697.7	11.9	1547235.2	94.4	2296.4	143.3	21.29	3087	103%	20.7	3000.0	100%		
				4/01/2025	28		20.67				X	99.0	3.9	201.0	7.9	3550.0	3.55	34154	151.9	2.0	7697.7	11.9	1547235.2	94.4	2294.4	143.2	21.54	3124	105%	20.7	3000.0	100%		

OBSERVACIONES: RESISTENCIA % (3 DIAS 40% - 7 DIAS 70% - 14 DIAS 90% - 28 DIAS 100%) Segun norma tecnica 500/630-13 (INVIAS-13/NTC 321)

La muestra de concreto de nomenclatura CR_# pertenecen al codigo interno del laboratorio para la identificacion de las muestra.

INFORME No.1 MUESTRA TOMADAS EN SITU Y TRANSPORTADAS AL LABORATORIO CENTRAL POR EL CLIENTE





VoBo LIBIAL ANGEL ALVAREZ

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO

MANUEL ANDRES SACAMANCA
LABORATORISTA

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E 410 - 13 / NTC 673	VERSION N° 1 FECHA VERSION: 19/07/2023 CLA-LECS-NTC673

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA — **PERIODO:** 10/12/2024 AL 07/01/2025

SOLICITANTE: DANES INGENIEROS S.A.S — **NIT:** 900.219.918 - 2 — **DIRECCION:** VEREDA LOS ANDES - SAN AGUSTÍN (H) — **INFORME** 2 **FECHA** 07/01/2025


CILINDRO Nº	ELEMENTO FUNDIDO	ABCISA ELEMENTO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ROTURA	DIAS	RESISTENCIA DE DISEÑO		EDAD (Dias) (digitar x para muestra o t para testigo)				DIAMETRO MUESTRA		LONGITUD MUESTRA		PESO (g)		CARGA APLICADA		TIPO DE FALLA	AREA MUESTRA		VOLUMEN		DENSIDAD		RESISTENCIA OBTENIDA		PORCENTAJE ALCANZADO	RESISTENCIA ESPERADA		PORCENTAJE ESPERADO	ASCENTAMIENTO (SLUMP)	OBSERVACIONES DE LA MUESTRA
						(Psi)	(Mpa)	3	7	14	28	(mm)	(in)	(mm)	(in)	(g)	(Kg)	(Lbf)	(KN)		(mm2)	(in2)	(mm3)	(in3)	(Kg/m3)	(lb/ft3)	(Mpa)	(PSI)		(Mpa)	(PSI)		(In)	
1	PEDESTAL	A4 - B3	10/12/2024	17/12/2024	7	3000	20.67		X			99.0	3.9	201.0	7.9	3550.0	3.55	23785	105,8	5,0	7697,7	11,9	1547235,2	94,4	2294,3	143,2	14,55	2110	71%	14.5	2100.0	70%		
				17/12/2024	7		20.67		X			99.0	3.9	201.0	7.9	3550.0	3.55	24352	108,3	5,0	7697,7	11,9	1547235,2	94,4	2294,1	143,2	14,46	2097	70%	14.5	2100.0	70%		
				24/12/2024	14		20.67			X		99.0	3.9	201.0	7.9	3550.0	3.55	29321	130,4	2,0	7697,7	11,9	1547235,2	94,4	2295,7	143,3	19,2	2784	93%	18.6	2700.0	99%		
				24/12/2024	14		20.67			X		99.0	3.9	201.0	7.9	3550.0	3.55	28975	128,9	5,0	7697,7	11,9	1547235,2	94,4	2295,3	143,3	18,78	2723	91%	18.6	2700.0	99%		
				07/01/2025	28		20.67				X	99.0	3.9	201.0	7.9	3552.0	3.55	33735	150,0	3.0	7697,7	11,9	1547235,2	94,4	2296,5	143,4	21,47	3114	104%	20.7	3000.0	103%		
				07/01/2025	28		20.67				X	99.0	3.9	201.0	7.9	3550.0	3.55	35126	156,3	2,0	7697,7	11,9	1547235,2	94,4	2296,7	143,4	21,10	3060	102%	20.7	3000.0	100%		

OBSERVACIONES: RESISTENCIA % / 3 DIAS 40% - 7 DIAS 70% - 14 DIAS 90% - 28 DIAS 100%) Según norma tecnica 5004630-13 (INVIAS-13/NTC 321)

La muestra de concreto de nomenclatura **CR** # pertenecen al codigo interno del laboratorio para la identificacion de las muestra.

INFORME No.1 MUESTRA TOMADAS EN SITU Y TRANSPORTADAS AL LABORATORIO CENTRAL POR EL CLIENTE





YAIR MAIKEL ANGEL ALVAREZ

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO

MANUEL ANDRES SACAMANCA
LABORATORISTA

Servi.Lab Ingeniería Laboratorio — Suelos - Pavimentos - Concretos - Materiales	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA DE ENSAYO INV E - 410	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

CLIENTE	DANES INGENIEROS SAS	ORDEN DE SERVICIO	SL-2412-24
PROYECTO	CONSTRLCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA	FECHA REPORTE	10 DE ENERO DE 2025
LOCALIZACION	VEREDA LOS ANDES, SAN AGUSTÍN - HUILA		

RESULTADOS DE LABORATORIO

MUESTRA No.	DESCRIPCION	LOCALIZACION	SLUMP	RC DISEÑO P.S.I.	FECHA		EDAD ROTURA (DÍAS)	FUERZA LB	DIAMETRO cm	RESISTENCIA A LA COMPRESION - PSI	
					TOMA	ROTURA				OBTENIDA (PSI)	% REFERIDA DISEÑO
1	VIGA DE CIMENTACIÓN EJE A	EJE A	4 PULG	3000	12-dic-24	19-dic-24	7	27995	10,00	**2300,33**	**76,68%**
2	VIGA DE CIMENTACIÓN EJE A	EJE A	4 PULG	3000	12-dic-24	26-dic-24	14	33399	10,00	**2744,37**	**91,48%**
3	VIGA DE CIMENTACIÓN EJE A	EJE A	4 PULG	3000	12-dic-24	9-ene-25	28	37665	10,00	**3094,91**	**103,16%**
4	VIGA DE CIMENTACIÓN EJE B	EJE B	4 PULG	3000	13-dic-24	20-dic-24	7	27886	10,00	**2291,37**	**76,38%**
5	VIGA DE CIMENTACIÓN EJE B	EJE B	4 PULG	3000	13-dic-24	27-dic-24	14	33312	10,00	**2737,22**	**91,24%**
6	VIGA DE CIMENTACIÓN EJE B	EJE B	4 PULG	3000	13-dic-24	10-ene-25	28	37889	10,00	**3113,31**	**103,78%**

OBSERV.: **LAS MUESTRAS (CILINDROS) SON TOMADOS, CURADOS Y TRANSPORTADOS AL LABORATORIO POR EL CLIENTE**

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

REVISA

Las muestras son tomadas, transportadas y curadas por

Cliente — X

Servi. Lab Ingeniería

Las muestras tomadas por el cliente al término de 28 días cumplen con la resistencia a compresión f'c mínima requerida 3000 psi.

GEOT. JOSE HERNEY SOLARTE SOLARTE MAT. 1951600199CAU

Laboratorio Calle 31 No. 7 - 59 Tel. (8) 8644050
email:serv.lab.ing@hotmail.com Neiva - Huila

Servi.Lab Ingeniería Laboratorio *Suelos - Pavimentos - Concretos - Materiales*	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA DE ENSAYO INV E - 410	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

CLIENTE	DANES INGENIEROS SAS	ORDEN DE SERVICIO	SL-3612-24
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA	FECHA REPORTE	24 DE ENERO DE 2025
LOCALIZACION	VEREDA LOS ANDES, SAN AGUSTÍN - HUILA		

RESULTADOS DE LABORATORIO

MUESTRA No.	DESCRIPCION	LOCALIZACION	SLUMP	RC DISEÑO P.S.I.	FECHA		EDAD ROTURA (DÍAS)	FUERZA LB	DIAMETRO cm	RESISTENCIA A LA COMPRESION - PSI	
					TOMA	ROTURA				OBTENIDA (PSI)	% REFERIDA DISEÑO
1	COLUMNA EJE A	EJE A	4 PULG	3000	19-dic-24	26-dic-24	7	27885	10,00	2291,29	76,38%
2	COLUMNA EJE A	EJE A	4 PULG	3000	19-dic-24	2-ene-25	14	33412	10,00	2745,44	91,51%
3	COLUMNA EJE A	EJE A	4 PULG	3000	19-dic-24	16-ene-25	28	37822	10,00	3107,81	103,59%
4	COLUMNA EJE B	EJE B	4 PULG	3000	20-dic-24	27-dic-24	7	27662	10,00	2272,97	75,77%
5	COLUMNA EJE B	EJE B	4 PULG	3000	20-dic-24	3-ene-25	14	33102	10,00	2719,97	90,67%
6	COLUMNA EJE B	EJE B	4 PULG	3000	20-dic-24	17-ene-25	28	37442	10,00	3076,58	102,55%
7	VIGA CANAL EJE A	EJE A	4 PULG	3000	27-dic-24	3-ene-25	7	27485	10,00	2258,42	75,28%
8	VIGA CANAL EJE A	EJE A	4 PULG	3000	27-dic-24	10-ene-25	14	33117	10,00	2721,20	90,71%
9	VIGA CANAL EJE A	EJE A	4 PULG	3000	27-dic-24	24-ene-25	28	37643	10,00	3093,10	103,10%
10	VIGA CANAL EJE B	EJE B	4 PULG	3000	10-ene-25	17-ene-25	7	27668	10,00	2273,46	75,78%
11	VIGA CANAL EJE B	EJE B	4 PULG	3000	10-ene-25	24-ene-25	14	33106	10,00	2720,30	90,68%

OBSERV.: LAS MUESTRAS (CILINDROS) SON TOMADOS, CURADOS Y TRANSPORTADOS AL LABORATORIO POR EL CLIENTE

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

REVISA

Las muestras son tomadas, transportadas y curadas por		Las muestras tomadas por el cliente al término de 28 dias cumplen con la resistencia a compresión f'c mínima requerida 3000 psi.
Cliente	X	
Servi. Lab Ingenieria		

GEOT. JOSE HENRY SOLARTE SOLARTE MAT. 1951600199CAU

Laboratorio Calle 31 No. 7 - 59 Tel. (8) 8644050
email:serv.lab.ing@hotmail.com Neiva - Huila

ANEXO 3. REGISTRO DEL TIEMPO EN EL SITIO DE OBRA

CONTROL DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO


MES ENERO - 2025 CONTRATO No. CLPIH383-2024 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA DANES INGENIEROS S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	ENERO DE 2025																													
DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Clase de tiempo																															
Seco	16	15	14	13	14	9	24	19	21	24	18	24	21	24	24	24	20	22	22	24	24	24	24	18	14	11	17	20	9	19	15
Lluvias moderadas	6	5	7	6	8	11	0	3	3	0	4	0	3	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	4	7	10	5	3	12	4	7
Lluvias intensas	2	4	3	5	2	4	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	3	3	2	1	3	1	2

NOTA: EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

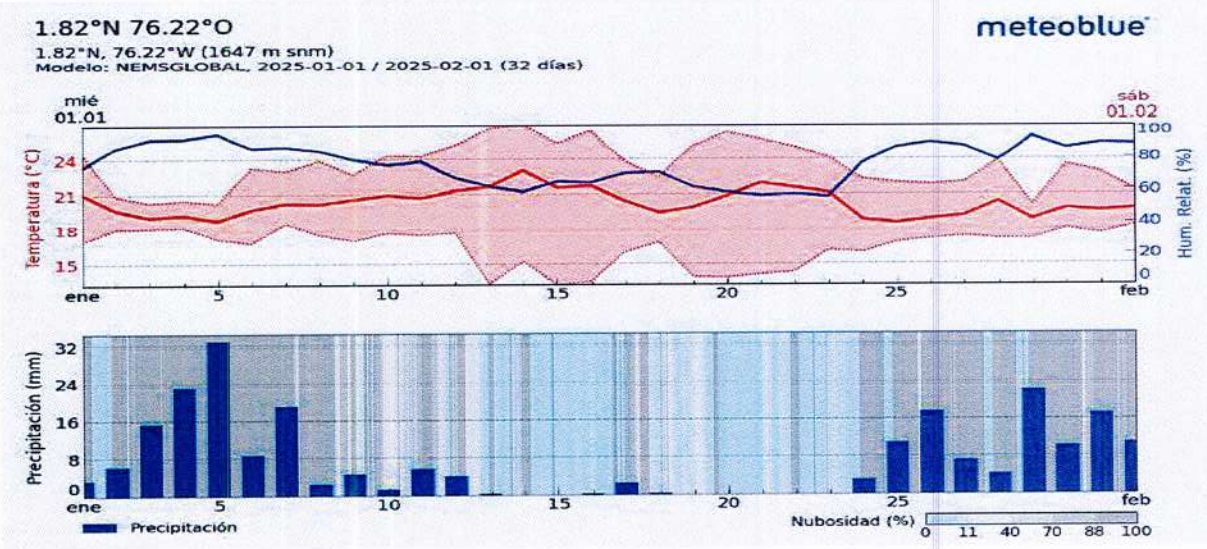

ANEXO 4. SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP)

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	32850249	9480094655	E	2025/01/08	2025/01/09	BANCO DE OCCIDENTE	1	$2,693,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: NEIVA (11 Afiliados)							$9,230,002	$1,477,000			$9,230,002	$369,400			$9,230,002	$369,400			$9,230,002	$475,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PERSONAL ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
1	CC	7719364	FIERRO NESTOR		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	36067241	MEDINA SANDRA		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PERSONAL DE OBRA (9 Afiliados)							$6,630,002	$1,061,000			$6,630,002	$265,400			$6,630,002	$265,400			$6,630,002	$461,800		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (9 Afiliados)							$6,630,002	$1,061,000			$6,630,002	$265,400			$6,630,002	$265,400			$6,630,002	$461,800		$0	$0
3	CC	1082772137	ARCOS ROBINSON		230301	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF32	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
4	CC	1082772716	ARCOS WILIAN		230301	8	$346,667	$55,500	EPS037	8	$346,667	$13,900	CCF32	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
5	CC	1082774946	HOYOS JORGE		230301	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF32	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
6	CC	80926744	JIMENEZ WILMAR		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
7	CC	1075220858	LOPEZ CRISTIAN		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
8	CC	7705022	MARTINEZ CARLOS		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
9	CC	1061986149	QUIÑONEZ SILVIO		230201	6	$260,000	$41,600	ESSC62	6	$260,000	$10,400	CCF32	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$18,100	6	$0	$0
10	CC	1061985531	SAMBONI EMIRO		230301	5	$216,667	$34,700	ESSC62	5	$216,667	$8,700	CCF32	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0
11	CC	12137587	TOVAR JOSE		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(11)**						$9,230,002	$1,477,000			$9,230,002	$369,400			$9,230,002	$369,400			$9,230,002	$475,400		$0	$0

2025/01/09 04:20 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	32850249	9480094655	E	2025/01/08	2025/01/09	BANCO DE OCCIDENTE	1	$2,693,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$1,477,000	$1,100	$0	$1,478,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$200	$0	$208,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$811,400	$600	$0	$812,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$457,600	$300	$0	$457,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$475,400	$300	$0	$475,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$475,400	$300	$0	$475,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$369,400	$300	$0	$369,700
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	$369,400	$300	$0	$369,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$369,400	$400	$0	$369,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$19,100	$100	$0	$19,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$298,300	$200	$0	$298,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$100	$0	$52,100
TOTAL				11	$2,691,200	$2,100	$0	$2,693,300

2025/01/09 04:20 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057304693		RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mirador de las lomas manzana 28 casa 4	MANIZALES-CALDAS	8728181	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1283466670	9481729478	I	2025/02/21	2025/02/21	BANCO DAVIVIENDA	0	$504,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900
1	CC	1057304693	RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$504,900
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057304693		RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mirador de las lomas manzana 28 casa 4	MANIZALES-CALDAS	8728181	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1283466670	9481729478	I	2025/02/21	2025/02/21	BANCO DAVIVIENDA	0	$504,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$504,900	$0	$0	$504,900

2025/05/19 08:03 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	37650014	9481408682	E	2025/02/06	2025/02/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,604,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF			RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: NEIVA (11 Afiliados)							$9,062,950	$1,450,600			$9,062,950	$362,900			$8,560,719	$342,800			$9,062,950	$448,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PERSONAL ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0
1	CC	7719364	FIERRO NESTOR		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
2	CC	36067241	MEDINA SANDRA		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PERSONAL DE OBRA (9 Afiliados)							$6,215,950	$995,000			$6,215,950	$248,900			$5,713,719	$228,800			$6,215,950	$433,200		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (9 Afiliados)							$6,215,950	$995,000			$6,215,950	$248,900			$5,713,719	$228,800			$6,215,950	$433,200		$0	$0
3	CC	1082772137	ARCOS ROBINSON		230301	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF32	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
4	CC	1082772716	ARCOS WILIAN		230301	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF32	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
5	CC	1081392872	GUALI OSCAR		230301	9	$427,050	$68,400	EPS037	9	$427,050	$17,100	CCF32	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0
6	CC	1082774946	HOYOS JORGE		230301	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF32	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
7	CC	80926744	JIMENEZ WILMAR		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
8	CC	7705022	MARTINEZ CARLOS		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
9	CC	1061986149	QUIÑONEZ SILVIO		230201	6	$284,700	$45,600	ESSC62	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
10	CC	1061985531	SAMBONI EMIRO		230301	6	$284,700	$45,600	ESSC62	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
11	CC	76006590	ZULUAGA OSCAR		230201	29	$1,376,050	$220,200	EPSIC3	29	$1,376,050	$55,100	CCF32	29	$1,256,667	$50,300	14-11	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0
Total			**Afiliados(11)**				$9,062,950	$1,450,600			$9,062,950	$362,900			$8,560,719	$342,800			$9,062,950	$448,200		$0	$0

2025/02/06 04:23 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	37650014	9481408682	E	2025/02/06	2025/02/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,604,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$1,450,600	$0	$0	$1,450,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$729,200	$0	$0	$729,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$493,600	$0	$0	$493,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$448,200	$0	$0	$448,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$448,200	$0	$0	$448,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$342,800	$0	$0	$342,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	$342,800	$0	$0	$342,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$362,900	$0	$0	$362,900
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$55,100	$0	$0	$55,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$22,800	$0	$0	$22,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$285,000	$0	$0	$285,000
TOTAL				11	$2,604,500	$0	$0	$2,604,500


2025/02/06 04:23 PM

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CIHCM420 DE 2023

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 5

MENSUAL [X] **FINAL** [ ]

Objeto Contrato: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA."**

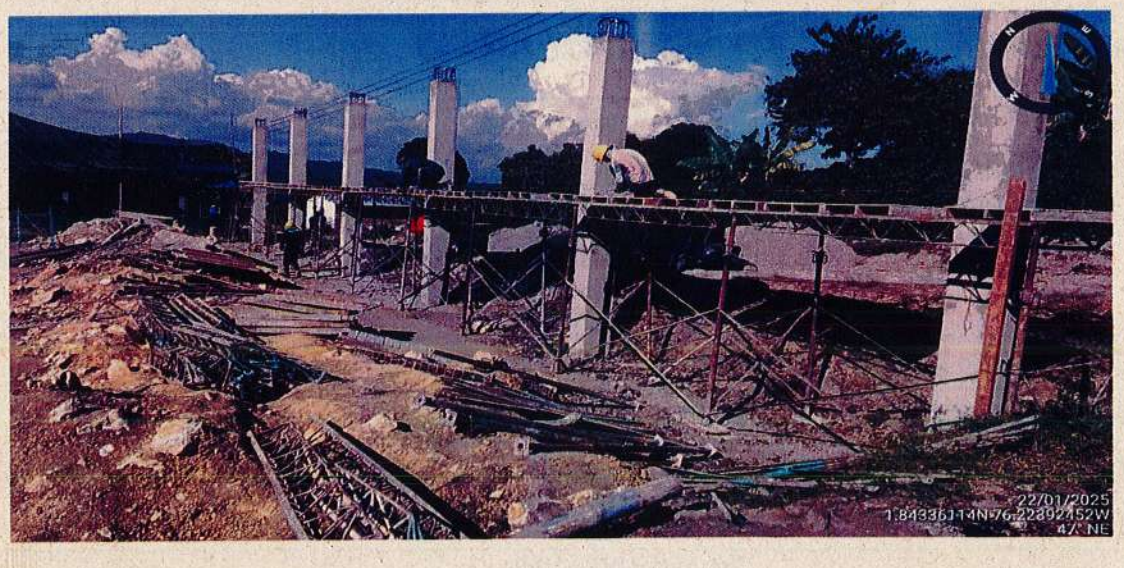

MUNICIPIO: **SAN AGUSTIN**

DEPARTAMENTO: **HUILA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CIHCM420 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO WF.


APOYO A LA SUPERVISIÓN	CESAR JOAQUÍN VELÁSQUEZ	**ENTIDAD**	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA			
CONTRATO No.	CIHCM420 DE 2023		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA	**PERIODO DEL INFORME**	DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE ENERO DEL 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO WF	**NIT:**	901.769.619 - 8.
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	**C.C:**	7.711.430 DE NEIVA
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	09 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16 DE NOVIEMBRE DE 2023		
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.		
FECHA DE SUSPENSION 1:	26 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE REINICIO 1:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
OTROSÍ No.1: 24/09/2024	MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA 4 -PLAZO DEL CONTRATO- VIGENCIA FISCAL.		
OTROSÍ No.2: 12/11/2024	Prórroga: VEINTE (20) DÍAS.		
OTROSÍ No.3: 02/12/2024	**Prórroga:** UN (1) MES-. **Adicional:** DOCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 12.573.718,00) M/CTE.		
OTROSÍ No.4: 27/12/2024	Prórroga: UN (1) MES- y TRES (3) DIAS.		
PLAZO ADICIONAL:	DOS (2) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS.		
PLAZO TOTAL:	CINCO (5) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE		

	PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.		
VALOR INICIAL:	OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($ 88.657.430,00) M/CTE.		
VALOR ADICIONAL:	DOCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 12.573.718,00) M/CTE.		
VALOR TOTAL:	CIENTO UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 101.231.148) M/CTE		
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.	CLPIH383 DE 2023		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA"	**PERIODO DEL INFORME**	DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE ENERO DEL 2025
CONTRATISTA	DANES INGENIEROS S.A.S	**NIT:**	900.219.918-2
REPRESENTANTE LEGAL:	NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA	**C.C:**	7.719.364 DE NEIVA (H)
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	01 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16 DE NOVIEMBRE DE 2023		
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.		
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:	21 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA ACTA DE REINICIO No.1:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024		
OTROSÍ N°1: 12/11/2024	MODIFICACIÓN CLÁUSULA 4 PLAZO DEL CONTRATO – VIGENCIA FISCAL.		
OTROSÍ N°2: 27/12/2024	MODIFICACIÓN CLÁUSULA 4 PLAZO DEL CONTRATO – PRÓRROGA DE UN (01) MES. MODIFICACIÓN CLÁUSULA 5 VALOR DEL CONTRATO – VALOR ADICIONAL DE SESENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($62.065.242,00) M/CTE.		
PLAZO ADICIONAL:	UN (01) MES.		
PLAZO TOTAL:	CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y		

	APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.		
VALOR INICIAL:	$ 506.549.699		
VALOR ADICIONAL:	$ 62.065.242,00		
VALOR TOTAL:	$ 568.614.941,00		
INTERVENTOR:	CONSOCIO WF	**NIT:**	901.769.619-8
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANÍA	**C.C:**	7.711.430 DE NEIVA (H)

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en la vereda Los Andes zona rural del municipio de San Agustín – Departamento del Huila.

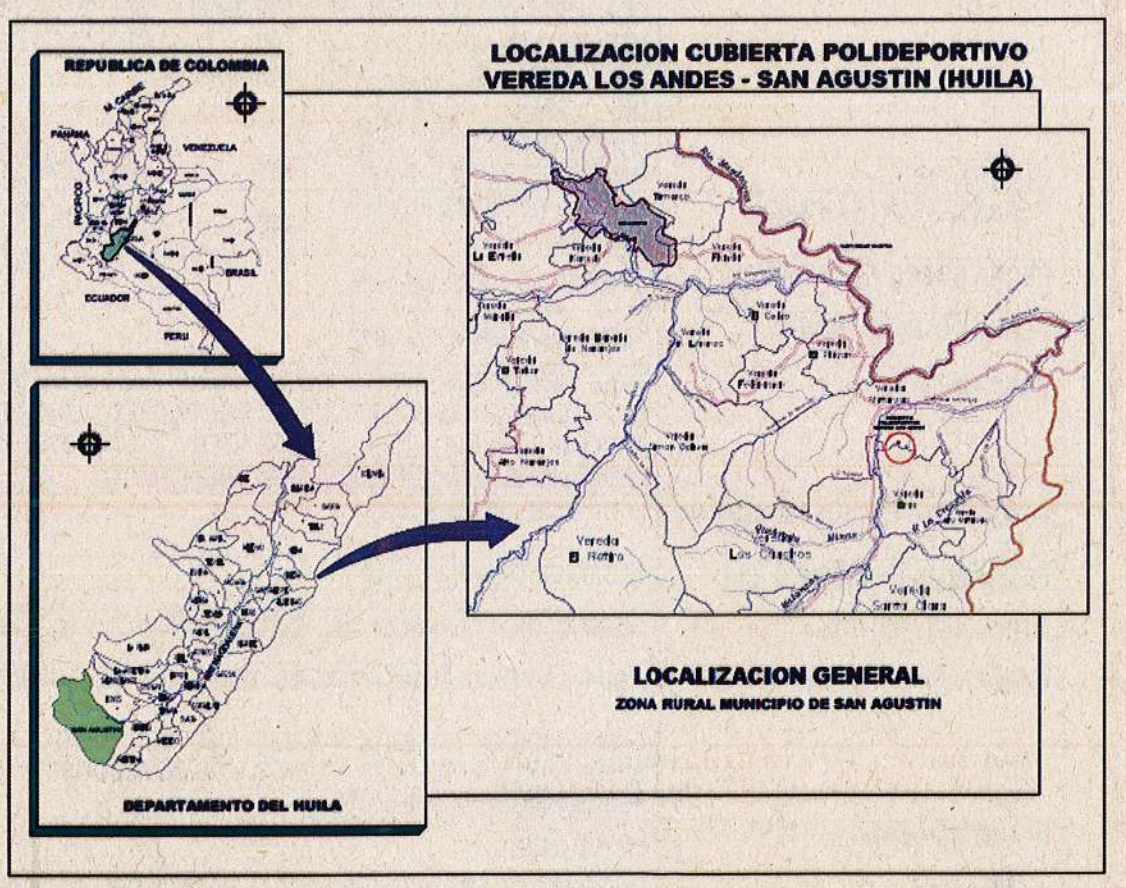

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto contempla un área a intervenir de 632,32 m², en la que se encuentra contemplada la construcción de la cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 20 en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz, para el polideportivo ubicado en la vereda Los Andes del Municipio de San Agustín – Huila, la cual tiene una destinación de uso recreativo, deportivo y cultural; el polideportivo corresponde a estructura de cubierta, iluminación y sistema hidráulico para el manejo de aguas lluvias.

La cubierta será con sistema autoportante, sostenida con columnas en concreto de 3.00 PSI. El sistema estructural propuesto consiste en columnas y vigas aéreas en concreto reforzado en 3.000 PSI y una cimentación tipo zapatas, vigas de cimentación y viga canal. Todas las obras atienden lo establecido en la NORMA SISMORRESISTENTE de 2010 – NSR-10.

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

- ACTIVIDADES PRELIMINARES
- CIMENTACIÓN
- ESTRUCTURA EN CONCRETO
- CUBIERTA
- ACABADOS – PLACA DE CONCRETO
- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
- INSTALACIONES ELÉCTRICAS
- TRANSPORTE

5. INFORME CONCRETO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DURANTE EL PERIODO

la junta comunal de la vereda continúa realizando acompañamiento a las actividades de obras chequeando que las obras continúen de acuerdo a los planos y a las medidas que se contrataron la comunidad expresa su agradecimiento por la continua colaboración y avance de la obra y durante el periodo no se reporta mayor actividad social y de parte de la comunidad.

Se mantienen las zonas seguras que se acordaron con la comunidad, se mantiene la señalización de prevención dentro de la obra y se mantienen las visitas por parte de la comunidad chequeando el buen desempeño y avance del ahora.

Que le informó a la comunidad que se mantiene abierta la convocatoria para el personal de ayudante obra que quiere participar en la construcción de la cubierta el contratista aún necesita personal y que se acerque los que están interesados.

Por último y no menos importante la comunidad sabe que el buen desarrollo de la obra les está mejorando las condiciones de vida a toda la población por ello viven muy agradecidos por el gran avance que ha tenido la obra más aun cuando tenemos una temporada fuerte de invierno.

6. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	16/11/2023	**35**		
Suspensión No. 1	21/12/2023		327	
Reiniciación No. 1	12/11/2024	**80**		
Otrosí No. 2	27/12/2024			
TERMINACIÓN Cto.				05/02/2025
TOTAL DÍAS		**115**	**327**	

7. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA DE INICIO		16/11/2023
ACTA DE VEEDURIA		07/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.01 – SUSPENSIÓN 1	1	21/12/2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No.01	1	21/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.02 - REINICIO 1	2	12/11/2024
ACTA DE REINICIO No. 01	1	12/11/2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.03 OTROSÍ No.01	3	12/11/2024
OTROSÍ No.01	1	12/11/2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.04 OTROSÍ No.02	4	27/12/2024
OTROSÍ No.02	2	27/12/2024

8. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

a). Obligaciones de Carácter General	La interventoría, en calidad de ente supervisor, gestiono, reviso y aprobó los siguientes puntos: - Se proyecta acta parcial - Se realiza verificación de actualización de pólizas según otrosí no. 2. Y cargue en el secop II para su debida aprobación por parte de la entidad. - Pago aportes de seguridad social del personal

b.) **Actividades operativas**	ACTIVIDADES PRELIMINARES - Suministro y proveimiento de materiales para las actividades propias de la obra - Demolición de las cunetas en concreto existentes que se ubicaban a cada lado de la cancha del polideportivo - Desmonte de los dos (2) marcos de las canchas existentes ESTRUCTURA EN CONCRETO - Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI, y Acero de refuerzo Fy=60.000 PSI para viga canal. Se realiza el armado de la estructura de soporte para la formaleta de la viga canal del **EJE B**, utilizando gatos, cerchas y camillas; luego, y se realiza el armado del acero que conforma la misma viga canal (incluyendo flejes de la viga y aceros para la pestaña del canal), siguiendo los diseños estructurales para tal fin. Seguidamente, se instala formaleta en madera dando forma a la viga canal, de acuerdo a los diseños; finalmente, se vierte el concreto haciendo uso del vibrador eléctrico para concreto con el fin de eliminar el aire o vacíos existentes dentro de la mezcla y así lograr una mayor compactación de la misma. Al concreto se le adiciona acelerante SikaSet L, con el fin de disminuir el tiempo de curado; luego se procede a retirar la formaleta y la estructura que lo soporta. - Suministro e instalación de manto zetal viga canal. Con el fin de impermeabilizar las vigas canal de los EJES A y B, se instala manto zetal siguiendo las especificaciones técnicas dadas por el proveedor y de esta manera lograr su mayor efectividad. CUBIERTA - Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 20, en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintura poliéster estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz. Una vez alcanzada la resistencia óptima del concreto acelerado de la viga canal en ambos ejes de la estructura, y luego de solventar las fuertes lluvias presentadas en la zona, se logra trasladar todo el equipo y maquinaria hasta el sitio de obra con el fin de fabricar e instalar la cubierta auto soportante, conforme a los diseños aprobados para esta actividad. ACABADOS - PLACA EN CONCRETO - Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño. Se construyen cunetas a lado y lado de la placa del polideportivo a lo largo de los ejes A y B, manteniendo una pendiente del 0.5% la cual permite una adecuada evacuación del agua lluvia recolectada por la cubierta instalada. - Rejillas prefabricadas para cunetas. Sobre las cuentas, son instaladas rejillas prefabricadas en concreto, con el fin de proteger la integridad de las personas que hacen uso del escenario deportivo evitando que caigan en las cunetas.

	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - Bajantes en tubería PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagües y bajantes de aguas lluvias. Se realiza la instalación de los bajantes de aguas lluvias para la cubierta según el diseño y planos hidrosanitarios del proyecto, garantizando su correcto anclaje a la estructura y correspondiente drenaje hacia la cuneta en concreto sobre el piso. - Suministro e instalación de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagües. Se realiza la instalación de tubería que conecta las dos cajillas de recolección de aguas lluvias, según los diseños y planos suministrados por la entidad contratante para el proyecto. - Suministro e instalación de tubería PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida. Con el fin de evacuar el agua lluvia recolectada en la cajilla, se instala tubería para evacuar el agua hasta un drenaje natural existente para dar una entrega correcta sin causar daños a los vecinos del escenario. - Caja de inspección en concreto de F´c=2500 PSI, de sección 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms, con espesores de paredes de 0.10 mts. según diseño. Se realiza la construcción de las dos cajillas de recolección de aguas lluvias ubicadas en los costados de la cancha multifuncional (Eje A y B), las cuales recolectan y redirigen el agua lluvia proveniente de las cunetas de recolección en concreto hasta su entrega final. INSTALACIONES ELÉCTRICAS - Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor. Se construyen tres cajas de inspección de alumbrado público: una en la base del posta donde se instala el medidor, y las otras dos, al inicio de los Ejes A y B. Las tapas son construidas en concreto con marco metálico en ángulo, ya que la lámina alfajor no cumple con las especificaciones técnicas para este tipo de cajillas. - Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada. Se realizan las brechas o excavaciones que permitan disponer la tubería eléctrica que va bajo tierra. - Canalización en ductos conduit PVC tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts. Son instalados los ductos para baja tensión en las brechas y luego se tapan con el fin de protegerlas de futuros daños. - Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2". Se pasa la red subterránea en PVC a red aérea en tubo IMC, que conduce del poste del medidor hasta la caja de automáticos. - Transición aérea-subterránea tubería IMC 1". La red que une los Ejes A y B es subterránea en PVC y luego pasa a red aérea en tubo IMC, las cuales llevaran los cables de la iluminación del escenario. - Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste. Se realiza la instalación del cableado desde la red existente hasta el medidor, el cual es instalado en poste.

	- Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna. Se instala el cableado y la caja de distribución en la columna A6, para controles de los reflectores y los tomacorrientes. - Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu. Se instala cableado en la los ductos PVC subterráneos para la red de distribución principal. - Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector. Conforme a los diseños eléctricos del proyecto, se instalan los brazos galvanizados en cada columna sobre los cuales se fijan los reflectores. - Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores. Se realiza la instalación del cableado en los tubos IMC para el montaje de los reflectores. - Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v. Se instala tomacorriente a 120 v, en la columna A6 por encima de la caja de distribución. - Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v. Se instala tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v, en la columna A6 por encima de la caja de distribución. - Reubicación de postes eléctricos en concreto. Son reubicados en sitios seguros, dos postes que se encontraban cerca al escenario deportivo.
c). **Actividades administrativas**	Se verifica el personal del contratista de obra, tiempo de dedicación y se solicita al contratista los pagos de seguridad social o afiliaciones del personal

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL	CARGO
NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA.	Director De Obra
WILMAR ARMANDO JIMÉNEZ MARULANDA	Coordinador de obra
JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO	Residente De Obra aux.
CRISTIAN CAMILO LÓPEZ CORDOBA	Residente Siso
OSCAR ALEXANDER ZULUAGA	Maestro De Obra
SILVIO QUIÑONEZ SAMBONI	Ayudante De Obra
EMIRO SAMBONI MUÑOZ	Ayudante De Obra
ROBINSON ARCOS TORRES	Ayudante De Obra
WILLIAM ESTIVEN ARCOS HOYOS	Ayudante De Obra
JORGE ARMANDO HOYOS PAZ	Ayudante De Obra
OSCAR IVÁN GUALÍ CUELLAR	Ayudante De Obra

	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS: Se realizo revisión y seguimiento y control a equipos utilizados en obra para cumplir con el debido proceso constructivo. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES: Se realiza seguimiento de materiales, diseños de mezcla caracterización de recebo, arena, gravilla, acero.

CONTROL Y SEGUIMIENTO A APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	Nº PLANILLA	FECHA DE PAGO
ENERO DE 2024							
NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA	$277.800	$57.000	$7.500	$57.000	EXONERADO	9480094655 9481408682	09/01/2025 06/02/2025
WILMAR ARMANDO JIMÉNEZ MARULANDA	$277.800	$57.000	$99.100	$57.000	EXONERADO	9480094655 9481408682	09/01/2025 06/02/2025
JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO	$227.800	$178.000	$99.100	$0	EXONERADO	9481729478	21/02/2025
CRISTIAN CAMILO LÓPEZ CÓRDOBA	$277.800	$57.000	$99.100	$57.000	EXONERADO	9480094655 9481408682	09/01/2025 06/02/2025
OSCAR ALEXANDER ZULUAGA	$220.200	$55.100	$95.800	$50.300	EXONERADO	9481408682	06/02/2025
SILVIO QUIÑONEZ SAMBONI	$41.600 $45.600	$10.400 $11.400	$18.100 $19.900	$10.400 $10.400	EXONERADO	9480094655 9481408682	09/01/2025 06/02/2025
EMIRO SAMBONI MUÑOZ	$34.700 $45.600	$8.700 $11.400	$15.100 $19.900	$8.700 $10.400	EXONERADO	9480094655 9481408682	09/01/2025 06/02/2025
ROBINSON ARCOS TORRES	$48.600 $53.200	$12.200 $13.300	$21.200 $23.200	$12.200 $12.200	EXONERADO	9480094655 9481408682	09/01/2025 06/02/2025
WILLIAM ESTIVEN ARCOS HOYOS	$55.500 $53.200	$13.900 $13.300	$24.200 $23.200	$13.900 $12.200	EXONERADO	9480094655 9481408682	09/01/2025 06/02/2025
JORGE ARMANDO HOYOS PAZ	$48.600 $53.200	$12.200 $13.300	$21.200 $23.200	$12.200 $12.200	EXONERADO	9480094655 9481408682	09/01/2025 06/02/2025
OSCAR IVÁN GUALÍ CUELLAR	$64.800	$17.100	$29.800	$17.100	EXONERADO	9481408682	06/02/2025

se verifica en obra el cumplimiento legal de seguridad industrial y salud ocupacional. Entrega de dotación y afiliaciones del personal.

d). **Actividades Logísticos.**	1. Se realiza la revisión diaria de los avances de la bitácora de obra. 2. Se realiza la medición de las actividades realizadas en la ejecución del contrato para proyectar acta parcial No. 1. 3. Se realizó la revisión de las vigencias de las pólizas del contrato de obra las cuales fueron remitidas a la entidad y cargadas al SECOP II. 4. Se verifica en obra el cumplimiento legal de seguridad industrial y salud ocupacional. Entrega de dotación y afiliaciones del personal. 5. Se realizaron comités de obra donde se expone actividades logísticas y administrativas realizadas. 6. Se inician actividades aprobadas del balance de obra de mayores y menores cantidades.
e). **Obligaciones de Carácter Ambiental.**	1. Se realiza seguimiento al sistema de gestión y sistema de seguridad y salud en el trabajo
f). **Actividades Financieras.**	1. Se radica cuenta de cobro para pago de parcial 1.

g). Actividades Jurídicos.

CONTRATO DE OBRA

Póliza legalización del CONTRATO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051691	0	02/11/2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	20/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	20/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	20/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 años desde acta de recibo final

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018815	0	02/11/2023	01/11/2023	20/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051691	1	22/11/2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	20/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	20/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	20/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 años desde acta de recibo final

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018815	1	22/11/2023	01/11/2023	20/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE REINICIO No. 1:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051691	2	20/11/2024	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	10/07/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	10/07/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	10/01/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 años desde acta de recibo final

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018815	2	20/11/2024	01/11/2023	24/01/2025

Póliza actualizada x ACLARACIÓN OTROSÍ No. 2


PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051691	4	29/01/2025	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	10/08/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	10/08/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	10/02/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 años desde acta de recibo final

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018815	4	29/01/2025	01/11/2023	04/03/2025

9. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

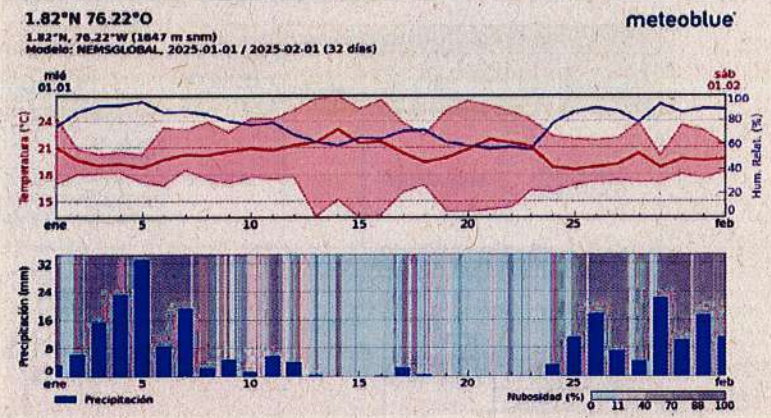

CONTROL DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO

MES ENERO - 2025 CONTRATO No. CLPIH383-2024 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA DANES INGENIEROS S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	ENERO DE 2025																													
DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Clase de tiempo																															
Seco	16	15	14	13	14	9	24	19	21	24	18	24	21	24	24	24	20	22	22	24	24	24	24	18	14	11	17	20	9	19	15
Lluvias moderadas	6	5	7	6	8	11	0	3	3	0	4	0	3	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	4	7	10	5	3	12	4	7
Lluvias intensas	2	4	3	5	2	4	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	3	3	2	1	3	1	2

NOTA: EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

10. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Tipo Prueba de Laboratorio	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
Diseños de mezcla para los concretos.	2500 PSI y 3000 PSI	
Diseños de mezcla para base.	N/A	
Compresión simple al concreto.	3000 PSI	
Ensayo de compactación de campo	N/A	

NOTA: *Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Articulo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.*

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
			7	14	28			
CONCRETO ZAPATAS EJE A3-B2	07/12/2024	14/12/2024	X			2100 PSI	2319	CUMPLE
		14/12/2024	X			2100 PSI	2294	
		21/12/2024		X		2700 PSI	2853	CUMPLE
		21/12/2024		X		2700 PSI	2776	
		04/01/2025			X	3000 PSI	3407	CUMPLE
		04/01/2025			X	3000 PSI	3518	
CONCRETO PEDESTAL EJE A4-B3	10/12/2024	17/12/2024	X			2100 PSI	2190	CUMPLE
		17/12/2024	X			2100 PSI	2222	
		24/12/2024		X		2700 PSI	2705	CUMPLE
		24/12/2024		X		2700 PSI	2774	
		07/01/2025			X	3000 PSI	3117	CUMPLE
		07/01/2025			X	3000 PSI	3158	
CONCRETOS VIGA DE CIMENTACION EJE A	12/12/2024	19/12/2024	X			2100 PSI	2135	CUMPLE
		19/12/2024	X			2100 PSI	2098	
		26/12/2024		X		2700 PSI	2742	CUMPLE
		26/12/2024		X		2700 PSI	2781	
		09/01/2025			X	3000 PSI	3149	CUMPLE
		09/01/2025			X	3000 PSI	3217	
CONCRETOS VIGA DE	13/12/2024	20/12/2024	X			2100 PSI	2153	CUMPLE
		20/12/2024	X			2100 PSI	2201	
		27/12/2024		X		2700 PSI	2866	CUMPLE

CIMENTACION EJE B		27/12/2024		X		2700 PSI	2912	
		10/01/2025			X	3000 PSI	3302	CUMPLE
		10/01/2025			X	3000 PSI	3254	
CONCRETOS COLUMNAS EJE A	19/12/2024	26/12/2024	X			2100 PSI	2135	CUMPLE
		26/12/2024	X			2100 PSI	2214	
		02/01/2025		X		2700 PSI	2781	CUMPLE
		02/01/2025		X		2700 PSI	2829	
		16/01/2025			X	3000 PSI	3162	CUMPLE
		16/01/2025			X	3000 PSI	3267	
CONCRETOS COLUMNAS EJE B	20/12/2024	27/12/2024	X			2100 PSI	2227	CUMPLE
		27/12/2024	X			2100 PSI	2242	
		03/01/2025		X		2700 PSI	2774	CUMPLE
		03/01/2025		X		2700 PSI	2790	
		17/01/2025			X	3000 PSI	3296	CUMPLE
		17/01/2025			X	3000 PSI	3237	
CONCRETOS VIGA CANAL EJE A	27/12/2024	03/01/2025	X			2100 PSI	2209	CUMPLE
		03/01/2025	X			2100 PSI	2186	
		10/01/2025		X		2700 PSI	2744	CUMPLE
		10/01/2025		X		2700 PSI	2774	
		24/01/2025			X	3000 PSI	3138	CUMPLE
		24/01/2025			X	3000 PSI	3149	
CONCRETOS VIGA CANAL EJE B	10/01/2025	17/01/2025	X			2100 PSI	2238	CUMPLE
		17/01/2025	X			2100 PSI	2212	
		24/01/2025		X		2700 PSI	2792	CUMPLE
		24/01/2025		X		2700 PSI	2763	
		07/02/2025				3000 PSI		
		07/02/2025				3000 PSI		

11. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	**Fecha** (dd/mm/aaaa)	**Valor Acta**	**Amortización**	**Valor pagado**
Valor Anticipo (25%)		N/A		N/A
Acta Parcial No. 1		$	$	$
Acta Recibo Final No.2		$	$	$

Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
$ 88.657.430,00	$ 12.573.718,00	$101.231.148,00	$	$ 101.231.148,00
CONTRATO DE OBRA				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	**Fecha** (dd/mm/aaaa)	**Valor Acta**	**Amortización**	**Valor pagado**
Valor Anticipo (25%)	27/11/2024	$ 126.637.424,75		$ 126.637.424,75
ADICION 01	27/12/2024	$ 62.065.242		$
Acta Parcial No. 1		$	$	$
Acta Parcial No. 2		$	$	$
Acta Recibo Final No.3		$	$	$
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 506.549.699	$ 62.065.242	$ 568.614.941	$192.311.566	$ 376.303.375

12. COMITES DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	**Lugar**	**Resultado del Comité** (Describir)
23/01/2025	OBRA	Socialización y avance de obra, de acuerdo a la aprobación de acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos.

13. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD (dd/mm/aaaa)	No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)	FORMATO (Físico/Digital)
Pólizas de cumplimiento (Endoso No. 0)	03/11/2023	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso No. 0)	03/11/2023	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso No. 1)	22/11/2023	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso No. 1)	22/11/2023	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso No. 2)	20/11/2024	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso No. 2)	20/11/2024	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso No. 3)	29/01/2025	S. N	FÍSICO Y DIGITAL

Pólizas R.C. (Endoso No. 3)	21/11/2024	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso No. 4)	29/01/2025	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas R.C. (Endoso No. 4)	29/01/2025	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo SG-SST	10/02/2025	S. N	FÍSICO
Copias de Bitácora de Obra (periodo del (1-01-2025) al (31/01/2025)	10/02/2025	S. N	FÍSICO
Actas de comités ((periodo del (1-01-2025) al (31/01/2025)	10/02/2025	S. N	FÍSICO
Planillas de aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP) (periodo del (1-01-2025) al (31/01/2025)	10/02/2025	S. N	FÍSICO
Registros de ensayos de calidad (periodo del (1-01-2025) al (31/01/2025)	10/02/2025	S. N	FÍSICO
Registro fotográfico (Dotación, PAPSO, PGIO – SG-SST) (periodo del (1-01-2025) al (31/01/2025)	10/02/2025	S. N	FÍSICO

14. RELACION DE PERSONAL (Profesional y Mano de obra)

CONTRATO DE INTERVENTORIA

NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
JOSE WILMER CHILITO	76.320.749	CONSORCIADO	CONTRATO POR OBRA O LABOR
FAIVER EDUARDO POLANIA	7711430	CONSORCIADO	CONTRATO POR OBRA O LABOR
JAVIER HUMBERTO GIRALDO JIMENEZ	1083886304	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONTRATO POR OBRA O LABOR

15. RELACIÓN DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA
Anticipo	S.N	27/11/2025

16. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARA FISCALES	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
FAIVER EDUARDO POLANIA	$562.900	$439.800	$85.700	N/A	N/A	7960848319	07/02/2025
JAVIER HUMBERTO GIRALDO JIMENEZ	$227.800	$178.000	$34.700	N/A	N/A	941044995	30/01/2025

17. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

Póliza actualizada x OTROSI 2:

LEGALIZACION DEL CONTRATO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010098	0	09/11/2023	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	09/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	09/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	09/02/2024	09/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	0	Amparo Básico, Predios, Labores y Operaciones	09/11/2023	09/02/2024

POLIZA ANULADA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010098	1	21/11/2023	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	09/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	09/02/2027
				Calidad del Servicio	09/02/2024	09/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002028	1	Amparo Básico, Predios, Labores y Operaciones	09/11/2023	09/02/2024

PÓLIZA ACTUALIZADA – INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010098	2	21/11/2023	Cumplimiento del contrato	16/11/2023	16/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/11/2023	16/02/2027
				Calidad del Servicio	16/02/2024	16/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002028	2	Amparo Básico, Predios, Labores y Operaciones	16/11/2023	16/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100010098	3	28/09/2024	Cumplimiento del contrato	17/09/2024	17/05/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/09/2024	17/11/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2024	17/11/2029

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100002028	3	28/09/2024	16/11/2023	17/11/2024

Póliza actualizada X otrosi 1

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100010898	4	28/09/2024	Cumplimiento del contrato	17/09/2024	17/05/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/09/2024	17/11/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2024	17/11/2029

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)					
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100002028	4	28/09/2024	16/11/2023	17/11/2024

Póliza actualizada X otrosi 2

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100010098	5	02/12/2024	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	07/06/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	12/11/2024	07/12/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	07/11/2024	07/12/2029

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)					
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100002028	5	02/12/2024	16/11/2023	07/12/2024

Póliza actualizada X otrosi 3

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100010898	6	18/12/2024	Cumplimiento del contrato	02/12/2024	07/07/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	02/12/2024	07/01/2028
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	07/01/2025	07/01/2030

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)					
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100002028	6	18/12/2024	16/11/2023	07/01/2025

Póliza actualizada X otrosi 4

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100010098	7	22/01/2025	Cumplimiento del contrato	27/12/2024	10/08/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	27/12/2024	10/12/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10/02/2025	10/02/2030

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)


ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100002028	7	22/01/2025	16/11/2023	10/02/2025

18. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
(Describir el contenido del plano)


19. REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRELIMINARES
Demolición de las cunetas en concreto existentes que se ubicaban a cada lado de la cancha del polideportivo






Desmonte de los dos (2) marcos de las canchas existentes

ESTRUCTURAS EN CONCRETO


Construcción de vigas canal Eje B (aceros y concreto)























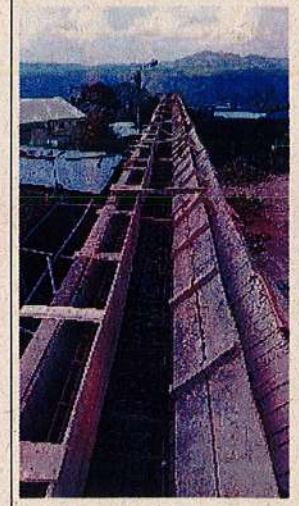



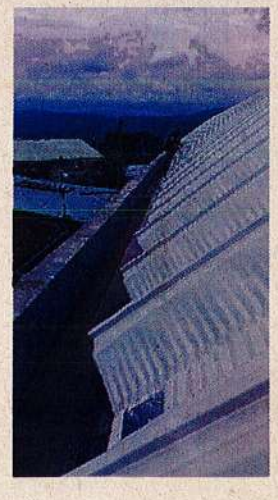
Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	 
CUBIERTA Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 20, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz. 	     

ACABADOS - PLACA EN CONCRETO Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño. 	
Rejillas prefabricadas para cunetas.	 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Bajantes en tubería PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagües y bajantes de aguas lluvias. 	 

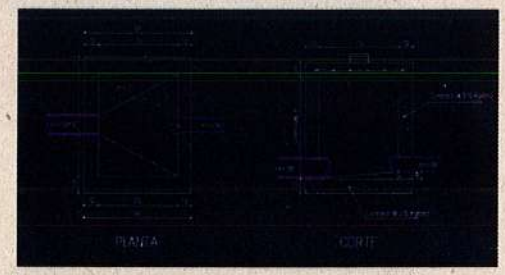
Suministro e instalación de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagües. 	
Suministro e instalación de tubería PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	
Caja de inspección en concreto de F´c=2500 PSI, de sección 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts . según diseño. 	   

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.














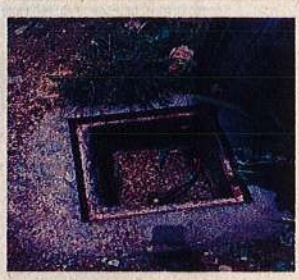











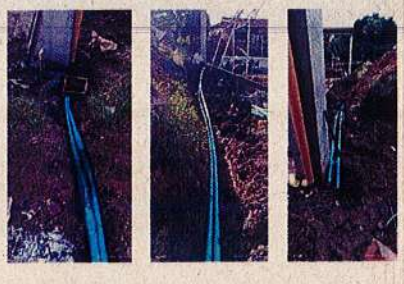

Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada. 	
Canalización en ductos conduit PVC tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts. 	
Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2" 	
Transición aérea-subterránea tubería IMC 1" 	

Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste. 	  
Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna. 	 
Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	 
Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector. 	

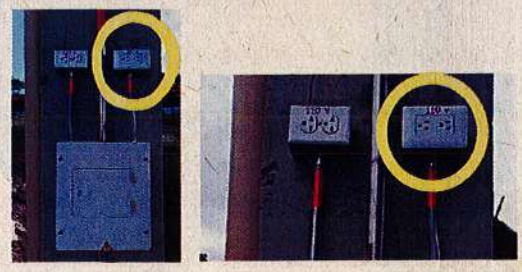	
Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores. 	
Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v. 	

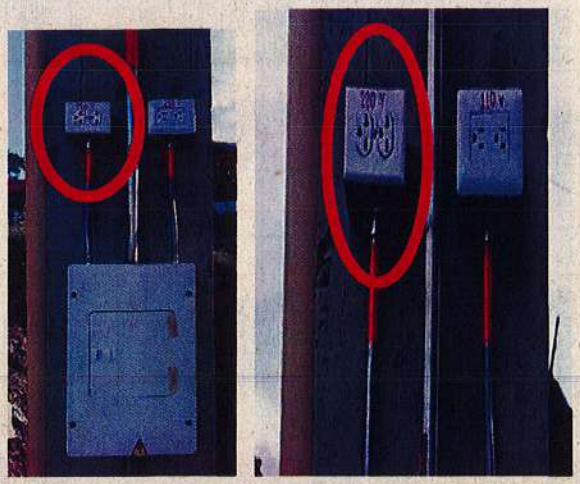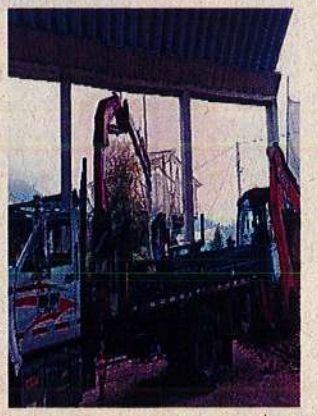Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v. 	
Reubicación de postes eléctricos en concreto	   

20. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES OTROSI 2 DEL 27/12/2024		EJECUCIÓN OBRA PRESENTE INFORME			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	% EJECUCIÓN	CANT.	VR/TOTAL	% EJECUCIÓN
1													
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
1.01	Localización y replanteo.	M2	632,32	$ 3.549,00	$ 2.244.104,00	733,21	$ 2.602.162,29	0,00	$ 0,00	0,00%	733,21	$ 2.602.162,29	100,00%
1.02	Demolición cuneta existente	ML	62,80	$ 7.544,00	$ 473.763,00	60,80	$ 458.675,20	60,80	$ 458.675,20	100,00%	60,80	$ 458.675,20	100,00%
1.03	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	2,40	$ 26.210,00	$ 62.904,00	27,97	$ 733.093,70	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
1.04	Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante.	ML	2,10	$ 20.804,00	$ 43.688,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
1.05	Desmonte marcos canchas existentes.	UND	2,00	$ 116.413,00	$ 232.826,00	2,00	$ 232.826,00	2,00	$ 232.826,00	100,00%	2,00	$ 232.826,00	100,00%
1.06	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	204,04	$ 45.880,00	$ 9.361.355,00	280,23	$ 12.856.952,40	0,00	$ 0,00	0,00%	280,23	$ 12.856.952,40	100,00%
1.1.7	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.	M3	152,02	$ 83.626,00	$ 12.712.825,00	102,30	$ 8.554.939,80	0,00	$ 0,00	0,00%	102,30	$ 8.554.939,80	100,00%
Sub-total					$ 25.131.465,00		$ 25.438.649,39		$ 691.501,20			$ 24.705.555,69	
2													
2.1	CIMENTACIÓN												
2.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	63,82	$ 33.922,00	$ 2.164.902,00	21,60	$ 732.715,20	0,00	$ 0,00	0,00%	21,60	$ 732.715,20	100,00%
2.02	Concreto ciclópeo - 2500 PSI (140 KG/CM2) 60% Concreto 2.000 PSI + 40% Piedra media zonga	M3	21,66	$ 359.045,00	$ 7.776.915,00	29,94	$ 10.749.807,30	0,00	$ 0,00	0,00%	29,94	$ 10.749.807,30	100,00%
2.03	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	26,71	$ 617.415,00	$ 16.491.155,00	38,92	$ 24.029.791,80	0,00	$ 0,00	0,00%	38,92	$ 24.029.791,80	100,00%
2.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	1.698,00	$ 7.097,00	$ 12.050.706,00	2.789,00	$ 19.793.533,00	0,00	$ 0,00	0,00%	2789,00	$ 19.793.533,00	100,00%
2.05	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	8,20	$ 740.066,00	$ 6.068.541,00	11,20	$ 8.288.739,20	0,00	$ 0,00	0,00%	11,20	$ 8.288.739,20	100,00%

2.06	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	KG	612,00	$ 7.097,00	$ 4.343.364,00	1.029,20	$ 7.304.232,40	0,00	$ 0,00	0,00%	1029,20	$ 7.304.232,40	100,00%
Sub-total					**$ 48.895.583,00**		**$ 70.898.818,90**		**$ 0,00**			**$ 70.898.818,90**	
3													
3.1	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**												
3.01	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	14,00	$ 918.378,00	$ 12.857.292,00	16,72	$ 15.355.280,16	0,00	$ 0,00	0,00%	16,72	$ 15.355.280,16	100,00%
3.02	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	3.491,00	$ 7.097,00	$ 24.775.627,00	2.955,17	$ 20.972.841,49	0,00	$ 0,00	0,00%	2955,17	$ 20.972.841,49	100,00%
3.03	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.	M3	17,00	$ 1.002.201,00	$ 17.037.417,00	16,37	$ 16.406.030,37	8,19	$ 8.203.015,19	50,00%	16,37	$ 16.406.030,37	100,00%
3.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	1.756,00	$ 7.097,00	$ 12.462.332,00	2.096,44	$ 14.878.434,68	1.048,22	$ 7.439.217,34	50,00%	#######	$ 14.878.434,68	100,00%
3.05	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	57,76	$ 40.240,00	$ 2.324.262,00	60,80	$ 2.446.592,00	60,80	$ 2.446.592,00	100,00%	60,80	$ 2.446.592,00	100,00%
Sub-total					**$ 69.456.930,00**		**$ 70.059.178,70**		**$ 18.088.824,53**			**$ 70.059.178,70**	
4													
4.1	**CUBIERTA**												
4.01	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 20, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	670,93	$ 285.939,00	$ 191.845.053,00	690,38	$ 197.406.566,82	690,38	$ 197.406.566,82	100,00%	690,38	$ 197.406.566,82	100,00%
Sub-total					**$ 191.845.053,00**		**$ 197.406.566,82**		**$ 197.406.566,82**			**$ 197.406.566,82**	
5													
5.1	**ACABADOS - PLACA EN CONCRETO**												
5.01	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	317,78	$ 14.758,00	$ 4.689.797,00	317,78	$ 4.689.797,24	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%

5.02	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	2,00	$ 3.700.895,00	$ 7.401.790,00	2,00	$ 7.401.790,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
5.03	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	2,40	$ 84.509,00	$ 202.822,00	27,97	$ 2.363.547,71	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
5.04	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño.	ML	62,80	$ 83.629,00	$ 5.251.901,00	62,80	$ 5.251.901,20	62,80	$ 5.251.901,20	100,00%	62,80	$ 5.251.901,20	100,00%
NP-5.05	Rejillas prefabricadas para cunetas.	ML		$ 159.779,00	$ 0,00	60,80	$ 9.714.563,20	60,80	$ 9.714.563,20	100,00%	60,80	$ 9.714.563,20	100,00%
Sub-total					**$ 17.546.310,00**		**$ 29.421.599,35**		**$ 14.966.464,40**			**$ 14.966.464,40**	
6													
6.1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**												
6.01	Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	63,20	$ 79.932,00	$ 5.051.702,00	63,20	$ 5.051.702,40	63,20	$ 5.051.702,40	100,00%	63,20	$ 5.051.702,40	100,00%
6.02	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.	ML	20,60	$ 106.806,00	$ 2.200.204,00	20,60	$ 2.200.203,60	20,60	$ 2.200.203,60	100,00%	20,60	$ 2.200.203,60	100,00%
6.03	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	30,00	$ 218.470,00	$ 6.554.100,00	30,00	$ 6.554.100,00	30,00	$ 6.554.100,00	100,00%	30,00	$ 6.554.100,00	100,00%
6.04	Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	2,00	$ 349.057,00	$ 698.114,00	2,00	$ 698.114,00	2,00	$ 698.114,00	100,00%	2,00	$ 698.114,00	100,00%
Sub-total					**$ 14.504.120,00**		**$ 14.504.120,00**		**$ 14.504.120,00**			**$ 14.504.120,00**	
7													
7.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**												
7.01	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.	UND	2,00	$ 292.572,00	$ 585.144,00	3,00	$ 877.716,00	0,00	$ 0,00	0,00%	3,00	$ 877.716,00	100,00%

7.02	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	3,00	$ 637.202,00	$ 1.911.606,00	3,00	$ 1.911.606,00	3,00	$ 1.911.606,00	100,00%	3,00	$ 1.911.606,00	100,00%
7.03	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	5,12	$ 45.880,00	$ 234.906,00	5,12	$ 234.905,60	5,12	$ 234.905,60	100,00%	5,12	$ 234.905,60	100,00%
7.04	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	ML	32,00	$ 49.210,00	$ 1.574.720,00	32,00	$ 1.574.720,00	32,00	$ 1.574.720,00	100,00%	32,00	$ 1.574.720,00	100,00%
7.05	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2,00	$ 303.693,00	$ 607.386,00	2,00	$ 607.386,00	2,00	$ 607.386,00	100,00%	2,00	$ 607.386,00	100,00%
7.06	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	2,00	$ 281.525,00	$ 563.050,00	2,00	$ 563.050,00	2,00	$ 563.050,00	100,00%	2,00	$ 563.050,00	100,00%
7.07	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1,00	$ 1.014.120,00	$ 1.014.120,00	1,00	$ 1.014.120,00	1,00	$ 1.014.120,00	100,00%	1,00	$ 1.014.120,00	100,00%
7.08	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1,00	$ 4.688.701,00	$ 4.688.701,00	1,00	$ 4.688.701,00	1,00	$ 4.688.701,00	100,00%	1,00	$ 4.688.701,00	100,00%
7.09	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	ML	16,00	$ 88.300,00	$ 1.412.800,00	35,00	$ 3.090.500,00	35,00	$ 3.090.500,00	100,00%	35,00	$ 3.090.500,00	100,00%
7.10	Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12,00	$ 367.987,00	$ 4.415.844,00	12,00	$ 4.415.844,00	12,00	$ 4.415.844,00	100,00%	12,00	$ 4.415.844,00	100,00%
7.11	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	60,00	$ 57.998,00	$ 3.479.880,00	102,80	$ 5.962.194,40	102,80	$ 5.962.194,40	100,00%	102,80	$ 5.962.194,40	100,00%
7.12	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12,00	$ 1.016.078,00	$ 12.192.936,00	12,00	$ 12.192.936,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 972.420,00	$ 972.420,00	1,00	$ 972.420,00	1,00	$ 972.420,00	100,00%	1,00	$ 972.420,00	100,00%
7.14	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 1.032.612,00	$ 1.032.612,00	1,00	$ 1.032.612,00	1,00	$ 1.032.612,00	100,00%	1,00	$ 1.032.612,00	100,00%
NP-7.15	Reubicación de postes eléctricos en concreto	UND		$ 968.000,00	$ 0,00	2,00	$ 1.936.000,00	2,00	$ 1.936.000,00	100,00%	2,00	$ 1.936.000,00	100,00%
Sub-total					**$ 34.686.125,00**		**$ 41.074.711,00**		**$ 28.004.059,00**			**$ 28.881.775,00**	

8													
8.1	TRANSPORTE												
8.01	Transporte de materiales petreos	M3-Km	2.760,15	$ 1.150,00	$ 3.174.173,00	5.294,18	$ 6.088.307,00	0,00	$ 0,00	0,00%	#######	$ 6.088.307,00	100,00%
Sub-total					$ 3.174.173,00		$ 6.088.307,00		$ 0,00			$ 6.088.307,00	
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 405.239.759,00		$ 454.891.951,00		$ 273.661.535,00	60,16%		$ 427.510.787,00	93,98%
	Administración	20%			$ 81.047.952,00		$ 90.978.390,00		$ 54.732.307,00	60,16%		$ 85.502.157,00	93,98%
	Imprevistos	1%			$ 4.052.398,00		$ 4.548.920,00		$ 2.736.615,00	60,16%		$ 4.275.108,00	93,98%
	Utilidad	4%			$ 16.209.590,00		$ 18.195.678,00		$ 10.946.461,00	60,16%		$ 17.100.431,00	93,98%
	VALOR TOTAL				$ 506.549.699,00		$ 568.614.941,00		$ 342.076.919,00	60,16%		$ 534.388.485,00	93,98%
	% AVANCE DE OBRA									60,16%			93,98%

ING. NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA
DIRECTOR DE OBRA
DANES INGENIEROS S.A.S.

ING. JAVIER HUMBERTO GIRALDO JIMENEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO WF

21. ANEXOS

- BITACORA
- RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABOTORIOS
- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP).

ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	10-02-2025	**ING. XIMENA ADELINDA JIMENEZ ZUÑIGA**
FIRMA ORIGINAL **CONTRATISTA INTERVENTORÍA**	FECHA DE ENTREGA	FIRMA ORIGINAL **Vo.Bo APOYO A LA SUPERVISIÓN**

30/12/2024 Tiempo: Lluvias esporádicas durante el día y noche.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipos: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 demoledor, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, gatos, cerchas, camillas, andamios.
Actividades: Las lluvias impiden que se desarrollen las actividades en normalidad; sin embargo, se continúa con la construcción de la estructura de la viga canal del E.E. B, pero no se logra avanzar mucho. El personal sale a receso de fin de año y se cita a laborar para el próximo 02 de enero de 2025.

Contratista - Residente.

Interventoría.

02/01/2025 Tiempo: Día nublado, lluvias en la tarde y noche.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipos: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 demoledor, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, gatos, cerchas, camillas, madera.
Actividades: Se continúa con la instalación de la estructura soporte para la construcción de la viga canal del E.E. B. Se suministra y transporta material pétreo para la obra.

Contratista - Residente.

Interventoría.

Powered by CamScanner

03/01/2025 Tiempo: Lluvias en la mañana y tarde con abundancia.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 demoledor, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, gatos, cerchas, cepillas, madera.
Actividades: Dadas las lluvias que se presentaron la noche anterior y la madrugada del día, las actividades realizadas en la construcción de la estructura para la vía canal, no son las mejores. Poco se logró avanzar en esa actividad.

Contratista - Residente

Interventoría

04/01/2025 Tiempo: Lluvias fuertes y leves todo el día.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 demoledor, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, gatos, cerchas, cepillas, madera.
Actividades: El día de hoy NO se adelantaron actividades de obra dadas las fuertes lluvias presentadas y el riesgo que se corre al realizar trabajos en alturas con clima lluvioso. Se realiza jornada de orden y aseo.

Contratista - Residente

Interventoría

Powered by CamScanner

07/01/2025 Tiempo: Día soleado y nubosidad en la tarde.
Personal: Ing. residente de obra e interventoría, profesional SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipos: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 demoledor, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, gatos, cercha, camillas, madera.
Actividades: Se continúa con la instalación de la estructura para la viga canal del eje B, logrando terminarla, asegurarla y nivelarla. Se retira madera de formaleta del muro y aleta del canal del Θ e A. Se inicia el armado de acero de la viga canal del Θ e B.

Contratista - Residente

Interventoría

08/01/2025 Tiempo: Lluvias leves en la tarde y fuertes en la noche.
Personal: Ing. residente de obra e interventoría, profesional SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor
Máq. y equipos: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 demoledor, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, gatos, cercha, camillas, madera.
Actividades: Se instalan y amarran los aceros de la viga canal del Θ e B, logrando armar tanto la viga como el muro y aleta del canal, se inicia la instalación de la madera y camillas que conforman la viga canal para su posterior fundición.

Contratista - Residente

Interventor

Powered by CamScanner

09/01/2025 Tiempo: Día soleado, lluvias leves en la tarde-noche.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 demoledor, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, gatos, cerchas, camillas, madera.
Actividades: Las camillas y la madera, es instalada y conforman la formaleta de la viga canal del eje B; se rectifican medidas y se ajusta toda la estructura quedando lista para proceder a fundir el día de mañana. Se transporta material pétreo para la fundición.

Contratista - Residente

Interventoría

10/01/2025 Tiempo: Nublado en la mañana, soleado en la tarde.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor. (5 ayudantes adicionales)
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 demoledor, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, gatos, cerchas, camillas, madera.
Actividades: Se revisa la seguridad y estabilidad de la estructura y la formaleta instalada para la viga canal del Eje B, luego se vierte el concreto fundiendo monolíticamente todo el elemento, haciendo uso del vibrador para retirar los vacíos en el concreto. Es necesario contar con la colaboración de 5 obreros adicionales. Se toman muestras al concreto producido y es llevado al laboratorio para verificar su control y resistencia. Se golpea ligeramente en el concreto con el fin de aislar su resistencia y retirar la formaleta en el menor tiempo.

Contratista - Residente

Interventoría

Powered by CamScanner

11/01/2025 Tiempo: Mañana soleada, tarde de lluvias

Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.

Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, gatos, cerchas, camillas, madera.

Actividades: Se retiran parte de las camillas que conforman la formaleta del Eje A, con el fin de ir desencofrando esa viga. Se realiza jornada de orden y aseo.

Contratista - Residente.

Interventor

13/01/2025 Tiempo: Lluvias toda la madrugada, resto del día soleado y seco.

Personal: Ing residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.

Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 vibrador, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, gatos, cerchas, camillas, madera.

Actividades: Se realiza el retiro de formaleta y estructura de soporte de la viga canal del Eje A, además, se retira madera de formaleta de muros y aleta de la viga canal del Eje B. Se programa el equipo y personal para la instalación de la cubierta, el cual llegará mañana a empezar a fabricar o moldear las láminas que conforman la cubierta.

Contratista - Residente

Interventoría.

NKB

Powered by CamScanner

14/01/2025 Tiempo: Dia soleado, tiempo seco.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor, personal para cubierta. (8 personas)
Máq y equipo: 1 soldadora, 1 metaladora, 1 dinoladora, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, gatos, cerchas, camillas, dobladora, grúa, herramientas para instalación cubierta.
Actividades: Se instala el material para impermeabilizar la viga canal del Eje A; en horas de la tarde llega el personal y equipos que instalarán la cubierta del polideportivo y se adelanta la logística necesaria para esta actividad.

Contratista - Residente

Interventoría

15/01/2025 Tiempo: Dia soleado, tiempo seco.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor, cuadrilla instalación abierta.
Máq. y equipo: 1 soldadora, 1 metaladora, 1 dinoladora, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, gatos, cerchas, camillas, 1 grúa, dobladora para lámina, herramientas para instalación de cubierta.
Actividades: Se inicia el retiro de camillas que conforman la formaleta de la viga canal del Eje B. El personal que instalará la cubierta del polideportivo, instala sus equipos y herramientas, dejando todo preparado para iniciar sus labores el día de mañana. Se sube de la obra material de formaletas.

Contratista - Residente.

Interventoría.

Powered by CamScanner

16-01-2025 Tiempo: Día soleado, tiempo seco.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor, cuadrilla instalación cubierta.
Máq y equipos: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, gatos, cerchas, canillas, 1 grúa, dobladora para láminas, herramienta para instalación de cubierta.
Actividades: Se realiza el retiro de la formaleta y de la estructura de soporte de la viga canal del E)(B. El personal que instalará la cubierta, inicia actividades, doblando y formando los elementos que conformarán la cubierta del polideportivo.

Contratista - Residente

Interventoría

17/01/2025 Tiempo: Lluvias leves en la madrugada, seco el resto del día.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor, cuadrilla instalación cubierta.
Máq. y equipos: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, 1 grúa, dobladora para lámina, herramientas para instalación de cubierta.
Actividades: Se continúa con las actividades de doblado y construcción de los elementos en lámina que conforman la cubierta autoportante del polideportivo. Se termina de retirar todo el material de formaleta de la viga canal del E)(B y es retirado de la obra.

Contratista - Residente

Interventoría

Powered by CamScanner

18/01/2025 Tiempo: Lluvias en la noche, día soleado
Personal: Ing. residente de obra, e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor, cuadrilla instalación cubierta.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 demoledor, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, 1 grúa, dobladora para lámina, herramientas para instalación de cubierta.
Actividades: En la viga canal del Eje B, se instala el material que impermeabiliza el elemento estructural, se da inicio a la instalación de las láminas que conforman la cubierta, las cuales son instaladas con la grúa y aseguradas a las vigas mediante pernos por la cuadrilla de instalación.

Contratista - Residente

Interventoría

19/01/2025 Tiempo: Soleado en el día, lluvias leves en la noche.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor, cuadrilla instalación cubierta.
Máq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 demoledor, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, 1 grúa, dobladora para lámina, herramienta para instalación de cubierta.
Actividades: Se da continuidad a la instalación de las láminas de la cubierta, labor realizada con la grúa; el personal asegura las láminas a las vigas dejando conformada la cubierta anteriormente.

Contratista - Residente

Interventoría

Powered by CamScanner

20/01/15 Turno: Día saliendo.

Personal: 1 ing. residente de obra e interventoría, profesional SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor, cuadrilla instalación eléctrica.

Máq. y equipos: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 vibrador, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, 1 grúa, dobladora para tacos, herramienta para instalación de eléctrica.

Actividades: Se termina la instalación de todos los elementos de la eléctrica, quedando cubierta el área estipulada en los diseños, con los materiales y recomendaciones dadas en las especificaciones técnicas. Se culminan actividades preliminares para dar inicio a la iluminación del polideportivo.

Contratista - Residente

Interventoría

21/01/15 Turno: Día saliendo.

Personal: 1 ing. residente de obra e interventoría, profesional SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor, cuadrilla eléctrica.

Máq. y equipos: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 grúa, herramienta menor, andamios, 1 dobladora, 1 vibrador.

Actividades: La cuadrilla eléctrica realiza la nivelación de los postes eléctricos en un lugar seguro y que no afecte el desarrollo de las actividades del escenario deportivo; esta labor es realizada con la grúa que aún se encontraba en el sitio luego de instalar la cubierta. También se realizó la abertura de las cuentas existentes con el fin de dar paso a la canalización de los nuevos circuitos.

Contratista - Residente

Interventoría

Powered by CamScanner

22/01/2025 Tiempo: Día soleado.

Personal: Ing. residente de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor.

Máq. y equipo: 1 colgata, 1 motobomba, 1 demoledor, 1 vibrador, herramienta menor; formaleta en madera, andamios.

Actividades: Se perfilan las excavaciones para la construcción de los cárcamos, se instalan la malla electrosoldada que reforzarán los muros y pisos de las cuetas. Se instala la formaleta y se funden los muros de los cárcamos del eje A.

Contratista - Residente

Interventor.

23/01/2025 Tiempo: Día soleado.

Personal: Ing. residente de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor

Máq. y equipo: 1 colgata, 1 motobomba, 1 demoledor, 1 vibrador, formaletas en madera, herramienta menor; andamios.

Actividades: Se instalan mallas electrosoldadas y formaletas para las cuetas del eje B, y se funden los muros de esa cueta. Se funde el piso de la cueta en el eje A, luego de retirar las formaletas de los muros, llegan a obra las tapas prefabricadas para los cárcamos.

Contratista - Residente

Interventoría.

Powered by CamScanner

24/01/2025 Tiempo: Llovió leve en la mañana y fuerte en horas de la tarde.
Personal: Ing. residente de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 3 ayudantes, 1 conductor.
Maq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 demoledor, 1 vibrador, formaletas en madera, herramienta menor, andamios.
Actividades: Se retiran las formaletas de las paredes de la cuneta del eje B y se funde el piso. Las lluvias impiden iniciar la instalación de la tubería de los bajantes. Se excavan los sitios para las cajillas que capturan o recogen el agua de las cunetas.

Contratista - Residente.

Interventoría

25/01/2025 Tiempo: Llovió en el día y horas de la tarde.
Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 4 ayudantes, 1 conductor.
Maq. y equipo: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 demoledor, 1 vibrador, formaletas, andamios, herramienta menor.
Actividades: Se da inicio a la instalación de la tubería de 4" que conforman los bajantes de aguas lluvias de los canales de cubierta, pero las lluvias impiden continuar con las actividades programadas. Se realiza proceso de orden y aseo a la obra.

Contratista - Residente.

Interventoría

Powered by CamScanner

27/01/2025 Tiempo: Lluvias en la madrugada y noche.

Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor, cuadrilla eléctrica.

Maq. y equipos: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 vibrador, 1 formaleta, andamios, herramienta menor, herramientas para eléctricos

Actividades: Se procede a la instalación a los bajantes de aguas lluvias de los canales de cubierta, apoyando con abrazaderas la tubería PVC de 4", la cual es dirigida para que el agua descargue en los canales construidos en los ejes A y B. Se inician actividades de instalación de ductos eléctricos, para la iluminación del polideportivo.

Contratista - Residente

Interventoría

28/01/2025 Tiempo: Lluvias leves en la tarde.

Personal: Ing. residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor, cuadrilla eléctrica.

Maq. y equipos: 1 volqueta, 1 mezcladora, 1 vibrador, 1 formaleta, andamios, herramienta menor, herramientas para eléctricos.

Actividades: Se instala la tubería sanitaria de 6" polipuesta que conecta las cajillas colectoras de aguas lluvias, y se inicia la instalación de la tubería de 8" para el descole final; se fundieron las cajillas colectoras de los canales de aguas lluvias. La cuadrilla eléctrica inicia excavaciones y realiza la instalación de la tubería subterránea de 1½" y 1", y la construcción de las cajillas de inspección.

Contratista - Residente.

Interventor

Powered by CamScanner

29/01/2025 Tiempos: Lluvias en la tarde y noche.
Personal: Ing. residente de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor, cuadrilla eléctrica.
Máq. y equipos: 1 retroexcavadora, 1 martillo demoledor, 1 vibrador, andamios, herramienta menor, herramienta para eléctricos.
Actividades: La tubería de 8" la cual hace la descarga final del agua lluvia, conducida por los cárcamos, es instalada en su totalidad, la brecha es tapada y compactada con equipo, la cuadrilla eléctrica continúa con la instalación de las redes eléctricas que iluminarán el polideportivo, se instala medidor en posteria con su respectivo aterrizaje y se conecta en la red de baja tensión existente.

Contratista - Residente.

Interventoría

30/01/2025 Tiempos: Lluvias leves en la mañana.
Personal: Ing. residente de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, 1 conductor, cuadrilla eléctrica.
Máq. y equipos: 1 retroexcavadora, 1 martillo demoledor, 1 vibrador, herramienta menor, andamios, herramientas para eléctricos.
Actividades: Las tapas prefabricadas en concreto para los cárcamos, es instalada y nivelada en los ejes A y D; la cuadrilla eléctrica instala la caja de distribución e hilan el cableado por los ductos ya instalados subterráneamente.

Contratista - Residente

Interventoría

Powered by CamScanner

31/01/2025 Tiempo: Llueve en la tarde y en la noche.

Personal: 1ing residentes de obra e interventoría, profesionales SST, 1 maestro, 5 ayudantes, contratista, cuadrilla eléctrica.

Maq y equipos: 1 retroexcavadora, 1 demoledor, 1 vibrador, andamios, herramienta menor, herramienta para eléctricos.

Actividades: Se realizan los huecos donde se instalarán los marcos de las cajillas múltiples, se da inicio a la demolición de las placas en concreto a reponer y que se encuentran en mal estado. El personal de electricidad, instala los bonos donde se colocarán los reflectores que iluminarán el polideportivo, y continúan cableado los ductos instalados.

Contratista - Residente.

Interventoría


Powered by CamScanner

AOLAB INGENIERIAS SAS

INFORME DEL ENSAYO COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS

CLIENTE:

CONSORCIO WF

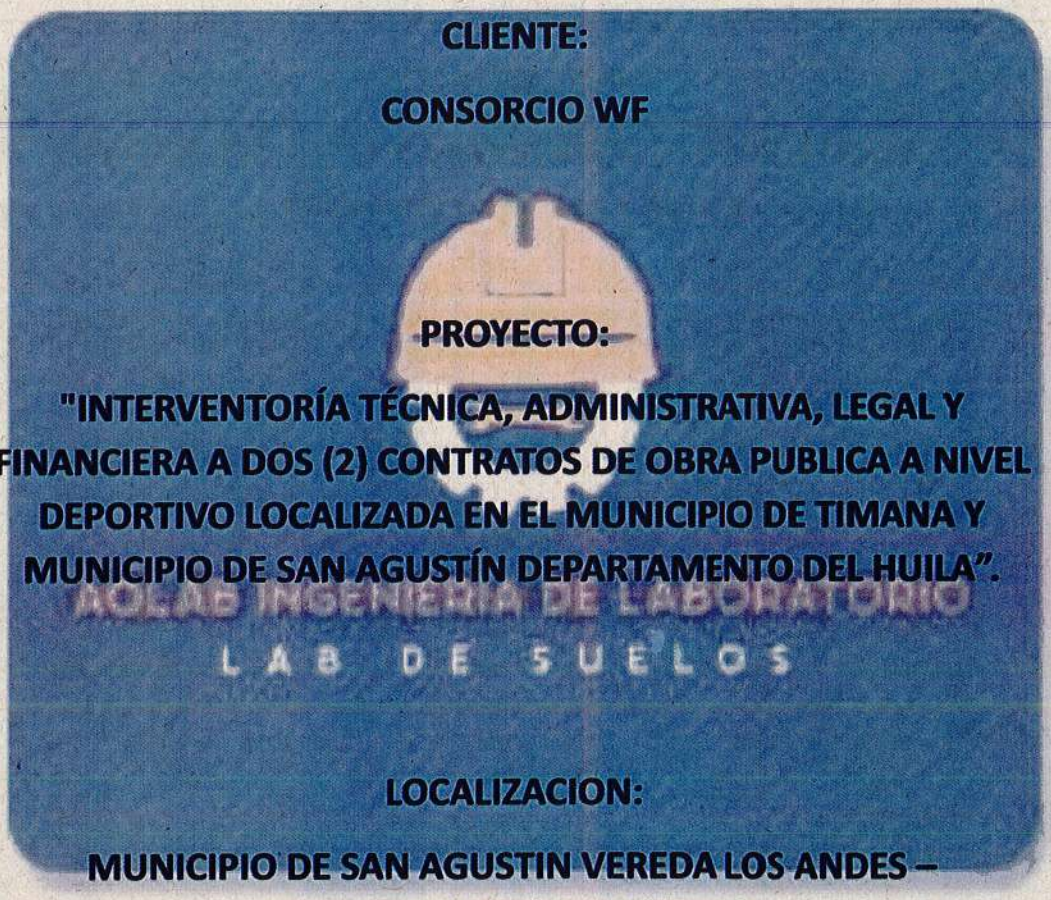

PROYECTO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA".

LOCALIZACION:

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN VEREDA LOS ANDES – DEPARTAMENTO DEL HUILA

ENERO DEL 2025

ingenieriadesuelosaolab@gmail.com / calle 76 # 1º bis -33 puertas del edén /3115955822

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

CONTRATISTA	CONSORCIO WF
PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA
UBICACIÓN	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN VEREDA LOS ANDES
FECHA EMISION INFORME	ENERO DEL 2025

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD. LAB	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	% de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
			Diametro	Longitud	KN							
12/12/2024	07/12/2024	1	10,00	20,00	125,6	7	14/12/2024	2319	77%	2	3000	CONCRETOS ZAPATAS A3-B2
	07/12/2024		10,00	20,00	124,2	7	14/12/2024	2294	76%	4	3000	
	07/12/2024		10,00	20,00	154,5	14	21/12/2024	2853	95%	3	3000	
	07/12/2024		10,00	20,00	150,3	14	21/12/2024	2776	93%	5	3000	
	07/12/2024		10,00	20,00	184,5	28	04/01/2025	3407	114%	5	3000	
	07/12/2024		10,00	20,00	190,5	28	04/01/2025	3518	117%	3	3000	

CONTROL DE CALIDAD DEL LABORATORIO
LAB DE SUELOS

ingenieriadesuelosaolab@gmail.com / calle 76 # 1ª bis -33 puertas del edén /3115955822

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

CONTRATISTA	CONSORCIO WF
PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA
UBICACIÓN	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN VEREDA LOS ANDES
FECHA EMISION INFORME:	ENERO DEL 2025

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD. LAB	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	% de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
			Diametro	Longitud	KN							
15/12/2024	10/12/2024	2	10,00	20,00	118,6	7	17/12/2024	2190	73%	4	3000	CONCRETOS PEDESTAL A4-B3
	10/12/2024		10,00	20,00	120,3	7	17/12/2024	2222	74%	4	3000	
	10/12/2024		10,00	20,00	146,5	14	24/12/2024	2705	90%	4	3000	
	10/12/2024		10,00	20,00	150,2	14	24/12/2024	2774	92%	5	3000	
	10/12/2024		10,00	20,00	168,8	28	07/01/2025	3117	104%	4	3000	
	10/12/2024		10,00	20,00	171,0	28	07/01/2025	3158	105%	4	3000	

AOLAB INGENIERIA DE LABORATORIO
LAB DE SUELOS

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
- INV-E-410-13

CONTRATISTA	CONSORCIO WF
PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA
UBICACIÓN	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN VEREDA LOS ANDES
FECHA EMISION INFORME:	ENERO DEL 2025

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD. LAB	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	% de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
			Diametro	Longitud	KN							
17/12/2024	12/12/2024	3	10,00	20,00	115,6	7	19/12/2024	2135	71%	4	3000	CONCRETOS VIGA CIMENTACION EJE A
	12/12/2024		10,00	20,00	113,6	7	19/12/2024	2098	70%	5	3000	
	12/12/2024		10,00	20,00	148,5	14	26/12/2024	2742	91%	4	3000	
	12/12/2024		10,00	20,00	150,6	14	26/12/2024	2781	93%	4	3000	
	12/12/2024		10,00	20,00	170,5	28	09/01/2025	3149	105%	5	3000	
	12/12/2024		10,00	20,00	174,2	28	09/01/2025	3217	107%	4	3000	

AOLAB INGENIERIA DE LABORATORIO DE SUELOS

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

CONTRATISTA	CONSORCIO WF
PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA
UBICACIÓN	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN VEREDA LOS ANDES
FECHA EMISION INFORME	ENERO DEL 2025

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD. LAB	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	%de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
			Diametro	Longitud	KN							
18/12/2024	13/12/2024	4	10,00	20,00	116,6	7	20/12/2024	2153	72%	4	3000	CONCRETOS VIGA CIMENTACION EJE B
	13/12/2024		10,00	20,00	119,2	7	20/12/2024	2201	73%	5	3000	
	13/12/2024		10,00	20,00	155,2	14	27/12/2024	2866	96%	4	3000	
	13/12/2024		10,00	20,00	157,7	14	27/12/2024	2912	97%	5	3000	
	13/12/2024		10,00	20,00	178,8	28	10/01/2025	3302	110%	5	3000	
	13/12/2024		10,00	20,00	176,2	28	10/01/2025	3254	106%	4	3000	

AOLAB INGENIERIA DE LABORATORIO
LAB DE SUELOS

ingenieriadesuelosaolab@gmail.com / calle 76 # 1ª bis -33 puertas del edén /3115955822

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

CONTRATISTA	CONSORCIO WF
PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA
UBICACIÓN	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN VEREDA LOS ANDES
FECHA EMISION INFORME:	ENERO DEL 2025

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD. LAB	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	% de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
			Diametro	Longitud	KN							
24/12/2024	19/12/2024	5	10,00	20,00	115,6	7	26/12/2024	2135	71%	5	3000	CONCRETOS COLUMNAS EJE A
	19/12/2024		10,00	20,00	119,9	7	26/12/2024	2214	74%	5	3000	
	19/12/2024		10,00	20,00	150,6	14	02/01/2025	2781	93%	3	3000	
	19/12/2024		10,00	20,00	153,2	14	02/01/2025	2829	94%	3	3000	
	19/12/2024		10,00	20,00	171,2	28	16/01/2025	3162	105%	5	3000	
	19/12/2024		10,00	20,00	176,9	28	16/01/2025	3267	109%	4	3000	

AOLAB INGENIERIA DE LABORATORIO
LAB DE SUELOS

ingenieriadesuelosaolab@gmail.com / calle 76 # 1ª bis -33 puertas del edén /3115955822

AOLAB INGENIERIAS SAS

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

CONTRATISTA CONSORCIO WF

PROYECTO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA

UBICACIÓN MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN VEREDA LOS ANDES

FECHA EMISION INFORME: ENERO DEL 2025

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD. LAB	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	% de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
			Diametro	Longitud	KN							
01/01/2025	27/12/2024	7	10,00	20,00	119,6	7	03/01/2025	2209	74%	3	3000	CONCRETOS VIGA CANAL EJE A
	27/12/2024		10,00	20,00	118,4	7	03/01/2025	2186	73%	5	3000	
	27/12/2024		10,00	20,00	148,6	14	10/01/2025	2744	91%	4	3000	
	27/12/2024		10,00	20,00	150,2	14	10/01/2025	2774	92%	5	3000	
	27/12/2024		10,00	20,00	169,9	28	24/01/2025	3138	105%	4	3000	
	27/12/2024		10,00	20,00	170,5	28	24/01/2025	3149	105%	4	3000	

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS HAN SIDO TOMADAS POR EL CLIENTE Y TRANSPORTADAS POR LABORATORIO. EL COMPORTAMIENTO PARA UN CONCRETO COMVENCIONAL (SIN ADITIVO) SERA: A LOS 1d= 15% 3d= 40% 7d= 70% 14d= 90% 28d= 100% CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5%

CALCULO
JEFE DE LABORATORIO

ingenieriadesuelosaolab@gmail.com / calle 76 # 1ª bis -33 puertas del edén /3115955822

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

CONTRATISTA	CONSORCIO WF
PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA
UBICACIÓN	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN VEREDA LOS ANDES
FECHA EMISION INFORME:	ENERO DEL 2025

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD. LAB	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	%de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
			Diametro	Longitud	KN							
25/12/2024	20/12/2024	6	10,00	20,00	120,6	7	27/12/2024	2227	74%	4	3000	CONCRETOS COLUMNAS EJE B
	20/12/2024		10,00	20,00	121,4	7	27/12/2024	2242	75%	5	3000	
	20/12/2024		10,00	20,00	150,2	14	03/01/2025	2774	92%	4	3000	
	20/12/2024		10,00	20,00	151,1	14	03/01/2025	2790	93%	5	3000	
	20/12/2024		10,00	20,00	178,5	28	17/01/2025	3296	110%	4	3000	
	20/12/2024		10,00	20,00	175,3	28	17/01/2025	3237	108%	3	3000	

AOLAB INGENIERIA DE LABORATORIO

ingenieriadesuelosaolab@gmail.com / calle 76 # 1ª bis -33 puertas del edén /3115955822

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

CONTRATISTA	CONSORCIO WF
PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA
UBICACIÓN	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN VEREDA LOS ANDES
FECHA EMISION INFORME:	ENERO DEL 2025

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD. LAB	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	%de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
			Diametro	Longitud	KN							
11/01/2025	10/01/2025	1	10,00	20,00	121,2	7	17/01/2025	2238	75%	3	3000	CONCRETOS VIGA CANAL EJE B
	10/01/2025		10,00	20,00	119,8	7	17/01/2025	2212	74%	4	3000	
	10/01/2025		10,00	20,00	151,2	14	24/01/2025	2792	93%	4	3000	
	10/01/2025		10,00	20,00	149,6	14	24/01/2025	2763	92%	3	3000	
	10/01/2025		10,00	20,00		28	07/02/2025	0	0%		3000	
	10/01/2025		10,00	20,00		28	07/02/2025	0	0%		3000	

AOLAB INGENIERIAS DE LABORATORIO
LAB DE SUELOS

ingenieriadesuelosaolab@gmail.com / calle 76 # 1ª bis -33 puertas del edén /3115955822

AOLAB INGENIERIAS SAS-ORDEN DE SERVICIO

AOLAB INGENIERIAS SAS
calle 76 # 1ª bis -33
puertas del edén
Neiv-Huila
3115955822
ingenieriadesuelosaolab@gmail.com

ORDEN DE SERVICIO 08-1224

NOMBRE DEL CLIENTE	CONSORCIO WF	**NÚMERO DE PEDIDO**	08-1224
TELÉFONO DEL CLIENTE	316 5373582	**ID DE CLIENTE**	901769619-8
CORREO ELECTRÓNICO DEL	consorciowf23@gmail.com	**PEDIDO RECIBIDO POR**	AOLAB INGENIERIAS SAS
TRABAJO DESCRIPCIÓN	OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA		
COMENTARIOS ADICIONALES	MUESTRAS DE CONCRETO-MUNICIPIO SAN AGUSTIN -LOS ANDES		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y LA MANO DE OBRA	ingreso de muestras	fechas de fundicion	resistencia (psi)
CONCRETOS ZAPATAS A3-B2	12/12/2024	7/12/2024	3000
CONCRETOS PEDESTAL A4-B3	15/12/2024	10/12/2024	3000
CONCRETO VIGA CIMENTACIÓN EJE A	17/12/2024	12/12/2024	3000
CONCRETO VIGA CIMENTACIÓN EJE B	18/12/2024	13/12/2024	3000
CONCRETO COLUMNAS EJE A	24/12/2024	19/12/2024	3000
CONCRETO COLUMNAS EJE B	25/12/2024	20/12/2024	3000
CONCRETO VIGA CANAL EJE A	1/01/2025	27/12/2024	3000
CONCRETO VIGA CANAL EJE B	11/01/2025	10/01/2025	3000

Cordialmente

AOLAB INGENIERÍA DE LABORATORIO

COORDINADOR DE LABORATORIO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14972266463

(415)7707212489984(8020) 000001497226646 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 7 7 9 0	6	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
AOLAB INGENIERIA SAS BIC

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CL 76 1 A 33

42. Correo electrónico INGENIERIADESUELOSAOLAB@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 6 9 9 5 7 0 3	3 1 1 5 9 5 5 8 2 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 4 0 1 0 5	7 1 2 0	2 0 2 4 0 1 0 5	4 2 1 0	4 2 9 0		0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	1	4	4	2	4	7	4	8	5	5																

14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 15 / 07 : 07: 57

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PERAFAN ORDOÑEZ OSCAR ESTEBAN
985. Cargo REPRESENTANTE

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 20-05-2024 04:17:41PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1083886304		GIRALDO JIMENEZ JAVIER HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA LLANOGRANDE	PITALITO-HUILA	8361000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1229014186	9481044995	I	2025/02/04	2025/01/30	BANCOLOMBIA	0	$440,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500
Ciudad: PITALITO Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500
1	CC	1083886304	GIRALDO JAVIER	X																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	0	$0	$0	No	$440,500
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1083886304		GIRALDO JIMENEZ JAVIER HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA LLANOGRANDE	PITALITO-HUILA	8361000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1229014186	9481044995	I	2025/02/04	2025/01/30	BANCOLOMBIA	0	$440,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,700	$0	$0	$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$440,500	$0	$0	$440,500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7711430
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 4 9 25 OF 507	TELÉFONO:	8668020
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7960848319	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2025
			0				
			2025/02/07				1471622116

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 562.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 562.900	$ 0	$ 562.900
SUBTOTALES:										$ 562.900	$ 0	$ 562.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 439.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 439.800	$ 0	$ 0	$ 439.800
SUBTOTALES:													$ 439.800	$ 0	$ 0	$ 439.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 85.700	$ 85.700	$ 0	$ 0	$ 85.700
SUBTOTALES:									$ 85.700	$ 0	$ 0	$ 85.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																														PENSIÓN							SALUD							ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 7711430	PERDOMO POLANIA FAIVER EDUARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 3.517.650				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 3.517.650	$ 562.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 562.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.517.650	$ 439.800	$ 0	$ 439.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.517.650	7711430	$ 85.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.088.400

Planilla Pagada
