INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL __X__ TOTAL ___
No. 03


Bogotá (Cundinamarca), ABRIL 2025

1. CONTRATISTA	Nombre completo: JUAN SEBASTIAN RINCON BELTRAN Identificación 1.095.829.944 Nacionalidad Colombiana Dirección: CALLE 21 # 11 C - 50 Teléfono de contacto 3169226852 E-mail de contacto: ingsebastianrincon126@gmail.com
2. SUPERVISOR	Nombre completo: CT. NATHALIE LOPEZ CARDENAS Cargo: Oficial planes y Estadística Resolución de nombramiento (00000371 de 10 de enero de 2025) Teléfono de contacto 3183637150 E-mail de contacto: nathalie.lopez@buzonejercito.mil.co
3. No. DEL CONTRATO – FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No. del contrato 104-CENACPERSONAL-2025 Fecha de suscripción 28/01/2025
4. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	No. De la Póliza :14-46-101131813 Entidad que expide la póliza: Seguros del Estado Fecha del certificado de aprobación de la Póliza: 1/FEB/2025 Aprobado por: TC. JAIRO ANDRES BEJARANO GARCIA
5. CRP	No. 6625 Fecha expedición 30 DE ENERO DE 2025 Unidas/Sub-unidad ejecutora CENAC PERSONAL Dependencia: COMANDO DE ADQUISICIONES -COADE Posición catálogo de gasto: (A-02-02-02-008-003) Fuente: NACIÓN Recurso 10 Valor: $36.000.000
6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	1/FEB/2025
7. PLAZO DE EJECUCIÓN	30/SEP/2025
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR TÉCNICO CONTRACTUAL
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. Realizar visitas de auditoría a cada tipo de proyecto, con el fin de evidenciar el cumplimiento de los requisitos y estándares de calidad establecidos, teniendo en cuenta la normatividad vigente. 2. Verificar y evaluar los informes semanales enviados por dirección de contratación regional y especializada con el fin de elaborar planes correctivos en los casos que se requiera, teniendo en cuenta la normatividad vigente. 3. Consolidar la documentación y base de datos de las obras, con el fin de mantener la trazabilidad para los procesos de seguimiento y control, teniendo -en cuenta la normatividad vigente. 4. Revisar y verificar el avance de las obras presentados y ejecución presupuestal presentadas por la Dirección de Contratación Regional y Especializada y Centrales Administrativas y Contables, comparándolo con las

Powered by CamScanner

	memorias del cálculo y planos de diseños, con el fin de optimizar los recursos asignados a cada contrato, teniendo en cuenta la normatividad vigente. 5. Actualizar la base de datos de seguimiento técnico y financiero, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Comando Superior. 6. Realizar visitas a las obras, con el fin de verificar el seguimiento y control de los contratos suscritos y así optimizar el presupuesto asignado, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Comando Superior. OBLIGACIONES GENERALES PRESTADORES DE SERVICIOS CENAC PERSONAL 1. Observar durante el tiempo de ejecución del contrato, buena disposición y actitud favorable hacia el trabajo, respeto hacia sus compañeros y miembros del Ejército Nacional, al igual que la aplicación permanente de principios y valores propios de la institución militar. 2. Dar estricto durante todas sus actuaciones, al marco normativo correspondiente a la integridad, trasparencia y lucha contra la corrupción. 3. Guardar y mantener la debida reserva y confiabilidad frente a los temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo y ejecución del presente contrato, reserva que se hará extensiva a los derechos de autor que de los mismos se derive. 4. Aplicar medidas pasivas de seguridad con la documentación según clasificación con el fin de evitar la fuga de información de acuerdo con la normatividad vigente. OBLIGACIONES CONTRACTUALES GENERALES: ✓ De conformidad con el artículo 3 del Decreto 2609 de 2012, el contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del Contrato, presentando en el cronograma de actividades y en su informe de forma mensual el barrido de los documentos en físico y el término del almacenamiento del Orfeo hasta el archivo de los documentos. ✓ El contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato. ✓ Entregar al final de la prestación del servicio, backup de la información producto ejecución del contrato. ✓ El contratista autoriza al MDN – EJÉRCITO NACIONAL a realizar los estudios de seguridad, comprobación de lealtad, realización de los exámenes de poligrafía y pruebas sicométricas antes y durante la contratación. ✓ Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer, y que hace parte del presente contrato. ✓ Las demás obligaciones que se deriven del objeto del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Independencia del Contratista. El Contratista es independiente del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre

Powered by CamScanner

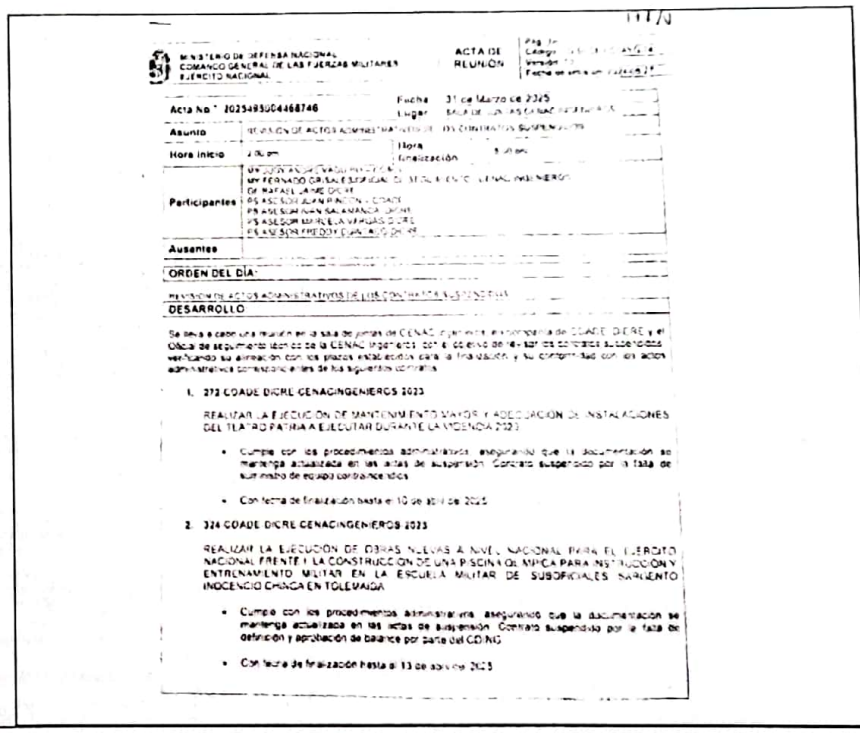	del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo
10. PERIODO DEL INFORME	ABRIL 2025
11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	2. Verificar y evaluar los informes semanales enviados por dirección de contratación regional y especializada con el fin de elaborar planes correctivos en los casos que se requiera, teniendo en cuenta la normatividad vigente. ✓ Se efectuó un seguimiento y control detallado con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos en las fechas indicadas en las circulares y oficios correspondientes. 1. Acta de reunión No. 2025495004468746 – asunto – revisión de actos administrativos de los contratos suspendidos. 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Acta No.° 2025495004468746 Fecha 31 de Marzo de 2025

Asunto

Hora inicio

Hora finalización

Participantes

Ausentes


ORDEN DEL DÍA:

DESARROLLO

1. 373 COADE DICRE GENACINGENIEROS 2023

2. 324 COADE DICRE GENACINGENIEROS 2023

Powered by CamScanner

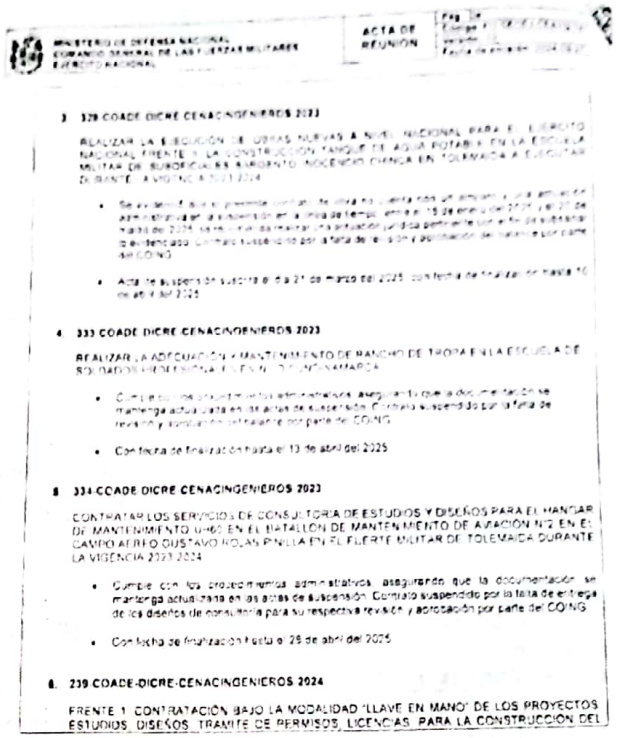

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL

ACTA DE REUNION

3 329 COADE DICRE CENACINGENIEROS 2023

REALIZAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS NUEVAS A NIVEL NACIONAL PARA EL EJERCITO NACIONAL FRENTE A LA CONSTRUCCIÓN TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES SARGENTO INOCENCIO CHINCA EN TOLEMAIDA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023 2024

- Se evidencia que el proceso contractual se encuentra en etapa de ejecución y con fecha de terminación en la orden de terminación el 15 de enero 2025 y con fecha de 27 de marzo de 2025 se realizo una prorroga por 90 días calendario por lo que se encuentra suspendido contrato suscrito con fecha de 8 de abril y posteriormente se reanuda por parte del COING
- Acta de suspensión suscrita el día 21 de marzo del 2025 con fecha de finalización hasta 10 de abril del 2025

4 333 COADE DICRE CENACINGENIEROS 2023

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RANCHO DE TROPA EN LA ESCUELA DE SUBOFICIALES PROFESIONAL FELIPE SANTAMARIA

- Cumple con los procedimientos administrativos, asegurando que la documentación se mantenga actualizada en las actas de suspensión. Contrato suspendido por la falta de revisión y aprobación integral por parte del COING
- Con fecha de finalización hasta el 13 de abril del 2025


5 334-COADE DICRE CENACINGENIEROS 2023

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL HANGAR DE MANTENIMIENTO UH60 EN EL BATALLON DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN N°2 EN EL CAMPO AEREO GUSTAVO ROJAS PINILLA EN EL FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA DURANTE LA VIGENCIA 2023 2024

- Cumple con los procedimientos administrativos, asegurando que la documentación se mantenga actualizada en las actas de suspensión. Contrato suspendido por la falta de entrega de los diseños de consultoría para su respectiva revisión y aprobación por parte del COING
- Con fecha de finalización hasta el 25 de abril del 2025

6. 239 COADE-DICRE-CENACINGENIEROS 2024

FRENTE 1 CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD "LLAVE EN MANO" DE LOS PROYECTOS ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITE DE PERMISOS, LICENCIAS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL

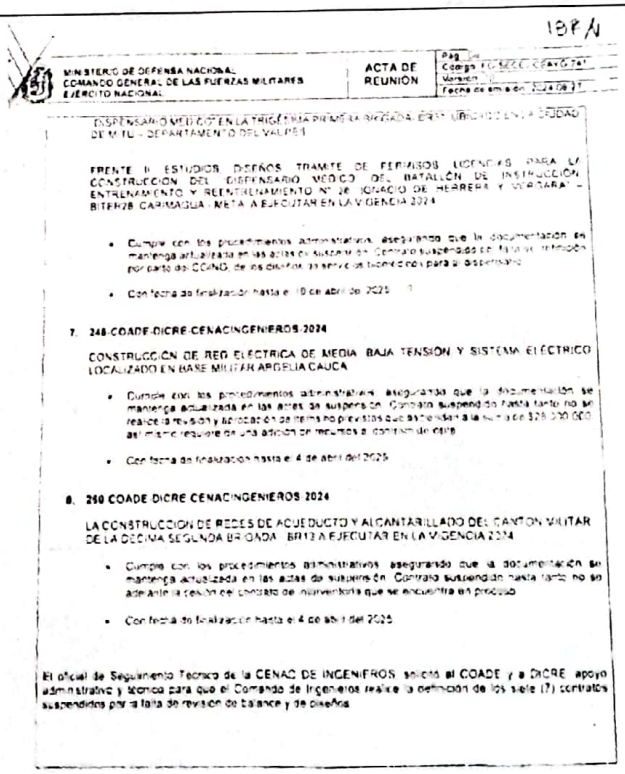

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL

ACTA DE REUNION

DISPENSARIO MEDICO EN LA PRIMERA BRIGADA, EN EL MUNICIPIO EN LA CIUDAD DE MITU - DEPARTAMENTO DEL VAUPES

FRENTE II ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITE DE PERMISOS, LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL DISPENSARIO MEDICO DEL BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N° 28 IGNACIO DE HERRERA Y VERGARA – BITER28 CARIMAGUA - META A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024

- Cumple con los procedimientos administrativos, asegurando que la documentación se mantenga actualizada en las actas de suspensión. Contrato suspendido en fase de revisión por parte del COING, de los diseños, ya se encuentra para su dispensario

- Con fecha de finalización hasta el 10 de abril de 2025

7. 248-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS 2024

CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA DE MEDIA BAJA TENSIÓN Y SISTEMA ELECTRICO LOCALIZADO EN BASE MILITAR ARGELIA CAUCA

- Cumple con los procedimientos administrativos, asegurando que la documentación se mantenga actualizada en las actas de suspensión. Contrato suspendido hasta tanto no se realice la revisión y aprobación de ítems no previstos que ascienden a la suma de $28.330.000 así mismo resultado de una adición de recursos a contratación 0818

- Con fecha de finalización hasta el 4 de abril del 2025

8. 250 COADE DICRE CENACINGENIEROS 2024


LA CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MILITAR DE LA DECIMA SEGUNDA BRIGADA BR12 A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024

- Cumple con los procedimientos administrativos asegurando que la documentación se mantenga actualizada en las actas de suspensión. Contrato suspendido hasta tanto no se adelante la cesión del contrato de interventoría que se encuentra en proceso

- Con fecha de finalización hasta el 4 de abril del 2025


El oficial de Seguimiento Tecnico de la CENAC DE INGENIEROS solicito al COADE y a DICRE apoyo administrativo y técnico para que el Comando de Ingenieros realice la definición de los siete (7) contratos suspendidos por la falta de revisión de balance y de diseños

Powered by CamScanner

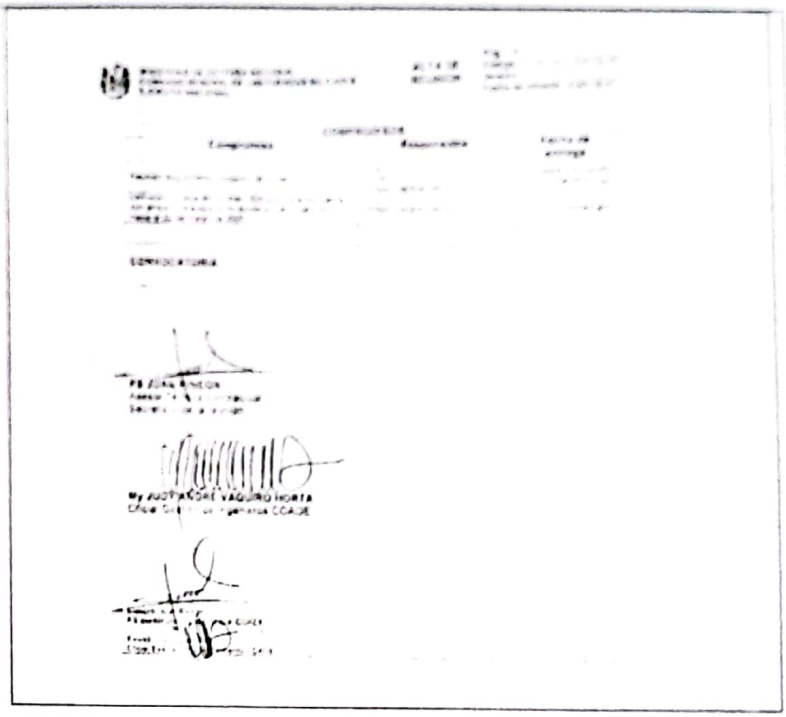

2. Acta de reunión No.2025495004465036 – asunto – reunión comité seguimiento de obras.

Powered by CamScanner

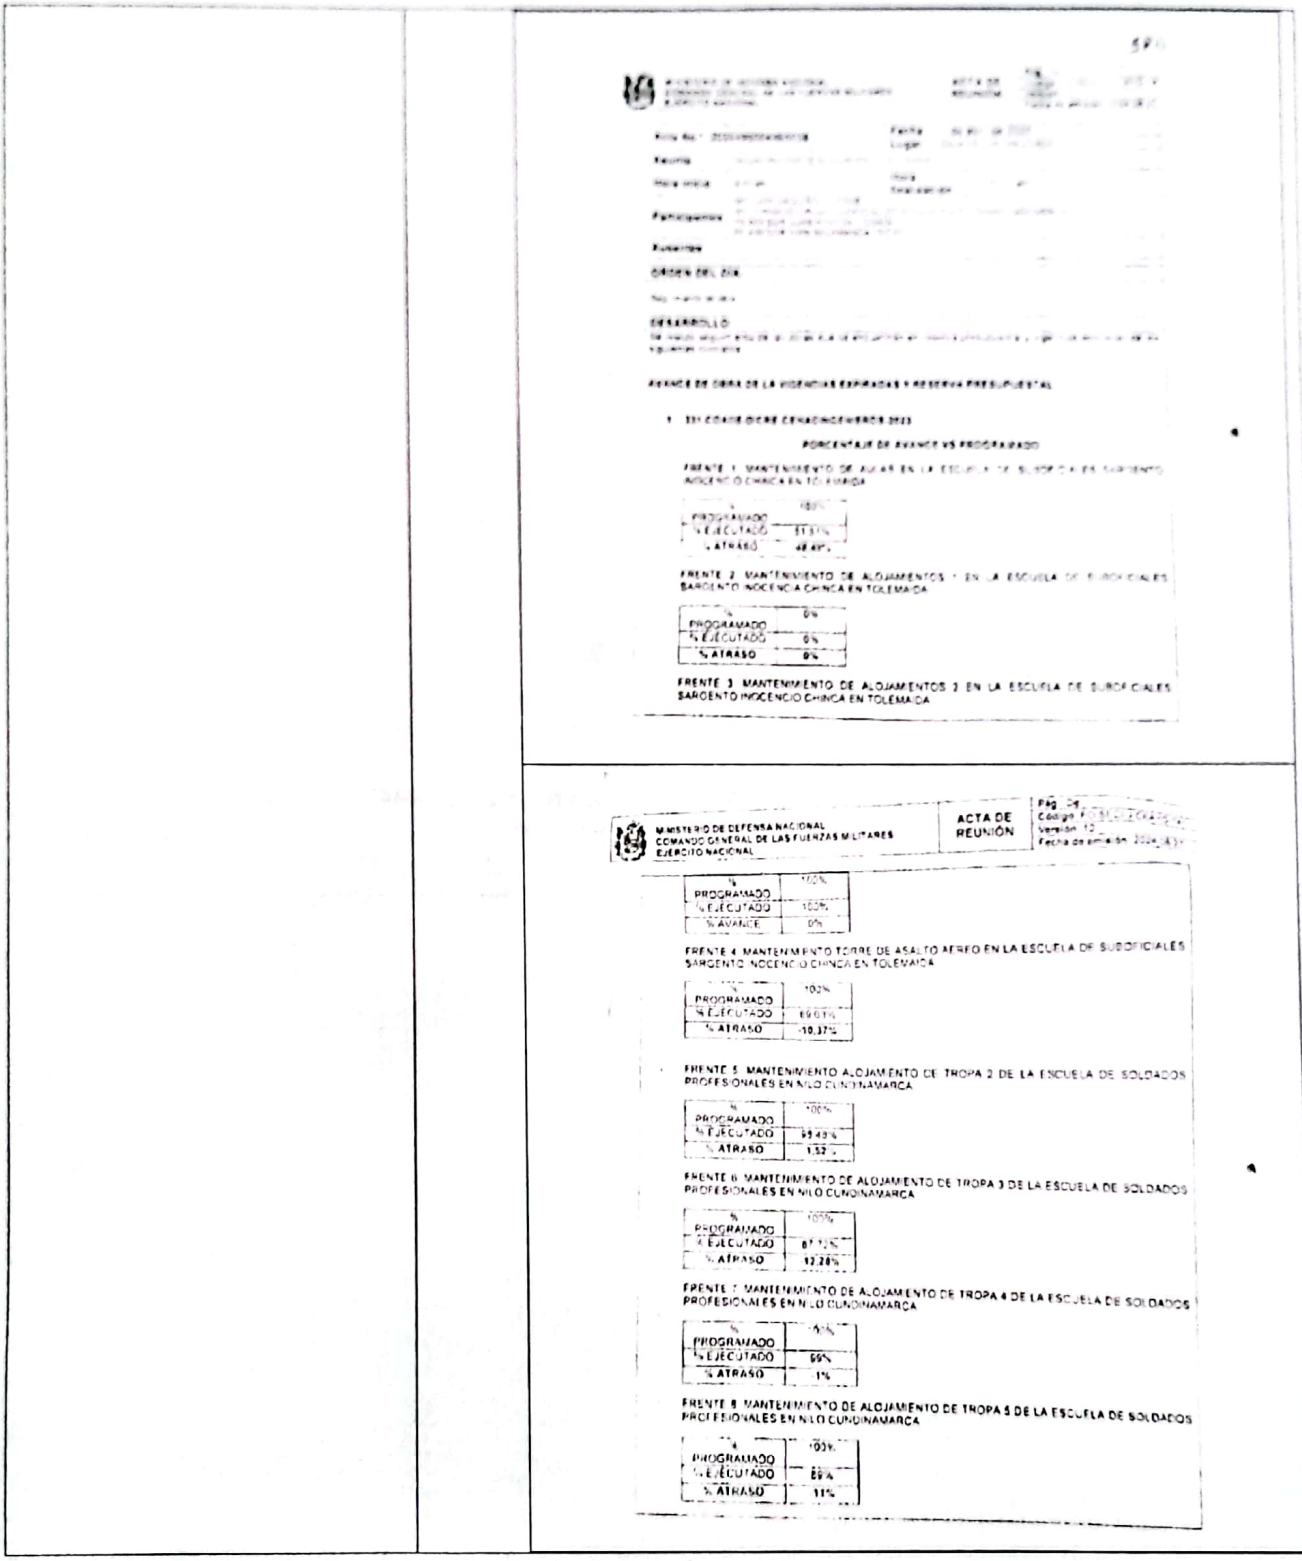

AVANCE DE OBRA DE LA VIGENCIAS EXPIRADAS Y RESERVA PRESUPUESTAL

1 [illegible]

PORCENTAJE DE AVANCE VS PROGRAMADO

FRENTE 1 MANTENIMIENTO DE ALOJAMIENTOS 1 EN LA ESCUELA DE SUBOFICIALES SARGENTO INOCENCIO CHINCA EN TOLEMAIDA

%	100%
PROGRAMADO	
% EJECUTADO	51.51%
% ATRASO	48.49%

FRENTE 2 MANTENIMIENTO DE ALOJAMIENTOS 1 EN LA ESCUELA DE SUBOFICIALES SARGENTO INOCENCIO CHINCA EN TOLEMAIDA

%	0%
PROGRAMADO	
% EJECUTADO	0%
% ATRASO	0%

FRENTE 3 MANTENIMIENTO DE ALOJAMIENTOS 2 EN LA ESCUELA DE SUBOFICIALES SARGENTO INOCENCIO CHINCA EN TOLEMAIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Pág. 24
Código: FORMULARIO-[illegible]
Versión: 12
Fecha de emisión: 2024-[illegible]

%	100%
PROGRAMADO	
% EJECUTADO	100%
% AVANCE	0%

FRENTE 4 MANTENIMIENTO TORRE DE ASALTO AEREO EN LA ESCUELA DE SUBOFICIALES SARGENTO INOCENCIO CHINCA EN TOLEMAIDA

%	100%
PROGRAMADO	
% EJECUTADO	89.63%
% ATRASO	-10.37%

FRENTE 5 MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO DE TROPA 2 DE LA ESCUELA DE SOLDADOS PROFESIONALES EN NILO CUNDINAMARCA

%	100%
PROGRAMADO	
% EJECUTADO	99.48%
% ATRASO	1.52%

FRENTE 6 MANTENIMIENTO DE ALOJAMIENTO DE TROPA 3 DE LA ESCUELA DE SOLDADOS PROFESIONALES EN NILO CUNDINAMARCA

%	100%
PROGRAMADO	
% EJECUTADO	87.72%
% ATRASO	12.28%

FRENTE 7 MANTENIMIENTO DE ALOJAMIENTO DE TROPA 4 DE LA ESCUELA DE SOLDADOS PROFESIONALES EN NILO CUNDINAMARCA

%	100%
PROGRAMADO	
% EJECUTADO	99%
% ATRASO	1%

FRENTE 8 MANTENIMIENTO DE ALOJAMIENTO DE TROPA 5 DE LA ESCUELA DE SOLDADOS PROFESIONALES EN NILO CUNDINAMARCA

%	100%
PROGRAMADO	
% EJECUTADO	89%
% ATRASO	11%

Powered by CamScanner

FRENTE 9 MANTENIMIENTO DE ALOJAMIENTO DE TROPA B DE LA ESCUELA DE SOLDADOS PROFESIONALES EN NILO CUNDINAMARCA

%	100%
PROGRAMADO	
% EJECUTADO	76.20%
% ATRASO	-23.80%

FRENTE 10 MANTENIMIENTO CASINO DE OFICIALES DE BATALLON DE INGENIEROS MILITARES LIBORIO MEJIA EN FLORENCIA CAQUETA

%	73%
PROGRAMADO	
% EJECUTADO	55.67%
% ATRASO	-17.33%

FRENTE 11 MANTENIMIENTO CASINO DE SUBOFICIALES DEL GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO N3 GR JOSE MARIA CABAL EN IPIALES NARIÑO

%	46.50%
PROGRAVADO	
% EJECUTADO	46.50%
% ATRASO	0%

FRENTE 12 MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA BATALLON DE APOY No 09 CACIQ CAITANA BASO9 EN NEIVA HUILA

%	100%
PROGRAMADO	
% EJECUTADO	98%
% ATRASO	-2%

OBSERVACIONES

- FRENTE 2 MANTENIMIENTO DE ALOJAMIENTOS 1 EN LA ESCUELA DE SUBOFICIALES SARGENTO INOCENCIA CHINCA EN TOLEMAIDA - la escuela ha realizado entrega parcialmente del alojamiento debido no estado no se ha podido iniciar obra
- FRENTE 4 MANTENIMIENTO TORRE DE ASALTO AEREO EN LA ESCUELA DE SUBOFICIALES SARGENTO INOCENCIO CHINCA EN TOLEMAIDA - se entregaron los apoyos de anclaje de parte del COING que estaba a espera para avanzar en la obra, la semana pasada

- FRENTE 11 MANTENIMIENTO CASINO DE SUBOFICIALES DEL GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO N3 GR JOSE MARIA CABAL EN IPIALES NARIÑO - el COING aprobó el balance para proceder a avanzar en la obra de igual manera se encuentra una falla y es necesario un reforzamiento que no está incluido en el balance

2. 333 COADE-DICRE-CENACINGENIEROS 2023

PORCENTAJE DE AVANCE VS PROGRAMADO

FRENTE 1 REALIZAR LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE RANCHO DE TROPA EN DE LA ESCUELA DE SOLDADOS PROFESIONALES EN NILO CUNDINAMARCA A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023-2024

%	98%
PROGRAMADO	
% EJECUTADO	22.15%
% ATRASO	-75.85%

OBSERVACIONES

- Recomendaciones adicionar tiempo a la suspension ya que se encuentra vencido desde el dia 10/03/2025
- El contrato esta suspendido por revision de balance del frente del COING

AVANCE DE OBRA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL

3. 323 COADE DICRE-CENACINGENIEROS-2023


PORCENTAJE DE AVANCE VS PROGRAMADO

FRENTE 1 LA CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 2 (DOS) ALOJAMIENTOS DE TROPA EN LA ESCUELA DE SOLDADOS PROFESIONALES

%	91%
PROGRAMADO	
% EJECUTADO	86.50%
% ATRASO	-4.5%

FRENTE 2 LA CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO DEL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA MILITAR A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023-2024-2025

Powered by CamScanner

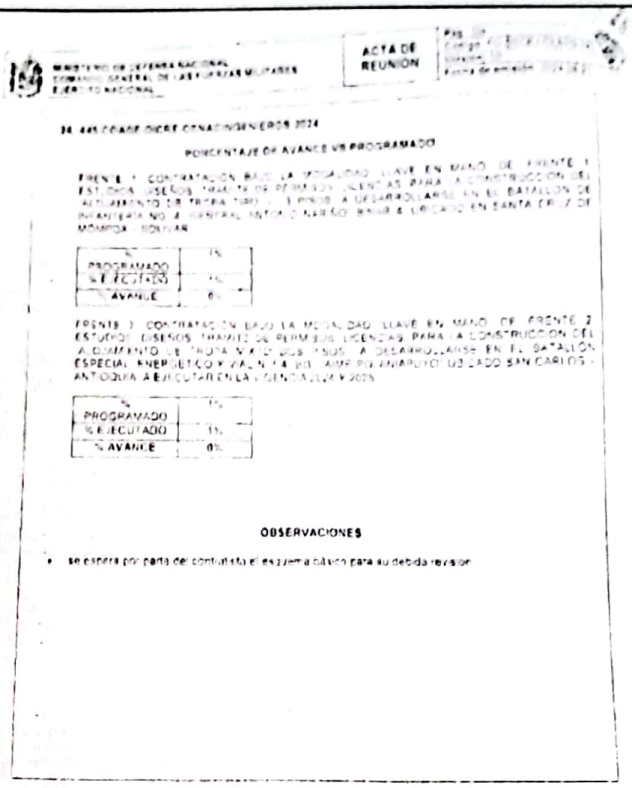

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL

ACTA DE REUNION

Pág.
Código FOR-CGFM-COADE-147
Versión 10
Fecha de emisión 2024-08-22

14 445 COADE OBRAS CONSTRUINGENIEROS 2024

PORCENTAJE DE AVANCE VS PROGRAMADO

FRENTE 1 CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO DE FRENTE 1 ESTUDIOS DISEÑOS TRAMITE DE PERMISOS LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL ALOJAMIENTO DE TROPA NIVEL 1 PISO A DESARROLLARSE EN EL BATALLON DE INFANTERIA NO 4 GENERAL ANTONIO NARIÑO BAJO EL LOCADO EN SANTA CRUZ DE MOMPOX BOLIVAR

PROGRAMADO	1%
% EJECUTADO	1%
AVANCE	0%

FRENTE 2 CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO DE FRENTE 2 ESTUDIOS DISEÑOS TRAMITE DE PERMISOS LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL ALOJAMIENTO DE TROPA NIVEL 1 PISO A DESARROLLARSE EN EL BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL 14 BIEVI AMPLIACION UBICADO SAN CARLOS ANTIOQUIA A EJECUTARSE EN LA VIGENCIA 2024 Y 2025

PROGRAMADO	1%
% EJECUTADO	1%
% AVANCE	0%

OBSERVACIONES

- se cargara por parte del contratista el cronograma actualizado para su debida revision

15

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL

ACTA DE REUNION

Pág.
Código FOR-CGFM-COADE-147
Versión 10
Fecha de emisión 2024-08-22

COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha de entrega
Actualizar los soportes de actos administrativos contratos suspendidos	Evaluación y Seguimiento COADE	31 marzo 2025

CONVOCATORIA: jueves 03 de abril de 2025 a las 08

PS JUAN SEBASTIAN RINCON BELTRAN
Asesor Tecnico Contractual
Secretario de la reunión


My JUDY ANDREA VAQUIRO HORTA
Oficial Gestion de Ingenieros COADE


PS [illegible]
Oficial Evaluacion y Seguimiento COADE

Powered by CamScanner

3. Consolidar la documentación y base de datos de las obras, con el fin de mantener la trazabilidad para los procesos de seguimiento y control, teniendo en cuenta la normatividad vigente.


- ✓ Se está llevando a cabo la consolidación de toda la información y documentación pertinente, la cual se encuentra en proceso de verificación, con el objetivo de completar la matriz de la base de datos de las obras en ejecución y de periodos anteriores. Este proceso tiene como finalidad asegurar un adecuado seguimiento y control, reflejando con exactitud.

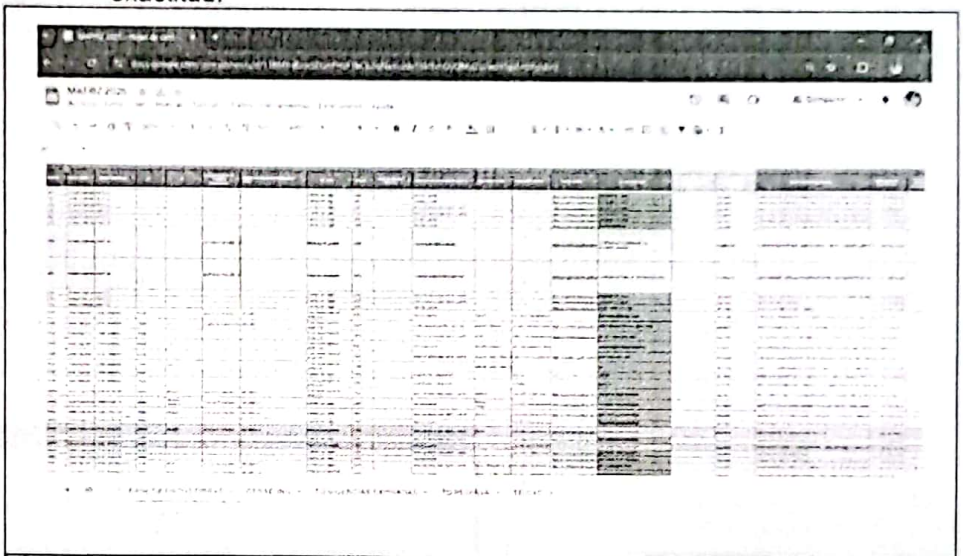

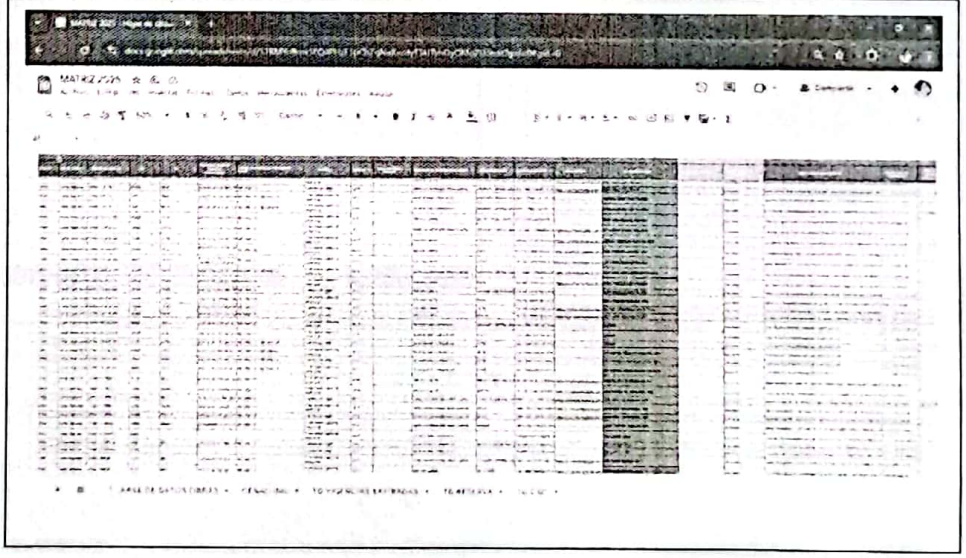



Powered by CamScanner


4. Revisar y verificar el avance de las obras presentados y ejecución presupuestal presentadas por la Dirección de Contratación Regional y Especializada y Centrales Administrativas y Contables, comparándolo con las memorias del cálculo y planos de diseños, con el fin de optimizar los recursos asignados a cada contrato, teniendo en cuenta la normatividad vigente.

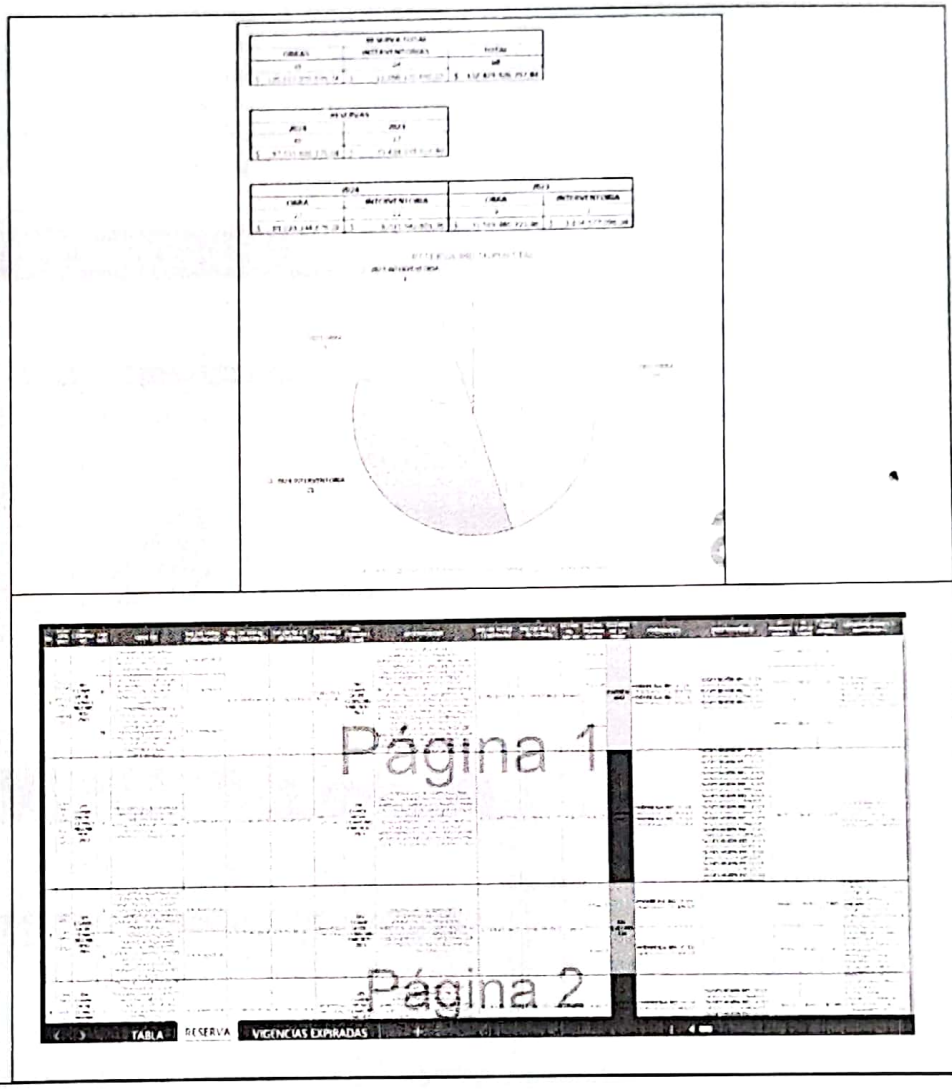

Powered by CamScanner

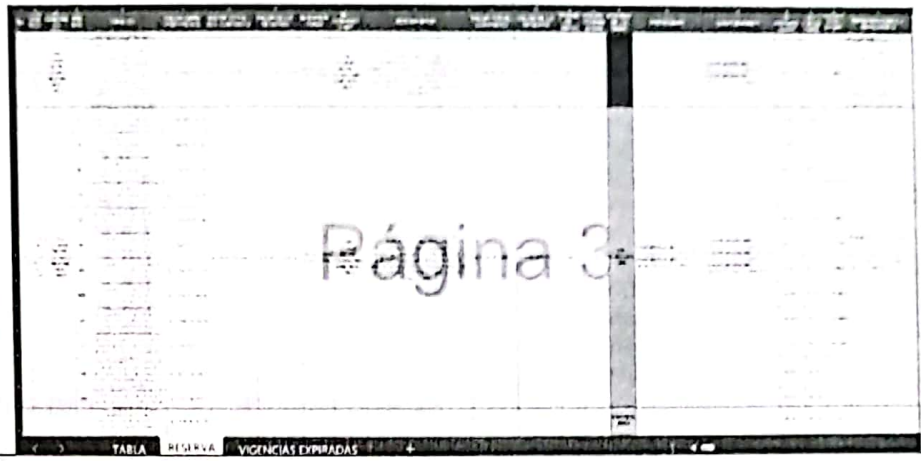

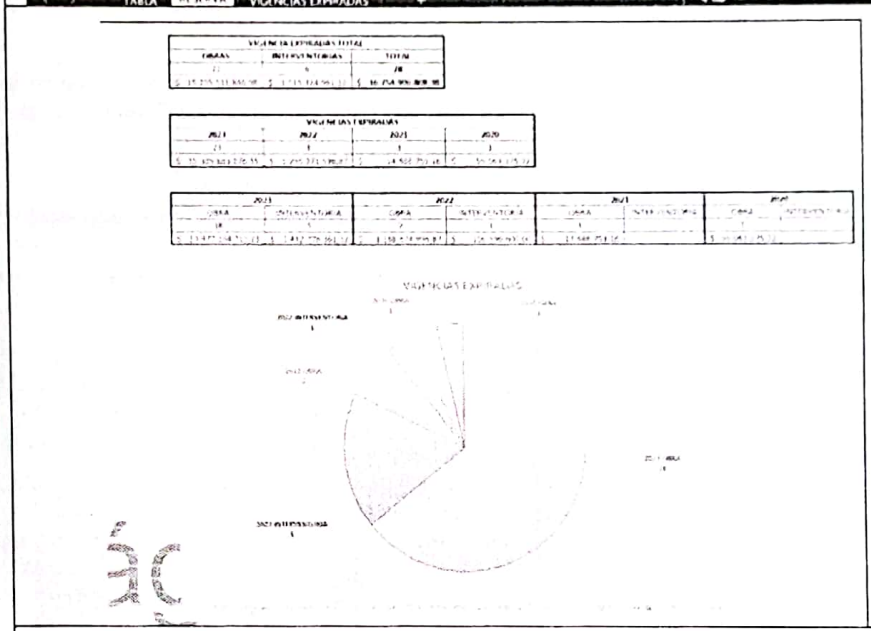





PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20B – 99 edificio Cantón Caldas
Bogotá D.C. - Cundinamarca
coade@buzonejercito.mil.co

Powered by CamScanner

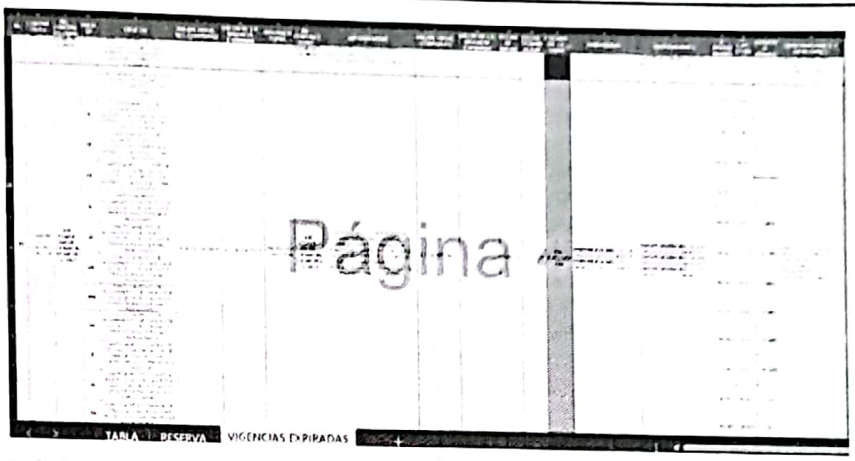


5. Actualizar la base de datos de seguimiento técnico y financiero, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Comando Superior.




OBRAS VIGENCIA ACTUAL

TIPO	VALOR ASIG.	VR. ADJUD.	#ADJ/TOTAL	% AVANCE
FUNCIONAMIENTO	$ 15.691.255.720,00		5/47	0%
INVERSION	$ 59.244.911.715,00	$ 1.252.333.240,00	3/28	2%
TOTAL OBRAS 2025	$ 74.935.187.435,00	$ 1.252.333.240,00	3/75	2%

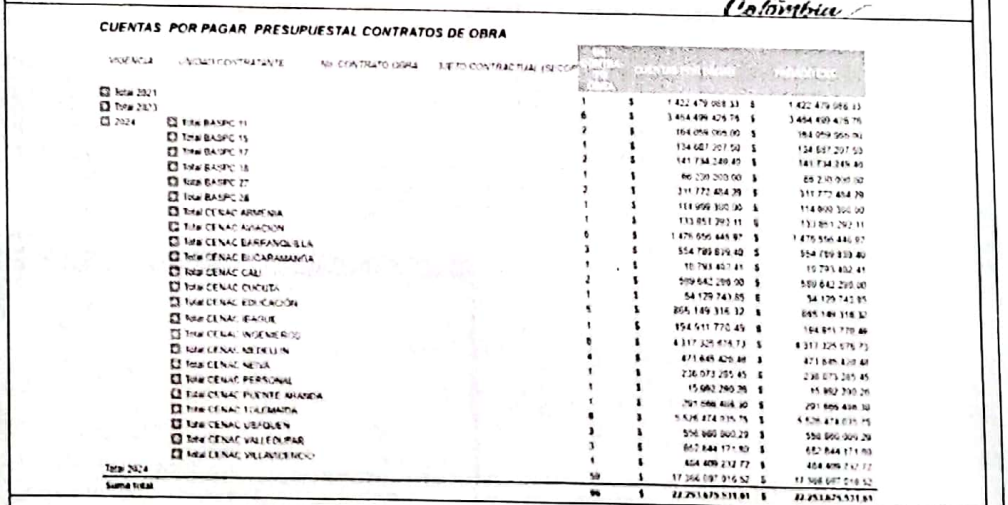

CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTAL CONTRATOS DE OBRA

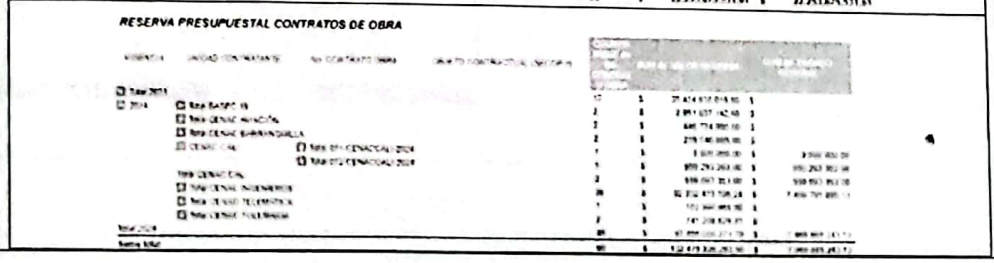

RESERVA PRESUPUESTAL CONTRATOS DE OBRA

12. VALOR DEL CONTRATO	Valor total: Valor: $ 36.000.000 Valor autorizado a pagar: $ 4.500.000

Powered by CamScanner

<table>
<tr><td>13. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL</td><td>
<table>
<tr><th>Obligación</th><th>Entidad</th><th>Valor Pago</th></tr>
<tr><td>PENSIÓN</td><td>PORVENIR</td><td>$ 288.000</td></tr>
<tr><td>SALUD</td><td>NUEVA EPS</td><td>$ 225.000</td></tr>
<tr><td>ARL</td><td>POSITIVA</td><td>$ 9.396</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>14. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL INFORME</td><td>1. Cuenta de cobro

2. Informe de gestión sobre el cumplimiento del objeto contractual, firmado por el CONTRATISTA y el recibido a satisfacción del supervisor del contrato, de acuerdo con el formato establecido.

3. Planilla de seguridad social: copia discriminada de los soportes de pago de los aportes mensuales obligatorios al sistema general de seguridad social en salud y pensión, sobre un ingreso base de cotización del 40% del valor mensual del contrato, con aporte del 16% en pensiones y el 12,5% en salud, ARL 0,522%

Nota: Lo anterior, conforme lo establece la normatividad legal vigente, la reglamentación de la materia y de acuerdo con la afiliación efectuada a la A.R.L.

4. Comprobante de pago de la planilla de seguridad social

5. Pantallazo SECOP II – Numeral 7 actualizado</td></tr>
<tr><td>15. CONSTANCIAS</td><td>En el presente informe se deja constancia que el/la contratista cumplió con las obligaciones contractuales y legales reguladas para este tipo de contrato y como consecuencia se recibe a satisfacción de forma PARCIAL __X__ TOTAL ____

Así mismo, se deja constancia que durante la ejecución del contrato no se han configurado los presupuestos legales que regulan el contrato laboral.</td></tr>
<tr><td>16. RECOMENDACIONES</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>17. CONCLUSIONES</td><td>Cumplió con las metas establecidas de acuerdo con el contrato establecido</td></tr>
</table>

Para constancia se firma en **Bogotá D.C.,** en el mes de **ABRIL 2025**

FIRMA SUPERVISOR
Contrato No. 104-CENACPERSONAL-2025
Nombre completo: CT NATHALIE LOPEZ CARDENAS
Cargo: Oficial Planes y Estadística
Resolución de nombramiento (00000371 de 10 de enero de 2025)

Powered by CamScanner
