CONSORCIO

INTER-VIAS 2023

Zipaquirá, 19 de Mayo de 2025

INTER-VIAS-168-2025

Señores:
ARQ. SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ

REF. SOLICITUD DE PRORROGA No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 05 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.5537544

Cordial saludo;

Teniendo en cuenta que el contratista requerirá de una prórroga a la suspensión de treinta (30) días al contrato de obra No CO1.PCCNTR.5598276 con el fin de que cesen las precipitaciones que se han venido presentando en la región durante el último mes, tal y como se argumentó anteriormente en el oficio No INTER-VIAS-167-2024, esta interventoría solicita mediante este documento, sea prorrogada la suspensión del contrato de interventoría No CO1.PCCNTR.5537544 por el mismo lapso de tiempo, treinta (30) días, con el fin de que cesen las lluvias en la región.

Se hace necesaria la aprobación de esta solicitud, todo en aras de dar el correcto cumplimiento del proyecto cuyo objeto hace referencia a "LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA AVENIDA BICENTENARIO Y URBANISMO ENTRE LA CALLE 7 Y LA CALLE 6 DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ"

Agradezco la atención prestada

Nº Folios : 13

Atentamente;

ING. DAVID FELIPE CAYCEDO VILLARRAGA.
R/L CONSORCIO INTER – VIAS 2023
INTERVENTORÍA
C.C. Secretaría de obras públicas

Zipaquirá, Calle 16 No. 14-26
Tel. 310 5747220/3132123236
E-mail: gkairos26@gmail.com / intervias2023@gmail.com

CONSORCIO

INTER-VIAS 2023

Zipaquirá, 19 de Mayo de 2025

INTER-VIAS-167-2025


Señores:
ARQ. SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ

REF. AVAL A LA PRORROGA No. 02 DE LA SUSPENSION NO. 05 DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5598276.

Cordial saludo;

De acuerdo a la solicitud entregada por el contratista el día 19 de mayo del presente año donde solicita se realice la prórroga No. 02 a la suspensión No. 05 en curso del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5598276, debido a que en la zona aún se están presentando precipitaciones, las cuales fueron objeto de la actual suspensión y no han disminuido. De igual manera manifiesta que dicha suspensión esta próxima a vencer y se ha mantenido constante comunicación con las canteras para adquirir material en óptimas condiciones, lo cual ha sido imposible para retomar actividades al reiniciar el contrato.

Por otro lado, el material granular superficial instalado a la fecha posee saturación y actualmente no cuenta con las propiedades necesarias, por lo que requerirá de correcciones para garantizar su humedad óptima y resistencia adecuada, motivo por el cual es indispensable realizar la ejecución de estas labores en condiciones climáticas secas, que ayuden a superar estas dificultades que se han presentado en este lapso de tiempo y asimismo poder continuar con la conformación de la estructura de pavimento y/o urbanismo al momento de reiniciar el contrato de obra, sin embargo, las condiciones climatológicas son desfavorables en los próximos días, ya que de acuerdo a los informes técnicos de alertas hidrológicas del IDEAM, las lluvias continuaran presentándose en la cuenca del río Bogotá, viéndose afectados principalmente los municipios pertenecientes al departamento de Cundinamarca, como se aprecia a continuación:

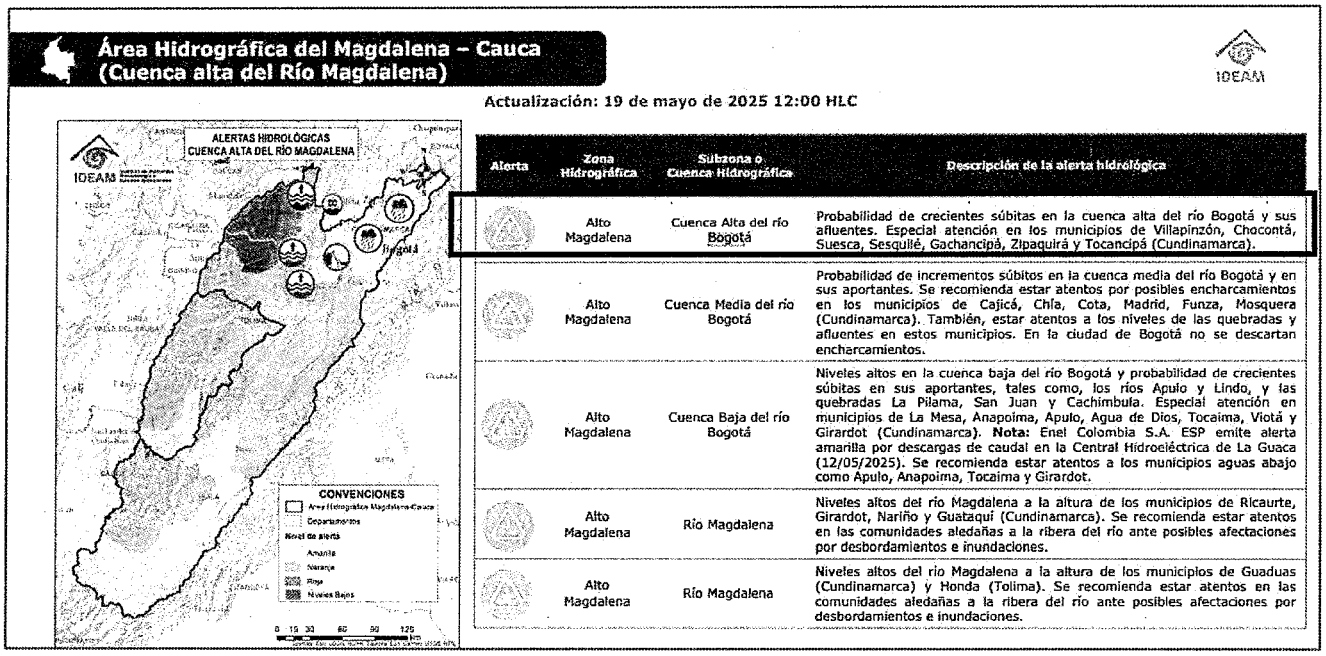

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca
(Cuenca alta del Río Magdalena)

IDEAM

Actualización: 19 de mayo de 2025 12:00 HLC

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Alto Magdalena	Cuenca Alta del río Bogotá	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca alta del río Bogotá y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Villapinzón, Chocontá, Suesca, Sesquilé, Gachancipá, Zipaquirá y Tocancipá (Cundinamarca).
	Alto Magdalena	Cuenca Media del río Bogotá	Probabilidad de incrementos súbitos en la cuenca media del río Bogotá y en sus aportantes. Se recomienda estar atentos por posibles encharcamientos en los municipios de Cajicá, Chía, Cota, Madrid, Funza, Mosquera (Cundinamarca). También, estar atentos a los niveles de las quebradas y afluentes en estos municipios. En la ciudad de Bogotá no se descartan encharcamientos.
	Alto Magdalena	Cuenca Baja del río Bogotá	Niveles altos en la cuenca baja del río Bogotá y probabilidad de crecientes súbitas en sus aportantes, tales como, los ríos Apulo y Lindo, y las quebradas La Pilama, San Juan y Cachimbula. Especial atención en municipios de La Mesa, Anapoima, Apulo, Agua de Dios, Tocaima, Viotá y Girardot (Cundinamarca). **Nota:** Enel Colombia S.A. ESP emite alerta amarilla por descargas de caudal en la Central Hidroeléctrica de La Guaca (12/05/2025). Se recomienda estar atentos a los municipios aguas abajo como Apulo, Anapoima, Tocaima y Girardot.
	Alto Magdalena	Río Magdalena	Niveles altos del río Magdalena a la altura de los municipios de Ricaurte, Girardot, Nariño y Guataquí (Cundinamarca). Se recomienda estar atentos en las comunidades aledañas a la ribera del río ante posibles afectaciones por desbordamientos e inundaciones.
	Alto Magdalena	Río Magdalena	Niveles altos del río Magdalena a la altura de los municipios de Guaduas (Cundinamarca) y Honda (Tolima). Se recomienda estar atentos en las comunidades aledañas a la ribera del río ante posibles afectaciones por desbordamientos e inundaciones.

Figura 1 Alerta hidrológica cuenca alta del río Magdalena. Fuente: Informe técnico diario IDEAM. Boletín No 139

Por estas razones, esta interventoría da el visto bueno a la solicitud realizada por el contratista para prorrogar la suspensión del contrato de obra No CO1.PCCNTR.5598276 por treinta (30) días.

Anexo solicitud No CO-NB-073-AZ, registro fotográfico del estado actual de la obra, informe técnico del IDEAM y certificaciones de proveedores entregadas por el contratista.

Agradezco la atención prestada

Atentamente;

ING. DAVID FELIPE CAYCEDO VILLARRAGA.
R/L CONSORCIO INTER – VIAS 2023
INTERVENTORÍA

Zipaquirá, Calle 16 No. 14-26
Tel. 310 5747220/3132123236
E-mail: gkairos26@gmail.com / intervias2023@gmail.com

CONSORCIO

INTER-VIAS 2023



Protección de Material granular– Zona vía Bicentenario




Protección de Material granular– Zona vía Bicentenario


Zipaquirá, Calle 16 No. 14-26
Tel. 310 5747220/3132123236
E-mail: gkairos26@gmail.com / intervias2023@gmail.com

CONSORCIO

INTER-VIAS 2023

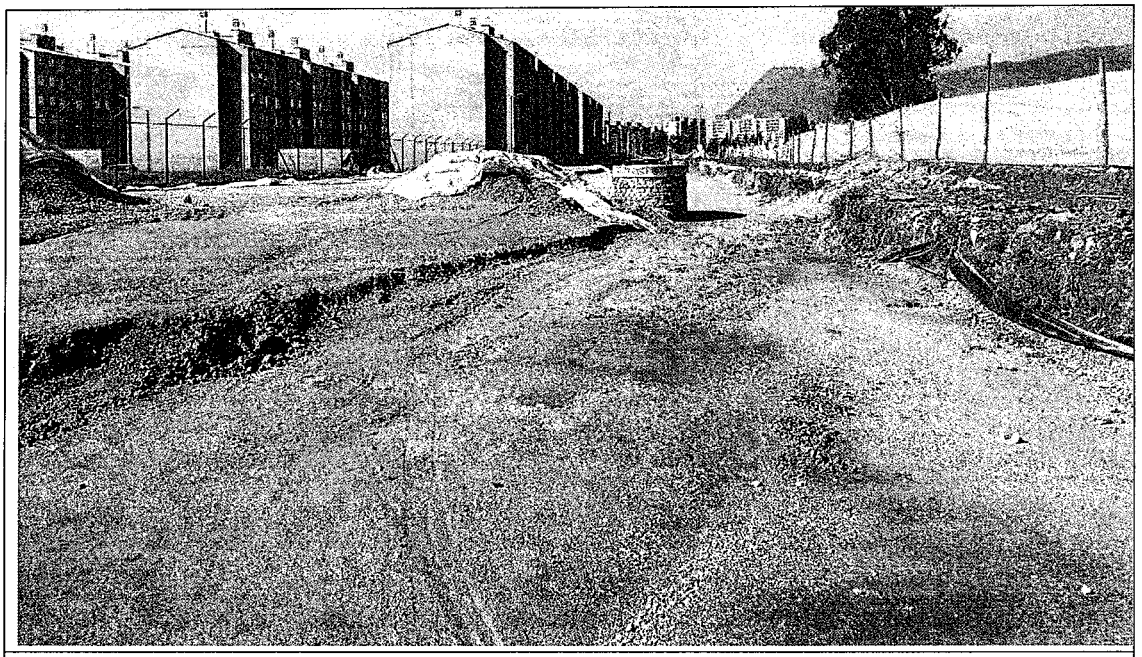

Material granular saturado – Zona vía Bicentenario

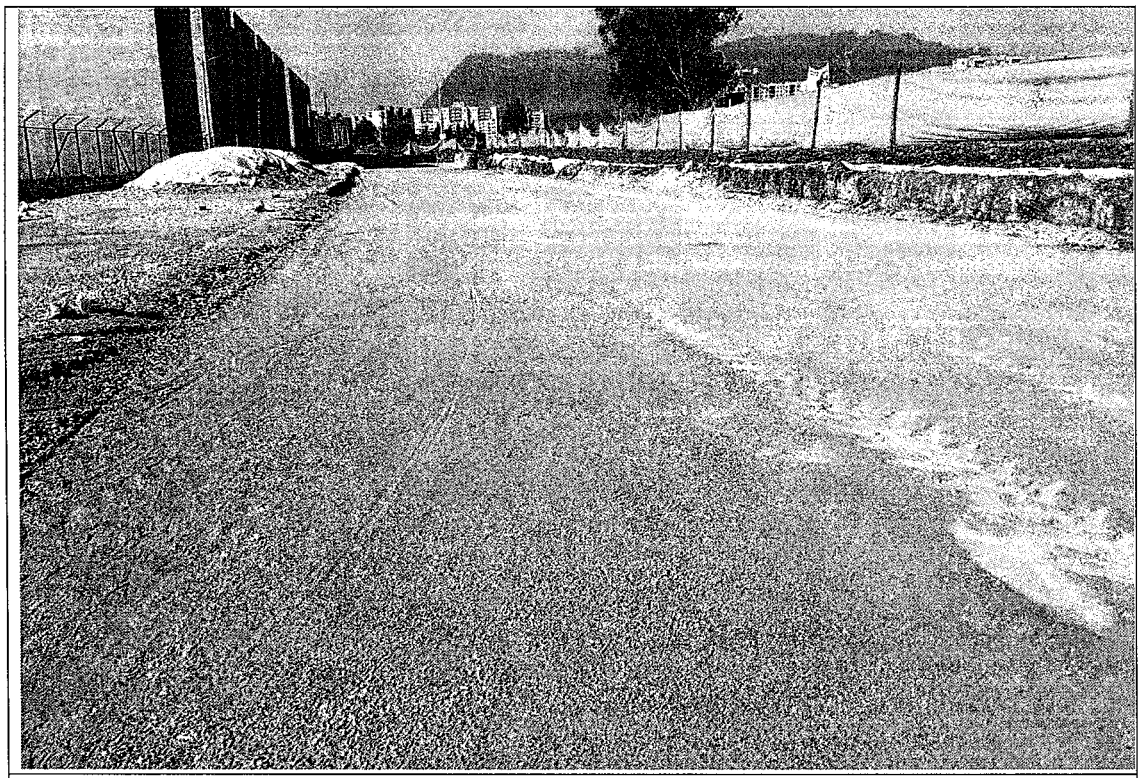

Material granular saturado – Zona vía Bicentenario

Zipaquirá, Calle 16 No. 14-26
Tel. 310 5747220/3132123236
E-mail: gkairos26@gmail.com / intervias2023@gmail.com

CONSORCIO

INTER-VIAS 2023



Material granular saturado – Zona vía Bicentenario



Material granular saturado – Zona vía Bicentenario


Zipaquirá, Calle 16 No. 14-26
Tel. 310 5747220/3132123236
E-mail: gkairos26@gmail.com / intervias2023@gmail.com

CONSORCIO

INTER-VIAS 2023

ANEXOS

Zipaquirá, Calle 16 No. 14-26
Tel. 310 5747220/3132123236
E-mail: gkairos26@gmail.com / intervias2023@gmail.com



Bladimir Cortés

NIT:80.539.473-6



Zipaquirá, Mayo de 2024

Señores.

PETRA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

Ref. COTIZACIÓN

Respetados señores.

Por medio de la presente me permito manifestar que el material que he venido suministrando, extendiendo y compactando proviene de la cantera Los Pinos ubicada en el Km 55 Vía Zipaquirá – Ubaté, Sutatausa (Cund), explotada y administrada por CARBOQ LTDA C.I.

Igualmente manifiesto que las condiciones climáticas se han mantenido con una alta precipitación, el estado de la vía de acceso que comunica a esta cantera se encuentra restringido llevando a afectaciones de los vehículos, de la misma forma el material que se logra cargar, se encuentra con una alta saturación y teniendo en cuenta las características físicas del mismo (Alta Plasticidad), resulta inconveniente en ese estado para el proyecto.

Agradezco su atención.

Cordialmente,

Bladimir Cortés Velandia
Nit: 80539473-6
Tel: 310-851-2141

CONSORCIO

INTER-VIAS 2023

SOLICITUD CONTRATISTA

Zipaquirá, Calle 16 No. 14-26
Tel. 310 5747220/3132123236
E-mail: gkairos26@gmail.com / intervias2023@gmail.com

CONSORCIO LA NUBE

Bogotá, 19 de mayo de 2025

CO-NB-073-AZ

Señores:
CONSORCIO INTER – VIAS 2023
Atn/ Ing David Felipe Caycedo V.
INTERVENTORIA
Zipaquirá - Cundinamarca

Referencia: Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.5598276 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE LA VIA AVENIDA BICENTENARIO Y URBANISMO ENTRE LA CALLE 7 Y LA CALLE 6 DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA"

Asunto: Solicitud de prorroga a la suspensión.

Estimado Ingeniero;

Me permito dirigirme a usted en calidad de representante legal del consorcio La Nube, en relación con el Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.5598276, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA AVENIDA BICENTENARIO Y URBANISMO ENTRE LA CALLE 7 Y LA CALLE 6 DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ", con el fin de solicitar la ampliación de la suspensión temporal del contrato, la cual se encuentra próxima a vencerse.

La presente solicitud se fundamenta en que persisten las condiciones climáticas adversas en el sector, principalmente lluvias constantes que han impedido el desarrollo normal de las actividades constructivas, afectando el acceso, la movilidad de la maquinaria y las condiciones de seguridad necesarias para ejecutar los trabajos.

Adicionalmente, informamos que las fuentes de materiales presentan intermitencias en el despacho, lo que ha dificultado la programación logística y la continuidad de las labores. Esta situación, sumada a la alta humedad presente en los materiales suministrados, impide garantizar la calidad del mismo, especialmente en lo referente a su grado de saturación, condición fundamental para cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto.

En virtud de lo anterior, y considerando que las causas que originaron la suspensión aún no han sido superadas, solicitamos se otorgue una ampliación del período de suspensión por 30 de días adicionales, contados a partir del día siguiente al vencimiento actual.

Calle 129B No 54-20 Of 24 - Bogotá D.C.
3163094733 - 3107564637
construccion@petra.com.co

CONSORCIO
LA NUBE

Adjuntamos los documentos de soporte técnico y registros que evidencian tanto las condiciones climáticas como las afectaciones en el suministro de materiales.

Agradezco su atención y a la espera de sus comentarios

Cordialmente,

DANIEL RUIZ VALBUENA
R.L. CONSORCIO LA NUBE

Anexo:
Informe de estación Pluviometrica
Certificación Cantera.
Certificación proveedor de material.

Calle 129B No 54-20 Of 24 - Bogotá D.C
3163094733 - 3107564637
construccion@petra.com.co

CONSORCIO

INTER-VIAS 2023

INFORME ALERTAS HIDROLOGICAS - IDEAM

Zipaquirá, Calle 16 No. 14-26
Tel. 310 5747220/3132123236
E-mail: gkairos26@gmail.com / intervias2023@gmail.com

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (19/05/2025 16:05)

Nombre estacion:	LA COSECHA [21205910]	**Corriente:**		**Categoría de estación:**	Climática Principal
Latitud:	4.989220	**Longitud:**	-74.001190	**Elevación:**	2570
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGIA M	**Area Operativa:**	Area Operativa 11 - Cundinam	**Departamento:**	Cundinamarca
Municipio:	Zipaquirá	**Fecha instalacíon:**	15/09/1976 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	14/04/2025 00:00-19/05/2025 00:00
Parametro:	Día pluviométrico (convencior	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
2025-04-14 00:00	0	Preliminar
2025-04-15 00:00	0	Preliminar
2025-04-16 00:00	0	Preliminar
2025-04-17 00:00	0	Preliminar
2025-04-18 00:00	0	Preliminar
2025-04-19 00:00	8	Preliminar
2025-04-20 00:00	2	Preliminar
2025-04-21 00:00	9	Preliminar
2025-04-22 00:00	18	Preliminar
2025-04-23 00:00	8	Preliminar
2025-04-24 00:00	10	Preliminar
2025-04-25 00:00	25	Preliminar
2025-04-26 00:00	28	Preliminar
2025-04-27 00:00	12.4	Preliminar
2025-04-28 00:00	3	Preliminar
2025-04-29 00:00	32	Preliminar
2025-04-30 00:00	3	Preliminar
2025-05-01 00:00	0	Preliminar
2025-05-02 00:00	28	Preliminar
2025-05-03 00:00	4	Preliminar
2025-05-04 00:00	8	Preliminar
2025-05-05 00:00	5	Preliminar
2025-05-06 00:00	25	Preliminar
2025-05-07 00:00	3	Preliminar
2025-05-08 00:00	2	Preliminar
2025-05-09 00:00	3	Preliminar
2025-05-10 00:00	0	Preliminar
2025-05-11 00:00	3	Preliminar
2025-05-12 00:00	0	Preliminar
2025-05-13 00:00	2	Preliminar
2025-05-14 00:00	1	Preliminar
2025-05-15 00:00	3	Preliminar
2025-05-16 00:00	6	Preliminar
2025-05-17 00:00	5	Preliminar
2025-05-18 00:00	22	Preliminar
