
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. MS - CM- 001-2025

INFORME DE INTERVENTORÍA

TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PARA EL CONTRATO DE OBRA No. MS-LP-002-2025



CONTRATISTA DE OBRA

COMLINRED SAS

820.004.070-9

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

BYD MULTIPROYECTOS S.A.S.

900.268.419- 8

ENTIDAD CONTRATANTE

MUNICIPIO DE SAMACA

30 DE ABRIL DE 2025 – 14 DE MAYO DE 2025

1. GENERALIDADES:

El Municipio de Samacá han hecho posible el desarrollo de proyectos que benefician a la comunidad del municipio; este se ha beneficiado con el proyecto en referencia. El proyecto a desarrollar se denomina. "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025"

Para el desarrollo de las actividades nombradas, constituye el punto de partida para la organización de proyectos tendientes a mejorar la calidad de vida de esta comunidad, a la vez permite el surgimiento del municipio como ente organizado, que busca el mejoramiento en general.

El proyecto consiste en "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025"

Para garantizar el cumplimiento y la calidad de las obras del contrato de acuerdo a las especificaciones existentes, el contratista realiza el siguiente informe, en este documento se describen todas las actividades realizadas por la firma COMLINRED S.A.S.

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. LOCALIZACION GENERAL

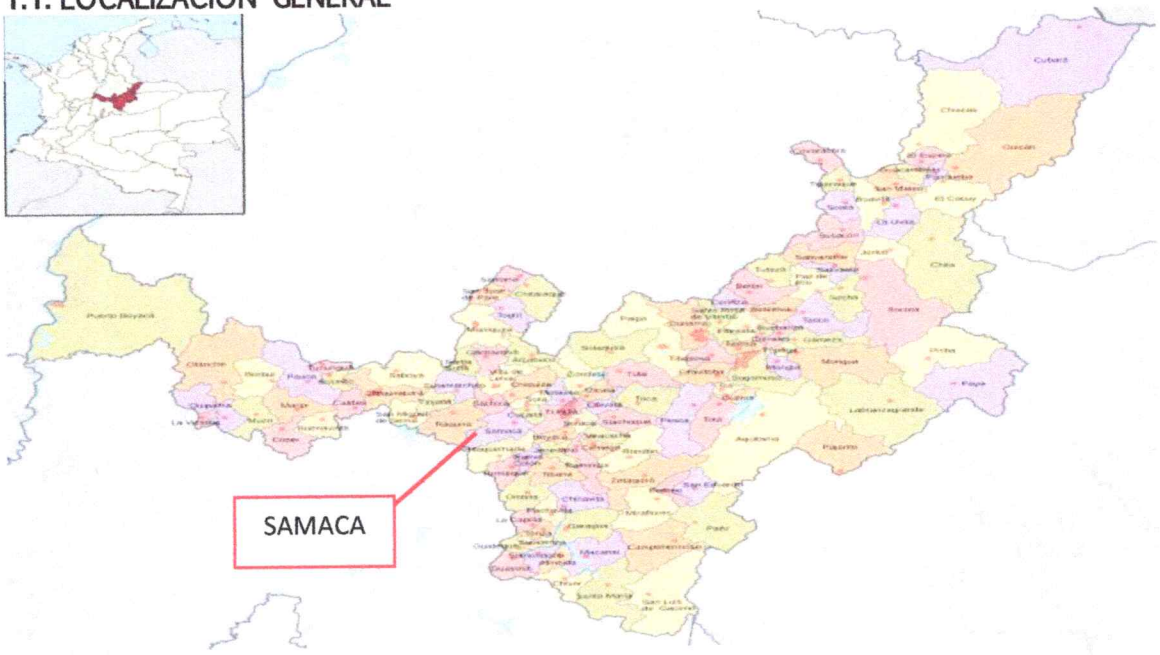


Ilustración 1. Ubicación General del municipio en el departamento

2.2 LOCALIZACION ESPECIFICA

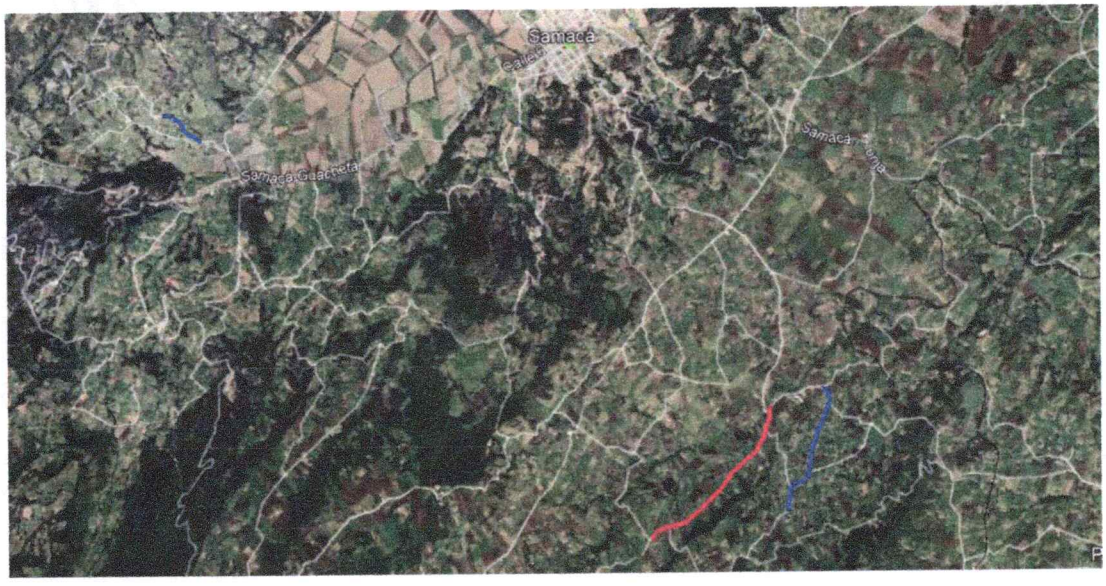


Ilustración 2. Ubicación especifica tramos a intervenir

2.3 FICHA TECNICA RESUMEN DEL CONTRATO OBRA

CONTRATO DE OBRA N.º:	MS-LP-002-2025
N.º DE PROCESO:	MS-LP-002-2025
OBJETO CONTRACTUAL:	"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SETECIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE. **($700.443.588,oo).**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAMACA
NIT:	800.016.757
ALCALDE MUNICIPAL:	WILSON CASTIBLANCO GIL
CONTRATISTA:	COMLINRED SAS
NIT:	820.004.070-9
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS C.C. 1.019.068.303 de Bogotá D.C.
INTERVENTORIA:	BYD MULTIPROYECTOS S.A.S.
NIT:	900.268.419-8
REPRESENTANTE LEGAL:	GILBERTO CELY VARGAS C.C. 1.052.020.418 DE FLORESTA
PLAZO:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO:	TREINTA (30) DE ABRIL DE 2025
ACTA PARCIAL 1:	CATORCE (14) DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	VEINTINUEVE (29) DE JULIO DE 2025

2.4 FICHA TECNICA RESUMEN DEL CONTRATO INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA N.º:	MS - CM- 001-2025
N.º DE PROCESO:	MS - CM- 001-2025
OBJETO CONTRACTUAL:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025"
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. **($49'031.051,oo).**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAMACA
NIT:	800.016.757
ALCALDE MUNICIPAL:	WILSON CASTIBLANCO GIL
CONTRATISTA:	BYD MULTIPROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT:	900.268.419-8

REPRESENTANTE LEGAL:	GILBERTO CELY VARGAS 74.374.894 DE DUITAMA
SUPERVISOR ACTUAL:	DANILO ALEXANDER VIANCHÀ VALDERRAMA Secretario de Planeación y Obras Públicas
PLAZO:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO:	TREINTA (30) DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	VEINTINUEVE (29) DE JULIO DE 2025

3. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO DE OBRA
3.1.CONDICIONES ORIGINALES

CONDICIONES ORIGINALES					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 40 - 60 W - 4000K- PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE (BRAZO PARA LUMINARIA, CABLE, FOTOCELDAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN)	UND	156.00	$ 1,082,556.00	$168,878,736.00
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG	UND	156.00	$ 995,504.00	$155,298,624.00
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) (INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE CONEXIÓN)	ML	4,650.00	$ 46,156.00	$214,625,400.00
	SUBTOTAL - COSTOS DIRECTOS				$ 538,802,760.00

3.2.CONDICIONES ACTUALIZADAS

3.3. SABANA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA (14/05/2025):

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PPRESENTE ACTA		ACUMULADO EJECUTADO	
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 40 - 60 W - 4000K- PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE (BRAZO PARA LUMINARIA, CABLE, FOTOCELDAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN)	140.00	$151,557,840.00	140.00	$151,557,840.00
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG	140.00	$139,370,560.00	140.00	$139,370,560.00
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) (INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE CONEXIÓN)	4,200.00	$193,855,200.00	4,200.00	$193,855,200.00
	SUBTOTAL - COSTOS DIRECTOS		$484,783,600.00		$484,783,600.00

3.4.ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CONTRATISTA DE OBRA

I. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 40 - 60 W - 4000K- PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE (BRAZO PARA LUMINARIA, CABLE, FOTOCELDAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN)

UNIDAD:	UND
CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA:	140
CANTIDAD POR EJECUTAR	16

DESCRIPCION: Los requisitos mínimos que debe llegar el "LUMINARIA 40W - 60 W DRIVER, IP 66, IK 08, 100.000H O MÁS TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K INCLUYE (CONECTOR DE TORNILLO DE PERFORACIÓN DE CHAQUETA AISLADA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN) 5 AÑOS O MÁS DE GARANTÍA con el fin de garantizar el

funcionamiento correcto de los mismos. Todo el tiempo basado estrictamente a las normas y reglamentos técnicos vigentes RETIE y RETILAP.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

· Armada y alistamiento de luminaria con el brazo, sus respectivos accesorios, cable y herrajes, esta actividad se hace en el piso, esto con el fin de cerciorarse de la conexión luego se procede a subir al poste con el camión grúa de canasta.

· Instalación de la luminaria en el poste de concreto que va soportada por con 2 collarines y/o conectores para garantizar su anclaje al poste, además de esto se realiza la conexión del cable que alimentara a la luminaria con el cable que alimenta la red eléctrica y para esto usamos el conector.

MANO DE OBRA:

- Profesional liniero
- Instalador

EQUIPOS

- Herramienta y equipo menor
- Grúa canasta hidráulica





EVIDENCIA FOTOGRAFICA

- TRAMO 1 VEREDA GACAL SECTOR KIOSCO

UNIDADES INSTALADAS	69





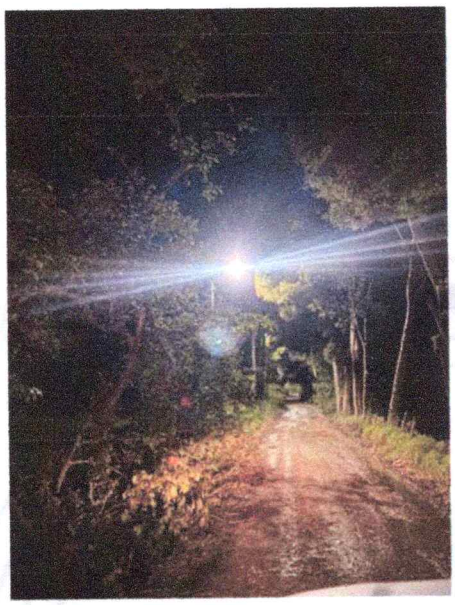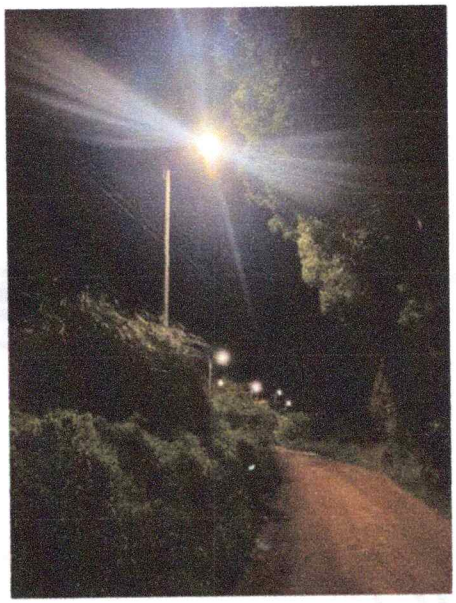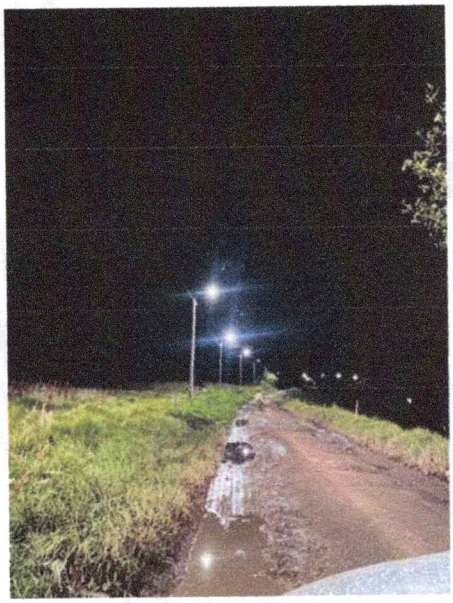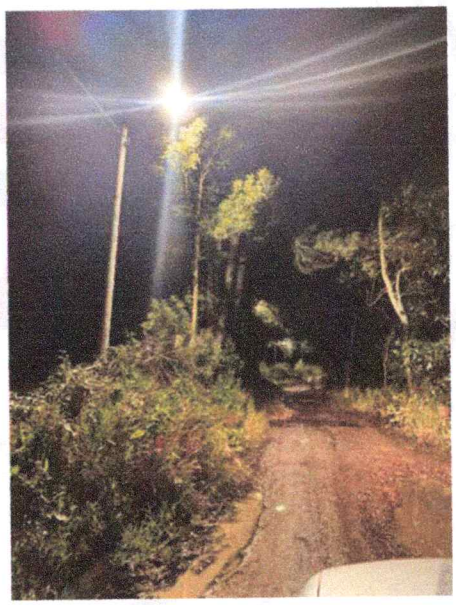


- TRAMO 2 VEREDA GACAL SECTOR IGLESIA SAN ISIDRO

UNIDADES INSTALADAS	57


DIRECCION: CARRERA 9A # 22-56 SOGAMOSO – BOYACÁ
EMAIL: MULTIPROYECTOSBYD@GMAIL.COM
TEL. 3143595318

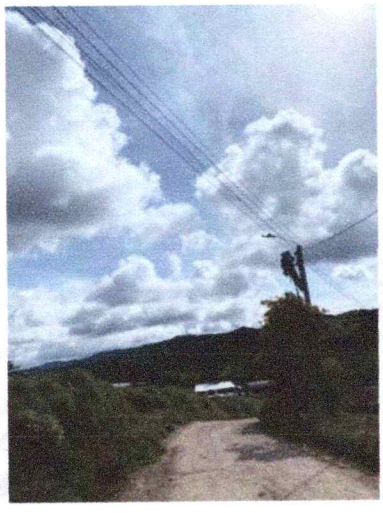II. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG

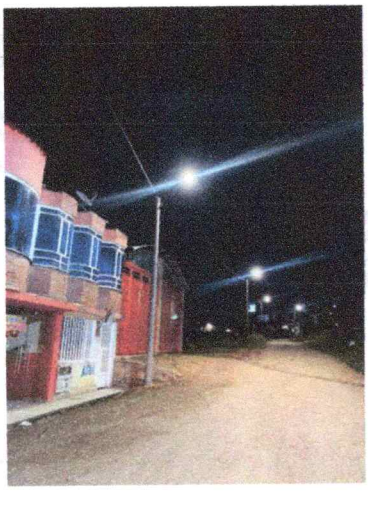UNIDAD:	UND
CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA:	140
CANTIDAD POR EJECUTAR	16

DESCRIPCION: Los requisitos mínimos que debe llegar el "SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG" con el fin de garantizar el funcionamiento correcto de los mismos. Todo el tiempo basado estrictamente a las normas y reglamentos técnicos vigentes RETIE y RETILAP.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

- Apertura de hueco en sitio según la normatividad vigente
- Luego procedemos a hincar el poste con la grúa de brazo hidráulico, este equipo es necesario ya que nos permite maniobrar con el poste.
- Plomada del poste, esta actividad se realiza girando el poste con la ayuda de una manila y una barra hasta obtener el ángulo adecuado, y se rellena el sobrante del hueco con material pétreo para fijarlo al suelo y evitar perder el ángulo.

MANO DE OBRA:

- Instalador
- Maestro
- Ayudante

EQUIPOS

- Herramienta y equipo menor
- Grúa brazo hidráulica

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

- TRAMO 1 VEREDA GACAL SECTOR KIOSCO

UNIDADES INSTALADAS	69





- TRAMO 2 VEREDA GACAL SECTOR IGLESIA SAN ISIDRO

UNIDADES INSTALADAS	57





III. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) (INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE CONEXIÓN)

UNIDAD:	ML
CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA:	4200

CANTIDAD POR EJECUTAR	450

DESCRIPCION: Los requisitos mínimos que debe llegar el "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) (INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESESARIOS DE CONEXIÓN)" con el fin de garantizar el funcionamiento correcto de los mismos. Todo el tiempo basado estrictamente a las normas y reglamentos técnicos vigentes RETIE y RETILAP.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

- Una vez se encuentra fijado el poste de concreto se procede a la instalación de los herrajes en su parte superior, allí se instala la percha que va fijada con el perno y la arandela y se pone el aislador y el capuchón que permite separar el cable conductor del de la percha y el poste, esto con el fin de evitar daños a la red, además se coloca la grapa en la red que hace parte del proceso constructivo, esta actividad se repite en cada una de las estructuras.

MANO DE OBRA:

- Profesional liniero
- Instalador
- Ayudante
- Maestro

EQUIPOS

- Herramienta y equipo menor
- Grúa canasta hidráulica

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

- TRAMO 1 VEREDA GACAL SECTOR KIOSCO


METROS LINEALES INSTALADOS	2060 ml






- TRAMO 2 VEREDA GACAL SECTOR IGLESIA SAN ISIDRO

METROS LINEALES INSTALADOS	1590 ML

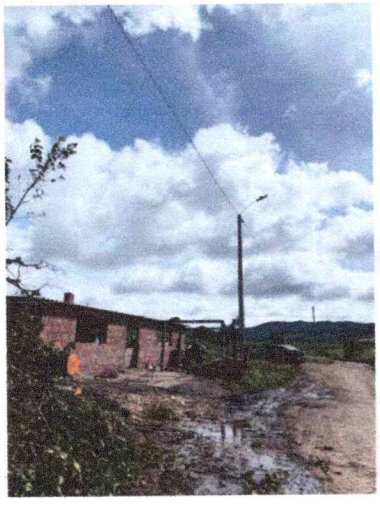

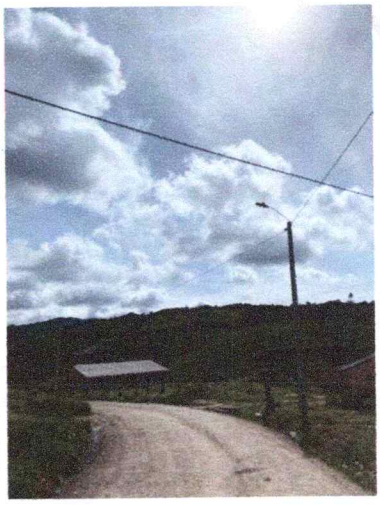

4. RESUMEN ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

A. CUADRO DE RELACION DE LAS ACTAS GENERADAS OBRA

Contrato de obra No. MS-LP-002-2025:

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	día	mes	año	
Contrato de obra	10	04	2025	
Acta de inicio obra	30	04	2025	

B. CUADRO DE RELACION DE LAS ACTAS GENERADAS INTERVENTORIA


Contrato de interventoría No. MS - CM- 001-2025

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	día	mes	año	
Contrato de obra	21	04	2025	
Acta de inicio obra	30	04	2025	

C. CRONOGRAMA AVANCE DE OBRA

EJECUCION VS CRONOGRAMA DE OBRA

AVANCE DE EJECUCIÓN					
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	20%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	89.9%	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	25%

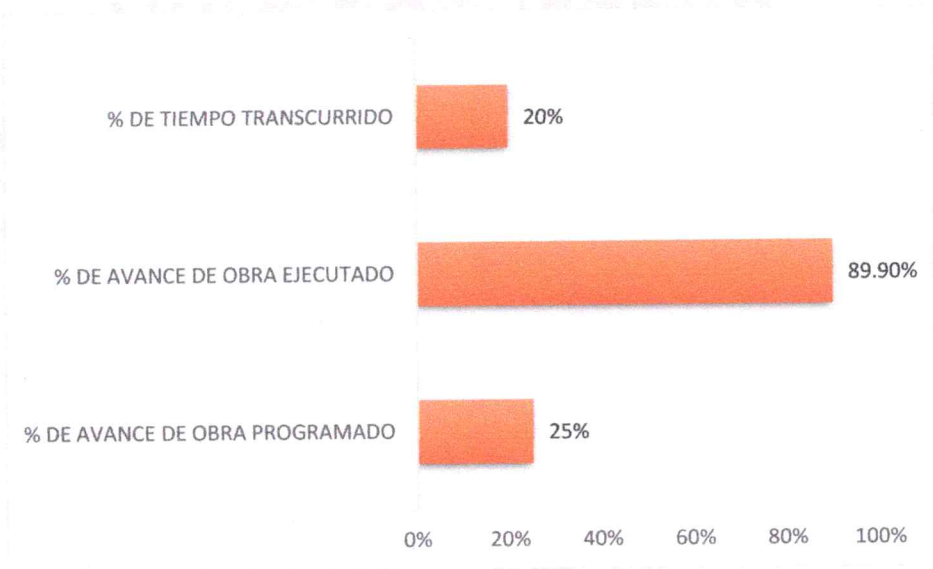

D. INFORMACION FINANCIERA DE OBRA

BALANCE DE PAGO		
ITEM	DETALLE	VALOR
1	Valor inicial	**$700.443.588,00**
2	Valor presente acta	**$630,218,680.00**
3	Valor ejecutado	**$630,218,680.00**
4	Saldo por ejecutar	**$70,224,908.00**

E. POLIZAS DEL CONTRATO OBRA

PÓLIZAS CONTRATO (10/04/2025)

Aseguradora solidaria de Colombia

- Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
		DESDE	HASTA		
600-47-994000075704	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/04/2025	16/01/2026	$105.066.538,20	Aprobada
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/04/2025	16/07/2028	$105.066.538,20	Aprobada
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10/04/2025	29/07/2025	$70.044.358,20	Aprobada

- Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento.

POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
		DESDE	HASTA		

600-74-994000012092	AMPARO BASICO PREDIOS LABORALES	10/04/2025	29/07/2025	$ 284,700,000.00	Aprobada
	PATRONAL	10/04/2025	29/07/2025	$ 284,700,000.00	Aprobada
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10/04/2025	29/07/2025	$ 284,700,000.00	Aprobada
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10/04/2025	29/07/2025	$ 284,700,000.00	Aprobada

POLIZAS INICIO (30/04/2025)

Aseguradora solidaria de Colombia

- Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
		DESDE	HASTA		
600-47-994000075704	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/04/2025	30/01/2026	$105.066.538,20	Actualizado
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/04/2025	30/07/2028	$105.066.538,20	Actualizado
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10/04/2025	29/07/2025	$70.044.358,20	Actualizado

- Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento.

POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
		DESDE	HASTA		
600-74-994000012092	AMPARO BASICO PREDIOS LABORALES	10/04/2025	29/07/2025	$ 284,700,000.00	Actualizado

	PATRONAL	10/04/2025	29/07/2025	$ 284,700,000.00	Actualizado
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10/04/2025	29/07/2025	$ 284,700,000.00	Actualizado
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10/04/2025	29/07/2025	$ 284,700,000.00	Actualizado

F. POLIZAS DEL CONTRATO INTERVENTORIA

POLIZAS CONTRATO (21/04/2025)

Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

- Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
		DESDE	HASTA		
51-44-101029685	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/04/2025	26/01/2026	$7.354.657,65	**Actualizado**
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21/04/2025	26/07/2028	$7.354.657,65	**Actualizado**
	CALIDAD DEL SERVICIO	21/04/2025	21/07/2030	$9.806.210,20	**Actualizado**

- Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento.

POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
		DESDE	HASTA		
51-40-101010032	AMPARO BASICO PREDIOS LABORALES	21/04/2025	26/07/2025	$ 284,700,000.00	**Actualizado**

POLIZAS INICIO (30/04/2025)

Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

- Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
		DESDE	HASTA		
51-44-101029685	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/04/2025	04/02/2026	$7.354.657,65	**Actualizado**
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/04/2025	04/08/2028	$7.354.657,65	**Actualizado**
	CALIDAD DEL SERVICIO	30/07/2025	30/07/2030	$9.806.210,20	**Actualizado**

- Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento.

POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
		DESDE	HASTA		
51-40-101010032	AMPARO BASICO PREDIOS LABORALES	30/04/2025	04/08/2025	$ 284,700,000.00	**Actualizado**

5. PERSONAL CONTRATO OBRA

ESPECIALIDAD	NOMBRE PROPUESTA	APROBACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS	OK

ESPECIALIDAD	NOMBRE PROPUESTA	APROBACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	ERWIN MENDEZ BERMUDEZ	OK
RESIDENTE DE OBRA	EDWIN LEONARDO VARGAS TORRES	OK
ASESOR ELECTRICO	OLMER WILCHES GARCIA	OK
TECNICO ELECTRICISTA, INSPECTOR	LUIS IGNACIO ARENAS GARCIA	OK
PROFESIONAL SISO	DIEGO FERNANDO SALDAÑA	OK

5.1. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

ESPECIALIDAD	NOMBRE PROPUESTA	APROBACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	GILBERTO CELY VARGAS	OK

ESPECIALIDAD	NOMBRE PROPUESTA	APROBACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	LEONARDO JOHNY PATIÑO QUIJANO	OK
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	OSCAR RENE FAJARDO RINCON	OK
ASESOR DE INTERVENTORIA	EDISON FABIAN VELANDIA RODRIGUEZ	OK
ASESOR SISO	BRIGGITTE KATHERINE FARFAN CORTES	OK

6. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL OBRA

Fecha de informe	**15/05/2025**	**PLANILLAS CONTRATISTA**	**RELACIÓN PLANILLAS APORTES PARAFISCALES**			
			ABR-25		**MAY-25**	
			Salud	**Pensiòn**	**Salud**	**Pensiòn**
RL CONTRATISTA 1	**DE: 01/04/2025**	**4604397509**	**Planilla No.**	**4604397509**	**Planilla No.**	

JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS	A: 30/04/2025			OK		

EQUIPO	Periodos trabajados	Salario base cotizaciòn (Salario propuesto)	40% Salario base	Salud (12,5 %)	Pensiòn (16%)	ARL (%)	ABR-25			
							SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF
Erwin Mendez Bermudez Director de obra	De: 30/04/2025 30/04/2025	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 1900,00	$ 7600.00	$ 3400.00	Planilla No.:		4604397509	
							OK	OK	OK	OK
Edwin Leonardo Vargas Torres Residente de obra	De: 30/04/2025 A: 30/04/2025	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 1900,00	$ 7600.00	$ 3400.00	Planilla No.:		4604397509	
							OK	OK	OK	OK
Olmer Wilches Garcia Asesor electrico	De: 30/04/2025 A: 30/04/2025	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 1900,00	$ 7600.00	$ 3400.00	Planilla No.:		4604397509	
							OK	OK	OK	OK
Luis Ignacio Arenas Garcia Tecnico Electricista	De: 30/04/2025 A: 30/04/2025	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 1900,00	$ 7600.00	$ 3400.00	Planilla No.:		4604397509	
							OK	OK	OK	OK
Diego Fernando Saldaña Sanchez	De: 30/04/2025	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 1900,00	$ 7600.00	$ 3400.00	Planilla No.:		4604397509	

Asesor SISO	A: 30/04/2025						OK	OK	OK	OK

7. CONCLUSIONES

- El proyecto consiste en la ampliación del sistema de alumbrado público con tecnología led en áreas rural y/o urbana del municipio de Samacá", con el fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad, embellecer el casco rural del municipio a la vez permite el surgimiento del municipio como ente organizado, que busca el mejoramiento en general.

- El tiempo transcurrido desde la firma del acta de inicio equivale a 20% del tiempo programado para la ejecución de la obra.

- Las actividades ejecutadas a la fecha por el contratista de obra, corresponden a un 89.9%, este porcentaje se formula con las cantidades ejecutadas a la fecha sobre las cantidades de las actividades.

- El contratista de obra cumple con la adecuada herramienta, equipos y maquinaria los cuales se encuentran en optimo estado, verificados por la interventoría.

- El contratista de obra realizo las actividades con el personal operativo adecuado y capacitado para cada labor ejecutada, usando de manera correcta y permanente los elementos de protección personal (EPP).

- El contratista de obra trabajo en forma veraz y precisa con la interventoría llevando un control y seguimiento a cada actividad desarrollada, esto con el fin de realizar correcto proceso constructivo para cada actividad ejecutada.



- El material usado por el contratista de obra es de buena calidad y están certificados por los proveedores.




- A las situaciones presentadas por las condiciones climáticas de lluvia se tomaron alternativas de solución para evitar los posibles daños a futuro.

- EL contratista de obra la empresa COMLINRED SAS, como la interventoría cuentan con las pólizas de seguro actualizadas según el estado del contrato a la fecha.




- EL contratista de obra la empresa COMLINRED SAS, como la interventoría cuentan con el pago de seguridad social y aporte a parafiscales.



GILBERTO CELY VARGAS
Rep. Legal BYD MULTIPROYECTOS SAS
Nit. No. 900.268.419-8


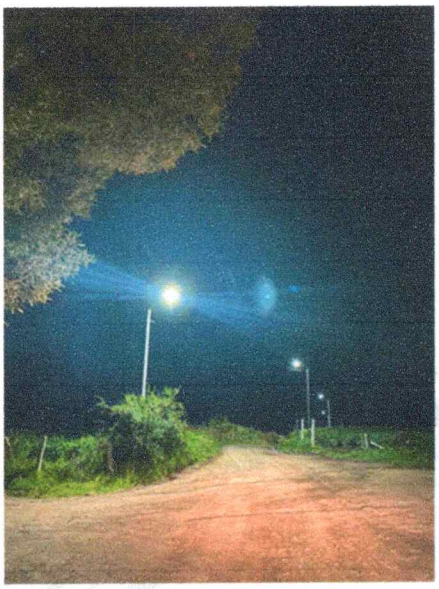
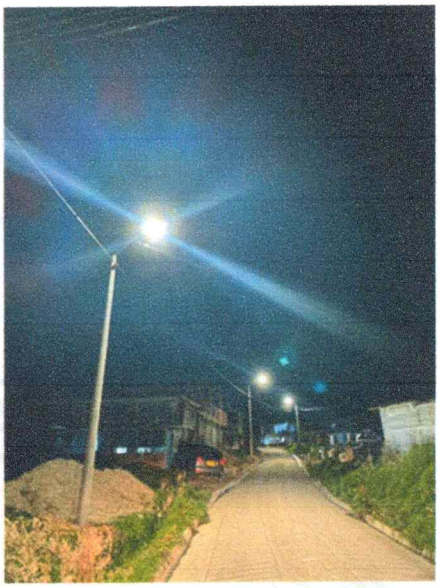


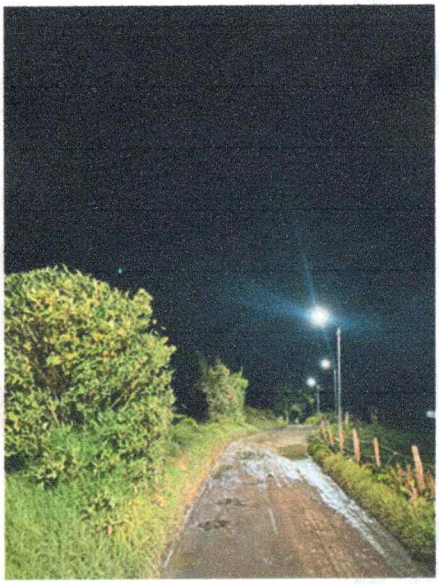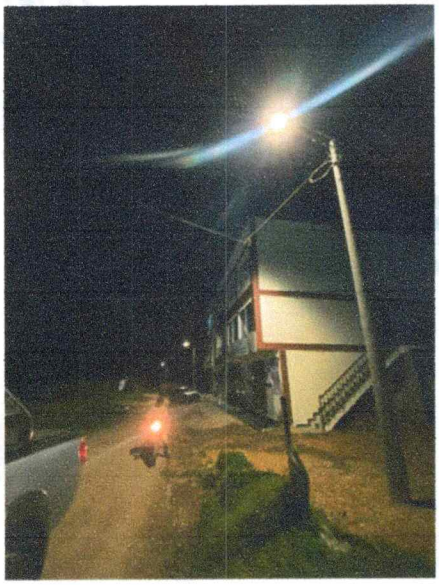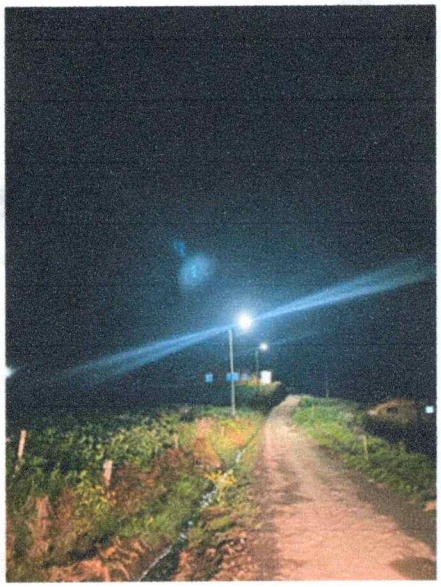
DIRECCION: CARRERA 9A # 22-56 SOGAMOSO – BOYACÁ
EMAIL: MULTIPROYECTOSBYD@GMAIL.COM
TEL. 3143595318

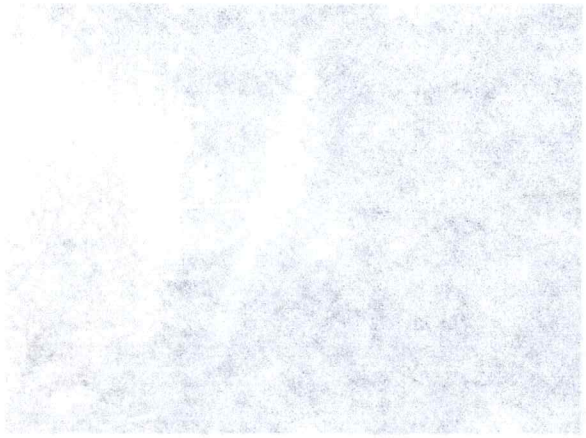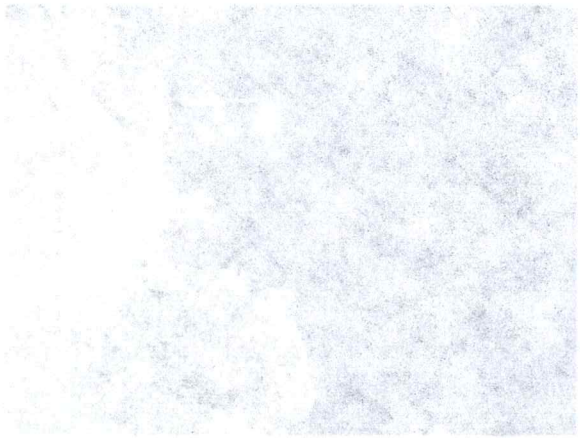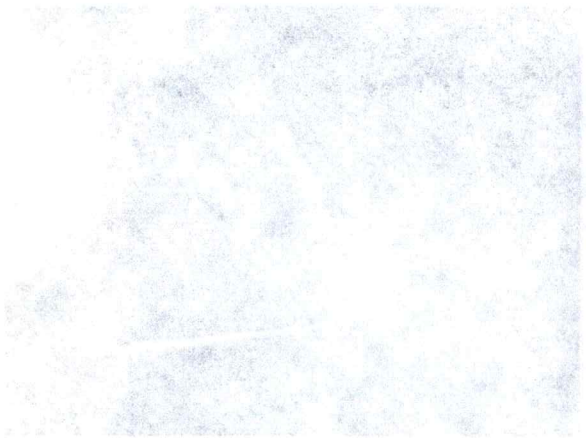

DIRECCION: CARRERA 9A # 22-56 SOGAMOSO – BOYACÁ
EMAIL: MULTIPROYECTOSBYD@GMAIL.COM
TEL. 3143595318

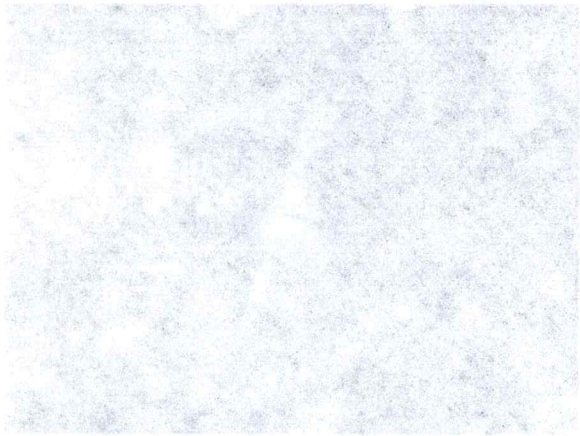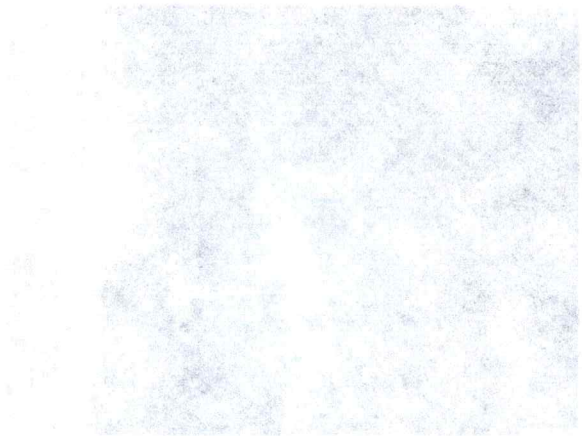CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MS-LP-002-2025

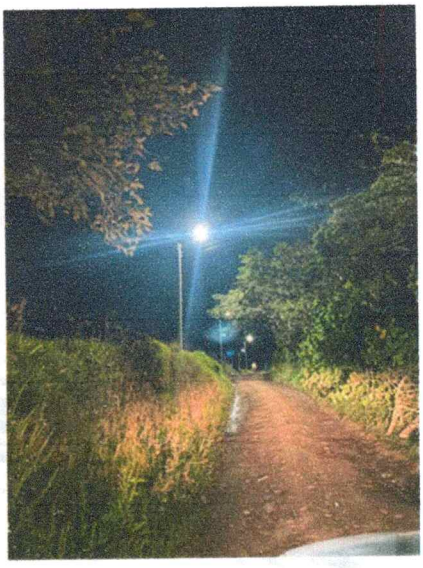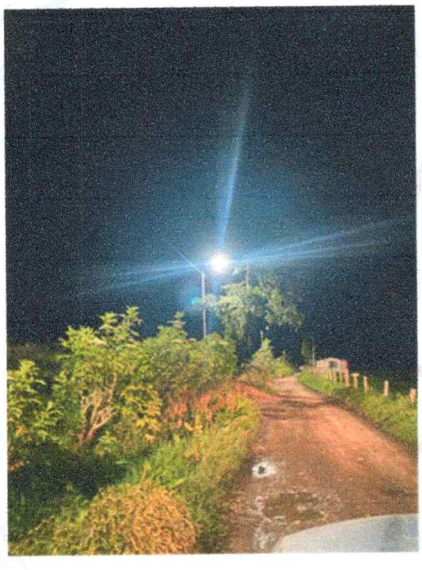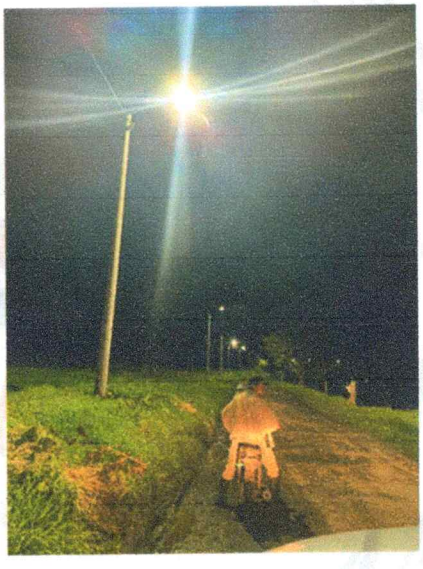INFORME TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA PARCIAL No. 1



"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025"

CONTRATISTA

COMLINRED SAS

820.004.070-9

ENTIDAD CONTRATANTE

MUNICIPIO DE SAMACÁ

30 DE ABRIL DE 2025 – 14 DE MAYO DE 2025

Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7474300 – Cel: 3125938847 313 3922615 -Email: luisignacioarenas@com -Juancaarenas.92@hotmail.com

1. GENERALIDADES:

El Municipio de Samacá han hecho posible el desarrollo de proyectos que benefician a la comunidad del municipio; este se ha beneficiado con el proyecto en referencia. El proyecto a desarrollar se denomina. "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025"."

Para el desarrollo de las actividades nombradas, constituye el punto de partida para la organización de proyectos tendientes a mejorar la calidad de vida de esta comunidad, a la vez permite el surgimiento del municipio como ente organizado, que busca el mejoramiento en general.

El proyecto consiste en "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025".

Para garantizar el cumplimiento y la calidad de las obras del contrato de acuerdo a las especificaciones, el contratista realiza el siguiente informe, en este documento se describen todas las actividades realizadas por la firma COMLINRED S.A.S.

2. INFORMACIÓN GENERAL

2.1. LOCALIZACION GENERAL



Ilustración 1. Ubicación General del municipio en el departamento

2.2 LOCALIZACION ESPECIFICA

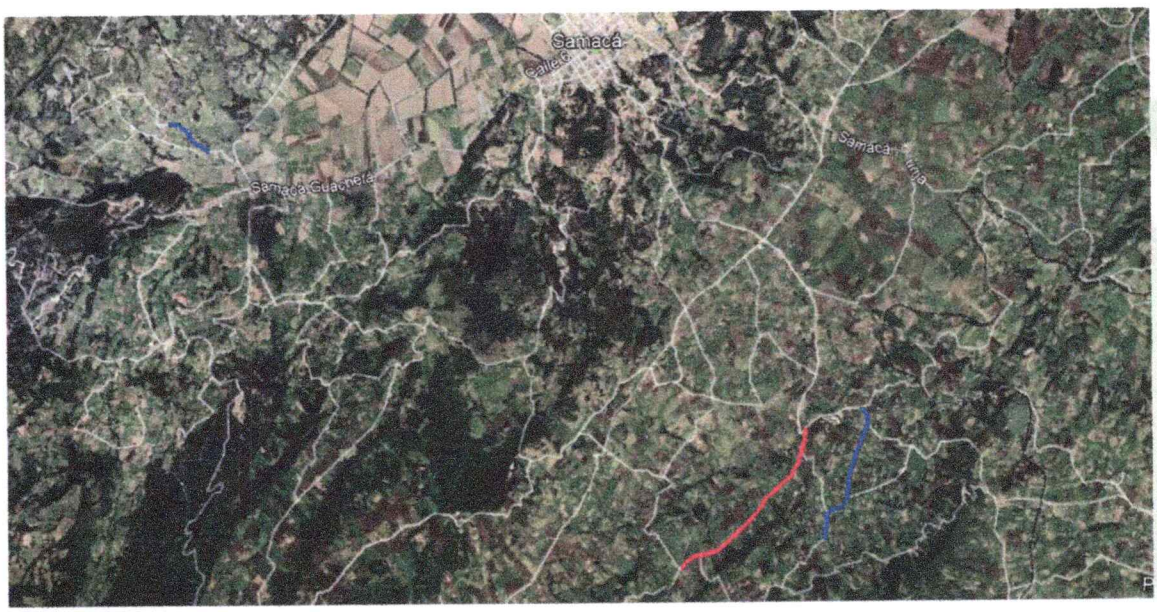


Ilustración 2. Ubicación especifica tramos a intervenir

2.4 FICHA TECNICA RESUMEN DEL CONTRATO OBRA

CONTRATO DE OBRA N.º:	MS-LP-002-2025
N.º DE PROCESO:	MS-LP-002-2025
OBJETO CONTRACTUAL:	"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SETECIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE. **($700.443.588,oo).**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAMACA
NIT:	800.016.757
ALCALDE MUNICIPAL:	WILSON CASTIBLANCO GIL
CONTRATISTA:	COMLINRED SAS
NIT:	820.004.070-9
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS C.C. 1.019.068.303 de Bogotá D.C.
INTERVENTORIA:	BYD MULTIPROYECTOS S.A.S.
NIT:	900.268.419-8
REPRESENTANTE LEGAL:	GILBERTO CELY VARGAS C.C. 1.052.020.418 DE FLORESTA
PLAZO:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO:	TREINTA (30) DE ABRIL DE 2025
ACTA PARCIAL 1:	CATORCE (14) DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTINUEVE (29) DE JULIO DE 2025

3. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO DE OBRA

4.

4.1. CONDICIONES ORIGINALES

CONDICIONES ORIGINALES					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 40 - 60 W - 4000K- PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE (BRAZO PARA LUMINARIA, CABLE, FOTOCELDAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN)	UND	156.00	$ 1,082,556.00	$168,878,736.00
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG	UND	156.00	$ 995,504.00	$155,298,624.00

1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) (INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE CONEXIÓN)	ML	4,650.00	$ 46,156.00	$214,625,400.00
	SUBTOTAL - COSTOS DIRECTOS				$ 538,802,760.00

4.2. SABANA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA (14/05/2025):

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTE ACTA		ACUMULADO EJECUTADO	
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 40 - 60 W - 4000K- PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE (BRAZO PARA LUMINARIA, CABLE, FOTOCELDAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN)	140.00	$151,557,840.00	140.00	$151,557,840.00
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG	140.00	$139,370,560.00	140.00	$139,370,560.00
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) (INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE CONEXIÓN)	4,200.00	$193,855,200.00	4,200.00	$193,855,200.00
	SUBTOTAL - COSTOS DIRECTOS		$484,783,600.00		$484,783,600.00

4.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

I. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 40 - 60 W - 4000K- PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE (BRAZO PARA LUMINARIA, CABLE, FOTOCELDAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN)

UNIDAD:	UND
CANTIDAD A COBRAR ACTA PARCIAL 02	140
CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA:	140
CANTIDAD POR EJECUTAR	16

DESCRIPCIÓN: Los requisitos mínimos que debe llegar el "LUMINARIA 40W - 60 W DRIVER, IP 66, IK 08, 100.000H O MÁS TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K INCLUYE (CONECTOR DE TORNILLO DE PERFORACIÓN DE CHAQUETA AISLADA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN) 5 AÑOS O MÁS DE GARANTÍA con el fin de garantizar el funcionamiento correcto de los mismos. Todo el tiempo basado estrictamente a las normas y reglamentos técnicos vigentes RETIE y RETILAP.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

• Armada y alistamiento de luminaria con el brazo, sus respectivos accesorios, cable y herrajes, esta actividad se hace en el piso, esto con el fin de cerciorarse de la conexión luego se procede a subir al poste con el camión grúa de canasta.

• Instalación de la luminaria en el poste de concreto que va soportada por con 2 collarines y/o conectores para garantizar su anclaje al poste, además de esto se realiza la conexión del cable que alimentara a la luminaria con el cable que alimenta la red eléctrica y para esto usamos el conector.

• Luego procedemos a instalar la fotocelda en la parte superior de la luminaria, para comprobar su funcionamiento tapamos la celda de entrada de luz de la fotocelda y esto permitirá que se active y encienda la luminaria.

MANO DE OBRA:

- Profesional liniero
- Instalador

EQUIPOS

- Herramienta y equipo menor
- Grúa canasta hidráulica

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



- TRAMO 1 VEREDA GACAL SECTOR KIOSCO

UNIDADES INSTALADAS	69




- TRAMO 2 VEREDA GACAL SECTOR IGLESIA SAN ISIDRO

UNIDADES INSTALADAS	57

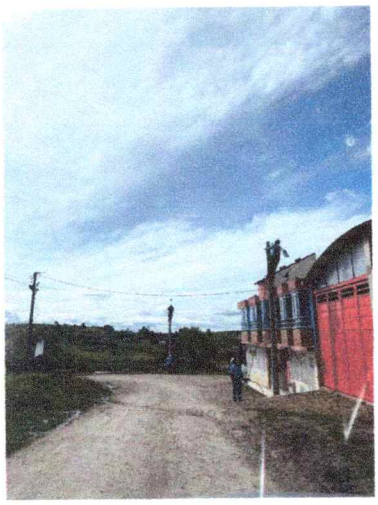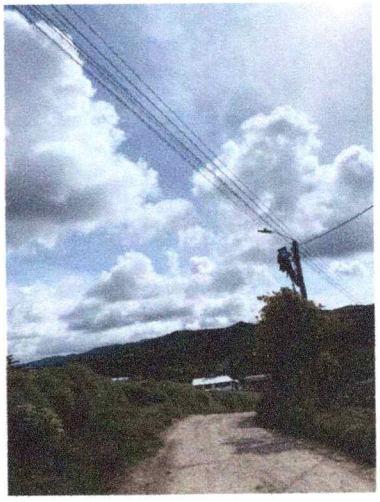II. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG

UNIDAD:	UND
CANTIDAD A COBRAR ACTA PARCIAL 01	140
CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA:	140
CANTIDAD POR EJECUTAR	16

DESCRIPCIÓN: Los requisitos mínimos que debe llegar el "SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG" con el fin de garantizar el funcionamiento correcto de los mismos. Todo el tiempo basado estrictamente a las normas y reglamentos técnicos vigentes RETIE y RETILAP.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

- Apertura de hueco en sitio según la normatividad vigente
- Luego procedemos a hincar el poste con la grúa de brazo hidráulico, este equipo es necesario ya que nos permite maniobrar con el poste.
- Plomada del poste, esta actividad se realiza girando el poste con la ayuda de una manila y una barra hasta obtener el ángulo adecuado, y se rellena el sobrante del hueco con material pétreo para fijarlo al suelo y evitar perder el ángulo.

MANO DE OBRA:

- Instalador
- Maestro
- Ayudante

EQUIPOS

- Herramienta y equipo menor
- Grúa brazo hidráulica

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

- TRAMO 1 VEREDA GACAL SECTOR KIOSCO

UNIDADES INSTALADAS	69





- TRAMO 2 VEREDA GACAL SECTOR IGLESIA SAN ISIDRO

UNIDADES INSTALADAS	57






- TRAMO 3 VEREDA RUCHICAL SECTOR IETNS SEDE DIVINO NIÑO

UNIDADES INSTALADAS	14





III. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) (INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE CONEXIÓN)

UNIDAD:	ML
CANTIDAD A COBRAR ACTA PARCIAL 02	4200
CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA:	4200
CANTIDAD POR EJECUTAR	450

DESCRIPCIÓN: Los requisitos mínimos que debe llegar el "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) (INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE CONEXIÓN)" con el fin de garantizar el funcionamiento correcto

de los mismos. Todo el tiempo basado estrictamente a las normas y reglamentos técnicos vigentes RETIE y RETILAP.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

- Una vez se encuentra fijado el poste de concreto se procede a la instalación de los herrajes en su parte superior, allí se instala la percha que va fijada con el perno y la arandela y se pone el aislador y el capuchón que permite separar el cable conductor del de la percha y el poste, esto con el fin de evitar daños a la red, además se coloca la grapa en la red que hace parte del proceso constructivo, esta actividad se repite en cada una de las estructuras.

MANO DE OBRA:

- Profesional liniero
- Instalador
- Ayudante
- Maestro

EQUIPOS

- Herramienta y equipo menor
- Grúa canasta hidráulica

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

- TRAMO 1 VEREDA GACAL SECTOR KIOSCO


METROS LINEALES INSTALADOS	2060 ml






- TRAMO 2 VEREDA GACAL SECTOR IGLESIA SAN ISIDRO

METROS LINEALES INSTALADOS	1590 ML

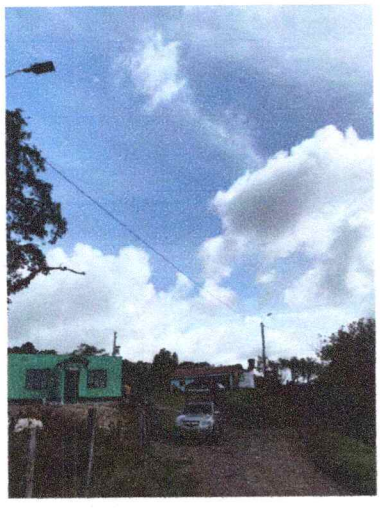

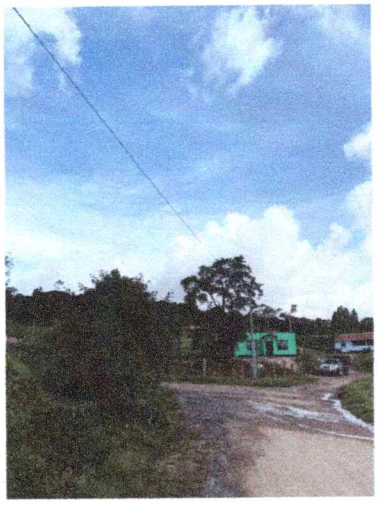

5. RESUMEN ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA NO. MS-LP-002-2025

A. CUADRO DE RELACION DE LAS ACTAS GENERADAS


Contrato de obra No. MS-LP-002-2025:

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	día	mes	año	
Contrato de obra	10	04	2025	
Acta de inicio obra	30	04	2025	

B. CRONOGRAMA AVANCE:

EJECUCIÓN VS CRONOGRAMA DE OBRA

AVANCE DE EJECUCIÓN					
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	**20%**	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	**89.97%**	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	**25%**

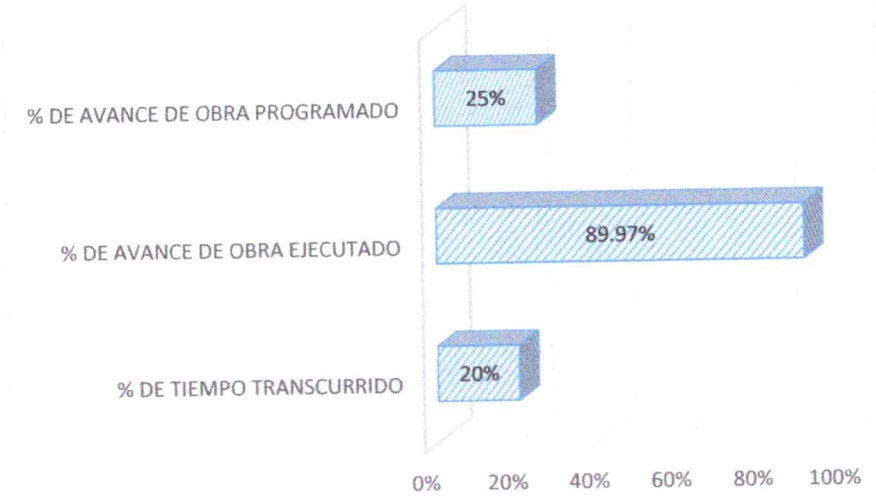

C. INFORMACION FINANCIERA

BALANCE DE PAGO		
ITEM	DETALLE	VALOR
1	Valor inicial	**$700.443.588,00**
2	Valor presente acta	**$630,218,680.00**
3	Valor ejecutado	**$630,218,680.00**
4	Saldo por ejecutar	**$70,224,908.00**

D. PÓLIZAS DEL CONTRATO

PÓLIZAS CONTRATO (10/04/2025)

Aseguradora solidaria de Colombia

- Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
		DESDE	HASTA		
600-47-994000075704	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/04/2025	16/01/2026	$105.066.538,20	Aprobada

	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/04/2025	16/07/2028	$105.066.538,20	Aprobada
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10/04/2025	29/07/2025	$70.044.358,20	Aprobada

- Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento.

POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
		DESDE	HASTA		
600-74-994000012092	AMPARO BASICO PREDIOS LABORALES	10/04/2025	29/07/2025	$ 284,700,000.00	Aprobada
	PATRONAL	10/04/2025	29/07/2025	$ 284,700,000.00	Aprobada
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10/04/2025	29/07/2025	$ 284,700,000.00	Aprobada
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10/04/2025	29/07/2025	$ 284,700,000.00	Aprobada

POLIZAS INICIO (30/04/2025)

Aseguradora solidaria de Colombia

- Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
		DESDE	HASTA		
600-47-994000075704	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/04/2025	30/01/2026	$105.066.538,20	Actualizado
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/04/2025	30/07/2028	$105.066.538,20	Actualizado
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10/04/2025	29/07/2025	$70.044.358,20	Actualizado

- Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento.

POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
		DESDE	HASTA		
600-74-994000012092	AMPARO BASICO PREDIOS LABORALES	10/04/2025	29/07/2025	$ 284,700,000.00	Actualizado
	PATRONAL	10/04/2025	29/07/2025	$ 284,700,000.00	Actualizado
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10/04/2025	29/07/2025	$ 284,700,000.00	Actualizado
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10/04/2025	29/07/2025	$ 284,700,000.00	Actualizado

6. CONCLUSIONES

- Todos los equipos utilizados fueron revisados para que funcionaran de forma correcta y el equipo utilizado cuenta con la certificación vigente.
- El personal que labora cuenta con la idoneidad, la capacidad, equipos, herramienta menor, y disponibilidad para llevar a cabo dichos trabajos.
- Durante la ejecución del contrato de obra se comunicó en forma veraz y precisa cada uno de los pasos a seguir en la obra.
- Los equipos suministrados y utilizados para la ejecución de la obra son de buena calidad.
- Durante la ejecución de la obra se lleva un control y seguimiento a cada actividad desarrollada.
- A las situaciones presentadas por las condiciones climáticas de lluvia se tomaron alternativas de solución para evitar los posibles daños a futuro.
- Las actividades realizadas por el contratista, se evidencia que el contrato se ha ejecutado en un 89.97%

Ing. JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS
Rep. Legal COMLINRED SAS
Nit. No. 820.004.070-9

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Somos la Decimocuarta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2024

Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2023

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6003816391

PÓLIZA No: 600 -74 - 994000012092 ANEXO:1

AGENCIA EXPEDIDORA: **TUNJA** COD. AGE: 600 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
06	05	2025		15	07	2025	23:59	29	07	2025	23:59	14	06	05	2025

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA — VIGENCIA DEL ANEXO

VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
15	07	2025	23:59	29	07	2025	23:59	14

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **COMLINRED S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **820.004.070-9**

DIRECCIÓN: CR 8 A 58 75 BRR SANTA RITA CIUDAD: TUNJA, BOYACÁ TELÉFONO: 3133922615

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **COMLINRED S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **820.004.070-9**

DIRECCIÓN: CR 8 A 58 75 BRR SANTA RITA CIUDAD: **TUNJA, BOYACÁ** TELÉFONO: 3133922615

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: COMLINRED S.A.S. NIT : 820004070

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: BOYACÁ CIUDAD: TUNJA

DIRECCION: CARRERA 8A No. 58-75

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: COMERCIAL MANZANA: 58-8A

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 284,700,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284,700,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS, SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025, AL CONTRATO NO. MS-LP-002-2025.

SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DE LA POLIZA ES: VIGENCIA DESDE:30-04-2025 VIGENCIA HASTA:29-07-2025.

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO # MS-LP-002-2025 REFERENTE A AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ-BOYACÁ 2025

SISTEMA BASE DE COBERTURA: OCURRENCIA

LA PRESENTE POLIZA EXCLUYE, ADEMÁS DE LAS EXCLUSIONES INDICADAS EN LAS CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO, LAS SIGUIENTES COBERTURAS:
- TODA RC CONTRACTUAL
- RC PROFESIONAL MÉDICA
- RC PROFESIONAL CLINICAS Y HOSPITALES

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***284,700,000.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
CLARA MARTINEZ AGENCIA DE SEGUROS LT	10834	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000600381639

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

MBOLIVAR 0

C8D8207B070DF57E5F

CLIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Ahora Asegur... Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través de... Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: TUNJA COD. AGENCIA: 600 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000012092** ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **COMLINRED S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **820.004.070-9**

ASEGURADO: **COMLINRED S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **820.004.070-9**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

TEXTO ITEM 1

- RC PRODUCTOS CUALQUIER OTRO TIPO DE RC PROFESIONAL

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000012092 ANEXO: 1 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 3

TOMADOR: COMLINRED S.A.S. IDENTIFICACION: 820.004.070-9

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	COMLINRED S.A.S.	820004070-9	CARRERA 8A No. 58-75	TUNJA	284,700,000.00	0	0

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
0	0

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6003816383

PÓLIZA No: 600 - 47 - 994000075704 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: **TUNJA** COD. AGENCIA: 600 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	05	2025	06	05	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **COMLINRED S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **820.004.070-9**

DIRECCIÓN: CR 8 A 58 75 BRR SANTA RITA CIUDAD: TUNJA, BOYACÁ TELÉFONO: 3133922615

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE SAMACA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.016.757-9**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE SAMACA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.016.757-9**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	30/04/2025	30/01/2026	105,066,538.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	30/04/2025	30/07/2028	105,066,538.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	70,044,358.80

BENEFICIARIOS
NIT 800016757 - MUNICIPIO DE SAMACA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS, SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025, AL CONTRATO NO. MS-LP-002-2025.

OBJETO DE LA GARANTIA
EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO NO. MS-LP-002-2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ-BOYACÁ 2025.

*** NOTA ACLARATORIA ***
EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

EL AMPARO MENCIONADO EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA COMO "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND." HACE REFERENCIA A "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO LABORAL".

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***280,177,435.20	$ ***********0	$*********0.00	$ **********0	$ ***********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
CLARA MARTINEZ AGENCIA DE SEGUROS LT	10834	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000600381638

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

C8D8207B070DF47757

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

DETALLE DE LA GARANTÍA

Id de la garantía CO1.WRT.17050552

Referencia de la garantía POLIZAS ACTA DE INICIO

Estado Aprobada

Justificación
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- [x] Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Número de póliza 600-74-994000012092

Tomador COMLINRED S.A.S.

Beneficiario MUNICIPIO DE SAMACA

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	105,066,538.20 COP	1/30/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	105,066,538.20 COP	7/30/2028 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra	70,044,358.80 COP	7/29/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	284,700,000.00 COP	7/29/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Descripción	Nombre del documento		
P 600 74 994000012092 ANEXO 1.pdf	P 600 74 994000012092 ANEXO 1.pdf	Descargar	Detalle

BYD MULTIPROYECTOS S.A.S.
900.268.419- 8
15 de mayo de 2025

Señores
Alcaldia municipal
Samacá

Asunto: Certificación sobre no requerimiento de actas de vecindad y cumplimiento de obligaciones contractuales

En mi calidad de interventor del contrato de obra pública No. [número de contrato], cuyo objeto es MS-LP-002-2025, me permito certificar que:

- No se requieren actas de vecindad en el marco del presente contrato, toda vez que el área de intervención no colinda con edificaciones susceptibles de afectación por las actividades constructivas. La intervención se desarrolla en un área libre, sin estructuras adyacentes que puedan resultar comprometidas estructural o funcionalmente.

- El contratista ha cumplido con la totalidad de las obligaciones contractuales aplicables al periodo actualmente en ejecución, de acuerdo con lo estipulado en los documentos contractuales, el cronograma aprobado y el alcance definido en la presente acta parcial. El avance de obra registrado ha sido verificado y corresponde a lo programado para la etapa actual.

La presente certificación se expide para los fines que el interesado estime convenientes.

En constancia, se firma en Sogamoso, a los 15 días del mes de mayo de 2025.

Atentamente,

GILBERTO CELY VARGAS
C.C. 1.052.020.348 de Floresta
Representante Legal BYD MULTIPROYECTOS SAS

VICTOR JULIO GAMBOA

Contador Público

El SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO DEBIDAMENTE INSCRITO ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, y art 23 Ley 1150 de 2007 bajo la gravedad del juramento:

CERTIFICO

Que: **COMLINRED**
NIT: 820.004.070-9

Ha dado cumplimiento oportuno y completo desde los últimos seis meses, con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y cuando ha sido del caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Se expide a solicitud del interesado a los quince (15) días del mes de mayo del dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,

VICTOR JULIO GAMBOA
CONTADOR PÚBLICO
TP 279880-T

DIRECCION: CALLE 20 No 10-61 EDIFICIO RINCON MARIÑO OFICINA 204
TUNJA- BOYACA
TELEFONO: 7434081 CEL 3186559248

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

967FEEF09B0E8800

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **VICTOR JULIO GAMBOA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7179372 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 279880-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

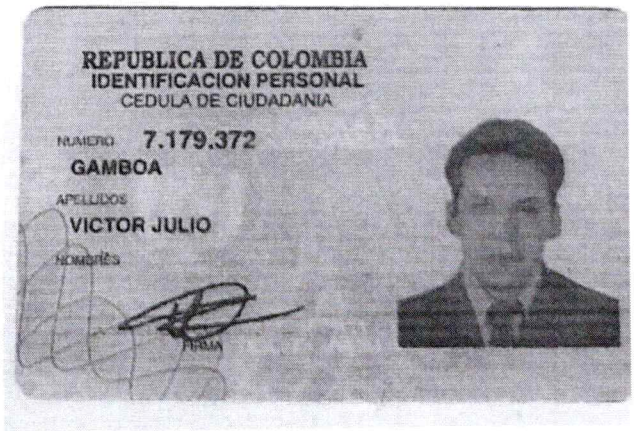

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.179.372
GAMBOA
APELLIDOS
VICTOR JULIO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 01-MAY-1981
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
B-
G.S. RH
M
SEXO
10-MAY-1999 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO



JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

279880-T

VICTOR JULIO
GAMBOA
C.C. 7179372
RES. INSCRIPCION 617 DEL 12/04/2021
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

302187 319374



JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

BUILDING AND DESIGNING
MULTIPROYECTOS

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

GILBERTO CELY VARGAS identificado con C.C. No 1.052.020.348 de Floresta en mi condición de representante legal de BYD MULTIPROYECTOS SAS identificada con NIT 900.268.419-8, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante el último mes. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

DANIEL ANTONIO VALENCIA MAZO identificado con C.C. No. 1.013.599.434, y con tarjeta profesional No. 325547-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de BYD MULTIPROYECTOS SAS identificada con NIT 900.268.419-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Sogamoso, luego de examinar los Estados Financieros de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante el último mes. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

De igual manera se hace la revisión del pago de seguridad social por parte de la empresa COMLINRED SAS para el contrato de obra MS-LP-002-2025 el cual presenta la afiliación del personal ofertado bajo planilla de abril numero 4604397509 a la espera de remisión de la planilla de mayo la cual se cancela mes vencido.

En constancia, se firma en Sogamoso, a los 14 días del mes de mayo de 2025.

GILBERTO CELY VARGAS
C.C. 1.052.020.348 de Floresta
Representante Legal BYD MULTIPROYECTOS SAS

DANIEL ANTONIO VALENCIA MAZO
C.C. 1.013.599.434 de Bogotá
Revisor fiscal BYD MULTIPROYECTOS SAS

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	820004070
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COMLINRED LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7455555
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	009 - INGRESOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4604397509	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2025		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9992686581		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.200	$ 0	$ 15.200
230301	230301-PORVENIR	1	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.600	$ 0	$ 7.600
230201	230201- PROTECCION	1	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.600	$ 0	$ 7.600
SUBTOTALES:										$ 30.400	$ 0	$ 30.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 1.900
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 3.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 3.800
SUBTOTALES:													$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 9.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 17.000	$ 17.000	$ 0	$ 0	$ 17.000
SUBTOTALES:									$ 17.000	$ 0	$ 0	$ 17.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	5	$ 9.500	$ 0	$ 9.500
SUBTOTALES:			$ 9.500	$ 0	$ 9.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES										
																										PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1011001G	WILCHES GARCIA OLMEN	DEPEND	RED CUMP PENS	$ 1.423.500	FIJO			SI	30																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS017-FAMISANAR	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	CCF10-COMFABOY	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1057582649	BALDANA SANCHEZ DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	30																	230201-PROTECCION	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	CCF10-COMFABOY	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 7175028	VARGAS TORRES ERWIN LEONARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	30																	25-14 COLPENSIONES	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	CCF10-COMFABOY	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 7213326	ARENAS GARCIA LUIS IGNACIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	30																	25-14 COLPENSIONES	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	CCF10-COMFABOY	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 98158516	MENDEZ BERMUDEZ ERWIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	30																	230301-PORVENIR	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	CCF10-COMFABOY	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 66.400

Planilla Pagada

ACTA PARCIAL

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MS-LP-002-2025

CIUDAD Y FECHA	SAMACÁ - 15 DE MAYO DE 2025
ACTA No.	UNO (01)
PERIODO REPORTE	DEL 30 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2025
OBJETO	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	JUAN CAMILO ARENAS CÁRDENAS / COMLINRED S.A.S.
NIT y/o C.C	1.019.068.303 / 820004070-9
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETECIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 700.443.588,00)
DURACIÓN DEL CONTRATO	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL	N/A
VALOR ADICIONAL	N/A
FECHA DE INICIO	TREINTA (30) DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTINUEVE (29) DE JULIO DE 2025
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	SEISCIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA M/CTE ($ 630,218,680.00)
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CUMPLE. Planilla No. 4604397509
INTERVENTOR	BYD MULTIPROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
***CUMPLIMIENTO**	T

T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)

ACTA PARCIAL

ESTADO FINANCIERO:

DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 700,443,588.00	
VALOR PRESENTE ACTA No. 001 15/05/2025		$ 630,218,680.00
VALOR ADICIÓN (SI HAY LUGAR A ELLO)	N/A	N/A
VALOR POR EJECUTAR		$ 70,224,908.00
SUMAS IGUALES	$ 700,443,588.00	$ 700,443,588.00

En constancia se firma a los quince (15) días del mes de mayo del año Dos Mil Veinticinco (2025).

JUAN CAMILO ARENAS CÁRDENAS /
COMLINRED S.A.S.
1.019.068.303 / 820004070-9
CONTRATISTA DE OBRA

GILBERTO CELY VARGAS / BYD
MULTIPROYECTOS SAS
1.052.020.348 / 900.268.419-8
INTERVENTOR

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAMACÁ 2024-2027	ALCALDIA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	
		PROCESO	FORMATO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)	F-GTI-023	
		Versión 1	

SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MS-LP-002-2025

CIUDAD Y FECHA	SAMACA - 15 DE MAYO DE 2025
ACTA N°	UNO (01)
OBJETO	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS / COMLINRED S.A.S.
NIT y/o C.C	1.019.068.303 / 820004070-9
RUBRO Y REGISTRO PRESUPUESTAL	Rubros No. 2.3.2.02.02.005.01 Mantenimiento y expansión alumbrado publico / IMPUESTO ALUMB SETECIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE. ($700.443.588,00).
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETECIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE. ($700.443.588,00).
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SETECIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE. ($700.443.588,00).
DURACIÓN DEL CONTRATO	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO ADICIONAL (SI APLICA)	N.A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE INICIO	Treinta (30) de abril de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	Veintinueve (29) de julio de 2025
FORMA DE PAGO	Mediante actas parciales así: Acta parcial No.1, equivalente al 40%de su ejecución o más del valor total del contrato, una vez se acredite su % de ejecución; Acta parcial No.2, equivalente al 40% o más del valor del contrato una vez se acredite su % de ejecución, posterior al primer pago, por lo cual se debe acreditar avance igual o superior al 80% acumulado: Un tercer pago, una vez suscrita y formalizada el acta de liquidación, el cual no podrá ser inferior al 10% del valor del contrato.
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	T
SUPERVISOR	DANILO ALEXANDER VIANCHA-Secretario de Planeación y Obra Públicas
CUMPLIMIENTO	T

(T: CUMPLE TOTALMENTE LAS ACTIVIDADES PACTADAS) (P: CUMPLE PARCIALMENTE LAS ACTIVIDADES PACTADAS) (N: NO CUMPLE LAS ACTIVIDADES PACTADAS)

CONDICIONES ORIGINALES						COND. ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA No. 1			ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% AVANCE	CANTIDAD	VR. TOTAL	% AVANCE	CANTIDAD	VR. TOTAL	% AVANCE
PRODUCTO I																
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 40 - 60 W - 4000K- PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE (BRAZO PARA LUMINARIA, CABLE, FOTOCELDAS Y ACCESORIOS DE CONEXION)	UND	156.00	1.082.556.00	168,878,736.00	156.00	168,878,736.00	140.00	151,557,840.00	89.74	0.00	0.00	0.00	140.00	151,557,840.00	0.90
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG	UND	156.00	995,504.00	155,298,624.00	156.00	155,298,624.00	140.00	139,370,560.00	89.74	0.00	0.00	0.00	140.00	139,370,560.00	0.90
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35mm+35MM (INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE CONEXION)	ML	4,650.00	46,156.00	214,625,400.00	4,650.00	214,625,400.00	4,200.00	193,855,200.00	90.32	0.00	0.00	0.00	4,200.00	193,855,200.00	0.90
	SUBTOTAL - COSTOS DIRECTOS				**538,802,760.00**		**538,802,760.00**		**484,783,600.00**			**0.00**			**484,783,600.00**	

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS			538,802,760.00		538,802,760.00		484,783,600.00			0.00			484,783,600.00			
ADMINISTRACION	20%		107,760,552.00		107,760,552.00		96,956,720.00			-			96,956,720.00			
IMPREVISTOS	5%		26,940,138.00		26,940,138.00		24,239,180.00			-			24,239,180.00			
UTILIDADES	5%		26,940,138.00		26,940,138.00		24,239,180.00			-			24,239,180.00			
TOTAL AIU	30%		161,640,828.00		161,640,828.00		145,435,080.00			-			145,435,080.00			
TOTAL			700,443,588.00		700,443,588.00		630,218,680.00			-			630,218,680.00			

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	700,443,588.00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	700,443,588.00
VALOR TOTAL NO EJECUTADO	70,224,908.00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	630,218,680.00
SON: SEISCIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA M/CTE	

89.97 %

NOTA:
1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.
3: Interventoria manifiesta su absoluta responsabilidad en cuanto a la calidad de materiales, camidad y cantidades de obra y cumplimiento a especificaciones tecnicas, librando al MUNICIPIO DE SAMACA y a sus funcionarios de cualquier proceso que se pueda adelantar por parte de los entes de control, durante la ejecucion y/o posterior al recibo de los CONTRATOS

En constancia se firma a los (20) días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024).

JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS / COMLINRED S.A.S.
1.019.068.303 / 820004070-9
EL CONTRATISTA


GILBERTO CELY VARGAS / BYD MULTIPROYECTOS SAS
1.052.020.348 / 900.268.419-8
INTERVENTOR


MEMORIA DE CANTIDADES				Versión
OBJETO	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025			
ITEM	1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 40 - 60 W - 4000K- PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE (BRAZO PARA LUMINARIA, CABLE, FOTOCELDAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN)	UNIDAD	UND

FECHA 2024-20-11	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto		
	TRAMO 1 VEREDA GACAL SECTOR KIOSCO				69.00	69.00
	TRAMO 2 VEREDA GACAL SECTOR IGLESIA SAN ISIDRO				57.00	57.00
	TRAMO 3 VEREDA RUCHICAL SECTOR IETNS SEDE DIVINO NIÑO				14.00	14.00
			TOTAL			140.00

ESQUEMA / FOTO



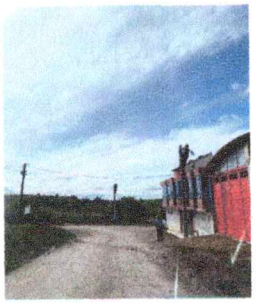

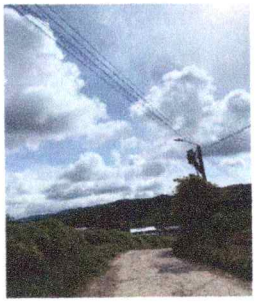

NOTA:

1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafisicales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por èste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.

3: Interventoria manifiesta su absoluta responsabilidad en cuanto a la calidad de materiales, camidad y cantidades de obra y cumplimiento a especificaciones tecnicas, librando al MUNICIPIO DE SAMACA y a sus funcionarios de cualquier proceso que se pueda adelantar por parte de los entes de control, durante la ejecucion y/o posterior al recibo de los CONTRATOS

CONTRATISTA

JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS / COMUNIRED S.A.S.
1.019.068.303 / 820004070-9

INTERVENTOR


GILBERTO CELY VARGAS / BYD MULTIPROYECTOS SAS
1.052.020.348 / 900.268.419-8


MEMORIA DE CANTIDADES				Versión
OBJETO	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025			
ITEM	1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) (INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE CONEXIÓN)	UNIDAD	ML

FECHA 2024-20-11	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto		
	TRAMO 1 VEREDA GACAL SECTOR KIOSCO	2060.00				2,060.00
	TRAMO 2 VEREDA GACAL SECTOR IGLESIA SAN ISIDRO	1590.00				1,590.00
	TRAMO 3 VEREDA RUCHICAL SECTOR IETNS SEDE DIVINO NIÑO	550.00				550.00
			TOTAL			4,200.00

ESQUEMA / FOTO



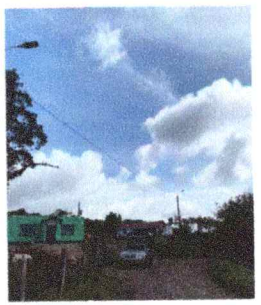

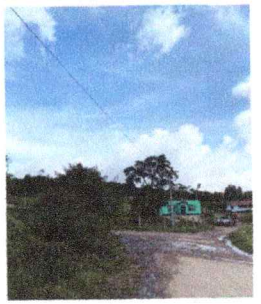

NOTA:
1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafisicales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.
3: Interventoria manifiesta su absoluta responsabilidad en cuanto a la calidad de materiales, camidad y cantidades de obra y cumplimiento a especificaciones tecnicas, librando al MUNICIPIO DE SAMACA y a sus funcionarios de cualquier proceso que se pueda adelantar por parte de los entes de control, durante la ejecucion y/o posterior al recibo de los CONTRATOS

CONTRATISTA

JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS / COMLINRED S.A.S.
1.019.068.303 / 820004070-9

INTERVENTOR


GILBERTO CELY VARGAS / BYD MULTIPROYECTOS SAS
1.052.020.348 / 900.268.419-8

MEMORIA DE CANTIDADES				Versión
OBJETO	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025			
ITEM	1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG	UNIDAD	UND

FECHA 2024-20-11	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto		
	TRAMO 1 VEREDA GACAL SECTOR KIOSCO				69.00	69.00
	TRAMO 2 VEREDA GACAL SECTOR IGLESIA SAN ISIDRO				57.00	57.00
	TRAMO 3 VEREDA RUCHICAL SECTOR IETNS SEDE DIVINO NIÑO				14.00	14.00
			TOTAL			140.00

ESQUEMA / FOTO



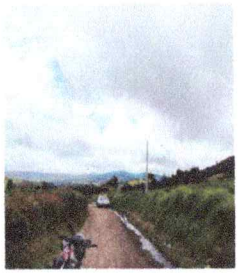



NOTA:

1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafisicales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.

3: Interventoria manifiesta su absoluta responsabilidad en cuanto a la calidad de materiales, camidad y cantidades de obra y cumplimiento a especificaciones tecnicas, librando al MUNICIPIO DE SAMACA y a sus funcionarios de cualquier proceso que se pueda adelantar por parte de los entes de control, durante la ejecucion y/o posterior al recibo de los CONTRATOS

CONTRATISTA

JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS / COMLINRED S.A.S.
1.019.068.303 / 820004070-9

INTERVENTOR

GILBERTO CELY VARGAS / BYD MULTIPROYECTOS SAS
1.052.020.348 / 900.268.419-8

Samacá, 14 de mayo de 2025

COMO REPRESETANTE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GACAL DEL MUNICIPIO DE SAMACA

CERTIFICO QUE:

En nombre de la comunidad de la vereda Gacal
certifico que en el sector gacal palenque se realizó la instalación de:

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 40 - 60 W - 4000K- PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE (BRAZO PARA LUMINARIA, CABLE, FOTOCELDAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN)	UND	69
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG	UND	69
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) (INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE CONEXIÓN)	ML	2060

Los cuales funcionan correctamente y se recibe a entera satisfacción.

Atentamente,

Luis Alfonso Beltrcourt
CC 4234868

Samacá, 14 de mayo de 2025

COMO REPRESETANTE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GACAL DEL MUNICIPIO DE SAMACA

CERTIFICO QUE:

En nombre de la comunidad de la vereda gacal
certifico que en el sector la arcperia se realizó la instalación de:

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 40 - 60 W - 4000K- PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE (BRAZO PARA LUMINARIA, CABLE, FOTOCELDAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN)	UND	57
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG	UND	57
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) (INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE CONEXIÓN)	ML	1590

Los cuales funcionan correctamente y se recibe a entera satisfacción.

Atentamente,

Luis Alfonso Belloncourt
cc 4234868

ComlinRED
Ingeniería Civil y Eléctrica
NIT. 820004070-9 Régimen común

Samacá, 14 de mayo de 2025

COMO REPRESETANTE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RUNCHICAL DEL MUNICIPIO DE SAMACA

CERTIFICO QUE:

En nombre de la comunidad de la vereda Runchical
certifico que en el sector Alto se realizó la instalación de:

DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 40 - 60 W - 4000K- PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE (BRAZO PARA LUMINARIA, CABLE, FOTOCELDAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN)	UND	14
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG	UND	14
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) (INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE CONEXIÓN)	ML	550

Los cuales funcionan correctamente y se recibe a entera satisfacción.

Atentamente,

Pedro Matamoros Cuesta

COMLINRED S.A.S.

COMLINRED S.A.S. NIT 820004070-9

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidades Tributarias - IVA

CR 8 A 58 75 BRR SANTA RITA - Tunja, Boyacá - Colombia

Tel.3133922615

luisignacioarenas@hotmail.com

Responsabilidad Fiscal
R-99-PN - No aplica – Otros

Act. Económica:4220

Cliente: MUNICIPIO DE SAMACA

NIT ó CC: 800016757-9 **PERSONA:** Persona Jurídica

DIRECCIÓN: CRA 6 No 4 53

CIUDAD: Samacá, Boyacá - Colombia

CORREO: contactenos@samaca-boyaca.gov.co

TELEFONO: 3223059115

RESPONS FISCAL: R-99-PN

RESPONS TRIBUTARIA: IVA

Factura Electrónica de Venta COM111

Fecha Creación: 2025-05-16 11:26

Fecha Validación: 2025-05-16 11:35

Fecha Vencimiento: 2025-05-16 23:59

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Efectivo

CUFE:469c0a69e2f4d949fb5e199ae018d3537e6c65737294b68d6c396b227644c7bc19fd5b98c5b8858881213733d3b6b0b7

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764085319894 desde COM105 hasta COM200 Vigencia: 2024-12-13 al 2025-12-13

N°	Codigo	Descripción	Cant	Precio	Impuesto	Total Impt.	Dto	Valor Total
1		ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MS-LP-002-2025 QUE TIENE COMO OBJETO " AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025"	1.0	$ 484,783,600.00			0.0	$ 484,783,600.00
2	ADMIN	Administracion - 20.0%	1.0	$ 96,956,720.00	0.0%		0.0	$ 96,956,720.00
3	IMPRE	Imprevistos - 5.0%	1.0	$ 24,239,180.00	0.0%		0.0	$ 24,239,180.00
4	UTIL	Utilidad - 5.0%	1.0	$ 24,239,180.00	0.0%		0.0	$ 24,239,180.00

Información Adicional

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Valor en letras

SEISCIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Tributo
Exento	$ 24,239,180.00	$ 0.00

Base no gravada

$ 605,979,500.00

SUBTOTAL	$ 630,218,680.00
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 24,239,180.00
IMPUESTOS (+)	$ 0.00
ANTICIPO	$ 0.00
TOTAL	**$ 630,218,680.00**

Generado en clarisa.co – Todo es más fácil ! – Clarisa Cloud S.A.S NIT 900707639 - 6
