
GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 364-2023

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO DEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA"

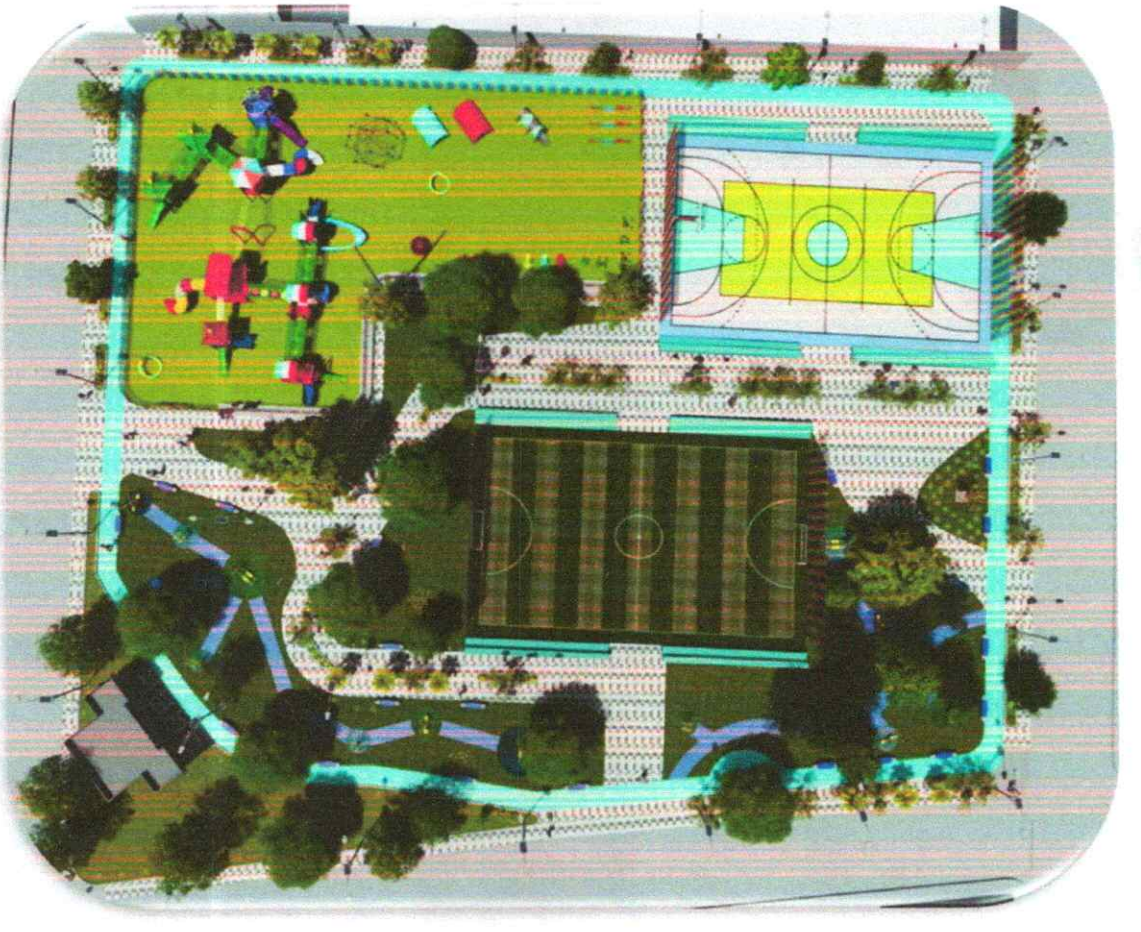

PERIODO: 14 DE DICIEMBRE 2024 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2024
RIOHACHA- LA GUAJIRA

gestionltda1@gmail.com 605 7292509 Calle 3 No 3-53
605 7280643 Riohacha la guajira Colombia

GESTIÓN CONSULTORES E INTERVENTORES S A S

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 4
2 JUSTIFICACION DEL PROYECTO 5
3 UBICACIÓN DEL PROYECTO 7
4 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 9
4.1 FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO 9
4.2 CADENA DE VALOR 10
4.3 PRODUCTOS DEL PROYECTO 11
4.4 ALCANCE DEL PROYECTO 11
5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 364 DE 2023 12
5.1 FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 12
5.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL 14
5.3 SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS 14
5.4 FORMA DE PAGO 22
5.5 BALANCE FINANCIERO Y DESEMBOLSOS REALIZADOS 23
5.6 REPORTE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO 24
5.7 ACTAS EFECTUADAS 25
5.8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 27
5.9 OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA 27
5.9.1 OBLIGACIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA 27
5.9.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA INTERVENTORÍA 29
5.10 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 32
6 CONTRATO DE OBRA 393 DE 2023 33
6.1 FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA 33
6.2 CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y REGISTRO PRESUPUESTAL 35
6.3 SEGUIMIENTO LAS GARANTÍAS 35
6.4 FORMA DE PAGO 43
6.5 BALANCE FINANCIERO Y DESEMBOLSOS 43
6.6 ACTAS EFECTUADAS 44
6.7 ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA 52
6.7.2 COMPONENTE SOCIAL 58

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S A S

6.7.3 ASPECTO SISO AMBIENTAL 58
6.7.4 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PMA) 60
6.8 ESTADO FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 63
6.9 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA 64
7 CONCEPTO ESTRUCTURAL Y RECOMENDACIONES 66
8 CONCLUSIÓN 68

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S A S

1 INTRODUCCIÓN

En el distrito especial, turístico y cultural de Riohacha, según Concurso de Mérito Abierto No. 004 de 2023, se suscribió contrato con GESTIÓN CONSULTORES E INTERVENTORES SAS con NIT: 900.278.213-0 el contrato de interventoría No. 364 de 2023, cuyo objeto es el de realizar la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO DEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA".**

El presente informe describe la ejecución del contrato de obra No 393 de 2023 **"LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO DEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA".**

Con la ejecución del contrato de obra 393 de 2023, se pretende incrementar las actividades de esparcimiento y prácticas deportivas de la población beneficiaria, accesibilidad y disponibilidad de actividades recreativas, sumado a esto el fomento de estilos de vida no sedentario, mediante la construcción y dotación del parque recreo deportivo en el barrio las Tunas del Distrito de Riohacha.

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

2 JUSTIFICACION DEL PROYECTO

En el distrito especial, turístico y cultural de Riohacha, los espacios públicos para la recreación, la actividad física y el deporte son insuficientes e inadecuados para la población que está en capacidad para practicar algún deporte o que desea aprovechar su tiempo al aire libre. Los espacios existentes del distrito están deteriorados y con frecuencia son ocupados para desarrollar otras actividades, y los escenarios deportivos y/o recreativos que están en buenas condiciones no son de uso público.

El distrito no cuenta con infraestructura recreo deportiva para atender las necesidades en recreación y deporte de las personas moradoras del barrio LAS TUNAS y alrededores entre aptas e interesadas en realizar prácticas deportivas y recreativas de manera habitual.

El municipio conjuntamente con las JAC y la Policía han identificado las causas del problema y sus efectos y han realizado el inventario de los escenarios recreo-deportivos que existen en el distrito, estimando su ocupación y la demanda de infraestructura por parte de la comunidad.
De igual manera se ha adelantado la concertación con diferentes juntas y clubes para determinar las prioridades en esta materia.
La ejecución del proyecto requiere la realización de convenios de cooperación técnica y apoyo logístico para el adecuado funcionamiento del escenario recreo-deportivo y para el fomento de la práctica de actividades de esparcimiento y deportivas. En este sentido la coordinación con los clubes y ligas, así como con las autoridades de policía permitirán que los niños, jóvenes y adultos ocupen adecuadamente el tiempo y gocen de condiciones de seguridad mientras realizan las prácticas recreativas y deportivas.

El proyecto "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO DEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"; su objetivo principal es el incremento de las actividades de esparcimiento y prácticas deportivas de la población beneficiaria, accesibilidad y


disponibilidad de actividades recreativas, sumado a esto el fomento de estilos de vida no sedentario.

El proyecto se encuentra integrado por 9 Capítulos: 1) Preliminares; 2) Excavaciones rellenos y su base granular; 3) Concretos; 4) Acero de refuerzo y estructura metálica; 5) Mampostería, pañete y cubierta; 6) Cancha de futbol y césped sintético; 7) Carpintería metálica 8) Instalaciones Eléctricas y 9) Dotación: infantiles y Biosaludables.

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S


3 UBICACIÓN DEL PROYECTO

- **DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA**

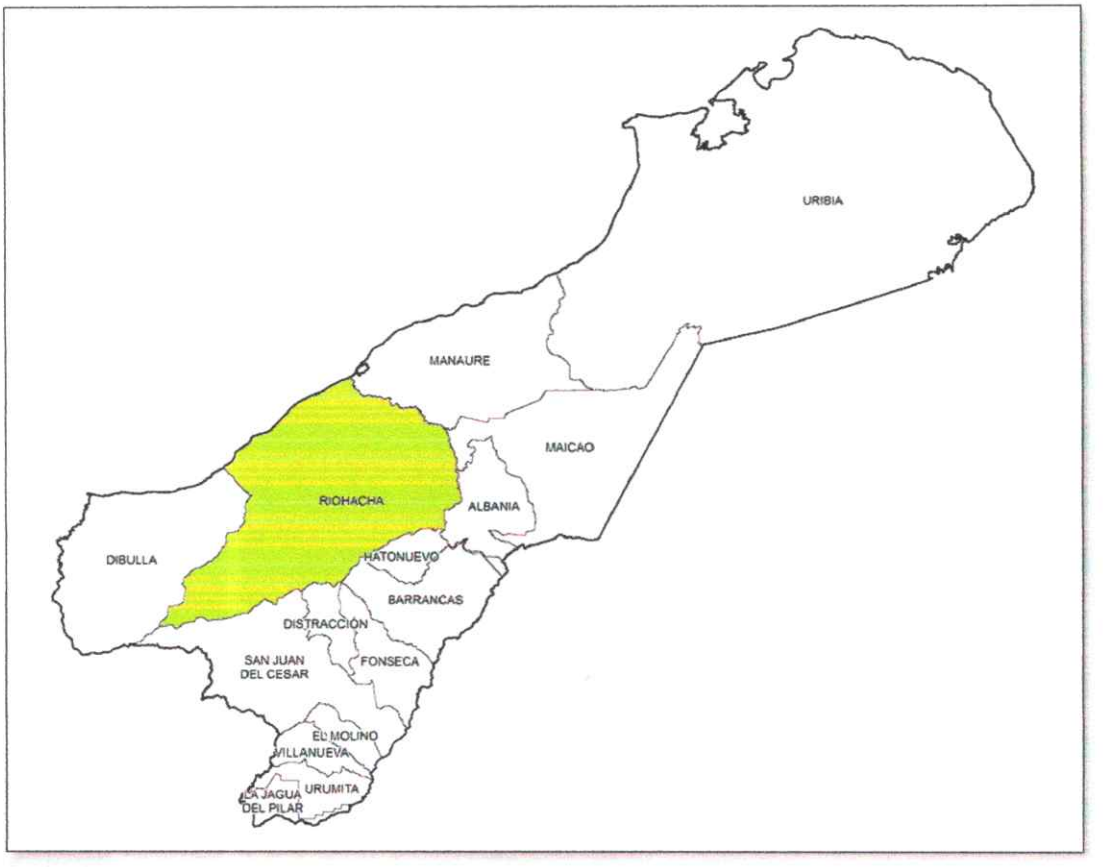

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

- **BARRIO LAS TUNAS**

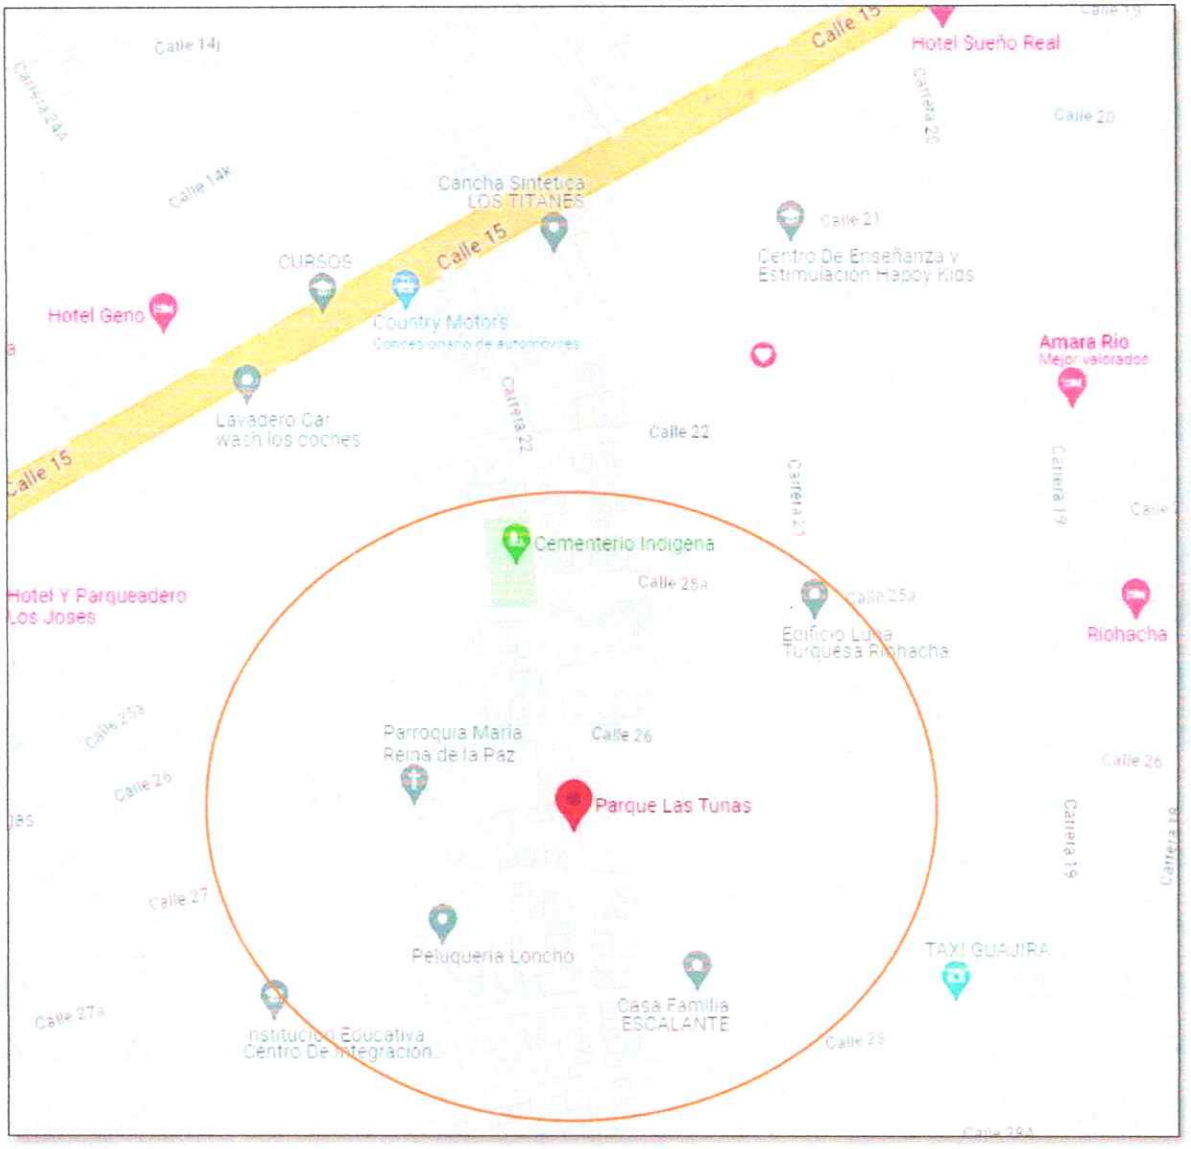

GESTIÓN CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S

4 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

4.1 FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO DEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	
CÓDIGO BPIN	9900G070	
VALOR TOTAL APROBADO PROYECTO	$ 5.290.000.000,00	
VALOR TOTAL CONTRATADO PROYECTO	$ 4.836.636.801,00	
FUENTE DE FINANCIACIÓN- RECURSOS PROPIOS		
FINANCIACIÓN APROBADO PROYECTO		
FUENTE	**DISTRITO DE RIOHACHA**	
VIGENCIA DE RECURSOS	2023	
DESCRIPCIÓN	**TIPO DE RECURSO**	**VALOR**
Valor total	Recursos propios	$ 5.290.000.000
Obra	Recursos propios	$ 4.943.925.234
Interventoría	Recursos propios	$ 346.074.766
FINANCIACIÓN CONTRATADO POR EL MUNICIPIO		
DESCRIPCIÓN	**TIPO DE RECURSO**	**VALOR**
Valor total	Recursos propios	$ 4,836,636,800
Obra	Recursos propios	$ 4,551,179,765
Interventoría	Recursos propios	$ 285,457,036

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S A S

4.2 CADENA DE VALOR

DISTRITO ESPECIAL Y TURÍSTICO DE RIOHACHA			
Ítem	**Actividad**	**Valor Proyecto**	**Valor Contratado**
1	REALIZAR PRELIMINARES	$ 235.319.992	$ 142,432,153
2	REALIZAR EXCAVACIONES, RELLENOS Y SUBBASE GRANULAR	$ 347.714.526	$ 321,086,434
3	REALIZAR CONCRETOS	$ 1.128.262.443	$ 1,126,592,208
4	REALIZAR ACERO DE REFUERZO Y ESTRUCTURA METÁLICA	$ 973.313.394	$ 707,911,053
5	REALIZAR MAMPOSTERÍA PAÑETE Y CUBIERTA	$ 291.718.392	$ 272,805,369
6	CANCHA DE FUTBOL Y CÉSPED SINTÉTICO	$ 432.433.119	$ 481,873,151
7	REALIZAR CARPINTERÍA METÁLICA	$ 201.504.409	$ 194,652,897
8	REALIZAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS	$ 541.673.348	$ 557,951,088
9	REALIZAR DOTACIÓN	$ 720.412.589	$ 676,018,189
10	REALIZAR COSTOS RETIE - RETILAP	$ 11.243.890	$ 10,848,091
11	REALIZAR PLAN DE BIOSEGURIDAD CONTRA EL COVID-19	$ 37.479.632	$ 36,160,304
12	REALIZAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	$ 22.849.500	$ 22,848,827
13	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA	$ 346.074.766	$ 285,457,036
	COSTO TOTAL	**$ 5.290.000.000**	**$ 4,836,636,801**

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

4.3 PRODUCTOS DEL PROYECTO

Ítem	Producto	Medido a través de	Cantidad	Costo Aprobado	Costo contratado
1.1	Parque recreo-deportivo construido y dotado (Producto principal del proyecto)	Número de parques recreo-deportivos	1	$ 5.290.000.000	$ 4,836,636,801
	COSTO TOTAL			**$ 5.290.000.000**	**$ 4,836,636,801**

4.4 ALCANCE DEL PROYECTO

Indicador No. 01: Parque recreo-deportivo construido y dotado (Producto principal del proyecto)
Medidos a través de: Número de parques recreo-deportivos
Meta: 1

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 364 DE 2023

5.1 FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DISTRITAL DE RIOHACHA
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO DEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA"
CONTRATO No:	364 DE 2023
CONTRATISTA:	GESTIÓN CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S
NIT:	900278213-0
DIRECCIÓN:	CALLE 3 # 3-53 RIOHACHA, LA GUAJIRA
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO
IDENTIFICACIÓN:	26.988.344 DE BARRANCAS
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/L ($ 285.457.036,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	DOS (02) DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	DOS (02) DE ABRIL DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01	VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO No. 01	DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No. 01:	VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE ADICIONAL EN TIEMPO 001:	VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DE 2024
ADICIONAL EN TIEMPO No. 001	TRES (03) MESES

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ADICIÓN EN TIEMPO 001:	VEINTIDÓS (22) DE MAYO DE 2024
PRÓRROGA EN TIEMPO No. 002:	TRES (03) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA 002:	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 002:	VEINTIDÓS (22) DE MAYO DE 2024
FECHA DE REINICIO 002:	DIEZ (10) DE JULIO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO 001:	DIEZ (10) DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 003:	NUEVE (09) DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE PRORROGA 01 A LA SUSPENSIÓN 003:	VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO 003:	CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO 003:	CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA EN TIEMPO No. 003:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA 003:	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS.
ESTADO DEL CONTRATO:	FINALIZADO

GESTIÓN CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S

5.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y REGISTRO PRESUPUESTAL				
Descripción	**N°**	**Fecha**	**Concepto**	**Valor**
CDP	351	26/04/2023	Contrato de interventoría no. 364 de 2023, objetivo; interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera a la construcción y dotación de parque recreo deportivo las tunas ubicado en el distrito de Riohacha, La Guajira.	$ 285.457.036,00
			TOTAL CDP	**$ 285.457.036,00**
RP	2326	12/07/2023	Contrato de interventoría no. 364 de 2023, objetivo; interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera a la construcción y dotación de parque recreo deportivo las tunas ubicado en el distrito de Riohacha, La Guajira.	$ 285.457.036,00
			TOTAL RP	**$ 285.457.036,00**

5.3 SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS

El movimiento que presentan las pólizas que amparan al Contrato de Interventoría No. 364 de 2023, de acuerdo a la actualización por prorroga en tiempo No. 003 aprobadas por parte del Distrito de Riohacha es el siguiente:

Fecha de Expedición	Tipo de Póliza	No. De Póliza	Tipo de Certificado	Observaciones
11/07/2023	Cumplimiento	3018234	Inicial	Garantizar cumplimiento del contrato, calidad del servicio, buen manejo y correcta inversión del anticipo, pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de personal, al documento complementario al proceso de concurso de méritos abierto No. 004 de 2023,

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

Fecha de Expedición	Tipo de Póliza	No. De Póliza	Tipo de Certificado	Observaciones
				contrato de interventoría No. 364 de 2023.
06/10/2023	Cumplimiento	3018234	Modificación	Garantizar cumplimiento del contrato, calidad del servicio, buen manejo y correcta inversión del anticipo, pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de personal, al documento complementario al proceso de concurso de méritos abierto No. 004 de 2023, contrato de interventoría No. 364 de 2023. Se expide el presente certificado para actualizar la vigencia de la póliza arriba indicada a solicitud de la entidad asegurada de acuerdo al acta de inicio de fecha 02 de octubre de 2023. Los demás términos y condiciones de la póliza no modificados continúan vigentes.
20/02/2024	Cumplimiento	3018234	Modificación	Garantizar cumplimiento del contrato, calidad del servicio, buen manejo y correcta inversión del anticipo, pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de personal, al documento complementario al proceso de concurso de méritos abierto No. 004 de 2023,

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S A S

Fecha de Expedición	Tipo de Póliza	No. De Póliza	Tipo de Certificado	Observaciones
				contrato de interventoría No. 364 de 2023. Se expide el presente certificado para actualizar la vigencia de la póliza arriba indicada de acuerdo al acta de suspensión No. 001 de fecha 28 de diciembre de 2023, acta de reinicio No. 001 de fecha 19 de febrero de 2024, al contrato de interventoría 364 de 2023. Los demás términos y condiciones de la póliza no modificados continúan vigentes.
01/03/2024	Cumplimiento	3018234	Modificación	Garantizar cumplimiento del contrato, calidad del servicio, buen manejo y correcta inversión del anticipo, pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de personal, al documento complementario al proceso de concurso de méritos abierto No. 004 de 2023, contrato de interventoría No. 364 de 2023. Se expide el presente certificado para actualizar la vigencia de la póliza arriba indicada de acuerdo a adicional en tiempo No. 001 al contrato de interventoría 364 de 2023.

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

Fecha de Expedición	Tipo de Póliza	No. De Póliza	Tipo de Certificado	Observaciones
				Los demás términos y condiciones de la póliza no modificados continúan vigentes.
25/07/2024	Cumplimiento	3018234	Modificación	Garantizar cumplimiento del contrato, calidad del servicio, buen manejo y correcta inversión del anticipo, pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de personal, al documento complementario al proceso de concurso de méritos abierto No. 004 de 2023, contrato de interventoría No. 364 de 2023. Se expide el presente certificado para ampliar las vigencias de la póliza arriba indicada de acuerdo a adicional en tiempo No.002 al contrato de interventoría No.364 de 2023 derivado del CMA-004 de 2023. Los demás términos y condiciones de la póliza no modificados continúan vigentes.
				Garantizar cumplimiento del contrato, calidad del servicio, buen manejo y correcta inversión del anticipo, pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de personal, al documento

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

Fecha de Expedición	Tipo de Póliza	No. De Póliza	Tipo de Certificado	Observaciones
25/07/2024	Cumplimiento	3018234	Modificación	complementario al proceso de concurso de méritos abierto No. 004 de 2023, contrato de interventoría No. 364 de 2023. Se expide el presente certificado para ampliar las vigencias de la póliza arriba indicada de acuerdo a acta de suspensión No.002 de fecha 22 de mayo de 2024, acta de reinicio No.002 de fecha 10 de julio de 2024 al contrato No. 364 de 2023. Los demás términos y condiciones de la póliza no modificados continúan vigentes.
25/07/2024	Cumplimiento	3018234	Modificación	Garantizar cumplimiento del contrato, calidad del servicio, buen manejo y correcta inversión del anticipo, pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de personal, al documento complementario al proceso de concurso de méritos abierto No. 004 de 2023, contrato de interventoría No. 364 de 2023. Se expide el presente certificado para actualizar las vigencias de la póliza arriba indicada de acuerdo a adición No. 01 al contrato

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

Fecha de Expedición	Tipo de Póliza	No. De Póliza	Tipo de Certificado	Observaciones
				de interventoría No.364 de 2023. Los demás términos y condiciones de la póliza no modificados continúan vigentes.
31/07/2024	Cumplimiento	3018234	Modificación	Garantizar cumplimiento del contrato, calidad del servicio, buen manejo y correcta inversión del anticipo, pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de personal, al documento complementario al proceso de concurso de méritos abierto No. 004 de 2023, contrato de interventoría No. 364 de 2023. Se expide el presente certificado para aumentar el valor asegurado a la póliza arriba indicada de acuerdo a solicitud de la entidad Los demás términos y condiciones de la póliza no modificados continúan vigentes.
				Garantizar cumplimiento del contrato, calidad del servicio, buen manejo y correcta inversión del anticipo, pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de personal, al documento complementario al proceso

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

Fecha de Expedición	Tipo de Póliza	No. De Póliza	Tipo de Certificado	Observaciones
21/11/2024	Cumplimiento	3018234	Modificación	de concurso de méritos abierto No. 004 de 2023, contrato de interventoría No. 364 de 2023. Se expide el presente certificado para actualizar las vigencias de la póliza arriba indicada de acuerdo a acta de suspensión No.003 de fecha 09 de octubre de 2024, prorroga No.001 de la suspensión No.003 de fecha 28 de octubre de 2024, acta de reinicio No.003 de fecha 14 de noviembre de 2024, al contrato de interventoría No.364 de 2023. Los demás términos y condiciones de la póliza no modificados continúan vigentes.
21/11/2024	Cumplimiento	3018234	Modificación	Garantizar cumplimiento del contrato, calidad del servicio, buen manejo y correcta inversión del anticipo, pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de personal, al documento complementario al proceso de concurso de méritos abierto No. 004 de 2023, contrato de interventoría No. 364 de 2023. Se expide el presente certificado para ampliar la vigencia de la póliza arriba

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

Fecha de Expedición	Tipo de Póliza	No. De Póliza	Tipo de Certificado	Observaciones
				indicada de acuerdo a prorroga No.03 al contrato de interventoría No.364 de 2023. Los demás términos y condiciones de la póliza no modificados continúan vigentes.

El estado actual de las pólizas que amparan el contrato es el siguiente:

Numero de Póliza: Cumplimiento	3018234	**Aseguradora:**	PREVISORA SEGUROS	
Amparo	**Vigencia**		**Valor Asegurado**	**Estado**
	Desde	**Hasta**		
Cumplimiento del contrato	14/11/2024	29/06/2025	$ 42.798.656,00	VIGENTE
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2024	29/12/2024	$ 149.795.294,00	VIGENTE
Pago de salarios, prestaciones sociales.	14/11/2024	29/12/2027	$ 21.399.328,00	VIGENTE
Calidad del servicio	29/12/2024	29/12/2029	$ 42.798.656,00	VIGENTE

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S A S

El seguimiento de las garantías efectuadas para el contrato de interventoría es el siguiente:

No. Póliza	Tipo de Póliza	No. Certificado	Fecha de expedición	Actualización
3018234	Cumplimiento	0	11/07/2023	Expedición
3018234	Cumplimiento	1	06/10/2023	Acta de incicio
3018234	Cumplimiento	2	20/02/2024	Acta de reinicio No.001
3018234	Cumplimiento	3	01/03/2024	Adicional en tiempo No.001
3018234	Cumplimiento	4		
3018234	Cumplimiento	5		
3018234	Cumplimiento	6	25/07/2024	Modificatorio No.002 adicional en tiempo
3018234	Cumplimiento	7	25/07/2024	Acta de reinicio No. 002
3018234	Cumplimiento	8	25/07/2024	Adición No. 001
3018234	Cumplimiento	9	31/07/2024	Modificación Adición No. 001
3018234	Cumplimiento	10	21/11/2024	Acta de reinicio No. 003
3018234	Cumplimiento	11	21/11/2024	Prorroga No. 003

5.4 FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO		
CONTRATO INICIAL		
GIROS POR	**PORCENTAJE**	**VALOR**
Anticipo, previa solicitud del interventor y aceptación de las condiciones de la entidad para su entrega.	35%	$ 99.909.962,60
El Distrito de Riohacha pagará al interventor el valor total del contrato de la siguiente forma: el 100% del valor del contrato se pagará mediante actas de costos en mensualidades vencidas o en días proporcionales al mes.	100%	**$ 285.457.036,00**
ADICIONAL		
GIROS POR	**PORCENTAJE**	**VALOR**

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

FORMA DE PAGO		
CONTRATO INICIAL		
GIROS POR	**PORCENTAJE**	**VALOR**
Anticipo, previa solicitud del interventor y aceptación de las condiciones de la entidad para su entrega.	35%	$ 49,885,331
El Distrito de Riohacha pagará al interventor el valor total del contrato de la siguiente forma: el 100% del valor del contrato se pagará mediante actas de costos en mensualidades vencidas o en días proporcionales al mes.	100%	**$ 142.529.517,00**

5.5 BALANCE FINANCIERO Y DESEMBOLSOS REALIZADOS

CONCEPTO	VALOR
Valor del Contrato	**$ 285.457.036,00**
Anticipo contrato inicial 35%	**$ 99.909.962,60**
Valor del acta parcial No. 01	**$ 233.123.246,00**
Amortización del anticipo 35%	**$ 81.593.136,00**
Valor pagado acta parcial No. 01	**$ 151.530.110,00**
Valor del acta parcial No. 02	**$ 47.576.173,00**
Amortización del anticipo 35%	**$ 16.651.660,00**
Valor pagado acta parcial No. 02	**$ 30.924.512,00**
Valor del acta parcial No. 03	**$ 98.191.423,00**
Amortización del anticipo 35%	**$ 34.366.998,00**
Valor pagado acta parcial No. 03	**$ 63.824.425,00**
VALOR PAGADO	**$ 378.890.841,00**
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	**$ 49.095.711,31**

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

A la fecha del presente informe el Distrito de Riohacha ha realizado el desembolso a esta interventoría del anticipo por un valor de trecientos setenta y ocho millones ochocientos noventa mil ocho cientos cuarenta y un pesos. ($ 378.890.841,00) M/cte.

5.6 REPORTE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	DURACIÓN (mes)	DEDICACIÓN	VALOR PARCIAL ($)	
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						**ANTICIPO 35%**
1	Director de interventoría	$ 7.058.712,70	6	30%	$ 12.705.682,85	$ 4.446.989,00
1	Residente de interventoría	$ 4.293.692,66	6	100%	$ 25.762.155,99	$ 9.016.754,60
1	Trabajadora social	$ 3.412.616,75	6	53,40%	$ 10.934.613,65	$ 3.827.114,78
1	Siso	$ 3.412.616,75	6	55%	$ 11.261.635,28	$ 3.941.572,35
1	Ingeniero civil especialista en estructura	$ 5.905.873,00	6	10%	$ 3.543.523,80	$ 1.240.233,33
SUB TOTAL					**$ 64.207.611,57**	**$ 22.472.664,05**
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,4**	**2,40**
TOTAL, COSTOS PERSONAL (A)					**$ 154.098.267,77**	**$ 53.934.393,72**
COSTOS OPERATIVOS						**ANTICIPO 35%**
1	Papelería, tintas, copias, material fotográfico y demás elementos para informes.	$ 650.000	6	100%	$ 3.900.000	$ 1.365.000
1	Alquiler de equipos de cómputo y fotográficos.	$ 300.000	6	100%	$ 1.800.000	$ 630.000
1	Ensayo de resistencia a la compresión de cilindros.	$ 200.000	6	100%	$ 1.200.000	$ 420.000
1	Ensayo de densidad y humedad.	$ 200.000	6	100%	$ 1.200.000	$ 420.000
1	Ensayo modificado de compactación.	$ 200.000	6	100%	$ 1.200.000	$ 420.000
1	Ensayo a la resistencia a la flexión del concreto.	$ 200.000	6	100%	$ 1.200.000	$ 420.000
TOTAL, COSTOS OPERATIVOS (B)					$ 10.500.000	$ 3.675.000,00
GASTOS DE LEGALIZACIÓN						**ANTICIPO 50%**
1	Legalización	$ 75.281.594	1		$ 75.281.594,00	$ 26.348.557,90
TOTAL, GASTOS DE LEGALIZACIÓN (C)					$ 75.281.594,00	$ 26.348.557,90
SUBTOTAL DEL PROYECTO (A + B + C) = D					**$ 239.879.862,00**	**$ 83.957.951,62**
IVA 19%					**$ 45.577.174,00**	**$ 15.952.010,81**
COSTO TOTAL INTERVENTORÍA					**$ 285.457.036,00**	**$ 99.909.962,60**

GESTIÓN CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S

5.7 ACTAS EFECTUADAS

ACTAS EFECTUADAS			
No.	**Descripción**	**Fecha**	**Actores**
1	Suscripción del contrato	11/07/2023	**LEANDRO MEJÍA DIAZ** Alcalde Distrital de Riohacha **LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante legal GESTIÓN CONSULTORES SAS.
2	Acta de Inicio	02/08/2023	**KEIDER FREYLE SARMIENTO** Secretario de Infraestructura y servicios públicos distrital. **LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante legal GESTIÓN CONSULTORES SAS.
3	Acta de suspensión No. 01	28/12/2023	**KEIDER FREYLE SARMIENTO** Secretario de Infraestructura y servicios públicos distrital. **LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante legal GESTIÓN CONSULTORES SAS.
4	Acta de reinicio No. 01	19/02/2024	**JAIME ORLANDO BRUGES MORENO** Secretario de Infraestructura y servicios públicos distrital. **LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante legal GESTIÓN CONSULTORES SAS.
5	Adicional en tiempo 001	22/02/2024	**JAIME ORLANDO BRUGES MORENO** Secretario de Infraestructura y servicios públicos distrital. **LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante legal GESTIÓN CONSULTORES SAS.
6	Acta parcial No. 001	18/04/2024	**JAIME ORLANDO BRUGES MORENO** Secretario de Infraestructura y servicios públicos distrital. **LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante legal GESTIÓN CONSULTORES SAS.
7	Acta parcial No. 002	19/05/2024	**JAIME ORLANDO BRUGES MORENO** Secretario de Infraestructura y servicios públicos distrital. **LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante legal GESTIÓN CONSULTORES SAS.

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

ACTAS EFECTUADAS			
No.	**Descripción**	**Fecha**	**Actores**
8	Acta de suspensión No. 02	22/05/2024	**JAIME ORLANDO BRUGES MORENO** Secretario de Infraestructura y servicios públicos distrital. **LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante legal GESTIÓN CONSULTORES SAS
9	Adicional en tiempo 002	22/05/2024	**JAIME ORLANDO BRUGES MORENO** Secretario de Infraestructura y servicios públicos distrital. **LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante legal GESTIÓN CONSULTORES SAS.
10	Acta de reinicio No. 02	10/07/2024	**JAIME ORLANDO BRUGES MORENO** Secretario de Infraestructura y servicios públicos distrital. **LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante legal GESTIÓN CONSULTORES SAS.
11	Adicional 001	12/07/2024	**JAIME ORLANDO BRUGES MORENO** Secretario de Infraestructura y servicios públicos distrital. **LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante legal GESTIÓN CONSULTORES SAS.
12	Acta de suspensión No. 03	09/10/2024	**JAIME ORLANDO BRUGES MORENO** Secretario de Infraestructura y servicios públicos distrital. **LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante legal GESTIÓN CONSULTORES SAS.
13	Prorroga suspensión No. 03	28/10/2024	**JAIME ORLANDO BRUGES MORENO** Secretario de Infraestructura y servicios públicos distrital. **LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante legal GESTIÓN CONSULTORES SAS
14	Acta de reinicio No. 02	14/11/2024	**JAIME ORLANDO BRUGES MORENO** Secretario de Infraestructura y servicios públicos distrital. **LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante legal GESTIÓN CONSULTORES SAS
15	Adicional en tiempo 002	14/11/2024	**JAIME ORLANDO BRUGES MORENO** Secretario de Infraestructura y servicios públicos distrital.

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

ACTAS EFECTUADAS			
No.	**Descripción**	**Fecha**	**Actores**
			LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO Representante legal GESTIÓN CONSULTORES SAS.
16	Acta parcial final	30/12/2024	**JAIME ORLANDO BRUGES MORENO** Secretario de Infraestructura y servicios públicos distrital. **LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante legal GESTIÓN CONSULTORES SAS.

5.8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

- Solicitud y revisión de la documentación contractual, no solo en los inicios del contrato de obra sino en el transcurrir del mismo.
- Informar al contratista mediante oficio del avance de la obra y cumplimiento del cronograma de trabajo.
- Control técnico de la obra supervisando cada una de las actividades contractuales que se ejecutaron durante el periodo.
- Solicitar las visitas a la obra para resolver inconvenientes que se generen en el transcurso de la ejecución de la obra.
- Registro fotográfico del seguimiento diario de las actividades ejecutadas. Anexo registro fotográfico.
- Revisión de diseños.
- Asistencia a los diferentes comités realizados durante el presente periodo.

5.9 OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA

5.9.1 OBLIGACIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA

1. Cumplir con el objeto y obligaciones del contrato.
2. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir con los requisitos para la ejecución del contrato.
3. Presentar los informes de las actividades realizadas durante el mes o periodo correspondientes.

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S A S

4. Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema General de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido por la normatividad vigente.
5. Mantener su afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales y en su calidad de CONTRATISTA, cumplir con lo establecido, en el Decreto 1072 de 2015 durante el termino de ejecución del contrato.
6. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de la obra.
7. Hacer uso de los formatos establecidos por la contratante, ejecutar sus procedimientos y efectuar los registros según corresponda a su actividad contractual.
8. Asistir y participar en los talleres y demás convocatorias a los que sea convocado y cumplir los acuerdos y tareas que en ellos se determine.
9. Realizar la entrega de la documentación producida y recibida en ejecución del contrato y entregarla debidamente organizada y atendiendo a las tablas de retención documental TRD aplicables según la ley, de acuerdo con los formatos que la contratante determine.
10. Responder por la pérdida total y/o parcial de los documentos que, por motivo de sus obligaciones contractuales, deba custodiar y/o manipular y/o emplear.
11. Mantener la reserva y confidencialidad de la información que obtenga directa o indirectamente en desarrollo del objeto contractual.
12. Conocer y acatar las directrices que imparta la interventoría y la entidad contratante a través del supervisor del contrato.
13. Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien, actuando por fuera de la ley, pretenda obligarlo a hacer u monitor algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses de la contratante.
14. Mantener actualizado su domicilio durante el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más y presentarse a la contratante, en el momento que sea requerido por el mismo, para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación, en los casos que aplique.
15. Defender en todas sus actuaciones los intereses de la contratante y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales.
16. De ser necesario, desplazarse a otros municipios del país, previa aprobación del supervisor.

17. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que abierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas.
18. Dar respuesta dentro de los cinco (5) días siguientes a su recepción, a las PQRS que le indique el supervisor y/o la interventoría y se relacionen con el objeto del contrato, de manera que se efectúe la revisión, firma y trámite administrativo para responder al peticionario dentro del plazo que señala la Ley. Este trámite será tenido en cuenta por parte del supervisor del contrato para la autorización de cobro y expedición de paz y salvos.
19. Asistir y participar en los comités, talleres, juntas y demás eventos que le indique la interventoría y la contratante a través del supervisor y se relacionen con el objeto del contrato.
20. Conocer y aplicar lo dispuesto en la política Anti soborno del **MINISTERIO.**
21. Las demás que determine el interventor y la contratante a través del supervisor y que se relacionen con su objeto contractual.

5.9.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA INTERVENTORÍA

1. Adquirir conocimiento completo y detallado del proyecto, de las especificaciones técnicas, de la oferta del contratista, de los cronogramas de ejecución y de cualquier otro documento que haga parte del contrato de obra. Para el efecto, la interventoría deberá revisar y verificar previamente a la iniciación de las obras, los planos y documentos del proyecto a construir.
2. Efectuar verificación oportuna en sitio de los procedimientos constructivos y del cumplimiento de las especificaciones técnicas, diseños y/o características acordadas de cada obra.
3. Apoyar al constructor en la determinación de soluciones a inconvenientes técnicos, sociales, ambientales o económicos y recomendando los correctivos o características que considere más apropiadas.
4. Revisar, complementar y aprobar conjuntamente con los contratistas los programas de trabajo para la ejecución de las obras.
5. Efectuar seguimiento detallado al avance de las obras, al cumplimiento de la programación y a la calidad de las obras. El Interventor deberá tomar los datos y hacer los cálculos necesarios para cuantificar el avance de los trabajos realizados y compararlos con los previstos en el cronograma como

justificación para la autorización de los pagos establecidos. También deberá establecer los incumplimientos y recomendar las sanciones y/o correctivos que correspondan.

6. Verificar las cantidades de obra construida y llevar balance permanente de la ejecución de cantidades de obra. El interventor deberá revisar, evaluar y cuantificar todos los trabajos que realice el contratista, aprobando aquellos que hayan sido adelantados adecuadamente y rechazando los trabajos que se hayan realizado en forma indebida o ineficiente, ordenando su cambio o corrección.
7. El interventor deberá garantizar que los contratistas de obra den estricto cumplimiento a las políticas de Gestión Social, SISO y Ambiental del Manual Operativo. En especial, deberá exigirse el estricto cumplimiento del código de conducta y relacionamiento con la comunidad que se establece en la evaluación social que se acuerda durante la socialización de la obra y presentación de los contratistas, antes del inicio de los mismos. El interventor deberá informar a la alcaldía del Distrito de Riohacha, la Guajira, la necesidad de servidumbres o reasentamientos involuntarios de habitantes para la ejecución de las obras, para que la persona designada por el Gestor defina y adelante las acciones correspondientes. El interventor debe verificar que los contratistas de obra den cumplimiento de las condiciones particulares de las licencias y/o permisos ambientales cuando aplique.
8. El interventor deberá mantener una bitácora del proyecto en sus oficinas donde se detallen los avances diarios y aspectos relevantes de las obras; también mantendrá archivo físico y digital de correspondencia cruzada, emitiendo comunicaciones formales cuando se evidencien incumplimiento u otro tipo de asuntos relevantes.
9. Aprobar las obras ejecutadas, efectuar mediciones diarias y semanales con el contratista; suscribir las respectivas actas de medición que servirán de base para la aprobación de las cuentas de pago del contratista, en acuerdo con las cantidades de obra ejecutada y debidamente recibida.
10. Impartir instrucciones al contratista de obra, sobre los trabajos de campo (localización, revisión previa de los sitios o de las obras, toma de muestras, ensayos de laboratorio, etc.) y de oficina (informes) y demás observaciones que al respecto juzgue pertinentes.

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S A S

11. Someter a consideración de la alcaldía del Municipio de Maicao- la Guajira, previamente, las modificaciones relativas a los términos, especificaciones, cantidades de obra, características, cambios o ajustes del personal, prórrogas, adiciones, etc. Toda solicitud de modificación deberá estar acompañada de la correspondiente justificación técnica.
12. Consignar en actas formales todos los convenios, aprobaciones, acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo de los trabajos contratados y en defensa de los intereses del PDAG.
13. Atender todas las consultas, reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por el contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a la alcaldía del Distrito de Riohacha- la Guajira, de aquellas que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto.
14. En cuanto a los suministros que haga directamente el contratista, la interventoría supervisará que el contratista efectúe un control de calidad y cantidad permanente a estos suministros, por su oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas correspondientes. Si por alguna causa los materiales no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, la interventoría deberá exigir el retiro y/o demolición de la parte de la obra que se haya trabajado con este tipo de materiales y deberá exigir el retiro y/o demolición de la parte de la obra que se haya trabajado con este tipo de materiales y deberá suspender la correspondiente actividad de la obra hasta que el contratista remplace los materiales por otros que cumplan con los requisitos y especificaciones establecidas en el contrato.
15. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de carácter laboral, ambiental y social, vigentes y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que sean den cumplimiento obligatorio.
16. Tener especial cuidado en que el Contratante esté amparado en todo tiempo por las garantías contractuales establecidas. Así mismo exigir con la debida anticipación su renovación o modificación si fuere el caso.
17. Verificar y controlar la vinculación del personal propuesto para la ejecución de los contratos, de acuerdo con los requisitos de experiencia y número requeridos y solicitar los cambios que fuesen necesarios o su incremento para el normal desarrollo de los contratos.

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

18. Vigilar que el contratista utilice los recursos del anticipo de acuerdo con el Plan de Inversión del Anticipo presentado por el contratista.
19. Efectuar comités de obras regulares con el contratista para revisar los aspectos más importantes de las obras.
20. Efectuar informes diarios de las visitas a obras para el archivo interno de la interventoría. Efectuar registro fotográfico detallado y ordenado de cada obra construida.

5.10 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

Periodo: Del 14 de diciembre del 2024 al 29 de diciembre del 2024.

Ítem	Nombre	Identificación	Cargo	IBC	Dias laborados
1	Luz Alejandra Figueroa Romero	26988344	Representante legal	$ 4.000.000	16
2	Jorge Andrés Ballesteros Valdivieso	1196881748	Director de interventoría	$ 1.440.000	16
3	Kevin Jair Acuña Negrete	1131071564	Residente de interventoría	$ 3.600.000	16
4	Yulimar Sánchez Ramos	40881210	Trabajadora social	$ 1.440.000	16
5	Severino Segundo Suarez Sierra	84081437	Siso	$ 1.300.000	16
6	Armando José Rivero Galvis	79956351	Especialista en estructura	$ 1.300.000	16

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

6 CONTRATO DE OBRA 393 DE 2023

6.1 FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DISTRITAL DE RIOHACHA
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO DEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA"
CONTRATO No:	393 DE 2023
CONTRATISTA:	JAVIER ESCORCIA MONTERO
DIRECCIÓN:	
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER ESCORCIA MONTERO
IDENTIFICACIÓN:	No. 19.600.598 DE FUNDACIÓN (MAGDALENA)
VALOR DEL CONTRATO:	CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($4.551.179.765,00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	DOS (02) DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	DOS (02) DE MARZO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01	VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO No. 01	DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No. 01:	VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE ADICIONAL EN TIEMPO 001:	VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ADICIÓN EN TIEMPO 001:	VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE 2024

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

ADICIONAL ENTIEMPO 002:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ADICIÓN 002:	VEINTIDÓS DE (22) DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 002:	VEINTIDÓS (22) DE MAYO DE 2024
FECHA DE REINICIO 002:	DIEZ (10) DE JULIO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO 001:	DIEZ (10) DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 003:	NUEVE (09) DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE PRORROGA 01 A LA SUSPENSIÓN 003:	VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO 003:	CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO 003:	CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA EN TIEMPO No. 003:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA 003:	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS.
ESTADO DEL CONTRATO:	FINALIZADO

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

6.2 CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y REGISTRO PRESUPUESTAL

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y REGISTRO PRESUPUESTAL				
Descripción	**N°**	**Fecha**	**Concepto**	**Valor**
CDP	351	26/04/2023	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO DEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA"	$ 5.056.938.538,00
			TOTAL, CDP	**$ 5.056.938.538,00**
RP	3082	01/09/2023	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO DEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA"	$ 4.551.179.705,00
			TOTAL, RP	**$ 4.551.179.765,00**

6.3 SEGUIMIENTO LAS GARANTÍAS

El movimiento que presentan las pólizas que amparan al Contrato de Obra No. 393 de 2023, de acuerdo a la actualización por prorroga en tiempo No. 003 aprobadas por parte del Distrito de Riohacha es el siguiente:

Fecha de Expedición	Tipo de Póliza	No. De Póliza	Tipo de Certificado	Observaciones
04/09/2023	Cumplimiento	96-44-101184682	Inicial	Se ampara la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado en desarrollo del contrato No.393 de 2023 referente a construcción y dotación de parque recreo-deportivo las Tunas, ubicado en el distrito de Riohacha.

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

Fecha de Expedición	Tipo de Póliza	No. De Póliza	Tipo de Certificado	Observaciones
04/09/2023	Responsabilidad Civil Extracontractual	96-40-101064952	inicial	Se ampara la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado en desarrollo del contrato No.393 de 2023 referente a construcción y dotación de parque recreo-deportivo las Tunas, ubicado en el distrito de Riohacha.
30/04/2024	Cumplimiento	85-44-101128627		el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de obra pública n 393 de 2023, cuyo objeto es construcción y dotación de parque recreo deportivo las tunas, ubicado en el distrito de Riohacha. nota: cesión de unión temporal park recreodeportivo a Javier Escorcia Montero según resolución numero 1-335 de 2023 17 de noviembre de 2023 por medio de la cual se autoriza la cesión total del contrato de obra no. 393 de 2023 y se dictan otras disposiciones
				se ampara la responsabilidad civil extracontractual por daños a terceros imputable al contratista durante la

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S A S

Fecha de Expedición	Tipo de Póliza	No. De Póliza	Tipo de Certificado	Observaciones
24/04/2024	Responsabilidad Civil Extracontractual	85-40-101058932		ejecucion del contrato de obra publican 393 de 2023, cuyo objeto es construccion y dotación de parque recreo deportivo las tunas, ubicado en el distrito de Riohacha nota: cesión de unión temporal park recreo deportivo a Javier Escorcia Montero según resolución numero 1-335 de 2023 17 de noviembre de 2023 por medio de la cual se autoriza la cesión total del contrato de obra no. 393 de 2023 y se dictan otras disposiciones
22/08/2024	Cumplimiento	85-44-101128627		el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de obra pública n 393 de 2023, cuyo objeto es construcción y dotación de parque recreo deportivo las tunas, ubicado en el distrito de Riohacha. nota: cesion de union temporal park recreodeportivo a javier escorcia monterio segun resolucion numero 1-335 de 2023 17 de noviembre de 2023 por medio de la cual se autoriza la cesión total del contrato de obra no. 393

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

Fecha de Expedición	Tipo de Póliza	No. De Póliza	Tipo de Certificado	Observaciones
				de 2023 y se dictan otras disposiciones. ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE ANEXO SE APLICA ACTA DE SUSPENSION DE FECHA 22/05/2024 Y ACTA DE REINICIO DE FECHA 10/07/2024 EN ESTE ANEXO SE ACTUALIZA AMPARO DE CUMPLIMIENTO POR ACLARACION DE VIGENCIA.
21/08/2024	Responsabilidad Civil Extracontractual	85-40-101058932		se ampara la responsabilidad civil extracontractual por daños a terceros imputable al contratista durante la ejecucion del contrato de obra publican 393 de 2023, cuyo objeto es construccion y dotacion de parque recreo deportivo las tunas, ubicado en el distrito de riohacha nota: cesión de union temporal park recreo deportivo a javier escorcia monterio segun resolucion

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

Fecha de Expedición	Tipo de Póliza	No. De Póliza	Tipo de Certificado	Observaciones
				numero 1-335 de 2023 17 de noviembre de 2023 por medio de la cual se autoriza la cesión total del contrato de obra no. 393 de 2023 y se dictan otras disposiciones. MEDIANTE ANEXO SE APLICA ACTA DE SUSPENSION DE FECHA 22/05/2024 Y ACTA DE REINICIO FECHA 10/07/2024
18/11/2024	Responsabilidad Civil Extracontractual	85-40-101058932		se ampara la responsabilidad civil extracontractual por daños a terceros imputable al contratista durante la ejecucion del contrato de obra publican 393 de 2023, cuyo objeto es construccion y dotación de parque recreo deportivo las tunas, ubicado en el distrito de Riohacha nota: cesión de unión temporal park recreo deportivo a Javier Escorcia Montero según resolución numero 1-335 de 2023 17 de noviembre de 2023 por medio de la cual se autoriza la cesión total del contrato de obra no. 393 de 2023 y se dictan otras disposiciones. ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

Fecha de Expedición	Tipo de Póliza	No. De Póliza	Tipo de Certificado	Observaciones
				HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE ANEXO SE APLICA ACTA DE SUSPENSION DE FECHA 09/10/2024 Y ACTA DE REINICIO DE FECHA 14/11/2024.
18/11/2024	Responsabilidad Civil Extracontractual	85-40-101058932		se ampara la responsabilidad civil extracontractual por daños a terceros imputable al contratista durante la ejecucion del contrato de obra publican 393 de 2023, cuyo objeto es construccion y dotacion de parque recreo deportivo las tunas, ubicado en el distrito de riohacha nota: cesión de union temporal park recreo deportivo a javier escorcia monterio segun resolucion numero 1-335 de 2023 17 de noviembre de 2023 por medio de la cual se autoriza la cesión total del contrato de obra no. 393 de 2023 y se dictan otras disposiciones. MEDIANTE ANEXO SE APLICA OTRO SI DE

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S A S

Fecha de Expedición	Tipo de Póliza	No. De Póliza	Tipo de Certificado	Observaciones
				PRORROGA 003 POR UN TIEMPO DE 45 DIAS
20/11/2024	Cumplimiento	85-44-101128627		el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de obra pública n 393 de 2023, cuyo objeto es construcción y dotación de parque recreo deportivo las tunas, ubicado en el distrito de Riohacha. nota: cesion de union temporal park recreodeportivo a javier escorcia monterio segun resolucion numero 1-335 de 2023 17 de noviembre de 2023 por medio de la cual se autoriza la cesión total del contrato de obra no. 393 de 2023 y se dictan otras disposiciones. ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE ANEXO SE APLICA ACTA DE SUSPENSION DE FECHA 09/10/2024 Y ACTA DE REINICIO DE FECHA 14/11/2024

GESTIÓN CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S

El estado actual de las pólizas que amparan el contrato es el siguiente:

Numero de Póliza Cumplimiento	85-44-101128627	**Aseguradora:**	SEGUROS DEL ESTADO S. A	
Numero de Póliza RCE	85-40-101058932			
Amparo	**Vigencia**		**Valor Asegurado**	**Estado**
	Desde	**Hasta**		
Cumplimiento del contrato	24/03/2024	02/07/2025	$ 455.117.976,50	VIGENTE
Buen manejo del anticipo	24/03/2024	02/07/2025	$ 1.365.353.929,50	VIGENTE
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	24/03/2024	29/12/2027	$ 227.558.988,25	VIGENTE
Estabilidad y calidad de la obra		5 años, 0 meses y 1 días.	$ 910.235.953,000	VIGENTE
Responsabilidad Civil Extracontractual	24/03/2024	27/12/2024	$ 260.000.000,00	VIGENTE

El seguimiento de las garantías efectuadas para el contrato de obra es el siguiente:

No. Póliza	**Tipo de Póliza**	**No. Certificado**	**Fecha de expedición**	**Actualización**
96-44-101184682	Cumplimiento	0	04/09/2023	Suscripción del Contrato
96-40-101064952	Responsabilidad Civil Extracontractual	0	04/09/2023	Suscripción del Contrato
85-44-101128627	Cumplimiento	0	24/04/2024	Emisión
85-40-101058932	Responsabilidad Civil Extracontractual	0	30/04/2024	Emisión
85-44-101128627	Cumplimiento	1	22/08/2024	REINICIO No. 02
85-40-101058932	Responsabilidad Civil Extracontractual	1	21/08/2024	REINICIO No. 02
85-44-101128627	Cumplimiento	2	22/08/2024	Anexo de prorroga

GESTIÓN CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S

No. Póliza	Tipo de Póliza	No. Certificado	Fecha de expedición	Actualización
85-40-101058932	Responsabilidad Civil Extracontractual	2	21/08/2024	Anexo de prorroga
85-40-101058932	Responsabilidad Civil Extracontractual	3	18/11/2024	Anexo de prorroga
85-44-101128627	Cumplimiento	3	20/11/2024	Reinicio No.03
85-44-101128627	Cumplimiento	4	20/11/2024	Reinicio No.03
85-44-101128627	Cumplimiento	5	20/11/2024	Anexo de prorroga

Las pólizas fueron actualizadas por el contratista de obra, de acuerdo a la prórroga No. 003 en tiempo efectuada al contrato.

6.4 FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO		
GIROS POR	**PORCENTAJE**	**VALOR**
Anticipo	30%	$ 1,365,353,929
Actas Parciales previa amortización del anticipo.	60%	$ 2,730,707,858
Retención por liquidación	10%	$ 455,117,976
Total	**100%**	**$4,551,179,765**

6.5 BALANCE FINANCIERO Y DESEMBOLSOS

CONCEPTO	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	**$4,551,179,764.51**
Anticipo	**$ 0.00**
Acta parcial No.001	**$ 1,365,353,929.00**
Acta parcial No.002	**$ 728,188,762.00**
Acta parcial No.003	**$ 682.472.437.00**

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

CONCEPTO	VALOR
Acta parcial final	**$ 1.775.164.636,00**
VALOR PAGADO	**$ 4,551,179,765**
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	**$ 0,00**

A la fecha del presente informe se han realizado el desembolso de cuatro mil quinientos cincuenta y un millones ciento setenta y nueve mil setecientos sesenta y cinco pesos $ 4,551,179,765 por concepto de acta parcial No. 01, acta parcial No. 02, acta parcial No. 03 y el acta parcial final de parte del distrito de Riohacha.

6.6 ACTAS EFECTUADAS

ACTAS EFECTUADAS			
No.	**Descripción**	**Fecha**	**Actores**
1	Suscripción del contrato	02/10/2023	**LEANDRO MEJÍA DIAZ** Secretario de Gobierno con funciones de alcalde del Distrito de Riohacha. **LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante Legal Gestión Interventores S.A.S
2	Acta de Inicio	02/10/2023	**KEIDER FREYLE SARMIENTO** Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos **LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante Legal Gestión Interventores S.A.S
3	Acta de socialización	12/10/2023	**JOSÉ RAMIRO BERMÚDEZ C.** Alcalde Distrito de Riohacha **KEIDER FREYLE SARMIENTO** Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos **ANA SUESCUN** Profesional de apoyo Gestión S.A.S **COMUNIDAD BENEFICIARIA DEL PROYECTO**
4	Acta de comité	16/10/2023	**KEIDER FREYLE SARMIENTO** Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos **ANA SUESCUN** Profesional de apoyo Gestión S.A.S **LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO**

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

ACTAS EFECTUADAS			
No.	**Descripción**	**Fecha**	**Actores**
			Representante Legal Gestión Interventores S.A.S
5	Acta de Conformación de veeduría	17/10/2023	**ANA SUESCUN** Profesional de apoyo Gestión S.A.S **YULIMAR SÁNCHEZ** Trabajadora social interventoría Gestión S.A.S **COMUNIDAD BENEFICIARIA DEL PROYECTO**
6	Acta de comité	17/11/2023	**KEIDER FREYLE SARMIENTO** Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos **ANA SUESCUN** Profesional de apoyo Gestión S.A.S **LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante Legal Gestión Interventores S.A.S
6	Cesión contrato de obra	17/11/2023	**JOSÉ RAMIRO BERMÚDEZ** Alcalde distrital de Riohacha
7	Acta de comité	19/12/2023	**KEIDER FREYLE SARMIENTO** Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos **ANA SUESCUN** Profesional de apoyo Gestión S.A.S **LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante Legal Gestión Interventores S.A.S
8	Acta de comité	27/12/2023	**KEIDER FREYLE SARMIENTO** Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos **ANA SUESCUN** Profesional de apoyo Gestión S.A.S **LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante Legal Gestión Interventores S.A.S **JAVIER ESCORCIA** Representante legal contrato de obra
9	Acta de suspensión No. 01	28/12/2023	**KEIDER FREYLE SARMIENTO** Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos **LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante Legal Gestión Interventores S.A.S **JAVIER ESCORCIA** Representante legal contrato de obra
10	Acta de reinicio No. 01	19/02/2024	**LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante Legal Gestión Interventores S.A.S **JAVIER ESCORCIA**

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

ACTAS EFECTUADAS			
No.	**Descripción**	**Fecha**	**Actores**
			Representante legal contrato de obra **JAIME ORLANDO BRUGES MORENO** Supervisión - secretario de Infraestructura y Servicios Públicos **JOSE MIGUEL SERRANO ILLIDGE** Apoyo a la supervisión
11	Acta de comité	21/02/2024	**LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante Legal Gestión Interventores S.A.S **JAVIER ESCORCIA** Representante legal contrato de obra **ANA SUESCUN** Profesional de apoyo Gestión S.A.S
12	Adicional en tiempo 001	22/02/2024	**JAIME ORLANDO BRUGES MORENO** Secretario de Infraestructura y servicios públicos distrital. **LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante legal GESTIÓN CONSULTORES SAS. **JAVIER ESCORCIA** Representante legal contrato de obra
13	Acta modificatoria No.001	05/03/2024	**LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante Legal Gestión Interventores S.A.S **JAVIER ESCORCIA** Representante legal contrato de obra **JAIME ORLANDO BRUGES MORENO** Supervisión - secretario de Infraestructura y Servicios Públicos **JOSE MIGUEL SERRANO ILLIDGE** Apoyo a la supervisión
14	Acta de comité		**LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante Legal Gestión Interventores S.A.S **JAVIER ESCORCIA** Representante legal contrato de obra **ANA SUESCUN** Profesional de apoyo Gestión S.A.S
15	Adicional en tiempo No.002	22/04/2024	**LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante Legal Gestión Interventores S.A.S **JAVIER ESCORCIA**

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

ACTAS EFECTUADAS			
No.	**Descripción**	**Fecha**	**Actores**
			Representante legal contrato de obra **JAIME ORLANDO BRUGES MORENO** Supervisión - secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
16	Acta parcial No. 001	24/04/2024	**LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante Legal Gestión Interventores S.A.S **JAVIER ESCORCIA** Representante legal contrato de obra **JAIME ORLANDO BRUGES MORENO** Supervisión - secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
17	Acta de comité		**LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante Legal Gestión Interventores S.A.S **JAVIER ESCORCIA** Representante legal contrato de obra **ANA SUESCUN** Profesional de apoyo Gestión S.A.S **JOSE MIGUEL SERRANO ILLIDGE** Apoyo a la supervisión
18	Acta de comité		**LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante Legal Gestión Interventores S.A.S **JAVIER ESCORCIA** Representante legal contrato de obra **ANA SUESCUN** Profesional de apoyo Gestión S.A.S **JOSE MIGUEL SERRANO ILLIDGE** Apoyo a la supervisión
19	Acta de suspensión No.002	22/05/2024	**LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante Legal Gestión Interventores S.A.S **JAVIER ESCORCIA** Representante legal contrato de obra **JAIME ORLANDO BRUGES MORENO** Supervisión - secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
20	Acta de reinicio No.002	10/07/2024	**LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante Legal Gestión Interventores S.A.S **JAVIER ESCORCIA** Representante legal contrato de obra

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

ACTAS EFECTUADAS			
No.	**Descripción**	**Fecha**	**Actores**
			JAIME ORLANDO BRUGES MORENO Supervisión - secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
21	Acta de comité		**LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante Legal Gestión Interventores S.A.S **JAVIER ESCORCIA** Representante legal contrato de obra **ANA SUESCUN** Profesional de apoyo Gestión S.A.S **JOSE MIGUEL SERRANO ILLIDGE** Apoyo a la supervisión
22	Acta de comité		**LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante Legal Gestión Interventores S.A.S **JAVIER ESCORCIA** Representante legal contrato de obra **ANA SUESCUN** Profesional de apoyo Gestión S.A.S
23	Acta de comité		**LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante Legal Gestión Interventores S.A.S **JAVIER ESCORCIA** Representante legal contrato de obra **ANA SUESCUN** Profesional de apoyo Gestión S.A.S
24	Acta parcial No. 002	27/08/2024	**LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante Legal Gestión Interventores S.A.S **JAVIER ESCORCIA** Representante legal contrato de obra **JAIME ORLANDO BRUGES MORENO** Supervisión - secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
25	Acta de comité		**LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante Legal Gestión Interventores S.A.S **JAVIER ESCORCIA** Representante legal contrato de obra **ANA SUESCUN** Profesional de apoyo Gestión S.A.S

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S A S

ACTAS EFECTUADAS			
No.	**Descripción**	**Fecha**	**Actores**
26	Acta de comité		**LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante Legal Gestión Interventores S.A.S **JAVIER ESCORCIA** Representante legal contrato de obra **ANA SUESCUN** Profesional de apoyo Gestión S.A.S
27	Acta de comité		**LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante Legal Gestión Interventores S.A.S **ANA SUESCUN** Profesional de apoyo Gestión S.A.S **JOSE SERRANO ILLIDGE** Apoyo Supervisión - secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
28	Acta de comité		**LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante Legal Gestión Interventores S.A.S **ANA SUESCUN** Profesional de apoyo Gestión S.A.S **JOSE SERRANO ILLIDGE** Apoyo Supervisión - secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
29	Acta de comité		**LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante Legal Gestión Interventores S.A.S **JAVIER ESCORCIA** Representante legal contrato de obra **JAIME ORLANDO BRUGES MORENO** Supervisión - secretario de Infraestructura y Servicios Públicos **JOSÉ SERRANO ILLIDGE** Apoyo Supervisión - secretario de Infraestructura y Servicios Públicos **ANA SUESCUN** Profesional de apoyo Gestión S.A.S
30	Acta de suspensión No.003	09/10/2024	**LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante Legal Gestión Interventores S.A.S **JAVIER ESCORCIA** Representante legal contrato de obra **JAIME ORLANDO BRUGES MORENO**

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

ACTAS EFECTUADAS			
No.	**Descripción**	**Fecha**	**Actores**
			Supervisión - secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
31	Acta de reinicio No.003	14/11/2024	**LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante Legal Gestión Interventores S.A.S **JAVIER ESCORCIA** Representante legal contrato de obra **JAIME ORLANDO BRUGES MORENO** Supervisión - secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
32	Acta de comité		**LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante Legal Gestión Interventores S.A.S **JAVIER ESCORCIA** Representante legal contrato de obra **JAIME ORLANDO BRUGES MORENO** Supervisión - secretario de Infraestructura y Servicios Públicos **JOSÉ SERRANO ILLIDGE** Apoyo Supervisión - secretario de Infraestructura y Servicios Públicos **ANA SUESCUN** Profesional de apoyo Gestión S.A.S
33	Adicional en tiempo No.002	14/11/2024	**LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante Legal Gestión Interventores S.A.S **JAVIER ESCORCIA** Representante legal contrato de obra **JAIME ORLANDO BRUGES MORENO** Supervisión - secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
34	Acta de comité		**LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante Legal Gestión Interventores S.A.S **JAVIER ESCORCIA** Representante legal contrato de obra **ANA SUESCUN** Profesional de apoyo Gestión S.A.S
35	Acta parcial No.03	19/11/2024	**LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante Legal Gestión Interventores S.A.S **JAVIER ESCORCIA**

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

ACTAS EFECTUADAS			
No.	**Descripción**	**Fecha**	**Actores**
			Representante legal contrato de obra **JAIME ORLANDO BRUGES MORENO** Supervisión - secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
36	Acta de comité		**LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante Legal Gestión Interventores S.A.S **JAVIER ESCORCIA** Representante legal contrato de obra **ANA SUESCUN** Profesional de apoyo Gestión S.A.S
37	Acta de comité		**JAVIER ESCORCIA** Representante legal contrato de obra **JOSE MIGUEL SERRANO ILLIDGE** Apoyo a la supervisión **ANA SUESCUN** Profesional de apoyo Gestión S.A.S
38	Acta modificatoria No.002	23/12/2024	**LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante Legal Gestión Interventores S.A.S **JAVIER ESCORCIA** Representante legal contrato de obra **JAIME ORLANDO BRUGES MORENO** Supervisión - secretario de Infraestructura y Servicios Públicos **JOSE MIGUEL SERRANO ILLIDGE** Apoyo a la supervisión
39	Acta parcial final	30/12/2024	**LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** Representante Legal Gestión Interventores S.A.S **JAVIER ESCORCIA** Representante legal contrato de obra **JAIME ORLANDO BRUGES MORENO** Supervisión - secretario de Infraestructura y Servicios Públicos **JOSE MIGUEL SERRANO ILLIDGE** Apoyo a la supervisión

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S A S

6.7 ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En el periodo del presente informe se adelantaron las labores de los ítems excavaciones, rellenos y subbase granular, adecuación de terreno, acero de refuerzo y estructura metálica y carpintería metálica; dentro del contrato de obra.

- **EMPRADIZACION Y PAISAJISMO,** se realiza la preparación del terreno, esta preparación consiste en el retiro de piedras, escombro y residuos sólidos que puedan afectar la instalación de la grama. Luego de esto pica el suelo con herramientas tipo picas, palines y barras metálicas; esto para poder des compactar la parte superior del terreno y poder facilitar el intercambio de nutrientes con la cobertura vegetal.
  Se coloca una capa de tierra negra y fértil de 5 a 10 cm de espesor en toda el área a recuperar. Esta actividad es importante, ya que entre mejor sea el sustrato en donde se instalará la grama, mejor responderá esta cobertura. Se adquirieron trozos de pasto (grama) de forma cuadrada o rectangular de un tamaño de 30 a 50 cm de largo y de ancho para facilitar su instalación. Estos se deben instalar sobre el sustrato nuevo y seguido uno del otro procurando no dejar espacios entre ellos. Luego se coloca sustrato nuevo (tierra negra) entre las uniones de los trozos de grama; inmediatamente se aplica riego suficiente que garantice la supervivencia de la cobertura de pasto instalada.

- **BANCAS EN CONCRETO,** Las Bancas se Construyeron en Obra Utilizando Formaletas Metálicas, en Concreto de 3.000 PSI con acabado liso de presentación a la vista y el Acero de Refuerzo estipulado. Los refuerzos internos de la losa en toda la superficie en malla electro soldada con hueco de 100 mm x 100 mm cal 1»4´ y dos (2) refuerzos longitudinales en varilla redonda corrugada de 1»2´.

- **BORDILLOS EN CONCRETO (15X15) 3000PSI INCLUYE REF. LONG 3/8" Y REF.TRASN. 1/4" NO INCLUYE PREPARACIÓN DEL TERRENO,** Los Bordillos se construyeron con secciones de 0.15 m x 0.15 m y servirán para el confinamiento y separación de superficies duras con zonas empradizadas,

de acuerdo a como se indica en los planos. Para la ejecución de esta actividad se preparó concreto de 3,000 PSI y se utilizaron formaletas metálicas.

- **PISO EN CONCRETO 3000PSI E = 0,10M ESTAMPADO,** La técnica utilizada para realizar superficies de concreto decoradas consistió en la ejecución in situ de una losa monolítica estructural que en estado fresco se le incorpora un endurecedor con color sobre su superficie, y posteriormente previa colocación de un agente desmoldante, se estampa con moldes con textura tridimensional que reproducen la apariencia natural de diversos materiales, permitiendo gran variedad de diseños y colores.

- **MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15X6MM,** Suministro, corte, figuración, amarre y colocación de la malla electrosoldada para placas de contrapiso, entrepiso o cubierta, según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10. La malla electrosoldada se utilizará como refuerzo de temperatura, distribución de carga o retracción de fraguado, en losas o pisos de concreto o como refuerzo principal de acuerdo con los diseños o instrucciones de la Interventoría. Las mallas deberán cumplir con lo especificado en las normas NTC 1925 y NTC 2310. Para la colocación y anclajes de las mallas electrosoldadas deberá cumplirse todos los requisitos establecidos en las Norma Sismo Resistente 2010.

- **SOBRENIVEL SENCILLO EN LADRILLO MACIZO H=60 CM**, Este ítem hace referencia al sobrenivel de la cimentación con altura variable de acuerdo a lo defino en planos y/o sugerido por la Interventoría.
  Se entiende por Sobrenivel al conjunto de bloques o ladrillos unidos mediante una mezcla de mortero (Agua, Cemento, Arena y Aditivo), ubicados justo encima de la cimentación (Vigas de amarre). Tiene como función principal ser una transición entre Muros y Cimentación. Las dimensiones del sobrenivel y la dosificación del mortero por lo general se encuentran plasmadas en planos o son sugeridas por el Interventor de la obra.

- **PLANTILLA DE NIVELACIÓN MORTERO 1:3 E = 0,05 M PARA PISOS,** Sobre la superficie de las placas perfectamente limpias y curadas, se vaciará un mortero 1:4, espesor promedio de 0.04 m con arena de río, perfectamente nivelado y reglado, que servirá de nivelación, listo para proceder a la instalación de la baldosa.

- **CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,80 X 0,80 X 0,80 M EN CONCRETO DE 17,2 MPA, TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 20,7 MPA**

- **PISO TIPO LOSETA DE CEMENTO PARA EXTERIOR,** Se deben disponer hilos para controlar niveles y alineamiento, usando topografía. Este proceso se inicia antes de colocar la capa de arena de asiento y se ajusta a medida que avance el progreso de la construcción.
  Para la colocación de losetas se realiza una mezcla de esta arena con cemento gris en proporción (7:1) esta capa sirve como base de asentamiento para las losetas prefabricadas de concreto, permitiendo así su correcta instalación, compactación y nivelación. El espesor de esta capa no tiene aporte en cuanto a capacidad estructural, pero brinda estabilidad y rigidez a la capa de rodadura conformada por las losetas.
  Una vez colocada y enrasada esta capa se procede a la colocación de las losetas. La instalación se realiza de forma manual de acuerdo al patrón y a la orientación definidos en el diseño.

- **PAÑETE EN MORTERO 1:4,** Los muros se revestirán en donde los planos lo indiquen, con dos capas de mortero de cemento y Arena se humedecerán convenientemente, enseguida se procederá a fijar las líneas maestras, las cuales sirven de guía para el plomo y la superficie plana. Se colocará en forma continua, una primera capa de mortero con espesor máximo de 1 cm. La cual se deja fraguar después se procede a dar la segunda capa de afinado apoyándose en las líneas maestras Finalmente, la superficie obtenida será, alisada por medio de una llana de madera especial, cuidando de que la superficie obtenida sea perfectamente reglada, plomada y plana.

- **APLICACIÓN DE PULIPLAST,** Este ítem hace referencia a la aplicación de Puliplast, de acuerdo al definido en planos.

- **PINTURA CON VINILO TIPO I A TRES MANOS, INCLUYE DILATACIONES Y FILOS,** Este ítem se refiere a la aplicación de pintura en vinilo tipo 1 a dos manos. Para este ítem se utilizó pintura calidad tipo Pintuco de primera calidad Su aplicación se realizó con rodillo de felpa procurando que no queden grumos en la pared y retirando los elementos extraños que se puedan adherir a la pared, de tal forma que la superficie terminada quede completamente lisa y de un color uniforme.

- **CIELO RASO EN LAMINAS DE PVC, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA,** Corresponde esta especificación al suministro e instalación de cielo raso en PVC board conforme a los diseños, compuesto por entramados metálicos (ángulos, vigas, omegas etc.)

- **PISO EN CERÁMICA PARA INTERIOR 40X40 CM,** Este ítem hace referencia al suministro e instalación de la cerámica como piso en interiores. De acuerdo a lo definido en planos y/o sugerido por la Interventoría.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO ACRILICO PARA CANCHA MULTIPLE,** Este ítem hace referencia al suministro y aplicación de la Capa sintética en la cancha de Micro futbol como se indica en planos

- **GRAMA SINTETICA DE 8800 DTEX, DENSIDAD 50400 EN COLORES PARA PISO DE JUEGOS INFANTILES,** Grama sintética de 30mm con césped entorchado de 15mm, 240 s/m puntadas, densidad 50000, Dtex superior a 18000, calibre 3/4", apoyo 2PP capa-red. (no requiere rellenos).

- **SHOCKPAD 10MM DE 70KG/M3,** Esta especificación contempla el suministro, colocación, nivelación de Shock Pad Drenante e=25 mm, según

cotas y niveles requeridos de acuerdo con los planos generales del proyecto, la cual funciona como almohadilla de choque como sub-base de la grama sintética. Posee una capa anti vibración que absorbe el impacto y mantiene las propiedades deportivas del campo permitiendo un excelente rebote de la bola, además reemplaza el sistema tradicional de drenaje que se utiliza en las canchas, lo que implica que aunque caiga mucha lluvia, no se generan espejos de agua que interrumpan el juego.
Antes de proceder a la colocación se deberán nivelar y emparejar las zonas estipuladas para este tipo de acabados de acuerdo con los detalles y cotas de piso señalado en los planos.

- **SHOCKPAD 20MM DE 70KG/M3**, Esta especificación contempla el suministro, colocación, nivelación de Shock Pad Drenante e=25 mm, según cotas y niveles requeridos de acuerdo con los planos generales del proyecto, la cual funciona como almohadilla de choque como sub-base de la grama sintética. Posee una capa anti vibración que absorbe el impacto y mantiene las propiedades deportivas del campo permitiendo un excelente rebote de la bola, además reemplaza el sistema tradicional de drenaje que se utiliza en las canchas, lo que implica que aunque caiga mucha lluvia, no se generan espejos de agua que interrumpan el juego. Antes de proceder a la colocación se deberán nivelar y emparejar las zonas estipuladas para este tipo de acabados de acuerdo con los detalles y cotas de piso sexalado en los planos generales y de detalle del proyecto. Se debe proceder a retirar los residuos y materiales de desechos.

- **ARCOS 3,0X2 EN TUBO DE 4" (PORTICO Y 2" ESTRUCTURA INCLUYE REDES),** Esta actividad hace referencia al suministro e instalación de las porterías que serán colocadas a cada lado de la cancha.

- **ESTERAS PARA CAFETERIA CAL. 22.**

- **PUERTA PARA BAÑOS EN ALUMINIO,** Este ítem hace referencia al suministro e instalación de puertas en aluminio para baños de acuerdo a lo definido en planos.

- **VENTANA DE ALUMINIO 744 BLANCA**, Este ítem hace referencia al suministro e instalación de ventanas de aluminio 744 blanca de acuerdo a lo establecido en planos.

- **PROTECTORES METÁLICOS EN TUBO CUADRADO DE 1",** Suministro, y colocación de reja metálica fabricadas con varillas cuadradas de 1´, según las indicaciones que contienen los Planos.

- **JUEGOS INFANTILES EN TUBERIA DE 4" CON PINTURA ELECTROSTATICA, PISOS METALICOS RECUBIERTOS EN PVC Y PASTAS EN POLIETILENO DE ALTA PRESION Y BAJA DENSIDAD HP-LDPE,** 2 Plataformas de acero desplegado recubiertas en plastisol, 1 trepador colgante argollas, 1 escaleras de acceso trepador, 1 escalera con peldaño y pasamanos plásticos antideslizantes, 1 juego didáctico michi, 2 trepadores en círculos, 2 botones de acceso, 1 trepador zigzag de acceso, 1 tobogán canoa doble, 1 tobogán canoa ancha, 1 techo metálico curvo con protecciones laterales plásticas, 8 postes estructurales en caxeria iso de 3´ galvanizado, abrazaderas metálicas de aleación. Todos los componentes metálicos tienen un revestimiento de galvanizado por inmersión en caliente y son sometidos a un lavado con fosfato de fierro antes de aplicar la pintura de polvo poliéster electrostático TRICODUR bajo normas de flexibilidad ASTM D-522-60 y resistencia al impacto norma ASTM D-22794 que asegura una alta calidad y brinda máxima protección a la intempe Las Partes y piezas de plástico son elaboradas con polietileno de baja densidad, rotomoldeadas que hace que las partes sean higiénicas, de superficie lisa y con espesores apropiados para uso público, durables, resistentes al calor, a los rayos ultravioletas y con retardantes para la decoloración. Estos productos cumplen con todas las normas de seguridad

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S A S

6.7.1 COMPONENTE SOCIAL

El presente informe social corresponde a las actividades realizadas en la obra de construcción y dotación del parque recreo deportivo las tunas, en el distrito de Riohacha, dirigido por el contratista, donde se ejecutará la obra para el mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes brindando espacios de diversión, recreación y deporte para fortalecer la calidad visual, física y de salud mental de la comunidad residente y visitante.

6.7.1.1 ATENCIÓN A QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DE LA COMUNIDAD

Durante las actividades con los moradores beneficiarios de la obra civil de la construcción del parque se dio en tiempos intercalados la participación y atención a la comunidad prestándoles interés en escuchar y atender de manera proactiva las quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones presentada por ellos, es importante llevar un proceso interactivo de diálogos frecuentes para asegurar una adecuada gestión y construcción de propuestas y soluciones, efectivas y oportunas para la satisfacción de los moradores.

6.7.2 ASPECTO SISO AMBIENTAL

Durante el presente mes continuaron realizaron las charlas de seguridad al personal con el fin de informar y sensibilizar a los trabajadores sobre peligros y situaciones que puedan afectar su salud y seguridad en la ejecución de sus tareas, y de esta forma ir creando una cultura de prevención de riesgo, así como un compromiso con la seguridad y salud en el trabajo.
Por otra parte, el contratista realizó inspección de cada una de las actividades críticas que generan algún peligro ya sea por fallas humanas o técnicas, que pueden causar un accidente al personal interno como externo a la obra.

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

El contratista durante el presente mes ha desarrollado las actividades de carácter de Seguridad y Salud en el trabajo, donde se ha brindado charlas al personal en obra.



De igual manera, ha realizado la entrega de elementos de protección al personal en obra tales como cascos, mascarillas, guantes y botas; elementos necesarios para la protección de cada trabajador y el desarrollo de sus actividades protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad y salud en el trabajo.

Así mismo, para garantizar la salud de los trabajadores, el contratista constantemente mantiene hidratado al personal a través de la instalación de puntos fríos, como también realiza pausas activas de acuerdo a recomendaciones en el área de la salud ocupacional.



GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

6.7.3 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PMA)

El plan de manejo ambiental (PMA), fue diseñado por el contratista de acuerdo con los lineamientos contenidos de la legislación Ambiental vigente y desarrolla las medidas tendientes a prevenir, mitigar, controlar, proteger, vigilar y/o compensar los posibles impactos que se deriven de las obras de construcción del proyecto "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO DEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA".


Cada una de las actividades de obra civil y arquitectónica del proyecto, generan un impacto positivo o negativo al ambiente y/o a la comunidad del sector; por tal razón se busca, con la implementación del PMA, crear una estrategia de desarrollo sostenible, que permita la ejecución del proyecto sin perjudicar o deteriorar el ambiente y/o la comunidad.

El presente Plan de Manejo Ambiental (PMA), implementado en el proyecto está enfocado principalmente a la identificación de los impactos ambientales y sociales que podrían ocasionarse durante la ejecución de las actividades constructivas; una vez identificados los posibles impactos, se hace necesario formular las medidas ambientales que pretendan al corto, mediano y largo plazo la mitigación, compensación y retribución de los componentes y elementos ambientales afectados con la ejecución del proyecto. Finalmente, para que cumpla con los objetivos propuestos, se realiza un seguimiento que garantizará en la medida de su accionar el cumplimiento de las acciones ambientales propuestas.

6.7.3.1 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Los materiales de construcción utilizados en obra (triturado, arena, subbase granular, material de relleno, cemento, aceros, etc.) se encuentran acopiados y apilados por separados para su respectivo uso en obra. El concreto para la construcción del pavimento es realizado con mezcladora elaborado en sitio.



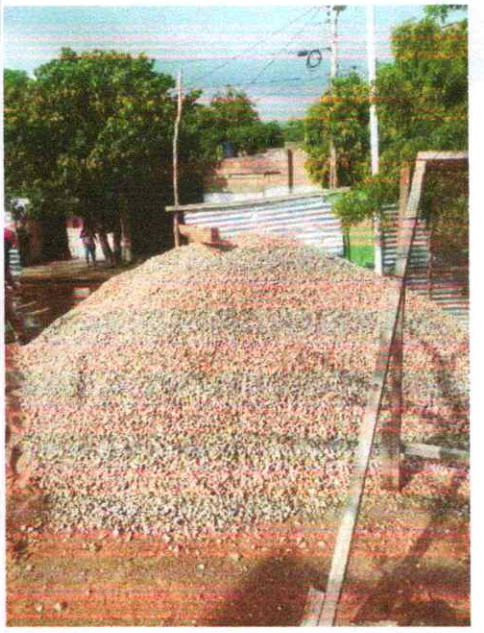



6.7.3.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Se realizó separación de los residuos sólidos (punto ecológico) originados en obra. Se utilizó 3 canecas: blanca, negra y verde debidamente rotuladas y con sus correspondientes bolsas de colores. Estos residuos sólidos son recolectados y almacenados en el centro de acopio del contratista (campamento) para luego realizar su respectiva disposición final por la empresa de Aseo.

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S A S

Después de realizar estas actividades se pudo evidenciar que la mayor producción de residuos es generada por los elementos de protección personal (EPP), bolsas plásticas consumo de agua (punto de hidratación), cinta de peligro (señalización) y bolsas de cemento (elaboración del concreto).









GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

6.8 ESTADO FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

RESUMEN ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 015 DE 2023				
Inversión Total	**Inversión Ejecutada**	**Porcentaje Ejecutado**	**Inversión Por Ejecutar**	**Porcentaje faltante por ejecutar**
$ 4,551,179,765.00	$ 4,551,179,765.00	100%	$ 0,00	0%

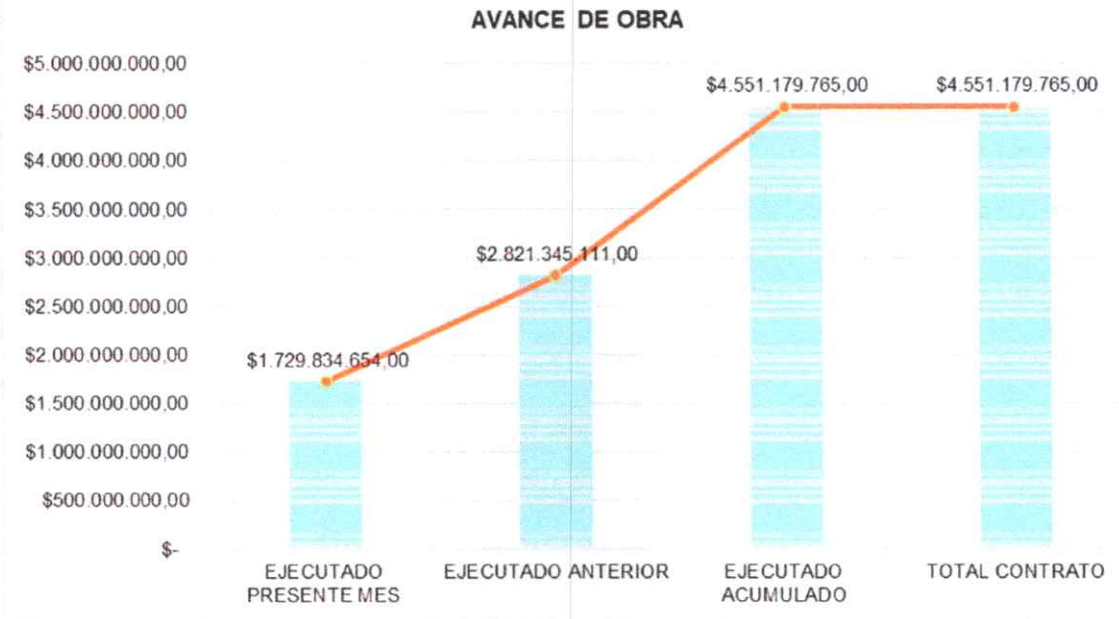

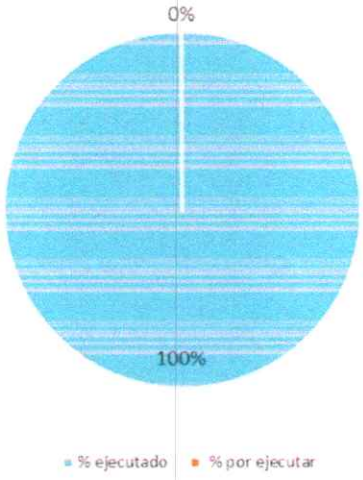


GESTIÓN CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S

6.9 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

La tabla y gráfica de programación que se presenta a continuación, corresponde a la programación ajustada de acuerdo a la prórroga en tiempo No.003 del proyecto presentada por el contratista de obra, en el que se tiene en cuenta el avance de obra que se consiguió en el presente mes.

PERIODO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INVERSION FINACIERA PROGRAMADA MENSUAL	$ -	$ 54.103.184	$ 86.112.287	$ 342.801.094	$ 882.337.364	$ 189.819.271	$ 538.369.491	$ 78.114.884	$ 604.786.914	$ 1.183.156.850	$ 591.578.425
% DE AVANCE ESPERADO MENSUAL	0,00%	1,19%	1,89%	7,53%	19,39%	4,17%	11,83%	1,72%	13,29%	26,00%	13,00%
% DE AVANCE ESPERADO ACUMULADO	0,00%	1,19%	3,08%	10,61%	30,00%	34,17%	46,00%	47,72%	61,00%	87,00%	100,00%
INVERSION FINACIERA EJECUTADA MENSUAL	$ 0,00	$ 54.103.184	$ 86.112.287	$ 342.801.094	$ 882.337.364	$ 189.819.271	$ 538.369.491	$ 78.114.884,00	$ 604.786.914,00	$ 44.900.622,00	$1.729.834.654
% DE AVANCE REAL MENSUAL	0,00%	1,19%	1,89%	7,53%	19,39%	4,17%	11,83%	1,72%	13,29%	0,99%	38,01%
% DE AVANCE REAL ACUMULADO	0,00%	1,19%	3,08%	10,61%	30,00%	34,17%	46,00%	47,72%	61,00%	61,99%	100%

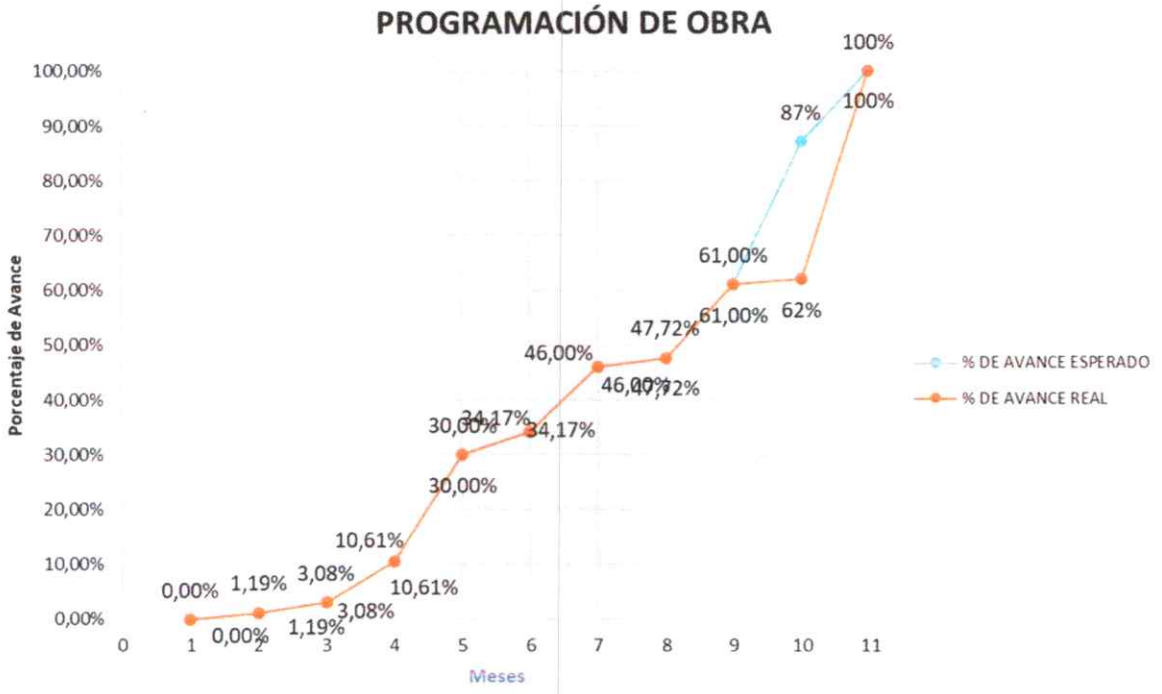

Como se puede evidenciar, en el presente mes el contratista ejecutó las actividades programadas para este periodo, alcanzando un avance en obra de 100%.

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

7 CONCEPTO ESTRUCTURAL Y RECOMENDACIONES

Dando cumplimiento al contrato de interventoría No. 364 de 2023 a continuación se enuncian algunas recomendaciones y puntos de control para lograr una construcción eficiente y sostenible en el tiempo basada en criterios técnicos y viabilidad económica ya propuestos en el proyecto de la construcción y dotación de parque recreo deportivo las tunas, ubicado en el distrito de Riohacha.

El proyecto concierne a unas construcciones que cobijan franjas de juegos y obras de construcción de dos canchas multifuncionales, las zonas verdes, los senderos peatonales, obras destinadas para actividades recreativas, deportivas y culturales, por lo que se deben considerar todas las fuerzas vivas además de los pesos de las estructuras (cargas estáticas).

- El estudio y el área nos definen el tipo de cimiento. La zona en estudio contiene suelos conformados por arcillas de mediana plasticidad. Teniendo en cuenta las características de las estructuras y de las propiedades de los suelos para fundación hallados, en ningún caso la profundidad de cimentación para estas obras será menor a 0.70 m, con el objeto de proporcionar a las estructuras un confinamiento adecuado y por tratarse de una arcilla el estrato correspondiente.

- Todos los materiales deben ser completamente nuevos y cumplir con los estándares de buena calidad.

- Las especificaciones de los materiales deben ser:
  CONCRETO: f'c=24.5 MPa
  CONCRETO: f'c=17,5 MPa Solado
  ACERO DE REFUERZO: Fy= 420 MPa

- el contratista mantendrá secas las excavaciones y construirá las obras provisionales necesarias para mantener las áreas de trabajo libres de agua.

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

Consideramos conveniente para el proceso de construcción seguir los siguientes pasos:

- Nivelar el terreno y retirar los materiales perjudiciales (plásticos, vegetales y otros elementos orgánicos)
- Ejecutar las excavaciones para las vigas y/o zapatas, pedestales y amarres.
- Fundir los elementos de cimentación.
- Aplicar un relleno adecuado compactándolo suficientemente con la máxima densidad y humedad óptima (ensayo Proctor de laboratorio).
- Excavar para tuberías de servicios y construir las vigas inferiores entrelazando los elementos a nivel de terreno.
- Levantar las otras obras verticales.
- Seguir con rellenos hasta la cota de diseño de la superficie terminada.
- Continuar con los trabajos de levantamiento y las demás actividades.

ARMANDO JOSÉ RIVERO GALVIS
Ingeniero Civil – MSc
Ingeniero civil – Especialista.

8 CONCLUSIÓN

El avance de la obra en el presente periodo alcanzo el 100% cuyo valor ejecutado es de $ 4,551,179,765.00, Durante este periodo se dio finalización a las actividades constructivas que restaban de las actividades contempladas en el contrato de obra.

En este periodo se continuó realizando las labores dentro del plan social realizando socializaciones con la comunidad donde se realizarán las intervenciones, indicando las tareas que se desarrollarán y el tiempo que tomarán hacerlas, manteniendo un buen dialogo con la comunidad y así disminuyendo las afectaciones sociales que este proyecto implica.

Por otra parte, la interventoría y el contratista realizaron la medición final de las actividades ejecutadas, por lo cual fue presentado a la secretaria de Infraestructuras y Servicios Públicos Distrital la respectiva Acta Final del Contrato de Obra al haberse finalizado el proceso de construcción del parque, con el fin de dar inicio a la fase de liquidación de ambos contratos.

En relación a la meta estipulada del proyecto, se tiene que el indicador del mismo es Parque recreo-deportivo construido y dotado medido a través de Número de parques recreo-deportivos con un alcance de 1.0, por lo cual se concluye que los contratos de obra y contrato de interventoría han cumplido a cabalidad con la meta establecida.

Las actividades ejecutadas fueron supervisadas por la interventoría, la cual estuvo atenta a que se cumplieran las especificaciones técnicas, las metas y alcances planteadas para el proyecto.

GESTIÓN
CONSULTORES
E INTERVENTORES S.A.S

Las actividades ejecutadas fueron supervisadas por la interventoría, la cual estuvo atento a que se cumplieran las metas y alcances planteados para el proyecto.

LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO
Representante Legal
Gestión Consultores e Interventores S.A.S
Elaboro: Ana Suescun Moreno, Ingeniera Civil
MP. 101037-0619830GJA000
