CTO 177-2023

FRENTE CHINAS

31-oct-2023

- Se realiza firma de acta de inicio.

01-NOV-2023

- Inicia trabajo de oficina.

02-NOV-2023

Se realiza trabajo de oficina, verificación y revisión de planos y cantidades de obra

03-Nov-2023

Se realiza trabajo de oficina, verificación y revisión de planos y cantidades de obra.

04-Noviembre-2023

No se presentan actividades

05-Noviembre-2023

No se presentan actividades

06-Noviembre-2023

No se presentan actividades

07-Noviembre de 2023

Se realiza trabajo de oficina, verificación y revisión de planos y cantidades de obra

08-Noviembre-2023

Se realiza trabajo de oficina, verificación y revisión de planos y cantidades de obra

09-Noviembre-2023

Se realiza trabajo de oficina, verificación y revisión de planos y cantidades de obra

10 - Noviembre - 2023

Se realiza trabajo de oficina, verificación y revisión de planos y cantidades de obra

11 - Noviembre - 2023

No se presentan actividades

12 - Noviembre - 2023

No se presentan actividades

13 - Noviembre - 2023

Se realiza trabajo de oficina, verificación y revisión de planos y cantidades de obra.

14 - Noviembre - 2023

Se realiza trabajo de oficina, verificación y revisión de planos y cantidades de obra

15 - Noviembre - 2023

Se realiza trabajo de oficina, verificación y revisión de planos y cantidades de obra.

16 - Noviembre - 2023

Se realiza trabajo de oficina, verificación y revisión de planos y cantidades de obra.

17 - Noviembre - 2023

Se realiza trabajo de oficina, verificación y revisión de planos y cantidades de obra

18 - Noviembre - 2023

No se realizan actividades

19- Noviembre - 2023

No se presentan actividades.

20 - Noviembre - 2023

Inicia la logistica para realizar el recorrido de obra en compañía de la corporación Nasa Kiwe

21 - Noviembre - 2023

Logistica para realizar el recorrido de obra en compañía de la corporación Nasa Kiwe.

22 - Noviembre - 2023

Logistica para realizar el recorrido de obra en compañía de la Corporación Nasa - Kiwe

23 - Noviembre - 2023

Logistica para realizar el recorrido de obra en compañía de la corporación Nasa Kiwe

24 - Noviembre - 2023

Logistica para realizar el recorrido de obra en compañía de la corporación Nasa Kiwe.

25 - Noviembre - 2023.

No se presentan actividades.

26 - Noviembre - 2023

No se presentan actividades

27- Noviembre - 2023.

Logistica para realizar el recorrido de obra en compañía de la corporación Nasa Kiwe.

28 - Noviembre - 2023

Logistica para realizar el recorrido de obra en compañia de la corporación Nasa Kwe

29 - Noviembre - 2023

- Se realiza visita al sitio de trabajo en compañia de la Corporación Nasa-Kwe Ing Maria Camila Guerrero, Inspector Marco Samir$ residente y contratista - residente de obra, se realiza la medición de la longitud de la placa huella, se revisa el espacio, se presenta un dialogo con la comunidad presente en cual coordinan espacio de almacenamientos, pero debido a que el gobernador no se encuentra no es posible coordinar la actividad.

30 - Noviembre - 2023

Se realiza trabajo de oficina, verificación y revisión de planos.

01 - Diciembre - 2023

Se realiza trabajo de oficina, verificación y revisión de planos.

02 - Diciembre - 2023

No se realizan actividades

03 - Diciembre - 2023

No se presentan actividades

04 - Diciembre - 2023

Se realiza la logistica para los materiales, cemento, acero, madera entre otros

05 de Diciembre de 2023

Se realiza logistica para materiales, cemento, acero, madera entre otros

06.- Diciembre - 2023

Se realiza logistica para materiales, cemento, acero, madera entre otros

07 - Diciembre - 2023

Se realiza logistica para materiales, cemento, acero, madera entre otros

08 - Diciembre - 2023

No se presentan actividades

09 - Diciembre - 2023

No se presentan actividades

10 - Diciembre - 2023

No se presentan actividades

11 - Diciembre - 2023

Inicia la recolecta y el carque del material y la herramienta De acuerdo con la comunidad, nos indica que se puede utilizar como bodega de almacenamiento la casa del cabildo.

12 - Diciembre - 2023

Continua la recolecta y el carque del material y la herramienta

13 - Diciembre - 2023

Continua la recolecta y el carque del material y el equipo.

14 - Diciembre - 2023

Personal: Maestro, ayudante y

Condiciones climaticas: dia soleado

Actividades.

Se realiza el desplazamiento al punto de trabajo al llegar con los materiales de obra para dar inicio con las actividades de campo, la comunidad nos indica que no nos permitira realizar la construcción de la placa huella en el punto donde nos indico la Corporacion Nasa-Kiwe, ellos nos indican que habian decido en una reunión anterior que la construcción de la placa huella seria en la continuidad de la placa huella de la via principal, por lo tanto no nos permiten realizar la construcción, debido a lo anterior se realiza la comunicación a la corporación Nasa-Kiwe para resolver el tema.

15-Dic-2023

La Corporación Nasa-Kiwe daria conversaciones con la comunidad de Chinas para llegar a acuerdos acerca del sitio de construcción de la placa huella, ya que el sitio que se tenia inicialmente no fue autorizado

16-Dic-2023

No se presentan actividades de obra.

17-Dic-2024

No se presentan actividades de obra.

18-Dic-2024

La Corportación Nasa-Kiwe continua en conversaciones con la comunidad

Para tener un nuevo lugar para la construcción de la placa huella.

19 - Dic - 2024

Continuan conversaciones entre la corporación y la comunidad para llegar a un acuerdo para el nuevo sitio de construcción

20 - Dic - 2024.

Continuan conversación entre la Corporación y la comunidad para nueva ubicación del sitio de construcción de la placa huella.

21 - Dic - 2024

Continua conversación entre la corporación y la comunidad para nueva ubicación del sitio de construcción de la placa huella.

22 - Dic - 2024.

Continua conversaciones entre la corporación y la comunidad para la nueva ubicación del sitio de construcción de la placa huellas.

23 - Dic - 2024

No se presentan actividades de obra

24 - Dic - 2024

No se presentan actividades de obra.

No se presentan actividades	25- Dic - 2023. de obra
Continuan conversaciones corporación y la comunidad. Ubicación del sitio a placa huella.	26- Dic 2023 entre la para nueva construir. dela
Continuan conversaciones y la comunidad para nueva a construir dela placa	27 - Dic - 2023 en la Corporación Ubicación del sitio huella.
Continuan conversacion- entre la comunidad para la nueva del sitio se construir la placa	28 - Dic - 2023 corporación ubicación huella
Debido a las festividades se realizo la suspencion de obras desde el 29 de hasta el 09 de enero de 2024.	29- Dic - 2023 de fin de año, de actividades diembe 2024
- Continuan las conversaciones corporación y la el nuevo sitio de placa huella, debido a que se estan debatiendo dos sitios.	09 - Enero - 2024 entre la comunidad para definir construcción de la

Continuan conversaciones acerca del sitio de construcción, la comunidad indica que el sitio de desarrollo de la placa huella sera la via principal, debido a esta decisión, se debe tener presente que no es posible iniciar con la construcción de la misma hasta que se haya terminado o este en la fase final la placa huella de SUIN, ya que para abastecer la placa huella de suin, se obligatorio tratar por el nuevo sitio ubicado para la construcción, además de ser la unica via de acceso.

10 - Enero - 2024

Durante el mes de enero hasta el 09 de febrero no se presentan actividades de obra, debido a que continua la ejecución de la placa huella de suin, además de tener un fuerte oleado invernal que dificulta el acceso de material a la zona, debido al mal estado de la unica via de acceso.

09 de febrero - 2024

El dia 09 de febrero de 2024 se realiza una reunión con los lideres de la comunidad - comunidad y el contratista de obra para informales del inicio de actividades y para solicitales ~~autorizar~~ informales a las comunidades ubicadas en la parte superior de la via del cierre temporal de via, asi como a las personas que se encuentran desarrollando construcción

Para q.e puedan realizar el abastecimiento de material antes del cierre de lluvia, se levanta esta acta de comite.

10 - Febrero - 2024.


Personal: Levantó.
Condiciones climaticas: Dia soleado
Actividades
Inicia abastecimiento de material de río.
1 viaje de arena y triturado.

11 - Febrero - 2024.

No se realizan actividades de obra.

12 - Febrero - 2024

Personal: 1 maestro, y 5 ayudantes
condiciones climaticas: Mañana soleada - tarde de lluvia
Actividades
Inicio descapote de terreno, presentandose un terreno rocoso.

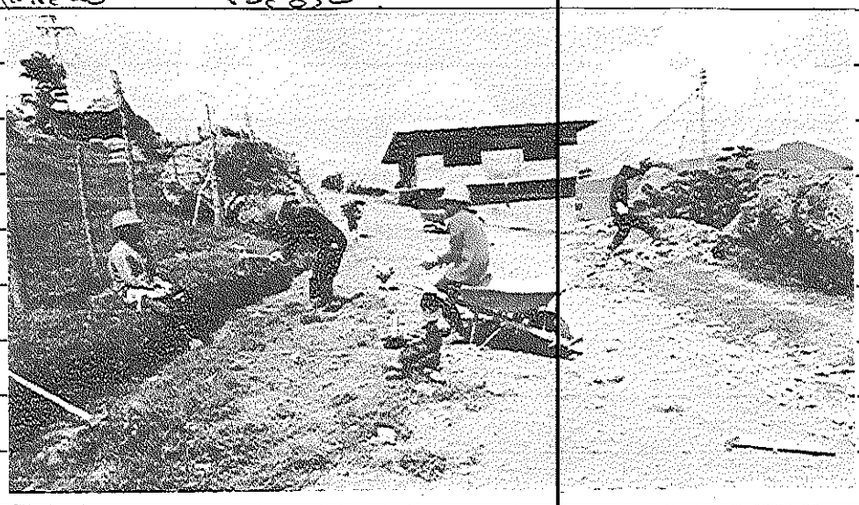

13 - Febrero - 2024.

Personal: 1 maestro y 5 ayudantes.
Condiciones climaticas. Dia lluvioso
Continuan actividades de descapote de terreno. y Viaje de arena.

14 de Febrero. 2024.

Personal: 1 maestro, y 3 ayudantes

Actividades


Continua conformación de la banca e inicia instalación de Formaleta para concreto ciclopeo centro y lado derecho e izquierdo, llega material de río.

15 de Febrero 2024

Personal: 1 maestro, y 11 ayudantes.

Actividades - ~~K maestro y 8 ayudantes~~

Continua instalación de formaleta y riego de piedra para 6 placas de concreto ciclopeo lado izquierdo y fundición del mismo. y entrega de EPP

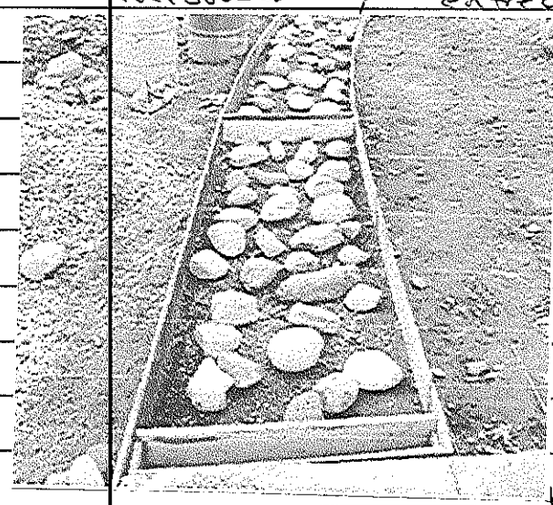

16 de Febrero 2024

Personal: 1 maestro y 4 ayudante.

Condiciones climaticas: Dia lluvioso.

Actividades.

Continua riego de piedra en formaleta lado derecho y fundición del concreto ciclopeo del mismo y continua pleje de acero.

17 de Febrero 2024

Personal: 1 maestro y 4 ayudantes


Condiciones climaticas : Dia de lluvias fuertes.
Actividades
Retiro de formaleta y continua flujo de acero, las fuertes lluvias no permiten continuar con las labores.

18 - Febrero - 2024

No se presentan actividades de obra.

19 - Febrero - 2024

Personal : 1 maestro y 4 ayudantes.
Condiciones climaticas : Mañana soleada - tarde de lluvia fuerte
Actividades.
Continua riego de Piedra en formaleta de concreto ciclopeo central, fundición del mismo, inicia excavación para riostras y fundición de solados.

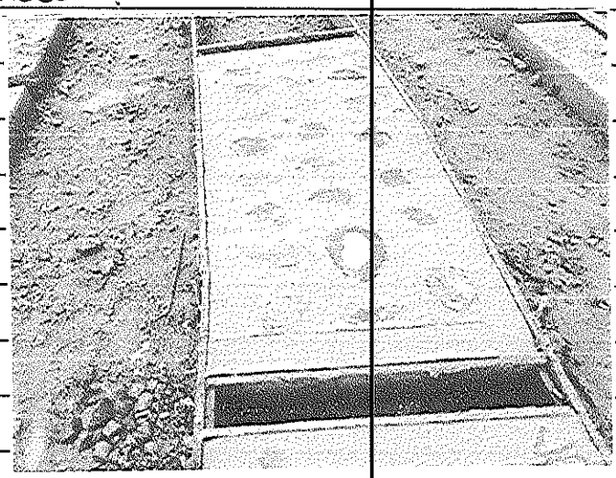

20 - Febrero - 2024

Personal : 1 maestro y 4 ayudantes.
Condiciones climaticas : Dia lluvias leves y fuerte
Actividades.
instalación de acero transversal y longitudinal, fundición de solados de riostras, instalación de aceros de las mismas, inicia fundición de huellas y riostras.

21 febrero 2024.

Personal: 1 maestro y 4 ayudantes

Condiciones climaticas: Mañana Soleada - tarde lluvia ligera

Actividades

Llega material de rio y cemento, continua instalación de Formaleta para concreto ciclopeo izquierda - derecha - y centro, de placas, se realiza riego de piedra a las mismas, excavación de riostras y continua flete de acero,


Hernán Bermúdez
Insp. CHK 22 Febrero 2024.

Personal: 1 maestro y 4 ayudantes.

Condiciones climaticas: Dia lluvia leve.

Actividades

Se realiza Fundición de concreto ciclopeo de placas derecha, izquierda y central, Fundición de solado para huellas, el inspector realiza verificación de actividades de Obra

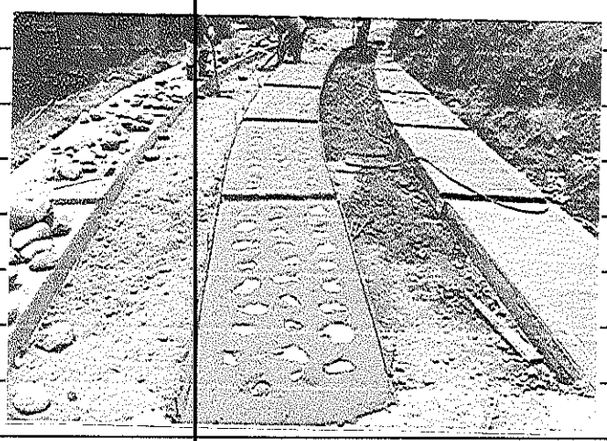

23 - Febrero - 2024

Personal: 1 maestro y 4 ayudantes

Condiciones climaticas: Dia lluvia leve.

Actividades.

Inicia instalación de acero longitudinal, transversal y demas refuerzos, para riostra y excavación de riostras e instalación de acero y fundición de solado de la misma

24 - Febrero - 2024.

Personal: 1 maestro, y 5 ayudante.
Condiciones climaticas: Dia lluvia fuerte.
Actividades.
Continua fleje de acero. y retiro de formaleta de concreto circuleo lateral., las fuerte lluvias no permiten realizar la fundición.

25 - Febrero - 2024.

No se presentan actividades de obra.

26 - Febrero - 2024.

Personal: 1 maestro y 4 ayudante.
Condiciones climaticas: Mañana soleada - tarde lluvia fuerte.
Actividades.
Se realiza fundición de huella de concreto reforzado lado derecho, continua fleje de acero.

27 - Febrero - 2024

Personal: 1 maestro y 4 ayudante.
Condiciones climaticas: Mona soleada - tarde de lluvia fuerte.
Actividades.
Se realiza fundición de huella de de concreto. reforzado lado izquierdo, continua fleje de acero, las fuerte lluvia dificultan el desarrollo de las actividades y el acceso ala zona.


28 - Febrero - 2024

Personal: 1 maestro y 4 ayudantes

Condiciones climaticas: Dia lluvia fuerte.

Actividades.

Fundición de dos huellas de concreto reforzado faltantes del tramo anterior., ajuste de banca y compactación para continuar con instalación de formaleta.

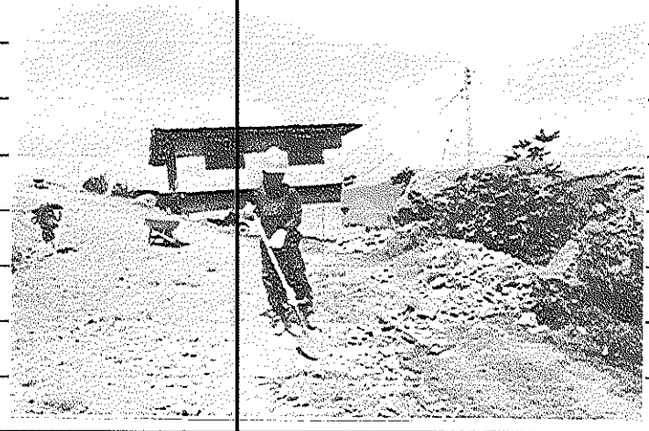


29 - Febrero - 2024

Personal: 1 maestro y 4 ayudantes

Condiciones climaticas: Dia lluvioso.


Actividades.

Continua ajuste de banca - conformación, e inicio de instalación de formale para concreto ciclopeo lado izquierdo, llegan a una longitu. de 67.76 m.

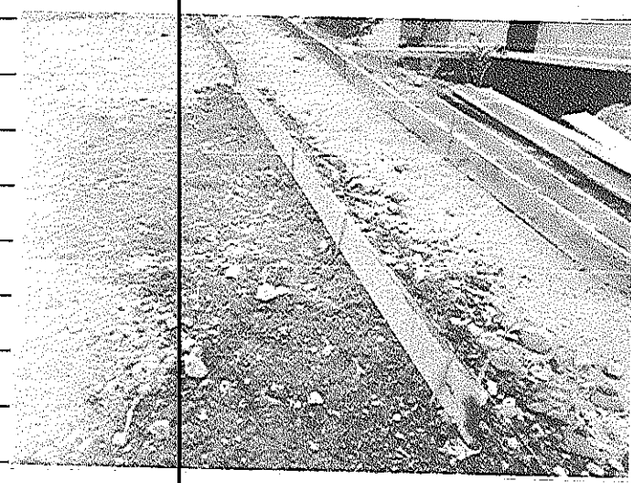

01 - marzo - 2024

Personal: 1 maestro y 11 ayudantes.
Condiciones climaticas: Dia lluvias fuerte.
Actividades.
Se realiza riego de piedra para formaleta lado izquierdo, se realiza salida de agua y se funde.

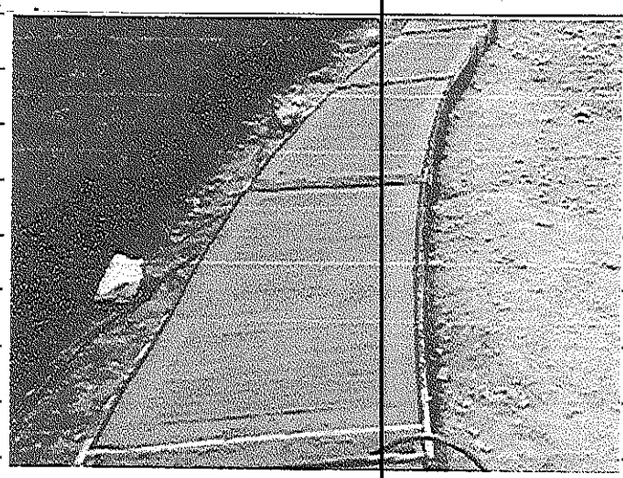

02 - marzo - 2024


No se presentan actividades de obra

03 - marzo - 2024.

Personal: presentan actividades de obra.

04 - marzo - 2024

Personal: 1 maestro y 4 ayudantes.
Condiciones climaticas: Dia lluvias
Actividades.
Instalación de formaleta de concreto fundido, Inicia Fundición de viaductos de losas fundidas anteriormente, inicia instalación de formaleta para ciclopeo doblado e izquierdo. y riego de piedra

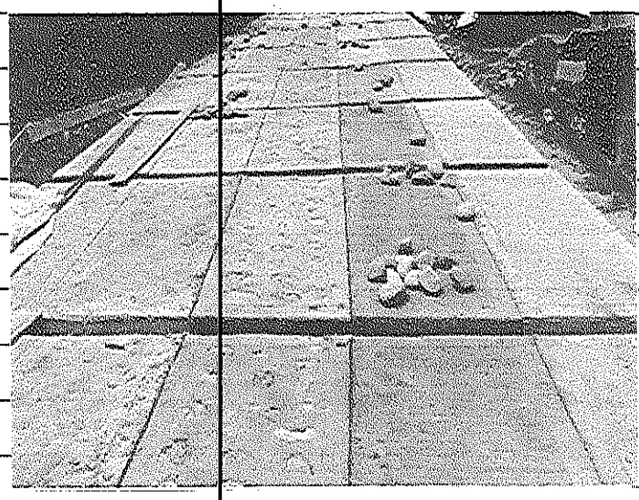

05-marzo-2024

Personal: 1 maestro y 4 ayudantes

Condiciones climaticas: Dia lluvias fuertes.

Actividades.

Se realiza fundición de concreto ciclopeo lado derecho, continua eleje y amarre de acero para riostras., las fuertes lluvias dificultan las actividades de obra., el inspector Harol Samia realiza visita de verificación de actividades de obra.



Harold Ramírez
Insp. ehh

06-marzo-2024

Personal: 1 maestro y 4 ayudantes.

Condiciones climaticas: Dia lluvia leve.

Actividades.

Continua instalación de formaleta para concreto ciclopeo contral., inicia

riego de piedra para el mismo, continua amarre y fleje de acero.

07-marzo-2024

Personal: 1 maestro y 1 maestro.
Condiciones climaticas: Mañana soleado - tarde lluvia.
Actividades.
Fundición de concreto ciclopeo central, Fundición de solado para huellas de concreto, El inspector Harol Samra verifica actividades anteriores

08-marzo-2024

Personal: 1 maestro y 4 ayudantes
Condiciones climaticas: Dia lluvias Fuertes.
Actividades.
Retiro de formaleta, inicia instalación de acero longitudinal y transversal., inicia excavación de vigas tes., fundición de solado de vigas tes

09-marzo-2024

Personal: 1 maestro y 4 ayudante.
Condiciones climaticas: Dia lluvias
Actividades.
Inicia Fundición de huellas de concreto reforzado, continua fleje de acero.


10-marzo-2024

No se presentan actividades de obra.

11-marzo-2024

Personal: 1 maestro y 4 ayudantes.
Condiciones climaticas: Dia lluvias fuertes.
Actividades.

Continua Fundición de concreto reforzado, continua Fleje de acero para Sardinel, continua excavación de riostras y solado de las mismas.

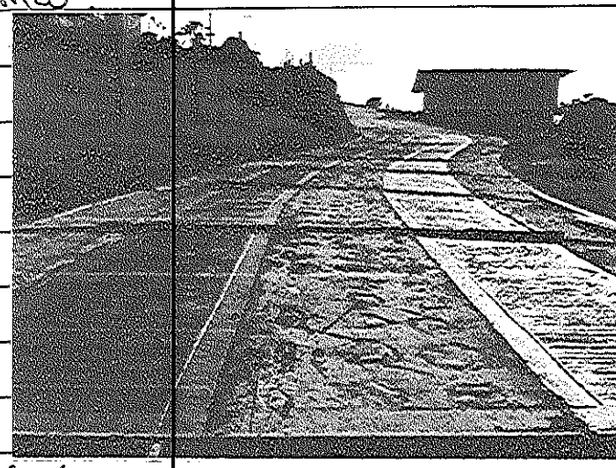

12-marzo-2024.

Personal: 1 maestro y 4 ayudantes.
Condiciones climaticas: Dia lluvias leve.
Actividades.
Continua instalación de acero de riostras, y inicia Fundición de riostras, continua conformación de banca.

13-marzo-2024.

Personal: 1 maestro y 4 ayudantes.
Condición climaticas: Dia lluvias fuertes.
Actividades.
Continua Fundición de riostras inicia excavación de sardinel lado derecho e izquierdo las fuertes lluvias dificultan el desarrollo de las actividades.


14-marzo-2024.

Personal: 1 maestro y 4 ayudantes
Condiciones climaticas: Dia lluvias
Actividades

Continua actividades de excavación de Sardinel lado derecho e izquierdo, continua conformación de banca del ultimo tramo de placa.

15-marzo-2024

Personal: 1 maestro y 4 ayudantes.
Condiciones climaticas: Dia lluvias Fuertes.
Actividades.
Inicia Fundición de solado para Sardinel derecho e izquierdo, continua fleje de acero y continua conformación de banca del ultimo tramo.

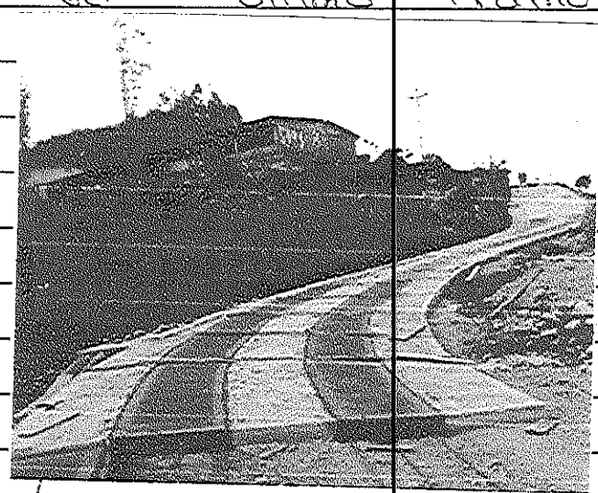

16marzo-2024

Personal: 1 maestro y 2 ayudante.
Condiciones climaticas: Dia lluvias Fuerte
Actividades.
Continua fleje y amarre de acero para Sardinel.

17-marzo-2024

No se presentan actividades de obra

18 - marzo - 2024.

Debido a las fuertes lluvias que se vienen presentando en la zona y las dificultades que estas misma traen para el desarrollo de las actividades, sumado a las constantes fallas mecánicas que ha presentado la planta de trituro que retrasa la llegada del triturado, las crecidas de rio Paez, fuente principal de abastecimiento de material, que no permiten el cargue de arena, y la dificultad que presenta la via al tornarse poco estable para el transito de carros de cargue pesado, el contratista solicita la suspención de las actividades de obra hasta tener una estabilidad y superar estas dificultades.

24 - abril - 2024.

Personal: 1 maestro y 4 ayudante.
Condiciones climaticas: Dia soleado
Actividades
Se retoman actividades de obra, se realiza conformación de banca de ultimo tramo, inicia instalacion de Formaleta para concreto ciclopeo lado derecho y cuneta y riego de piedra.

25 - abril - 2024

Personal: 1 maestro, 4 ayudantes.
Condiciones climaticas: Dia soleado
Actividades
Se realiza fundición de concreto ciclopeo lado derecho, continua riego de piedra concreto ciclopeo cuneta y fundición de


la mitad de el mismo, instalación de acero para sardinel derecho.

26-abril-2024

Personal: 1 maestro y 4 ayudantes.
Condiciones climaticas: Mañana soleado-tarde lluvia leve.
Actividades.
Continua fundición de concreto ciclopeo central, instalación de formaleta para concreto ciclopeo lado izquierdo, riego de piedra y fundición del mismo., retiro de formaleta de la fundición anterior.

27-abril-2024

Personal: 1 maestro y 4 ayudantes.
Condiciones climaticas: Dia soleado.
Actividades
Fundición de solado para huellas de concreto reforzado, excavación de rieles y sardinel., inicia instalación de acero longitudinal y transversal.

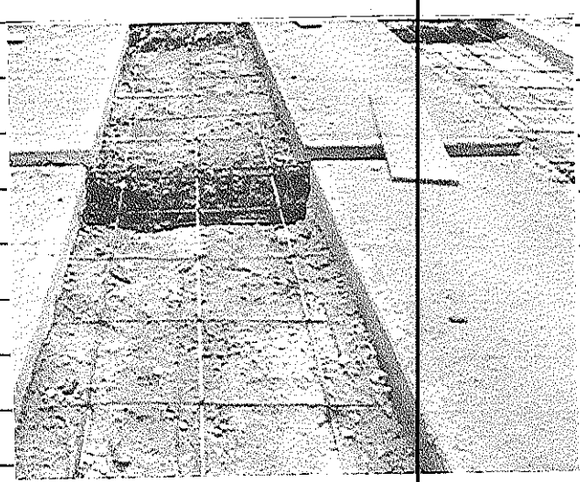

28 - abril - 2024


No se presentan actividades.

29 - abril - 2024

Personal: 1 maestro, y 4 ayudantes.
Condiciones climaticas: Dia soleado.
Actividades.
Continua instalación de acero longitudinal y transversal e inicia fundición de huella de concreto reforzado lado derecho tramo final, inida instalación de formaleta de sardinel.

30 - abril - 2024

Personal: 1 maestro y 4 ayudantes.
Condiciones climaticos: Dia soleado.
Actividades.
Continua instación de acero en ultimos riostras, Continua fundición de huellas de concreto reforzado lado izquierdo., inida fundición de sardinel derecho e instalación de formaleta sardinel izquierdo.

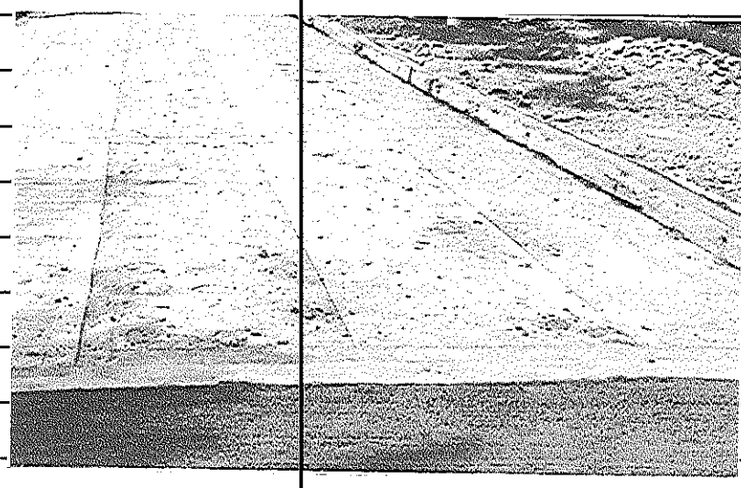

01-MAYO- 2024.

Personal: 1 maestro y 4 ayudantes

Condiciones climaticas: Dia soleado.

Actividades

Fundiciones de sardinel izquierdo, Fundición de riostras de tramo final, retiro de Formaleta sardinel derecho, inicia limpieza de obra.

02-MAYO- 2024.

Personal: 1 maestro y 4 ayudantes.

Condiciones climaticas: Dia soleado.

Actividades

Retiro de formaleta de Sardinel, Fundición de ramper para acceso, limpieza general de obra y finalización de la misma, se le recomienda a la comunidad tener bloqueada la vía por 28 dias que es el tiempo de curado especificado en la norma.

