28 - Febrero - 2024

Personal: 1 maestro, 1 oficial y 3 ayudantes.
Condiciones climatica: Dia lluvioso parte.
Actividades.
Continua nivelacion de terreno, excavacion de riostra e instalacion de piedra en el frente de placa de concreto ciclopeo - concreto + fundicion del mismo desde contacto, debido a filtraciones de aguas de lavado del colegio se solicita al rector de la institucion canalizar las aguas para que no afecten la estabilidad de la placa H.

29 - Febrero - 2024

Personal: 1 oficial y 3 ayudantes,
Condiciones climaticas: Dia lluvioso.
Actividades.
Continua excavacion para sardinel y riostra, corte y fleje de acero para riostras restantes, llega 1 viaje de triturado.

01 - marzo - 2024

Personal: 1 oficial y 2 ayudantes.
Condiciones climatica: Dia sol y lluvia leve
Actividades.
Continua corte y fleje de acero para riostra y sardinel, se realiza instalacion de formaleta para placa de ciclopeo lado derecho. y riego de nivel para dar misma placa.

02 - marzo - 2024

No se presentan actividades de obra.

03 - marzo - 2024

No se presentan actividades de obra.

04 - marzo - 2024

Personal: 1 oficial y 1 ayudante.

Condiciones climaticas: Dia soleado

Actividades:

Continua corte, fleje, armare de acero para rastras y sardinel, asi como corte y acero para huellas de concreto.


05 - marzo - 2024.

Personal: 1 oficial y 2 ayudantes.

Condiciones climaticas: Dia sol - lluvia

Actividades

Fundicion de placas de concreto ciclopeo lado derecho Km +00 + Km +067, continua alistado de Subrasante para placas de concreto ciclopeo lado izquierdo del mismo tramo.

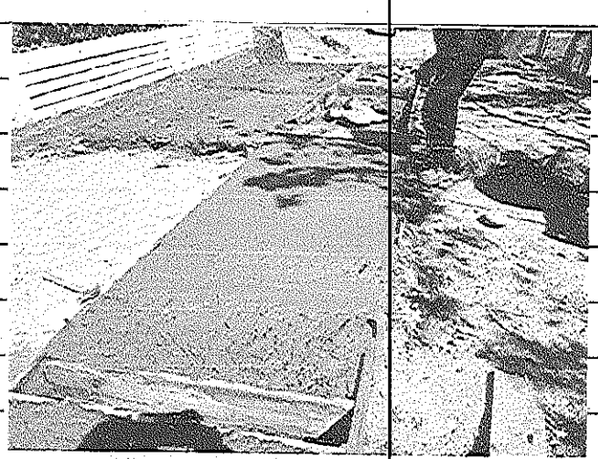


06 - marzo - 2024.


Personal: 1 oficial y 2 ayudantes.

Condiciones climaticas: Dia soleado

Actividades

Se realiza resane de piedra para placa de concreto ciclopeo lado izquierdo y fundición de la misma, continua corte y fleje de acero y amarre del mismo para el muro retro a Kotosa, El inspector Harol Sunia realiza verificación de las actividades nombradas anteriormente.

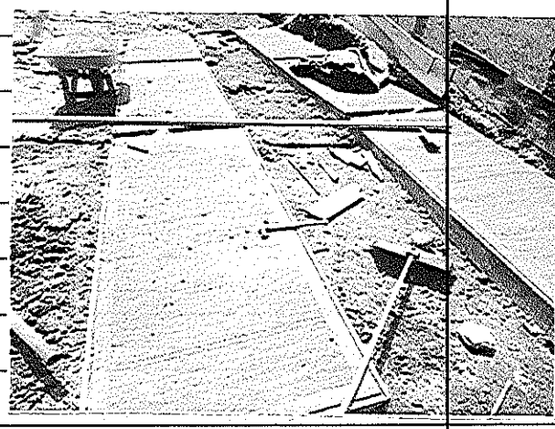

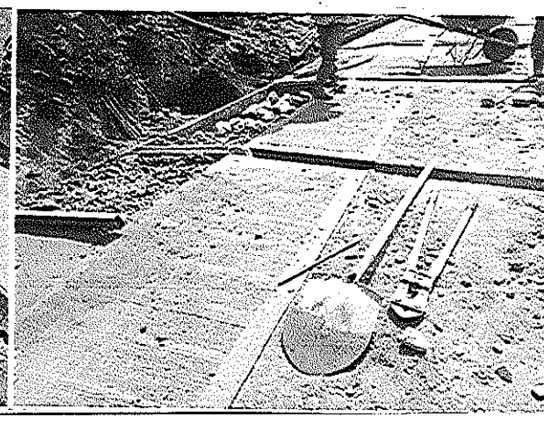



07-marzo-2023

Personal: 1 maestro, 1 oficial + 2 ayudante.
Condiciones climatica: Mañana soleada-tarde lluviosa
Actividades.
Continua excavacion para riostra y sardinel del tramo Kotosa a Kotosa, Fundicion de solado para los mismos.

Inspector Harold Barrios
Insp CMH 08-marzo-2023

Actividad: 1 maestro, 1 oficial y 2 ayudante.
Condiciones climaticas: Dia soleado.
Actividades
Instalacion de acero para riostra, amarre de acero para sardinel e instalacion del mismo, retiro de Formaleta de placa de concreto ciclopeo fundidas.

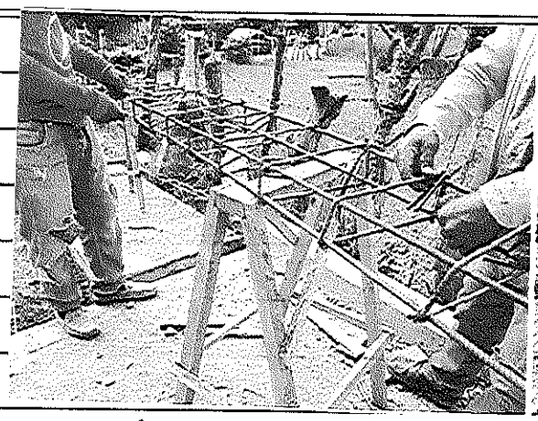

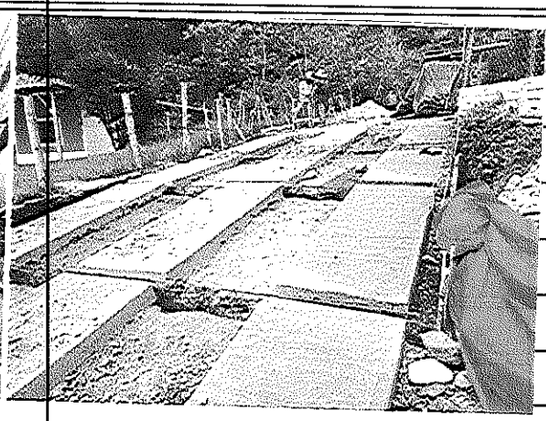

09-marzo-2024

Personal: 1 maestro, 1 oficial y 2 ayudante

Condiciones climaticas: Dia soleado

Actividades

Fundición de solado para huella de concreto reforzado e instalación de acero longitudinal y transversal para la misma desde km 0+050 a km 0+067

10-marzo-2024

Personal: 1 maestro,

No se presentan actividades de obra

11-marzo-2024

Personal: 1 maestro, 1 oficial y 2 ayudantes.

Condiciones climaticas: Dia ~~soleado~~ nuves

Actividades

Fundición de huellas de concreto reforzado, y rasantes en el tramo km 0+050 a km 0+067 + fundición de sardinel hasta km 0+060.


12-marzo-2024


Personal: 1 oficial y 2 ayudantes.

Condiciones climaticas: Dia lluvias todo el

Actividades.

Al finalizar el tramo se presenta un sobreancho fundiendo este en concreto ciclopeo y formando el punto de transición entre la placa nueva y la anterior, se realiza instalación de formaleta para sardinel derecho katorce a katorce y se funde, al igual que el restante de sardinel del lado izquierdo katorce a katorce.

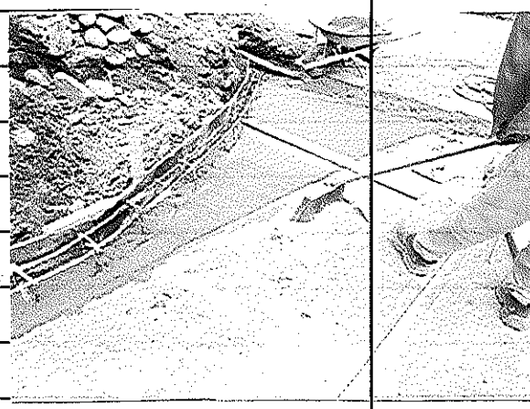

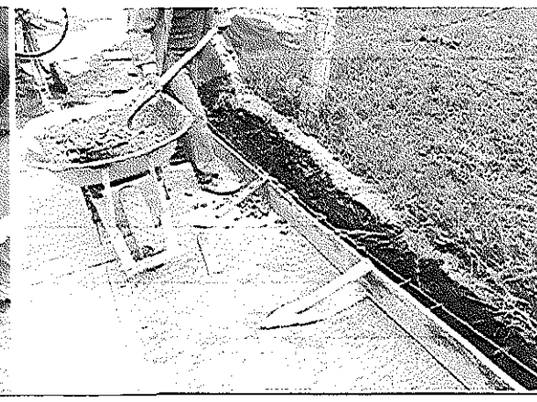

13 - marzo - 2024

Personal: 1 maestro, 1 oficial y 2a ayudante

Condiciones climaticas: Dia de lluvia leve.

Actividades:

Acarreo de material petreo y cemento, retiro de de formaleta de sardinal, instalación de acero para sardinal del derecho de la placa de 10m y fundición de solado para los mismos.

14-marzo-2024.


Personal: 1 maestro y 2 ayudante.


Condiciones climaticas: Dia lluvioso

Actividades.

Inicia instalación de formaleta para sardinal derecho e izquierdo del - abscisa de la via

Placa - principal, inicia limpieza de obra barriendo y recogiendo la basura - como, baldes de cemento y sobrantes de tabla.

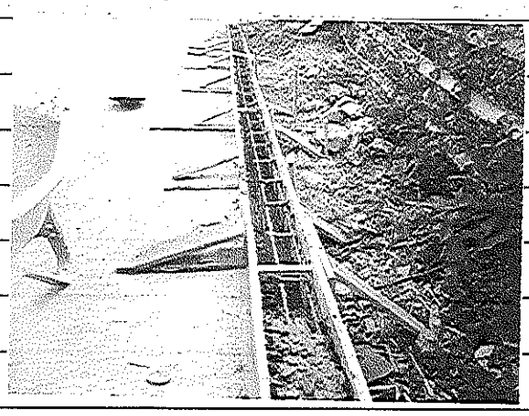

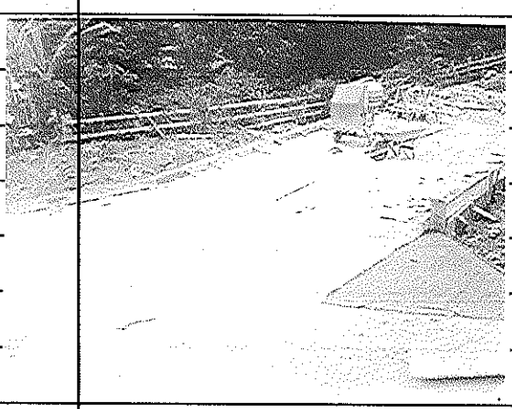

15-marzo-2024

Personal: 1 maestro, 1 oficial y 2 ayudantes

Condiciones climaticas: Dia Soleado.

Actividades

Fundición de sardinel lado derecho e izquierdo del dormitorio 1 con 1, toma de muestras 3 und., terminación de limpieza general de obra.





16 - marzo - 2024

Personal : 1 ayudante.

Condiciones climaticas : Dia lluvia leve.

Actividades.

Retiro de formale de sardinel y culminacion de obra, se recomienda al Rector de la institución permanecer el bloqueado la via durante 28 dias para alcanzar el curado del concreto.
