Nombre del proyecto:	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ."**
Localización del proyecto (municipio / departamento):	**CAJICA/ CUNDINAMARCA**
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	**CONSTRUCCIONES A&C SAS**
Numero del contrato:	**CI 002-2024**
Fecha del registro fotográfico:	**20-01-2025 AL 21-04-2025**

FOTOGRAFÍA (1)

Tamaño 10 X 14 u 8 X 12 para fotos de perspectiva; y tamaño 7.5 x10 u 6 X 8 para fotografías que muestren detalles.



Se realiza el armado del acero para la viga de amarre y muro de contención que confinara la estructura del anden costado sur sobre la vía San Antonio – Calahorra.

FOTOGRAFÍA (2)

Tamaño 10 X 14 u 8 X 12 para fotos de perspectiva; y tamaño 7.5 x10 u 6 X 8 para fotografías que muestren detalles.



Armado de acero para muro de contención.

FOTOGRAFÍA (3)

Tamaño 10 X 14 u 8 X 12 para fotos de perspectiva; y tamaño 7.5 x10 u 6 X 8 para fotografías que muestren detalles.



Se verifica la instalación de los sumideros laterales que formaran parte del sistema de recolección de aguas lluvias.

FOTOGRAFÍA (4)

Tamaño 10 X 14 u 8 X 12 para fotos de perspectiva; y tamaño 7.5 x10 u 6 X 8 para fotografías que muestren detalles.



Se ejecutan excavaciones para la instalación y/o construcción de pilotes en lo que se sostendrá viga de amarre y muro de contención, respectivamente.

FOTOGRAFÍA (5)

Tamaño 10 X 14 u 8 X 12 para fotos de perspectiva; y tamaño 7.5 x10 u 6 X 8 para fotografías que muestren detalles.



Se realizan excavaciones zanja abierta desde los puntos inicialmente que transportaran agua desde los sumideros hasta el humedal existente en tubería de PVC 12”.

FOTOGRAFÍA (6)

Tamaño 10 X 14 u 8 X 12 para fotos de perspectiva; y tamaño 7.5 x10 u 6 X 8 para fotografías que muestren detalles.



Se realizan actividades de excavación para la precisa instalación a nivel de los bordillos prefabricados los cuales confinaran la estructura del andén.

FOTOGRAFÍA (7)

Tamaño 10 X 14 u 8 X 12 para fotos de perspectiva; y tamaño 7.5 x10 u 6 X 8 para fotografías que muestren detalles.



Se realiza el vaciado de concreto sobre viga de amarre para darle rigidez al muro de contención.

FOTOGRAFÍA (8)

Tamaño 10 X 14 u 8 X 12 para fotos de perspectiva; y tamaño 7.5 x10 u 6 X 8 para fotografías que muestren detalles.



Se realiza actividades de vibraciones y/o golpeteo para la eliminación de aire atrapado en el concreto.

FOTOGRAFÍA (9)


Tamaño 10 X 14 u 8 X 12 para fotos de perspectiva; y tamaño 7.5 x10 u 6 X 8 para fotografías que muestren detalles.



Se terminan excavaciones para pilotes con un diámetro de 30cm y con altura de 2 m.

FOTOGRAFÍA (10)

Tamaño 10 X 14 u 8 X 12 para fotos de perspectiva; y tamaño 7.5 x10 u 6 X 8 para fotografías que muestren detalles.

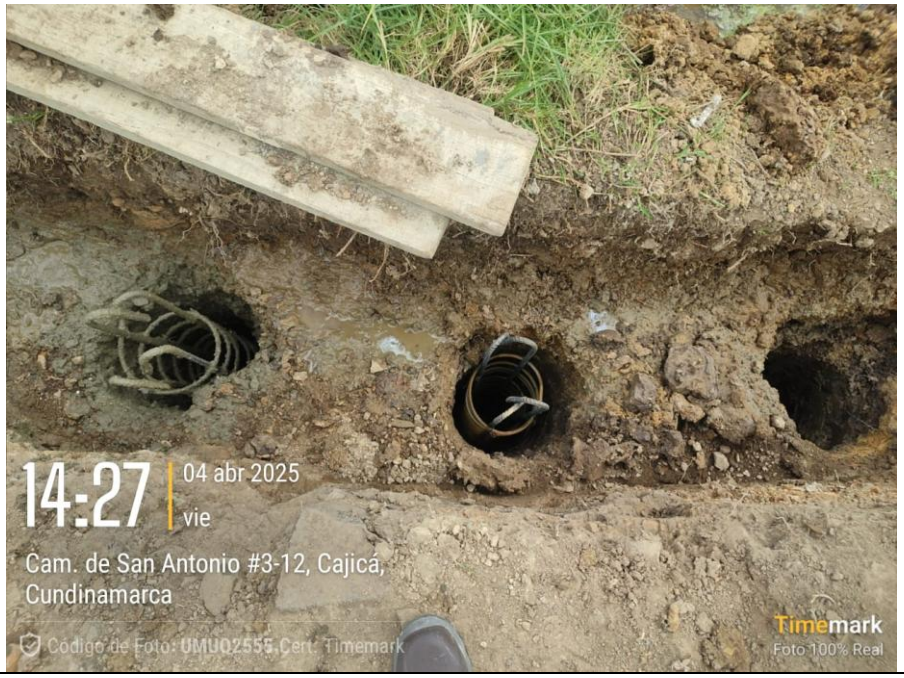

Sobre las excavaciones previamente ejecutadas para los pilotes, se instalan canastas de refuerzos para los pilotes.

FOTOGRAFÍA (11)

Tamaño 10 X 14 u 8 X 12 para fotos de perspectiva; y tamaño 7.5 x10 u 6 X 8 para fotografías que muestren detalles.



Se termina de extender el vaciado de concreto sobre la viga de amarre.

FOTOGRAFÍA (12)

Tamaño 10 X 14 u 8 X 12 para fotos de perspectiva; y tamaño 7.5 x10 u 6 X 8 para fotografías que muestren detalles.



Para el correcto vaciado de concreto sobre el área replanteada, se realizan actividades de desague con motovalde.

FOTOGRAFÍA (13)

Tamaño 10 X 14 u 8 X 12 para fotos de perspectiva; y tamaño 7.5 x10 u 6 X 8 para fotografías que muestren detalles.



Posterior al vaciado de la viga de amarre se alza la formaleta para vaciar concreto para el muro de contención.

FOTOGRAFÍA (14)


Tamaño 10 X 14 u 8 X 12 para fotos de perspectiva; y tamaño 7.5 x10 u 6 X 8 para fotografías que muestren detalles.



Se sigue con actividades de postergación de la instalación en el acero de refuerzo respectivo para el muro de contención.

FOTOGRAFÍA (15)

Tamaño 10 X 14 u 8 X 12 para fotos de perspectiva; y tamaño 7.5 x10 u 6 X 8 para fotografías que muestren detalles.

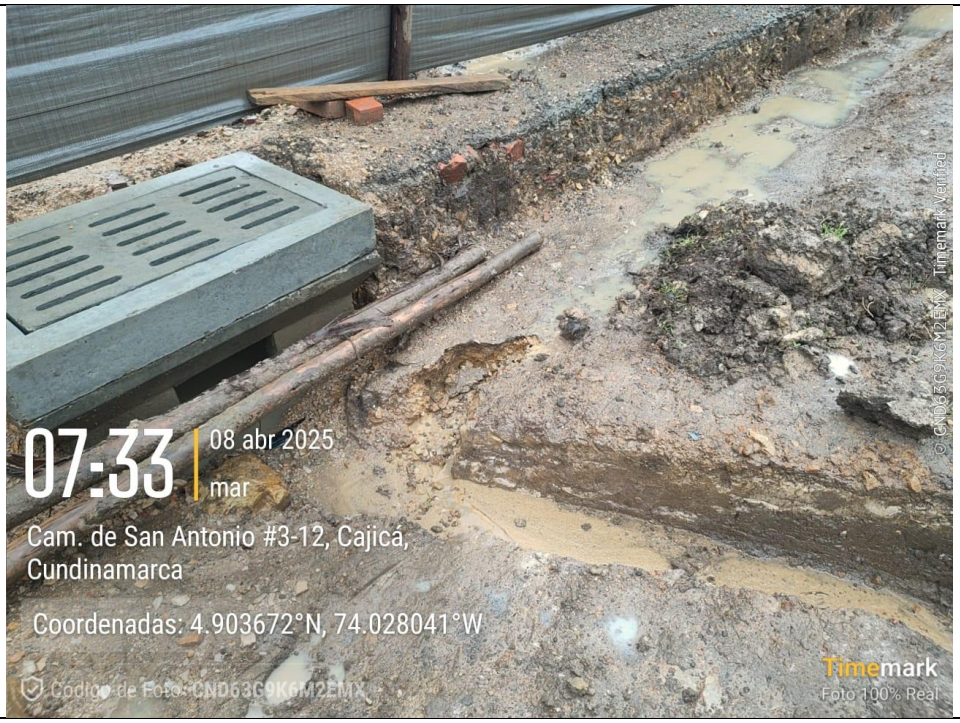

Se realiza la instalación de sumideros laterales prefabricados para la recolección de aguas lluvias.

FOTOGRAFÍA (16)


Tamaño 10 X 14 u 8 X 12 para fotos de perspectiva; y tamaño 7.5 x10 u 6 X 8 para fotografías que muestren detalles.



Sobre el adoquín instaldo de concreto se emboquilla con arena para asegurar un buen acabado.

FOTOGRAFÍA (17)

Tamaño 10 X 14 u 8 X 12 para fotos de perspectiva; y tamaño 7.5 x10 u 6 X 8 para fotografías que muestren detalles.

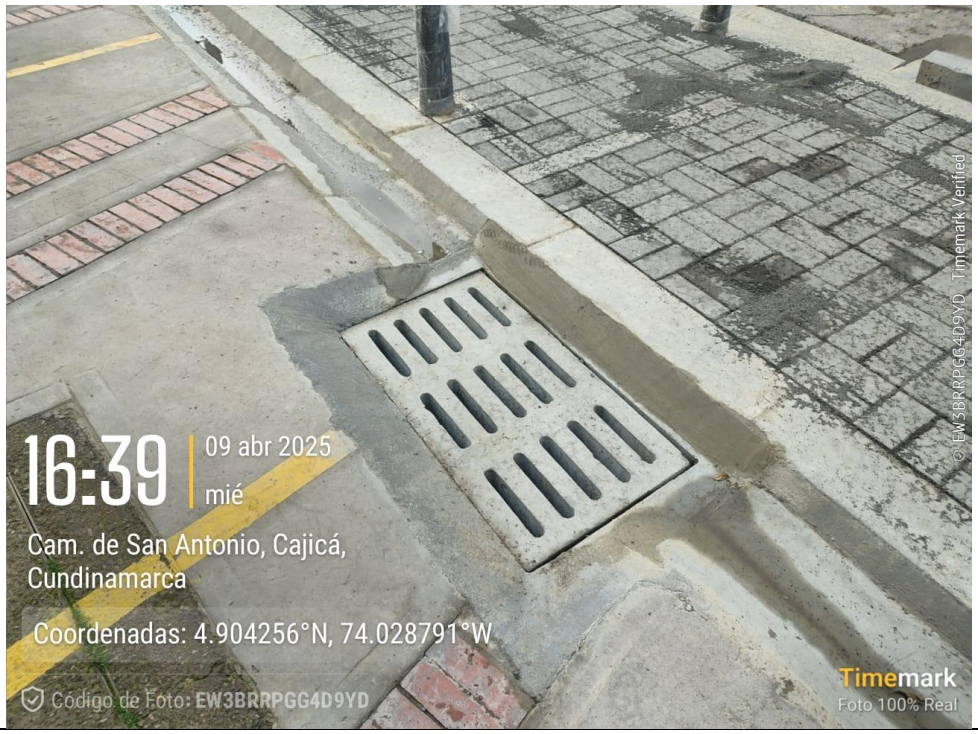

Se realiza limpieza y sellado de juntas en mortero para el buen manejo de agua en escorrentia.

FOTOGRAFÍA (18)

Tamaño 10 X 14 u 8 X 12 para fotos de perspectiva; y tamaño 7.5 x10 u 6 X 8 para fotografías que muestren detalles.



Se vuelven a realizar actividades de emboquillado sobre el tramo de anden ya construido.

FOTOGRAFÍA (19)

Tamaño 10 X 14 u 8 X 12 para fotos de perspectiva; y tamaño 7.5 x10 u 6 X 8 para fotografías que muestren detalles.



Se realizan sellamientos de juntas que se encontraban una vez se instalaran los bordillos prefabricados.

FOTOGRAFÍA (20)

Tamaño 10 X 14 u 8 X 12 para fotos de perspectiva; y tamaño 7.5 x10 u 6 X 8 para fotografías que muestren detalles.



Se realiza la acomodación y verificación del nivel y planteo de los bordillos prefabricados.

FOTOGRAFÍA (21)

Tamaño 10 X 14 u 8 X 12 para fotos de perspectiva; y tamaño 7.5 x10 u 6 X 8 para fotografías que muestren detalles.



Se siguen actividades para la instalación de sumideros prefabricados.

FOTOGRAFÍA (22)

Tamaño 10 X 14 u 8 X 12 para fotos de perspectiva; y tamaño 7.5 x10 u 6 X 8 para fotografías que muestren detalles.



Se realizan traslados en caliente fijos de redes eléctricas que se encontraban mal ubicadas sobre la zona en intervención.

FOTOGRAFÍA (23)

Tamaño 10 X 14 u 8 X 12 para fotos de perspectiva; y tamaño 7.5 x10 u 6 X 8 para fotografías que muestren detalles.



Instalación de cunetas para el buen manejo de agua lluvias.

FOTOGRAFÍA (24)

Tamaño 10 X 14 u 8 X 12 para fotos de perspectiva; y tamaño 7.5 x10 u 6 X 8 para fotografías que muestren detalles.



Actividades de emboquillamiento.

FOTOGRAFÍA (25)

Tamaño 10 X 14 u 8 X 12 para fotos de perspectiva; y tamaño 7.5 x10 u 6 X 8 para fotografías que muestren detalles.



Se terminan actividades de excavación para la instalación de pilotes de 30cm de diámetro y una profundidad de 2 m.

FOTOGRAFÍA (26)


Tamaño 10 X 14 u 8 X 12 para fotos de perspectiva; y tamaño 7.5 x10 u 6 X 8 para fotografías que muestren detalles.



Se verifica por parte de interventoría las excavaciones realizadas con el fin de que se cumpla os requerimientos y actividades previamente definidas en la licitación del proyecto.

FOTOGRAFÍA (27)

Tamaño 10 X 14 u 8 X 12 para fotos de perspectiva; y tamaño 7.5 x10 u 6 X 8 para fotografías que muestren detalles.

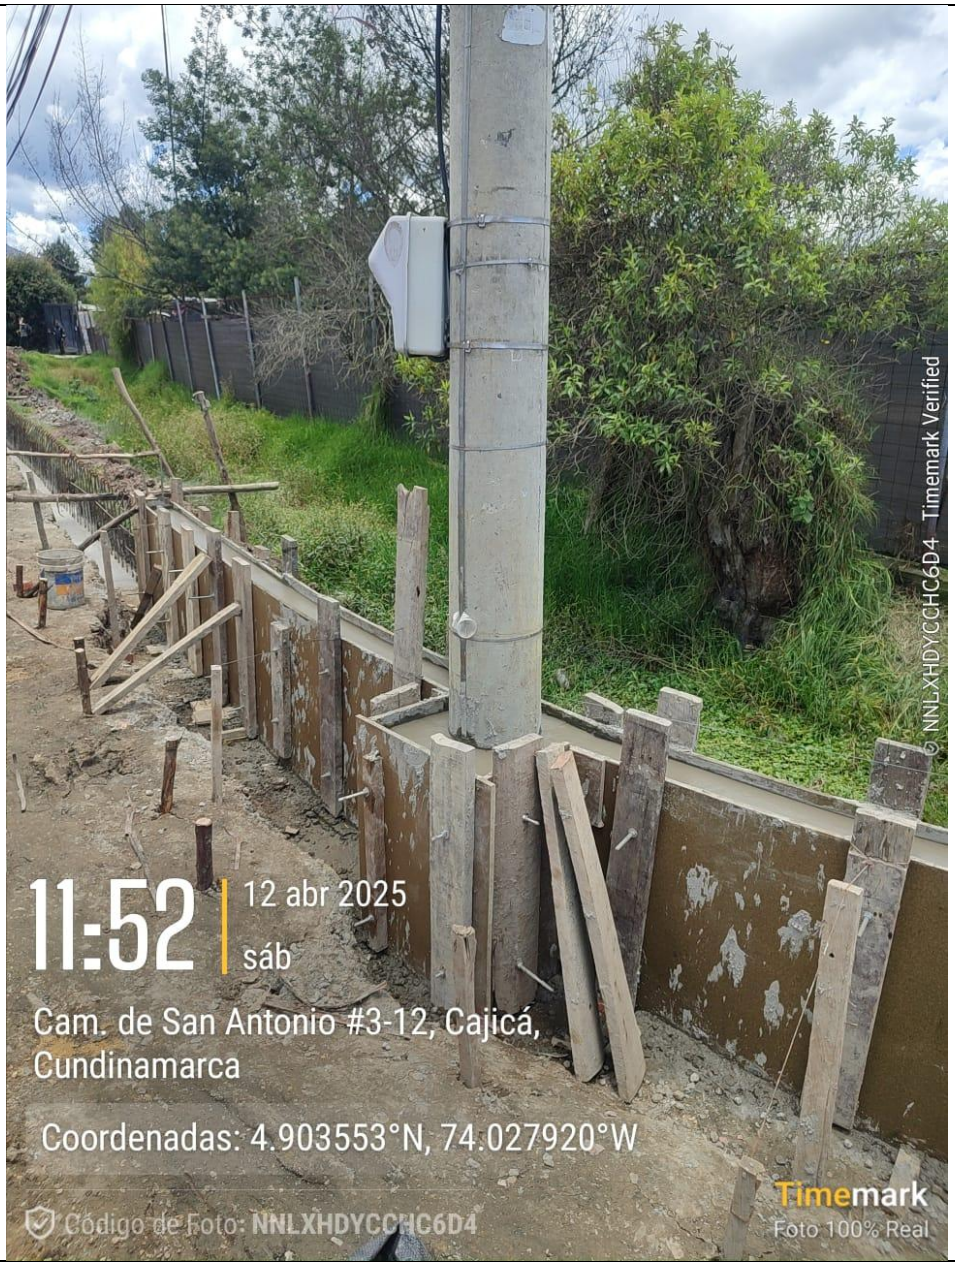

En los puntos de red trasladados se ejecuta la construcción de dados sobre postes de 12 metros aumentando la rigidez de estos puntos eléctricos.

FOTOGRAFÍA (28)

Tamaño 10 X 14 u 8 X 12 para fotos de perspectiva; y tamaño 7.5 x10 u 6 X 8 para fotografías que muestren detalles.



Finalizando el vaciado de concreto para el muro de contención con la instalación de la respectiva formaleta.
