4167

CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S

GOBERNACIÓN DE CASANARE
RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA
06 DIC 2023
Hora: 16:37
No. de Radicación: 15090

Aguazul-Casanare, 06 de diciembre de 2023

Señores:

GOBERNACION DE CASANARE

Secretaria de Infraestructura

Atn. Dirección Técnica de Construcciones

Asunto: Renuncia Anticipo del Valor de la Adición del Contrato.

Apreciados Señores,

Por medio de la presente le informamos que **CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S** renuncia al anticipo de la adición del contrato de obra pública **"CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 de 2022-12-30 cuyo objeto: Terminación del Mejoramiento a nivel de Pavimento de la vía acceso a la vereda Turua –Municipio de Aguazul – Departamento de Casanare"** en su clausula 6 **"ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO"** Debido a la premura del tiempo para la terminación del contrato.

Cordialmente,

ING. ALFREDO RESTREPO VARON

APODERADO DEL R/L ELIZABETH CAINA DELGADO

CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S NIT. 900.119.570-4

CONTRATISTA

Su proyecto, nuestro compromiso

Calle 73 No 20A - 66 PBX: 8052595 Móvil: 300 7978856 Bogotá D.C
info@caipro.com.co www.caipro.com.co

01-08-23 410 r
RECIBIDO INTERVENTORIA

CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S

Bogotá, 1 agosto de 2023, Municipio de Yopal Casanare

OFCAI-VAZ-041

Señores
A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
Ing. Ivon Mayerly Forero Abril

Ref.: "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 de 2022-12-30 cuyo objeto: Terminación del Mejoramiento a nivel de Pavimento de la vía acceso a la vereda Turua – Municipio de Aguazul – Departamento de Casanare."

Asunto: solicitud de adicional de obra.

Por medio del presente les solicitamos realizar el trámite para la adicional presupuestal requerida en la ejecución de mayores cantidades de obra, por tal motivo anexamos la documentación requerida para viabilizacion.

Cordialmente,

ING. ALFREDO RESTREPO VARON
C.C. 19.250.092 de Bogotá
Director de Obra Caipro Constructores S.A.S
Cel: 3108677565

Su proyecto,
nuestro
compromiso

01-08-23 4169
RECIBIDO INTERVENTORIA

CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S

Bogotá, 1 de agosto de 2023, Municipio de Yopal Casanare

OFCAI-VAZ-042

Señores
A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
Ing. Ivon Mayerly Forero Abril

Ref.: "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 de 2022-12-30 cuyo objeto: Terminación del Mejoramiento a nivel de Pavimento de la vía acceso a la vereda Turua – Municipio de Aguazul – Departamento de Casanare."

Asunto: solicitud de adicional de ítems no previstos.

Por medio del presente les solicitamos realizar el trámite para la adicional presupuestal requerida en la ejecución de los ítems no previstos requeridos en obra relacionados a continuación, por tal motivo anexamos la documentación requerida para la viabilizacion.

NP-08: Placa base en concreto de 3000 PSI e= 0,10 m.
NP-09: Caja de inspección de 90 x 90.

Cordialmente,

ING. ALFREDO RESTREPO VARON
C.C. 19.250.092 de Bogotá
Director de Obra Caipro Constructores S.A.S
Cel: 3108677565

Su proyecto,
nuestro
compromiso

4170

PROYECTOS

Yopal, 04 de julio de 2023

GOBERNACIÓN DE CASANARE
RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA
04 JUL 2023
Hora: 10:00 am
No. de Radicación: 06928

SEÑORES:
GOBERNACIÓN DE CASANARE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Dirección técnica de construcciones
La ciudad.

Referencia: CONTRATO DE INTEVENTORIA No 0487 DEL 08 DE FEBRERO DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Entrega de informes semanales de obra e interventoría, hasta el 23 de junio del 2023

Mediante el presente oficio esta interventoría realiza la entrega de los informes semanales de obra e interventoría del contrato de obra 2653 del 2022. Correspondientes hasta el 23 de junio del 2023, para su revisión y aprobación por parte de la supervisión.

Atentamente,

IVON MAYERLY FORERO ABRIL
R/L A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
NIT. 901.126.140-3

Folios: 43

Dirección – Calle 11 # 04-20 Trinidad Casanare – Cel. 3233118725
Email: aypingenieriasas@gmail.com

GOBERNACION DEL CASANARE

INFORME SEMANAL DE OBRA


CAIPRO

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME No.	1	MES:	ABRIL - MAYO	AÑO:	2023	PERIODO	28/04/2023	AL	5/05/2023	PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
CONTRATO No.	2653 DE 2022	OBJETO:	TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA ACCESO A LA VEREDA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE								
CONTRATISTA DE OBRA	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.				CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S				FECHA	lunes, 8 de mayo de 2023

1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

UBICACIÓN GENERAL



MARGINAL DE LA SELVA

INICIO DE VIA
PR55+830
FINAL DE VIA
PR54+090



2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	viernes, 30 de diciembre de 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 946.540.231,20
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	TRES (3) MESES	VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:	$ 0,00
FECHA DE INICIO:	28/04/2023	FECHA DE TERMINACION:	27/07/2023
PRORROGA :	N/A	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 946.540.231,20	VALOR DEL ANTICIPO:	$ 473.270.115,60

3. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

* TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES EN OBRA.

* SOLICITUD ANTE LA PRESIDENTE E LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL PERSONAL REQUERIDO Y CONTRATAR BIENES Y SERVICIOS ,QUIEN MANIFIESTA QUE NO PERMITE EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA, NI ESTAN DE ACUERDO CON EL INICIO DE LA MOVILIZACION DE EQUIPOS NI INGRESO DE PERSONAL.

* EL DIA 05/05/2023 SE REALIZA LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO CON REPRESENTACION DE LA GOBERNACION DEL CASANARE, CONTRATISTA DE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA DE OBRA.

4. CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD MODIFICACION 002	VALOR UNITARIO	AVANCE SEMANAL(ES) ANTERIOR(ES)			AVANCE SEMANA ACTUAL			AVANCE SEMANA TOTAL		
					CANTIDAD MES(ES) ANTERIOR(ES)	VALOR MES(ES) ANTERIOR(ES)	% AVANCE MES(ES) ANTERIOR(ES)	CANTIDAD MES ACTUAL	VALOR MES ACTUAL	% AVANCE MES ACTUAL	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% AVANCE TOTAL ACUMULADO
1	MOVIMIENTO DE TIERRAS												
101	Excavación manual en material común de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	M3	50,44	$ 49.311,14	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO												
201	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio clasificado Tmax. 3"	M3	5,87	$ 63.629,61	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
202	Sub base granular triturada	M3	337,14	$ 99.919,68	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
203	Base granular (INV. 330. 1)	M3	851,58	$ 114.773,79	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
204	Imprimación con emulsión asfáltica	M2	6.544,62	$ 5.007,93	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
205	Mezcal asfáltica MDC-2 o 19	M3	458,12	$ 1.074.126,70	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
3	OBRAS DE DRENAJE												
301	Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=0.45 m)	M	1.834,50	$ 50.380,78	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
302	Malla electrosoldada Q-4 o M - 159	KG	1.724,43	$ 7.889,49	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
303	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 Psi	M3	0,96	$ 560.489,26	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
304	Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transportada	M3	50,46	$ 84.101,97	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
305	Relleno de excavación (con material local)	M3	18,35	$ 19.151,09	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
306	Tubería PVC alcantarillado 16" . Suministro e instal.	M	13,50	$ 310.922,90	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
307	Bolsa o saco con arena de 0.60 x 0.80 para obras de protección	UND	36,00	$ 9.151,84	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
308	Piedra pegada en Mortero 1:4, e=0.15 m	M2	120,59	$ 66.631,87	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
4	OBRAS DE URBANISMO												
401	Líneas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700. 1)	M	7.336,00	$ 4.184,49	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
402	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 75 X 75 cm	UND	19,00	$ 575.874,50	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
403	Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (símbolos y letreros)	M2	50,40	$ 35.928,70	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
404	Tacha reflectiva	UND	2.703,00	$ 13.136,24	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%

GOBERNACION DEL CASANARE

INFORME SEMANAL DE OBRA

$	TRANSPORTE													
501	Transporte de material Pétreo (via pavimentada)	M3-KM	8.435,42	$ 1.912,44	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
502	Transporte de material Pétreo (via destapada)	M3-KM	1.976,64	$ 2.022,17	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
6	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE												
601	Excavación mecánica con retiro y disposición final	M3	50,44	$ 23.023,91	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%

AVANCE DE ACTIVIDADES				
	SUBTOTAL OBRAS	$ -		$ -		$ -	
	SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)	$ -		$ -		$ -	
	IMPLEMENTACIÓN PAGA	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
	PMT	$ -		$ -		$ -	
	CARACTERIZACIÓN VIAL	$ -		$ -		$ -	
	TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	$ -		$ -		$ -	

5. COMPARACIÓN PORCENTUAL AVANCE

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO %	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO %	AVANCE SEMANAL EJECUTADO %	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO %	% DE RETRASO O AVANCE
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

POLIZAS DE GARANTIA

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
MANEJO DE ANTICIPO	OK	28-abr.-2023	29-nov.-2023	$ 473.270.116,00	Nota: La vigencia de la poliza se ajusta a la ultima actualización del contrato.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	OK	28-abr.-2023	29-jul.-2026	$ 47.327.011,60	
ESTABILIDAD Y CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	OK	2-feb.-2023	2-feb.-2028	$ 94.654.023,20	ULTIMA ACTUALIZACION DEL CONTRATO: ACTA DE INICIO
CUMPLIMIENTO	OK	28-abr.-2023	29-nov.-2023	$ 94.654.023,20	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	OK	2-feb.-2023	28-jul.-2023	$ 232.000.000,00	

7. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

se estan recepcionando hojas de vida y preparando la logistaca para poder iniciar actividades en obra, ademas se continua con el proceso de conseguir maquinaria de la region de acuerdo a los compromisos realizados en la socializacion del dia 05 de mayo del 2023

Elaborado por:

ING. ALFREDO VARON
Director de obra

GOBERNACION DEL CASANARE


INFORME SEMANAL DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME No.	2	MES:	MAYO	AÑO:	2023	PERIODO	5/05/2023	AL	12/05/2023	PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
CONTRATO No.	2653 DE 2022	OBJETO:	TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA ACCESO A LA VEREDA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE								
CONTRATISTA DE OBRA	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.				CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S				FECHA	15/05/2023

1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

UBICACIÓN GENERAL



MARGUNAL DE LA SELVA

INICIO DE VIA
PR55+830
FINAL DE VIA
PR54+090



2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	viernes, 30 de diciembre de 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 946.540.231,20
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	TRES (3) MESES	VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:	$ 0,00
FECHA DE INICIO:	28/04/2023	FECHA DE TERMINACION:	27/07/2023
PRORROGA :	N/A	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 946.540.231,20	VALOR DEL ANTICIPO:	$ 473.270.115,60

3. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

* VISITA DE OBRA CON REPRESENTACION DE LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA DE OBRA, REALIZANDO RECORRIDO POR TODA LA VIA PARA PODER VISUALIZAR LAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y CONTEMPLAR LOS ITEMS NO PREVISTOS PARA REALIZAR EL BALANCE DE OBRA.

* SE INICIA EL DILIGENCIAMIENTO DE LAS ACTAS DE VECINDAD CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA INTERVENTORIA

* SE REALIZAN APIQUES EN LA VIA, SOLICITADOS POR LA INTERVENTORIA DE ACUERDO AL RECORRIDO EFECTUADO E DIA 07/05/2023 Y ASI PODER VERIFICAR ÑA ESTRUCTURA EXISTENTE.

* SE CONTINUA ACTIVIADES CON LA COMISION TOPOGRAFICA A LO LARGO DE LA TODA LA VIA Y PODER REALIZAR EL AJUSTE AL DISEÑO GEOMETRICO DE LA VIA A CONSTRUIR

* SE REALIZAN ACTIVIADADES ADMINISTRATIVAS CON LA INTERVENTORIA PARA PODER SABER LAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA, COTEMPLANDO LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS PARA EL BALANCE DE OBRA.

* EL DIA 12/05/2023 SE REALIZA RECORRIDO POR TODA LA VIA CON REPRESENTACION DE LA GOBERNACION DEL CASANARE, CONTRATISTA DE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA DE OBRA PARA REVISAR LAS ACTIVIADES Y CANTIDADES DE OBRA REQUERIDAS PARA SABER MEDIANTE EL BALANCE DE OBRA EL VALOR REAL DEL CONTRATO.

4. CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD MODIFICACION 002	VALOR UNITARIO	AVANCE SEMANAL(ES) ANTERIOR(ES)			AVANCE SEMANA ACTUAL			AVANCE SEMANA TOTAL		
					CANTIDAD MES(ES) ANTERIOR(ES)	VALOR MES(ES) ANTERIOR(ES)	% AVANCE MES(ES) ANTERIOR(ES)	CANTIDAD MES ACTUAL	VALOR MES ACTUAL	% AVANCE MES ACTUAL	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% AVANCE TOTAL ACUMULADO
1	MOVIMIENTO DE TIERRAS												
101	Excavación manual en material común de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	M3	50,44	$ 49.311,14	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO												
201	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio clasificado Tmax. 3"	M3	5,87	$ 63.629,51	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
202	Sub base granular triturada	M3	337,14	$ 99.919,68	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
203	Base granular (INV. 330. 1)	M3	851,58	$ 114.773,79	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
204	Imprimación con emulsión asfáltica	M2	6.544,62	$ 5.007,93	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
205	Mezcal asfáltica MDC-2 o 19	M3	458,12	$ 1.074.126,70	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
3	OBRAS DE DRENAJE												
301	Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (e=0.45 m)	M	1.834,50	$ 50.380,78	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
302	Malla electrosoldada Q-4 o M - 159	KG	1.724,43	$ 7.889,49	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
303	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 Psi	M3	0,96	$ 560.489,26	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
304	Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transportada	M3	50,46	$ 84.101,97	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
305	Relleno de excavación (con material local)	M3	18,35	$ 19.151,09	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
306	Tubería PVC alcantarillado 16" . Suministro e instal.	M	13,50	$ 310.922,90	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
307	Bolsa o saco con arena de 0.60 x 0.80 para obras de protección	UND	36,00	$ 9.151,84	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
308	Piedra pegada en Mortero 1:4, e=0.15 m	M2	120,59	$ 66.631,87	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
4	OBRAS DE URBANISMO												
401	Líneas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700. 1)	M	7.336,00	$ 4.184,49	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
402	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 75 X 75 cm	UND	19,00	$ 575.874,50	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
403	Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (símbolos y letreros)	M2	50,40	$ 35.928,70	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%



GOBERNACION DEL CASANARE

INFORME SEMANAL DE OBRA

404	Tacha reflectiva	UND	2.703,00	$ 13.136,24	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
5	TRANSPORTE													
501	Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	M3-KM	8.435,42	$ 1.912,44	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
502	Transporte de material Pétreo (vía destapada)	M3-KM	1.976,64	$ 2.022,17	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
6	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE													
601	Excavación mecánica con retiro y disposición final	M3	50,44	$ 23.023,91	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%

AVANCE DE ACTIVIDADES	SUBTOTAL OBRAS	$ -		$ -		$ -	
	SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)	$ -		$ -		$ -	
	IMPLEMENTACIÓN PAGA	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
	PMT	$ -		$ -		$ -	
	CARACTERIZACIÓN VIAL	$ -		$ -		$ -	
	TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	$ -		$ -		$ -	

5. COMPARACIÓN PORCENTUAL AVANCE

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO %	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO %	AVANCE SEMANAL EJECUTADO %	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO %	% DE RETRASO O AVANCE
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

POLIZAS DE GARANTIA

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
MANEJO DE ANTICIPO	OK	28-abr.-2023	29-nov.-2023	$ 473.270.116,00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	OK	28-abr.-2023	29-jul.-2026	$ 47.327.011,60	Nota: La vigencia de la poliza se ajusta a la ultima actualización del contrato.
ESTABILIDAD Y CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	OK	2-feb.-2023	2-feb.-2028	$ 94.654.023,20	ULTIMA ACTUALIZACION DEL CONTRATO: ACTA DE INICIO
CUMPLIMIENTO	OK	28-abr.-2023	29-nov.-2023	$ 94.654.023,20	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	OK	2-feb.-2023	28-jul.-2023	$ 232.000.000,00	

7. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

luego de las labores administrativas realizadas con la interventroria, se determina que se requiere realizar una modificacion ajustando las cantidades de los items contracturales y que se requiere incluir actividades no previstas, ademas que se requiere de un valor adicional.

Elaborado por:

ING. ALFREDO VARON
Director de obra

4A5

GOBERNACION DEL CASANARE

INFORME SEMANAL DE OBRA


CAIPRO

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME No.	3	MES:	MAYO	AÑO:	2023	PERIODO	12/05/2023	Al:	19/05/2023	PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
CONTRATO No.	2653 DE 2022	OBJETO:	TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA ACCESO A LA VEREDA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE								
CONTRATISTA DE OBRA	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.					CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S			FECHA	29/05/2023

1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

UBICACIÓN GENERAL



MARGUNAL DE LA SELVA

INICIO DE VIA
PR55+830
FINAL DE VIA
PR54+090



2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	viernes, 30 de diciembre de 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 946.540.231,20
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	TRES (3) MESES	VALOR ACICIONAL AL CONTRATO:	$ 0,00
FECHA DE INICIO:	28/04/2023	FECHA DE TERMINACION:	27/07/2023
PRORROGA :	N/A	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 946.540.231,20	VALOR DEL ANTICIPO:	$ 473.270.115,60

3. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

* SE CONTINUA CON EL DILIGENCIAMIENTO DE LAS ACTAS DE VECINDAD CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA INTERVENTORIA

* SE CONTINUA REALIZANDO ADMINISTRATIVAS Y EN OBRA CON LA CONVISION TOPOGRAFICA A LO LARGO DE LA TODA LA VIA AJUSTANDO EL DISEÑO GEOMETRICO DE LA VIA

* SE REALIZAN ACTIVIADADES ADMINISTRATIVAS ENTRE OBRA E INTERVENTORIA PARA AJUSTAR EL BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA REQUERIDAS Y SER PRESENTADO ANTE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

4. CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD MODIFICACION 002	VALOR UNITARIO	AVANCE SEMANAL(ES) ANTERIOR(ES)			AVANCE SEMANA ACTUAL			AVANCE SEMANA TOTAL		
					CANTIDAD MES(ES) ANTERIOR(ES)	VALOR MES(ES) ANTERIOR(ES)	% AVANCE MES(ES) ANTERIOR(ES)	CANTIDAD MES ACTUAL	VALOR MES ACTUAL	% AVANCE MES ACTUAL	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% AVANCE TOTAL ACUMULADO
1	MOVIMIENTO DE TIERRAS												
101	Excavación manual en material común de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	M3	50,44	$ 49.371,14	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO												
201	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de río clasificado Tmax. 3"	M3	5,87	$ 63.629,51	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
202	Sub base granular triturada	M3	337,14	$ 99.979,88	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
203	Base granular (INV. 330. 1)	M3	851,58	$ 114.773,79	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
204	Imprimación con emulsión asfáltica	M2	6.544,62	$ 5.007,93	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
205	Mezcal asfáltica MDC-2 o 19	M3	458,12	$ 1.074.126,70	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
3	OBRAS DE DRENAJE												
301	Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=0.45 m)	M	1.834,50	$ 50.380,78	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
302	Malla electrosoldada C-4 o M - 159	KG	1.724,43	$ 7.809,49	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
303	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 Psi	M3	0,96	$ 560.489,26	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
304	Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transportada	M3	50,46	$ 84.101,97	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
305	Relleno de excavación (con material local)	M3	18,35	$ 19.151,09	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
306	Tubería PVC alcantarillado 16" . Suministro e instal.	M	13,50	$ 310.922,90	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
307	Bolsa o saco con arena de 0.80 x 0.80 para obras de protección	UND	36,00	$ 9.151,84	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
308	Piedra pegada en Mortero 1:4, e=0.15 m	M2	120,59	$ 66.631,87	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
4	OBRAS DE URBANISMO												

GOBERNACION DEL CASANARE

INFORME SEMANAL DE OBRA

CAIPRO

401	Lineas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrilica, incluye micro esferas (INV. 700. 1)	M	7.336,00	$	4.184,49	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
402	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 75 X 75 cm	UND	19,00	$	575.874,50	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
403	Marcas viales con pintura acrilica para demarcación (simbolos y letreros)	M2	50,40	$	35.928,70	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
404	Tacha reflectiva	UND	2.703,00	$	13.196,24	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
5	TRANSPORTE													
501	Transporte de material Pétreo (via pavimentada)	M3-KM	8.435,42	$	1.912,44	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
502	Transporte de material Pétreo (via destapada)	M3-KM	1.976,64	$	2.022,17	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
6	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE													
601	Excavación mecánica con retiro y disposición final	M3	50,44	$	23.023,91	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%

AVANCE DE ACTIVIDADES						
SUBTOTAL OBRAS	$ -	0,00%	$ -	1,68%	$ -	1,68%
SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)	$ -		$ -		$ -	
IMPLEMENTACIÓN PAGA	$ -		$ 5.578.534,00		$ 5.578.534,00	
PMT	$ -		$ 9.892.809,00		$ 9.892.809,00	
CARACTERIZACIÓN VIAL	$ -		$ 385.670,00		$ 385.670,00	
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	$ -		$ 15.857.013,00		$ 15.857.013,00	

5. COMPARACIÓN PORCENTUAL AVANCE

ACUMULADO PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR %	PROGRAMADO PRESENTE SEMANA %	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO %	ACUMULADO EJECUTADO SEMANA ANTERIOR %	EJECUTADO PRESENTE SEMANA %	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO %	% DE RETRASO O AVANCE
0,00%	1,79%	1,79%	0,00%	1,68%	1,68%	0,11%

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

POLIZAS DE GARANTIA

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
MANEJO DE ANTICIPO	OK	28-abr.-2023	29-nov.-2023	$ 473.270.116,00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	OK	28-abr.-2023	29-jul.-2028	$ 47.327.011,60	
ESTABILIDAD Y CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	OK	2-feb.-2023	2-feb.-2028	$ 94.654.023,20	ULTIMA ACTUALIZACION DEL CONTRATO: ACTA DE INICIO
CUMPLIMIENTO	OK	28-abr.-2023	29-nov.-2023	$ 94.654.023,20	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	OK	2-feb.-2023	28-jul.-2023	$ 232.000.000,00	

7. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

UNA DE LAS PRIMERAS ACTVIDADES A EJECUTAR ES LA DEMOLICION DE CUNETAS, LA CUAL FUE CONTEMPLADA EN EL BALANCE FINANCIERO QUE SE PRESENTARA A LA ENTIDAD CONTRATANTE, ADEMAS SE ESTA AJUSTANDO LA TOPOGRAFIA QUE FUE ENTREGADA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE A LO QUE ESTA EN OBRA.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

GOBERNACION DEL CASANARE

INFORME SEMANAL DE OBRA

CAIPRO





Elaborado por:

ING. ALFREDO VARON
Director de obra

GOBERNACION DEL CASANARE

INFORME SEMANAL DE OBRA


CAIPRO

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME No.	4	MES:	MAYO	AÑO:	2023	PERIODO	19/05/2023	AL:	26/05/2023	PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
CONTRATO No.	2653 DE 2022	OBJETO:	TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA ACCESO A LA VEREDA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE								
CONTRATISTA DE OBRA	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.				CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S				FECHA	29/05/2023

1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

UBICACIÓN GENERAL



MARGUNAL DE LA SELVA

INICIO DE VIA
PR55+830
FINAL DE VIA
PR54+090



2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	viernes, 30 de diciembre de 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 946.540.231,20
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	TRES (3) MESES	VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:	$ 0,00
FECHA DE INICIO:	28/04/2023	FECHA DE TERMINACION:	27/07/2023
PRORROGA :	N/A	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 946.540.231,20	VALOR DEL ANTICIPO:	$ 473.270.115,60

3. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

* SE CONTINUA CON EL DILIGENCIAMIENTO DE LAS ACTAS DE VECINDAD CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA INTERVENTORIA

* SE CONTINUA REALIZANDO ADMINISTRATIVAS Y EN OBRA CON LA COMISION TOPOGRAFICA A LO LARGO DE LA TODA LA VIA AJUSTANDO EL DISEÑO GEOMETRICO DE LA VIA

* SE REALIZAN ACTIVIADADES ADMINISTRATIVAS ENTRE OBRA E INTERVENTORIA PARA AJUSTAR EL BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA REQUERIDAS Y SER PRESENTADO ANTE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

4. CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD MODIFICACION 002	VALOR UNITARIO	AVANCE SEMANAL(ES) ANTERIOR(ES)			AVANCE SEMANA ACTUAL			AVANCE SEMANA TOTAL		
					CANTIDAD MES(ES) ANTERIOR(ES)	VALOR MES(ES) ANTERIOR(ES)	% AVANCE MES(ES) ANTERIOR(ES)	CANTIDAD MES ACTUAL	VALOR MES ACTUAL	% AVANCE MES ACTUAL	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% AVANCE TOTAL ACUMULADO
1	MOVIMIENTO DE TIERRAS												
101	Excavación manual en material común de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	M3	50,44	$ 49.3[illegible]1,14	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO												
201	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de río clasificado Tmax. 3"	M3	5,87	$ 63.629,51	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
202	Sub base granular triturada	M3	337,14	$ 99.[illegible]9,88	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
203	Base granular (INV. 330. 1)	M3	851,58	$ 114.773,79	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
204	Imprimación con emulsión asfáltica	M2	6.544,62	$ 5.007,93	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
205	Mezcal asfáltica MDC-2 o 19	M3	458,12	$ 1.074.126,70	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
3	OBRAS DE DRENAJE												
301	Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=0.45 m)	M	1.834,50	$ 50.380,78	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
302	Malla electrosoldada C-4 o M - 159	KG	1.724,43	$ 7.889,49	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
303	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 Psi	M3	0,95	$ 560.489,26	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
304	Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transportada	M3	50,46	$ 84.101,97	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
305	Relleno de excavación (con material local)	M3	18,35	$ 19.151,09	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
306	Tubería PVC alcantarillado 16" . Suministro e instal.	M	13,50	$ 310.922,90	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
307	Bolsa o saco con arena de 0.60 x 0.80 para obras de protección	UND	36,00	$ 9.151,84	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
308	Piedra pegada en Mortero 1:4, e=0.15 m	M2	120,59	$ 66.631,87	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%

GOBERNACION DEL CASANARE

INFORME SEMANAL DE OBRA

CAIPRO

4	OBRAS DE URBANISMO													
401	Lineas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrilica, incluye micro esferas (INV. 700. 1)	M	7.336,00	$ 4.184,49	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	
402	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 75 X 75 cm	UND	19,00	$ 575.874,50	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	
403	Marcas viales con pintura acrilica para demarcación (simbolos y letreros)	M2	50,40	$ 35.928,70	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	
404	Tacha reflectiva	UND	2.703,00	$ 13.136,24	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	
5	TRANSPORTE													
501	Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	M3-KM	8.435,42	$ 1.912,44	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	
502	Transporte de material Pétreo (vía destapada)	M3-KM	1.976,64	$ 2.022,17	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	
6	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE													
601	Excavación mecánica con retiro y disposición final	M3	50,44	$ 23.023,91	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	

AVANCE DE ACTIVIDADES						
	SUBTOTAL OBRAS	$ -		$ -		$ -	
	SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)	$ -		$ -		$ -	
	IMPLEMENTACIÓN PAGA	$ 5.578.533,50	1,68%	$ 1.561.989,38	0,47%	$ 7.140.522,88	2,14%
	PMT	$ 9.892.808,00		$ 2.769.986,52		$ 12.662.795,52	
	CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 385.670,00		$ 107.987,60		$ 493.657,60	
	TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	$ 15.857.012,50		$ 4.439.963,50		$ 20.296.976,00	

5. COMPARACIÓN PORCENTUAL AVANCE

ACUMULADO PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR %	PROGRAMADO PRESENTE SEMANA %	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO %	ACUMULADO EJECUTADO SEMANA ANTERIOR %	EJECUTADO PRESENTE SEMANA %	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO %	% DE RETRASO O AVANCE
1,79%	0,72%	2,51%	1,68%	0,47%	2,15%	0,36%

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

POLIZAS DE GARANTIA

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
MANEJO DE ANTICIPO	OK	28-abr.-2023	29-nov.-2023	$ 473.270.116,00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	OK	28-abr.-2023	29-jul.-2026	$ 47.327.011,60	
ESTABILIDAD Y CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	OK	2-feb.-2023	2-feb.-2028	$ 94.654.023,20	ULTIMA ACTUALIZACION DEL CONTRATO: ACTA DE INICIO
CUMPLIMIENTO	OK	28-abr.-2023	29-nov.-2023	$ 94.654.023,20	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	OK	2-feb.-2023	28-jul.-2023	$ 232.000.000,00	

7. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

UNA DE LAS PRIMERAS ACTVIDADES A EJECUTAR ES LA DEMOLICION DE CUNETAS, LA CUAL FUE CONTEMPLADA EN EL BALANCE FINANCIERO QUE SE PRESENTARA A LA ENTIDAD CONTRATANTE, ADEMAS SE ESTA AJUSTANDO LA TOPOGRAFIA QUE FUE ENTREGADA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE A LO QUE ESTA EN OBRA.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

GOBERNACION DEL CASANARE	
INFORME SEMANAL DE OBRA	CAIPRO





Elaborado por:

ING. ALFREDO VARON
Director de obra

4181

8

INFORME SEMANAL DE OBRA


CAIPRO

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME No.	5	MES:	MAYO	AÑO:	2023	PERIODO	23/05/2023	AL	2/06/2023	PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES
CONTRATO No.	2653 DE 2022	OBJETO:	TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA ACCESO A LA VEREDA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE								
CONTRATISTA DE OBRA	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.				CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S				FECHA	9/06/2023


1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

UBICACIÓN GENERAL



MARGUNAL DE LA SELVA

INICIO DE VIA
PR55+830
FINAL DE VIA
PR54+090



2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	viernes, 30 de diciembre de 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 946.540.231,20
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	TRES (3) MESES	VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:	$ 0,00
FECHA DE INICIO:	28/04/2023	FECHA DE TERMINACION:	27/07/2023
PRORROGA :	N/A	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A
VALOR ACTUAL DE CONTRATO:	$ 946.540.231,20	VALOR DEL ANTICIPO:	$ 473.270.115,60

3. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

* SE CONTINUA CON EL DILIGENCIAMIENTO DE LAS ACTAS DE VECINDAD CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA INTERVENTORIA

* LA COMISION TOPOGRAFICA REALIZA LABORES DE ABSCISADO Y UBICACIÓN DE EJES A LO LARGO DE LA VIA.

* SE REALIZAN LA ENTREGA A LA GOBERNACION DEL BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA CONTRACTUALES Y LOS ITEMS NO PREVISTOS REQUERIDOS EN OBRA PARA SU REVISION Y APROBACION

* SE REALIZA LAS CORRECCIONES REQUERIDAS POR LA SUPERVISION DEL CONTRATO AL BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA CONTRACTUALES Y LOS ITEMS NO PREVISTOS REQURIDOS EN OBRA.

SE INICIA CON LA EXCAVACION MECANICA PARA LA CAJA DE LA VIA DESDE EL PR1+730 AL PR1+450

4. CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD MODIFICACION 002	VALOR UNITARIO	AVANCE SEMANAL(ES) ANTERIOR(ES)			AVANCE SEMANA ACTUAL			AVANCE SEMANA TOTAL		
					CANTIDAD MES(ES) ANTERIOR(ES)	VALOR MES(ES) ANTERIOR(ES)	% AVANCE MES(ES) ANTERIOR(ES)	CANTIDAD MES ACTUAL	VALOR MES ACTUAL	% AVANCE MES ACTUAL	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% AVANCE TOTAL ACUMULADO
1	MOVIMIENTO DE TIERRAS												
101	Excavación manual en material común de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	M3	50,44	$ 49.311,14	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO												
201	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio clasificado Tmax. 3"	M3	5,87	$ 63.629,51	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
202	Sub base granular triturada	M3	337,14	$ 99.919,68	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
203	Base granular (INV. 330. 1)	M3	851,58	$ 114.773,79	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
204	Imprimación con emulsión asfáltica	M2	6.574,62	$ 5.007,93	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
205	Mezcal asfáltica MDC-2 o 19	M3	458,12	$ 1.074.126,70	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
3	OBRAS DE DRENAJE												
301	Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=0.45 m)	M	1.834,50	$ 50.380,78	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
302	Malla electrosoldada Q-4 o M - 159	KG	1.724,43	$ 7.689,49	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
303	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 Psi	M3	0,96	$ 560.488,26	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
304	Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transportada	M3	50,46	$ 84.101,97	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
305	Relleno de excavación (con material local)	M3	18,35	$ 19.151,09	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
306	Tubería PVC alcantarillado 16" . Suministro e instal.	M	13,50	$ 310.922,90	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
307	Bolsa o saco con arena de 0.60 x 0.80 para obras de protección	UND	36,00	$ 9.151,84	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
308	Piedra pegada en Mortero 1:4, e=0.15 m	M2	120,59	$ 66.631,87	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
4	OBRAS DE URBANISMO												
401	Lineas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrilica, incluye micro esferas (INV. 700. 1)	M	7.336,00	$ 4.184,49	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
402	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 75 X 75 cm	UND	19,00	$ 575.874,50	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
403	Marcas viales con pintura acrilica para demarcación (simbolos y letreros)	M2	50,40	$ 35.928,70	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
404	Tacha reflectiva	UND	2.703,00	$ 13.136,24	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%

8

INFORME SEMANAL DE OBRA

5	TRANSPORTE															
501	Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	M3-KM	8.435,42	$	1.912,44	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		
502	Transporte de material Pétreo (vía destapada)	M3-KM	1.976,64	$	2.022,17	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		
6	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE															
601	Excavación mecánica con retiro y disposición final	M3	50,44	$	23.023,91	-	$ -	0,00%	50,44	$ 1.161.326,02	100,00%	50,44	$ 1.161.326,00	100,00%		

AVANCE DE ACTIVIDADES								
SUBTOTAL OBRAS	$ -	2,14%	$ 1.161.326,00	0,66%	$ 1.161.326,00	2,80%		
SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)	$ -		$ 1.161.326,00		$ 1.161.326,00			
IMPLEMENTACIÓN PAGA	$ 7.140.522,88		$ 1.785.130,72		$ 8.925.653,60			
PMT	$ 12.662.795,52		$ 3.165.698,88		$ 15.828.494,40			
CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 493.657,60		$ 123.414,40		$ 617.072,00			
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	$ 20.296.976,00		$ 6.235.570,00		$ 26.532.546,00			

5. COMPARACIÓN PORCENTUAL AVANCE

ACUMULADO PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR %	PROGRAMADO PRESENTE SEMANA %	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO %	ACUMULADO EJECUTADO SEMANA ANTERIOR %	EJECUTADO PRESENTE SEMANA %	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO %	% DE RETRASO O AVANCE
2,51%	6,17%	8,68%	2,14%	0,66%	2,80%	5,88%

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

POLIZAS DE GARANTÍA

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
MANEJO DE ANTICIPO	OK	23-abr.-2023	29-nov.-2023	$ 473.270.116,00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	OK	23-abr.-2023	29-jul.-2026	$ 47.327.011,60	
ESTABILIDAD Y CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	OK	2-feb.-2023	2-feb.-2028	$ 94.654.023,20	ULTIMA ACTUALIZACION DEL CONTRATO: ACTA DE INICIO
CUMPLIMIENTO	OK	23-abr.-2023	29-nov.-2023	$ 94.654.023,20	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	OK	2-feb.-2023	28-jul.-2023	$ 232.300.000,00	

7. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

SE INICIA CON LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACION MECANICA PARA LA CAJA DE LA VIA DONDE SE PRESENTA SOCAVACION POR LA ESCORRENTIA DE AGUAS LLUVIAS DESDE EL PR1+730 AL PR1+450

8. REGISTRO FOTOGRAFICO





8	
INFORME SEMANAL DE OBRA	CAIPRO





Elaborado por:

ING. ALFREDO VARON
Director de obra

GOBERNACION DEL CASANARE

INFORME SEMANAL DE OBRA


CAIPRO

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME No.	8	MES:	JUNIO	AÑO:	2023	PERIODO	2/06/2023	AL	9/06/2023	PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
CONTRATO No.	2653 DE 2022	OBJETO:	TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA ACCESO A LA VEREDA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE								
CONTRATISTA DE OBRA	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.			CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S					FECHA	26/06/2023


1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

UBICACIÓN GENERAL



MARGUNAL DE LA SELVA

INICIO DE VIA
PR55+830
FINAL DE VIA
PR54+090



2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	viernes, 30 de diciembre de 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 946.540.231,20
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	TRES (3) MESES	VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:	$ 0,00
FECHA DE INICIO:	28/04/2023	FECHA DE TERMINACION:	27/07/2023
PRORROGA :	N/A	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 946.540.231,20	VALOR DEL ANTICIPO:	$ 473.270.115,60

3. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

C

* LA COMISION TOPOGRAFICA REALIZA LABORES DE CONTROL DE VOLUMENES.

* SE REALIZA EXCAVACION MECANICA PARA CAJA DE VIA DESDE EL PR1+720 AL PR1+430.

* CON LA MOTONIVELADORA SE REALIZA LA CONFORMACION DE LA VIA DESDE EL PR1+720 AL PR1+430 Y COMPACATADO CON EL VIBROCOMPACTADOR, ADEMAS SE REALIZA CUNETEO EN AMBOS COSTADOS DE LA VIA PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS

* POR LAS FUERTES Y CONSTANTES LLUIAS QUE SE PRESENTAN EN OBRA, NO SE HA PODIDO TENER UN BUEN AVANCE DE OBRA.

4. CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD MODIFICACION 002	VALOR UNITARIO	AVANCE SEMANAL(ES) ANTERIOR(ES)			AVANCE SEMANA ACTUAL			AVANCE SEMANA TOTAL		
					CANTIDAD MES(ES) ANTERIOR(ES)	VALOR MES(ES) ANTERIOR(ES)	% AVANCE MES(ES) ANTERIOR(ES)	CANTIDAD MES ACTUAL	VALOR MES ACTUAL	% AVANCE MES ACTUAL	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% AVANCE TOTAL ACUMULADO
1	MOVIMIENTO DE TIERRAS												
101	Excavación manual en material común de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	M3	50,44	$ 49.311,14	-	$ -	0,00%	50,44	$ 2.487.253,90	100,00%	50,44	$ 2.487.254,00	100,00%
2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO												
201	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio clasificado Tmax. 3"	M3	5,87	$ 63.629,51	-	$ -	0,00%	5,87	$ 373.505,22	100,00%	5,87	$ 373.505,00	100,00%
202	Sub base granular triturada	M3	337,14	$ 99.919,68	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
203	Base granular (INV. 330. 1)	M3	851,58	$ 114.773,79	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
204	Imprimación con emulsión asfáltica	M2	6.544,62	$ 5.007,93	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
205	Mezcal asfáltica MDC-2 o 19	M3	458,12	$ 1.074.126,70	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
3	OBRAS DE DRENAJE												
301	Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=0.45 m)	M	1.834,50	$ 50.380,78	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
302	Malla electrosoldada Q-4 o M - 159	KG	1.724,43	$ 7.889,49	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
303	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 Psi	M3	0,96	$ 560.489,26	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
304	Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transportada	M3	50,46	$ 84.101,97	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
305	Relleno de excavación (con material local)	M3	18,35	$ 19.151,09	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
306	Tuberia PVC alcantarillado 16" . Suministro e instal.	M	13,50	$ 310.922,90	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
307	Bolsa o saco con arena de 0.60 x 0.80 para obras de protección	UND	36,00	$ 9.151,84	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
308	Piedra pegada en Mortero 1:4, e=0.15 m	M2	120,59	$ 66.631,87	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
4	OBRAS DE URBANISMO												
401	Lineas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrilica, incluye micro esferas (INV. 700. 1)	M	7.336,00	$ 4.184,49	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
402	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 75 X 75 cm	UND	19,00	$ 575.874,50	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
403	Marcas viales con pintura acrilica para demarcación (simbolos y letreros)	M2	50,40	$ 35.928,70	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
404	Tacha reflectiva	UND	2.703,00	$ 13.136,24	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%

4185

GOBERNACION DEL CASANARE

INFORME SEMANAL DE OBRA

CAIPRO

5	TRANSPORTE															
501	Transporte de material Pétreo (via pavimentada)	M3-KM	8.435,42	$	1.912,44	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		
502	Transporte de material Pétreo (via destapada)	M3-KM	1.976,64	$	2.022,17	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		
6	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE															
601	Excavación mecánica con retiro y disposición final	M3	50,44	$	23.023,91	50,44	$ 1.161.326,02	100,00%		$ -	0,00%	50,44	$ 1.161.326,00	100,00%		

AVANCE DE ACTIVIDADES								
SUBTOTAL OBRAS	$ 1.161.326,00	2,80%	$ 2.860.759,00	0,84%	$ 4.022.085,00	3,64%		
SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)	$ 1.161.326,00		$ 2.860.759,00		$ 4.022.085,00			
IMPLEMENTACIÓN PAGA	$ 6.925.653,60		$ 1.785.130,72		$ 10.710.784,32			
PMT	$ 15.828.494,40		$ 3.165.698,88		$ 18.994.193,28			
CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 617.072,00		$ 123.414,40		$ 740.486,40			
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	**$ 26.532.546,00**		**$ 7.935.003,00**		**$ 34.467.549,00**			

5. COMPARACIÓN PORCENTUAL AVANCE

ACUMULADO PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR %	PROGRAMADO PRESENTE SEMANA %	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO %	ACUMULADO EJECUTADO SEMANA ANTERIOR %	EJECUTADO PRESENTE SEMANA %	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO %	% DE RETRASO O AVANCE
8,68%	2,02%	10,70%	2,80%	0,84%	3,638316506625426000%	7,06%

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

POLIZAS DE GARANTIA

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
MANEJO DE ANTICIPO	OK	28-abr.-2023	29-nov.-2023	$ 473.270.118,00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	OK	28-abr.-2023	29-jul.-2026	$ 47.327.011,60	
ESTABILIDAD Y CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	OK	2-feb.-2023	2-feb.-2028	$ 94.654.023,20	ULTIMA ACTUALIZACION DEL CONTRATO: ACTA DE INICIO
CUMPLIMIENTO	OK	28-abr.-2023	29-nov.-2023	$ 94.654.023,20	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	OK	2-feb.-2023	28-jul.-2023	$ 232.000.000,00	

7. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

SE COMTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACION MECANICA PARA LA CAJA DE LA VIA DONDE SE PRESENTA SOCAVACION POR LA ESCORRENTIA DE AGUAS LLUVIAS DESDE EL PR1+730 AL PR1+450 Y PERFILADO CON LA MOTONIVELADORA Y VIBROCOMPACTADO

8. REGISTRO FOTOGRAFICO





GOBERNACION DEL CASANARE

INFORME SEMANAL DE OBRA

CAIPRO





Elaborado por:

ING. ALFREDO VARON
Director de obra

GOBERNACION DEL CASANARE

INFORME SEMANAL DE OBRA


CAIPRO

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME No.	7	**MES:**	JUNIO	**AÑO:**	2023	**PERIODO**	9/06/2023	**AL**	18/06/2023	**PLAZO INICIAL:**	TRES (3) MESES
CONTRATO No.	2653 DE 2022	**OBJETO:**	TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA ACCESO A LA VEREDA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE								
CONTRATISTA DE OBRA	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.			**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S					**FECHA**	26/06/2023


1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

UBICACIÓN GENERAL



MARGUNAL DE LA SELVA

INICIO DE VIA
PR55+830
FINAL DE VIA
PR54+090



2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	viernes, 30 de diciembre de 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 946.540.231,20
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	TRES (3) MESES	VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:	$ 0,00
FECHA DE INICIO:	28/04/2023	FECHA DE TERMINACION:	27/07/2023
PRORROGA :	N/A	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 946.540.231,20	VALOR DEL ANTICIPO:	$ 473.270.115,60

3. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

C

* LA COMISION TOPOGRAFICA REALIZA LABORES DE CONTROL DE VOLUMENES.

* SE HACE EXCAVACION MANUAL PARA ADECUACION DE CUNETAS EN EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL PR1+680 AL PR1+600 MARGEN DERECHO.

* SE REALIZA EXCAVACIÓN MECANICA PARA CAJA DE VIA DESDE EL PR1+720 AL PR1+430.

* CON LA MOTONIVELADORA SE REALIZA LA CONFORMACION DE LA VIA DESDE EL PR1+720 AL PR1+430 Y COMPACATADO CON EL VIBROCOMPACTADOR, ADEMAS SE REALIZA CUNETEO EN AMBOS COSTADOS DE LA VIA PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS

4. CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD MODIFICACION 002	VALOR UNITARIO	AVANCE SEMANAL(ES) ANTERIOR(ES)			AVANCE SEMANA ACTUAL			AVANCE SEMANA TOTAL		
					CANTIDAD MES(ES) ANTERIOR(ES)	VALOR MES(ES) ANTERIOR(ES)	% AVANCE MES(ES) ANTERIOR(ES)	CANTIDAD MES ACTUAL	VALOR MES ACTUAL	% AVANCE MES ACTUAL	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% AVANCE TOTAL ACUMULADO
1	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**												
101	Excavación manual en material común de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	M3	50,44	$ 49.311,14	50,44	$ 2.487.253,90	100,00%		$ -	0,00%	50,44	$ 2.487.254,00	100,00%
2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**												
201	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio clasificado Tmax. 3"	M3	5,87	$ 63.629,51	5,87	$ 373.505,22	100,00%		$ -	0,00%	5,87	$ 373.505,00	100,00%
202	Sub base granular triturada	M3	337,14	$ 99.919,68	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
203	Base granular (INV. 330. 1)	M3	851,58	$ 114.773,79	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
204	Imprimación con emulsión asfáltica	M2	6.544,62	$ 5.007,93	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
205	Mezcal asfáltica MDC-2 o 19	M3	458,12	$ 1.074.126,70	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
3	**OBRAS DE DRENAJE**												
301	Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=0.45 m)	M	1.834,50	$ 50.380,78	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
302	Malla electrosoldada Q-4 o M - 159	KG	1.724,43	$ 7.889,49	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
303	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 Psi	M3	0,96	$ 560.489,26	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
304	Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transportada	M3	50,46	$ 84.101,97	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
305	Relleno de excavación (con material local)	M3	18,35	$ 19.151,09	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
306	Tuberia PVC alcantarillado 16" . Suministro e instal.	M	13,50	$ 310.922,90	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
307	Bolsa o saco con arena de 0.60 x 0.80 para obras de protección	UND	36,00	$ 9.151,84	-	$ -	0,00%	36,00	$ 329.466,24	100,00%	36,00	$ 329.466,00	100,00%
308	Piedra pegada en Mortero 1:4, e=0.15 m	M2	120,59	$ 66.631,87	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
4	**OBRAS DE URBANISMO**												
401	Lineas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrilica, incluye micro esferas (INV. 700. 1)	M	7.336,00	$ 4.184,49	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
402	Señales preventivas (SP), reglamentarios (SR) e informativas (SI) 75 X 75 cm	UND	19,00	$ 575.874,50	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
403	Marcas viales con pintura acrilica para demarcación (simbolos y letreros)	M2	50,40	$ 35.928,70	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
404	Tacha reflectiva	UND	2.703,00	$ 13.136,24	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%

GOBERNACION DEL CASANARE

INFORME SEMANAL DE OBRA

CAIPRO

5	TRANSPORTE															
501	Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	M3-KM	8.435,42	$	1.912,44	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
502	Transporte de material Pétreo (vía destapada)	M3-KM	1.976,64	$	2.022,17	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
6	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE															
601	Excavación mecánica con retiro y disposición final	M3	50,44	$	23.023,91	50,44	$	1.161.326,02	100,00%		$	-	0,00%	50,44	$	1.161.326,00	100,00%

AVANCE DE ACTIVIDADES								
	SUBTOTAL OBRAS	$	4.022.085,00		$	329.466,00		$	4.351.551,00	
	SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)	$	4.022.085,00		$	329.466,00		$	4.351.551,00	
	IMPLEMENTACIÓN PAGA	$	10.710.784,32	3,64%	$	1.561.989,38	0,50%	$	12.272.773,70	4,15%
	PMT	$	18.994.193,28		$	2.769.986,52		$	21.764.179,80	
	CARACTERIZACIÓN VIAL	$	740.486,40		$	107.987,60		$	848.474,00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	$	34.467.549,00		$	4.769.429,50		$	39.236.978,50	

5. COMPARACIÓN PORCENTUAL AVANCE

ACUMULADO PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR %	PROGRAMADO PRESENTE SEMANA %	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO %	ACUMULADO EJECUTADO SEMANA ANTERIOR %	EJECUTADO PRESENTE SEMANA %	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO %	% DE RETRASO O AVANCE
10,70%	2,94%	13,64%	3,64%	0,50%	4,15%	9,49%

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

POLIZAS DE GARANTIA

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
MANEJO DE ANTICIPO	OK	28-abr.-2023	29-nov.-2023	$ 473.270.116,00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	OK	28-abr.-2023	29-jul.-2026	$ 47.327.011,60	
ESTABILIDAD Y CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	OK	2-feb.-2023	2-feb.-2028	$ 94.654.023,20	ULTIMA ACTUALIZACION DEL CONTRATO: ACTA DE INICIO
CUMPLIMIENTO	OK	28-abr.-2023	29-nov.-2023	$ 94.654.023,20	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	OK	2-feb.-2023	28-jul.-2023	$ 232.000.000,00	

7. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

POR LAS FUERTES LLUVIAS QUE REALIZAN SOCAVACIONES LATERALES EN LA VIA SE REALIZA LLENADO DE LONAS CON ARENA PARA INSTALAR UNA TRAS LA OTRA A LO LARGO DE LA CUNETA PARA PROTEGER EL MATERIAL DE LA ESTRUCUTRA DE LA VIA.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO





4189

GOBERNACION DEL CASANARE

INFORME SEMANAL DE OBRA

CAIPRO





Elaborado por:

ING. ALFREDO VARON
Director de obra

GOBERNACION DEL CASANARE

INFORME SEMANAL DE OBRA


CAIPRO

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME No.	8	MES:	JUNIO	AÑO:	2023	PERIODO	16/06/2023	AL	23/06/2023	PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
CONTRATO No.	2653 DE 2022	OBJETO:	TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA ACCESO A LA VEREDA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE								
CONTRATISTA DE OBRA	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.			CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S					FECHA	26/06/2023


1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

UBICACIÓN GENERAL



MARGUNAL DE LA SELVA

INICIO DE VIA
PR55+830
FINAL DE VIA
PR54+090



2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	viernes, 30 de diciembre de 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 946.540.231,20
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	TRES (3) MESES	VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:	$ 0,00
FECHA DE INICIO:	28/04/2023	FECHA DE TERMINACION:	27/07/2023
PRORROGA :	N/A	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 946.540.231,20	VALOR DEL ANTICIPO:	$ 473.270.115,60

3. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

C

* LA COMISION TOPOGRAFICA REALIZA LABORES DE CONTROL DE VOLUMENES.

* SE HACE EXCAVACION MANUAL PARA ADECUACION DE CUNETAS EN EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL PR1+670 AL PR1+480 MARGEN IZQUIERDO.

* SE LLENAN LONAS CON ARENA Y SON INSTALADAS UNAS TRAS OTRA A LO LARGO DE LA CUNETA PARA PROTEGER EL MATERIAL DE LA ESTRUCTURA DE LA VIA POR ACCION DE LA ESCORRENTIA DE AGUAS LLUVIAS DESDE EL PR1+670 AL PR1+630.

* CON LA MOTONIVELADORA SE REALIZA EL PERFILADO DE LA VIA DESDE EL PR1+135 AL PR1+420 Y COMPACATADO CON EL VIBROCOMPACTADOR.

* POR LAS FUERTES Y CONSTANTES LLUIAS QUE SE PRESENTAN EN OBRA, NO SE HA PODIDO TENER UN BUEN AVANCE DE OBRA.

4. CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD MODIFICACION 002	VALOR UNITARIO	AVANCE SEMANAL(ES) ANTERIOR(ES)			AVANCE SEMANA ACTUAL			AVANCE SEMANA TOTAL		
					CANTIDAD MES(ES) ANTERIOR(ES)	VALOR MES(ES) ANTERIOR(ES)	% AVANCE MES(ES) ANTERIOR(ES)	CANTIDAD MES ACTUAL	VALOR MES ACTUAL	% AVANCE MES ACTUAL	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% AVANCE TOTAL ACUMULADO
1	MOVIMIENTO DE TIERRAS												
101	Excavación manual en material común de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	M3	50,44	$ 49.311,14	50,44	$ 2.487.253,90	100,00%		$ -	0,00%	50,44	$ 2.487.254,00	100,00%
2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO												
201	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio clasificado Tmax. 3"	M3	5,87	$ 63.629,51	5,87	$ 373.505,22	100,00%		$ -	0,00%	5,87	$ 373.505,00	100,00%
202	Sub base granular triturada	M3	337,14	$ 99.919,68	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
203	Base granular (INV. 330. 1)	M3	851,58	$ 114.773,79	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
204	Imprimación con emulsión asfáltica	M2	6.544,62	$ 5.007,93	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
205	Mezcal asfáltica MDC-2 o 19	M3	458,12	$ 1.074.126,70	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
3	OBRAS DE DRENAJE												
301	Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=0.45 m)	M	1.834,50	$ 50.380,78	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
302	Malla electrosoldada Q-4 o M - 159	KG	1.724,43	$ 7.889,49	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
303	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 Psi	M3	0,98	$ 560.489,26	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
304	Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transportada	M3	50,46	$ 84.101,97	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
305	Relleno de excavación (con material local)	M3	18,35	$ 19.151,09	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
306	Tuberia PVC alcantarillado 16" . Suministro e instal.	M	13,50	$ 310.922,90	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
307	Bolsa o saco con arena de 0.60 x 0.80 para obras de protección	UND	36,00	$ 9.151,84	36,00	$ 329.466,24	100,00%		$ -	0,00%	36,00	$ 329.466,00	100,00%
308	Piedra pegada en Mortero 1:4, e=0.15 m	M2	120,59	$ 66.631,87	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
4	OBRAS DE URBANISMO												
401	Lineas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrilica, incluye micro esferas (INV. 700. 1)	M	7.336,00	$ 4.184,49	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
402	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 75 X 75 cm	UND	19,00	$ 575.874,50	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
403	Marcas viales con pintura acrilica para demarcación (simbolos y letreros)	M2	50,40	$ 35.928,70	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%

GOBERNACION DEL CASANARE														
INFORME SEMANAL DE OBRA														
404	Tacha reflectiva	UND	2.703,00	$ 13.138,24	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%

GOBERNACION DEL CASANARE

INFORME SEMANAL DE OBRA

5	TRANSPORTE															
501	Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	M3-KM	8.435,42	$	1.912,44	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		
502	Transporte de material Pétreo (vía destapada)	M3-KM	1.976,64	$	2.022,17	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		
6	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE															
601	Excavación mecánica con retiro y disposición final	M3	50,44	$	23.023,91	50,44	$ 1.161.326,02	100,00%		$ -	0,00%	50,44	$ 1.161.326,00	100,00%		

AVANCE DE ACTIVIDADES						
SUBTOTAL OBRAS	$ 4.351.551,00	4,15%	$ -	0,47%	$ 4.351.551,00	4,61%
SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)	$ 4.351.551,00		$ -		$ 4.351.551,00	
IMPLEMENTACIÓN PAGA	$ 12.272.773,70		$ 1.561.989,38		$ 13.834.763,08	
PMT	$ 21.764.179,80		$ 2.769.986,52		$ 24.534.166,32	
CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 848.474,00		$ 107.987,60		$ 956.461,60	
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	**$ 39.236.978,50**		**$ 4.439.963,50**		**$ 43.676.942,00**	

5. COMPARACIÓN PORCENTUAL AVANCE

ACUMULADO PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR %	PROGRAMADO PRESENTE SEMANA %	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO %	ACUMULADO EJECUTADO SEMANA ANTERIOR %	EJECUTADO PRESENTE SEMANA %	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO %	% DE RETRASO O AVANCE
13,64%	6,22%	19,86%	4,15%	0,47%	4,61%	15,25%

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

POLIZAS DE GARANTIA

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
MANEJO DE ANTICIPO	OK	28-abr.-2023	29-nov.-2023	$ 473.270.116,00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	OK	28-abr.-2023	29-jul.-2026	$ 47.327.011,60	
ESTABILIDAD Y CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	OK	2-feb.-2023	2-feb.-2028	$ 94.654.023,20	ULTIMA ACTUALIZACION DEL CONTRATO: ACTA DE INICIO
CUMPLIMIENTO	OK	28-abr.-2023	29-nov.-2023	$ 94.654.023,20	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	OK	2-feb.-2023	28-jul.-2023	$ 232.000.000,00	

7. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

DURANTE ESTA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, YA QUE POR LAS FUERTES LLUVIAS Y POR EL GRADO DE INCLINACION EN EL TRAMO COMPRENDIDO DESDE EL PR1+720 AL PR1+440 SE PRESENTA SOCAVACIONES LATERALES DE LA CALZADA Y DESPLAAMIENTO DE ESTE MATERIAL EN EL PR1+430.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO






4193

GOBERNACION DEL CASANARE	
INFORME SEMANAL DE OBRA	CAIPRO



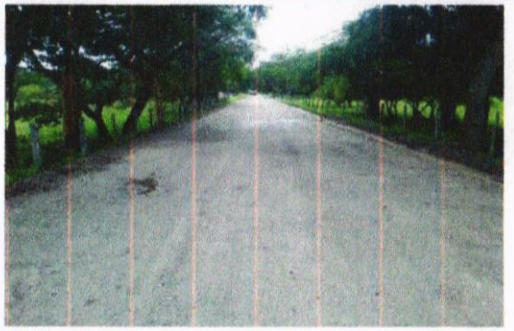

Elaborado por:

ING. ALFREDO VARON
Director de obra

4494

PROYECTOS

Yopal, 03 de noviembre de 2023

GOBERNACIÓN DE CASANARE
RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA
03 NOV 2023
Hora:
No. de Radicación: 13535

SEÑORES:
GOBERNACIÓN DE CASANARE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Dirección técnica de construcciones
La ciudad.

Referencia: CONTRATO DE INTEVENTORIA No 0487 DEL 08 DE FEBRERO DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Entrega de informes semanales de interventoría, hasta el 3 de noviembre del 2023

Mediante el presente oficio esta interventoría realiza la entrega de los informes semanales 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de interventoría del contrato de obra 2653 del 2022. Correspondientes hasta el 3 de noviembre del 2023, para su revisión y aprobación por parte de la supervisión.

Atentamente,

IVON MAYERLY FORERO ABRIL
R/L A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
NIT. 901.126.140-3

Folios: 50

ENTREGADO A ING. LYA CONSTRUCCIONES

Dirección – Calle 11 # 04-20 Trinidad Casanare – Cel. 3233118725
Email: aypingenieriasas@gmail.com

07-NOVIEMBRE-2023
RECIBIDO INTERVENTORIA
4195

CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S

Bogotá, 07 noviembre de 2023, Municipio de Yopal Casanare

Señores
A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
Ing. Ivon Mayerly Forero Abril

Ref.: "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 de 2022-12-30 cuyo objeto: Terminación del Mejoramiento a nivel de Pavimento de la vía acceso a la vereda Turua – Municipio de Aguazul – Departamento de Casanare."

Asunto: entrega de informes semanales de obra No 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20.

Por medio de la presente se hace la entrega de los informes semanales de obra No 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Correspondientes desde el 16 de agosto de 2023 hasta el 3 de noviembre de 2023. Para su revisión y aprobación

Cordialmente,

ING. ALFREDO RESTREPO VARON
C.C. 19.250.092 de Bogotá
Director de Obra Caipro Constructores S.A.S
Cel: 3108677565

Su proyecto,
nuestro
compromiso

4196

10

INFORME SEMANAL DE OBRA


CAIPRO

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME No.	10	**MES:**	AGOSTO	**AÑO:**	2023	**PERIODO**	16/08/2023	**AL**	25/08/2023	**PLAZO INICIAL:**	TRES (3) MESES
CONTRATO No.	2653 DE 2022	**OBJETO:**	TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA ACCESO A LA VEREDA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE								
CONTRATISTA DE OBRA	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.			**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S					**FECHA**	25/08/2023

1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

UBICACIÓN GENERAL



MARGUNAL DE LA SELVA

INICIO DE VIA
PR55+830
FINAL DE VIA
PR54+090



2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	viernes, 30 de diciembre de 2022	FECHA DE TERMINACION INICIAL	27/07/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	TRES (3) MESES	SUSPENSION No 1	27/06/2023
FECHA DE INICIO:	28/04/2023	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSION No 1	17/07/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 946.540.231,20	REINICIO No 1	16/08/2023
VALOR DEL ANTICIPO:	$ 473.270.115,60	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	15/09/2023

3. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

* SE APRUEBA EL ACTA DE REINICIO DEBIÓ A QUE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS HAN MEJORADO Y ES POSIBLE CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES EN OBRA

* SE REALIZA UNA MESA DE TRABAJO EN CONJUNTO CON SUPERVISIÓN, INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA PARA AJUSTAR LOS ÍTEMS A APROBAR EN LA SOLICITUD DE MODIFICATORIA # 1

* SE REINICIA LOS TRABAJOS DE CONTROL DE AGUAS ENTRE EL PR1+450 HASTA EL PR1+730

* INICIAN LOS TRABAJOS DE REMOCIÓN DE ARENAS Y MATERIAL GRANULAR ACOPIADO EN EL PR1+450 DEBIDO A LA ESCORRENTÍA GENERADA POR LAS LLUVIAS.

4. CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD INICIAL	VALOR UNITARIO	AVANCE SEMANAL(ES) ANTERIOR(ES)			AVANCE SEMANA ACTUAL			AVANCE SEMANA TOTAL		
					CANTIDAD SEMANA(S) ANTERIOR(ES)	VALOR SEMANA(S) ANTERIOR(ES)	% AVANCE SEMANA(S) ANTERIOR(ES)	CANTIDAD SEMANA ACTUAL	VALOR SEMANA ACTUAL	% AVANCE SEMANA ACTUAL	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% AVANCE TOTAL ACUMULADO
1	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**												
101	Excavación manual en material común de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	M3	50,44	$ 49.311,14	50,44	$ 2.487.253,90	100,00%		$ -	0,00%	50,44	$ 2.487.254,00	100,00%
2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**												
201	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio clasificado Tmax. 3"	M3	5,87	$ 63.629,51	5,87	$ 373.505,22	100,00%	-	$ -	0,00%	5,87	$ 373.505,00	100,00%
202	Sub base granular triturada	M3	337,14	$ 99.919,68	80,00	$ 7.993.574,40	23,73%	40,00	$ 3.996.787,20	11,86%	120,00	$ 11.990.362,00	35,59%
203	Base granular (INV. 330. 1)	M3	851,58	$ 114.773,79	62,00	$ 7.115.974,98	7,28%	35,00	$ 4.017.082,85	4,11%	97,00	$ 11.133.058,00	11,39%
204	Imprimación con emulsión asfáltica	M2	6.544,62	$ 5.007,93	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
205	Mezcal asfáltica MDC-2 o 19	M3	458,12	$ 1.074.126,70	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
3	**OBRAS DE DRENAJE**												
301	Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=0.45 m)	M	1.834,50	$ 50.380,78	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%

INFORME SEMANAL DE OBRA

CAIPRO

302	Malla electrosoldada Q-4 o M - 159	KG	1.724,43	$	7.889,49	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
303	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 Psi	M3	0,96	$	560.489,26	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
304	Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transportada	M3	50,46	$	84.101,97		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
305	Relleno de excavación (con material local)	M3	18,35	$	19.151,09		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
306	Tubería PVC alcantarillado 16" . Suministro e instal.	M	13,50	$	310.922,90		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
307	Bolsa o saco con arena de 0.80 x 0.80 para obras de protección	UND	36,00	$	9.151,84		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
308	Piedra pegada en Mortero 1:4, e=0.15 m	M2	120,59	$	66.631,87	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
4	OBRAS DE URBANISMO													
401	Lineas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrilica, incluye micro esferas (INV. 700. 1)	M	7.336,00	$	4.184,49	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
402	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 75 X 75 cm	UND	19,00	$	575.874,50	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
403	Marcas viales con pintura acrilica para demarcación (simbolos y letreros)	M2	50,40	$	35.928,70	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
404	Tacha reflectiva	UND	2.703,00	$	13.136,24	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
5	TRANSPORTE													
501	Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	M3-KM	8.435,42	$	1.912,44	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
502	Transporte de material Pétreo (vía destapada)	M3-KM	1.976,64	$	2.022,17	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
6	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE													
601	Excavación mecánica con retiro y disposición final	M3	50,44	$	23.023,91	50,44	$ 1.161.326,02	100,00%		$ -	0,00%	50,44	$ 1.161.326,00	100,00%

AVANCE DE ACTIVIDADES							
	SUBTOTAL OBRAS	$ 19.131.635,00	5,37%	$ 8.013.870,00	0,85%	$ 27.145.505,00	6,22%
	SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)	$ 19.131.635,00		$ 8.013.870,00		$ 27.145.505,00	
	IMPLEMENTACIÓN PAGA	$ 11.157.067,00		$ -		$ 11.157.067,00	
	PMT	$ 19.785.618,00		$ -		$ 19.785.618,00	
	CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 771.340,00		$ -		$ 771.340,00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	**$ 50.845.660,00**		**$ 8.013.870,00**		**$ 58.859.530,00**	

5. COMPARACIÓN PORCENTUAL AVANCE

ACUMULADO PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR %	PROGRAMADO PRESENTE SEMANA %	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO %	ACUMULADO EJECUTADO SEMANA ANTERIOR %	EJECUTADO PRESENTE SEMANA %	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO %	% DE RETRASO O AVANCE
39,70%	35,40%	75,10%	5,37%	0,85%	6,22%	68,88%

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

POLIZAS DE GARANTIA

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
MANEJO DE ANTICIPO	OK	28-abr.-2023	20-feb.-2024	$ 473.270.116,00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	OK	28-abr.-2023	20-oct.-2026	$ 47.327.011,60	
ESTABILIDAD Y CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	OK	2-feb.-2023	2-feb.-2028	$ 94.654.023,20	ULTIMA ACTUALIZACION DEL CONTRATO: ACTA DE REINICIO No 1
CUMPLIMIENTO	OK	28-abr.-2023	20-feb.-2024	$ 94.654.023,20	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	OK	19-sep.-2023	20-oct.-2023	$ 232.000.000,00	


7. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

INFORME SEMANAL DE OBRA

CAIPRO

8. REGISTRO FOTOGRAFICO



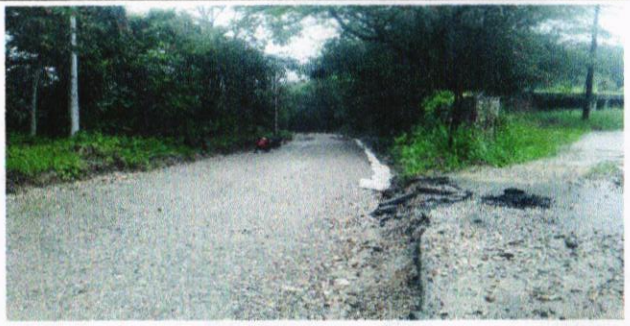





Elaborado por:

ING. ALFREDO VARON
Director de obra

4499

11

INFORME SEMANAL DE OBRA


CAIPRO

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME No.	11	**MES:**	AGOSTO	**AÑO:**	2023	**PERIODO**	26/08/2023	**AL**	1/09/2023	**PLAZO INICIAL:**	TRES (3) MESES
CONTRATO No.	2653 DE 2022	**OBJETO:**	TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA ACCESO A LA VEREDA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE								
CONTRATISTA DE OBRA	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.					**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S			**FECHA**	1/09/2023


1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

UBICACIÓN GENERAL



MARGINAL DE LA SELVA

INICIO DE VIA
PR55+830
FINAL DE VIA
PR54+090



2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	viernes, 30 de diciembre de 2022	FECHA DE TERMINACION INICIAL	27/07/2023		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	TRES (3) MESES	SUSPENSION No 1	27/06/2023		
FECHA DE INICIO:	26/04/2023	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSION No 1	17/07/2023		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 946.540.231,20	REINICIO No 1	16/08/2023		
VALOR DEL ANTICIPO:	$ 473.270.115,60	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	15/09/2023		

3. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

* SE DETERMINA ENTRE LA SUPERVISIÓN, INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA LOS ÍTEMS NO PREVISTOS LOS CUALES SE REQUIEREN PARA DAR CONTINUIDAD CON LOS TRABAJOS Y CONCLUIR CON LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE MATERIAL PÉTREO EN LA VÍA.

* LOS POSIBLES ÍTEMS A INCLUIR EN EL MODIFICATORIA # 1 SON LOS SIGUIENTES:

- Demolición de cunetas con Retiro mecánico
- Rocería con retiro
- Corte en carpeta asfáltica
- Demolición mecánica en pavimento en concreto asfaltico (inc. Retiro)
- Movilización y Desmovilización de equipo pesado
- Desmonte y limpieza (incluye retiro)
- Filtro O Dren Francés PVC 100 MM (0,4X0,6) M

* SE ACLARO QUE NO ES POSIBLE EN EL MOMENTO ADICIONAR MAS RECURSOS POR LO CUAL SE HARÁ UN BALANCE INCLUYENDO LOS NUEVOS ÍTEM NO PREVISTOS Y SE PRIORIZARA LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEGAR A LA META FÍSICA DEL PROYECTO.

4. CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD INICIAL	VALOR UNITARIO	AVANCE SEMANAL(ES) ANTERIOR(ES)			AVANCE SEMANA ACTUAL			AVANCE SEMANA TOTAL		
					CANTIDAD SEMANA(S) ANTERIOR(ES)	VALOR SEMANA(S) ANTERIOR(ES)	% AVANCE SEMANA(S) ANTERIOR(ES)	CANTIDAD SEMANA ACTUAL	VALOR SEMANA ACTUAL	% AVANCE SEMANA ACTUAL	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% AVANCE TOTAL ACUMULADO
1	MOVIMIENTO DE TIERRAS												
101	Excavación manual en material común de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	M3	50,44	$ 49.311,14	50,44	$ 2.487.253,90	100,00%		$ -	0,00%	50,44	$ 2.487.254,00	100,00%
2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO												
201	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio clasificado Tmax. 3"	M3	5,87	$ 63.629,51	5,87	$ 373.505,22	100,00%	-	$ -	0,00%	5,87	$ 373.505,00	100,00%
202	Sub base granular triturada	M3	337,14	$ 99.919,68	120,00	$ 11.990.361,60	35,59%	22,00	$ 2.198.232,96	6,53%	142,00	$ 14.188.595,00	42,12%
203	Base granular (INV. 330. 1)	M3	851,58	$ 114.773,79	97,00	$ 11.133.057,63	11,39%		$ -	0,00%	97,00	$ 11.133.058,00	11,39%
204	Imprimación con emulsión asfáltica	M2	6.544,62	$ 5.007,93	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%

INFORME SEMANAL DE OBRA

CAIPRO

205	Mezcal asfáltica MDC-2 o 19	M3	458,12	$ 1.074.126,70	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
3	OBRAS DE DRENAJE												
301	Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=0.45 m)	M	1.834,50	$ 50.380,78	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
302	Malla electrosoldada Q-4 o M - 159	KG	1.724,43	$ 7.889,49	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
303	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 Psi	M3	0,96	$ 560.489,26	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
304	Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transportada	M3	50,46	$ 84.101,97		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
305	Relleno de excavación (con material local)	M3	18,35	$ 19.151,09		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
306	Tubería PVC alcantarillado 16" . Suministro e instal.	M	13,50	$ 310.922,90		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
307	Bolsa o saco con arena de 0.60 x 0.80 para obras de protección	UND	36,00	$ 9.151,84		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
308	Piedra pegada en Mortero 1:4, e=0.15 m	M2	120,59	$ 66.631,87	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
4	OBRAS DE URBANISMO												
401	Líneas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700. 1)	M	7.336,00	$ 4.184,49	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
402	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 75 X 75 cm	UND	19,00	$ 575.874,50	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
403	Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (símbolos y letreros)	M2	50,40	$ 35.928,70	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
404	Tacha reflectiva	UND	2.703,00	$ 13.136,24	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
5	TRANSPORTE												
501	Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	M3-KM	8.435,42	$ 1.912,44	-	$ -	0,00%	1.249,82	$ 2.390.205,76	14,82%	1.249,82	$ 2.390.206,00	14,82%
502	Transporte de material Pétreo (vía destapada)	M3-KM	1.976,64	$ 2.022,17	-	$ -	0,00%	292,86	$ 592.212,71	14,82%	292,86	$ 592.213,00	14,82%
6	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE												
601	Excavación mecánica con retiro y disposición final	M3	50,44	$ 23.023,91	50,44	$ 1.161.326,02	100,00%		$ -	0,00%	50,44	$ 1.161.326,00	100,00%

AVANCE DE ACTIVIDADES					
SUBTOTAL OBRAS	$ 27.145.504,00		$ 5.180.651,00		$ 32.326.157,00	
SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)	$ 27.145.504,00		$ 5.180.651,00		$ 32.326.157,00	
IMPLEMENTACIÓN PAGA	$ 11.157.067,00	6,22%	$ -	0,55%	$ 11.157.067,00	6,77%
PMT	$ 19.785.618,00		$ -		$ 19.785.618,00	
CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 771.340,00		$ -		$ 771.340,00	
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	**$ 58.859.529,00**		**$ 5.180.651,00**		**$ 64.040.182,00**	

5. COMPARACIÓN PORCENTUAL AVANCE

ACUMULADO PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR %	PROGRAMADO PRESENTE SEMANA %	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO %	ACUMULADO EJECUTADO SEMANA ANTERIOR %	EJECUTADO PRESENTE SEMANA %	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO %	% DE RETRASO O AVANCE
75,10%	11,50%	86,60%	6,22%	0,55%	6,77%	79,83%

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

POLIZAS DE GARANTIA

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
MANEJO DE ANTICIPO	OK	28-abr.-2023	20-feb.-2024	$ 473.270.116,00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	OK	28-abr.-2023	20-oct.-2026	$ 47.327.011,60	
ESTABILIDAD Y CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	OK	2-feb.-2023	2-feb.-2028	$ 94.654.023,20	ULTIMA ACTUALIZACION DEL CONTRATO: ACTA DE REINICIO No 1
CUMPLIMIENTO	OK	28-abr.-2023	20-feb.-2024	$ 94.654.023,20	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	OK	19-sep.-2023	20-oct.-2023	$ 232.000.000,00	

7. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

4201

11


INFORME SEMANAL DE OBRA

CAIPRO

8. REGISTRO FOTOGRAFICO





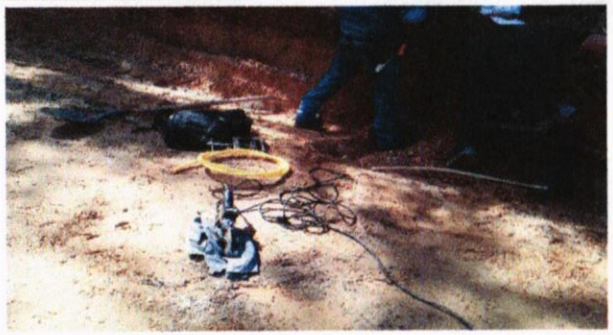



Elaborado por:

ING. ALFREDO VARON
Director de obra







4202

12

INFORME SEMANAL DE OBRA


CAIPRO

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME No.	12	**MES:**	SEPTIEMBRE	**AÑO:**	2023	**PERIODO**	2/09/2023	**AL**	8/09/2023	**PLAZO INICIAL:**	TRES (3) MESES
CONTRATO No.	2653 DE 2022	**OBJETO:**	TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA ACCESO A LA VEREDA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE								
CONTRATISTA DE OBRA	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.			**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S					**FECHA**	8/09/2023

1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

UBICACIÓN GENERAL



MARGINAL DE LA SELVA

INICIO DE VIA
PR55+830
FINAL DE VIA
PR54+090



2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	viernes, 30 de diciembre de 2022	FECHA DE TERMINACION INICIAL	27/07/2023		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	TRES (3) MESES	SUSPENSION No 1	27/06/2023		
FECHA DE INICIO:	28/04/2023	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSION No 1	17/07/2023		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 946.540.231,20	REINICIO No 1	16/08/2023		
VALOR DEL ANTICIPO:	$ 473.270.115,60	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	15/09/2023		

3. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

* SE RADICO ANTE LA SUPERVISIÓN LA SOLICITUD DE MODIFICATORIA # 1 AL CONTRATO DE OBRA 2653 DE 2022, JUNTO AL AVAL POR PARTE DE INTERVENTORÍA DE SU REVISIÓN Y APROBACIÓN.

* SE PROYECTO QUE LAS ACTIVIDADES QUE NO FUERON CATALOGADAS COMO DE ALTA PRIORIDAD PARA EL PRESENTE SOLICITUD DE MODIFICATORIO # 1, SE HARÁ SU SOLICITUD DE RECURSOS Y TIEMPO PARA SU EJECUCIÓN MEDIANTE LA SOLICITUD DE UN ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA 2653 DE 2022.

* TERMINO LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN MANUAL E INSTALACIÓN DE SACOS CON ARENA PARA EL CONTROL DE ESCORRENTÍAS ENTRE LOS PR1+450 HASTA EL PR 1+750.

* TERMINARON LOS TRABAJOS DE RETIRO DE ARENAS Y MATERIAL PÉTREO CONTAMINADO, EL CUAL FUE ACUMULADO POR LA ESCORRENTÍA EN EL PR1 +450.

* TERMINA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y SE PROCEDE A REVISIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA PARA SU ENTREGA A LA SUPERVISIÓN.

4. CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD INICIAL	VALOR UNITARIO	AVANCE SEMANAL(ES) ANTERIOR(ES)			AVANCE SEMANA ACTUAL			AVANCE SEMANA TOTAL		
					CANTIDAD SEMANA(S) ANTERIOR(ES)	VALOR SEMANA(S) ANTERIOR(ES)	% AVANCE SEMANA(S) ANTERIOR(ES)	CANTIDAD SEMANA ACTUAL	VALOR SEMANA ACTUAL	% AVANCE SEMANA ACTUAL	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% AVANCE TOTAL ACUMULADO
1	MOVIMIENTO DE TIERRAS												
101	Excavación manual en material común de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	M3	50,44	$ 49.311,14	50,44	$ 2.487.253,90	100,00%		$ -	0,00%	50,44	$ 2.487.254,00	100,00%
2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO												
201	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio clasificado Tmax. 3"	M3	5,87	$ 63.629,51	5,87	$ 373.505,22	100,00%	-	$ -	0,00%	5,87	$ 373.505,00	100,00%
202	Sub base granular triturada	M3	337,14	$ 99.919,68	142,00	$ 14.188.594,56	42,12%	66,00	$ 6.594.698,88	19,56%	208,00	$ 20.783.293,00	61,70%
203	Base granular (INV. 330. 1)	M3	851,58	$ 114.773,79	97,00	$ 11.133.057,63	11,39%		$ -	0,00%	97,00	$ 11.133.058,00	11,39%
204	Imprimación con emulsión asfáltica	M2	6.544,62	$ 5.007,93	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
205	Mezcal asfáltica MDC-2 o 19	M3	458,12	$ 1.074.126,70	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
3	OBRAS DE DRENAJE												
301	Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=0.45 m)	M	1.834,50	$ 50.380,78	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
302	Malla electrosoldada Q-4 o M - 159	KG	1.724,43	$ 7.889,49	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
303	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 Psi	M3	0,96	$ 560.489,26	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
304	Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transportada	M3	50,46	$ 84.101,97		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%

12

INFORME SEMANAL DE OBRA

CAIPRO

305	Relleno de excavación (con material local)	M3	18,35	$ 19.151,09		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
306	Tubería PVC alcantarillado 16" . Suministro e instal.	M	13,50	$ 310.922,90		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
307	Bolsa o saco con arena de 0.60 x 0.80 para obras de protección	UND	36,00	$ 9.151,84		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
308	Piedra pegada en Mortero 1:4, e=0.15 m	M2	120,59	$ 66.631,87	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
4	OBRAS DE URBANISMO												
401	Líneas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700. 1)	M	7.336,00	$ 4.184,49	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
402	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 75 X 75 cm	UND	19,00	$ 575.674,50	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
403	Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (símbolos y letreros)	M2	50,40	$ 35.928,70	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
404	Tacha reflectiva	UND	2.703,00	$ 13.136,24	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
5	TRANSPORTE												
501	Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	M3-KM	8.435,42	$ 1.912,44	1.249,82	$ 2.390.205,76	14,82%	336,86	$ 644.224,54	3,99%	1.586,68	$ 3.034.430,00	18,81%
502	Transporte de material Pétreo (vía destapada)	M3-KM	1.976,64	$ 2.022,17	292,86	$ 592.212,71	14,82%	78,94	$ 159.630,10	3,99%	371,80	$ 751.843,00	18,81%
6	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE												
601	Excavación mecánica con retiro y disposición final	M3	50,44	$ 23.023,91	50,44	$ 1.161.326,02	100,00%		$ -	0,00%	50,44	$ 1.161.326,00	100,00%

AVANCE DE ACTIVIDADES						
SUBTOTAL OBRAS	$ 32.326.156,00		$ 7.398.554,00		$ 39.724.709,00	
SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)	$ 32.326.156,00		$ 7.398.554,00		$ 39.724.709,00	
IMPLEMENTACIÓN PAGA	$ 11.157.067,00	6,77%	$ -	0,78%	$ 11.157.067,00	7,55%
PMT	$ 19.785.618,00		$ -		$ 19.785.618,00	
CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 771.340,00		$ -		$ 771.340,00	
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	**$ 64.040.181,00**		**$ 7.398.554,00**		**$ 71.438.734,00**	

5. COMPARACIÓN PORCENTUAL AVANCE

ACUMULADO PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR %	PROGRAMADO PRESENTE SEMANA %	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO %	ACUMULADO EJECUTADO SEMANA ANTERIOR %	EJECUTADO PRESENTE SEMANA %	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO %	% DE RETRASO O AVANCE
86,68%	9,40%	96,08%	6,77%	0,78%	7,55%	88,45%

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

POLIZAS DE GARANTIA

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
MANEJO DE ANTICIPO	OK	28-abr.-2023	20-feb.-2024	$ 473.270.116,00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	OK	28-abr.-2023	20-oct.-2026	$ 47.327.011,60	
ESTABILIDAD Y CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	OK	2-feb.-2023	2-feb.-2028	$ 94.654.023,20	ULTIMA ACTUALIZACION DEL CONTRATO: ACTA DE REINICIO No 1
CUMPLIMIENTO	OK	28-abr.-2023	20-feb.-2024	$ 94.654.023,20	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	OK	19-sep.-2023	20-oct.-2023	$ 232.000.000,00	

7. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

4204

12

INFORME SEMANAL DE OBRA

CAIPRO

8. REGISTRO FOTOGRAFICO









Elaborado por:

ING. ALFREDO VARON
Director de obra

4205

13

INFORME SEMANAL DE OBRA


CAIPRO

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME No.	13	**MES:**	SEPTIEMBRE	**AÑO:**	2023	**PERIODO**	9/09/2023	**AL**	15/09/2023	**PLAZO INICIAL:**	TRES (3) MESES
CONTRATO No.	2653 DE 2022	**OBJETO:**	TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA ACCESO A LA VEREDA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE								
CONTRATISTA DE OBRA	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.			**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S					**FECHA**	15/09/2023

1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

UBICACIÓN GENERAL



MARGINAL DE LA SELVA

INICIO DE VIA
PR55+830
FINAL DE VIA
PR54+090



2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	viernes, 30 de diciembre de 2022	FECHA DE TERMINACION INICIAL	27/07/2023	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	16/10/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	TRES (3) MESES	SUSPENSION No 1	27/06/2023		
FECHA DE INICIO:	28/04/2023	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSION No 1	17/07/2023		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 946.540.231,20	REINICIO No 1	16/08/2023		
VALOR DEL ANTICIPO:	$ 473.270.115,60	PRORROGA No 1	11/09/2023		

3. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

* SE HACE LA APROBACIÓN DEL ACTA MODIFICATORIA # 1 EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL CONTRATO DE OBRA 2653 DE 2022

* SE REALIZA LA REPROGRAMACIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA Y SE AJUSTA EL PORCENTAJE PROGRAMADO Y EJECUTADO EN EL PRESENTE INFORME.

* SE APRUEBA LA SOLICITUD DE PRORROGA POR UN MES A PARTIR EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HASTA EL 16 DE OCTUBRE DE 2023. AL CONTRATO DE OBRA 2653 DE 2022.

* SE REALIZA LA DEMOLICIÓN DE 148,11 M3 DE CUNETA EXISTENTE EN OBRA, LA CUAL NO CONTABA CON LOS REQUERIMIENTOS TÈCNICOS NI COTAS DE ACABADO DE LA VÍA.

* INICIA LOS TRABAJOS DE ROCERÍA EN LA TOTALIDAD DE LA VÍA, EN AMBOS COSTADOS

* SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN MANUAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO ENTRE LOS PR 1+450 HASTA PR1+720, COSTADO DERECHO E IZQUIERDO.

4. CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD MODIFICATORIA N0 1	VALOR UNITARIO	AVANCE SEMANAL(ES) ANTERIOR(ES)			AVANCE SEMANA ACTUAL			AVANCE SEMANA TOTAL		
					CANTIDAD SEMANA(S) ANTERIOR(ES)	VALOR SEMANA(S) ANTERIOR(ES)	% AVANCE SEMANA(S) ANTERIOR(ES)	CANTIDAD SEMANA ACTUAL	VALOR SEMANA ACTUAL	% AVANCE SEMANA ACTUAL	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% AVANCE TOTAL ACUMULADO
1	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**												
101	Excavación manual en material común de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	M3	376,70	$ 49.311,14	50,44	$ 2.487.253,90	13,39%	45,00	$ 2.219.001,30	11,95%	95,44	$ 4.706.255,00	25,34%
2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**												
201	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio clasificado Tmax. 3"	M3	643,08	$ 63.629,51	5,87	$ 373.505,22	0,91%	100,00	$ 6.362.951,00	15,55%	105,87	$ 6.736.456,00	16,46%
202	Sub base granular triturada	M3	308,93	$ 99.919,68	208,00	$ 20.783.293,44	67,33%		$ -	0,00%	208,00	$ 20.783.293,00	67,33%
203	Base granular (INV. 330. 1)	M3	824,01	$ 114.773,79	97,00	$ 11.133.057,63	11,77%	180,00	$ 20.659.282,20	21,84%	277,00	$ 31.792.340,00	33,62%
204	Imprimación con emulsión asfáltica	M2	6.373,62	$ 5.007,93	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
205	Mezcla asfáltica MDC-2 o 19	M3	446,15	$ 1.074.126,70	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
3	**OBRAS DE DRENAJE**												
301	Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=0.45 m)	M	123,05	$ 50.380,78	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
302	Malla electrosoldada Q-4 o M - 159	KG	115,67	$ 7.889,49	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%

4206

303	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 Psi	M3	-	$ 560.489,26	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
304	Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compectada y transportada	M3	11,07	$ 84.101,97	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
305	Relleno de excavación (con material local)	M3	4,43	$ 19.151,09	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
306	Tubería PVC alcantarillado 16" . Suministro e instal.	M	-	$ 310.922,90	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
307	Bolsa o saco con arena de 0.60 x 0.80 para obras de protección	UND	-	$ 9.151,84	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
308	Piedra pegada en Mortero 1:4, e=0.15 m	M2	-	$ 66.631,87	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
4	**OBRAS DE URBANISMO**												
401	Líneas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700. 1)	M	-	$ 4.184,49	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
402	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 75 X 75 cm	UND	-	$ 575.874,50	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
403	Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (simbolos y letreros)	M2	-	$ 35.928,70	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
404	Tacha reflectiva	UND	-	$ 13.136,24	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
5	**TRANSPORTE**												
501	Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	M3-KM	11.398,46	$ 1.912,44	1.586,68	$ 3.034.430,30	13,92%	1.429,12	$ 2.733.106,25	12,54%	3.015,80	$ 5.767.537,00	26,46%
502	Transporte de material Pétreo (vía destapada)	M3-KM	2.670,96	$ 2.022,17	371,80	$ 751.842,81	13,92%	334,88	$ 677.184,29	12,54%	706,68	$ 1.429.027,00	26,46%
6	**RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE**												
601	Excavación mecánica con retiro y disposición final	M3	162,72	$ 23.023,91	50,44	$ 1.161.326,02	31,00%	112,28	$ 2.585.124,61	69,00%	162,72	$ 3.746.451,00	100,00%
7	**NO PREVISTOS**												
NP-01	Demolición de cunetas con Retiro mecánico	M3	148,11	$ 182.801,46	-	$ -	0,00%	148,11	$ 27.074.724,24	100,00%	148,11	$ 27.074.724,00	100,00%
NP-02	Rocería con retiro	HA	1,65	$ 635.382,44	-	$ -	0,00%	0,80	$ 508.305,95	48,48%	0,80	$ 508.306,00	48,48%
NP-03	Corte en carpeta asfáltica	M	22,30	$ 11.798,70	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
NP-04	Demolición mecánica en pavimento en concreto asfaltico (inc. Retiro)	M2	415,96	$ 14.966,46	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
NP-05	Movilización y Desmovilización de equipo pesado	KM	225,00	$ 43.200,26	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
NP-06	Desmonte y limpieza (incluye retiro)	M2	1.422,00	$ 3.904,76	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
NP-07	Filtro O Dren Francés PVC 100 MM (0,4X0,6) M	M	1.053,00	$ 93.139,38	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%

AVANCE DE ACTIVIDADES						
	SUBTOTAL OBRAS	$ 39.724.709,00		$ 62.819.680,00		$ 102.544.389,00	
	SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)	$ 39.724.709,00		$ 62.819.680,00		$ 102.544.389,00	
	IMPLEMENTACIÓN PAGA	$ 11.157.067,00	7,55%	$ 5.578.533,50	8,31%	$ 16.735.600,50	15,86%
	PMT	$ 19.785.618,00		$ 9.892.809,00		$ 29.678.427,00	
	CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 771.340,00		$ 385.670,00		$ 1.157.010,00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	**$ 71.438.734,00**		**$ 78.676.692,50**		**$ 150.115.426,50**	

5. COMPARACIÓN PORCENTUAL AVANCE

ACUMULADO PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR %	PROGRAMADO PRESENTE SEMANA %	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO %	ACUMULADO EJECUTADO SEMANA ANTERIOR %	EJECUTADO PRESENTE SEMANA %	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO %	% DE RETRASO O AVANCE
46,10%	12,50%	58,60%	7,55%	8,31%	15,86%	42,74%

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

POLIZAS DE GARANTIA

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
MANEJO DE ANTICIPO	OK	28-abr.-2023	21-mar.-2024	$ 473.270.116,00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	OK	28-abr.-2023	20-nov.-2026	$ 47.327.011,60	
ESTABILIDAD Y CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	OK	2-feb.-2023	2-feb.-2028	$ 94.654.023,20	ULTIMA ACTUALIZACION DEL CONTRATO: ACTA DE PRORROGA No 1
CUMPLIMIENTO	OK	28-abr.-2023	21-mar.-2024	$ 94.654.023,20	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	OK	20-oct.-2023	20-nov.-2023	$ 232.000.000,00	

4207

13	
INFORME SEMANAL DE OBRA	CAIPRO

7. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

8. REGISTRO FOTOGRAFICO









Elaborado por:

ING. ALFREDO VARON
Director de obra







4208

14

INFORME SEMANAL DE OBRA


CAIPRO

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME No.	14	**MES:**	SEPTIEMBRE	**AÑO:**	2023	**PERIODO**	16/09/2023	**AL**	22/09/2023	**PLAZO INICIAL:**	TRES (3) MESES
CONTRATO No.	2653 DE 2022	**OBJETO:**	TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA ACCESO A LA VEREDA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE								
CONTRATISTA DE OBRA	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.			**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S					**FECHA**	22/09/2023

1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

UBICACIÓN GENERAL



MARGINAL DE LA SELVA

INICIO DE VIA
PR55+830
FINAL DE VIA
PR54+090



2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	viernes, 30 de diciembre de 2022	FECHA DE TERMINACION INICIAL	27/07/2023	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	16/10/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	TRES (3) MESES	SUSPENSION No 1	27/06/2023		
FECHA DE INICIO:	28/04/2023	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSION No 1	17/07/2023		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 946.540.231,20	REINICIO No 1	16/08/2023		
VALOR DEL ANTICIPO:	$ 473.270.115,60	PRORROGA No 1	11/09/2023		

3. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

* SE REALIZA EL CORTE DE ASFALTO PARA CONFORMAR LA JUNTA ENTRE EL ASFALTO EXISTENTE Y EL NUEVO EN LOS PR 000 +000, PR 000 +926,42, PR 001 +806, PARA UN TOTAL DE 22,3 ML

* TERMINA LA INSTALACIÓN DE MATERIAL SUB BASE ENTRE EL PR 0+00 HASTA EL PR 0+56

* CONTINUA LOS TRABAJOS DE ROCERIA EN LOS COSTADOS DE LA VIA.

* CONTINUA LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN MANUAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO ENTRE LOS PR 1+450 HASTA PR1+720, COSTADO DERECHO E IZQUIERDO.

* SE REALIZA TOMA DE DENSIDADES AL MATERIAL SUB BASE INSTALADO ENTRE LOS PR 0+00 HASTA EL PR 0+56, PARA DAR INICIO CON LA INSTALACIÓN DE BASE DESDE EL PR 0+00 HASTA EL PR 0+145. (CERO AL PUENTE)

* TERMINA LA INSTALACIÓN DE MATERIAL BASE EN EL PR 000+175 - PR 000+212,69

* INICIA LA INSTALACIÓN DE MATERIAL BASE EN EL PR 001+130,35 - PR 001+450

4. CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD MODIFICATORIA NO 1	VALOR UNITARIO	AVANCE SEMANAL(ES) ANTERIOR(ES)			AVANCE SEMANA ACTUAL			AVANCE SEMANA TOTAL		
					CANTIDAD SEMANA(S) ANTERIOR(ES)	VALOR SEMANA(S) ANTERIOR(ES)	% AVANCE SEMANA(S) ANTERIOR(ES)	CANTIDAD SEMANA ACTUAL	VALOR SEMANA ACTUAL	% AVANCE SEMANA ACTUAL	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% AVANCE TOTAL ACUMULADO
1	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**												
101	Excavación manual en material común de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	M3	376,70	$ 49.311,14	95,44	$ 4.706.255,20	25,34%	45,00	$ 2.219.001,30	11,95%	140,44	$ 6.925.257,00	37,28%
2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**												
201	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de río clasificado Tmax. 3"	M3	643,08	$ 63.629,51	105,87	$ 6.736.456,22	16,46%	190,00	$ 12.089.606,90	29,55%	295,87	$ 18.826.063,00	46,01%
202	Sub base granular triturada	M3	308,93	$ 99.919,68	208,00	$ 20.783.293,44	67,33%	50,00	$ 4.995.984,00	16,18%	258,00	$ 25.779.277,00	83,51%
203	Base granular (INV. 330. 1)	M3	824,01	$ 114.773,79	277,00	$ 31.792.339,83	33,62%	120,00	$ 13.772.854,80	14,56%	397,00	$ 45.565.195,00	48,18%
204	Imprimación con emulsión asfáltica	M2	6.373,62	$ 5.007,93	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
205	Mezcla asfáltica MDC-2 o 19	M3	446,15	$ 1.074.126,70	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
3	**OBRAS DE DRENAJE**												

301	Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=0.45 m)	M	123,05	$ 50.380,78	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
302	Malla electrosoldada Q-4 o M - 159	KG	115,67	$ 7.889,49	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
303	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 Psi	M3	-	$ 560.489,26	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
304	Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transportada	M3	11,07	$ 84.101,97	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
305	Relleno de excavación (con material local)	M3	4,43	$ 19.151,09	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
306	Tubería PVC alcantarillado 16" . Suministro e instal.	M	-	$ 310.922,90	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
307	Bolsa o saco con arena de 0.60 x 0.80 para obras de protección	UND	-	$ 9.151,84	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
308	Piedra pegada en Mortero 1:4, e=0.15 m	M2	-	$ 66.631,87	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
4	**OBRAS DE URBANISMO**												
401	Líneas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700. 1)	M	-	$ 4.184,49	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
402	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 75 X 75 cm	UND	-	$ 575.874,50	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
403	Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (símbolos y letreros)	M2	-	$ 35.928,70	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
404	Tacha reflectiva	UND	-	$ 13.136,24	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
5	**TRANSPORTE**												
501	Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	M3-KM	11.398,46	$ 1.912,44	3.015,80	$ 5.767.536,55	26,46%	1.837,44	$ 3.513.993,75	16,12%	4.853,24	$ 9.281.530,00	42,58%
502	Transporte de material Pétreo (vía destapada)	M3-KM	2.670,96	$ 2.022,17	706,68	$ 1.429.027,10	26,46%	430,56	$ 870.665,52	16,12%	1.137,24	$ 2.299.693,00	42,58%
6	**RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE**												
601	Excavación mecánica con retiro y disposición final	M3	162,72	$ 23.023,91	162,72	$ 3.746.450,64	100,00%		$ -	0,00%	162,72	$ 3.746.451,00	100,00%
7	**NO PREVISTOS**												
NP-01	Demolición de cunetas con Retiro mecánico	M3	148,11	$ 182.801,46	148,11	$ 27.074.724,24	100,00%		$ -	0,00%	148,11	$ 27.074.724,00	100,00%
NP-02	Rocería con retiro	HA	1,65	$ 635.382,44	0,80	$ 508.305,95	48,48%	0,50	$ 317.691,22	30,30%	1,30	$ 825.997,00	78,79%
NP-03	Corte en carpeta asfáltica	M	22,30	$ 11.798,70	-	$ -	0,00%	22,30	$ 263.111,01	100,00%	22,30	$ 263.111,00	100,00%
NP-04	Demolición mecánica en pavimento en concreto asfaltico (inc. Retiro)	M2	415,96	$ 14.966,46	-	$ -	0,00%	415,96	$ 6.225.448,70	100,00%	415,96	$ 6.225.449,00	100,00%
NP-05	Movilización y Desmovilización de equipo pesado	KM	225,00	$ 43.200,26	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
NP-06	Desmonte y limpieza (incluye retiro)	M2	1.422,00	$ 3.904,76	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
NP-07	Filtro O Dren Francés PVC 100 MM (0,4X0,6) M	M	1.053,00	$ 93.139,38	-	$ -	0,00%	238,50	$ 22.213.742,13	22,65%	238,50	$ 22.213.742,00	22,65%

AVANCE DE ACTIVIDADES						
SUBTOTAL OBRAS	$ 102.544.389,00	15,86%	$ 66.482.099,00	7,02%	$ 169.026.489,00	22,88%
SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)	$ 102.544.389,00		$ 66.482.099,00		$ 169.026.489,00	
IMPLEMENTACIÓN PAGA	$ 16.735.600,50		$ -		$ 16.735.600,50	
PMT	$ 29.678.427,00		$ -		$ 29.678.427,00	
CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 1.157.010,00		$ -		$ 1.157.010,00	
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	**$ 150.115.426,50**		**$ 66.482.099,00**		**$ 216.597.526,50**	

5. COMPARACIÓN PORCENTUAL AVANCE

ACUMULADO PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR %	PROGRAMADO PRESENTE SEMANA %	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO %	ACUMULADO EJECUTADO SEMANA ANTERIOR %	EJECUTADO PRESENTE SEMANA %	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO %	% DE RETRASO O AVANCE
58,69%	9,70%	68,39%	15,86%	7,02%	22,88%	45,42%

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

POLIZAS DE GARANTIA

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
MANEJO DE ANTICIPO	OK	28-abr.-2023	21-mar.-2024	$ 473.270.116,00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	OK	28-abr.-2023	20-nov.-2026	$ 47.327.011,60	
ESTABILIDAD Y CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	OK	2-feb.-2023	2-feb.-2026	$ 94.654.023,20	ULTIMA ACTUALIZACION DEL CONTRATO: ACTA DE PRORROGA No 1
CUMPLIMIENTO	OK	28-abr.-2023	21-mar.-2024	$ 94.654.023,20	

14


INFORME SEMANAL DE OBRA

CAIPRO


RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	OK	20-oct.-2023	20-nov.-2023	$ 232.000.000,00

7. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

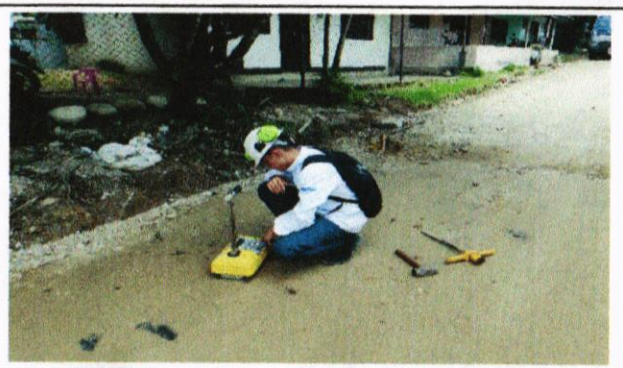



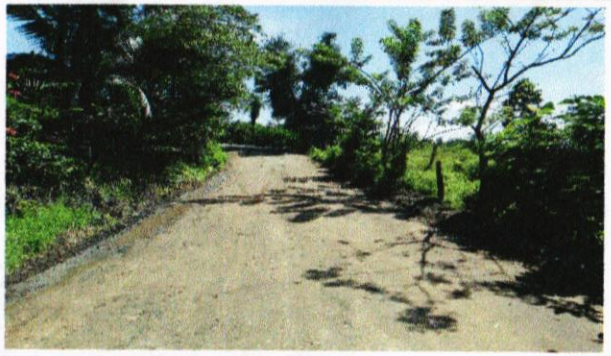



Elaborado por:

ING. ALFREDO VARON
Director de obra





4211

15

INFORME SEMANAL DE OBRA


CAIPRO

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME No.	15	**MES:**	SEPTIEMBRE	**AÑO:**	2023	**PERIODO**	23/09/2023	**AL**	29/09/2023	**PLAZO INICIAL:**	TRES (3) MESES
CONTRATO No.	2653 DE 2022	**OBJETO:**	TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA ACCESO A LA VEREDA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE								
CONTRATISTA DE OBRA	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.			**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S					**FECHA**	29/09/2023

1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

UBICACIÓN GENERAL



MARGINAL DE LA SELVA

INICIO DE VIA
PR55+830
FINAL DE VIA
PR54+090



2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	viernes, 30 de diciembre de 2022	FECHA DE TERMINACION INICIAL	27/07/2023	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	16/10/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	TRES (3) MESES	SUSPENSION No 1	27/06/2023		
FECHA DE INICIO:	28/04/2023	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSION No 1	17/07/2023		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 946.540.231,20	REINICIO No 1	16/08/2023		
VALOR DEL ANTICIPO:	$ 473.270.115,60	PRORROGA No 1	11/09/2023		

3. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

* SE APRUEBA LA PRORROGA NO 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 0487 DE 2023 POR UN (1) MES EL CUAL ACTUALIZA LA FECHA DE TERMINACIÓN HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2022.

* CONTINUA LOS TRABAJOS DE ROCERÍA EN LOS COSTADOS DE LA VÍA.

* CONTINUA LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN MANUAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO ENTRE LOS PR 1+450 HASTA PR1+720, COSTADO DERECHO E IZQUIERDO.

* INICIA LA INSTALACIÓN DE DUCTO Y MATERIAL PÉTREO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO ENTRE LOS PR 1+450 HASTA PR1+720, COSTADO DERECHO E IZQUIERDO.

* CONTINUA LA INSTALACIÓN DE MATERIAL BASE EN EL PR 001+130,35 - PR 001+450

* SE PROGRAMO LA LLEGADA DE MAQUINARIA PARA LA APLICACIÓN DEL PAVIMENTO PARA EL DÍA 2/10/23.

4. CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD MODIFICATORIA N0 1	VALOR UNITARIO	AVANCE SEMANAL(ES) ANTERIOR(ES)			AVANCE SEMANA ACTUAL			AVANCE SEMANA TOTAL		
					CANTIDAD SEMANA(S) ANTERIOR(ES)	VALOR SEMANA(S) ANTERIOR(ES)	% AVANCE SEMANA(S) ANTERIOR(ES)	CANTIDAD SEMANA ACTUAL	VALOR SEMANA ACTUAL	% AVANCE SEMANA ACTUAL	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% AVANCE TOTAL ACUMULADO
1	MOVIMIENTO DE TIERRAS												
101	Excavación manual en material común de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	M3	376,70	$ 49.311,14	140,44	$ 6.925.256,50	37,28%	35,00	$ 1.726.889,90	9,29%	175,44	$ 8.651.146,00	46,57%
2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO												
201	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio clasificado Tmax. 3"	M3	643,08	$ 63.629,51	295,87	$ 18.826.063,12	46,01%	250,00	$ 15.907.377,50	38,88%	545,87	$ 34.733.441,00	84,88%
202	Sub base granular triturada	M3	308,93	$ 99.919,68	258,00	$ 25.779.277,44	83,51%	25,00	$ 2.497.992,00	8,09%	283,00	$ 28.277.269,00	91,61%
203	Base granular (INV. 330. 1)	M3	824,01	$ 114.773,79	397,00	$ 45.565.194,63	48,18%	120,00	$ 13.772.854,80	14,56%	517,00	$ 59.338.049,00	62,74%
204	Imprimación con emulsión asfáltica	M2	6.373,62	$ 5.007,93	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
205	Mezcla asfáltica MDC-2 o 19	M3	446,15	$ 1.074.126,70	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
3	OBRAS DE DRENAJE												

INFORME SEMANAL DE OBRA

CAIPRO

301	Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=0.45 m)	M	123,05	$ 50.380,78	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
302	Malla electrosoldada Q-4 o M - 159	KG	115,67	$ 7.889,49	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
303	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 Psi	M3	-	$ 560.489,26	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
304	Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transportada	M3	11,07	$ 84.101,97	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
305	Relleno de excavación (con material local)	M3	4,43	$ 19.151,09	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
306	Tubería PVC alcantarillado 16" . Suministro e instal.	M	-	$ 310.922,90	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
307	Bolsa o saco con arena de 0.60 x 0.80 para obras de protección	UND	-	$ 9.151,84	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
308	Piedra pegada en Mortero 1:4, e=0.15 m	M2	-	$ 66.631,87	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
4	**OBRAS DE URBANISMO**												
401	Líneas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700. 1)	M	-	$ 4.184,49	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
402	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 75 X 75 cm	UND	-	$ 575.874,50	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
403	Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (símbolos y letreros)	M2	-	$ 35.928,70	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
404	Tacha reflectiva	UND	-	$ 13.136,24	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
5	**TRANSPORTE**												
501	Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	M3-KM	11.398,46	$ 1.912,44	4.853,24	$ 9.281.530,31	42,58%	2.016,08	$ 3.855.632,04	17,69%	6.869,32	$ 13.137.162,00	60,27%
502	Transporte de material Pétreo (vía destapada)	M3-KM	2.670,96	$ 2.022,17	1.137,24	$ 2.299.692,61	42,58%	472,42	$ 955.313,55	17,69%	1.609,66	$ 3.255.006,00	60,27%
6	**RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE**												
601	Excavación mecánica con retiro y disposición final	M3	162,72	$ 23.023,91	162,72	$ 3.746.450,64	100,00%		$ -	0,00%	162,72	$ 3.746.451,00	100,00%
7	**NO PREVISTOS**												
NP-01	Demolición de cunetas con Retiro mecánico	M3	148,11	$ 182.801,46	148,11	$ 27.074.724,24	100,00%		$ -	0,00%	148,11	$ 27.074.724,00	100,00%
NP-02	Rocería con retiro	HA	1,65	$ 635.382,44	1,30	$ 825.997,17	78,79%	0,20	$ 127.076,49	12,12%	1,50	$ 953.074,00	90,91%
NP-03	Corte en carpeta asfáltica	M	22,30	$ 11.798,70	22,30	$ 263.111,01	100,00%		$ -	0,00%	22,30	$ 263.111,00	100,00%
NP-04	Demolición mecánica en pavimento en concreto asfaltico (inc. Retiro)	M2	415,96	$ 14.966,46	415,96	$ 6.225.448,70	100,00%		$ -	0,00%	415,96	$ 6.225.449,00	100,00%
NP-05	Movilización y Desmovilización de equipo pesado	KM	225,00	$ 43.200,26	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
NP-06	Desmonte y limpieza (incluye retiro)	M2	1.422,00	$ 3.904,76	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
NP-07	Filtro O Dren Francés PVC 100 MM (0,4X0,6) M	M	1.053,00	$ 93.139,38	238,50	$ 22.213.742,13	22,65%	125,50	$ 11.688.992,19	11,92%	364,00	$ 33.902.734,00	34,57%

AVANCE DE ACTIVIDADES						
	SUBTOTAL OBRAS	$ 169.026.489,00		$ 50.531.128,00		$ 219.557.616,00	
	SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)	$ 169.026.489,00		$ 50.531.128,00		$ 219.557.616,00	
	IMPLEMENTACIÓN PAGA	$ 16.735.600,50	22,88%	$ -	5,34%	$ 16.735.600,50	28,22%
	PMT	$ 29.678.427,00		$ -		$ 29.678.427,00	
	CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 1.157.010,00		$ -		$ 1.157.010,00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	**$ 216.597.526,50**		**$ 50.531.128,00**		**$ 267.128.653,50**	

5. COMPARACIÓN PORCENTUAL AVANCE

ACUMULADO PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR %	PROGRAMADO PRESENTE SEMANA %	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO %	ACUMULADO EJECUTADO SEMANA ANTERIOR %	EJECUTADO PRESENTE SEMANA %	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO %	% DE RETRASO O AVANCE
68,39%	12,66%	80,95%	22,88%	5,34%	28,22%	52,73%

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

	POLIZAS DE GARANTIA				
CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
MANEJO DE ANTICIPO	OK	28-abr.-2023	21-mar.-2024	$ 473.270.116,00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	OK	28-abr.-2023	20-nov.-2026	$ 47.327.011,60	
ESTABILIDAD Y CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	OK	2-feb.-2023	2-feb.-2028	$ 94.654.023,20	ULTIMA ACTUALIZACION DEL CONTRATO: ACTA DE PRORROGA No 1
CUMPLIMIENTO	OK	28-abr.-2023	21-mar.-2024	$ 94.654.023,20	

15	
INFORME SEMANAL DE OBRA	CAIPRO


RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	OK	20-oct.-2023	20-nov.-2023	$ 232.000.000,00	


7. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

8. REGISTRO FOTOGRAFICO





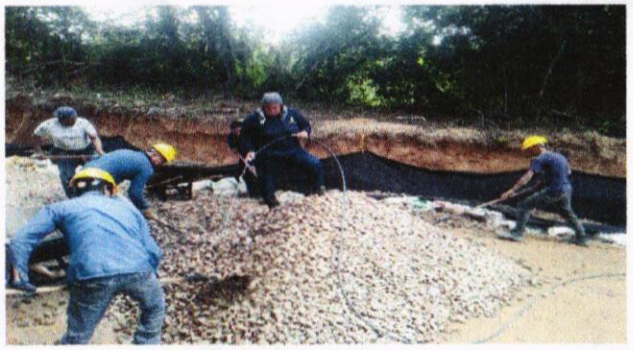

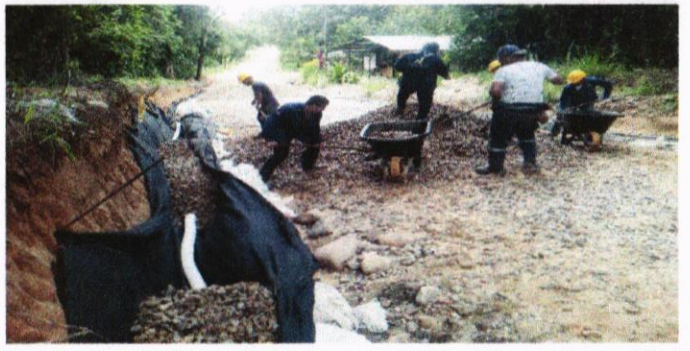

Elaborado por:

ING. ALFREDO VARON
Director de obra

4214

16

INFORME SEMANAL DE OBRA


CAIPRO

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME No.	16	**MES:**	OCTUBRE	**AÑO:**	2023	**PERIODO**	30/09/2023	**AL**	6/10/2023	**PLAZO INICIAL:**	TRES (3) MESES
CONTRATO No.	2653 DE 2022	**OBJETO:**	TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA ACCESO A LA VEREDA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE								
CONTRATISTA DE OBRA	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.			**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S					**FECHA**	6/10/2023


1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

UBICACIÓN GENERAL



MARGINAL DE LA SELVA

INICIO DE VIA
PR55+830
FINAL DE VIA
PR54+090



2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	viernes, 30 de diciembre de 2022	FECHA DE TERMINACION INICIAL	27/07/2023	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	16/10/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	TRES (3) MESES	SUSPENSION No 1	27/06/2023		
FECHA DE INICIO:	28/04/2023	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSION No 1	17/07/2023		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 946.540.231,20	REINICIO No 1	16/08/2023		
VALOR DEL ANTICIPO:	$ 473.270.115,60	PRORROGA No 1	11/09/2023		

3. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

* TERMINA LOS TRABAJOS DE ROCERÍA EN LOS COSTADOS DE LA VÍA.

* TERMINA LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN MANUAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO ENTRE LOS PR 1+450 HASTA PR1+720, COSTADO DERECHO E IZQUIERDO.

* TERMINA LA CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO ENTRE LOS PR 1+450 HASTA PR1+720, COSTADO IZQUIERDO.

* TERMINA LA INSTALACIÓN DE MATERIAL BASE EN EL PR 001+130,35 - PR 001+450

* INICIA LA INSTALACIÓN DE MATERIAL CRUDO DE RIO MAX 3" EN EL PR 1+450 HASTA PR1+720

* SE REALIZA LA APLICACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MEZCLA ASFÁLTICA ENTRE LOS PR 0+00 AL PR 0+145 Y PR 000+175 - PR 000+212,69

4. CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD MODIFICATORIA N0 1	VALOR UNITARIO	AVANCE SEMANAL(ES) ANTERIOR(ES)			AVANCE SEMANA ACTUAL			AVANCE SEMANA TOTAL		
					CANTIDAD SEMANA(S) ANTERIOR(ES)	VALOR SEMANA(S) ANTERIOR(ES)	% AVANCE SEMANA(S) ANTERIOR(ES)	CANTIDAD SEMANA ACTUAL	VALOR SEMANA ACTUAL	% AVANCE SEMANA ACTUAL	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% AVANCE TOTAL ACUMULADO
1	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**												
101	Excavación manual en material común de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	M3	376,70	$ 49.311,14	175,44	$ 8.651.146,40	46,57%		$ -	0,00%	175,44	$ 8.651.146,00	46,57%
2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**												
201	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio clasificado Tmax. 3"	M3	643,08	$ 63.629,51	545,87	$ 34.733.440,62	84,88%	75,00	$ 4.772.213,25	11,66%	620,87	$ 39.505.654,00	96,55%
202	Sub base granular triturada	M3	308,93	$ 99.919,68	283,00	$ 28.277.269,44	91,61%		$ -	0,00%	283,00	$ 28.277.269,00	91,61%
203	Base granular (INV. 330. 1)	M3	824,01	$ 114.773,79	517,00	$ 59.338.049,43	62,74%	145,00	$ 16.642.199,55	17,60%	662,00	$ 75.980.249,00	80,34%
204	Imprimación con emulsión asfáltica	M2	6.373,62	$ 5.007,93	-	$ -	0,00%	1.096,14	$ 5.489.392,39	17,20%	1.096,14	$ 5.489.392,00	17,20%
205	Mezcla asfáltica MDC-2 o 19	M3	446,15	$ 1.074.126,70	-	$ -	0,00%	76,73	$ 82.417.741,69	17,20%	76,73	$ 82.417.742,00	17,20%
3	**OBRAS DE DRENAJE**												

INFORME SEMANAL DE OBRA

CAIPRO

301	Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=0.45 m)	M	123,05	$ 50.380,78	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
302	Malla electrosoldada Q-4 o M - 159	KG	115,67	$ 7.889,49	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
303	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 Psi	M3	-	$ 560.489,26	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
304	Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transportada	M3	11,07	$ 84.101,97	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
305	Relleno de excavación (con material local)	M3	4,43	$ 19.151,09	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
306	Tubería PVC alcantarillado 16" . Suministro e instal.	M	-	$ 310.922,90	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
307	Bolsa o saco con arena de 0.60 x 0.80 para obras de protección	UND	-	$ 9.151,84	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
308	Piedra pegada en Mortero 1:4, e=0.15 m	M2	-	$ 66.631,87	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
4	**OBRAS DE URBANISMO**												
401	Líneas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700. 1)	M	-	$ 4.184,49	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
402	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 75 X 75 cm	UND	-	$ 575.874,50	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
403	Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (símbolos y letreros)	M2	-	$ 35.928,70	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
404	Tacha reflectiva	UND	-	$ 13.136,24	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
5	**TRANSPORTE**												
501	Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	M3-KM	11.398,46	$ 1.912,44	6.869,32	$ 13.137.162,34	60,27%	1.514,51	$ 2.896.409,50	13,29%	8.383,83	$ 16.033.572,00	73,56%
502	Transporte de material Pétreo (vía destapada)	M3-KM	2.670,96	$ 2.022,17	1.609,66	$ 3.255.006,16	60,27%	354,89	$ 717.647,91	13,29%	1.964,55	$ 3.972.654,00	73,56%
6	**RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE**												
601	Excavación mecánica con retiro y disposición final	M3	162,72	$ 23.023,91	162,72	$ 3.746.450,64	100,00%		$ -	0,00%	162,72	$ 3.746.451,00	100,00%
7	**NO PREVISTOS**												
NP-01	Demolición de cunetas con Retiro mecánico	M3	148,11	$ 182.801,46	148,11	$ 27.074.724,24	100,00%		$ -	0,00%	148,11	$ 27.074.724,00	100,00%
NP-02	Rocería con retiro	HA	1,65	$ 635.382,44	1,50	$ 953.073,66	90,91%	0,15	$ 95.307,37	9,09%	1,65	$ 1.048.381,00	100,00%
NP-03	Corte en carpeta asfáltica	M	22,30	$ 11.798,70	22,30	$ 263.111,01	100,00%		$ -	0,00%	22,30	$ 263.111,00	100,00%
NP-04	Demolición mecánica en pavimento en concreto asfaltico (inc. Retiro)	M2	415,96	$ 14.966,46	415,96	$ 6.225.448,70	100,00%		$ -	0,00%	415,96	$ 6.225.449,00	100,00%
NP-05	Movilización y Desmovilización de equipo pesado	KM	225,00	$ 43.200,26	-	$ -	0,00%	112,50	$ 4.860.029,25	50,00%	112,50	$ 4.860.029,00	50,00%
NP-06	Desmonte y limpieza (incluye retiro)	M2	1.422,00	$ 3.904,76	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
NP-07	Filtro O Dren Francés PVC 100 MM (0,4X0,6) M	M	1.053,00	$ 93.139,38	364,00	$ 33.902.734,32	34,57%	120,00	$ 11.176.725,60	11,40%	484,00	$ 45.079.460,00	45,96%

AVANCE DE ACTIVIDADES						
	SUBTOTAL OBRAS	$ 219.557.617,00		$ 129.067.667,00		$ 348.625.283,00	
	SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)	$ 219.557.617,00		$ 129.067.667,00		$ 348.625.283,00	
	IMPLEMENTACIÓN PAGA	$ 16.735.600,50	28,22%	$ -	13,64%	$ 16.735.600,50	41,86%
	PMT	$ 29.678.427,00		$ -		$ 29.678.427,00	
	CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 1.157.010,00		$ -		$ 1.157.010,00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	**$ 267.128.654,50**		**$ 129.067.667,00**		**$ 396.196.320,50**	

5. COMPARACIÓN PORCENTUAL AVANCE

ACUMULADO PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR %	PROGRAMADO PRESENTE SEMANA %	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO %	ACUMULADO EJECUTADO SEMANA ANTERIOR %	EJECUTADO PRESENTE SEMANA %	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO %	% DE RETRASO O AVANCE
80,95%	18,50%	99,45%	28,22%	13,64%	41,86%	57,59%

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

POLIZAS DE GARANTIA

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
MANEJO DE ANTICIPO	OK	28-abr.-2023	21-mar.-2024	$ 473.270.116,00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	OK	28-abr.-2023	20-nov.-2026	$ 47.327.011,60	
ESTABILIDAD Y CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	OK	2-feb.-2023	2-feb.-2028	$ 94.654.023,20	ULTIMA ACTUALIZACION DEL CONTRATO: ACTA DE PRORROGA No 1
CUMPLIMIENTO	OK	28-abr.-2023	21-mar.-2024	$ 94.654.023,20	

16	
INFORME SEMANAL DE OBRA	CAIPRO


RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	OK	20-oct.-2023	20-nov.-2023	$ 232.000.000.00	

7. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

8. REGISTRO FOTOGRAFICO





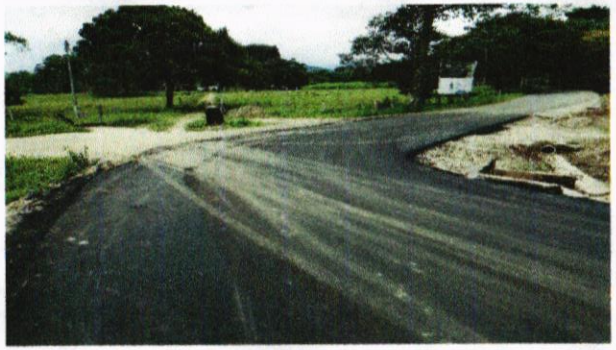



Elaborado por:

ING. ALFREDO VARON
Director de obra

17

INFORME SEMANAL DE OBRA


CAIPRO

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME No.	17	**MES:**	OCTUBRE	**AÑO:**	2023	**PERIODO**	7/10/2023	**AL**	13/10/2023	**PLAZO INICIAL:**	TRES (3) MESES
CONTRATO No.	2653 DE 2022	**OBJETO:**	TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA ACCESO A LA VEREDA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE								
CONTRATISTA DE OBRA	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.			**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S					**FECHA**	13/10/2023

1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

UBICACIÓN GENERAL



MARGINAL DE LA SELVA

INICIO DE VIA
PR55+830
FINAL DE VIA
PR54+090



2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	viernes, 30 de diciembre de 2022	FECHA DE TERMINACION INICIAL	27/07/2023	PRORROGA No 2	13/10/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	TRES (3) MESES	SUSPENSION No 1	27/06/2023	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	15/11/2023
FECHA DE INICIO:	28/04/2023	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSION No 1	17/07/2023		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 946.540.231,20	REINICIO No 1	16/08/2023		
VALOR DEL ANTICIPO:	$ 473.270.115,60	PRORROGA No 1	11/09/2023		

3. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

* SE APRUEBA LA PRORROGA NO 2 AL CONTRATO DE OBRA 2653 DE 2022 POR UN (1) MES, NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 15 DE NOVIEMBRE DE 2023

* CONTINUA LA CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO ENTRE LOS PR 1+450 HASTA PR1+720, COSTADO DERECHO.

* TERMINA LA INSTALACIÓN DE MATERIAL CRUDO DE RIO MÁX. 3" EN EL PR 1+450 HASTA PR1+720

* SE REALIZA TOMA DE DENSIDADES AL MATERIAL PÉTREO INSTALADO EN OBRA

* SE REALIZA LA APLICACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MEZCLA ASFÁLTICA ENTRE LOS PR 000+926,42 - PR 001+450

4. CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD MODIFICATORIA N0 1	VALOR UNITARIO	AVANCE SEMANAL(ES) ANTERIOR(ES)			AVANCE SEMANA ACTUAL			AVANCE SEMANA TOTAL		
					CANTIDAD SEMANA(S) ANTERIOR(ES)	VALOR SEMANA(S) ANTERIOR(ES)	% AVANCE SEMANA(S) ANTERIOR(ES)	CANTIDAD SEMANA ACTUAL	VALOR SEMANA ACTUAL	% AVANCE SEMANA ACTUAL	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% AVANCE TOTAL ACUMULADO
1	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**												
101	Excavación manual en material común de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	M3	376,70	$ 49.311,14	175,44	$ 8.651.146,40	46,57%	12,69	$ 625.758,37	3,37%	188,13	$ 9.276.905,00	49,94%
2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**												
201	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio clasificado Tmax. 3"	M3	643,08	$ 63.629,51	620,87	$ 39.505.653,87	96,55%	22,21	$ 1.413.211,42	3,45%	643,08	$ 40.918.865,00	100,00%
202	Sub base granular triturada	M3	308,93	$ 99.919,68	283,00	$ 28.277.269,44	91,61%		$ -	0,00%	283,00	$ 28.277.269,00	91,61%
203	Base granular (INV. 330. 1)	M3	824,01	$ 114.773,79	662,00	$ 75.980.248,98	80,34%		$ -	0,00%	662,00	$ 75.980.249,00	80,34%
204	Imprimación con emulsión asfáltica	M2	6.373,62	$ 5.007,93	1.096,14	$ 5.489.392,39	17,20%	2.858,52	$ 14.315.268,06	44,85%	3.954,66	$ 19.804.660,00	62,05%
205	Mezcla asfáltica MDC-2 o 19	M3	446,15	$ 1.074.126,70	76,73	$ 82.417.741,69	17,20%	200,10	$ 214.932.752,67	44,85%	276,83	$ 297.350.494,00	62,05%
3	**OBRAS DE DRENAJE**												
301	Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=0.45 m)	M	123,05	$ 50.380,78	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
302	Malla electrosoldada Q-4 o M - 159	KG	115,67	$ 7.889,49	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%

303	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 Psi	M3	-	$ 560.489,26	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
304	Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transportada	M3	11,07	$ 84.101,97	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
305	Relleno de excavación (con material local)	M3	4,43	$ 19.151,09	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
306	Tubería PVC alcantarillado 16" . Suministro e instal.	M	-	$ 310.922,90	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
307	Bolsa o saco con arena de 0.60 x 0.80 para obras de protección	UND	-	$ 9.151,84	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
308	Piedra pegada en Mortero 1:4, e=0.15 m	M2	-	$ 66.631,87	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
4	**OBRAS DE URBANISMO**												
401	Líneas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700. 1)	M	-	$ 4.184,49	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
402	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 75 X 75 cm	UND	-	$ 575.874,50	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
403	Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (símbolos y letreros)	M2	-	$ 35.928,70	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
404	Tacha reflectiva	UND	-	$ 13.136,24	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
5	**TRANSPORTE**												
501	Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	M3-KM	11.398,46	$ 1.912,44	8.383,83	$ 16.033.571,85	73,55%	1.021,31	$ 1.953.194,10	8,96%	9.405,14	$ 17.986.766,00	82,51%
502	Transporte de material Pétreo (vía destapada)	M3-KM	2.670,96	$ 2.022,17	1.964,65	$ 3.972.856,29	73,56%	239,32	$ 483.945,72	8,96%	2.203,97	$ 4.456.802,00	82,52%
6	**RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE**												
601	Excavación mecánica con retiro y disposición final	M3	162,72	$ 23.023,91	162,72	$ 3.746.450,64	100,00%		$ -	0,00%	162,72	$ 3.746.451,00	100,00%
7	**NO PREVISTOS**												
NP-01	Demolición de cunetas con Retiro mecánico	M3	148,11	$ 182.801,46	148,11	$ 27.074.724,24	100,00%		$ -	0,00%	148,11	$ 27.074.724,00	100,00%
NP-02	Rocería con retiro	HA	1,65	$ 635.382,44	1,65	$ 1.048.381,03	100,00%		$ -	0,00%	1,65	$ 1.048.381,00	100,00%
NP-03	Corte en carpeta asfáltica	M	22,30	$ 11.798,70	22,30	$ 263.111,01	100,00%		$ -	0,00%	22,30	$ 263.111,00	100,00%
NP-04	Demolición mecánica en pavimento en concreto asfaltico (inc. Retiro)	M2	415,96	$ 14.966,46	415,96	$ 6.225.448,70	100,00%		$ -	0,00%	415,96	$ 6.225.449,00	100,00%
NP-05	Movilización y Desmovilización de equipo pesado	KM	225,00	$ 43.200,26	112,50	$ 4.860.029,25	50,00%		$ -	0,00%	112,50	$ 4.860.029,00	50,00%
NP-06	Desmonte y limpieza (incluye retiro)	M2	1.422,00	$ 3.904,76	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
NP-07	Filtro O Dren Francés PVC 100 MM (0,4X0,6) M	M	1.053,00	$ 93.139,38	484,00	$ 45.079.459,92	45,96%	43,50	$ 4.051.563,03	4,13%	527,50	$ 49.131.023,00	50,09%

AVANCE DE ACTIVIDADES					
	SUBTOTAL OBRAS	$ 348.625.486,00		$ 237.775.693,00		$ 586.401.178,00	
	SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)	$ 348.625.486,00		$ 237.775.693,00		$ 586.401.178,00	
	IMPLEMENTACIÓN PAGA	$ 16.735.600,50	41,86%	$ -	25,12%	$ 16.735.600,50	66,98%
	PMT	$ 29.678.427,00		$ -		$ 29.678.427,00	
	CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 1.157.010,00		$ -		$ 1.157.010,00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	**$ 396.196.523,50**		**$ 237.775.693,00**		**$ 633.972.215,50**	

5. COMPARACIÓN PORCENTUAL AVANCE

ACUMULADO PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR %	PROGRAMADO PRESENTE SEMANA %	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO %	ACUMULADO EJECUTADO SEMANA ANTERIOR %	EJECUTADO PRESENTE SEMANA %	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO %	% DE RETRASO O AVANCE
52,63%	9,87%	62,50%	41,86%	25,12%	66,98%	-4,48%

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

POLIZAS DE GARANTIA

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
MANEJO DE ANTICIPO	OK	28-abr.-2023	21-abr.-2024	$ 473.270.116,00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	OK	28-abr.-2023	20-dic.-2026	$ 47.327.011,60	
ESTABILIDAD Y CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	OK	2-feb.-2023	2-feb.-2028	$ 94.654.023,20	ULTIMA ACTUALIZACION DEL CONTRATO: ACTA DE PRORROGA No 2
CUMPLIMIENTO	OK	28-abr.-2023	21-abr.-2024	$ 94.654.023,20	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	OK	20-nov.-2023	20-dic.-2023	$ 232.000.000,00	


17

INFORME SEMANAL DE OBRA

CAIPRO

7. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

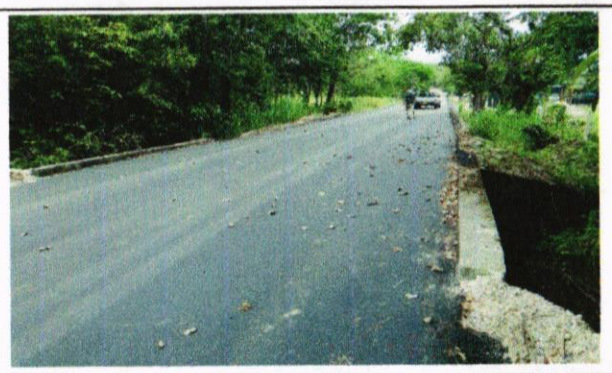







Elaborado por:

ING. ALFREDO VARON
Director de obra

4220

18

INFORME SEMANAL DE OBRA


CAIPRO

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME No.	18	**MES:**	OCTUBRE	**AÑO:**	2023	**PERIODO**	14/10/2023	**AL**	20/10/2023	**PLAZO INICIAL:**	TRES (3) MESES
CONTRATO No.	2653 DE 2022	**OBJETO:**	TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA ACCESO A LA VEREDA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE								
CONTRATISTA DE OBRA	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.				**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S				**FECHA**	20/10/2023


1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

UBICACIÓN GENERAL



MARGINAL DE LA SELVA

INICIO DE VIA
PR55+830
FINAL DE VIA
PR54+090



2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	viernes, 30 de diciembre de 2022	FECHA DE TERMINACION INICIAL	27/07/2023	PRORROGA No 2	13/10/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	TRES (3) MESES	SUSPENSION No 1	27/06/2023	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	15/11/2023
FECHA DE INICIO:	28/04/2023	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSION No 1	17/07/2023		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 946.540.231,20	REINICIO No 1	16/08/2023		
VALOR DEL ANTICIPO:	$ 473.270.115,60	PRORROGA No 1	11/09/2023		

3. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

* SE RADICA A LA SUPERVISIÓN LAS CORRECCIONES SOLICITADAS A LA SOLICITUD DE ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA 2653 DE 2022.

* TERMINA LA CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO ENTRE LOS PR 1+450 HASTA PR1+720, COSTADO DERECHO.

* INICIA LA INSTALACIÓN DE MATERIAL SUB BASE DESDE PR 001+450- PR 001+806

4. CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD MODIFICATORIA N0 1	VALOR UNITARIO	AVANCE SEMANAL(ES) ANTERIOR(ES)			AVANCE SEMANA ACTUAL			AVANCE SEMANA TOTAL		
					CANTIDAD SEMANA(S) ANTERIOR(ES)	VALOR SEMANA(S) ANTERIOR(ES)	% AVANCE SEMANA(S) ANTERIOR(ES)	CANTIDAD SEMANA ACTUAL	VALOR SEMANA ACTUAL	% AVANCE SEMANA ACTUAL	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% AVANCE TOTAL ACUMULADO
1	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**												
101	Excavación manual en material común de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	M3	376,70	$ 49.311,14	188,13	$ 9.276.904,77	49,94%		$ -	0,00%	188,13	$ 9.276.905,00	49,94%
2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**												
201	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio clasificado Tmax. 3"	M3	643,08	$ 63.629,51	643,08	$ 40.918.865,29	100,00%		$ -	0,00%	643,08	$ 40.918.865,00	100,00%
202	Sub base granular triturada	M3	308,93	$ 99.919,68	283,00	$ 28.277.269,44	91,61%	18,00	$ 1.798.554,24	5,83%	301,00	$ 30.075.824,00	97,43%
203	Base granular (INV. 330. 1)	M3	824,01	$ 114.773,79	662,00	$ 75.980.248,98	80,34%	105,00	$ 12.051.247,95	12,74%	767,00	$ 88.031.497,00	93,08%
204	Imprimación con emulsión asfáltica	M2	6.373,62	$ 5.007,93	3.954,66	$ 19.804.660,45	62,05%		$ -	0,00%	3.954,66	$ 19.804.660,00	62,05%
205	Mezcla asfáltica MDC-2 o 19	M3	446,15	$ 1.074.126,70	276,83	$ 297.350.494,36	62,05%		$ -	0,00%	276,83	$ 297.350.494,00	62,05%
3	**OBRAS DE DRENAJE**												
301	Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=0.45 m)	M	123,05	$ 50.380,78	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%
302	Malla electrosoldada Q-4 o M - 159	KG	115,67	$ 7.889,49	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%

4221

303	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 Psi	M3	-	$ 560.489,26	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
304	Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transportada	M3	11,07	$ 84.101,97	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
305	Relleno de excavación (con material local)	M3	4,43	$ 19.151,09	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
306	Tubería PVC alcantarillado 16" . Suministro e instal.	M	-	$ 310.922,90	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
307	Bolsa o saco con arena de 0.60 x 0.80 para obras de protección	UND	-	$ 9.151,84	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
308	Piedra pegada en Mortero 1:4, e=0.15 m	M2	-	$ 66.631,87	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
4	OBRAS DE URBANISMO												
401	Líneas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700. 1)	M	-	$ 4.184,49	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
402	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 75 X 75 cm	UND	-	$ 575.874,50	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
403	Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (simbolos y letreros)	M2	-	$ 35.928,70	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
404	Tacha reflectiva	UND	-	$ 13.136,24	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
5	TRANSPORTE												
501	Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	M3-KM	11.398,46	$ 1.912,44	9.405,14	$ 17.986.765,94	82,51%	627,79	$ 1.200.610,71	5,51%	10.032,93	$ 19.187.377,00	88,02%
502	Transporte de material Pétreo (vía destapada)	M3-KM	2.670,96	$ 2.022,17	2.203,97	$ 4.456.802,01	82,52%	147,11	$ 297.481,43	5,51%	2.351,08	$ 4.754.283,00	88,02%
6	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE												
601	Excavación mecánica con retiro y disposición final	M3	162,72	$ 23.023,91	162,72	$ 3.746.450,64	100,00%		$ -	0,00%	162,72	$ 3.746.451,00	100,00%
7	NO PREVISTOS												
NP-01	Demolición de cunetas con Retiro mecánico	M3	148,11	$ 182.801,46	148,11	$ 27.074.724,24	100,00%		$ -	0,00%	148,11	$ 27.074.724,00	100,00%
NP-02	Rocería con retiro	HA	1,65	$ 635.382,44	1,65	$ 1.048.381,03	100,00%		$ -	0,00%	1,65	$ 1.048.381,00	100,00%
NP-03	Corte en carpeta asfáltica	M	22,30	$ 11.798,70	22,30	$ 263.111,01	100,00%		$ -	0,00%	22,30	$ 263.111,00	100,00%
NP-04	Demolición mecánica en pavimento en concreto asfaltico (inc. Retiro)	M2	415,96	$ 14.966,46	415,96	$ 6.225.448,70	100,00%		$ -	0,00%	415,96	$ 6.225.449,00	100,00%
NP-05	Movilización y Desmovilización de equipo pesado	KM	225,00	$ 43.200,26	112,50	$ 4.860.029,25	50,00%		$ -	0,00%	112,50	$ 4.860.029,00	50,00%
NP-06	Desmonte y limpieza (incluye retiro)	M2	1.422,00	$ 3.904,76	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
NP-07	Filtro O Dren Francés PVC 100 MM (0,4X0,6) M	M	1.053,00	$ 93.139,38	527,50	$ 49.131.022,95	50,09%	10,00	$ 931.393,80	0,95%	537,50	$ 50.062.417,00	51,04%

AVANCE DE ACTIVIDADES					
	SUBTOTAL OBRAS	$ 586.401.179,00		$ 16.279.288,00		$ 602.680.467,00	
	SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)	$ 586.401.179,00		$ 16.279.288,00		$ 602.680.467,00	
	IMPLEMENTACIÓN PAGA	$ 16.735.600,50	66,98%	$ -	1,72%	$ 16.735.600,50	68,70%
	PMT	$ 29.678.427,00		$ -		$ 29.678.427,00	
	CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 1.157.010,00		$ -		$ 1.157.010,00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	**$ 633.972.216,50**		**$ 16.279.288,00**		**$ 650.251.504,50**	

5. COMPARACIÓN PORCENTUAL AVANCE

ACUMULADO PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR %	PROGRAMADO PRESENTE SEMANA %	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO %	ACUMULADO EJECUTADO SEMANA ANTERIOR %	EJECUTADO PRESENTE SEMANA %	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO %	% DE RETRASO O AVANCE
62,50%	5,36%	67,86%	66,98%	1,72%	68,70%	-0,84%

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

POLIZAS DE GARANTIA


CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
MANEJO DE ANTICIPO	OK	28-abr.-2023	21-abr.-2024	$ 473.270.116,00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	OK	28-abr.-2023	20-dic.-2026	$ 47.327.011,60	
ESTABILIDAD Y CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	OK	2-feb.-2023	2-feb.-2028	$ 94.654.023,20	ULTIMA ACTUALIZACION DEL CONTRATO: ACTA DE PRORROGA No 2
CUMPLIMIENTO	OK	28-abr.-2023	21-abr.-2024	$ 94.654.023,20	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	OK	20-nov.-2023	20-dic.-2023	$ 232.000.000,00	

4222

18	
INFORME SEMANAL DE OBRA	CAIPRO

7. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

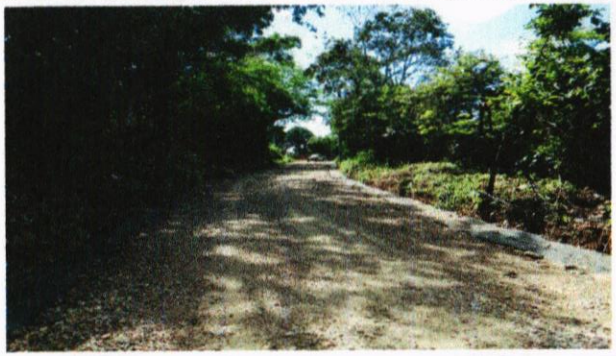







Elaborado por:

ING. ALFREDO VARON
Director de obra


19

INFORME SEMANAL DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME No.	19	**MES:**	OCTUBRE	**AÑO:**	2023	**PERIODO**	21/10/2023	**AL**	27/10/2023	**PLAZO INICIAL:**	TRES (3) MESES
CONTRATO No.	2653 DE 2022	**OBJETO:**	TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA ACCESO A LA VEREDA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE								
CONTRATISTA DE OBRA	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.				**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S				**FECHA**	27/10/2023

1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

UBICACIÓN GENERAL		**MARGINAL DE LA SELVA**	INICIO DE VIA PR55+830 FINAL DE VIA PR54+090	

2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	viernes, 30 de diciembre de 2022	FECHA DE TERMINACION INICIAL	27/07/2023	PRORROGA No 2	13/10/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	TRES (3) MESES	SUSPENSION No 1	27/06/2023	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	15/11/2023
FECHA DE INICIO:	28/04/2023	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSION No 1	17/07/2023		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 946.540.231,20	REINICIO No 1	16/08/2023		
VALOR DEL ANTICIPO:	$ 473.270.115,60	PRORROGA No 1	11/09/2023		

3. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

* SE HACE ENTREGA DEL ACTA PARCIAL # 1 AL CONTRATO DE OBRA 2653 DEL 2022, PARA REVISIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA.


* TERMINA LA INSTALACIÓN DE MATERIAL SUB BASE EN EL PR 001+450- PR 001+806

* SE REALIZA TOMA DE DENSIDADES AL MATERIAL PÉTREO INSTALADO EN OBRA

* INICIA LA INSTALACIÓN DE MATERIAL BASE EN EL PR 001+450- PR 001+806

4. CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD MODIFICATORIA Nº 1	VALOR UNITARIO	AVANCE SEMANAL(ES) ANTERIOR(ES)			AVANCE SEMANA ACTUAL			AVANCE SEMANA TOTAL		
					CANTIDAD SEMANA(S) ANTERIOR(ES)	VALOR SEMANA(S) ANTERIOR(ES)	% AVANCE SEMANA(S) ANTERIOR(ES)	CANTIDAD SEMANA ACTUAL	VALOR SEMANA ACTUAL	% AVANCE SEMANA ACTUAL	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% AVANCE TOTAL ACUMULADO
1	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**												
101	Excavación manual en material común de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	M3	376,70	$ 49.311,14	188,13	$ 9.276.904,77	49,94%		$ -	0,00%	188,13	$ 9.276.905,00	49,94%
2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**												
201	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio clasificado Tmax. 3"	M3	643,08	$ 63.629,51	643,08	$ 40.918.865,29	100,00%		$ -	0,00%	643,08	$ 40.918.865,00	100,00%
202	Sub base granular triturada	M3	308,93	$ 99.919,68	301,00	$ 30.075.823,68	97,43%	7,93	$ 792.363,06	2,57%	308,93	$ 30.868.187,00	100,00%
203	Base granular (INV. 330. 1)	M3	824,01	$ 114.773,79	767,00	$ 88.031.496,93	93,08%	45,00	$ 5.164.820,55	5,46%	812,00	$ 93.196.317,00	98,54%
204	Imprimación con emulsión asfáltica	M2	6.373,62	$ 5.007,93	3.954,66	$ 19.804.660,45	62,05%		$ -	0,00%	3.954,66	$ 19.804.660,00	62,05%
205	Mezcla asfáltica MDC-2 o 19	M3	446,15	$ 1.074.126,70	276,83	$ 297.350.494,36	62,05%		$ -	0,00%	276,83	$ 297.350.494,00	62,05%
3	**OBRAS DE DRENAJE**												
301	Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=0.45 m)	M	123,05	$ 50.380,78	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
302	Malla electrosoldada Q-4 o M - 159	KG	115,67	$ 7.889,49	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
303	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 Psi	M3	-	$ 560.489,26	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
304	Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transportada	M3	11,07	$ 84.101,97		$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%



305	Relleno de excavación (con material local)	M3	4,43	$	19.151,09	-	$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
306	Tubería PVC alcantarillado 16" . Suministro e instal.	M	-	$	310.922,90	-	$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
307	Bolsa o saco con arena de 0.60 x 0.80 para obras de protección	UND	-	$	9.151,84	-	$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
308	Piedra pegada en Mortero 1:4, e=0.15 m	M2	-	$	66.631,87	-	$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
4	**OBRAS DE URBANISMO**																
401	Lineas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700. 1)	M	-	$	4.184,49	-	$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
402	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 75 X 75 cm	UND	-	$	575.874,50	-	$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
403	Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (simbolos y letreros)	M2	-	$	35.928,70	-	$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
404	Tacha reflectiva	UND	-	$	13.136,24	-	$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
5	**TRANSPORTE**																
501	Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	M3-KM	11.398,46	$	1.912,44	10.032,93	$	19.187.378,65	88,02%	270,15	$	516.645,67	2,37%	10.303,08	$	19.704.022,00	90,39%
502	Transporte de material Pétreo (vía destapada)	M3-KM	2.670,98	$	2.022,17	2.351,08	$	4.754.283,44	88,02%	63,30	$	128.003,36	2,37%	2.414,38	$	4.882.287,00	90,39%
6	**RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE**																
601	Excavación mecánica con retiro y disposición final	M3	162,72	$	23.023,91	162,72	$	3.746.450,64	100,00%		$	-	0,00%	162,72	$	3.746.451,00	100,00%
7	**NO PREVISTOS**																
NP-01	Demolición de cunetas con Retiro mecánico	M3	148,11	$	182.801,46	148,11	$	27.074.724,24	100,00%		$	-	0,00%	148,11	$	27.074.724,00	100,00%
NP-02	Rocería con retiro	HA	1,65	$	635.382,44	1,65	$	1.048.381,03	100,00%		$	-	0,00%	1,65	$	1.048.381,00	100,00%
NP-03	Corte en carpeta asfáltica	M	22,30	$	11.798,70	22,30	$	263.111,01	100,00%		$	-	0,00%	22,30	$	263.111,00	100,00%
NP-04	Demolición mecánica en pavimento en concreto asfaltico (inc. Retiro)	M2	415,96	$	14.966,46	415,96	$	6.225.448,70	100,00%		$	-	0,00%	415,96	$	6.225.449,00	100,00%
NP-05	Movilización y Desmovilización de equipo pesado	KM	225,00	$	43.200,26	112,50	$	4.860.029,25	50,00%		$	-	0,00%	112,50	$	4.860.029,00	50,00%
NP-06	Desmonte y limpieza (incluye retiro)	M2	1.422,00	$	3.904,76	-	$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
NP-07	Filtro O Dren Francés PVC 100 MM (0,4X0,6) M	M	1.053,00	$	93.139,38	537,50	$	50.062.416,75	51,04%		$	-	0,00%	537,50	$	50.062.417,00	51,04%

AVANCE DE ACTIVIDADES						
SUBTOTAL OBRAS	$ 602.680.467,00		$ 6.601.833,00		$ 609.282.299,00	
SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)	$ 602.680.467,00		$ 6.601.833,00		$ 609.282.299,00	
IMPLEMENTACIÓN PAGA	$ 16.735.600,50	68,70%	$ 5.578.533,50	2,37%	$ 22.314.134,00	71,07%
PMT	$ 29.678.427,00		$ 9.892.809,00		$ 39.571.236,00	
CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 1.157.010,00		$ 385.670,00		$ 1.542.680,00	
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	**$ 650.251.504,50**		**$ 22.458.845,50**		**$ 672.710.348,00**	

5. COMPARACIÓN PORCENTUAL AVANCE

ACUMULADO PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR %	PROGRAMADO PRESENTE SEMANA %	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO %	ACUMULADO EJECUTADO SEMANA ANTERIOR %	EJECUTADO PRESENTE SEMANA %	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO %	% DE RETRASO O AVANCE
67,88%	5,83%	73,69%	68,70%	2,37%	71,07%	2,62%

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

POLIZAS DE GARANTIA

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
MANEJO DE ANTICIPO	OK	28-abr.-2023	21-abr.-2024	$ 473.270.116,00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	OK	28-abr.-2023	20-dic.-2026	$ 47.327.011,60	
ESTABILIDAD Y CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	OK	2-feb.-2023	2-feb.-2026	$ 94.654.023,20	ULTIMA ACTUALIZACION DEL CONTRATO: ACTA DE PRORROGA No 2
CUMPLIMIENTO	OK	28-abr.-2023	21-abr.-2024	$ 94.654.023,20	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	OK	20-nov.-2023	20-dic.-2023	$ 232.000.000,00	


4245

19	
INFORME SEMANAL DE OBRA	CAIPRO

7. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

8. REGISTRO FOTOGRAFICO



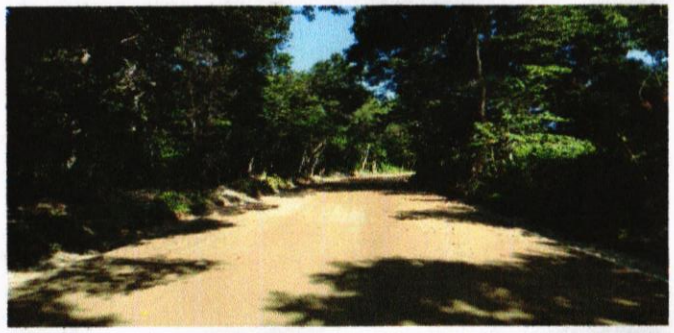





Elaborado por:

ING. ALFREDO VARON
Director de obra









4246

20

INFORME SEMANAL DE OBRA


CAIPRO

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME No.	20	**MES:**	OCTUBRE	**AÑO:**	2023	**PERIODO**	28/10/2023	**AL**	3/11/2023	**PLAZO INICIAL:**	TRES (3) MESES
CONTRATO No.	2653 DE 2022	**OBJETO:**	TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA ACCESO A LA VEREDA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE								
CONTRATISTA DE OBRA	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.				**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S				**FECHA**	3/11/2023

1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

UBICACIÓN GENERAL



MARGINAL DE LA SELVA

INICIO DE VIA
PR55+830
FINAL DE VIA
PR54+090



2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	viernes, 30 de diciembre de 2022	FECHA DE TERMINACION INICIAL	27/07/2023	PRORROGA No 2	13/10/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	TRES (3) MESES	SUSPENSION No 1	27/06/2023	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	15/11/2023
FECHA DE INICIO:	28/04/2023	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSION No 1	17/07/2023		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 946.540.231,20	REINICIO No 1	16/08/2023		
VALOR DEL ANTICIPO:	$ 473.270.115,60	PRORROGA No 1	11/09/2023		

3. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

* TERMINA LA INSTALACIÓN DE MATERIAL BASE EN EL PR 001+450- PR 001+806


* SE REALIZA TOMA DE DENSIDADES AL MATERIAL PÉTREO INSTALADO EN OBRA

* SE REALIZA LA APLICACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MEZCLA ASFÁLTICA ENTRE LOS PR 001+450 - PR 001+806

* SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE MATERIAL SUB BASE PARA 123,05 M DE CUNETA

4. CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD MODIFICATORIA N0 1	VALOR UNITARIO	AVANCE SEMANAL(ES) ANTERIOR(ES)			AVANCE SEMANA ACTUAL			AVANCE SEMANA TOTAL		
					CANTIDAD SEMANA(S) ANTERIOR(ES)	VALOR SEMANA(S) ANTERIOR(ES)	% AVANCE SEMANA(S) ANTERIOR(ES)	CANTIDAD SEMANA ACTUAL	VALOR SEMANA ACTUAL	% AVANCE SEMANA ACTUAL	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% AVANCE TOTAL ACUMULADO
1	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**												
101	Excavación manual en material común de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	M3	376,70	$ 49.311,14	188,13	$ 9.276.904,77	49,94%	8,15	$ 401.885,79	2,16%	196,28	$ 9.678.791,00	52,10%
2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**												
201	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio clasificado Tmax. 3"	M3	643,08	$ 63.629,51	643,08	$ 40.918.865,29	100,00%		$ -	0,00%	643,08	$ 40.918.865,00	100,00%
202	Sub base granular triturada	M3	306,93	$ 99.919,66	306,93	$ 30.868.186,74	100,00%		$ -	0,00%	306,93	$ 30.868.187,00	100,00%
203	Base granular (INV. 330. 1)	M3	824,01	$ 114.773,79	812,00	$ 93.196.317,48	98,54%	12,01	$ 1.378.433,22	1,46%	824,01	$ 94.574.751,00	100,00%
204	Imprimación con emulsión asfáltica	M2	6.373,62	$ 5.007,93	3.954,66	$ 19.804.660,45	62,05%	2.418,96	$ 12.113.982,35	37,95%	6.373,62	$ 31.918.643,00	100,00%
205	Mezcla asfáltica MDC-2 o 19	M3	446,15	$ 1.074.126,70	276,83	$ 297.350.494,36	62,05%	169,32	$ 181.871.132,84	37,95%	446,15	$ 479.221.627,00	100,00%
3	**OBRAS DE DRENAJE**												
301	Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=0.45 m)	M	123,05	$ 50.380,78	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%
302	Malla electrosoldada Q-4 o M - 159	KG	115,67	$ 7.889,49	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
303	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 Psi	M3	-	$ 560.489,26	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
304	Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transportada	M3	11,07	$ 84.101,97		$ -	0,00%	11,07	$ 931.008,81	0,00%	11,07	$ 931.009,00	100,00%



INFORME SEMANAL DE OBRA

CAIPRO

305	Relleno de excavación (con material local)	M3	4,43	$	19.151,09	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
306	Tubería PVC alcantarillado 16" . Suministro e instal.	M	-	$	310.922,90	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
307	Bolsa o saco con arena de 0.60 x 0.80 para obras de protección	UND	-	$	9.151,84	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
308	Piedra pegada en Mortero 1:4, e=0.15 m	M2	-	$	66.631,87	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
4	**OBRAS DE URBANISMO**													
401	Lineas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700. 1)	M	-	$	4.184,49	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
402	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 75 X 75 cm	UND	-	$	575.874,50	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
403	Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (simbolos y letreros)	M2	-	$	35.926,70	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
404	Tacha reflectiva	UND	-	$	13.136,24	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
5	**TRANSPORTE**													
501	Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	M3-KM	11.398,46	$	1.912,44	10.303,08	$ 19.704.022,32	90,39%	1.095,38	$ 2.094.848,53	9,61%	11.398,46	$ 21.798.871,00	100,00%
502	Transporte de material Pétreo (vía destapada)	M3-KM	2.670,96	$	2.022,17	2.414,38	$ 4.882.286,80	90,39%	256,58	$ 518.848,38	9,61%	2.670,96	$ 5.401.135,00	100,00%
6	**RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE**													
601	Excavación mecánica con retiro y disposición final	M3	162,72	$	23.023,91	162,72	$ 3.746.450,64	100,00%		$ -	0,00%	162,72	$ 3.746.451,00	100,00%
7	**NO PREVISTOS**													
NP-01	Demolición de cunetas con Retiro mecánico	M3	148,11	$	182.801,46	148,11	$ 27.074.724,24	100,00%		$ -	0,00%	148,11	$ 27.074.724,00	100,00%
NP-02	Rocería con retiro	HA	1,65	$	635.382,44	1,65	$ 1.048.381,03	100,00%		$ -	0,00%	1,65	$ 1.048.381,00	100,00%
NP-03	Corte en carpeta asfáltica	M	22,30	$	11.798,70	22,30	$ 263.111,01	100,00%		$ -	0,00%	22,30	$ 263.111,00	100,00%
NP-04	Demolición mecánica en pavimento en concreto asfaltico (inc. Retiro)	M2	415,96	$	14.966,46	415,96	$ 6.225.448,70	100,00%		$ -	0,00%	415,96	$ 6.225.449,00	100,00%
NP-05	Movilización y Desmovilización de equipo pesado	KM	225,00	$	43.200,28	112,50	$ 4.860.029,25	50,00%	112,50	$ 4.860.029,25	50,00%	225,00	$ 9.720.059,00	100,00%
NP-06	Desmonte y limpieza (incluye retiro)	M2	1.422,00	$	3.904,76	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
NP-07	Filtro O Dren Francés PVC 100 MM (0,4X0,6) M	M	1.053,00	$	93.139,38	537,50	$ 50.062.416,75	51,04%		$ -	0,00%	537,50	$ 50.062.417,00	51,04%

AVANCE DE ACTIVIDADES						
SUBTOTAL OBRAS	$ 609.282.300,00		$ 204.170.169,00		$ 813.452.471,00	
SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)	$ 609.282.300,00		$ 204.170.169,00		$ 813.452.471,00	
IMPLEMENTACIÓN PAGA	$ 22.314.134,00	71,07%	$ -	21,57%	$ 22.314.134,00	92,64%
PMT	$ 39.571.236,00		$ -		$ 39.571.236,00	
CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 1.542.680,00		$ -		$ 1.542.680,00	
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	**$ 672.710.350,00**		**$ 204.170.169,00**		**$ 876.880.521,00**	

5. COMPARACIÓN PORCENTUAL AVANCE

ACUMULADO PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR %	PROGRAMADO PRESENTE SEMANA %	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO %	ACUMULADO EJECUTADO SEMANA ANTERIOR %	EJECUTADO PRESENTE SEMANA %	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO %	% DE RETRASO O AVANCE
73,69%	11,40%	85,09%	71,07%	21,57%	92,64%	-7,55%

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

POLIZAS DE GARANTIA

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
MANEJO DE ANTICIPO	OK	28-abr.-2023	21-abr.-2024	$ 473.270.116,00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	OK	28-abr.-2023	20-dic.-2026	$ 47.327.011,60	
ESTABILIDAD Y CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	OK	2-feb.-2023	2-feb.-2028	$ 94.654.023,20	ULTIMA ACTUALIZACION DEL CONTRATO: ACTA DE PRORROGA No 2
CUMPLIMIENTO	OK	28-abr.-2023	21-abr.-2024	$ 94.654.023,20	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	OK	20-nov.-2023	20-dic.-2023	$ 232.000.000,00	

4248


20	
INFORME SEMANAL DE OBRA	CAIPRO

7. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

8. REGISTRO FOTOGRAFICO





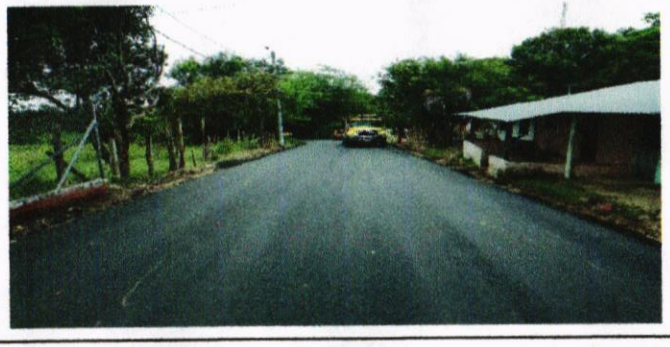



Elaborado por:

ING. ALFREDO VARON
Director de obra







