GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 1

CONSORCIO INTERGAVIMAVE

FECHA:	20	agosto	2024				
PERÍODO:	SEMANA No.	1	DEL	9/08/2024	HASTA	18/08/2024	

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SST A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	202401450		CONTRATO INTERVENTORÍA:	202401655	
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL KCG		CONTRATISTA INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERGAVIMAVE	
VALOR INICIAL	$16.937.647.163,00		VALOR INICIAL	$1.148.808.864	
ADICIONES	$0,00		ADICIONES	$0,00	
VR ACTUALIZADO	$16.937.647.163,00		VR ACTUALIZADO	$1.148.808.864,00	
PLAZO INICIAL	Hasta 31 Dic 2024	144,00 días	PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES	144,00 días
ACTA DE INICIO	viernes, 9 de agosto de 2024		ACTA DE INICIO	viernes, 9 de agosto de 2024	
PRORROGA	N.A.	0,00 días	PRORROGA	N.A.	0,00 días
SUSPENSION 1	N.A.	0,00 días	SUSPENSION 1	N.A.	0,00 días
SUSPENSION 2	N.A.	0,00 días	SUSPENSION 2	N.A.	0,00 días
PLAZO ACTUALIZADO	SEIS (6) MESES	144,00 días	PLAZO ACTUALIZADO	SEIS (6) MESES	144,00 días
FECHA DE TERMINACIÓN	martes, 31 de diciembre de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN	martes, 31 de diciembre de 2024	
PLAZO TRANSCURRIDO	9,00 días	6,25%	PLAZO TRANSCURRIDO	9,00 días	6,25%


2. AVANCE DEL CONVENIO O CONTRATO

LOTE No 1

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO ACUMULADO	% FISICO EJECUTADO EN EL PERIODO	% AVANCE ACUMULADO EJECUTADO FISICO	EJECUTADO PESOS EN EL PERIODO	EJECUTADO PESOS ACUMULADO
1	9/08/2024	18/08/2024	0,10%	0,50%	0,50%	$ 84.688.236	$ 84.688.235,82
2	19/08/2024	25/08/2024	0,30%	0,00%	0,00%	$ -	$ 84.688.235,82
3	26/08/2024	1/09/2024	0,45%	0,00%	0,00%	$ -	$ 84.688.235,82
4	2/09/2024	8/09/2024	1,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ 84.688.235,82
5	9/09/2024	15/09/2024	2,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ 84.688.235,82
6	16/09/2024	22/09/2024	8,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ 84.688.235,82
7	23/09/2024	29/09/2024	15,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ 84.688.235,82
8	30/09/2024	6/10/2024	22,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ 84.688.235,82
9	7/10/2024	13/10/2024	26,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ 84.688.235,82
10	14/10/2024	20/10/2024	37,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ 84.688.235,82
11	21/10/2024	27/10/2024	45,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ 84.688.235,82
12	28/10/2024	3/11/2024	56,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ 84.688.235,82
13	4/11/2024	10/11/2024	68,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ 84.688.235,82
14	11/11/2024	17/11/2024	75,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ 84.688.235,82
15	18/11/2024	24/11/2024	81,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ 84.688.235,82
16	25/11/2024	1/12/2024	85,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ 84.688.235,82
17	2/12/2024	8/12/2024	91,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ 84.688.235,82
18	9/12/2024	15/12/2024	95,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ 84.688.235,82
19	16/12/2024	22/12/2024	98,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ 84.688.235,82
20	23/12/2024	31/12/2024	100,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ 84.688.235,82

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO O CONTRATO





Cronogramas presentados por contraistas de Obra, han sido objeto de observaciones - esperando subsanación para generar curva S y diagramas de Controles - De momento se toman los indicadores interpretados de ese cronograma, para meidiciones de seguimiento

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES Y CONTROL A LA PROGRAMACIÓN

TRAMO VIAL	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ESTADO DE SOCIALIZACIÓN	FECHA DE SOCIALIZACIÓN	ESTADO TEMAS PREDIALES	ACTIVADO / NO ACTIVADO	OBSERVACIONES
LOTE No 1						
Piojó -El Cruce (El Vaivén) -Tubará -Juan Mina -Barranquilla (Av. CIRCUNVALAR) (5m Ancho Prom)	Rocería - Tipificación de rocería - Identificación de patologías viales.	Por Resolver	N.D.	Sin Novedad	Activado	14 De Agosto se llevó a cabo recorrido (Contratista, Interventoría y Gobernación) para re-identificar los alcances de las reparaciones, siendo mas dirigidas a reparación de fisuras resaltando el alcance de Mantenimiento Vial y el estado actual de la rocería.
Ruta 9006AT-03 (Yee Tubará) -Guaimaral Paluato -Galapa (3m Ancho Prom)	Rocería - Tipificación de rocería	Por Resolver	N.D.	Sin Novedad	Activado	Se llevó a cabo recorrido (Contratista e Interventoría) para tipificar el tipo de rocería.
Cruce Ruta 9006 (Carretera La Cordialidad) -Isabel López -Usiacurí -Baranoa (5m Ancho Prom)	Rocería - Tipificación de rocería - Identificación de patologías viales.	Por Resolver	N.D.	Sin Novedad	Activado	14 De Agosto se llevó a cabo recorrido (Contratista, Interventoría y Gobernación) para re-identificar los alcances de las reparaciones, siendo mas dirigidas a reparación de fisuras resaltando el alcance de Mantenimiento Vial y el estado actual de la rocería.
Carrera 51B, Ruta 9006AAT-14 (Ye de Los Chinos) -UNIATLÁNTICO -Barranquilla (Av. CIRCUNVALAR) (4.5m Ancho Prom)	Rocería - Tipificación de rocería	Por Resolver	N.D.	Sin Novedad	Activado	Se llevó a cabo recorrido (Contratista e Interventoría) para tipificar el tipo de rocería.
Juan De Acosta -Sibarco-Baranoa (incluye retiro de derrumbe en el K2+000y fallos en el K1+450 y K2+500) (5 m Prom)	Sin Actividades	Por Resolver	N.D.	Sin Novedad	No Activado	Contratista Indica apertura de frente en la semana entrante en actividades de rocería.
Baranoa (Cruce Ruta 9006 -Carretera La Cordialidad) -Polonuevo (4m Ancho Prom)	Rocería - Tipificación de rocería - Identificación de patologías viales.	Por Resolver	N.D.	Sin Novedad	Activado	14 De Agosto se llevó a cabo recorrido (Contratista, Interventoría y Gobernación) para re-identificar los alcances de las reparaciones, siendo mas dirigidas a reparación de fisuras resaltando el alcance de Mantenimiento Vial y el estado actual de la rocería.
Cruce Ruta 90AT-08 -Ye de Salgar (Cruce Ruta 90AT08-1) (Salgar –Curva los Manaties –La Playa) (5 m Prom)	Sin Actividades	Por Resolver	N.D.	Sin Novedad	No Activado	Se requiere apertura de frente por parte del Contratista de obra en labores de rocería
Ruta 9006AAT-14 (Ye de Los Chinos) Sabanilla -Cruce Ruta 9006AAT-14-1-A (Mallorquín) (intersección Sabanalla Curva los Manaties)(5 m Prom)	Sin Actividades	Por Resolver	N.D.	Sin Novedad	No Activado	Se requiere apertura de frente por parte del Contratista de obra en labores de rocería
Ruta 90A (Autopista al Mar -Ye de Los Chinos) -Pradomar (Puerto Colombia)	Gestión de Ajuste de Diseños por Parte del Contratista Puente Detrás de Olimpica en Malecón	Por Resolver	N.D.	Sin Novedad	No Activado	De momento Contratista indica que los diseños se encuentran en ajuste.
OTROS TRAMOS Sector Platanal Soledad	Gestión de Ajuste de Diseños por Parte del Contartista	Por Resolver	N.D.	Sin Novedad	No Activado	Se precisan Definicoines de Alcances Con Municipo de Soledad y Constructora Bolivar para determinar haswta donde llegan los alcances del contarto en el Sector Villegas
Variante de Baranoa (Villa Zunilda -Vía Baranoa -Usiacuri)	Gestión de Ajuste de Diseños por Parte del Contartista	Por Resolver	N.D.	Sin Novedad	Activado	Se requiere por parte del Contratista documentación preliminar a las actividades para los diferentes seguientos:

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ESPACIO PARA CURVA S y COMENTARIOS

Cronogramas presentados por contratistas de Obra, han sido objeto de observaciones - esperando subsanación para generar curva S y diagramas de Controles - De momento se toman los indicadores interpretados de ese cronograma, para mediciones de seguimiento

Avence a Fecha 0,50%

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 1

CONSORCIO INTERGAVIMAVE

FECHA:	20	agosto	2024				
PERÍODO:	SEMANA No.	1	DEL	9/08/2024	HASTA	18/08/2024	

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SST A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
TODOS LOS FRENTES	Director de Obra (1) Residente de Obra (1) Residentes Sociales (2) Operatoivos en Campo (150 Obreros Diferentes Frentes) Anexo 0 del Presente Informe	Director de Interventoría (1) Residente de Interventoria (2) Profesional Social (1) Profesional SST (1) Topógrafo (1) Conductor (1) Profesional Ambiental (1) Inspectores de Interventoría (2)	Derretidora Ruteadora Compresor Guadañadora Motosierra Vehículo para Movilización de Personal Equipo de topografia	Vehículo para Movilización de Personal Equipo de topografia Equipos de computo

En Anexo 0 del Presente Informe, se detallan controles de personal y equipo en Obras en medida de Actiacion de Ejecuciones

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1 - 2 — ROCERIA Y TIPIFICACIÓN DE ROCERIA (TRAMO GUAIMARAL - GALAPA)



FOTO 3 - 4 — INICIO ACTIVIDADES ROCERIA Y TIPIFICACIÓN DE PATOLOGIAS (TRAMO POLONUEVO - BARANOA)



FOTO 5 - 6 — ROCERIA Y TIPIFICACIÓN DE ROCERIA (TRAMO USIACURI - BARANOA)



FOTO 7 - 8 — INICIO REPARACIÓN FISURAS (TRAMO PIOJO - VAIVEN)

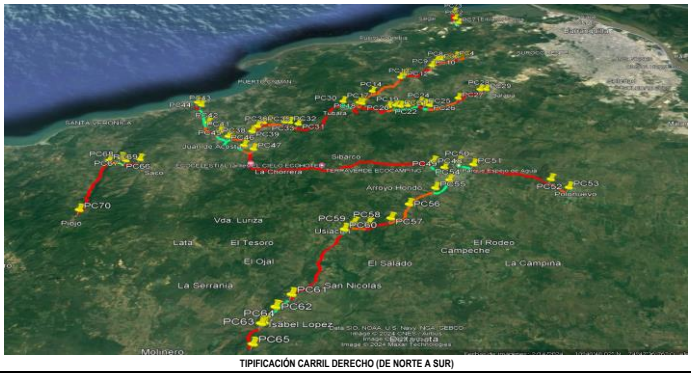


FOTO 9 - 10 — RECORRIDO (CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y GOBERNACION) DEFINICIONES APARTE ROCERIA

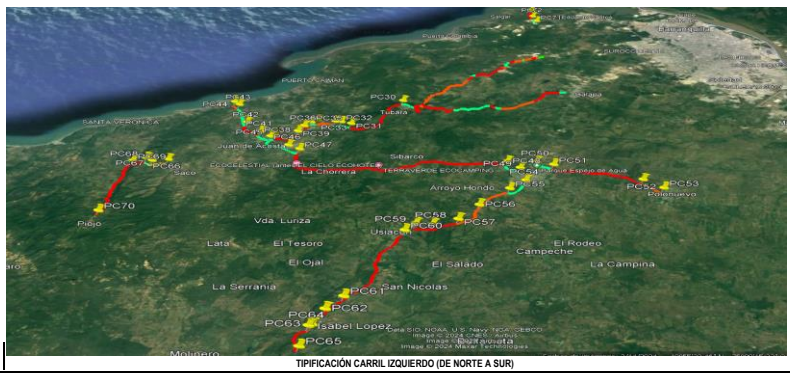


FOTO 10 - 11 — TIPIFICACIÓN ROCERIA (TAMO JUAN MINA - TUBARA)

ESQUEMAS AVANCE TIPIFICACION DE ROCERIA



TIPIFICACIÓN CARRIL DERECHO (DE NORTE A SUR)



TIPIFICACIÓN CARRIL IZQUIERDO (DE NORTE A SUR)

TRAMOS DE ROSERIA IDENTIFICADA - CONTRATISTA RECLAMA QUE LOS ALCANCES DE ROCERIA NO SON CONCRDANTES CON LO CONTRATADO
(ESPERANDO MANIFSTACION FORMAL SOBRE PLANTEAMIENTO DEL CONTRATISTA) (ROJO TIPO 1, NARANJA TIPO 2, VERDE TIPO 3)

7. OBSERVACIONES

7.0. GESTIONES PERMISOS Y LICENCIAMIENTOS

En Tramite PMT Villa Zunilda para Traslado a Municipio

7.1. TECNICAS

• Se emitió el Oficio M202408081-001-2024 haciendo requerimiento de información para seguimientos respectivos, destacando principalmente :
1. Memorias de cálculo de las actividades identificadas en las tres vías adelantadas en verificación de momento.
2. Consolidado en plantilla de presupuesto contractual para tales actividades
3. Archivos Satelitales de tales vías
4. Informe de conteo de vehículos en diferentes vías (para frente de villa zunilda)
Cabe resaltar que a los requerimientos anteriores se le aunan los mencionados en el checklist mencionado en el anterior oficio.

• Se estan ejecutando las actividades de roceria e iniciaron las actividades de reparación de fisuras en el tramo de PIOJO - VAIVEN

• Se hizo recorrido en pro de identificar la rocería en los diferentes tramos

• Se llevó a cabo comité de seguimiento el 13 de agosto con intención de aterrizar los apartes documentales para respectiva entrega.

• Se llevó a cabo recorrido junto con Contratista y Gobernación, para definición de apartes relacionados con roceria y alcance de reparaciones en el tramo de baranoa - polonuevo

FECHA:	20	agosto	2024				
PERÍODO:	SEMANA No.	1	DEL	9/08/2024	HASTA	18/08/2024	

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SST A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

7.2. SOCIAL

Durante el periodo de reporte no se adelantan actividades del componente social

7.3. SST Y AMBIENTALES

Durante el periodo de reporte de ejecutan las actividades de obra en cumplimiento de las normas SST y ambientales no se requiere obtencion de permisos ambientales para las actividades a ejecutar hasta la fecha

8. SITUACIONES PROBLEMÁTICAS EN DESARROLLOS DEL PROYECTO (DE MOMENTO NO APLICA)

Reavizado por:	Reealizado por:	Aprobado por:
NOMBRE: Claudia Suarez Artgarita	**NOMBRE:** Ing. Andres Velandia - Luis Ospino	**NOMBRE:** Fernando Pelaez
CARGO: Director Interventoria	**CARGO:** residente Interv - inspector Interv	**CARGO:** Apoyo a Supervisor del Contrato

CONSORCIO
INTERGAVIMAVE

ANEXO 1
CONTROL DETALLADO DE EQUIPOS Y PERSONAL EN OBRA

SEGUIMIENTO PERSONAL Y EQUIPOS EN OBRA

FECHA	RECURSOS EN CAMPO		Piojó -El Cruce (El Valvén) -Tubará -Juan Mina - Barranquilla (Av. CIRCUNVALAR). (3m Ancho Prom)	Ruta 9006AT-03 (Yee Tubará) -Guaimaral Palueto -Galapa (3m Ancho Prom)	Cruce Ruta 9006 (Carretera La Cordialidad) - Isabel López -Usiacurí -Baranoa (5m Ancho Prom)	Carrera 51B. Ruta 9006AAT-14 (Ye de Los Chinos) -UNIATLÁNTICO -Barranquilla (Av. CIRCUNVALAR) (4.5m Ancho Prom)	Juan De Acosta -Sibarco-Baranoa (incluye retiro de derrumbe en el K2+000y fallos en el K1+450 y K2+500) (3 m Prom)	Baranoa (Cruce Ruta 9006 -Carretera La Cordialidad) -Polonuevo (4m Ancho Prom)	Ruta 9006AAT-14 (Ye de Los Chinos) Sabanilla - Cruce Ruta 9006AAT-14-1-A. (Mallorquin) (Intersección Sabananilla Curva los Manatíes)(5 m Prom)	Ruta 90A (Autopista al Mar -Ye de Los Chinos) - Pradomar (Puerto Colombia)	OTROS TRAMOS Sector Platanal Soledad	Variante de Baranoa (Villa Zunilda -Vía Baranoa - Usiacurí)
9/08/2024	PERSONAL EN OBRA	CUADRILLAS	N/A	1 Cuadrilla (Jardineros)	1 Cuadrilla (Jardineros)	1 Cuadrilla (Jardineros)	N/A	1 Cuadrilla (Jardineros)	N/A	N/A	N/A	1 Cuadrilla (Jardineros)
		No DE TRABAJADORES	N/A	4	4	4	N/A	4	N/A	N/A	N/A	4
	EQUIPOS EN OBRA	EQUIPOS EN USO	N/A	2	2	2	N/A	2	N/A	N/A	N/A	2
		DESCRIPCION DE EQUIPOS	N/A	GUADAÑADORA Y MOTOSIERRA	GUADAÑADORA Y MOTOSIERRA	GUADAÑADORA Y MOTOSIERRA	N/A	GUADAÑADORA Y MOTOSIERRA	N/A	N/A	N/A	GUADAÑADORA Y MOTOSIERRA
10/08/2024	PERSONAL EN OBRA	CUADRILLAS	N/A	1 Cuadrilla (Jardineros)	1 Cuadrilla (Jardineros)	1 Cuadrilla (Jardineros)	N/A	1 Cuadrilla (Jardineros)	N/A	N/A	N/A	1 Cuadrilla (Jardineros)
		No DE TRABAJADORES	N/A	4	4	4	N/A	4	N/A	N/A	N/A	4
	EQUIPOS EN OBRA	EQUIPOS EN USO	N/A	2	2	2	N/A	2	N/A	N/A	N/A	2
		DESCRIPCION DE EQUIPOS	N/A	GUADAÑADORA Y MOTOSIERRA	GUADAÑADORA Y MOTOSIERRA	GUADAÑADORA Y MOTOSIERRA	N/A	GUADAÑADORA Y MOTOSIERRA	N/A	N/A	N/A	GUADAÑADORA Y MOTOSIERRA
11/08/2024	PERSONAL EN OBRA	CUADRILLAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		No DE TRABAJADORES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	EQUIPOS EN OBRA	EQUIPOS EN USO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		DESCRIPCION DE EQUIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12/08/2024	PERSONAL EN OBRA	CUADRILLAS	N/A	1 Cuadrilla (Jardineros)	1 Cuadrilla (Jardineros)	1 Cuadrilla (Jardineros)	N/A	1 Cuadrilla (Jardineros)	N/A	N/A	N/A	1 Cuadrilla (Jardineros)
		No DE TRABAJADORES	N/A	4	4	4	N/A	4	N/A	N/A	N/A	4
	EQUIPOS EN OBRA	EQUIPOS EN USO	N/A	2	2	2	N/A	2	N/A	N/A	N/A	2
		DESCRIPCION DE EQUIPOS	N/A	GUADAÑADORA Y MOTOSIERRA	GUADAÑADORA Y MOTOSIERRA	GUADAÑADORA Y MOTOSIERRA	N/A	GUADAÑADORA Y MOTOSIERRA	N/A	N/A	N/A	GUADAÑADORA Y MOTOSIERRA
13/08/2024	PERSONAL EN OBRA	CUADRILLAS	N/A	1 Cuadrilla (Jardineros)	1 Cuadrilla (Jardineros)	1 Cuadrilla (Jardineros)	N/A	1 Cuadrilla (Jardineros)	N/A	N/A	N/A	1 Cuadrilla (Jardineros)
		No DE TRABAJADORES	N/A	4	4	4	N/A	4	N/A	N/A	N/A	4
	EQUIPOS EN OBRA	EQUIPOS EN USO	N/A	2	2	2	N/A	2	N/A	N/A	N/A	2
		DESCRIPCION DE EQUIPOS	N/A	GUADAÑADORA Y MOTOSIERRA	GUADAÑADORA Y MOTOSIERRA	GUADAÑADORA Y MOTOSIERRA	N/A	GUADAÑADORA Y MOTOSIERRA	N/A	N/A	N/A	GUADAÑADORA Y MOTOSIERRA
14/08/2024	PERSONAL EN OBRA	CUADRILLAS	CUADRILLAS REPARACIÓN FISURAS	1 Cuadrilla (Jardineros)	1 Cuadrilla (Jardineros)	1 Cuadrilla (Jardineros)	N/A	1 Cuadrilla (Jardineros)	N/A	N/A	N/A	1 Cuadrilla (Jardineros)
		No DE TRABAJADORES	8	4	4	4	N/A	4	N/A	N/A	N/A	4
	EQUIPOS EN OBRA	EQUIPOS EN USO	3	2	2	2	N/A	2	N/A	N/A	N/A	2
		DESCRIPCION DE EQUIPOS	DERRETIDORA Y RUTEADORA	GUADAÑADORA Y MOTOSIERRA	GUADAÑADORA Y MOTOSIERRA	GUADAÑADORA Y MOTOSIERRA	N/A	GUADAÑADORA Y MOTOSIERRA	N/A	N/A	N/A	GUADAÑADORA Y MOTOSIERRA
15/08/2024	PERSONAL EN OBRA	CUADRILLAS	CUADRILLAS REPARACIÓN FISURAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		No DE TRABAJADORES	8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	EQUIPOS EN OBRA	EQUIPOS EN USO	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		DESCRIPCION DE EQUIPOS	DERRETIDORA Y RUTEADORA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CONSORCIO
INTERGAVIMAVE

ANEXO 3
CONTROL CANTIDADES EJECUTADAS

ANEXO 3
CONTROL CANTIDADES Y PRESUPUESTO

ESPECIFIC	ITEM	CONTROL DE CANTIDADES CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES VIGENTES MODIFICATORIO No 1			CANTIDADES EJECUTADAS									VRES EJECUTADOS			% ACUMULADO EJECUTADO ACTUAL INVERSIÓN	% ACUMULADO EJECUTADO ACTUAL FISICO	SALDOS POR EJECUTAR	
		Descripcion	Und	Cant	Vr Unitario	Vr Parcial	Cant	Vr Unitario	Vr Parcial Presupuestos Estimados y/o con Cierre	ACUM ANTERIOR	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom	PRESENTE CORTE	ACUMULADO ACTUAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ACTUAL			CANT	VR POR EJECUTAR
		CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PATINAJE EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA				$ 16.937.647.161,10			$ 16.937.647.161,10											$ -	$ 84.625.980,00	$ 84.625.980,00	0,50%	0,50%		$ 16.853.021.181,00
		MANTENIMIENTO RUTINARIO																								
	EP1	ROCERÍA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN ZONA NO BOSCOSAS - TIPO 1 (densidad baja, h<2 m y diam.> 4")	Ha	1,50	$ 801.881,00	$ 1.202.821,50	1,50	$ 801.881,00	$ 1.202.821,50	-	0,20	0,30	0,30	0,20	0,20	0,10		1,30	1,30		$ 1.042.445,00	$ 1.042.445,00	86,67%	86,67%	0,20	$ 160.376,00
	EP2	ROCERÍA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN ZONA NO BOSCOSAS - TIPO 2 (densidad intermedia, 1> h <2 m, 2" > diam. > 4")	Ha	41,32	$ 539.908,00	$ 22.308.998,56	41,32	$ 539.908,00	$ 22.308.998,56	-	0,70	1,40	1,60	1,70	1,30	1,30		8,00	8,00		$ 4.319.264,00	$ 4.319.264,00	19,36%	19,36%	33,32	$ 17.989.735,00
	EP3	ROCERÍA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN ZONA NO BOSCOSAS - TIPO 3 (densidad baja, h<1 m, diam.< 2")	Ha	275,83	$ 360.978,00	$ 99.568.561,74	275,83	$ 360.978,00	$ 99.568.561,74	-	0,10	0,30	0,20	0,30	0,30	0,10		1,30	1,30		$ 469.271,00	$ 469.271,00	0,47%	0,47%	274,53	$ 99.099.290,00
466-2022		SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUEDO	m	79.397,50	$ 18.540,00	$ 1.472.029.650,00	79.397,50	$ 18.540,00	$ 1.472.029.650,00	-	500,00	700,00	750,00	730,00	780,00	600,00	190,00	4.250,00	4.250,00		$ 78.795.000,00	$ 78.795.000,00	5,35%	5,35%	75147,50	$ 1.393.234.650,00
	EP4	LIMPIEZA DE CUNETAS LATERALES, HOMBRILLO DEL BORDE DE LA VÍA Y DISIPADORES	m	324,28	$ 3.720,00	$ 1.206.321,60	324,28	$ 3.720,00	$ 1.206.321,60	-								-	-				0,00%	0,00%	324,28	$ 1.206.322,00
	EP5	LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJES (Alcantarillas, Box-culvert, Cajoneras)	UNIDAD	200,00	$ 699.651,00	$ 139.930.200,00	200,00	$ 699.651,00	$ 139.930.200,00	-								-	-				0,00%	0,00%	200,00	$ 139.930.200,00
211-2022		REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	5.600,00	$ 20.378,00	$ 114.116.800,00	5.600,00	$ 20.378,00	$ 114.116.800,00	-								-	-				0,00%	0,00%	5600,00	$ 114.116.800,00
						SUB TOTAL $ 1.850.363.353,40	-		$ 1.850.363.353,40											$ -	$ 84.625.980,00	$ 84.625.980,00	4,57%	4,57%		$ 1.765.737.373,00
		MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN																								
201-2022		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	m2	4.162,17	$ 17.886,00	$ 74.444.572,62	4.162,17	$ 17.886,00	$ 74.444.572,62	-					-			-	-				0,00%	0,00%	4162,17	$ 74.444.573,00
210-2022		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	25.389,24	$ 29.605,00	$ 751.648.450,20	25.389,24	$ 29.605,00	$ 751.648.450,20	-					-			-	-				0,00%	0,00%	25389,24	$ 751.648.450,00
221-2022		MEJORAR SU CAPACIDAD	m3	2.497,30	$ 200.000,00	$ 499.460.000,00	2.497,30	$ 200.000,00	$ 499.460.000,00	-					-			-	-				0,00%	0,00%	2497,30	$ 499.460.000,00
320-2022		SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE C (Analizado para tipo de graduacion SGB-50, Clase C)	m3	12.486,51	$ 68.000,00	$ 849.082.680,00	12.486,51	$ 68.000,00	$ 849.082.680,00	-					-			-	-				0,00%	0,00%	12486,51	$ 849.082.680,00
330-2022		BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE C (Analizado para tipo NT1, de gradacion BG 27, clase C)	m3	10.405,43	$ 92.000,00	$ 957.299.560,00	10.405,43	$ 92.000,00	$ 957.299.560,00	-					-			-	-				0,00%	0,00%	10405,43	$ 957.299.560,00
420-2022		RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-40	m2	30.215,54	$ 4.122,00	$ 124.548.449,28	30.215,54	$ 4.122,00	$ 124.548.449,28	-					-			-	-				0,00%	0,00%	30215,54	$ 124.548.449,00
450-2022		MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MDC-19 (Compra de Mezcla)	m3	3.021,55	$ 1.580.000,00	$ 4.774.055.067,04	3.021,55	$ 1.580.000,00	$ 4.774.055.067,04	-					-			-	-				0,00%	0,00%	3021,55	$ 4.774.055.067,00
610-2022		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Analizado sin preparacion de superficie base del relleno)	m3	25,80	$ 65.164,00	$ 1.681.279,71	25,80	$ 65.164,00	$ 1.681.279,71	-					-			-	-				0,00%	0,00%	25,80	$ 1.681.280,00
321-2022		GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES (Analizado para geotextil no tejido)	m2	535,13	$ 10.327,00	$ 5.526.251,88	535,13	$ 10.327,00	$ 5.526.251,88	-					-			-	-				0,00%	0,00%	535,13	$ 5.526.252,00
681-2022		GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 5: RECUBRIMIENTO DE ALEACIÓN Zn-5Al-MM Y PVC (analizado para gavion de vol 2m3 (2 modulo de caida de 1 mt x 1mt x 1mt))	m3	264,70	$ 319.565,00	$ 84.587.745,17	264,70	$ 319.565,00	$ 84.587.745,17	-					-			-	-				0,00%	0,00%	264,70	$ 84.587.745,00
671-2022		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	1.222,19	$ 880.000,00	$ 1.075.527.918,37	1.222,19	$ 880.000,00	$ 1.075.527.918,37	-					-			-	-				0,00%	0,00%	1222,19	$ 1.075.527.918,00
630-2022		TIPO DE CONCRETO G (Analizado para concreto ciclopeo con resistencia 17 Mpa)	m3	15,29	$ 376.331,00	$ 5.753.848,85	15,29	$ 376.331,00	$ 5.753.848,85	-					-			-	-				0,00%	0,00%	15,29	$ 5.753.849,00
630-2022		TIPO DE CONCRETO F (Analizado para concreto liviano resistencia 14 Mpa, mezcla in situ)	m3	276,16	$ 483.965,00	$ 133.653.479,41	276,16	$ 483.965,00	$ 133.653.479,41	-					-			-	-				0,00%	0,00%	276,16	$ 133.653.479,00
630-2022		TIPO DE CONCRETO D (Analizado para concreto reforzado de resistencia 21 Mpa (compra de material)	m3	258,01	$ 1.160.000,00	$ 299.288.634,62	258,01	$ 1.160.000,00	$ 299.288.634,62	-					-			-	-				0,00%	0,00%	258,01	$ 299.288.635,00
630-2022		TIPO DE CONCRETO C (Analizado para concreto reforzado resistencia 28 Mpa, compra de mezcla)	m3	516,01	$ 1.040.500,00	$ 536.913.490,20	516,01	$ 1.040.500,00	$ 536.913.490,20	-					-			-	-				0,00%	0,00%	516,01	$ 536.913.490,00
	EP6	MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOSINTETICOS	m3	340,19	$ 375.545,00	$ 127.755.749,37	340,19	$ 375.545,00	$ 127.755.749,37	-					-			-	-				0,00%	0,00%	340,19	$ 127.755.749,00
673-2022		GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO (Analizado para geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n)	m2	2.341,18	$ 9.996,00	$ 23.402.421,84	2.341,18	$ 9.996,00	$ 23.402.421,84	-					-			-	-				0,00%	0,00%	2341,18	$ 23.402.422,00
673-2022		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	64,00	$ 138.816,00	$ 8.884.224,00	64,00	$ 138.816,00	$ 8.884.224,00	-					-			-	-				0,00%	0,00%	64,00	$ 8.884.224,00
201-2022		REMOCIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	m2	27,00	$ 19.826,00	$ 535.302,00	27,00	$ 19.826,00	$ 535.302,00	-					-			-	-				0,00%	0,00%	27,00	$ 535.302,00
220-2022		TERRAPLENES CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	69,53	$ 56.560,00	$ 3.932.616,80	69,53	$ 56.560,00	$ 3.932.616,80	-					-			-	-				0,00%	0,00%	69,53	$ 3.932.617,00
350-2022		MATERIAL GRANULAR TRATADO CON CEMENTO (MGTC) CLASE 2, INCLUYE SUM. CEMENTO (Analizado para Material fino a granular clase 2, MT2)	m3	1.114,19	$ 157.832,00	$ 175.854.836,08	1.114,19	$ 157.832,00	$ 175.854.836,08	-					-			-	-				0,00%	0,00%	1114,19	$ 175.854.836,00
500-2022		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (Analizado para un hidraulico MT2)	m3	1.559,86	$ 1.380.000,00	$ 2.152.606.800,00	1.559,86	$ 1.380.000,00	$ 2.152.606.800,00	-					-			-	-				0,00%	0,00%	1559,86	$ 2.152.606.800,00
640-2022		ACERO DE REFUERZO fy = 4200 MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	60.074,23	$ 10.585,00	$ 635.885.724,55	60.074,23	$ 10.585,00	$ 635.885.724,55	-					-			-	-				0,00%	0,00%	60074,23	$ 635.885.725,00
						SUB TOTAL $ 13.302.329.101,98	-		$ 13.302.329.101,98											$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%		$ 13.302.329.102,00
	1.3	**TRANSPORTE DE MATERIALES**																								
900-2022		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km)	m3-km	66.873,66	$ 2.080,00	$ 139.097.216,92	66.873,66	$ 2.080,00	$ 139.097.216,92	-					-			-	-				0,00%	0,00%	66873,66	$ 139.097.217,00
900-2022		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km)	m3-km	45.420,38	$ 1.970,00	$ 89.478.143,67	45.420,38	$ 1.970,00	$ 89.478.143,67	-					-			-	-				0,00%	0,00%	45420,38	$ 89.478.144,00
	EP7	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE ZONAS DE CANTERAS, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km)	m3-km	467.693,14	$ 2.080,00	$ 972.801.721,13	467.693,14	$ 2.080,00	$ 972.801.721,13	-					-			-	-				0,00%	0,00%	467693,14	$ 972.801.721,00
	EP8	ASEO	glb	1,00	$ 233.577.624,00	$ 233.577.624,00	1,00	$ 233.577.624,00	$ 233.577.624,00	-					-			-	-				0,00%	0,00%	1,00	$ 233.577.624,00
		REVISION, ANALISIS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y AJUSTE PRESUPUESTAL (Incluido IVA) (NO MODIFICABLE)	und	1,00	$ 350.000.000,00	$ 350.000.000,00	1,00	$ 350.000.000,00	$ 350.000.000,00	-					-			-	-				0,00%	0,00%	1,00	$ 350.000.000,00
						SUB TOTAL $ 1.784.954.705,72	-		$ 1.784.954.705,72											$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%		$ 1.784.954.706,00
		SUBTOTAL CONSTRUCCION DE PISTA DE PATINAJE EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA				$ 16.937.647.161,10			$ 16.937.647.161,10											$ 0,00	$ 84.625.980,00	$ 84.625.980,00	0,50%	0,50%		$ 16.853.021.181,00
