INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 11

CONSORCIO INTERGAVIMAVE

FECHA:	26	noviembre	2024				
PERÍODO:	SEMANA No. 11	DEL	15/11/2024	HASTA	25/11/2024		

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SST A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.


1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	202401450			CONTRATO INTERVENTORÍA:	202401655		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL KCG			CONTRATISTA INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERGAVIMAVE		
VALOR INICIAL	$16,937,647,163.00			VALOR INICIAL	$1,148,808,864		
ADICIONES	$0.00			ADICIONES	$0.00		
VR ACTUALIZADO	$16,937,647,163.00			VR ACTUALIZADO	$1,148,808,864.00		
PLAZO INICIAL	Hasta 31 Dic 2024	145.00	días	PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES	184.00	días
ACTA DE INICIO	viernes, 9 de agosto de 2024			ACTA DE INICIO	viernes, 9 de agosto de 2024		
PRORROGA	N.A.	0.00	días	PRORROGA	N.A.	0.00	días
SUSPENSION 1	del 25/14/2024 al 15/11/2024	21.00	días	SUSPENSION 1	del 25/14/2024 al 15/11/2024	21.00	días
SUSPENSION 2	N.A.	0.00	días	SUSPENSION 2	N.A.	0.00	días
REINICIO NO.1	15 de noviembre de 2024			REINICIO NO.1	15 de noviembre de 2024		
PLAZO ACTUALIZADO	SEIS (6) MESES	145.00	días	PLAZO ACTUALIZADO	SEIS (6) MESES	145.00	días
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	martes, 31 de diciembre de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN	martes, 31 de diciembre de 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	sábado, 25 de enero de 2025			FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	sábado, 25 de enero de 2025		
PLAZO TRANSCURRIDO	87.00	días	60.00%	PLAZO TRANSCURRIDO	87.00	días	60.00%

2. AVANCE DEL CONVENIO O CONTRATO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO ACUMULADO	% FISICO EJECUTADO EN EL PERIODO	% AVANCE ACUMULADO EJECUTADO	Atraso /adelanto	EJECUTADO PESOS EN EL PERIODO	EJECUTADO PESOS ACUMULADO
1	9/8/2024	18/8/2024	0.67%	0.50%	0.50%	-0.17%	$ 84,688,236	$ 84,688,235.82
2	19/8/2024	25/8/2024	1.48%	1.67%	2.17%	0.69%	$ 282,264,472	$ 366,972,708.04
3	26/8/2024	1/9/2024	2.33%	1.66%	3.83%	1.50%	$ 281,808,000	$ 648,780,708.07
4	2/9/2024	8/9/2024	3.19%	2.03%	5.86%	2.67%	$ 343,917,000	$ 992,697,708.11
5	9/9/2024	15/9/2024	6.97%	3.00%	8.86%	1.89%	$ 507,977,831	$ 1,500,675,538.94
6	16/9/2024	22/9/2024	12.64%	0.87%	9.73%	-2.91%	$ 147,357,530	$ 1,648,033,068.96
7	23/9/2024	29/9/2024	19.07%	0.76%	10.49%	-8.58%	$ 128,827,150	$ 1,776,860,219.12
8	30/9/2024	6/10/2024	25.51%	5.56%	16.05%	-9.46%	$ 941,632,151	$ 2,718,492,369.66
9	7/10/2024	13/10/2024	32.03%	6.08%	22.13%	-9.90%	$ 1,029,935,131	$ 3,748,427,500.42
10	14/10/2024	25/10/2024	38.61%	7.97%	30.10%	-8.51%	$ 1,349,804,296	$ 5,098,231,796.06
11	15/11/2024	24/11/2024	30.10%	6.58%	36.68%	6.58%	$ 1,114,497,183	$ 6,212,728,979.39
12	25/11/2024	1/12/2024	35.96%	0.00%	0.00%	0.00%	$ -	$ 6,212,728,979.39
13	2/12/2024	8/12/2024	44.41%	0.00%	0.00%	0.00%	$ -	$ 6,212,728,979.39
14	9/12/2024	15/12/2024	53.09%	0.00%	0.00%	0.00%	$ -	$ 6,212,728,979.39
15	16/12/2024	22/12/2024	63.34%	0.00%	0.00%	0.00%	$ -	$ 6,212,728,979.39
16	23/12/2024	29/12/2024	73.51%	0.00%	0.00%	0.00%	$ -	$ 6,212,728,979.39
17	30/12/2024	5/1/2025	83.36%	0.00%	0.00%	0.00%	$ -	$ 6,212,728,979.39
18	6/1/2025	12/1/2025	96.34%	0.00%	0.00%	0.00%	$ -	$ 6,212,728,979.39
19	13/1/2025	19/1/2025	99.24%	0.00%	0.00%	0.00%	$ -	$ 6,212,728,979.39
20	20/1/2025	21/1/2025	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	$ -	$ 6,212,728,979.39

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO O CONTRATO





ANALISIS DE LA GRAFICA

Durante en el periodo de reporte se realiza una reprogramación de las actividades de obra sustentada en las dificultades identificadas en la zona de villa Zunilda con la instalación de la tuberia por parte de la empresa prestadora de servicios Triple A por otro lado es necesario movilizar las actividades de acuerdo a la suspensión No.1, asi las cosas de acuerdo con la repogramación se observa una nivelación en lo que respecta a los avances sin embargo, y dada la dinamica del contrato es necesario aumentar los rendimientos para evitar futuros atrasos

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES Y CONTROL A LA PROGRAMACIÓN

TRAMO VIAL	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ESTADO DE SOCIALIZACIÓN	FECHA DE SOCIALIZACIÓN	ESTADO TEMAS PREDIALES	ACTIVADO / NO ACTIVADO	OBSERVACIONES
LOTE No 1						
Variante de Baranoa (Villa Zunilda -Vía Baranoa -Usiacuri)	Demolición de pavimento existente, relleno y mejoramiento de subsrante	Socializado	1/9/2024	Sin Novedad	Activado	en el presente periodo de reporte se adelantan actividades de mejoramiento de subrsante con la adición de RCD producto de la demolición de pavimentos rigidos para zonas muy blandas

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ESPACIO PARA CURVA S y COMENTARIOS

Cronograma aportado por contratista de momento se evidencia un porcentaje ejecutado de % 36.68 vs un porcentaje programado de % 30.10 lo que indica un porcente de adelanto (+) /atraso (-) de % 6.58 en actividades contractuales.

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 11

CONSORCIO INTERGAVIMAVE

FECHA:	26	noviembre	2024				
PERÍODO:	SEMANA No. 11		DEL	15/11/2024	HASTA	25/11/2024	

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SST A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
TODOS LOS FRENTES	Director de Obra (1) Residente de Obra (1) Residentes Sociales (2) Operatoivos en Campo (13 Obreros Diferentes Frentes) Anexo 0 del Presente Informe	Director de Interventoría (1) Residente de Interventoría (2) Profesional Social (1) Profesional SST (1) Topógrafo (1) Conductor (1) Profesional Ambiental (1) Inspectores de Interventoría (2)	Retroexcavadora Vibrocompactador Motoniveladora Carro tanque	Vehículo para Movilización de Personal Equipo de topografía Equipos de computo

En Anexo 0 del Presente Informe, se detallan controles de personal y equipo en Obras en medida de Actiacion de Ejecuciones

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO





Actividades de mejoramiento de subrasante con adición de RCD producto de la demolición de pavimentos por exposición de la subrasante a residuos de desechos humanos Tramo Villa Zunilda K00+210 hasta K00+220




Suministro e instalación de estabilización de subrasnte con material canto rodado tramo Villa Zunilda K00+220 hasta K00+235

7. OBSERVACIONES

7.0. GESTIONES PERMISOS Y LICENCIAMIENTOS

En Tramite PMT Villa Zunilda ante la secretaria de transito

7.1. TECNICAS

- Actividades de mejoramiento de subrsante con adición de material RCD producto de la demolición de pavimento rigido para controlar zonas afectadas por las actividades adelantadas por la empresa Triple A y la exposición de la subrasante a los elementos tramo Villa Zunilda desde el K000+220 hasta el K00+240
- Actividad de instalación capa de mejoramiento de subrasante con adición de material granular segun diseño remitido a la entidad

7.2. SOCIAL

* Se adelanta actividades de seguimiento y validacion de la ejecución de las actividades sociales en los tramos de villa zunilda
* A la fecha no se tiene ninguna PQR abierta.

7.3. SST Y AMBIENTALES

- Se radico oficio 68f M202408081-068A-2024 Traslado Solicitud Reinicio No 1 Contratos Obra e Interventoría del 15/11/2024
- Se radico oficio 69. M202408081-069-2024 Remisión atención comunicado 20241000010581 del 15/11/2024
- Se radico oficio 70. M202408081-070-2024 concepto aprobacion diseño de pavimento tramo villa zunilda 19/11/2024
- Se radico oficio 71. M202408081-071-2024 remisión diseño de pavimentos aprobado tramo Villa Zunilda del 19/11/2024
- Se radico oficio 72. M202408081-072-2024 Aprobacion Ajuste Cronograma por Condiciones Modificatorio No 1 Obra y Novedad Reinicio No 1 del 21/11/2024
- Se radico oficio 73. M202408081-073-2024 Traslado Validacion Ajuste Cronograma Obra Por Modificatorio No 1 del 21/11/2024
- Se radico oficio 74. M202408081-074-2024 Concepto Para Solicitud de Prorroga No. 1 Cto Obra 202401450 del 21/11/2024
- Se radico oficio 75. M202408081-075-2024 Traslado acta parcial No 1 de interventoria para firma del 25/11/2024

por otro lado, se realizan comites semanales en las instalaciones de la gobernación para exponer cada una de las problematicas y solicitar los apoyos pertinentes para obtener soluciones oportunas que permitan el apropiado desarrollo del contrato

8. SITUACIONES PROBLEMÁTICAS EN DESARROLLOS DEL PROYECTO (DE MOMENTO NO APLICA)

Durante el periodo de reporte se observa que el contratista de obra tiene dificultades para cumplir con los tiempos adecuados para resolver temas administrativos actualmente tiene en mora la entrega de la informacion de los informes mensuales, el balance de obra para modificatorio entre otros por lo que se ha venido solicitando de manera continuada tanto en campo como a travez de oficios el cumplimeinto por lo que se esta a la espera para tomar medidas a fin de cominar el contratista la cumplimiento

Reavizado por:	Reealizado por:	Aprobado por:
NOMBRE: Claudia Suarez Angarita	**NOMBRE:** Ing. Ignacio Hernadez - Luis Ospino	**NOMBRE:** Fernando Pelaez
CARGO: Director Interventoría	**CARGO:** Residente Interv - inspector Interv	**CARGO:** Apoyo a Supervisor del Contrato

CONSORCIO
INTERGAVIMAVE

ANEXO 0
CONTROL DETALLADO DE EQUIPOS Y PRSONAL EN OBRA

SEGUIMIENTO PERSONAL Y EQUIPOS EN OBRA

FECHA	RECURSOS EN CAMPO		Pigjó -El Cruce (El Vaivén) -Tubará -Juan Mina - Barranquilla (Av. CIRCUNVALAR) (5m Ancho Prom)	Ruta 9006AT-03 (Yee Tubará) -Guaimaral Paluato -Galapa (3m Ancho Prom)	Cruce Ruta 9006 (Carretera La Cordialidad) - Isabel López -Usiacuri -Baranoa (5m Ancho Prom)	Carrera 51B, Ruta 9006AAT-14 (Ye de Los Chinos) -UNIATLÁNTICO -Barranquilla (Av. CIRCUNVALAR) (4.5m Ancho Prom)	Juan De Acosta -Sibarco-Baranoa (incluye retiro de derrumbe en el K2+000y fallos en el K1+450 y K2+500) (5 m Prom)	Baranoa (Cruce Ruta 9006 -Carretera La Cordialidad) -Polonuevo (4m Ancho Prom)	Ruta 9006AAT-14 (Ye de Los Chinos) Sabanilla - Cruce Ruta 9006AAT-14-1-A (Malloquín) (intersección Sabananila Curva los Manatíes)(5 m Prom)	Ruta 90A (Autopista al Mar -Ye de Los Chinos) - Pradomar (Puerto Colombia)	OTROS TRAMOS Sector Platanal Soledad	Variante de Baranoa (Villa Zunilda -Vía Baranoa - Usiacurí)
15/11/2024	PERSONAL EN OBRA	CUADRILLAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Cuadrilla pavimentacion Villa Zunilda
		No DE TRABAJADORES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13
	EQUIPOS EN OBRA	EQUIPOS EN USO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4
		DESCRIPCION DE EQUIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Retroexcavadora, minicargador, carro tanque, motoniveladora
16/11/2024	PERSONAL EN OBRA	CUADRILLAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		No DE TRABAJADORES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	EQUIPOS EN OBRA	EQUIPOS EN USO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		DESCRIPCION DE EQUIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17/11/2024	PERSONAL EN OBRA	CUADRILLAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		No DE TRABAJADORES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	EQUIPOS EN OBRA	EQUIPOS EN USO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		DESCRIPCION DE EQUIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18/11/2024	PERSONAL EN OBRA	CUADRILLAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Cuadrilla pavimentacion Villa Zunilda
		No DE TRABAJADORES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13
	EQUIPOS EN OBRA	EQUIPOS EN USO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4
		DESCRIPCION DE EQUIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Retroexcavadora, minicargador, carro tanque, motoniveladora
19/11/2024	PERSONAL EN OBRA	CUADRILLAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Cuadrilla pavimentacion Villa Zunilda
		No DE TRABAJADORES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13
	EQUIPOS EN OBRA	EQUIPOS EN USO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4
		DESCRIPCION DE EQUIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Retroexcavadora, mincargador, vibrador de concreto, cortadora de pavimento
20/11/2024	PERSONAL EN OBRA	CUADRILLAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Cuadrilla pavimentacion Villa Zunilda
		No DE TRABAJADORES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13
	EQUIPOS EN OBRA	EQUIPOS EN USO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2
		DESCRIPCION DE EQUIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Retroexcavadora, mincargador,
21/11/2024	PERSONAL EN OBRA	CUADRILLAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Cuadrilla pavimentacion Villa Zunilda
		No DE TRABAJADORES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13
	EQUIPOS EN OBRA	EQUIPOS EN USO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2
		DESCRIPCION DE EQUIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Retroexcavadora, mincargador,

CONSORCIO
INTERGAVIMAVE

ANEXO 1
CONTROL DE PROGRAMACIÓN DE OBRA

CONSORCIO INTERGAVIMAVE	ANEXO 2 CONTROL DE AVANCES DE OBRA PROGRAMACION	Edición No 01

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SST A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

PERIODO DEL: 15-nov-24 25-nov-24

FECHA DE CORTE : 25-nov-24

MANTENIMIENTO VIAL

Actividad	Fecha Inicio Actividad	Fecha Final Actividad	Duración Actividad (Semanas)	Esperado Periodo (%)	Observado Periodo (%)	Esperado Acumulado (%)	Requerido Semanal (%)	Cant Ejecución Req Semanal
PROYECTO DE MANTENIMIENTO VIAL	**9/8/2024**	**21/1/2025**	**23.57**			**30.10%**		
INICIO	**9/8/2024**	**9/8/2024**	**0.00**	**100.00%**	**100.00%**	**100%**	**0.00%**	**0.00**
MANTENIMIENTO RUTINARIO	**9/8/2024**	**20/1/2025**	**23.6**	**61%**	**0.00%**	**61%**	**0%**	
ROCERÍA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN ZONA NO BOSCOSAS - TIPO 1 (Muy densa, h>2 m y diam.> 4")	9/8/2024	20/1/2025	23.50	60.98%	0.00%	61%	0.00%	0.00
ROCERÍA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN ZONA NO BOSCOSAS - TIPO 2 (densidad intermedia, 1> h <2 m, 2" > diam. < 4")	9/8/2024	20/1/2025	23.56	60.98%	0.00%	61%	0.00%	0.00
ROCERÍA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN ZONA NO BOSCOSAS - TIPO 3 (densidad baja, h<1 m, diam.< 2")	9/8/2024	9/1/2025	21.99	65.79%	0.00%	66%	0.00%	0.00
SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO	15/8/2024	12/1/2025	21.43	63.06%	0.00%	63%	0.00%	0.00
LIMPIEZA DE CUNETAS LATERALES, HOMBRILLO DEL BORDE DE LA VÍA Y DISIPADORES	28/8/2024	20/1/2025	20.79	55.14%	0.00%	55%	0.00%	0.00
LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJES (Alcantarillas, Box-culvert, Cárcamos)	28/8/2024	20/1/2025	20.79	55.14%	0.00%	55%	0.00%	0.00
REMOCIÓN DE DERRUMBES	21/10/2024	20/12/2024	8.57	37.14%	0.00%	37%	0.00%	0.00
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN	**15/10/2024**	**21/1/2025**	**14.0**	**13%**	**0.00%**	**13%**	**0%**	
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	15/10/2024	28/12/2024	10.57	38.30%	0.00%	38%	0.00%	0.00
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	17/10/2024	12/1/2025	12.43	28.07%	0.00%	28%	0.00%	0.00
PEDRAPLÉN COMPACTO	15/11/2024	14/1/2025	8.57	17.31%	0.00%	17%	0.00%	0.00
SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE C (Analizada para tipo de gradacion SGB-50, Clase C)	8/12/2024	17/1/2025	5.71	0.00%	0.00%	0%	0.00%	0.00
BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE C (Analizada para tipo NT1, de gradacion BG 27, clase C)	9/12/2024	18/1/2025	5.71	0.00%	0.00%	0%	0.00%	0.00
RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-40	10/12/2024	19/1/2025	5.71	0.00%	0.00%	0%	0.00%	0.00
MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MDC-19 (Compra de Mezcla)	16/12/2024	21/1/2025	5.14	0.00%	0.00%	0%	0.00%	0.00
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Analizado sin preparacion de superficie base del relleno)	17/11/2024	7/12/2024	2.86	38.89%	0.00%	39%	0.00%	0.00
TIPO DE CONCRETO F (Analizado para concreto liviano resistencia 14 Mpa, mezcla in situ)	19/11/2024	29/11/2024	1.43	60.00%	0.00%	60%	0.00%	0.00
DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	19/10/2024	14/1/2025	12.43	24.56%	0.00%	25%	0.00%	0.00
TERRAPLENES CON MATERIAL SELECCIONADO	18/10/2024	13/1/2025	12.43	26.32%	0.00%	26%	0.00%	0.00
MATERIAL GRANULAR TRATADO CON CEMENTO (MGTC) CLASE 2, INCLUYE SUM. CEMENTO (Analizado para Material fino o granular clase 2, NT2)	19/10/2024	14/1/2025	12.43	24.56%	0.00%	25%	0.00%	0.00
ACERO DE REFUERZO fy = 4200 MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	27/11/2024	15/1/2025	7.00	0.00%	0.00%	0%	0.00%	0.00
TRANSPORTE DE MATERIALES	**9/8/2024**	**20/1/2025**	**23.50**	**25%**	**0.00%**	**25%**	**-2%**	
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km)	17/10/2024	12/1/2025	12.43	28.07%	0.00%	28%	0.00%	0.00
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE ZONAS DE CANTERAS, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km)	15/11/2024	20/1/2025	9.50	15.79%	0.00%	16%	0.00%	0.00
P.G.I.O.	9/8/2024	30/12/2024	20.43	71.43%	0.00%	71%	0.00%	0.00
REVISION, ANALISIS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y AJUSTE PRESUPUESTAL (Incluido IVA) (NO MODIFICABLE)	9/8/2024	18/10/2024	10.00	100.00%	0.00%	100%	0.00%	0.00
ITEMS NO PREVISTOS	**15/11/2024**	**21/1/2025**	**9.57**	**2%**	**0.00%**	**2%**	**0%**	
MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MDC-19 (Compra de Mezcla, e incluye extension con terminadora de asfalto)	16/12/2024	21/1/2025	5.14	0%	-	0%	0.00	0.00
DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	15/11/2024	20/1/2025	9.50	16%	0	16%	0.00	0.00
PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR-42 MPA E: 0,20 M (INCLUYE DOVELAS DE 1" A 0,30 M, L: 0,35M Y PASADORES DE 1/2" L: 0,85 M, CORTE Y SELLO DE JUNTAS DE DILATACION Y APLICACIÓN DE ANTISOL)	28/11/2024	16/1/2025	7.00	0%	0	0%	0.00	0.00
BORDILLO DE CONCRETO (245 kg/cm2 ó 3500 PSI), (0,15m*0,20m) TIPO I.	30/11/2024	18/1/2025	7.00	0%	0	0%	0.00	0.00
CONCRETO 3000 PSI PARA ANDEN, INCLUYE SUMNISTRO, INSTALACIÓN , MICROTEXTURIZADO Y MACROTEXTURIZADO, CURADO CON ANTISOL	1/12/2024	19/1/2025	7.00	0%	0	0%	0.00	0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T-2400 Ó SIMILAR	26/11/2024	28/11/2024	0.29	0%	0	0%	0.00	0.00
TABLESTACA PERDIDA EN ACERO A50, CON ANCHO EFECTIVO DE UNIDAD DE 0,63 m	20/11/2024	5/12/2024	2.14	36%	0	36%	0.00	0.00

CONSORCIO
INTERGAVIMAVE

ANEXO 2
TENDENCIAS DE EJECUCIONES

CONSORCIO INTERGAVIMAVE

ANEXO 4
CONTROL AVANCE DE INVERSIÓN CONSTRUIDA Vs PROGRAMADA
ANALISIS DE TEDENCIA

EJECUTADO 36.68% DEL PROGRAMA GENERAL META FISICA 36.68% DEL PROGRAMA GENERAL META INVERSION

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SST A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.


PERIODO: DEL: 15-nov-24 AL: 21-nov-24
FECHA DE CORTE: 21-nov-24

CONTRATO DE OBRA 202401450

INDICADORES DEVENIDOS DEL CRONOGRAMA APORTADO Y DEL CONTROL AL MISMO

Semana	Fecha Corte	DURANTE EL PERIODO			FLUJO DE INVERSION PROGRAMADO Vs EJECUTADO ACUMULADO							
		% Esperado Inversión y Meta Física	% Observado Meta Física	Diferencia	% Esperado Inversión	% Esperado Inversión	% Observada Inversión	% Observada Inversión	Diferencia Inversión	Diferencia Meta Física	Vr inversión Ejecutado	Vr inversión Programado
0	9-ago.-24	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	$ -	$ -
1	18-ago.-24	0.67	0.50	-0.170	0.67	0.67	0.50	0.50	-0.170	-0.170	$ 84,688,236	$ 113,482,236
2	25-ago.-24	0.81	1.67	0.857	1.48	1.48	2.17	2.17	0.687	0.687	$ 366,972,708	$ 250,677,178
3	1-sep.-24	0.85	1.66	0.814	2.33	2.33	3.83	3.83	1.500	1.500	$ 648,780,708	$ 394,647,179
4	8-sep.-24	0.86	2.03	1.170	3.19	3.19	5.86	5.86	2.671	2.671	$ 992,697,708	$ 540,310,945
5	15-sep.-24	3.78	3.00	-0.781	6.97	6.97	8.86	8.86	1.890	1.890	$ 1,500,675,539	$ 1,180,554,007
6	22-sep.-24	5.67	0.87	-4.800	12.64	12.64	9.73	9.73	-2.910	-2.910	$ 1,648,033,069	$ 2,140,918,602
7	29-sep.-24	6.43	0.76	-5.669	19.07	19.07	10.49	10.49	-8.579	-8.579	$ 1,776,860,219	$ 3,230,009,314
8	6-oct.-24	6.44	2.05	-4.385	25.51	25.51	16.05	12.55	-9.460	-12.965	$ 2,718,492,370	$ 4,320,793,792
9	13-oct.-24	6.52	9.59	3.065	32.03	32.03	22.13	22.13	-9.899	-9.899	$ 3,748,427,501	$ 5,425,128,387
10	25-oct.-24	6.58	7.97	1.389	38.61	38.61	30.10	30.10	-8.510	-8.510	$ 5,098,231,796	$ 6,539,625,570
11	24-nov.-24	-8.51			30.10	30.10	36.68	36.68	6.580	6.580	$ 6,212,728,980	$ 5,098,231,796
12	1-dic.-24	22.31			52.41	52.41					$ -	$ 8,877,020,879
13	8-dic.-24	8.46			60.87	60.87					$ -	$ 10,309,945,829
14	15-dic.-24	8.04			68.91	68.91					$ -	$ 11,671,732,661
15	22-dic.-24	7.91			76.82	76.82					$ -	$ 13,011,500,551
16	29-dic.-24	6.92			83.74	83.74					$ -	$ 14,183,585,735
17	5-ene.-25	6.36			90.10	90.10					$ -	$ 15,260,820,095
18	12-ene.-25	6.24			96.34	96.34					$ -	$ 16,317,729,278
19	19-ene.-25	3.42			99.76	99.76					$ -	$ 16,896,996,811
20	21-ene.-00	0.24			100.00	100.00					$ -	$ 16,937,647,164

PROYECCION TERMINACION POR TENDENCIAS DE AVANCES

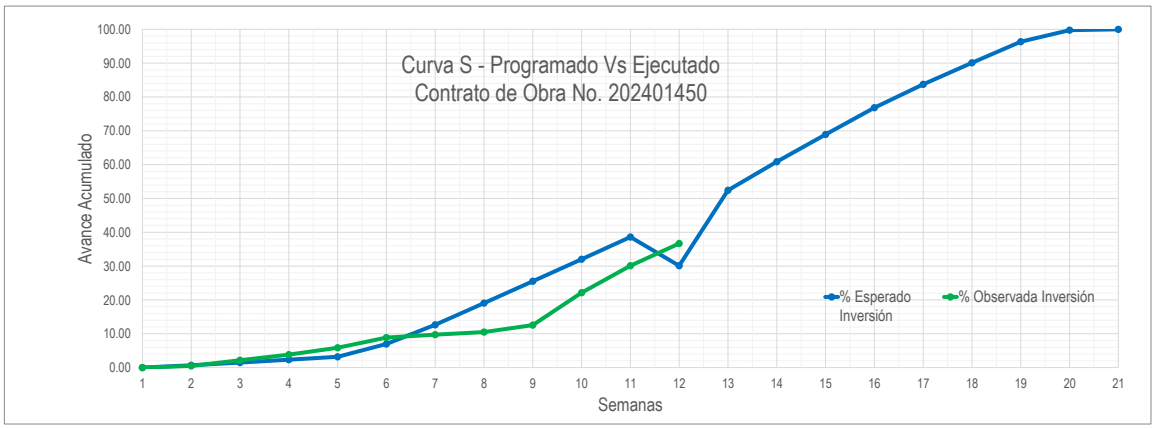

CURVA DE INVERSION PROGRAMADA Vs INVERSION EJECUTADA

COMENTARIOS DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:
Durante el periodo de reporte se presenta una repogramación de obra lo que llevo el porcentaje programado a un valor similar al ejecutado en el periodo pasado por lo que actualmente el contrato de obra presenta un adelando del 6.58%, sin embargo, se adelanta que este adelanto es a causa de la reprogramación por lo que se requiere que el contratista de obra aumente los rendimientos de obra para evitar retrasos dado que la pendiente de la curva programada es alta lo que requiere una mayor ejecución semana con semana para el cumplimiento del contrato dentro de los tiempos actuales

PERIODOS SUSPENDIDOS

25/10/2024 - 15/11/2024

CONSORCIO
INTERGAVIMAVE

ANEXO 3
CONTROL ESTADO DEL TIEMPO

CONSORCIO INTERGAVIMAVE

CONSORCIO INTERGAVIMAVE
INFORME SEMANAL DE SUPERVISION DE CONTRATOS
ANEXO 5 - CONTROL LLUVIAS POR SEMANA

GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO

CODIGO:	MT-IS-001
VERSIÓN:	01
VIGENCIA:	2016-03-03

CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO
L = Leve - M = Moderado - I = Intenso

UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA	ESTADO		DIA DE LA SEMANA																						TOTAL HORAS SEMANA
			LUNES 5/8/2024			MARTES 6/8/2024			MIERCOLES 7/8/2024			JUEVES 8/8/2024			VIERNES 9/8/2024			SABADO 10/8/2024			DOMINGO 11/8/2024			
			L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	
VILLA ZUNILDA	SOLEADO	DESDE														07:00			07:00			07:00			30:00:00
		HASTA														17:00			17:00			17:00			
	LLUVIOSO	DESDE																							0:00:00
		HASTA																							

UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA	ESTADO		DIA DE LA SEMANA																						TOTAL HORAS SEMANA
			LUNES 12/8/2024			MARTES 13/8/2024			MIERCOLES 14/8/2024			JUEVES 15/8/2024			VIERNES 16/8/2024			SABADO 17/8/2024			DOMINGO 18/8/2024			
			L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	
VILLA ZUNILDA	SOLEADO	DESDE		07:00			07:00			07:00		07:00	13:01			13:01		07:00	12:01		07:00			52:27:00
		HASTA		17:00			17:00			17:00		09:30	17:00			17:00		09:00	17:00		12:00			
	LLUVIOSO	DESDE											09:31						09:01					6:28:00
		HASTA											13:00						12:00					

UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA	ESTADO		DIA DE LA SEMANA																						TOTAL HORAS SEMANA
			LUNES 19/8/2024			MARTES 20/8/2024			MIERCOLES 21/8/2024			JUEVES 22/8/2024			VIERNES 23/8/2024			SABADO 24/8/2024			DOMINGO 25/8/2024			
			L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	
VILLA ZUNILDA	SOLEADO	DESDE		07:00		12:31	07:00		07:00	14:01			07:00		07:00	12:31		07:00				07:00			55:27:00
		HASTA		17:00		17:00	11:30		11:00	17:00			17:00		10:00	17:00		09:00				17:00			
	LLUVIOSO	DESDE					11:31			11:01						10:01			09:01						9:26:00
		HASTA					12:30			14:00						12:30			12:00						

UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA	ESTADO		DIA DE LA SEMANA																						TOTAL HORAS SEMANA
			LUNES 26/8/2024			MARTES 27/8/2024			MIERCOLES 28/8/2024			JUEVES 29/8/2024			VIERNES 30/8/2024			SABADO 31/8/2024			DOMINGO 1/9/2024			
			L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	
VILLA ZUNILDA	SOLEADO	DESDE		11:01		07:00			07:00	13:01		07:00			07:00			07:00			07:00			56:28:00
		HASTA		14:00		17:00			10:00	17:00		17:00			13:30			17:00			17:00			
	LLUVIOSO	DESDE	06:00	14:01					10:01							13:30									11:28:00
		HASTA	10:00	17:00					13:00							17:00									

UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA	ESTADO		DIA DE LA SEMANA																						TOTAL HORAS SEMANA
			LUNES 2/9/2024			MARTES 3/9/2024			MIERCOLES 4/9/2024			JUEVES 5/9/2024			VIERNES 6/9/2024			SABADO 7/9/2024			DOMINGO 8/9/2024			
			L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	
VILLA ZUNILDA	SOLEADO	DESDE		07:00			07:00			07:00			07:00			07:00			07:00			07:00			55:30:00
		HASTA		13:00			14:00			15:00			14:00			14:30			17:00			17:00		
	LLUVIOSO	DESDE		13:01			14:01			15:01			14:01			14:31									14:25:00
		HASTA		17:00			17:00			17:00			17:00			17:00									

UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA	ESTADO		DIA DE LA SEMANA																						TOTAL HORAS SEMANA
			LUNES 9/9/2024			MARTES 10/9/2024			MIERCOLES 11/9/2024			JUEVES 12/9/2024			VIERNES 13/9/2024			SABADO 14/9/2024			DOMINGO 15/9/2024			
			L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	
VILLA ZUNILDA	SOLEADO	DESDE		07:00		07:00			07:00			07:00			07:00			07:00			07:00			63:30:00
		HASTA		14:00		16:00			17:00			14:30			17:00			17:00			17:00			
	LLUVIOSO	DESDE			14:01		16:01					14:31													6:27:00
		HASTA			17:00		17:00					17:00													

UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA	ESTADO		DIA DE LA SEMANA																						TOTAL HORAS SEMANA
			LUNES 16/9/2024			MARTES 17/9/2024			MIERCOLES 18/9/2024			JUEVES 19/9/2024			VIERNES 20/9/2024			SABADO 21/9/2024			DOMINGO 22/9/2024			
			L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	
VILLA ZUNILDA	SOLEADO	DESDE	07:00			16:01	07:00		07:00			07:00			07:00			07:00			07:00			65:59:00
		HASTA	16:00			17:00	14:00		17:00			16:00			17:00			17:00			17:00			
	LLUVIOSO	DESDE			16:01	14:01							16:01												3:57:00
		HASTA			17:00	16:00							17:00												

UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA	ESTADO		DIA DE LA SEMANA																						TOTAL HORAS SEMANA
			LUNES 23/9/2024			MARTES 24/9/2024			MIERCOLES 25/9/2024			JUEVES 26/9/2024			VIERNES 27/9/2024			SABADO 28/9/2024			DOMINGO 29/9/2024			
			L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	
VILLA ZUNILDA	SOLEADO	DESDE	07:00	14:01		07:00	13:00		07:00			15:01		07:00		07:00				07:00			07:00		64:28:00
		HASTA	11:00	17:00		11:30	17:00		17:00			17:00		14:00		17:00				17:00			17:00		
	LLUVIOSO	DESDE		11:01				11:31					14:01												5:27:00
		HASTA		14:00				13:00					15:00												

UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA	ESTADO		DIA DE LA SEMANA																						TOTAL HORAS SEMANA
			LUNES 30/9/2024			MARTES 1/10/2024			MIERCOLES 2/10/2024			JUEVES 3/10/2024			VIERNES 4/10/2024			SABADO 5/10/2024			DOMINGO 6/10/2024			
			L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	
VILLA ZUNILDA	SOLEADO	DESDE		07:00		13:30	07:00				07:00		07:00	14:31			07:00			07:00			07:00		67:59:00
		HASTA		17:00		17:00	13:00				17:00		13:00	17:00			17:00			17:00			17:00		
	LLUVIOSO	DESDE					13:01						13:01												1:58:00
		HASTA					13:30						14:30												

UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA	ESTADO		DIA DE LA SEMANA																						TOTAL HORAS SEMANA
			LUNES 7/10/2024			MARTES 8/10/2024			MIERCOLES 9/10/2024			JUEVES 10/10/2024			VIERNES 11/10/2024			SABADO 12/10/2024			DOMINGO 13/10/2024			
			L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	
VILLA ZUNILDA	SOLEADO	DESDE	13:01				13:01	07:00			07:00	07:00	14:01				07:00			07:00			07:00		63:57:00
		HASTA	17:00		07:00		17:00	11:00			17:00	14:00	16:00				16:00			17:00			17:00		
	LLUVIOSO	DESDE		11:01		11:01						16:01			16:01										5:56:00
		HASTA		13:00		13:00						17:00			17:00										

UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA	ESTADO		DIA DE LA SEMANA																						TOTAL HORAS SEMANA
			LUNES 14/10/2024			MARTES 15/10/2024			MIERCOLES 16/10/2024			JUEVES 17/10/2024			VIERNES 18/10/2024			SABADO 19/10/2024			DOMINGO 20/10/2024			
			L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	
VILLA ZUNILDA	SOLEADO	DESDE	07:00	13:01		07:00	11:01		07:00	14:31		07:00	16:01		07:00	13:46		07:00			07:00			58:40:00
		HASTA	09:00	17:00		10:00	17:00		12:00	17:00		14:00	17:00		12:00	17:00		17:00			17:00			
	LLUVIOSO	DESDE	09:01				10:01		13:01			14:01			12:01										10:10:00
		HASTA	13:00				11:00		14:30			16:00			13:45										

UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA	ESTADO		DIA DE LA SEMANA																						TOTAL HORAS SEMANA
			LUNES 21/10/2024			MARTES 22/10/2024			MIERCOLES 23/10/2024			JUEVES 24/10/2024			VIERNES 25/10/2024			SABADO 26/10/2024			DOMINGO 27/10/2024			
			L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	
VILLA ZUNILDA	SOLEADO	DESDE																							0:00:00
		HASTA																							
	LLUVIOSO	DESDE																							0:00:00
		HASTA																							

UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA	ESTADO		DIA DE LA SEMANA																						TOTAL HORAS SEMANA
			LUNES 28/10/2024			MARTES 29/10/2024			MIERCOLES 30/10/2024			JUEVES 31/10/2024			VIERNES 1/11/2024			SABADO 2/11/2024			DOMINGO 3/11/2024			
			L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	
VILLA ZUNILDA	SOLEADO	DESDE																							0:00:00
		HASTA																							
	LLUVIOSO	DESDE																							0:00:00
		HASTA																							

UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA	ESTADO		DIA DE LA SEMANA																						TOTAL HORAS SEMANA
			LUNES 4/11/2024			MARTES 5/11/2024			MIERCOLES 6/11/2024			JUEVES 7/11/2024			VIERNES 8/11/2024			SABADO 9/11/2024			DOMINGO 10/11/2024			
			L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	
VILLA ZUNILDA	SOLEADO	DESDE																							0:00:00
		HASTA																							
	LLUVIOSO	DESDE																							0:00:00
		HASTA																							

UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA	ESTADO		DIA DE LA SEMANA																					TOTAL HORAS SEMANA
			LUNES 11/11/2024			MARTES 12/11/2024			MIERCOLES 13/11/2024			JUEVES 14/11/2024			VIERNES 15/11/2024			SABADO 16/11/2024			DOMINGO 17/11/2024			
			L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	
VILLA ZUNILDA	SOLEADO	DESDE													07:00			07:00			07:00			30:00:00
		HASTA													17:00			17:00			17:00			
	LLUVIOSO	DESDE																						0:00:00
		HASTA																						

UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA	ESTADO		DIA DE LA SEMANA																					TOTAL HORAS SEMANA
			LUNES 18/11/2024			MARTES 19/11/2024			MIERCOLES 20/11/2024			JUEVES 21/11/2024			VIERNES 22/11/2024			SABADO 23/11/2024			DOMINGO 24/11/2024			
			L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	
VILLA ZUNILDA	SOLEADO	DESDE	07:00			07:00			07:00			07:00			07:00			07:00			07:00			58:00:00
		HASTA	15:00			15:00			13:00			13:00			17:00			17:00			17:00			
	LLUVIOSO	DESDE				15:00				13:00			13:00											10:00:00
		HASTA				17:00				17:00			17:00											

UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA	ESTADO		DIA DE LA SEMANA																					TOTAL HORAS SEMANA
			LUNES 25/11/2024			MARTES 26/11/2024			MIERCOLES 27/11/2024			JUEVES 28/11/2024			VIERNES 29/11/2024			SABADO 30/11/2024			DOMINGO 1/12/2024			
			L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	
VILLA ZUNILDA	SOLEADO	DESDE	07:00																					10:00:00
		HASTA	17:00																					
	LLUVIOSO	DESDE																						0:00:00
		HASTA																						

UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA	ESTADO		DIA DE LA SEMANA																					TOTAL HORAS SEMANA
			LUNES 2/12/2024			MARTES 3/12/2024			MIERCOLES 4/12/2024			JUEVES 5/12/2024			VIERNES 6/12/2024			SABADO 7/12/2024			DOMINGO 8/12/2024			
			L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	
VILLA ZUNILDA	SOLEADO	DESDE																						0:00:00
		HASTA																						
	LLUVIOSO	DESDE																						0:00:00
		HASTA																						

UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA	ESTADO		DIA DE LA SEMANA																					TOTAL HORAS SEMANA
			LUNES 9/12/2024			MARTES 10/12/2024			MIERCOLES 11/12/2024			JUEVES 12/12/2024			VIERNES 13/12/2024			SABADO 14/12/2024			DOMINGO 15/12/2024			
			L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	
VILLA ZUNILDA	SOLEADO	DESDE																						0:00:00
		HASTA																						
	LLUVIOSO	DESDE																						0:00:00
		HASTA																						

UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA	ESTADO		DIA DE LA SEMANA																					TOTAL HORAS SEMANA
			LUNES 16/12/2024			MARTES 17/12/2024			MIERCOLES 18/12/2024			JUEVES 19/12/2024			VIERNES 20/12/2024			SABADO 21/12/2024			DOMINGO 22/12/2024			
			L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	
VILLA ZUNILDA	SOLEADO	DESDE																						0:00:00
		HASTA																						
	LLUVIOSO	DESDE																						0:00:00
		HASTA																						

UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA	ESTADO		DIA DE LA SEMANA																					TOTAL HORAS SEMANA
			LUNES 23/12/2024			MARTES 24/12/2024			MIERCOLES 25/12/2024			JUEVES 26/12/2024			VIERNES 27/12/2024			SABADO 28/12/2024			DOMINGO 29/12/2024			
			L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	
VILLA ZUNILDA	SOLEADO	DESDE																						0:00:00
		HASTA																						
	LLUVIOSO	DESDE																						0:00:00
		HASTA																						

UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA	ESTADO		DIA DE LA SEMANA																					TOTAL HORAS SEMANA
			LUNES 30/12/2024			MARTES 31/12/2024			MIERCOLES 1/1/2025			JUEVES 2/1/2025			VIERNES 3/1/2025			SABADO 4/1/2025			DOMINGO 5/1/2025			
			L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	
VILLA ZUNILDA	SOLEADO	DESDE																						0:00:00
		HASTA																						
	LLUVIOSO	DESDE																						0:00:00
		HASTA																						

UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA	ESTADO		DIA DE LA SEMANA																					TOTAL HORAS SEMANA
			LUNES 6/1/2025			MARTES 7/1/2025			MIERCOLES 8/1/2025			JUEVES 9/1/2025			VIERNES 10/1/2025			SABADO 11/1/2025			DOMINGO 12/1/2025			
			L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	
VILLA ZUNILDA	SOLEADO	DESDE																						0:00:00
		HASTA																						
	LLUVIOSO	DESDE																						0:00:00
		HASTA																						

UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA	ESTADO		DIA DE LA SEMANA																					TOTAL HORAS SEMANA
			LUNES 13/1/2025			MARTES 14/1/2025			MIERCOLES 15/1/2025			JUEVES 16/1/2025			VIERNES 17/1/2025			SABADO 18/1/2025			DOMINGO 19/1/2025			
			L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	
VILLA ZUNILDA	SOLEADO	DESDE																						0:00:00
		HASTA																						
	LLUVIOSO	DESDE																						0:00:00
		HASTA																						

UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA	ESTADO		DIA DE LA SEMANA																					TOTAL HORAS SEMANA
			LUNES 20/1/2025			MARTES 21/1/2025			MIERCOLES 22/1/2025			JUEVES 23/1/2025			VIERNES 24/1/2025			SABADO 25/1/2025			DOMINGO 26/1/2025			
			L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	
VILLA ZUNILDA	SOLEADO	DESDE																						0:00:00
		HASTA																						
	LLUVIOSO	DESDE																						0:00:00
		HASTA																						

UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA	ESTADO		DIA DE LA SEMANA																					TOTAL HORAS SEMANA
			LUNES 27/1/2025			MARTES 28/1/2025			MIERCOLES 29/1/2025			JUEVES 30/1/2025			VIERNES 31/1/2025			SABADO 1/2/2025			DOMINGO 2/2/2025			
			L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	
VILLA ZUNILDA	SOLEADO	DESDE																						0:00:00
		HASTA																						
	LLUVIOSO	DESDE																						0:00:00
		HASTA																						

UBICACIÓN O FRENTE DE OBRA	ESTADO		DIA DE LA SEMANA																					TOTAL HORAS SEMANA
			LUNES 3/2/2025			MARTES 4/2/2025			MIERCOLES 5/2/2025			JUEVES 6/2/2025			VIERNES 7/2/2025			SABADO 8/2/2025			DOMINGO 9/2/2025			
			L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	L	M	I	
VILLA ZUNILDA	SOLEADO	DESDE																						0:00:00
		HASTA																						
	LLUVIOSO	DESDE																						0:00:00
		HASTA																						

TOTAL		
	SOLEADO	732:25:00
	LLUVIOSO	85:42:00

PARA EL PERIODO ACTUAL SE INTENSIFICARON CON MAS FRECUCUENCIAS LAS LLUVIAS EN HORAS DEL MEDIO DIA Y LA TARDE, LOS DIAS CON EL TIEMPO SECO Y ELEVADAS TEMPERATURAS Y EVENTUALES BRISAS.

