
REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE N PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 12 NO. 2 32/34, COMÚNMENTE DENOMINADO "PUEBLITO CRIOLLO" DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA.

INFORME RECIBO FINAL & LIQUIDACION

FECHA INFORME: MAYO 19 DE 2025

CONTRATO DE OBRA No 595 DE 2024

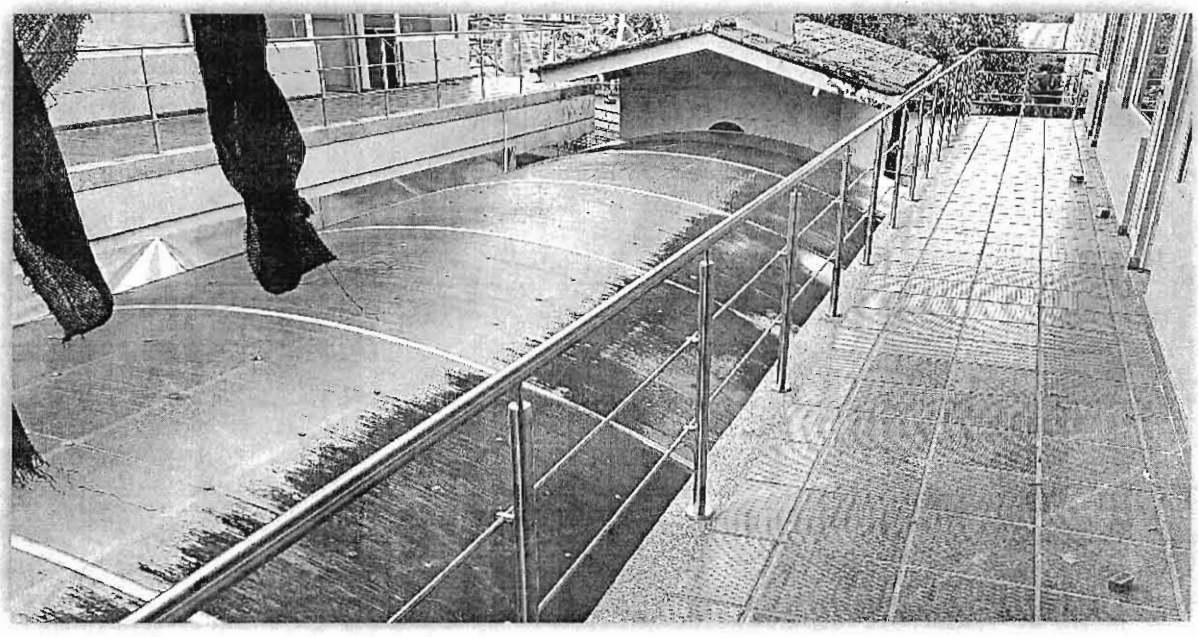

Rcbo S.I
Mayo-19-25.
4:30pm

CONTRATISTA:

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

SUPERVISOR

ING. LINO RODRIGUEZ OCHOA

INFORME RECIBO FINAL & LIQUIDACION		ING. EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
CONTRATO DE OBRA No.:	595 DE 2024	
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	
SUPERVISOR	ING. LINO RODRIGUEZ OCHOA	

INTRODUCCION

El municipio de Tauramena- Casanare celebró el contrato de obra No. 595-2024 con la empresa EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ, con el siguiente objeto contractual: "REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE UN PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 12 NO. 2 32/34, COMÚNMENTE DENOMINADO "PUEBLITO CRIOLLO" DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA".

El presente informe corresponde al informe del contratista, de conformidad al parágrafo del literal 4- FORMAS DE PAGO de la minuta, para permitir a la entidad elaborar al acta de recibo final del contrato de obra No. 595 del 2024, donde se describe el desarrollo de las actividades y obligaciones adquiridas desde el día 27 de diciembre de 2024, hasta el día 17 de marzo de 2025, en donde se terminó la ejecución dentro del plazo establecido, y se desembolsó en calidad de anticipo el 50% de ($36.346.739,00) correspondiente a ($18.173.369,00).

Las actividades realizadas, y que se cobran en el acta de recibo final y dentro del presente informe de ejecución del contratista son las siguientes: *Desmonte de barandas y pasamanos en madera; Desmonte de cielo raso con retiro; Baranda en acero inoxidable 1 hilo D=1 1/2 +2 hilos D= 1/2 H prom 0.90 m Cal 18. Incluye soportes y anclajes a todo costo instalada; Rejilla removible en platina de 2x1/4" hueco de 3" para tapa o pasarela función de inspección y limpieza o drenaje (in. Marco y contramarco) e instalación; Escalera gato en angulo 2"x 1/8" suministro e instal; Suministro e instalación de lámina para cielo raso en superboard pintado 8mm con vinitex o similar calidad; Impermeabilización con mortero acrílico reforzado con fibras para tanques y piscinas E= 2 mm .*

ING. EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

INFORME RECIBO FINAL & LIQUIDACION		ING. EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
CONTRATO DE OBRA No.:	595 DE 2024	
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	

2. TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION

2. TABLA DE CONTENIDO

3. CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO DE OBRA

- 3.1 INFORMACION BASICA DEL CONTRATO
- 3,2 INFORMACION TÉCNICA
- 3,3 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
- 3.4 AVANCE FISICO DE LA OBRA
- 3.5 CANTIDADES EJECUTADAS
- 3.6 PORCENTAJE DE OBRAS EJECUTADAS
- 3.7 RELACION DE POLIZAS
- 3.8 RELACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
- 3.9 GRAFICO DE AVANCE DE OBRA
- 3.10 GRAFICO DE AVANCE EN TIEMPO

4. CONCLUCIONES

5. ANEXOS

- 5.1 REGISTRO FOTOGRAFICO

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

INFORME RECIBO FINAL & LIQUIDACION	ING. EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

CONTRATO DE OBRA No.:	595 DE 2024
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
3.1. CONTRATO DE OBRA	
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO	
CONTRATO INICIAL	
Nombre del Contratante	**MUNICIPIO DE TAURAMENA**
Nombre del Contratista	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
NIT	79799614-9
Representante Legal	N/A
Numero del Contrato	595 DE 2024
Fecha del Contrato	20 DE DICIEMBRE DE 2024
Plazo total de Ejecución	DIEZ (10) DIAS
Valor del Contrato	$ 36,346,739.00
Valor Anticipo (50%)	$ 18,173,369.00
Fecha Acta de Iniciación	27 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha de Terminacion Final	17 DE MARZO DE 2025
PRORROGA EN PLAZO No. 1	
Fecha de la prorroga en plazo No. 1	N/A
Fecha de terminacion del plazo No. 1	N/A
Días de prorroga	N/A
Nueva fecha de terminación	N/A
SUSPENSIÓN No.1	
Fecha de suspensión No. 1	31 DE DICIEMBRE DE 2024
Días de suspensión	VEINTE (20) DIAS
AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.1	
Fecha de la ampliacion No.1	20 DE ENERO DE 2025
Días ampliados	VEINTE (20) DIAS
AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No.1	
Fecha de la ampliacion No.1	07 DE FEBRERO DE 2025
Días ampliados	TREINTA (30) DIAS
REINICIO A LA SUSPENSIÓN No.1	
Fecha acta de reinicio	11 DE MARZO DE 2025
ESTADO ACTUAL	
Valor ejecutado presente informe	$36,299,436.00
Valor anticipo	$18,173,369.00
Saldo a favor del municipio	$47,303.00
Valor por ejecutar	N/A
Valor reajustes	N/A
TOTAL CONTRATADO	**$ 36,346,739.00**

INFORME RECIBO FINAL & LIQUIDACION																				ING. EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
CONTRATO DE OBRA No.:	595 DE 2024																			
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ																			
3.2 INFORMACION TÉCNICA																				
3.2.1 INFORMACIÓN DE EQUIPO - PERSONAL																				
TIEMPO	DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL			
DESCRIPCION	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
EQUIPO																				
Herramienta menor				GL								GL								
PERSONAL																				
Ingeniero Residente				1								1								
Ayudante				2								1								
TOTAL				3								2								
INSTALACIONES																				
BODEGA				1								1								
OFICINA				1								1								

INFORME RECIBO FINAL & LIQUIDACION		ING. EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
CONTRATO DE OBRA No.:	595 DE 2024	
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	

3.3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

3.3.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra localizado en el Municipio de Tauramena-Casanare, en la carrera 13 No. 2 32-34 del barrio centro.



3.3.2 NECESIDAD DE LA OBRA

Es usual que las edificaciones en el transcurrir de su vida útil comience a deteriorarse por multiples efectos de agentes externos, como los diversos cambios de temperatura e hidrológicos, además del desgaste que pueda provocarse por el uso desde la entrega de la obra hasta el presente año, por esta razón la entidad municipal planificó realizar un mantenimiento preventivo, puesto que, en previa acta de visita por parte de la secretaría de infraestructura se pudo evidenciar daños y deteriores en múltiples partes de la sede como por ejemplo las barandas de madera la cual se presentan un estado de deterioro considerable debido a la exposición constante al agua y al sol, cabe destacar que algunas secciones se encuentran ya rotas, el cielo raso de varios salones muestran afectaciones por humedades de la cubierta, y en otras, un desprendimiento total.

De acuerdo a lo anterior, la Secretaría de Infraestructura determinó la necesidad de realizar actividades de: Desmonte de barandas y pasamanos en madera; Desmonte de cielo raso con retiro; Baranda en acero inoxidable 1 hilo D=1 1/2 +2 hilos D= 1/2 H prom 0.90 m Cal 18. (Incluye soportes y anclajes a todo costo instalada); Rejilla removible en platina de 2x1/4" hueco de 3" para tapa o pasarela función de inspección y limpieza o drenaje (inc. Marco y contramarco) e instalación; Escalera gato en angulo 2"x 1/8" suministro e instal; Cerrojo seguridad doble cilindro para puerta de acceso. Suministro e instal; Suministro e instalación de lámina para cielo raso en superboard pintado 8mm con vinitex o similar calidad; Impermeabilización con mortero acrílico reforzado con fibras para tanques y piscinas E= 2 mm.

3.3.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA OBRA

3.3.3.1 ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA FASE DE PLANEACIÓN

El conjunto de actividades contempladas concernientes en la ejecución del objeto del contrato de obra que se llevan a cabo son las siguientes:

INFORME RECIBO FINAL & LIQUIDACION		ING. EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
CONTRATO DE OBRA No.:	595 DE 2024	
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	

3.3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

ITEM	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL
1	Desmonte de barandas y pasamanos en madera.	ml	$ 6,398.00	50	$ 319,900.00
2	Desmonte de cielo raso con retiro.	m2	$ 19,643.00	11	$ 216,073.00
3	Baranda en acero inoxidable 1 hilo D=1 1/2 +2 hilos D= 1/2 H prom 0.90 m Cal 18. Incluye soportes y anclajes a todo costo instalada.	ml	$ 522,000.00	50	$ 26,100,000.00
4	Rejilla removible en platina de 2x1/4" hueco de 3" para tapa o pasarela función de inspección y limpieza o drenaje (in. Marco y contramarco) e instalación.	m2	$ 920,222.00	1.35	$ 1,242,299.70
5	Escalera gato en angulo 2"x 1/8" suministro e instal.	ml	$ 201,274.00	3.1	$ 623,949.40
6	Cerrojo seguridad doble cilindro para puerta de acceso. Suministro e instal.	und	$ 136,411.00	5	$ 682,055.00
7	Suministro e instalación de lámina para cielo raso en superboard pintado 8mm con vinitex o similar calidad.	m2	$ 135,258.00	11	$ 1,487,838.00
8	Impermeabilización con mortero acrílico reforzado con fibras para tanques y piscinas E= 2 mm.	m2	$ 124,717.00	45.5	$ 5,674,623.50
		VALOR TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO (AJUSTADO AL PESO)			$ 36,346,739.00

INFORME RECIBO FINAL & LIQUIDACION		ING. EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
CONTRATO DE OBRA No.:	595 DE 2024	
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	

3.4. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

Se realiza las actividades a Continuación.

1. Desmonte de barandas y pasamanos en madera: Se procedió al desmonte y retiro de las barandas y pasamanos existentes en madera, ubicados en el segundo piso del pueblito criollo. Se utilizaron herramientas manuales y mecánicas para desmontar y retirar los componentes de madera, asegurando la integridad estructural de la edificación.

Descripción técnica:

- Se identificaron y se marcaron los componentes de madera que se iban a desmontar, asegurando que no se dañaron los elementos estructurales adyacentes.
- Se utilizaron herramientas manuales, como llaves y destornilladores, para aflojar y retirar los tornillos, clavos o otros elementos de fijación que sujetaban las barandas y pasamanos.
- Se utilizaron herramientas mecánicas, como taladros y sierras, para cortar o desmontar los componentes de madera que no pudieron ser retirados manualmente.
- Se tomaron medidas para evitar daños a los elementos estructurales, como vigas, columnas o paredes, que se encontraban cerca de las áreas de desmonte.
- Se verificó la estabilidad y la integridad estructural de la edificación después del desmonte, para asegurarse de que no se habían causado daños o debilidades estructurales.

Tareas realizadas:

- Desmonte de barandas y pasamanos en madera
- Retiro de los componentes desmontados
- Limpieza del área de trabajo
- Verificación de la integridad estructural de la edificación

2. Desmonte de cielo raso con retiro: Se procedió al desmonte y retiro del cielo raso existente, ubicado en dos locales previamente identificados en visita de inspección, del segundo piso del pueblito criollo. Se utilizaron herramientas manuales y mecánicas para desmontar y retirar los componentes del cielo raso, asegurando la integridad estructural de la edificación.

Descripción técnica:

- Se identificaron y se marcaron los componentes del cielo raso que se iban a desmontar, asegurando que no se afectara el restante de cielo raso, que si se hallaba en buenas condiciones.
- Se utilizaron herramientas manuales, como llaves y destornilladores, para aflojar y retirar los tornillos, clavos o otros elementos de fijación que sujetaban el cielo raso.
- Se utilizaron herramientas mecánicas, como taladros y sierras, para cortar o desmontar los componentes del cielo raso que no pudieron ser retirados manualmente.
- Se tomaron medidas para evitar daños a los elementos estructurales, como vigas, columnas o paredes, que se encontraban cerca de las áreas de desmonte.
- Se verificó la estabilidad y la integridad estructural de la edificación después del desmonte, para asegurarse de que no se habían causado daños o debilidades estructurales.

INFORME RECIBO FINAL & LIQUIDACION		ING. EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
CONTRATO DE OBRA No.:	595 DE 2024	
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	

3.4. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA

3. Baranda en acero inoxidable 1 hilo D=1 1/2 +2 hilos D= 1/2 H prom 0.90 m Cal 18. Incluye soportes y anclajes a todo costo instalada: Se instaló una baranda en acero inoxidable, incluyendo soportes y anclajes, en toda la zona del segundo piso donde anteriormente estaba las barandas en madera. La baranda se diseñó y se instaló para proporcionar una barrera de seguridad y un elemento estético a la estructura.

Descripción técnica:
- Se preparó el área de trabajo, asegurando que estuviera libre de obstáculos y peligros.
- Se midieron y se marcaron los puntos de anclaje para los soportes de la baranda.
- Se perforaron los agujeros para los anclajes y se insertaron los soportes de la baranda.
- Se instaló la baranda en acero inoxidable, asegurándose de que estuviera nivelada y segura.
- Se fijaron los soportes y anclajes de la baranda utilizando tornillos y arandelas de acero inoxidable.
- Se verificó la estabilidad y la seguridad de la baranda una vez instalada.

Tareas realizadas:
- Preparación del área de trabajo
- Medición y marcado de puntos de anclaje
- Perforación de agujeros para anclajes
- Instalación de soportes y baranda
- Fijación de soportes y anclajes
- Verificación de estabilidad y seguridad

4. Rejilla removible en platina de 2x1/4" hueco de 3" para tapa o pasarela función de inspección y limpieza o drenaje (In. Marco y contramarco) e instalación: Se instaló una rejilla removible en platina de 2x1/4", con marco y contramarco, en la zona de primer piso parte inferior del pueblito criollo. La rejilla se diseñó y se instaló para proporcionar un acceso fácil y seguro para la limpieza y el mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado y ventilación, acorde a las especificaciones técnicas del proceso.

Descripción técnica:
- Se preparó el área de trabajo, asegurando que estuviera libre de obstáculos y peligros.
- Se midieron y se marcaron los puntos de anclaje para el marco de la rejilla.
- Se perforaron los agujeros para los anclajes y se insertaron los tacos de anclaje.
- Se instaló el marco de la rejilla, asegurándose de que estuviera nivelado y seguro.
- Se instaló la platina de 2x1/4" en el marco de la rejilla, asegurándose de que estuviera firme y segura.
- Se instaló el contramarco de la rejilla, asegurándose de que estuviera firme y seguro.
- Se verificó la estabilidad y la seguridad de la rejilla una vez instalada.

Tareas realizadas:
- Preparación del área de trabajo
- Medición y marcado de puntos de anclaje
- Perforación de agujeros para anclajes
- Instalación del marco de la rejilla
- Instalación de la platina de 2x1/4"
- Instalación del contramarco de la rejilla
- Verificación de estabilidad y seguridad

INFORME RECIBO FINAL & LIQUIDACION		ING. EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
CONTRATO DE OBRA No.:	595 DE 2024	
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	

3.4. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA

5. Escalera gato en angulo 2"x 1/8" suministro e instal: Se instaló una escalera gato con elementos en ángulo de 2" x 1/8", en la zona para acceder al tanque aéreo. La escalera gato se diseñó y se instaló para proporcionar un acceso seguro y fácil a las áreas de mantenimiento y reparación.

Descripción técnica:

- Se preparó el área de trabajo, asegurando que estuviera libre de obstáculos y peligros.
- Se midieron y se marcaron los puntos de anclaje para la escalera gato.
- Se perforaron los agujeros para los anclajes y se insertaron los tacos de anclaje.
- Se instaló la escalera gato, asegurándose de que estuviera nivelada y segura.
- Se fijaron los elementos en ángulo de 2" x 1/8" a la escalera gato, asegurándose de que estuvieran firmes y seguros.
- Se verificó la estabilidad y la seguridad de la escalera gato una vez instalada.

Tareas realizadas:

- Preparación del área de trabajo
- Medición y marcado de puntos de anclaje
- Perforación de agujeros para anclajes
- Instalación de la escalera gato
- Fijación de elementos en ángulo de 2" x 1/8"
- Verificación de estabilidad y seguridad

7. **Suministro e instalación de lámina para cielo raso en superboard pintado 8mm con vinitex o similar calidad:** Se instaló lámina para cielo raso en superboard pintada, en las zonas donde ya se hizo el desmontaje de dicha laminas afectadas por la humedad. La lámina se diseñó y se instaló para proporcionar un acabado estético y duradero al cielo raso.

Descripción técnica:

- Se preparó el área de trabajo, asegurando que estuviera libre de obstáculos y peligros.
- Se midieron y se marcaron los puntos de anclaje para la lámina.
- Se cortó la lámina a la medida requerida utilizando una sierra o una cortadora de lámina.
- Se instaló la lámina en el cielo raso, asegurándose de que estuviera nivelada y segura.
- Se fijó la lámina utilizando tornillos o clavos, asegurándose de que estuvieran firmes y seguros.
- Se sellaron las juntas y los bordes de la lámina utilizando un sellador adecuado.

Tareas realizadas:

- Preparación del área de trabajo
- Medición y marcado de puntos de anclaje
- Corte de la lámina
- Instalación de la lámina
- Fijación de la lámina
- Sellado de juntas y bordes

INFORME RECIBO FINAL & LIQUIDACION		ING. EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
CONTRATO DE OBRA No.:	595 DE 2024	
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	

3.4. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA

8. Impermeabilización con mortero acrílico reforzado con fibras para tanques y piscinas E= 2 mm. Se aplicó un mortero acrílico para impermeabilizar dentro del taque aereo, en la parte superior del tanque y en las zonas donde era probable las goteras en la cubierta del pueblito criollo. El mortero acrílico se diseñó y se aplicó para proporcionar una barrera impermeable y duradera contra la infiltración de agua.

Descripción técnica:

- Se preparó la superficie, asegurando que estuviera limpia y libre de obstáculos.
- Se aplicó una capa de imprimación acrílica para mejorar la adherencia del mortero.
- Se mezcló el mortero acrílico según las instrucciones del fabricante.
- Se aplicó el mortero acrílico en una capa uniforme, utilizando una llana o una brocha.
- Se permitió que el mortero se secara completamente, según las instrucciones del fabricante.
- Se aplicó una segunda capa de mortero acrílico, si es necesario.

Tareas realizadas:

- Preparación de la superficie
- Aplicación de imprimación acrílica
- Mezcla del mortero acrílico
- Aplicación del mortero acrílico
- Secado del mortero
- Aplicación de segunda capa (si es necesario)

9. Cerrojo seguridad doble cilindro para puerta de acceso. Suministro e instal. Durante la ejecución se pudo determinar que el ítem de Cerrojo seguirdad doble cilindro para el portón de acceso principal debía ser sustitudo en sus cantidades contratadas, pues, a medida que se fue realizando las demás actividades se observó la necesidad de incrementar las cantidades originales del ítem descrito en el literal anterior, es decir, la aplicación de "impemeabilización con mortero acrílico reforzado con fibras para tanques y piscinas E=2 mm", ya que se identificó que en la placa superior del tanque aéreo contaba con multiples rupturas de un tamaño pequeño que permitían infiltrar el agua de la lluvia dentro de las instalaciones, a lo cual, se podía corroborar que era una de las causas de humedades de la segunda planta de la edificación, por tanto, se requirió realizar mayor y menores cantidades para poder solventar ese imperfecto hallado.

INFORME RECIBO FINAL & LIQUIDACION									ING. EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
CONTRATO DE OBRA No.:	595 DE 2024								
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ								
3.5 CANTIDADES EJECUTADAS									
CONDICIONES ORIGINALES CONTRACTUALES				**CANTIDADES CONTRACTUALES**		**(+/-)**	**PRESENTE INFORME**		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	
1	Desmonte de barandas y pasamanos en madera.	ml	$ 6,398.00	50.00	$ 319,900.00	-1.10	48.90	$ 312,862.00	
2	Desmonte de cielo raso con retiro.	m2	$ 19,643.00	11.00	$ 216,073.00	0.00	11.00	$ 216,073.00	
3	Baranda en acero inoxidable 1 hilo D=1 1/2 +2 hilos D= 1/2 H prom 0.90 m Cal 18. Incluye soportes y anclajes a todo costo instalada.	ml	$ 522,000.00	50.00	$ 26,100,000.00	-1.10	48.90	$ 25,525,800.00	
4	Rejilla removible en platina de 2x1/4" hueco de 3" para tapa o pasarela función de inspección y limpieza o drenaje (in. Marco y contramarco) e instalación.	m2	$ 920,222.00	1.35	$ 1,242,300.00	0.00	1.35	$ 1,242,300.00	
5	Escalera gato en angulo 2"x 1/8" suministro e instal.	ml	$ 201,274.00	3.10	$ 623,949.00	0.00	3.10	$ 623,949.00	
6	Cerrojo seguridad doble cilindro para puerta de acceso. Suministro e instal.	und	$ 136,411.00	5.00	$ 682,055.00	-5.00	0.00	$ 0.00	
7	Suministro e instalación de lámina para cielo raso en superboard pintado 8mm con vinitex o similar calidad.	m2	$ 135,258.00	11.00	$ 1,487,838.00	0.00	11.00	$ 1,487,838.00	
8	Impermeabilización con mortero acrílico reforzado con fibras para tanques y piscinas E= 2 mm.	m2	$ 124,717.00	45.50	$ 5,674,624.00	9.75	55.25	$ 6,890,614.00	
		TOTAL COSTO DIRECTO			$ 36,346,739.00			$ 36,299,436.00	
		TOTAL			$ 36,346,739.00			$ 36,299,436.00	

INFORME RECIBO FINAL & LIQUIDACION		ING. EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
CONTRATO DE OBRA No.:	595 DE 2024	
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	

3.7 PORCENTAJE DE OBRAS EJECUTADAS

CONDICIONES ORIGINALES CONTRACTUALES				CONDICIONES INICIALES		PRESENTE INFORME		PORCENTAJE EJECUTADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	VR. UNIT (Con AIU)	CANT.	VR.TOTAL	CANT	Vr Total	SOBRE CONTRATO	
1	Desmonte de barandas y pasamanos en madera.	ml	$ 6,398.00	50	$ 319,900.00	48.90	$ 312,862.00	0.86%	0.86%
2	Desmonte de cielo raso con retiro.	m2	$ 19,643.00	11	$ 216,073.00	11.00	$ 216,073.00	0.59%	0.60%
3	Baranda en acero inoxidable 1 hilo D=1 1/2 +2 hilos D= 1/2 H prom 0.90 m Cal 18. Incluye soportes y anclajes a todo costo instalada.	ml	$ 522,000.00	50	$ 26,100,000.00	48.90	$ 25,525,800.00	70.23%	70.32%
4	Rejilla removible en platina de 2x1/4" hueco de 3" para tapa o pasarela función de inspección y limpieza o drenaje (in. Marco y contramarco) e instalación.	m2	$ 920,222.00	1.35	$ 1,242,300.00	1.35	$ 1,242,300.00	3.42%	3.42%
5	Escalera gato en angulo 2"x 1/8" suministro e instal.	ml	$ 201,274.00	3.1	$ 623,949.00	3.10	$ 623,949.00	1.72%	1.72%
6	Cerrojo seguridad doble cilindro para puerta de acceso. Suministro e instal.	und	$ 136,411.00	5	$ 682,055.00	0.00	$ 0.00	0.00%	0.00%
7	Suministro e instalación de lámina para cielo raso en superboard pintado 8mm con vinitex o similar calidad.	m2	$ 135,258.00	11	$ 1,487,838.00	11.00	$ 1,487,838.00	4.09%	4.10%
8	Impermeabilización con mortero acrílico reforzado con fibras para tanques y piscinas E= 2 mm.	m2	$ 124,717.00	45.5	$ 5,674,624.00	55.25	$ 6,890,614.00	18.96%	18.98%
		TOTAL COSTO DIRECTO			$ 36,346,739.00		$ 36,299,436.00	99.87%	100.00%
		TOTAL			$ 36,346,739.00		$ 36,299,436.00		

INFORME RECIBO FINAL & LIQUIDACION		ING. EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
CONTRATO DE OBRA No.:	595 DE 2024	
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	
FECHA PRESENTE DE APROBACION:	27 DE ENERO DE 2025	

3.7 RELACION DE POLIZAS

GARANTIAS

POLIZA DE REINICIO	DESCRIPCION AMPAROS	%	SUMA ASEGURADO	VIGENCIA		ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZAS
				DESDE	HASTA	
166974	Cumplimiento	10%	$3,634,673.90	20 de diciembre de 2024	18 de julio de 2025	21 DE ABRIL DE 2025
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$18,173,369.50	20 de diciembre de 2024	18 de julio de 2025	
	Pago de salarios y prestaciones sociales	5%	$1,817,336.95	20 de diciembre de 2024	19 de marzo de 2028	
16143	Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	$284,700,000.00	20 de diciembre de 2024	20 de marzo de 2025	

POLIZA DE ACTA DE INICIO	DESCRIPCION AMPAROS	%	SUMA ASEGURADO	VIGENCIA		ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZAS
				DESDE	HASTA	
166974	Cumplimiento	10%	$3,634,673.90	20 de diciembre de 2024	8 de mayo de 2025	26 DE DICIEMBRE DE 2024
	Buen manejo y correcta inversion del anticipo	100%	$18,173,369.50	20 de diciembre de 2024	8 de mayo de 2025	
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	$1,817,336.95	20 de diciembre de 2024	8 de enero de 2028	
16143	Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	$260,000,000.00	20 de diciembre de 2024	8 de enero de 2025	

INFORME RECIBO FINAL & LIQUIDACION		ING. EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
CONTRATO DE OBRA No.:	595 DE 2024	
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	

3.9 PERSONAL DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PAGO MES DE DICIEMBRE 2024


N°	NOMBRE DEL EMPLEADO	No. DE IDENTIFICACION	CARGO	PERIODO
1	EDWAR BARRETO	79.799.614	AUXILIAR DE OBRA	27 A 31 DIC-24
2	KEVIN FIGUEREDO	1.115.916.022	AUXILIAR DE OBRA	11 A 17 DE MAR-25
3	MONROY HERNANDEZ NOEL	9.505.635	AYUDANTE	27 A 31 DIC-24
4	RAMOS SALAMANCA	1.118.123.677	AYUDANTE	27 A 31 DIC-24 Y 11 A 17 DE MAR-25

INFORME RECIBO FINAL & LIQUIDACION	ING. EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

CONTRATO DE OBRA No.:	595 DE 2024
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ


3.10. GRAFICO AVANCE DE OBRA (Porcentaje Ejecutado Acumulado)

GRAFICO DE AVANCE DE OBRA (PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO)

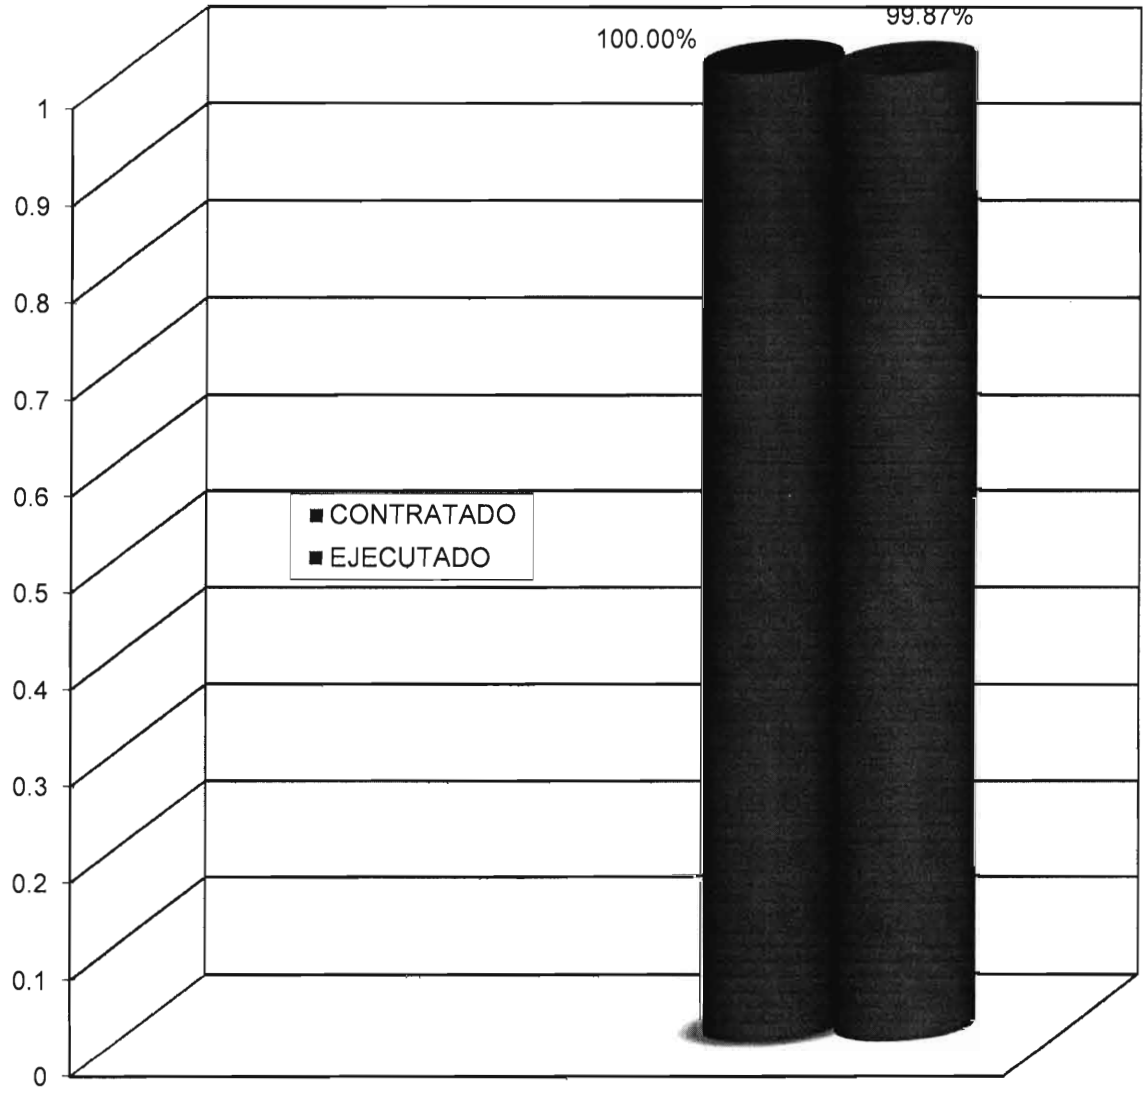

INFORME RECIBO FINAL & LIQUIDACION		ING. EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
CONTRATO DE OBRA No.:	595 DE 2024	
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	

3.11 GRAFICO AVANCE DE TIEMPO (Porcentaje Contratado / Avanzado)

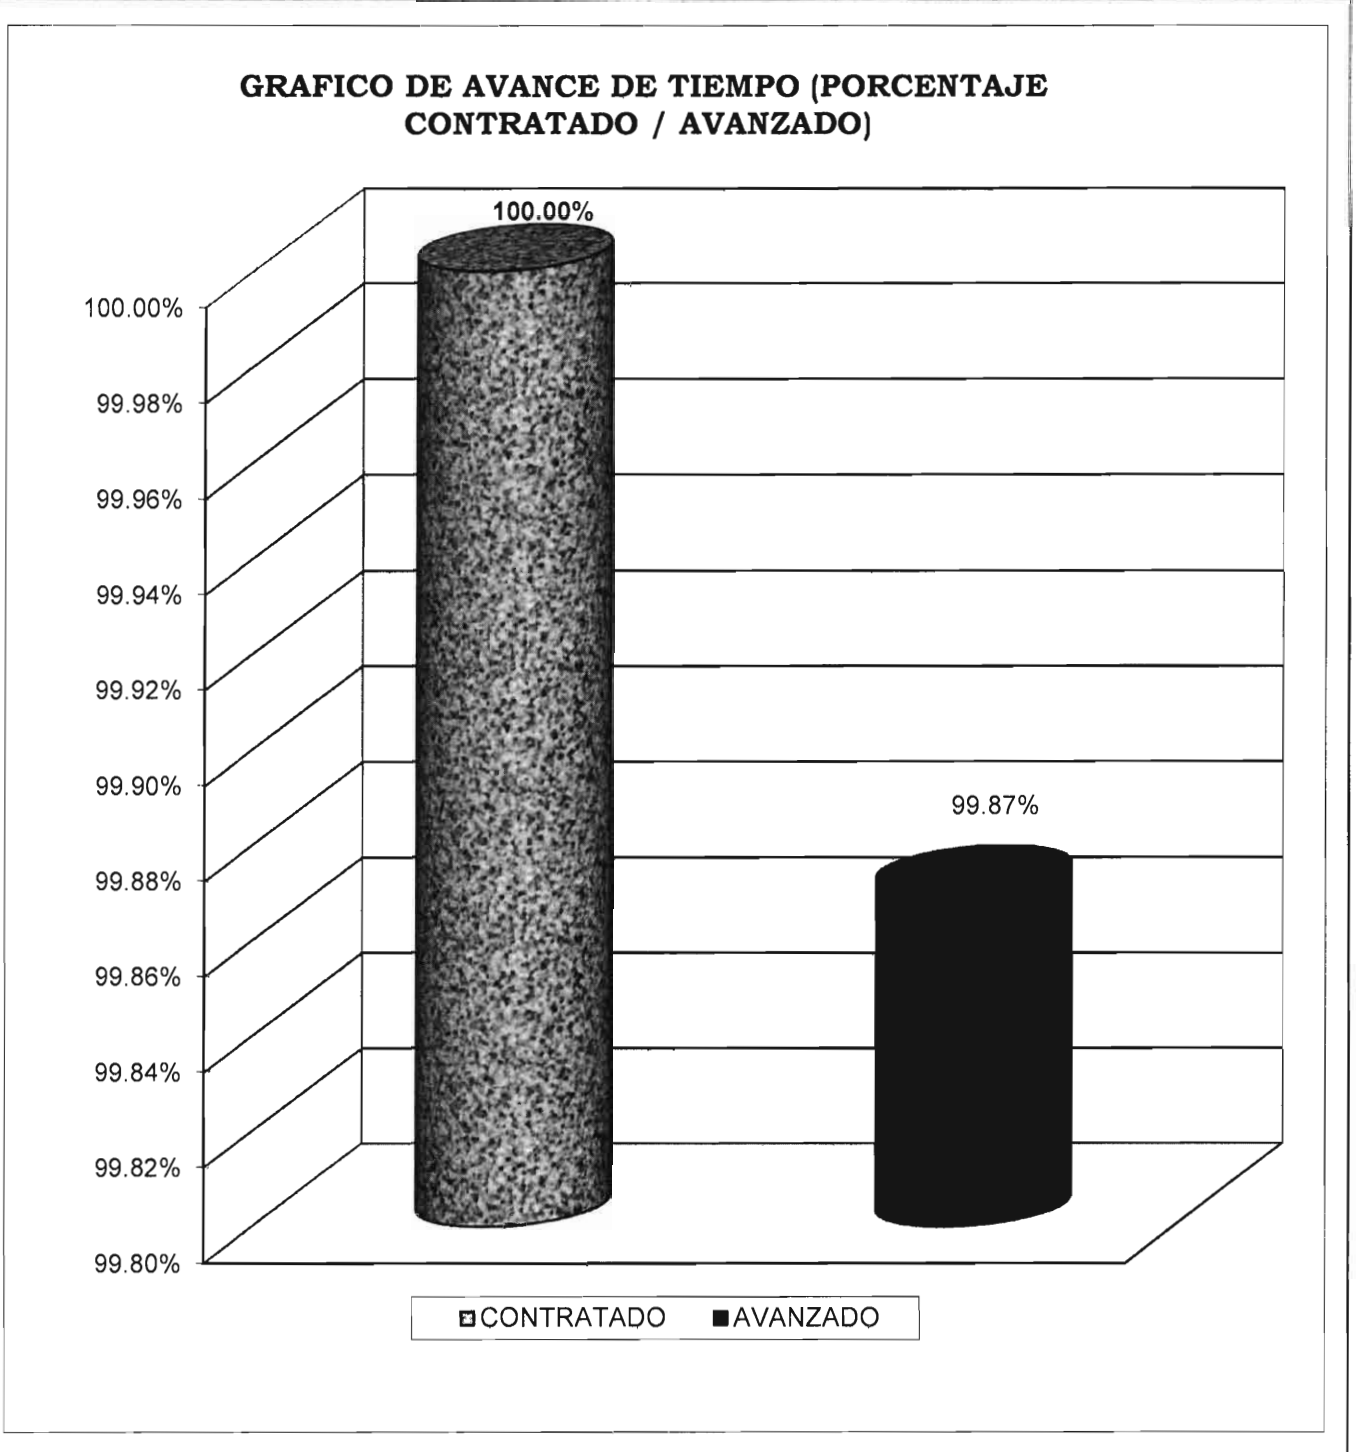

INFORME RECIBO FINAL & LIQUIDACION		ING. EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
CONTRATO DE OBRA No.:	595 DE 2024	
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	
SUPERVISOR	ING. LINO RODRIGUEZ OCHOA	

4. CONCLUSIONES

En la presente acta de recibo final se tiene un avance de ejecución físico de 99.87% y un ejecución presupuestal del 99.87% equivalente a **$36.299.436**, con un saldo a favor del municipio de **$47.303**; se realizó una suspensión en tiempo correspondiente a veinte días iniciando el 31 de diciembre de 2024, con una ampliación N.1 a la suspensión N.1 el día 20 de enero de 2025 correspondiente a veinte días , de igual manera se realizó una ampliación N. 2 a la suspensión N. 1 el día 7 de febrero de 2025 correspondiente a 30 días calendario; finalizando el 17 de marzo de 2025, mediante acta de terminación.

Se han realizado las obligaciones adquiridas en el contrato, las cuales fueron las siguientes: Desmonte de barandas y pasamanos en madera; Desmonte de cielo raso con retiro; Baranda en acero inoxidable 1 hilo D=1 1/2 +2 hilos D= 1/2 H prom 0.90 m Cal 18. Incluye soportes y anclajes a todo costo instalada; Rejilla removible en platina de 2x1/4" hueco de 3" para tapa o pasarela función de inspección y limpieza o drenaje (in. Marco y contramarco) e instalación; Escalera gato en angulo 2"x 1/8" suministro e instal; Suministro e instalación de lámina para cielo raso en superboard pintado 8mm con vinitex o similar calidad; Impermeabilización con mortero acrílico reforzado con fibras para tanques y piscinas E= 2 mm. No se ejecutó el item de Cerrojo seguridad doble cilindro para puerta de acceso. Suministro e instal, puesto que durante la ejecución del contrato surgió la necesidad de ampliar las cantidades de áreas impermeabilizadas del tanque aéreo de la edificación, por la identificación de más filtración de agua por grietas.



ING. EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

INFORME RECIBO FINAL & LIQUIDACION	ING. EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
CONTRATO DE OBRA No.:	595 DE 2024
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

5. ANEXOS

ANEXOS



INFORME RECIBO FINAL & LIQUIDACION

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	595 DE 2024
			12-Feb-25			

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE N PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 12 NO. 2 32/34, COMÚNMENTE DENOMINADO "PUEBLITO CRIOLLO" DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto. 1 Desmonte de cielo raso con retiro



Foto. 2 Desmonte de cielo raso con retiro



Foto. 3 Desmonte de barandas y pasamanos en madera



Foto. 4 Desmonte de barandas y pasamanos en madera



Foto. 5 Desmonte de barandas y pasamanos en madera



Foto. 6 Estado de la placa *superior tanques* aereos

INFORME RECIBO FINAL & LIQUIDACION

HOJA 2 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	595 DE 2024
			12-Feb-25			

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE N PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 12 NO. 2 32/34, COMÚNMENTE DENOMINADO "PUEBLITO CRIOLLO" DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA.

REGISTRO FOTOGRAFICO LAS VILLAS



Foto. 7 Zona de la rejilla



Foto. 8 Desmonte de barandas y pasamanos en madera



Foto. 9 Desmonte de barandas y pasamanos en madera



Foto. 10 Rejilla removible



Foto. 11 Rejilla removible



Foto. 12 Rejilla removible

INFORME RECIBO FINAL & LIQUIDACION


HOJA 2 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	595 DE 2024
			12-Feb-25			

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE N PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 12 NO. 2 32/34, COMÚNMENTE DENOMINADO "PUEBLITO CRIOLLO" DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA.

REGISTRO FOTOGRAFICO BARRIO VILLA ESTHER

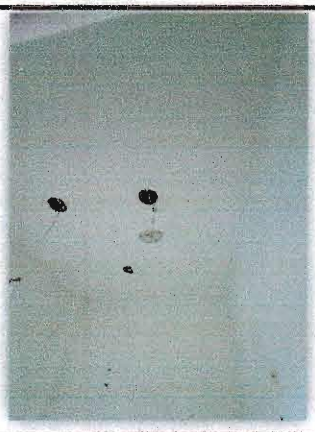

13. instalación de lámina para cielo raso en superboard pintado.




14. Impermeabilización tarque aereo



15. Baranda en acero inoxidable



16. Baranda en acero inoxidable

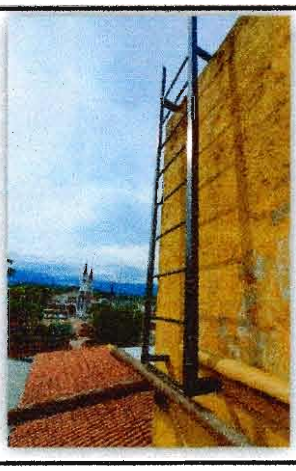

17. Escalera gato



18. Escalera gato y apoyos

INFORME RECIBO FINAL & LIQUIDACION


HOJA 2 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	595 DE 2024
		12-Feb-25				

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE N PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 12 NO. 2 32/34, COMÚNMENTE DENOMINADO "PUEBLITO CRIOLLO" DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA.

REGISTRO FOTOGRAFICO BARRIO VILLA ESTHER

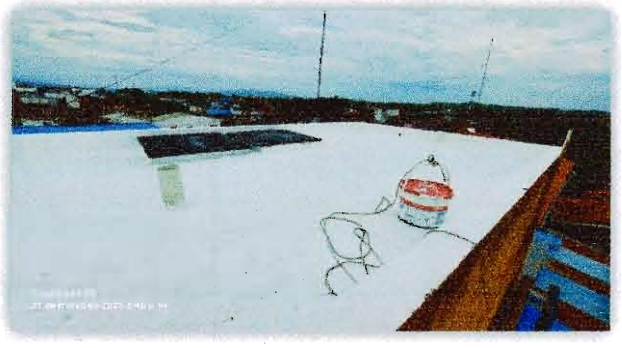

19. Impermeabilización tarque aereo




20. Impermeabilización tarque aereo



21. Impermeabilización tarque aereo



22. Impermeabilización tarque aereo

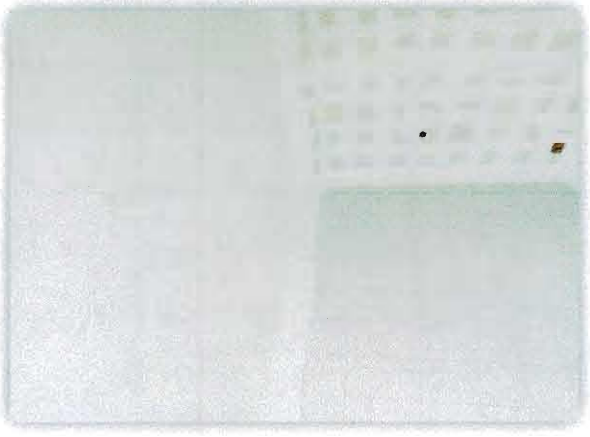

23. Impermeabilización tarque aereo




24. Impermeabilización

BALANCE GENERAL

MUNICIPIO DE TAURAMENA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA: 595 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2024	FECHA DE INICIO	VALOR DEL CONTRATO
SECCRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		27 DE DICIEMBRE DE 2024	$36,346,739.00
REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE N PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 12 NO. 2 32/34, COMÚNMENTE DENOMINADO "PUEBLITO CRIOLLO" DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA.	PLAZO	FECHA DE TERMINACION	VALOR DEL ANTICIPO
	DIEZ (10) DIAS	17 DE MARZO DE 2025	$18,173,369.00

ITEM	DESCRIPCION.	UND	CONDICIONES ORIGINALES			(+/-)	CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			CANT	VR UNIT.	VR TOTAL		CANT	VALOR PARCIAL
					$36,346,739.00			**$36,299,436.00**
1	Desmonte de barandas y pasamanos en madera	ml	50.00	$6,398.00	$319,900.00	1.10	48.90	$312,862.00
2	Desmonte de cielo raso con retiro	m2	11.00	$19,643.00	$216,073.00	0.00	11.00	$216,073.00
3	Baranda en acero inoxidable 1 hilo D=1 1/2 +2 hilos D= 1/2 H prom 0.90 m Cal 18. Incluye soportes y anclajes a todo costo instalada.	ml	50.00	$522,000.00	$26,100,000.00	1.10	48.90	$25,525,800.00
4	Rejilla removible en platina de 2x1/4" hueco de 3" para tapa o pasarela función de inspección y limpieza o drenaje (in. Marco y contramarco) e instalación.	m2	1.35	$920,222.00	$1,242,300.00	0.00	1.35	$1,242,300.00
5	Escalera gato en angulo 2"x 1/8" suministro e instal.	ml	3.10	$201,274.00	$623,949.00	0.00	3.10	$623,949.00
6	Cerrojo seguridad doble cilindro para puerta de acceso. Suministro e instal.	und	5.00	$136,411.00	$682,055.00	5.00	0.00	$0.00
7	Suministro e instalación de lámina para cielo raso en superboard pintado 8mm con vinitex o similar calidad.	m2	11.00	$135,258.00	$1,487,838.00	0.00	11.00	$1,487,838.00
8	Impermeabilización con mortero acrílico reforzado con fibras para tanques y piscinas E= 2 mm.	m2	45.50	$124,717.00	$5,674,624.00	9.75	55.25	$6,890,614.00
COSTO TOTAL AJUSTADO AL PESO					**$36,346,739.00**			**$36,299,436.00**

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO **$47,303.00**




EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
CONTRATISTA

	MUNICIPIO DE TAURAMENA	**Ing. EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ**
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	
	MEMORIAS DE CÁLCULO	

OBJETO:	**REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE N PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 12 NO. 2 32/34, COMÚNMENTE DENOMINADO "PUEBLITO CRIOLLO" DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA.**

CAPÍTULO:	1	**ITEM**	**1**	Desmonte de barandas y pasamanos en madera	**UNIDAD** ml

DIAGRAMA / RESGISTRO FOTOGRAFICO

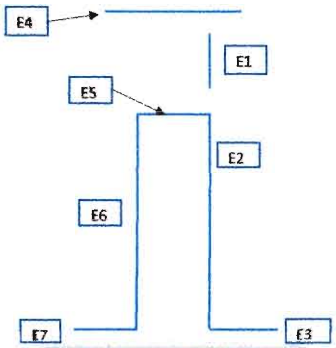



ÁREA DE CÁLCULO

No.	DESCRIPCIÓN	ANCHO (M)	LARGO (M)	AREA	ALTURA (M)	TOTAL
1	Desmonte elemento E1		3			3.00
2	Desmonte elemento E2		16			16.00
3	Desmonte elemento E3		1.5			1.50
4	Desmonte elemento E4		6			6.00
5	Desmonte elemento E5		4.9			4.90
6	Desmonte elemento E6		16			16.00
7	Desmonte elemento E7		1.5			1.50





SUBTOTAL	**48.90**
DESCUENTO	**0.00**
TOTAL	**48.90**

Observaciones:

Elaboró:

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
CONTRATISTA

	MUNICIPIO DE TAURAMENA	Ing. EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	
	MEMORIAS DE CÁLCULO	


OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE N PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 12 NO. 2 32/34, COMÚNMENTE DENOMINADO "PUEBLITO CRIOLLO" DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA.

CAPÍTULO:	2	ITEM	2	Desmonte de cielo raso con retiro	UNIDAD
					m2

DIAGRAMA / RESGISTRO FOTOGRAFICO

Area 1



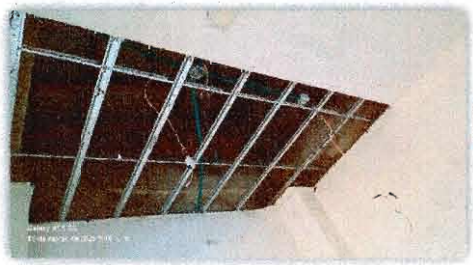

Area 2

ÁREA DE CÁLCULO


No.	DESCRIPCIÓN	ANCHO (M)	LARGO (M)	AREA	ALTURA (M)	TOTAL
1	Area 1	1.5	1.0			1.50
2	Area 2	3.8	2.5			9.50

	MUNICIPIO DE TAURAMENA	**Ing. EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ**
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	
	MEMORIAS DE CÁLCULO	

OBJETO:	**REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE N PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 12 NO. 2 32/34, COMÚNMENTE DENOMINADO "PUEBLITO CRIOLLO" DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA.**

CAPÍTULO:	3	**ITEM**	**3**	Baranda en acero inoxidable 1 hilo D=1 1/2 +2 hilos D= 1/2 H prom 0.90 m Cal 18. Incluye soportes y anclajes a todo costo instalada.	**UNIDAD** ml

DIAGRAMA / RESGISTRO FOTOGRAFICO

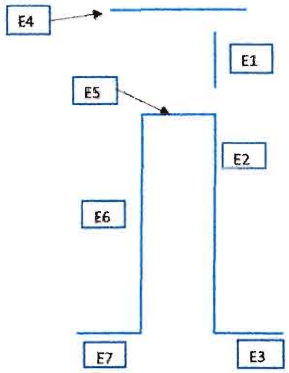



ÁREA DE CÁLCULO

No.	DESCRIPCIÓN	ANCHO (M)	LARGO (M)	AREA	ALTURA (M)	TOTAL
1	Desmonte elemento E1		3			3.00
2	Desmonte elemento E2		16			16.00
3	Desmonte elemento E3		1.5			1.50
4	Desmonte elemento E4		6			6.00
5	Desmonte elemento E5		4.9			4.90
6	Desmonte elemento E6		16			16.00
7	Desmonte elemento E7		1.5			1.50





SUBTOTAL	**48.90**
DESCUENTO	**0.00**
TOTAL	**48.90**

Observaciones:

Elaboró:

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
CONTRATISTA

	MUNICIPIO DE TAURAMENA	**Ing. EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ**
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	
	MEMORIAS DE CÁLCULO	

OBJETO:	**REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE N PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 12 NO. 2 32/34, COMÚNMENTE DENOMINADO "PUEBLITO CRIOLLO" DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA.**

CAPÍTULO:	4	**ITEM**	4	Rejilla removible en platina de 2x1/4" hueco de 3" para tapa o pasarela función de inspección y limpieza o drenaje (in. Marco y contramarco) e instalación.	**UNIDAD** m2

DIAGRAMA / RESGISTRO FOTOGRAFICO



ÁREA DE CÁLCULO

No.	DESCRIPCIÓN	ANCHO	LARGO			TOTAL
	Rejilla 1	0.42	1.07			0.45
	Rejilla 2	0.42	1.07			0.45
	Rejilla 3	0.42	1.07			0.45





SUBTOTAL	**1.35**
DESCUENTO	**0.00**
TOTAL	**1.35**

Observaciones:

Elaboró:

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
CONTRATISTA

	MUNICIPIO DE TAURAMENA	**Ing. EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ**
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	
	MEMORIAS DE CÁLCULO	

OBJETO:	**REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE N PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 12 NO. 2 32/34, COMÚNMENTE DENOMINADO "PUEBLITO CRIOLLO" DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA.**

CAPÍTULO:	5	**ITEM**	**5**	Escalera gato en angulo 2"x 1/8" suministro e instal.	**UNIDAD** ml


DIAGRAMA / RESGISTRO FOTOGRAFICO



ÁREA DE CÁLCULO

No.	DESCRIPCIÓN	LONGITUD			TOTAL
1	Escalera gato.	3.1			3.1



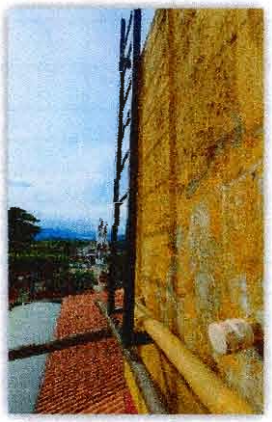

SUBTOTAL	**3.10**
DESCUENTO	**0.00**
TOTAL	**3.10**

Observaciones:

Elaboró:


EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
CONTRATISTA

	MUNICIPIO DE TAURAMENA	Ing. EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	
	MEMORIAS DE CÁLCULO	

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE N PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 12 NO. 2 32/34, COMÚNMENTE DENOMINADO "PUEBLITO CRIOLLO" DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA.

CAPÍTULO:	8	ITEM	8	Impermeabilización con mortero acrílico reforzado con fibras para tanques y piscinas E= 2 mm.	UNIDAD: m2

DIAGRAMA / RESGISTRO FOTOGRAFICO

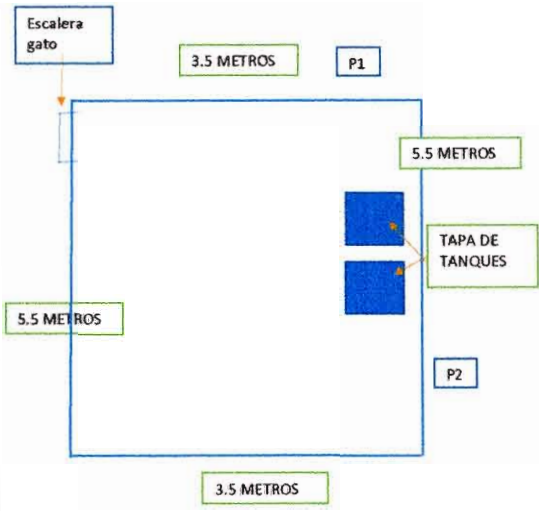

ÁREA DE CÁLCULO

No.	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL
	PLACA SUPERIOR DEL TANQUE	3.50	5.5	1.0	19.25
	PAREDES INTERNAS P1	2.00	3.5	2.0	14.00
	PAREDES INTERNAS P2	2.00	5.5	2.0	22.00





SUBTOTAL	55.25
DESCUENTO	0.00
TOTAL	55.25

Observaciones:

Elaboró:

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79799614
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAURAMENA	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	TRANSVERSAL 16 A NO 8B 82	TELÉFONO:	6247113
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	5167174224			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo	AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril	AÑO 2025	
DÍAS DE MORA:	45						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/16			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0968006004

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		APORTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP		MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 106.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 0	$ 106.400	$ 3.000		$ 109.400
SUBTOTALES:										$ 106.400	$ 3.000		$ 109.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		APORTES	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES		MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 41.600	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 41.600	$ 1.200	$ 0	$ 42.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 41.600	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 41.600	$ 1.200	$ 0	$ 42.800
SUBTOTALES:													$ 83.200	$ 2.400	$ 0	$ 85.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	APORTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 46.400	$ 1.300	$ 0	$ 47.700
SUBTOTALES:									$ 46.400	$ 1.300	$ 0	$ 47.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	APORTES	TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE			MORA	VALOR PAGADO
CCF89	CCF89-COMFACASANARE	2	$ 26.900	$ 500	$ 27.400
SUBTOTALES:			$ 26.900	$ 500	$ 27.400

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	APORTES	TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE			MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	2	$ 20.500	$ 100	$ 20.600
PASENA	PASENA - SENA	2	$ 13.400	$ 100	$ 13.500
SUBTOTALES:			$ 33.900	$ 200	$ 34.100

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE EXTERIOR	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INF	PENSIÓN						SALUD						ARP																					
																								ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 1115919022	ROMERO SALAMANCA KEVIN EDUARDO	CEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO	11	17														230301-PORVENIR	7	$ 332.150	$ 50.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 50.200	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 332.150	$ 41.600	$ 0	$ 41.600	14-11 - ARL SURA	7	$ 332.150	79799614	$ 23.200	7	$ 332.150	CCF89-COMFACASANARE	$ 13.300	$ 6.700	$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1118123677	RAMOS SALAMANCA ALEXANDER	CEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO	11	17														230301-PORVENIR	7	$ 332.150	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 53.200	EPS005-SANITAS S.A.	7	$ 332.150	$ 41.600	$ 0	$ 41.600	14-11 - ARL SURA	7	$ 332.150	79799614	$ 23.200	7	$ 332.150	CCF89-COMFACASANARE	$ 13.300	$ 6.700	$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 304.500

¿Qué vas a consultar hoy?

Aquí puedes explorar las planillas disponibles para pago, revisar tus comprobantes de pago y acceder a certificados por cotizante. Elige la opción que necesitas:

Los campos marcados con * son obligatorios para garantizar la información esencial.

Datos del aportante:

Tipo de documento *

Cédula de ciudadanía

No. de documento *

79799614



Planillas disponibles para pago



Soportes de pago



Certificados por cotizante

Esta opción te permite generar los soportes de pago de tus planillas, creadas a través de nuestros canales de asesoría ó el portal transaccional, pagadas en puntos presenciales ó a través de PSE.

No. de planilla *

5167174224

Administradora de riesgos *

14-11 - ARL SURA

☐ No Cotizo ARL

Buscar

Tus resultados:

No. Planilla	Tipo planilla	Valor pagado	Estado	Forma de presentación	Periodo liquidado	Enviar comprobante de pago	Soporte de pago
5167174224	**E**	**$304.500**	**PAGADA**	**ÚNICO**	**2025-03**		



Regresa al home

Powered By Lucasian Labs S.A.S

© Copyrights ACH Colombia ACH COLOMBIA S.A.

Líneas de Atención al cliente: Planilla electrónica Bogotá: 380 8880 - Medellín: 204 0180 - Resto del País: 01 8000 11 0764

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79799614
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAURAMENA	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	TRANSVERSAL 18 A NO 88 82	TELÉFONO:	6247113
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	5166887340	TIPO DE PLANILLA:	N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	44		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/02/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0e58158758
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	5168712885	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	2025/01/03

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	P30301-PORVENIR	2	$ 110.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.200	$ 0	$ 110.800	$ 3.200	$ 114.000
SUBTOTALES:										$ 110.800	$ 3.200	$ 114.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 43.300	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 43.300	$ 1.300	$ 0	$ 44.600
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 43.300	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 43.300	$ 1.300	$ 0	$ 44.600
SUBTOTALES:													$ 86.600	$ 2.600	$ 0	$ 89.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 49.200	$ 49.200	$ 1.400	$ 0	$ 49.600
SUBTOTALES:									$ 49.200	$ 1.400	$ 0	$ 49.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	2	$ 27.600	$ 800	$ 28.400
SUBTOTALES:			$ 27.600	$ 800	$ 28.400

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	2	$ 20.300	$ 600	$ 21.000
PASENA	PASENA - SENA	2	$ 13.800	$ 400	$ 14.200
SUBTOTALES:			$ 34.400	$ 1.000	$ 35.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES				
																								PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1118123677	RAMOS SALAMANCA ALEXANDER	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		NO	27						A									230301 - PORVENIR	4	$ 173.334	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 27.800	EPS005 - SANITAS S.A.	4	$ 173.334	$ 21.700	$ 0	$ 21.700	14-11 - ARL SURA	4	$ 173.334	79799614	$ 12.300	4	$ 173.334	CCF69 - COMFACASANARE	$ 7.000	$ 3.500	$ 5.300	$ 0	$ 0
2	CC 1118123677	RAMOS SALAMANCA ALEXANDER	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		NO	19						C									230301 - PORVENIR	12	$ 520.000	$ 83.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 83.200	EPS005 - SANITAS S.A.	12	$ 520.000	$ 65.000	$ 0	$ 65.000	14-11 - ARL SURA	12	$ 520.000	79799614	$ 36.900	12	$ 520.000	CCF69 - COMFACASANARE	$ 20.900	$ 10.400	$ 15.600	$ 0	$ 0
3	CC 1118123677	RAMOS SALAMANCA ALEXANDER	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		NO	19						A									230301 - PORVENIR	8	$ 346.666	$ 55.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 55.400	EPS005 - SANITAS S.A.	8	$ 346.666	$ 43.300	$ 0	$ 43.300	14-11 - ARL SURA	8	$ 346.666	79799614	$ 24.700	8	$ 346.666	CCF69 - COMFACASANARE	$ 13.900	$ 6.900	$ 10.300	$ 0	$ 0
4	CC 9503635	MORENO HERNANDEZ NOEL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		NO	27						A									230301 - PORVENIR	4	$ 173.334	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 27.800	EPSC25 - CAPRESOCA EPS	4	$ 173.334	$ 21.700	$ 0	$ 21.700	14-11 - ARL SURA	4	$ 173.334	79799614	$ 12.300	4	$ 173.334	CCF69 - COMFACASANARE	$ 7.000	$ 3.500	$ 5.300	$ 0	$ 0
5	CC 9503635	MORENO HERNANDEZ NOEL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		NO	19						C									230301 - PORVENIR	12	$ 520.000	$ 83.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 83.200	EPSC25 - CAPRESOCA EPS	12	$ 520.000	$ 65.000	$ 0	$ 65.000	14-11 - ARL SURA	12	$ 520.000	79799614	$ 36.900	12	$ 520.000	CCF69 - COMFACASANARE	$ 20.900	$ 10.400	$ 15.600	$ 0	$ 0
6	CC 9503635	MORENO HERNANDEZ NOEL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		NO	19						A									230301 - PORVENIR	8	$ 346.666	$ 55.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 55.400	EPSC25 - CAPRESOCA EPS	8	$ 346.666	$ 43.300	$ 0	$ 43.300	14-11 - ARL SURA	8	$ 346.666	79799614	$ 24.700	8	$ 346.666	CCF69 - COMFACASANARE	$ 13.900	$ 6.900	$ 10.300	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 316.600

¿Qué vas a consultar hoy?

Aquí puedes explorar las planillas disponibles para pago, revisar tus comprobantes de pago y acceder a certificados por cotizante. Elige la opción que necesitas:

Los campos marcados con * son obligatorios para garantizar la información esencial.

Datos del aportante:

Tipo de documento *

Cédula de ciudadanía

No. de documento *

79799614



Planillas disponibles para pago



Soportes de pago



Certificados por cotizante

Esta opción te permite generar los soportes de pago de tus planillas, creadas a través de nuestros canales de asesoría ó el portal transaccional, pagadas en puntos presenciales ó a través de PSE.

No. de planilla *

5166887340

Administradora de riesgos *

14-11 - ARL SURA

☐ No Cotizo ARL

Buscar

Tus resultados:

No. Planilla	Tipo planilla	Valor pagado	Estado	Forma de presentación	Periodo liquidado	Enviar comprobante de pago	Soporte de pago
5166887340	**N**	**$316.600**	**PAGADA**	**ÚNICO**	**2024-12**		



Regresa al home

Powered By Lucasian Labs S.A.S

© Copyrights ACH Colombia ACH COLOMBIA S.A.

Líneas de Atención al cliente: Planilla electrónica Bogotá: 380 8880 - Medellín: 204 0180 - Resto del País: 01 8000 11 0764

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79799614	0	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4921	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
85-410	TRANSVERSAL 16A MUMERO 8B 82		7632065			EDWWARDB@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2024-12	31892064	I	2024-12-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	721.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31892064	2025-01-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	T-Hor Ext.	T Vac Ts ccCot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 79799614	BARRETO GUTIERREZ EDWAR ALEXANDER	2.000.000																	0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	250.000	COMFACASANARE-CCF69	2.000.000	12.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	57	0	721.200	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79799614	0	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4921	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
85-410	TRANSVERSAL 16A MUMERO 8B 82		7632065			EDWWARDB@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2024-12	31892064	I	2024-12-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	721.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31892064	2025-01-07	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	320.000	0	0	0	320.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	320.000	0	0	0	320.000
EPS(Administradoras: 1)				1	250.000	0	0	0	250.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	250.000	0	0	0	250.000
ARP(Administradoras: 1)				1	139.200	0	0	0	139.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	139.200	0	0	0	139.200
CCF(Administradoras: 1)				1	12.000	0	0	0	12.000
COMFACASANARE	CCF69	844003392	8	1	12.000	0	0	0	12.000
Gran Total					721.200	0	0	0	721.200

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2024-12
Período Salud : 2024-12

Se certifica que en la fecha 2024-12-30 la empresa EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ con documento de identificación CC 79799614 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante BARRETO GUTIERREZ EDWAR ALEXANDER identificado con CC-79799614, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-79799614	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
31892064	I	2024-12-30	0,0696

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30
CCF	844003392	CCF69	Caja de Compensacion Familiar del Casanare COMFACASANARE	30
