FONDECÚN	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO**	CÓDIGO: EGAP-FR-08
		VERSIÓN: 01
	INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO SUPERVISION	VIGENCIA: 2/01/2023

FECHA	25/01/2025	**PERIODO No.**	1	DEL	**21/01/2025**	AL	**25/01/2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	*CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0025 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS CUNDINAMARCA – FONDECÚN Y BRACO COMPANY S.A.S. ZOMAC.*
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	*MOCOA PUTUMAYO BARRIO EL CENTRO*

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.:	2025 - 0025		
PLAZO INICIAL:			-
FECHA DE INICIACION:	21/01/2025		
**SUSPENSION:	N/A		
**PRÓRROGA	N/A		
FECHA DE TERMINACION:	21/03/2025		
PLAZO ACTUALIZADO:	60		
PLAZO TRANSCURRIDO:	4,00	EQUIVALE AL	7%
VALOR INICIAL :	$		551.748.942,00
VALOR ADICION(ES):			
VALOR ACTUALIZADO:	$		551.748.942,00
VALOR PAGADO:	*0*		
VALOR POR PAGAR:	$		551.748.942,00
INTERVENTOR:	*ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS*		

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	(Hito 1) SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)			no iniciado
	actividad Actas de vecindad	21/01/2025	25/01/2025	-4
	Entrega de dotación	21/01/2025	25/01/2025	-4
	Mediciones respecto a los planos	21/01/2025	25/01/2025	-4
	(Hito n) ENTREGA A SUPERVISION DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			no iniciado
Plazo del proyecto en días				

***** Agregue las filas necesarias según la cantidad de hitos; teniendo presente que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ -	0%	0,00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ -	0	

GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

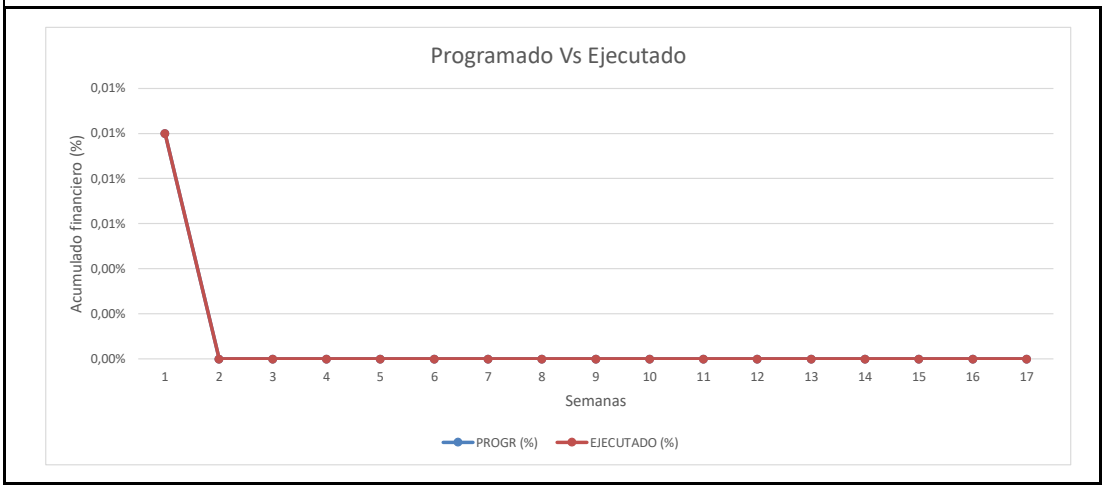

SEMANA No.	ACUMULADO FINANCIERO	
	PROGR (%)	EJEC. (%)
1	0,01%	0,010%
2	0,00%	0,000%
3	0,00%	0,000%
4	0,00%	0,000%
5	0,00%	0,000%
6	0,00%	0,000%
7	0,00%	0,000%
8	0,00%	0,000%
9	0,00%	0,000%
10	0,00%	0,000%
11	0,00%	0,000%
12	0,00%	0,000%
13	0,00%	0,000%
14	0,00%	0,000%
15	0,00%	0,000%
16	0,00%	0,000%
17	0,00%	0,000%
18		

3. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
SE REALIZA VALIDACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL PROYECTO Y DEL INMUEBLE A INTERVENIR

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS
SE INICIA VALIDACIÓN DE ACTA DE VECINDAD CON LA CGR Y PROPIETARIA

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
N/A		

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA N°1 PROFESIONAL SST BRACO COMPANY S.A.S ZOMAC



Actas de vecindad



Entrega de dotación



Mediciones respecto a los planos



Implementos del botiquín



entrega de guantes de seguridad

FIRMA DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE: *JHOAN CAMILO BRAVO ROJAS*

NOMBRE SUPERVISOR: ING EDGAR JHOAN LO PEZ RIVEROS
