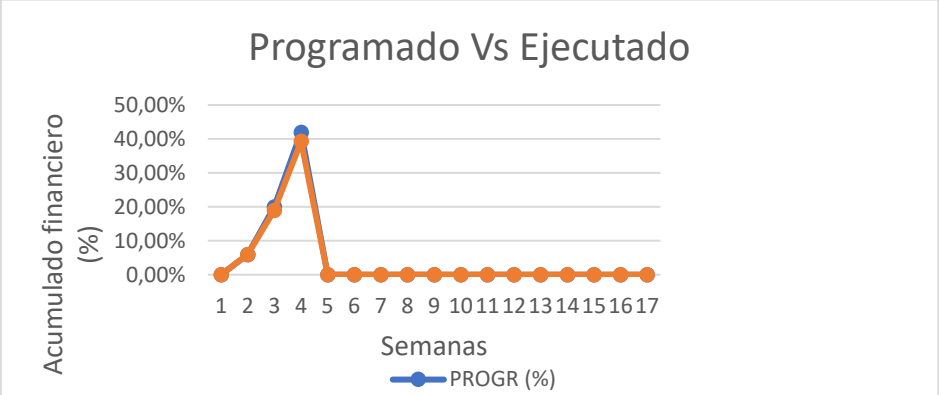
TIPO DE INFORME			
Informe Parcial	X	Periodo	10/02/2025 al 15/02/2025
Semana N°	4		
ASPECTO GENERALES DEL CONTRATO Y EJECUCIÓN			
Contrato No	0025	Año	2025
Nombre Completo del Contratista	BRACO COMPANY SAS ZOMAC		
CC/NIT	901.319.735-4		
Entidad contratante	FONDECÚN		
Nombre del Supervisor	EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS		
Objeto del Contrato	*REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.*		

INFORMACIÓN GENERAL				
CONTRATO No.	*2025 - 0025*			
TIPO DE CONTRATO	*CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES*			
CONTRATISTA	*BRACO COMPANY S.A.S. ZOMAC*			
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	**TIPO**	*NIT*	***No.***	*901.319.735-4*
OBJETO	*REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.*			
VALOR	*QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($551.749.000, oo)*			
PLAZO	*DOS (02) MESES*			
FECHA SUSCRIPCIÓN	*DEICISEIS (16) DE ENERO DE 2025*			
ASEGURADORA	*NACIONAL DE SEGUROS*			
PÓLIZA CUMPLIMIENTO	*400061197*	**Fecha de Aprobación**	*VEINTE (20) DE ENERO DE 2025*	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	*400061196*	**Fecha de Aprobación**	*VEINTE (20) DE ENERO DE 2025*	
REGISTRO PRESUPUESTAL	*20250030*	**Fecha de Expedición**	*DEICISEIS (16) DE ENERO DE 2025*	
FECHA DE INICIO	*VEINTE* Y UNO *(21) DE ENERO DE 2025*			
FECHA DE TERMINACIÓN	*VEINTE* Y UNO *(21) DE MARZO DE 2025*			

SUPERVISOR CONTRATO	*ING EDGAR JHOAN LÓPEZ RIVEROS* *ING PABLO ABEL GIL SOTO* *ING MAIRON SMITH GUEVARA REYES*

INFORME TECNICO DEL CONTRATO

Actividades realizadas	Se dan por finalizadas las siguientes actividades: • SE TIENE UN AVANCE DEL 39.30%  • Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. 42% • Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por supervisión.39% Se ha generado un atraso de 2.66% Se presento atraso por que se tiene que validar los trazados de cableado respeto a los puntos finales y la cantidad de instalación para las nuevas ubicaciones de los aires acondicionados. la diferencia se superará en la siguiente semana mejorando la celeridad en los procesos constructivos.

- 13.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA TRIFASICA 3X4 + 4N + 8T DESDE TGA HASTA TABLEROS DE DISTRIBUCION A.A



- Se hace conexión de acometida eléctrica a tablero de distribución según el diseño unifilar eléctrico, en el segundo piso.

- 13.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA TRIFASICA 3X4 + 4N + 8T DESDE TGA HASTA TABLEROS DE DISTRIBUCION NORMAL Y REGULADA



- Se instala en cuarto técnico, la acometida eléctrica hasta el tablero de distribución normal y regulada.

- 14.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE F/UTP 24 AWG (CMR) LSHF CAT 6ª
- Se revisa cable para instalación de datos en rejilla de distribución



- 14.2 SUMINISTRO DE PATCHCORD PARA PUESTO DE TRABAJO 1.5 METROS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAT 6A Y MARQUILLADO



- Se revisa suministro en obra para instalación de patchcord de puestos de trabajo.

	• 14.3 SUMINISTRO DE PATCHCORD 1.5 METROS PARA CONEXIONES ENTRE SWITCH Y PATCHPANEL CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK RJ45 CAT 6A BLINDADO Y MARQUILLADO • Llega suministro a obra patchcord para conexiones entre switch y  patchpanel.

Fecha de informe: 15 de febrero de 2025

JHOAN CAMILO BRAVO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
BRACO COMPANY S.A.S ZOMAC
