FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL- AEROCIVIL**			**FECHA:**	29/03/2025
Semana No	**43**	**Del :**	23/03/2025	AL:	29/03/2025
Plazo Total		558	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		297	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		53,23%			
Nombre del Supervisor :		Gisell Sánchez Pastrana			

OBJETO DEL CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO TOLÚ.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**1,61%**	**68,17%**	**(%) Ejecutado**	**0,37%**	**76,44%**
Valor programado ($)	**$ 32.072.978,08**	**$ 1.361.064.557,08**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 7.377.770,49**	**$ 1.526.050.376,77**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**8,26%**
				Valor Adelanto	**$ 164.985.819,69**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	ABILE SAS	**Contratista:**	CONSORCIO SERVINC-BETMAF 2024
Contrato No:	23001186 H4 DE 2023	**Contrato No:**	23001301 H3 DE 2023
Valor Inicial:	$ 1.996.500.065	**Valor Inicial:**	$ 1.117.574.559
Valor Actualizado al modificatorio :	NA	**Valor Actualizado al modificatorio :**	NA
Valor actualizado 2:	NA	**Valor actualizado 2:**	NA
Plazo inicial:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE 2025	**Plazo inicial:**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Plazo actualizado:	NA	**Plazo actualizado:**	NA
Fecha de iniciación:	5-jun-24	**Fecha de iniciación:**	5-jun-24
Fecha de vencimiento:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE 2025	**Fecha de vencimiento:**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Modificatorio No. Prórroga No.	NA	**Modificatorio No. Prórroga No.**	NA
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	NA	**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	NA
Suspensión No.	NA	**Suspensión No.**	NA
Periodo de Suspensión No.	NA	**Periodo de Suspensión No.**	NA
Levantamiento de la suspensión No.	NA	**Levantamiento de la suspensión No.**	NA
Nueva fecha de terminación	NA	**Nueva fecha de terminación**	NA
Valor total actual del contrato	$ 1.996.500.065	**Valor total actual del contrato**	$ 1.117.574.559

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS


Se realiza recorrido con personal de Contraloría General de la República, Contratista y Supervisión del Contrato. Se tramita informe semanal No. 42. Se tramita subsanación de Acta No. 1 de mayores y menores cantidades. Se realiza mesa de trabajo con Contratista para revisión de balance para BMA.

OBRAS LADO TIERRA

SE REPORTA LAS SIGUIENTES ACTIVADES DURANTE LA SEMANA :
-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIRDRIO TEMPLADO
-LIMPIEZA CUBIERTA
-SERVICIOS DE JARDINERIA
-SE REPORTA POR LA BMA 20,09 M2 DE POLARIZADO PARA VIDRIOS.




Polarizado vidrios



Polarizado vidrios


Cambio vidrio


Cambio vidrio


Cambio vidrio


Rocería

AVANCE DE OBRA: Se presenta un avance acumulado de 76,44% en la ejecución de las actividades.

-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIRDRIO TEMPLADO (8,32 M²)
-LIMPIEZA CUBIERTA (7,83 M²)
-SERVICIOS DE JARDINERIA (0,6 HA)
-SE REPORTA POR LA BMA 20,09 M2 DE POLARIZADO PARA VIDRIOS.

Se informan avances de obra ejecutados pendientes por reportar:
FINANCIERO:
Se realizó desembolso del anticipo.
Se aprueba el acta parcial de obra No. 01, por un valor de $ 23.200.454 y acta No. 02 por un valor de $ 47.602.415; acta No. 03 por un valor de $ 75.183.934; acta No. 04 por un valor de $ 42.348.675; acta No. 05 por un valor de $64.720.146; acta No. 06 por un valor de $ 264.538.180 y acta No. 07 por un valor de $ 610.682.692, para un acumulado total de 56,51% del proyecto.

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA


Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3

AMBIENTAL:
Actividades desarrolladas:
Se desarrolla la adecuada disposición de residuos.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
Se realiza seguimiento al cumplimiento de requisitos legales y según actividades
Uso de EPP en actividades realizadas
Se realizan charlas diarias de 5 minutos en temas de seguridad, salud en el trabajo
Se validan el registro documental (ATS, inspecciones de equipos, charlas diarias)
En la semana reportada no se presentaron accidentes laborales

PERSONAL OBRA E INTERVENTORÍA

Personal de Interventoría	4
Personal del Contratista	7
Total Personal en Obra	11

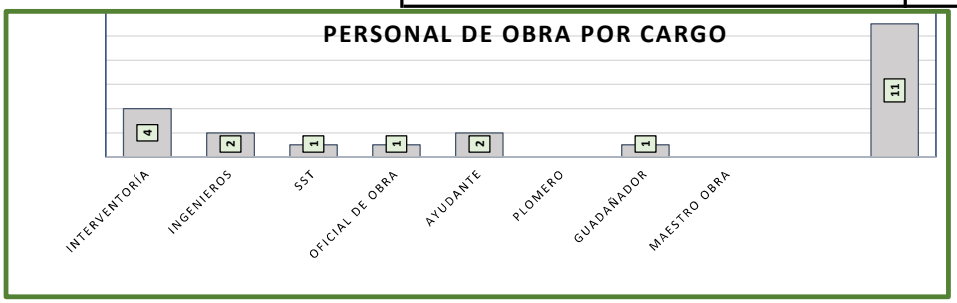

En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

RELACIÓN MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
GUADAÑADORA		1	
ESCALERA		2	
ANDAMIOS		0	
HIDRO LAVADORA		1	
PULIDORA		2	
Total Maquinaria		6	

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	05/06/2024 - 04/07/2024	$ 23.200.454,00
2	05/07/2024 - 04/08/2024	$ 47.602.415,00
3	05/08/2024 - 04/09/2025	$ 75.183.934,00
4	05/09/2024 - 04/10/2025	$ 42.348.675,00
5	05/10/2024 - 04/11/2025	$ 64.720.146,00
6	05/11/2024 - 04/12/2025	$ 264.538.180,00
7	05/12/2024 - 31/12/2025	$ 610.682.692,00
Total Acumulado	**$ 1.128.276.496,00**	

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 1.996.500.065,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 1.128.276.496,00
% Avance facturado Acumulado
56,51%

	FORMATO			
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página: 1 de 3**

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	05/06/2024 - 04/07/2024	$ 42.800.730,00
2	05/07/2024 - 04/08/2024	$ 37.046.902,00
3	05/08/2024 - 04/09/2025	$ 41.812.759,00
4	05/09/2024 - 04/10/2025	$ 45.105.296,00
5	05/10/2024 - 04/11/2025	$ 50.666.541,00
6	05/11/2024 - 04/12/2025	$ 72.106.411,00
7	05/12/2024 - 31/12/2025	$ 114.934.236,00
Total Acumulado	**$ 404.472.875,00**	

Valor Total Contrato interventoría	
$ 1.117.574.559,00	
Valor facturado Contrato Interventoría	
$ 404.472.875,00	
% Avance facturado Acumulado	
36,19%	

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ISMAEL MAFIOLY RODRIGUEZ
