INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No 1

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL PROYECTO DE REGULACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CIÉNAGAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 293 DEL 2017”.

PERIODO DE EJECUCION

DEL 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 5 DE MARZO DE 2025

CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE SAS
NIT: 901. 427. 201 - 6

CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA 0496 DE 2024

Contenido

1. INTRODUCCION 3
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 5
2.1. Localización 5
2.2. Actividades a Ejecutar 8
2.2.1. Localización, trazado y replanteo (incluye: topógrafo, cadeneros y equipos de medición) 9
2.2.2. Limpieza para recuperación ambiental 9
2.2.3. Retiro y disposición final de residuos 10
2.2.4. Especificaciones Técnicas Componente Socioambiental 10
3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 13
3.1. Información General 13
3.2. Presupuesto del Proyecto 14
3.3. Cronograma del Proyecto 15
3.4. Personal del Contratista 18
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA 19
4.1. Actividades Técnicas 19
5. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 28
5.1. Información General 28
5.2. Presupuesto de la Interventoría 28
5.3. Personal de la Interventoría 29
6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA 30
6.1. Actividades Técnicas 30
6.2. Seguimiento a la Ejecución 37
6.3. COMPONENTE SST 40
6.4. COMPONENTE SOCIAL 41
6.5. COMPONENTE AMBIENTAL 42
6.5.1. Monitoreo de Calidad del Agua 45
6.5.2. Monitoreo Biológico Pesquero 46
6.5.3. Manejo de emisiones atmosféricas y niveles de ruido 46
6.5.4. Manejo Ambiental para el monitoreo de los niveles del hidrosistema 46
6.5.5. Manejo de Residuos 47
6.5.6. Salvamento de Fauna Silvestre 47
6.5.7. Educación Ambiental 48
6.6. Pagos Realizados al Contratita 48
7. CONCLUSIONES 48
8. ANEXOS 50

Índice de Tablas

Tabla 1 Especificaciones Componente SocioAmbiental 12
Tabla 2 Información del Contratista de obra 13
Tabla 3 Presupuesto del Proyecto 15
Tabla 4 Tabla de Hitos según programación..... 18
Tabla 5 Personal del Contratista 19
Tabla 6 Información de Interventoría..... 28
Tabla 7 Presupuesto de la Interventoría 29
Tabla 8 Personal de la Interventoria..... 30
Tabla 9 Consolidado de avance de Obra 39
Tabla 10 Relación de reuniones de socialización..... 42
Tabla 11 Relación de Documentos formulados..... 42
Tabla 12 Tabla de Pagos al Contratista 48

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1 Ubicación de Sabanagrande en Colombia..... 5
Ilustración 2 Localización de Caño Puerto Sabangrande..... 6
Ilustración 3 Localización Caño Convento 6
Ilustración 4 Localización Caño Grande..... 6
Ilustración 5 Ubicación de Santo Tomas en Colombia 7
Ilustración 6 Localización de Caño Luisa 7
Ilustración 7 Ubicación de Palmar de Varela en Colombia..... 8
Ilustración 8 Localización de Caño Tigre..... 8
Ilustración 9 Sección Típica de Diseño 9
Ilustración 10 Gantt de Seguimiento 16
Ilustración 11Curva de Avance..... 40
Ilustración 12 Relación de Charlas de seguridad reportado dentro del informe contratista..... 41
Ilustración 13 Estado de PQRS Gestionadas..... 42

1. INTRODUCCION

La Corporación Autónoma Regional del Atlántico –CRA- en ejercicio de las funciones que le asignan la ley 99 de 1993 en su ánimo de conservar, recuperar y proteger los recursos naturales y el ambiente, en el Departamento del Atlántico, ejecuta políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplimiento y aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Debido a que, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó licencia ambiental al Departamento del Atlántico (Gobernación del Atlántico) y a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), para la ejecución, desarrollo y operación del proyecto de "Recuperación y Manejo Integral del Sistema de Ciénagas de los Municipios de Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela", en el Departamento del Atlántico y en cumplimiento de su Plan de Acción 2024- 2027 "Por un Ambiente Sin Fronteras", la Corporación Autónoma Regional del Atlántico se hizo necesario dar inicio al proceso de selección por licitación pública LP-2024-0007 para contratar el siguiente objeto: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL PROYECTO DE REGULACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CIÉNAGAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 293 DEL 2017, Una vez agotado el proceso citado, se adjudica y se contrata al CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL. identificado con N.I.T. 901.896.859-2 para que realice la ejecución de las obras proyectadas.

Para el seguimiento técnico, administrativo, ambiental, SISO, jurídico, financiero, presupuestal del objeto del contrato de obra, en lo referente a la gestión de control y supervisión; La CRA de conformidad al régimen jurídico de la contratación estatal, convoca al concurso de méritos No. CM-2024-0009. A lo que una vez agotado el proceso se adjudicó y contrato al CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S, identificada con NIT: 901.427.201-6. para que en lo pertinente realice las labores de seguimiento y control.

Este documento aborda esta obligación en lo pertinente a la generación del informe mensual técnico dando a conocer los aspectos más relevantes del presente proyecto en cuanto a las características contractuales, administrativas y financieras durante el periodo en estudio; adicionalmente, se presentan los soportes que integran este informe en cuanto a los formatos que esta INTERVENTORIA, lleva en el desarrollo de su labor diaria y que sirven para complementar los análisis que se toman para comparar los avances y rendimientos dentro del proyecto

Como resumen durante el Primer Periodo de Ejecución comprendido entre el 06 de febrero al 05 de marzo del 2025, las principales actividades ejecutadas son la

gestión administrativa de plan social con el levantamiento de las actas de vecindad, localización y replanteo en los frentes de obra, con el sobrevuelo con drone y la movilización de maquinaria y preparación de terrenos para el inicio de las actividades de limpieza de los canales. Al igual y consecuentemente con las actividades anteriores se dieron inicio a las actividades de limpieza ambiental en el caño Tigre en la jurisdicción del municipio de Palmar de Varela A cierre del presente periodo se puede contabilizar un avance de obra de 8,15 %.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. Localización

El proyecto se encuentra localizado en la región caribe en el departamento del Atlántico en la jurisdicción de los municipios de Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela.

En primer lugar, Sabanagrande Está ubicada a 19 km de la capital del departamento del Atlántico, Barranquilla, en la zona oriental. Es un municipio ribereño del río Magdalena. Su territorio es plano y caliente, con temperaturas de 36 grados en promedio. La zona próxima del río Magdalena es cenagosa y alimenta varias lagunas, entre ellas el Convento, Guartinaja y Sabanagrande.



Ilustración 1 Ubicación de Sabanagrande en Colombia

En la jurisdicción de este municipio están ubicadas tres de los caños a intervenir, los cuales son CAÑO PUERTO SABANAGRANDE con una longitud de 1239 M, CAÑO CONVENTO y CAÑO GRANDE (limites con el municipio de Malambo), a continuación, se muestra sus ubicaciones.

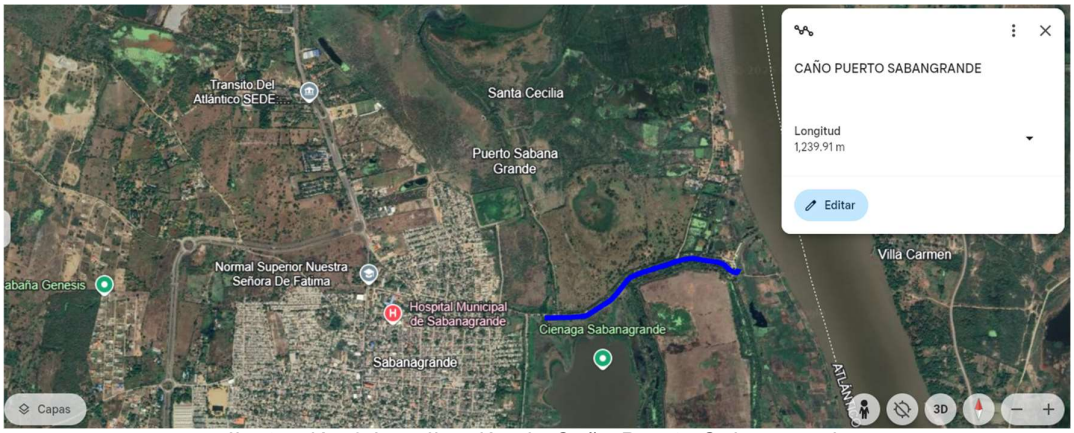


Ilustración 2 Localización de Caño Puerto Sabangrande

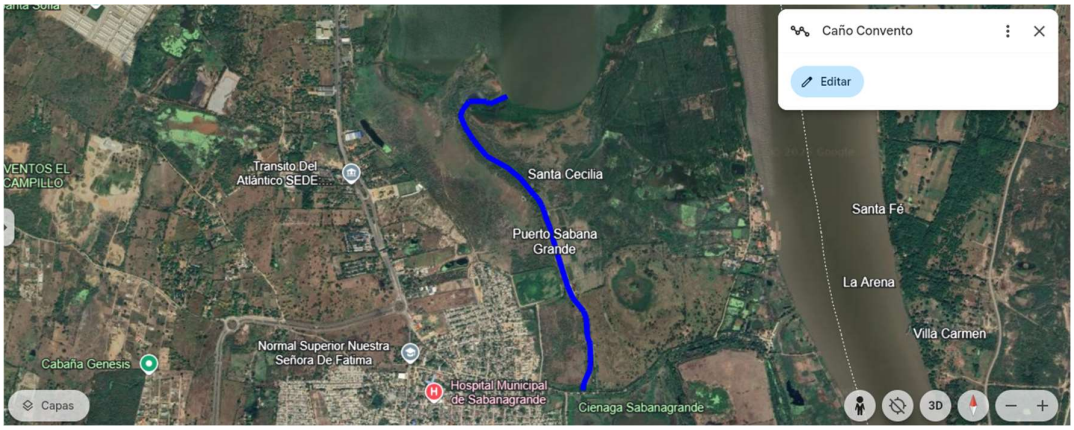


Ilustración 3 Localización Caño Convento



Ilustración 4 Localización Caño Grande

Seguido se encuentra el Municipio de Santo Tomas ubicado en el oriente del departamento del Atlántico, en la ribera occidental del río Magdalena. Tiene una extensión de 67 km² y queda a una distancia de 25 km de Barranquilla, en un

terreno levemente ondulado hacia el occidente con fuerte presencia de zonas lacustres y una importante ribera sobre el principal río Magdalena



Ilustración 5 Ubicación de Santo Tomas en Colombia

En la jurisdicción de este municipio están ubicado el CAÑO LUISA con una longitud de 1.499 M, a continuación, se muestra su ubicación:

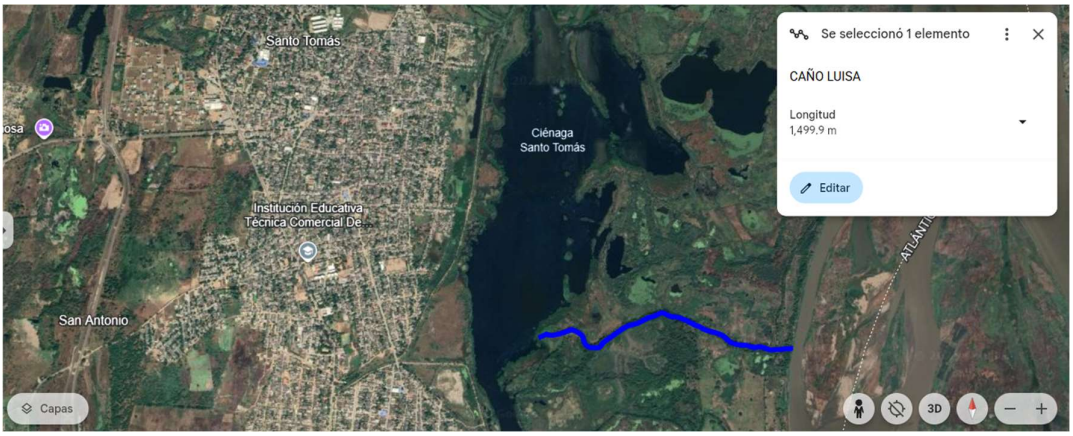


Ilustración 6 Localización de Caño Luisa

Por ultimo se encuentra el municipio de Palmar de Varela ubicado en el departamento del Atlántico, sobre la margen occidental de río Magdalena. Este municipio se encuentra completamente conurbado con Santo Tomás. El municipio se ubica sobre el delta del río Magdalena, en el oriente del departamento. Esto permite las actividades pesqueras y agrícolas.



Ilustración 7 Ubicación de Palmar de Varela en Colombia

En la jurisdicción de este municipio están ubicado el CAÑO TIGRE con una longitud de 900 M, a continuación, se muestra su ubicación



Ilustración 8 Localización de Caño Tigre

2.2. Actividades a Ejecutar

A continuación, se detallan la secuencia de actividades que el contratista se compromete a ejecutar siguiendo los buenos prácticas de ingeniería y de una manera lógica y ordenada.

2.2.1. Localización, trazado y replanteo (incluye: topógrafo, cadeneros y equipos de medición)

Este ítem, consiste en localizar de manera exacta la ubicación de cada uno de los puntos del proyecto tanto en agua como en tierra, con el fin de que las obras queden en las coordenadas diseñadas y con las cotas establecidas en los planos. Para la localización, es importante que la topografía, se rija por las referencias de planimetría y altimetría suministradas en el proyecto, a través de puntos fijos y BM existentes en donde se realizó el levantamiento inicial. El trazado se deberá ejecutar siguiendo estrictamente los planos, en donde se encuentra todo lo relacionado a ejes, centros y paramentos de las obras. También se deberá tener en cuenta dentro de este ítem la demarcación de los puntos.

Se deberá contar como mínimo personal requerido un topógrafo con licencia vigente y dos cadeneros o ayudantes de topografía. Como mínimo equipo requerido una estación total y GNSS RTK.

Medida y forma de pago: La unidad de medida será metros cuadrados (m 2) de localización, trazado y replanteo de comisión topográfica, cumpliendo con lo establecido en el presente documento.

2.2.2. Limpieza para recuperación ambiental

La limpieza consiste en el conjunto de las actividades de excavar y recuperar los caños y/o estructuras hidráulicas en el complejo de humedales del rio Magdalena (ciénagas de Sabanagrande, Palmar de Varela, Santo Tomás, El Convento y Malambo). Las secciones de excavación deben realizarse según lo indicado en las secciones transversales tipo que se presentan a continuación:

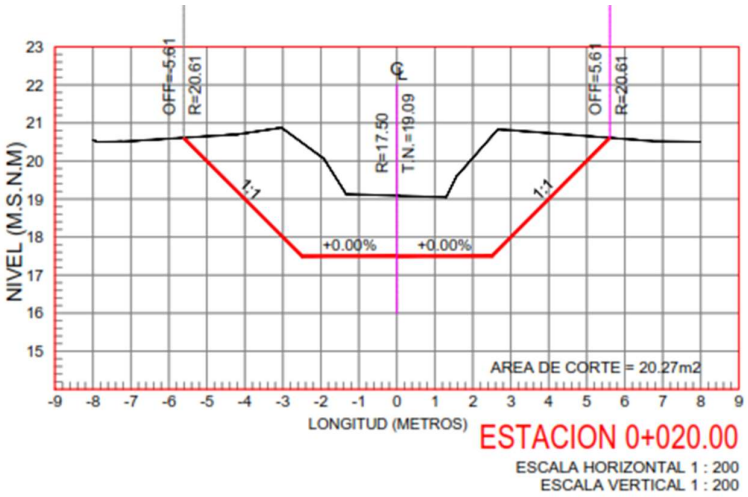


Ilustración 9 Sección Típica de Diseño

El trabajo comprende el conjunto de actividades de excavación y nivelación. Se deben garantizar los niveles y secciones de fondos de los caños y anchos propuestos.

Medida y forma de pago: La unidad de medida será el metro cúbico (m3), justificado en las carteras topográficas, de cálculo manual o digital con software. El trabajo de excavación se pagará al precio unitario del contrato por toda obra ejecutada de acuerdo con el proyecto.

2.2.3. Retiro y disposición final de residuos

Esta actividad corresponde a la disposición final del material retirado por limpieza para recuperación ambiental de los caños y/o estructuras hidráulicas. Dicha disposición se deberá llevar a cabo en un sitio autorizado.

De igual forma, dentro del desarrollo del contrato, para optimizar las actividades de limpieza, retiro y disposición, y cumplir cabalmente con el objeto del contrato, el Contratista de Obra podrá analizar otras alternativas de disposición del material. Para este fin, a su cuenta y riego, deberá realizar los estudios técnicos y ambientales y trámites pertinentes a través de la Autoridad Ambiental, para lograr las modificaciones y/o ajustes de los permisos y/o Planes de Manejo correspondientes, cumpliendo con toda la normatividad vigente.

Medida y forma de pago: La unidad de medida será el metro cúbico por Kilometro (m3-Km), incluye todo lo necesario para el retiro y disposición final de los residuos producto de la limpieza para recuperación ambiental de los caños y/o estructuras hidráulicas sujetos de intervención en el proyecto.

2.2.4. Especificaciones Técnicas Componente Socioambiental

De conformidad con lo establecido en la licencia ambiental otorgada por la ANLA mediante Resolución No. 293 del 2017 a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) y al Departamento del Atlántico (Gobernación del Atlántico el contratista deberán dar estricto cumplimiento de las obligaciones asociadas con el componente socioambiental y los procedimientos apegados a la normatividad ambiental vigente para la implementación del Plan de Manejo Ambiental antes, durante y posterior a la intervención a ser realizada en el proyecto en referencia.

A continuación, se describen las actividades de este componente:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	CARACTERISTICAS
Campaña radial	Und	1	En un medio de amplia difusión a nivel regional o local
Reuniones informativas con la Comunidad	Und	4	Alquiler de Salón Social para desarrollar reunión informativa con la comunidad para 150 personas durante sesión de 4 horas (Incluye amplificación, video beam, telón, sillas, cartilla, insumos, personal de apoyo y refrigerios para 150 personas).
Inducción ambiental a Comunidades	Und	4	Alquiler de Salón Social para desarrollar reunión de inducción ambiental a la comunidad para 40 personas en una sesión de 4 horas Temática de Gestión del Riesgo (Incluye amplificación, video beam, telón, sillas, cartilla, insumos, personal de apoyo, refrigerios y alimentación para 40 personas).
Inducción ambiental a Trabajadores	Und	1	Alquiler de Salón Social para desarrollar reunión de inducción ambiental con trabajadores del contratista de obra e interventoría para 40 personas en una sesión de 4 horas Temática de Gestión del Riesgo (Incluye amplificación, video beam, telón, sillas, cartilla, insumos, personal de apoyo, refrigerios y alimentación para 40 personas).
Socialización del proyecto con organismos y autoridades	Und	2	Alquiler de Salón Social para desarrollar reunión de socialización del proyecto con organismos y autoridades para 40 personas en una sesión de 4 horas (Incluye amplificación, video beam, telón, sillas, cartilla, insumos, personal de apoyo, refrigerios y alimentación para 40 personas).
Monitoreo de partículas de gases PM10 (antes y durante la ejecución del proyecto en dos puntos)	Und	4	Muestreador de Partículas HI-VOL para PM10. 2 puntos por monitoreo.
Monitoreo de emisiones de ruido (antes y durante la ejecución del proyecto)	Und	4	Sonómetro Digital Tipo I

Punto ecológico para almacenar residuos solidos	Und	2	Punto ecológico de 55 Gal
Alquiler de una (1) cabina sanitaria por cada frente de obra habilitado	Und	2	Alquiler de baño portátil. Incluye limpieza y disposición final. Se debe certificar la disposición final.
Monitoreo de Parámetros físicos, químicos y biológicos (antes y durante la ejecución del proyecto)	Und	12	Muestreo y análisis de Calidad del Agua (Parámetros a medir en Muestra Compuestas: 1. Temperatura, 2. Conductividad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Sólidos Suspendidos Totales, 6. Demanda Biológica de Oxigeno (DBO5), 7. Demanda Química de Oxigeno (DQO), 8. Coliforme termotolerantes y 9. Coliformes totales.
Instalación de miras Hidrológicas	Und	5	Miras Hidrológicas (reglas). Se aclara que no son miras topográficas.
Monitoreo Biológico-Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	MES	7	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores
Trampas tipo Tomahawk y Sherman. Varas con lazos, ganchos herpetológicos y bolsas plásticas y de tela.	GLB	1	Se relacionan las unidades por tipo: -Trampas tipo Tomahawk (2) -Trampa tipo Sherman (2) -Varas con lazos (6) -Ganchos herpetológico (5) -Bolsas plásticas (200) -Bolsas de tela (200)
Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	MES	7	Se relacionan los profesionales: -Profesional Experto Ambiental -Profesional Social -Profesional Biólogo -Auxiliar para el Manejo de Fauna y-Flora

Tabla 1 Especificaciones Componente SocioAmbiental

3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General

La siguiente tabla contempla los datos principales del contratista de obra:

Contratista	**CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL**
Participantes	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA D&D S.A.S – 85,00% TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. - (15,00%)
Representante Legal	JOSE MARIA VECINO VILLAREAL, identificado con Cedula de Ciudadanía 73.162.008 expedida en Barranquilla
Contrato No.	. 0493 de 2024
Objeto	REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL PROYECTO DE REGULACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CIÉNAGAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 293 DEL 2017
Valor Inicial	$ 5.049.740.412,34
Adiciones	$ 0.00
Valor Total	$ 5.049.740.412,34
Plazo Inicial de Ejecución	7 Meses
Fecha de Inicio	06 de Febrero de 2025
Fecha de Terminación Programada	03 de Septiembre de 2025
COMPONENTE ADMINITRATIVO	
Pagos Parciales	Mediante actas de recibo parcial por avance, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría Externa, de conformidad con el sistema de PRECIOSUNITARIOS.
Origen de los Recursos	Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA)
COMPONENTE JURIDICO	
El Contratista Toma la Póliza con la compañía de seguros La Previsora SA, un seguro de cumplimiento para entidades estatales No. 3006890; y seguros de responsabilidad civil con la misma entidad, La Previsora SA, con numero de Póliza 1012753, que ampara los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones asumidas por la contratita en virtud del contrato de Obra No 0493 de 2024, a continuación, se detallan los amparos:	

Amparo	**Valor**	**Vigencias**	
		Inicio	**Terminación**
Cumplimiento del contrato	$ 504.974.041,00	06/02/2025	12/01/2026
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	$ 252.487.021,00	12/12/2024	12/07/2028
Estabilidad de la Obra	$ 1.009.948.083,00	12/07/2025	12/07/2026
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 520.000.000,00	12/12/2024	12/07/2025

Tabla 2 Información del Contratista de obra

El Acta de Inicio para el desarrollo de las labores del Contrato de Obra No. 0493 DE2024, fue suscrita el día 06 de Febrero de 2025 entre el Supervisor de la Entidad Contratante, el representante legal de la Interventoría, y el Representante Legal del Contratista para ejecutar las obras del proyecto.

3.2. Presupuesto del Proyecto

El contratista ejecutara el proyecto en base a la oferta económica presentada que a continuación se detalla:

Item	Nombre de tarea	Unid	Cantidad	Costo Directo
1	**CAPÍTULO I - RECUPERACION CAÑO PUERTO SABANAGRANDE**			**$ 356.211.891,80**
1.01	Localización, Trazado y Replanteo	m2	11.060,42	$ 41.918.991,80
1.02	Limpieza para Recuperación Ambiental	m3	8.340,00	$ 173.346.900,00
1.03	Retiro y Disposición Final de Residuos	m3 - km	108.420,00	$ 140.946.000,00
2	**CAPÍTULO II - RECUPERACION CAÑO TIGRE**			**$ 502.913.250,00**
2.01	Localización, Trazado y Replanteo	m2	6.300,00	$ 23.877.000,00
2.02	Limpieza para Recuperación Ambiental	m3	12.166,00	$ 252.870.310,00
2.03	Retiro y Disposición Final de Residuos	m3 - km	173.973,80	$ 226.165.940,00
3	**CAPÍTULO III- RECUPERACION CAÑO LUISA**			**$ 719.013.750,00**
3.01	Localización, Trazado y Replanteo	m2	10.500,00	$ 39.795.000,00
3.02	Limpieza para Recuperación Ambiental	m3	17.250,00	$ 358.541.250,00
3.03	Retiro y Disposición Final de Residuos	m3 - km	246.675,00	$ 320.677.500,00
4	**CAPÍTULO IV - RECUPERACION CAÑO CONVENTO**			**$ 916.436.010,00**
4.01	Localización, Trazado y Replanteo	m2	21.600,00	$ 81.864.000,00
4.02	Limpieza para Recuperación Ambiental	m3	22.146,00	$ 460.304.610,00
4.03	Retiro y Disposición Final de Residuos	m3 - km	287.898,00	$ 374.267.400,00
5	**CAPÍTULO V - RECUPERACION CAÑO GRANDE**			**$ 466.925.550,00**
5.01	Localización, Trazado y Replanteo	m2	24.300,00	$ 92.097.000,00
5.02	Limpieza para Recuperación Ambiental	m3	7.570,00	$ 157.342.450,00
5.03	Retiro y Disposición Final de Residuos	m3 - km	167.297,00	$ 217.486.100,00
6	**CAPÍTULO VI - LIMPIEZA ESTRUCTURAS HIDRAULICAS**			**$ 356.278.250,00**
6.01	Limpieza para Recuperación Ambiental	m3	8.540,40	$ 177.512.214,00
6.02	Limpieza a Mano de Residuos Sólidos sobre Cauce (Incluye Retiro y Disposición)	Und	5,00	$ 20.000.000,00
6.03	Retiro y disposición Final de Residuos	m3 - km	122.127,72	$ 158.766.036,00
7	**CAPÍTULO VII - COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL**			**$ 566.637.000,00**
	Gestión Social			**$ 12.000.000,00**
7.01	Campaña Radial	Und	1,00	$ 2.000.000,00
7.02	Reuniones informativas con la Comunidad	Und	4,00	$ 10.000.000,00
	Educación Ambiental			**$ 8.000.000,00**
7.03	Inducción ambiental a Comunidades	Und	4,00	$ 6.400.000,00

Item	Nombre de tarea	Unid	Cantidad	Costo Directo
7.04	Inducción ambiental a Trabajadores	Und	1,00	$ 1.600.000,00
	Fortalecimiento Institucional			**$ 3.200.000,00**
7.05	Socialización del proyecto con organismos y autoridades	Und	2,00	$ 3.200.000,00
	Gestión Ambiental			**$ 543.437.000,00**
	Manejo de emisiones Atmosféricas de material particulado, gases y vapores al aire			**$ 241.600.000,00**
7.06	Monitoreo de partículas de gases PM10 (antes y durante la ejecución del proyecto en dos puntos)	Und	4,00	$ 241.600.000,00
	Manejo de niveles de Ruido y Vibración			**$ 24.000.000,00**
7.07	Monitoreo de emisiones de ruido (antes y durante la ejecución del proyecto)	Und	4,00	$ 24.000.000,00
	Manejo Ambiental de los Residuos Solidos			**$ 3.600.000,00**
7.08	Punto ecológico para almacenar residuos solidos	Und	2,00	$ 3.600.000,00
	Manejo Ambiental de los Residuos Líquidos			**$ 24.920.000,00**
7.09	Alquiler de una (1) cabina sanitaria por cada frente de obra habilitado	Und	2,00	$ 5.000.000,00
7.10	Monitoreo de Parámetros físicos, químicos y biológicos (antes y durante la ejecución del proyecto)	Und	12,00	$ 19.920.000,00
	Manejo Ambiental para monitorear los niveles del Hidrosistema			**$ 7.850.000,00**
7.11	Instalación de miras Hidrológicas	Und	5,00	$ 7.850.000,00
	Manejo ambiental de las Migraciones de peces en el sistema de Ciénagas			$ 48.251.000,00
7.12	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	Mes	7,00	$ 48.251.000,00
	Salvamento de Fauna Silvestre			**$ 6.400.000,00**
7,13	Trampas tipo Tomahawk y Sherman. Varas con lazos, ganchos herpetológicos y bolsas plásticas y de tela.	Glb	1,00	$ 6.400.000,00
	Recursos Humanos			**$ 186.816.000,00**
7,14	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	Mes	7,00	$ 186.816.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 3.884.415.701,80**
ADMINISTRACION (22%)				$ 854.571.454,40
IMPREVISTOS (3%)				$ 116.532.471,05
UTILIDAD (5%)				$ 194.220.785,09
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 1.165.324.710,54**
COSTO TOTAL				**$ 5.049.740.412,34**

Tabla 3 Presupuesto del Proyecto

3.3. Cronograma del Proyecto

El contratista presenta con Oficio CPN493-002-2025, el cronograma de obra el cual se adapta a las condiciones y términos del contrato, por lo cual será insumo para la gestión de control y seguimiento. A continuación, se presenta cuadro con los hitos y el diagrama de Gantt.

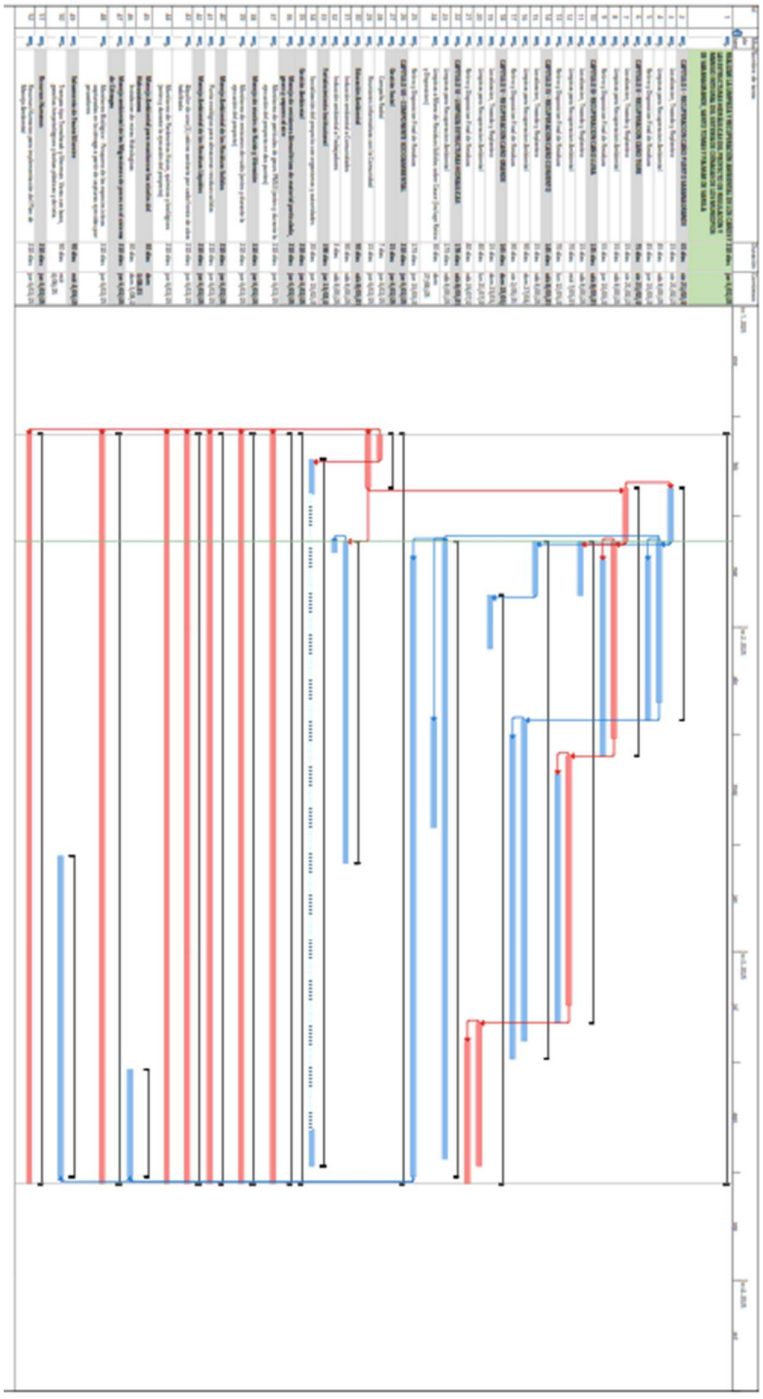


Ilustración 10 Gantt de Seguimiento

Item	Nombre de tarea	Costo Directo	Comienzo	Fin
1	**CAPÍTULO I - RECUPERACION CAÑO PUERTO SABANAGRANDE**	**$ 356.211.891,80**	**21/02/2025**	**26/04/2025**
1.01	Localización, Trazado y Replanteo	$ 41.918.991,80	21/02/2025	7/03/2025
1.02	Limpieza para Recuperación Ambiental	$ 173.346.900,00	8/03/2025	21/04/2025
1.03	Retiro y Disposición Final de Residuos	$ 140.946.000,00	13/03/2025	26/04/2025
2	**CAPÍTULO II - RECUPERACION CAÑO TIGRE**	**$ 502.913.250,00**	**21/02/2025**	**6/05/2025**
2.01	Localización, Trazado y Replanteo	$ 23.877.000,00	21/02/2025	7/03/2025
2.02	Limpieza para Recuperación Ambiental	$ 252.870.310,00	8/03/2025	1/05/2025
2.03	Retiro y Disposición Final de Residuos	$ 226.165.940,00	13/03/2025	6/05/2025
3	**CAPÍTULO III- RECUPERACION CAÑO LUISA**	**$ 719.013.750,00**	**8/03/2025**	**20/07/2025**
3.01	Localización, Trazado y Replanteo	$ 39.795.000,00	8/03/2025	22/03/2025
3.02	Limpieza para Recuperación Ambiental	$ 358.541.250,00	7/05/2025	15/07/2025
3.03	Retiro y Disposición Final de Residuos	$ 320.677.500,00	12/05/2025	20/07/2025
4	**CAPÍTULO IV - RECUPERACION CAÑO CONVENTO**	**$ 916.436.010,00**	**8/03/2025**	**30/07/2025**
4.01	Localización, Trazado y Replanteo	$ 81.864.000,00	8/03/2025	22/03/2025
4.02	Limpieza para Recuperación Ambiental	$ 460.304.610,00	27/04/2025	25/07/2025
4.03	Retiro y Disposición Final de Residuos	$ 374.267.400,00	2/05/2025	30/07/2025
5	**CAPÍTULO V - RECUPERACION CAÑO GRANDE**	**$ 466.925.550,00**	**23/03/2025**	**3/09/2025**
5.01	Localización, Trazado y Replanteo	$ 92.097.000,00	23/03/2025	6/04/2025
5.02	Limpieza para Recuperación Ambiental	$ 157.342.450,00	21/07/2025	29/08/2025
5.03	Retiro y Disposición Final de Residuos	$ 217.486.100,00	26/07/2025	3/09/2025
6	**CAPÍTULO VI - LIMPIEZA ESTRUCTURAS HIDRAULICAS**	**$ 356.278.250,00**	**8/03/2025**	**1/09/2025**
6.01	Limpieza para Recuperación Ambiental	$ 177.512.214,00	8/03/2025	27/08/2025
6.02	Limpieza a Mano de Residuos Sólidos sobre Cauce (Incluye Retiro y Disposición)	$ 20.000.000,00	27/04/2025	26/05/2025
6.03	Retiro y disposición Final de Residuos	$ 158.766.036,00	13/03/2025	1/09/2025
7	**CAPÍTULO VII - COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL**	**$ 566.637.000,00**	**6/02/2025**	**3/09/2025**
	Gestión Social	**$ 12.000.000,00**	**6/02/2025**	**20/02/2025**
7.01	Campaña Radial	$ 2.000.000,00	6/02/2025	12/02/2025
7.02	Reuniones informativas con la Comunidad	$ 10.000.000,00	6/02/2025	20/02/2025
	Educación Ambiental	**$ 8.000.000,00**	**8/03/2025**	**5/06/2025**
7.03	Inducción ambiental a Comunidades	$ 6.400.000,00	8/03/2025	5/06/2025
7.04	Inducción ambiental a Trabajadores	$ 1.600.000,00	8/03/2025	10/03/2025
	Fortalecimiento Institucional	**$ 3.200.000,00**	**13/02/2025**	**29/08/2025**
7.05	Socialización del proyecto con organismos y autoridades	$ 3.200.000,00	13/02/2025	29/08/2025
	Gestión Ambiental	**$ 543.437.000,00**	**6/02/2025**	**3/09/2025**
	Manejo de emisiones Atmosféricas de material particulado, gases y vapores al aire	**$ 241.600.000,00**	**6/02/2025**	**3/09/2025**
7.06	Monitoreo de partículas de gases PM10 (antes y durante la ejecución del proyecto en dos puntos)	$ 241.600.000,00	6/02/2025	3/09/2025
	Manejo de niveles de Ruido y Vibración	**$ 24.000.000,00**	**6/02/2025**	**3/09/2025**

Item	Nombre de tarea		Costo Directo	Comienzo	Fin
7.07	Monitoreo de emisiones de ruido (antes y durante la ejecución del proyecto)	$	24.000.000,00	6/02/2025	3/09/2025
	Manejo Ambiental de los Residuos Solidos	**$**	**3.600.000,00**	**6/02/2025**	**3/09/2025**
7.08	Punto ecológico para almacenar residuos solidos	$	3.600.000,00	6/02/2025	3/09/2025
	Manejo Ambiental de los Residuos Líquidos	**$**	**24.920.000,00**	**6/02/2025**	**3/09/2025**
7.09	Alquiler de una (1) cabina sanitaria por cada frente de obra habilitado	$	5.000.000,00	6/02/2025	3/09/2025
7.10	Monitoreo de Parámetros físicos, químicos y biológicos (antes y durante la ejecución del proyecto)	$	19.920.000,00	6/02/2025	3/09/2025
	Manejo Ambiental para monitorear los niveles del Hidrosistema	**$**	**7.850.000,00**	**3/08/2025**	**1/09/2025**
7.11	Instalación de miras Hidrológicas	$	7.850.000,00	3/08/2025	1/09/2025
	Manejo ambiental de las Migraciones de peces en el sistema de Ciénagas	$	48.251.000,00	**6/02/2025**	**3/09/2025**
7.12	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	$	48.251.000,00	6/02/2025	3/09/2025
	Salvamento de Fauna Silvestre	**$**	**6.400.000,00**	**4/06/2025**	**1/09/2025**
7,13	Trampas tipo Tomahawk y Sherman. Varas con lazos, ganchos herpetológicos y bolsas plásticas y de tela.	$	6.400.000,00	4/06/2025	1/09/2025
	Recursos Humanos	**$**	**186.816.000,00**	**6/02/2025**	**3/09/2025**
7,14	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	$	186.816.000,00	6/02/2025	3/09/2025

Tabla 4 Tabla de Hitos según programación

3.4. Personal del Contratista

El contratista para el desarrollo de las actividades dispuso en obra del siguiente personal el cual cumple con los pliegos de condiciones con los requerimientos mínimos. A continuación, se detallan los profesionales:

Nombre	Cargo	Profesión	Cedula	TP
Roque Muñoz Barrera	Director de Obra	Ing Civil	91 281 627	68202087106STD
Humberto Maldonado	Residente de Obra	Ing Civil	1 129 524 877	08202148465ATL
Juan Miguel Hernández	Especialista Ambienta	Ing Ambiental	1 118 848 009	08238349693ATL
Sonia González	Residente Ambiental	Ing Ambiental	1 140 885 236	08238428833ATL
Darío Vega	Biólogo	Biólogo	85 476 492	Resol. 06 del 26/03/2010
Osman Aragón	Auxiliar de Flora y Fauna	Bachiller	1 004 353 345	Resol. 04 del 11/02/2025
Rafael Rubio	Ing Pesquero	Ingeniero	72 302 363	N/A
Gilary Romero	Profesional SISO	Ingeniera	1 123 997 747	2644 - 26/05/2025
Luz Marina Barraza	Residente Social	Trabajadora Social	32 876 840	096423214-A

Nombre	Cargo	Profesión	Cedula	TP
Marvin Arregoces	Topógrafo	Tecnólogo	1 118 805 770	01 4405
Ekliss Gil Viloria	Cadenero	Tecnólogo	1 131 070 566	N/A
Walter Paredes	Operador Retro	Bachiller	8 731 832	N/A
Jhon C Troconiz	Conductor	Bachiller	3 821 255	N/A
Cesar Cabarcas	Operador Motoniveladora	Bachiller	1 043 017 263	N/A
Luis Molina	Operador Retro	Bachiller	8 729 191	N/A

Tabla 5 Personal del Contratista

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

4.1. Actividades Técnicas

A continuación, relacionamos las actividades que el contratista ha desarrollado en el periodo de estudio el cual va desde el 06/02/2025 al 05/03/2025:

Semana del 06 al 12 de Febrero

Jueves 6 de Febrero

- Se suscribió el acta de inicio del Contrato de Obra No. 493 de 2024.
- Se realizó la actualización del cronograma de obra a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.

Viernes 7 de Febrero

- Se realizó una reunión en conjunto con la interventoría se realiza la reunión con la Interventoría CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S., con la finalidad de coordinar las actividades de inspección de los frentes de trabajo en campo a intervenir, previo al inicio de las actividades operativas.
- Se elaboró la documentación técnica requerida para el desarrollo del proyecto, dentro de los cuales se encuentran el Plan de Calidad, listado de quipos requeridos, Análisis de precios unitarios, el Plan de Manejo Ambiental, El plan de Gestión Social, el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sábado 8 de Febrero

- Se continuó con las actividades de revisión y ajustes de los documentos técnicos y administrativos, planes y programas a implementar durante la ejecución del proyecto.
- Se elaboró el diseño de la valla informativa del proyecto, en la cual se relaciona el alcance del mismo, duración, y costos asociados. Se procedió a realizar el proceso de elaboración (impresión) de la valla informativa.

Domingo 9 de febrero

- No se ejecutaron actividades durante este día.

Lunes 10 de Febrero

- Se remitió a la interventoría los documentos administrativos, los soportes relacionados con el equipo de trabajo del Consorcio Alianza Ambiental, quienes estarán encargados del desarrollo del proyecto.
- Se realizó la adecuación del Punto de Atención a la Comunidad (PAC), el cual se encuentra ubicado en la Calle 11 # 13 – 16, en el Barrio Florencio, en el Municipio de Palmar de Varela. Se dispone de este punto físico para la atención a las PQRS que llegaran a ser formuladas por la comunidad en relación al proyecto.

Martes 11 de Febrero

- Se remitió a la interventoría los documentos técnicos asociados al proyecto, tales como la propuesta económica ofertada, los análisis de precios Unitarios (APUs), la programación de obra actualizada según el acta de inicio de obra, el listado de equipos y documentos asociados a estos (tarjetas de propiedad, SOAT, etc.), El plan de calidad, el plan de manejo ambiental, el plan de gestión social, el programa de seguridad y salud en el trabajo.
- Se realizó un sobrevuelo con dron, en conjunto con la interventoría, en los frentes del Caño del Puerto de Sabanagrande, el Caño Tigre, el Caño Luisa y el Caño Convento; este sobrevuelo se llevó a cabo con la finalidad de inspeccionar las condiciones topográficas y de acceso a dichos frentes, en aras de inspeccionar y registrar las condiciones previas a la ejecución de las actividades de limpieza y para definir la logística para la puesta en marcha de las actividades operativas.

Miércoles 12 de Febrero

- Se dio inicio a las actividades de levantamiento de actas de vecindad liderada por la profesional social del proyecto, registrando el estado actual de las viviendas y establecimientos cercanos al frente de trabajo del Caño del Puerto de Sabanagrande; se diligenciaron las actas y se tomaron los registros fotográficos correspondientes.

Semana del 3 al 19 de Febrero

Jueves 13 de febrero

- Se realizó un recorrido de inspección en el Caño Tigre y en el Caño Luisa de Palmar de Varela, en conjunto con la Interventoría y la comisión topográfica, con el fin de inspeccionar la disponibilidad de recursos para el acceso, rutas para la entrada de la maquinaria y tiempos de recorrido.

- Se continuó con las actividades de levantamiento de actas de vecindad en el frente de trabajo del caño del puerto de Sabanagrande.

Viernes 14 de Febrero

- Se realizó la movilización de equipos (maquinaria amarilla) al frente de obra del Caño Tigre.
- Se realizaron actividades de limpieza y desmonte, retirando maleza presente en el cauce del Caño Tigre, con el objetivo de remover los obstáculos y despejar el área para la realización de las actividades de levantamiento topográfico.
- Se realizó la instalación de la señalización en obra, indicando los puntos de encuentro, puntos de hidratación, inicio y fin de obra. Así mismo, se realizó la señalización en el PAC, indicando las rutas de evacuación, extintores, botiquín, entre otros.
- Se continuó con las actividades de levantamiento de actas de vecindad en el frente de trabajo del caño del puerto de Sabanagrande.

Sábado 15 de Febrero

- Se realizó la actividad de levantamiento topográfico del Caño Tigre en conjunto con la interventoría, mediante GPS RTK; se levantó el área comprendida entre la abscisa K0+000 (desembocadura del caño en el rio magdalena) hasta la K0+900 (desembocadura del caño en la ciénaga de Palmar de Varela, para un total de 900 metros lineales.
- Se realizó la instalación de la Valla informativa del proyecto en el Municipio de Palmar de Varela, sobre el acceso a la vía oriental.
- Se realizó la verificación del uso adecuado de los EPP del personal operativo, así como el diligenciamiento de AST para las actividades de campo.
- Se continuó con las actividades de levantamiento de actas de vecindad en el frente de trabajo del caño del puerto de Sabanagrande.

Lunes 17 de Febrero

- Se realiza sobrevuelo con done en los 5 frentes de trabajo, con la finalidad de complementar los detalles obtenidos en el primer sobre vuelo y evaluar rutas de accesos para los frentes de los Municipios de Palmar en Caño tigre, en el Municipio de Santo Tomas en Caño Luisa, en el Municipio de Sabanagrande en Caño Puerto Sabanagrande, Caño Convento y en Caño grande en el área de PIMSA.
- Se dio inicio a las actividades de conformación y adecuación del sitio para operaciones de maquinaria en caño Tigre, habilitando los accesos entre las abscisas K0+000 al K0+030 para este frente de trabajo.

- Se realizaron charlas al personal en obra en materia de seguridad y salud en el trabajo; se realizó el diligenciamiento de AST, se verificó el uso adecuado de EPP.
- Se continuó con las actividades de levantamiento de actas de vecindad en el frente de trabajo del caño del puerto de Sabanagrande.

Martes 18 de Febrero

- Se continuó con las actividades de adecuaciones de terreno en el frente de trabajo de Caño Tigre, para el ingreso de la maquinaria en dicho frente, habilitándose el acceso entre las abscisas las abscisas K0+030 al K0+060. Estas actividades de realizaron mediante la operatividad de una retroexcavadora Hitachi EX200.

Miércoles 19 de Febrero

- Se continuó con las actividades de adecuaciones de terreno en el frente de trabajo de Caño Tigre, realizando la adecuación de accesos en el tramo comprendido entre las abscisas K0+030 a la K0+060, mediante la operatividad de una retroexcavadora Hitachi EX200.
- Se realizó una reunión de socialización del proyecto en la Zona Portuaria de PIMSA, a la cual se convocaron grupos de pescadores y personal operativo de PIMSA, para dar a conocer el alcance del proyecto, las intervenciones a realizar, duración, entre otros aspectos técnicos.
- Se realizaron charlas al personal en campo relacionadas con el componente de seguridad y salud en el trabajo; se verificó al diligenciamiento de AST, y el uso adecuado de EPP.

Semana del 20 al 26 de Febrero

Jueves 20 de febrero

- Se realizó la revisión de la información recopilada durante los sobrevuelos con dron realizados el día anterior en los 5 frentes de trabajo y se remite a la Interventoría del proyecto los registros fílmicos y fotográficos.
- Se continuó con las actividades de levantamiento de actas de vecindad en el frente de trabajo del caño del puerto de Sabanagrande.

Viernes 21 de Febrero

- Se continuó con el levantamiento de las actas de vecindad en el área de Caño Puerto Sabanagrande; durante este día se levantaron 14 actas de vecindad correspondientes a los locales al margen del caño y en el costado de la vía al puerto.
- Se realizó la toma de tres (3) muestras puntuales de calidad de aguas previo a la ejecución de las actividades de limpieza en los diferentes caños. Estas muestras fueron tomadas por técnicos del Laboratorio para

la industria y el medio ambiente LIMA, acreditado por el IDEAM, el cual será el encargado de realizar los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos definidos en los estudios previos y APUs del proyecto, que contempla: Temperatura, Conductividad, Oxígeno Disuelto, PH, Sólidos Suspendidos Totales, Demanda Biológica de Oxigeno (DBO5), Demanda Química de Oxigeno (DQO), Coniforme termotolerantes y Coliformes totales

Sábado 22 de Febrero

- Se continuó con las labores de adecuación de las vías y accesos en el frente de trabajo del Caño Tigre entre las abscisas K0+067 a la K0+073, mediante la operatividad de una retroexcavadora Hitachi EX200, logrando conformar la pista para el acceso y maniobra de los vehículos tipo volquetas.
- Implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo: se verifico el uso adecuado de EPP por parte del personal en obra, el diligenciamiento de formatos de AST, inspecciones preoperacionales.

Lunes 24 de Febrero

- Se continuó con las labores de adecuación de las vías, accesos y puntos para el acopio temporal de material a extraer en el frente de trabajo del Caño Tigre entre las abscisas K0+067 a la K0+073.
- Levantamiento de actas de vecindad en el frente de trabajo del Caño de Puerto de Sabanagrande, lográndose elaborar cinco (5) actas correspondientes a locales comerciales del puerto.

Martes 25 de Febrero

- Se finalizan las labores de adecuación de las vías, accesos y puntos para el acopio temporal de material a extraer en el frente de trabajo del Caño Tigre entre las abscisas K0+067 a la K0+073.
- Se realizó reunión de comité técnico en conjunto con la interventoría del proyecto, y el supervisor por parte de la CRA en las instalaciones de la corporación, con la finalidad de aclarar y precisar los lineamientos bajo los cuales se deben elaborar las actividades asociadas al componente socioambiental del proyecto, tales como el monitoreo biológico pesquero y el monitoreo de calidad de aire y ruido.

Miércoles 26 de Febrero

- Se realizó la actividad de levantamiento de actas de vecindad en el frente de trabajo del Caño Convento, diligenciando la información del estado actual de los establecimientos y viviendas inspeccionados acompañados de un registro fotográfico, se logró elaborar durante este día tres (3) actas.

- Se realizaron las actividades de preparación y logística para la jornada de socialización del proyecto en el Municipio de Palmar de Varela por parte del equipo Social, la cual se programó para el 27 de febrero de 2025.
- Se realizó el primer monitoreo de sedimentos para verificar la presencia de metales pesados tales como plata, arsénico, selenio, bario, cadmio, cromo, plomo, mercurio; en el caño tigre, caño luisa, caño puerto sabanagrande y caño convento, para este monitoreo se contrató al laboratorio para la industria y el medio ambiente – LIMA.

Semana del 27 de febrero al 05 de marzo de 2025

Jueves 27 de febrero

- Se realizó una jornada de socialización en el Municipio de Palmar de Varela en la Calle 5 # 4A-08, contando con la participación del gremio de los agricultores y pescadores presentes en el área del frente de trabajo de Caño Tigre. La jornada se desarrolló con normalidad, se socializó a los asistentes el alcance del proyecto, áreas a intervenir, duración del proyecto, y otros aspectos; así mismo, se aclararon las dudas de los asistentes y se brindó información acerca del punto de atención a la comunidad, para tramitar PQRS y ser atendidas por parte del equipo de contratista de obra.
- Se dio inicio a las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Caño Tigre, mediante la operatividad de una retroexcavadora Hitachi EX200, entre las abscisas K0+000 (desembocadura del caño en el rio magdalena hasta la abscisa K0+040, manejando anchos promedios de 5 metros. El material extraído se acopio temporalmente en los espacios habilitados previamente a la realización de actividades de recuperación, para posteriormente ser dispuestos en sitio autorizado.
- Implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la inspección del uso adecuado de los EPP por parte de los trabajadores en obra, el diligenciamiento de formatos previo al inicio de las actividades tales como preoperacionales y análisis de trabajo seguro (AST).
- Se llevó a cabo un recorrido exploratorio por el sistema de ciénagas de Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela con el propósito de realizar una inspección preliminar del área. Esta evaluación inicial permitió identificar las condiciones hidrobiológicas y ecosistemitas del sistema, con énfasis en la caracterización de hábitats acuáticos y la identificación de posibles sitios de muestreo. Los resultados de esta inspección sirvieron como base para la planificación de la ejecución del monitoreo biológico pesquero, el cual buscará analizar la estructura y dinámica de las comunidades ícticas, así como evaluar el estado de los recursos pesqueros en el hidrosistema.
- Se elaboró el plan de trabajo para la realización del Monitoreo Biológico Pesquero, conformando los documentos técnicos y metodologías y

ensayos a realizar para la puesta en marcha de esta actividad. Se remitió a la interventoría la documentación para su revisión.

- Se realizó la actividad de levantamiento topográfico del Caño Luisa en conjunto con la interventoría, mediante GPS RTK.
- Se llevó a cabo el proceso logístico para la organización y ejecución de las capacitaciones dirigidas a los encuestadores en el marco del monitoreo biológico pesquero. Como parte de esta planificación, se coordinaron los recursos necesarios, incluyendo materiales didácticos, espacio de formación y herramientas metodológicas para garantizar una capacitación efectiva

Viernes 28 de Febrero

- Se continuó con las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Caño Tigre, mediante la operatividad de una retroexcavadora Hitachi EX200, entre las abscisas K0+040 hasta la abscisa K0+070, manejando secciones trapezoidales con anchos promedios de 5 metros en la base. Se acopio temporalmente el material extraído en los espacios habilitados previamente.
- Implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la inspección del uso adecuado de EPP, así como el diligenciamiento de formatos (AST y preoperacionales), así como la verificación del botiquín de primeros auxilios y camilla de emergencia en el frente de obra de Caño Tigre.
- Se dio inicio a las actividades de levantamiento de actas de vecindad en el frente de trabajo de Caño Luisa, lográndose levantar tres (3) actas precisándose el estado actual y registro fotográfico.
- Se realizó la actividad de levantamiento topográfico del frente de trabajo de Caño Sabanagrande en conjunto con la interventoría, mediante GPS RTK.
- Durante la jornada se llevó a cabo un rescate y liberación de iguana que se encontraba en cercanía al área de trabajo
- Se llevó a cabo la capacitación a los encuestadores a las 10:30am en las instalaciones de la oficina central de Palmar de Varela ubicada en la Calle 11 # 13- 16 Barrio Florencia, se realizó entrega de materiales tales como ictiometros, balanzas, formatos de encuestas, durante la jornada se realizó la entrega de hidratación y alimentación.

Sábado 01 de Marzo

- Se realizaron las actividades de perfilamiento de taludes en el frente de obra de Caño Tigre entre las abscisas K0+000 hasta la K0+070, tanto del lado izquierdo como derecho del caño, manejando una relación de 1:1 y un alto promedio de 2.8 metros.
- Se llevó a cabo la ejecución de las medidas establecidas en el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), asegurando el cumplimiento de los protocolos normativos. Se verificó la correcta utilización de los

Equipos de Protección Personal (EPP) por parte del personal, así como el adecuado diligenciamiento y control de los formatos de Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) y listas de verificación preoperacionales. Adicionalmente, se supervisó la adherencia a los procedimientos establecidos para mitigar riesgos laborales y garantizar condiciones óptimas de seguridad en el entorno de trabajo.

- Se realizó la actividad de levantamiento topográfico en el frente de trabajo de Caño convento, en conjunto con la interventoría, mediante GPS RTK.

Lunes 03 de Marzo

- Se continuó con las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Caño Tigre, mediante la operatividad de una retroexcavadora Hitachi EX200, entre las abscisas K0+070 hasta la abscisa K0+120, manejando secciones trapezoidales con anchos promedios de 5 metros en la base. Se acopio temporalmente el material extraído en los espacios habilitados previamente para posteriormente realizar su disposición final en el sitio autorizado por la CRA.
- Se dio inicio la puesta en marcha del monitoreo biológico pesquero con los parámetros pesqueros, biológicos y económicos.

Martes 04 de Marzo

- Se dio continuidad a las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Caño Tigre, utilizando una retroexcavadora Hitachi EX200. Los trabajos se desarrollaron entre las abscisas K0+120 y K0+180 (60 metros lineales), ejecutando el perfilado de secciones trapezoidales con un ancho promedio de 5 metros en la base. El material extraído fue acopiado temporalmente en las áreas previamente habilitadas, garantizando su posterior disposición fina en el sitio autorizado por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), en cumplimiento de las normativas ambientales vigentes. Asi mismo, se realizó la actividad de reconformación de taludes, manejando relaciones de 1:1 y una altura promedio de 2.3 metros.
- Se llevó a cabo la implementación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), garantizando el cumplimiento de los protocolos establecidos para la prevención de riesgos laborales. Durante la jornada, se realizó la inspección del uso adecuado de los Equipos de Protección Personal (EPP) por parte de los trabajadores, verificando su correcta utilización según las actividades desempeñadas. Asimismo, se supervisó el diligenciamiento de los formatos de Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) y preoperacionales, asegurando que se registraran adecuadamente las condiciones de seguridad antes del inicio de las labores, con el fin de mitigar posibles incidentes y mejorar el ambiente laboral.
- Durante la jornada se presentó un ahuyentamiento de culebra que se encontraba en cercanía del área de trabajo.

- Se continuo con la puesta en marcha del monitoreo biológico pesquero con los parámetros pesqueros, biológicos y económicos.

Miércoles 05 de Marzo

- Se avanzó con las actividades de limpieza para la recuperación ambiental en el frente de obra de Caño Tigre, empleando una retroexcavadora Hitachi EX200. Las labores se ejecutaron entre las abscisas K0+180 y K0+240, abarcando un tramo de 60 metros lineales, donde se realizó el perfilado de secciones trapezoidales con un ancho promedio de 5 metros en la base. El material extraído fue temporalmente acopiado en las áreas previamente habilitadas, asegurando su disposición final conforme a las normativas establecidas por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA). Adicionalmente, se llevó a cabo la reconformación de taludes, aplicando una relación de inclinación de 1:1 y alcanzando una altura promedio de 2.3 metros, garantizando la estabilidad estructural y el cumplimiento de los estándares ambientales. El aumento en el nivel del río ha provocado la entrada de agua al canal, por lo que las labores se están desarrollando de manera secuencial, iniciando en las secciones ubicadas aguas arriba y empalmando con los tramos previamente finalizados. Esta estrategia tiene como objetivo mitigar el impacto del flujo de agua en las operaciones de limpieza, permitiendo una ejecución más eficiente y evitando interrupciones en el proceso.
- Como parte de la implementación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se llevó a cabo la inspección del uso correcto de los Equipos de Protección Personal (EPP) por parte del personal. Asimismo, se verificó el adecuado diligenciamiento de los formatos de Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) y preoperacionales, garantizando el cumplimiento de los protocolos de seguridad y la mitigación de riesgos en el entorno laboral.
- Se realizó una inspección en campo en conjunto con la interventoría en el frente de trabajo de Caño Grande, evidenciándose la presencia abundante de material vegetal (henea), por lo que se requiere programar una jornada de limpieza del área para poder realizar el levantamiento topográfico en este frente de trabajo.
- Se realizaron encuestas de conocimiento local y uso de la fauna silvestre
- Se continuo con la puesta en marcha del monitoreo biológico pesquero con los parámetros pesqueros, biológicos y económicos.

5. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1. Información General

Contratista	**CONTRUPROYECTOS DEL NORTE SAS**
Representante Legal	DAVID ANDRES MARMOLEJO ROMERO, identificado con Cedula de Ciudadanía 1.102.862.466 expedida en Sincelejo
Contrato No.	. 0496 de 2024
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL PROYECTO DE REGULACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CIÉNAGAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 293 DEL 2017".
Valor Inicial	$ 377.999.998,00
Adiciones	$ 0.00
Valor Total	$ 377.999.998,00
Plazo Inicial de Ejecución	7 Meses
Fecha de Inicio	06 de Febrero de 2025
Fecha de Terminación Programada	05 de Septiembre de 2025
COMPONENTE ADMINITRATIVO	
Pagos Parciales	LA ENTIDAD pagará al CONTRATISTA el valor total del contrato así: En cuotas mensuales, vencidas e iguales durante el plazo del contrato, según el personal y costos ofertados, afectados por un multiplicador.
Origen de los Recursos	Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA)
COMPONENTE JURIDICO	
El Contratista Toma la Póliza con la compañía de Seguros del Estado SA, un seguro de cumplimiento para entidades estatales No. 11-44-101245325;, a continuación, se detallan los amparos:	

Amparo	**Valor**	**Vigencias**	
		Inicio	**Terminación**
Cumplimiento del contrato	$ 37.799.999,00	06/02/2025	09/03/2026
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	$ 18.899.999,00	06/02/2025	06/09/2028
Calidad del Servicio	$ 75.599.999,00	06/09/2025	06/09/2026

Tabla 6 Información de Interventoría

5.2. Presupuesto de la Interventoría

En la tabla a continuación se presenta el presupuesto ofertado por la interventoría

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL PROYECTO DE REGULACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CIÉNAGAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 293 DEL 2017"					
PRESUPUESTO					
DESCRIPCION	**CANT**	**MESES**	**DEDICACION**	**SUELDO**	**VALOR PARCIAL**
A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
A.1 PERSONAL PROFESIONAL					
Director de Interventoría	1	7	50%	$ 7.250.000,00	$ 25.375.000,00
Residente de Interventoría	1	7	100%	$ 4.150.000,00	$ 29.050.000,00
Profesional Ambiental	1	7	20%	$ 5.880.000,00	$ 8.232.000,00
A.2 PERSONAL TECNICO					
Profesional SISO	1	7	100%	$ 2.300.000,00	$ 16.100.000,00
SUBTOTAL PERSONAL					**$ 78.757.000,00**
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,40**
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					**$ 189.016.800,00**
B. OTROS COSTOS DIRECTOS					
DESCRIPCION	**UNIDAD**		**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
Alquiler de Vehículo (Incluye conductor, combustible y mantenimiento)	MES		7	$ 7.000.000,00	$ 49.000.000,00
Comisión Topográfica. (Incluye: Un Topógrafo, Un Cadenero y Equipos de Medición: Sistema GNSS - RTK Base y Rover (Incluye: dos bastones y trípode), Estación Total Topográfica (Incluye: dos bastones y trípode), Nivel de precisión (Incluye: dos bastones y trípode))	MES		7	$ 10.425.751,00	$ 72.980.257,00
Informes, papelería, reproducción de documentos, planos y fotografías.	MES		7	$ 950.000,00	$ 6.650.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 128.630.257,00**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS					**$ 317.647.057,00**
IMPUESTO AL VALOR AGREADO IVA (19%)					**$ 60.352.941,00**
COSTO TOTAL INTERVENTORIA					**$ 377.999.998,00**

Tabla 7 Presupuesto de la Interventoría

5.3. Personal de la Interventoría

De acuerdo al pliego de condiciones se dispuso en obra del siguiente personal de obra:

Nombre	Cargo	Profesión	Cedula	TP
Manuel Rodríguez Gómez	Director de Obra	Ing Civil	8.726.301	0820239156 ATL
Gustavo Castellar Arrieta	Residente de Obra	Ing Civil	80.066.599	13202133728BLV
Eyleen Pérez Maestre	Profesional Ambiental	Trabadora Social	1.065.608.102	08260278380ATL
Amanda Trujillo Niño	Profesional SISO	Ing Ambiental	22.668.158	Res 526 de 2023
Jeison Álvarez Brito	Topógrafo	Tecnólogo	1.121.042.629	Licencia 01-14373
Tania Cabrera Padilla	Cadenera	Tecnólogo	1.001.779.481	NA

Tabla 8 Personal de la Interventoria

6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA

6.1. Actividades Técnicas

A continuación, relacionamos las actividades que por parte de la interventoría se han desarrollado en el periodo de estudio el cual va desde el 06/02/2025 al 05/03/2025:

Semana del 06 al 12 de Febrero

Jueves 6 de Febrero

- Se suscribió el acta de inicio del Contrato de Interventoría No. 496 de 2024.
- Se analiza el cronograma presentado por el contratista, se evalúa la secuencia lógica de las actividades fecha de inicio de actividades y su culminación a fin de que no sobrepase el 05/09/2024, una vez revisado se aprueba y se le informa la entidad de su validez.

Viernes 7 de Febrero

- Se estudia en conjunto con el contratista el plan de acción a seguir para el inicio de las actividades se agendan planes de inspección de los frentes de trabajo en campo y el personal requerido para tal inspección.
- Se recibe documentación técnica por parte del contratista para revisión y análisis.
- Se da inicio al estudio, análisis y evaluación de la documentación presentada, la cual consta de: Plan de Calidad, listado de quipos requeridos, Análisis de precios unitarios, el Plan de Manejo Ambiental, El plan de Gestión Social, el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Se le requiere al contratista por algunos ajustes en el Plan de Calidad y el Plan Social.
- Se requiere al contratista para que presente el plan de gestión de los monitoreos ambientales.

Sábado 8 de Febrero

- Una vez evaluados los documentos presentados de Plan de Calidad, listado de quipos requeridos, Análisis de precios unitarios, el Plan de Manejo Ambiental, se da aval para estos documentos y se informa a la entidad.
- El contratista presenta para revisión el diseño de la valla informativa para lo cual se analiza y se aprueba el diseño para tramite posterior.

Lunes 10 de Febrero

- Se recibe correspondencia con documentos del equipo mínimo requerido para el proyecto, para lo cual se realiza el proceso de verificación de requerimientos de acuerdo al pliego de condiciones a fin de que cumplan con la propuesta. Se requiere al contratista para que presente los anexos de la experiencia mínima requerida para los profesionales sociales y ambiental.
- Se realiza acompañamiento en la instalación del Punto de Atención a la Comunidad (PAC), en la Calle 11 # 13 – 16, en el Municipio de Palmar de Varela.

Martes 11 de Febrero

- Se recibe del contratista los siguientes documentos: propuesta económica ofertada, los análisis de precios Unitarios (APUs), el listado de equipos y documentos asociados a estos (tarjetas de propiedad, SOAT, etc.).
- Se analizan los documentos y se requiere al contratista por dos temas un SOAT de una volqueta vencida y otro próximo a vencer para que se legalice dicho seguro y sea subsanada la salvedad
- Se realiza acompañamiento al sobrevuelo con dron, en conjunto, en los frentes del Caño del Puerto de Sabanagrande, el Caño Tigre, el Caño Luisa y el Caño Convento.
- Se realiza consulta a la entidad de la programación para la presentación de informes y su contenido, para lo cual se visitó la CRA para que se nos aclaran las dudas con respecto a estos temas.
- Se organiza con la entidad los formatos para la presentación de informes.

Miércoles 12 de Febrero

- Se realiza acompañamiento al levantamiento de actas de vecindad en las viviendas y establecimientos cercanos al frente de trabajo del Caño del Puerto de Sabanagrande; se aclaran las dudas de carácter técnico a los entrevistado y se revisan la idoneidad de las evidencias fotográficas.
- Se realiza la formulación del primer informe semanal de acuerdo a las recomendaciones de la entidad para su presentación.

Semana del 3 al 19 de Febrero

Jueves 13 de febrero

- Se presenta el primer informe semanal ante la entidad para revisión y aprobación
- Se realiza acompañamiento en recorrido con el contratista en Caño Tigre y en el Caño Luisa de Palmar de Varela, a fin de evaluar la logística de los vehículos que se utilizaran en las labores de limpieza.
- Se sigue en el acompañamiento de levantamiento de actas de vecindad en el frente de trabajo del caño del puerto de Sabanagrande.

Viernes 14 de Febrero

- Se realiza seguimiento a la implementación del programa SST
- Se realiza seguimiento a la movilización de equipos (maquinaria amarilla) al frente de obra del Caño Tigre. Se verifica que todos los documentos de los vehículos de la operación cuenten con las vigencias al día, que sean operativos y que estén en condiciones para realizar la tarea.
- Se realiza seguimiento y avalan las actividades de seguridad en el trabajo en lo pertinente a señalización en obra.
- Se sigue con el acompañamiento en el levantamiento de actas de vecindad en el frente de trabajo del caño del puerto de Sabanagrande.

Sábado 15 de Febrero

- Se realiza seguimiento a la implementación del programa SST
- Se realiza acompañamiento en el replanteo topográfico del Caño Tigre, mediante GPS RTK; desde la abscisa K0+000 (desembocadura del caño en el rio magdalena) hasta la K0+900 (desembocadura del caño en la ciénaga de Palmar de Varela, para un total de 900 metros lineales.
- Se verifica la operatividad del GPS RTK,
- Se verifica en campo el abscisado y alcance de la actividad
- Se evalúa y avala la pertinencia del sitio escogido para la instalación de la valla informativa. Se realizó acompañamiento en la instalación en el Municipio de Palmar de Varela.
- Se continuó con el acompañamiento de levantamiento de actas de vecindad en el frente de trabajo del caño del puerto de Sabanagrande.

Lunes 17 de Febrero

- Se realiza seguimiento a la implementación del programa SST
- Se acompaña al sobrevuelo con done en 5 frentes de trabajo, para los frentes de los Municipios de Palmar en Caño tigre, en el Municipio de Santo Tomas en Caño Luisa, en el Municipio de Sabanagrande en Caño

Puerto Sabanagrande, Caño Convento y en Caño grande en el área de PIMSA.

- Se verifica la operatividad del Drone, su documentación y se realiza seguimiento al sobrevuelo a fin de que cubra el alcance del proyecto.
- Se realiza seguimiento a la actividad de conformación y adecuación del terreno para pista de operaciones en caño Tigre, entre las abscisas K0+000 al K0+030.
- Continua el acampamiento en el levantamiento de actas de vecindad en el frente de trabajo del caño del puerto de Sabanagrande.

Martes 18 de Febrero

- Se realiza el seguimiento a la adecuación del terreno en el frente de trabajo de Caño Tigre, para el ingreso de la maquinaria y la pista de operaciones, en la abscisa K 0+030
- Se realiza el control y seguimiento a la implementación del programa SST, para lo cual se llena el formulario de seguimiento.
- Se realiza seguimiento a control topográfico reportado

Miércoles 19 de Febrero

- Se realiza acompañamiento a las actividades charlas preoperativas, uso de EPP. Se realiza el control y seguimiento a la implementación del programa SST.
- Se realiza seguimiento a las tareas de conformación de terreno en el frente de trabajo de Caño Tigre, entre las abscisas K0+030 a la K0+060, con la retroexcavadora Hitachi EX200.
- Se realiza control y seguimiento al reporte topográfico
- Se asiste a la socialización del proyecto en la Zona Portuaria de PIMSA, con grupos de pescadores y personal operativo de PIMSA, en donde se realiza una presentación del alcance del proyecto.
- Se realiza la formulación del segundo informe semanal

Semana del 20 al 26 de Febrero

Jueves 20 de febrero

- Se presenta segundo informe semanal a la entidad
- Se recibe del contratista el material de los sobrevuelos para su análisis, la cual es conforme con el alcance de los frentes, las imágenes detallan la zona a intervenir, y se informa al contratista de su aval como evidencia fotográfica
- Se continuó acompañando el levantamiento de actas de vecindad en el frente de trabajo del caño del puerto de Sabanagrande.

Viernes 21 de Febrero

- Se continua con el acompañamiento al levantamiento de las actas de vecindad en el área de Caño Puerto Sabanagrande; se revisan 14 actas de vecindad correspondientes a los locales al margen del caño y en el costado de la vía al puerto.
- Se verifica la idoneidad y capacidad del Laboratorio propuesto para el monitoreo (LIMA), y se reporta su aceptación al contratista
- Se acompaña al equipo del contratista en la toma de tres (3) muestras puntuales de calidad de aguas. Estas muestras fueron tomadas por técnicos del Laboratorio para la industria y el medio ambiente LIMA, acreditado por el IDEAM, los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos a reportar contempla: Temperatura, Conductividad, Oxígeno Disuelto, PH, Sólidos Suspendidos Totales, Demanda Biológica de Oxigeno (DBO5), Demanda Química de Oxigeno (DQO), Coniforme termotolerantes y Coliformes totales. Este monitoreo se realiza antes del inicio de actividades.

Sábado 22 de Febrero

- Se realiza el control y seguimiento a la implementación del programa SST.
- Se realiza seguimiento a las labores con la retroexcavadora en Caño Tigre para las actividades entre las abscisas K0+067 a la K0+073.
- Se realiza seguimiento al control topográfico reportado por el contratista.

Lunes 24 de Febrero

- Se realiza el control y seguimiento a la implementación del programa SST
- Se realiza seguimiento a la actividad de adecuación de las vías, accesos y puntos para el acopio temporal de material del Caño Tigre entre las abscisas K0+067 a la K0+073
- Se realiza seguimiento al control topográfico reportado por el contratista.
- Se acompaña al levantamiento de actas de vecindad del Caño de Puerto de Sabanagrande, se revisan cinco (5) actas

Martes 25 de Febrero

- Se realiza el control y seguimiento a la implementación del programa SST
- Continua el seguimiento a la actividad de adecuación de las vías, accesos y puntos para el acopio temporal de material del Caño Tigre entre las abscisas K0+067 a la K0+073
- Se participa en la reunión de comité técnico en conjunto con la interventoría del proyecto, y el supervisor por parte de la CRA en las instalaciones de la corporación, con la finalidad de aclarar y precisar los

lineamientos bajo los cuales se deben elaborar las actividades asociadas al componente socioambiental del proyecto, tales como el monitoreo biológico pesquero y el monitoreo de calidad de aire y ruido.

Miércoles 26 de Febrero

- Se acompaña la actividad de levantamiento de actas de vecindad en el frente de trabajo del Caño Convento, se revisan tres (3) actas.
- Se acompaña al contratista en la preparación y logística para la jornada de socialización del proyecto en el Municipio de Palmar de Varela por parte del equipo Social, para el 27/02/2025.
- Se acompaña al primer monitoreo de sedimentos para verificar la presencia de metales pesados tales como plata, arsénico, selenio, bario, cadmio, cromo, plomo, mercurio; en el caño tigre, caño luisa, caño puerto sabanagrande y caño convento, para este monitoreo se designo al laboratorio para la industria y el medio ambiente – LIMA.
- Se avalan las muestras recolectadas para el laboratorio y se evidencia el sitio de las tomas
- Se realiza la formulación del tercer informe semanal

Semana del 27 de febrero al 05 de marzo de 2025

Jueves 27 de febrero

- Se presenta el informe semanal a la entidad
- Se asistió y acompaño al contratista en la socialización en el Municipio de Palmar de Varela en la Calle 5 # 4A-08, junto al gremio de los agricultores y pescadores presentes en el área del frente de trabajo de Caño Tigre. Se despejaron las dudas de los participantes y se apoyó en la intervención de carácter técnico junto con el contratista.
- Se realiza el control y seguimiento a la implementación del programa SST
- Se hace seguimiento a la actividad de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Caño Tigre, entre las abscisas K0+000 (desembocadura del caño en el rio magdalena) hasta la abscisa K0+040.
- Se realiza seguimiento al control en la medida del ancho del fondo y en la nivelación de la cota de fondo de la limpieza.
- Se acompaño al contratista en el recorrido exploratorio por el sistema de ciénagas de Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela con el propósito de realizar una inspección preliminar del área. Esta tarea es la base para la planificación de la ejecución del monitoreo biológico pesquero, el cual buscará analizar la estructura y dinámica de las comunidades ícticas, así como evaluar el estado de los recursos pesqueros en el hidrosistema.
- Se requiere al contratista para presentar el plan de trabajo para la realización del Monitoreo Biológico Pesquero, conformando los

documentos técnicos y metodologías y ensayos a realizar para la puesta en marcha de esta actividad.
- Se realiza seguimiento al levantamiento topográfico del Caño Luisa en, mediante GPS RTK.
- Se realiza seguimiento al control topográfico realizado en la jornada
- Se requiere al contratista para elaborar el plan de acción en la organización y ejecución de las capacitaciones dirigidas a los encuestadores en el marco del monitoreo biológico pesquero.

Viernes 28 de Febrero

- Se realiza el control y seguimiento a la implementación del programa SST
- Se realiza el seguimiento a la actividad de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Caño Tigre, entre las abscisas K0+040 hasta la abscisa K0+070.
- Se acompaña a la topografía en el trazado del área a intervenir.
- Se verifica la medida de anchos y cotas de fondo de la limpieza dentro del caño.
- Se realiza acompañamiento al levantamiento de actas de vecindad en el frente de trabajo de Caño Luisa, se revisan tres (3) actas
- Se realiza seguimiento al de levantamiento topográfico del frente de trabajo de Caño Sabanagrande, mediante GPS RTK
- Se realiza seguimiento al rescate y liberación de iguana que se encontraba en cercanía al área de trabajo
- Se asiste a la capacitación a los encuestadores en las instalaciones de la oficina central de Palmar de Varela ubicada en la Calle 11 # 13- 16,

Sábado 01 de Marzo

- Se realiza el control y seguimiento a la implementación del programa SST
- Se realiza el seguimiento a la actividad de perfilamiento de taludes en el frente de obra de Caño Tigre, entre las abscisas K0+000 al K0+070.
- Se verifica que los taludes tengan relación 1:1.
- Se realiza seguimiento a los controles topográficos reportados por el contratista
- Se realiza seguimiento a la actividad de levantamiento topográfico en el frente de trabajo de Caño convento, en conjunto con la interventoría, mediante GPS RTK.

Lunes 03 de Marzo

- Se realiza el control y seguimiento a la implementación del programa SST
- Se realiza el seguimiento a la actividad de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Caño Tigre, entre las abscisas K0+070 hasta la abscisa K0+120.
- Se acompaña a la topografía en el trazado del área a intervenir.

- Se verifica la medida de anchos y cotas de fondo de la limpieza dentro del caño.
- Se realiza seguimiento al control topográfico reportado por el contratista
- Se requiere al contratista para el monitoreo biológico pesquero con los parámetros pesqueros, biológicos y económicos.

Martes 04 de Marzo

- Se realiza el control y seguimiento a la implementación del programa SST
- Se realiza el seguimiento a la actividad de limpieza para recuperación ambiental y perfilamiento de taludes en el frente de obra de Caño Tigre, entre las abscisas K0+120 hasta la abscisa K0+180.
- Se acompaña a la topografía en el trazado del área a intervenir.
- Se verifica la medida de anchos, relación de taludes en 1:1 y cotas de fondo de la limpieza dentro del caño.
- Se realiza seguimiento al control topográfico reportado por el contratista.
- Se acompaña a la labor de ahuyentamiento de un reptil (culebra) que se encontraba en cercanía del área de trabajo.
- Se realiza seguimiento al monitoreo biológico pesquero con los parámetros pesqueros, biológicos y económicos.

Miércoles 05 de Marzo

- Se realiza el control y seguimiento a la implementación del programa SST
- Se realiza el seguimiento a la actividad de limpieza para recuperación ambiental y perfilamiento de taludes en el frente de obra de Caño Tigre, entre las abscisas K0+180 hasta la abscisa K0+240.
- Se acompaña a la topografía en el trazado del área a intervenir.
- Se verifica la medida de anchos, relación de taludes en 1:1 y cotas de fondo de la limpieza dentro del caño.
- Se realiza seguimiento al control topográfico reportado por el contratista.
- Se reporta la presencia abundante de material vegetal (henea), en el frente Caño Grande (PIMSA). Se sugiere al contratista realizar limpieza del área para poder realizar el levantamiento topográfico en este frente de trabajo.
- Se revisan las encuestas de conocimiento local y uso de la fauna silvestre
- Se realiza seguimiento al monitoreo biológico pesquero con los parámetros pesqueros, biológicos y económicos
- Se realiza la formulación del cuarto informe semanal.

6.2. Seguimiento a la Ejecución

Para organizar los avances de obra presentados en los reportes originados se realiza un desglose de la estructura de trabajo y se prorratea en base a la

programación presentada, lo cual arroja un cuadro de flujos que se grafican para proyectar las inversiones programadas en los periodos.

En base a esto en cada periodo se cuantifican las actividades desarrolladas lo cual se afecta con el valor unitario lo que genera el monto real invertido en el periodo. Este dato se compara con el programado generando los reportes de avance

A continuación, se resumen en el cuadro los cálculos realizados:

Item	Nombre de tarea	Unid	Cant	ACUMULADO TOTAL		
				Cant Ejec	Vlr Parcial	%
1	**CAPÍTULO I - RECUPERACION CAÑO PUERTO SABANAGRANDE**				**$ 41.918.991,80**	**11,77%**
1.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	m2	11.060,42	11.060,42	$ 41.918.991,80	100,00%
1.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	m3	8.340,00	0,00	$ -	0,00%
1.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	m3 - km	108.420,00	0,00	$ -	0,00%
2	**CAPÍTULO II - RECUPERACION CAÑO TIGRE**				**$ 112.961.510,00**	**22,46%**
2.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	m2	6.300,00	6.300,00	$ 23.877.000,00	100,00%
2.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	m3	12.166,00	4.286,00	$ 89.084.510,00	35,23%
2.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	m3 - km	173.973,80	0,00	$ -	0,00%
3	**CAPÍTULO III- RECUPERACION CAÑO LUISA**				**$ 39.795.000,00**	**5,53%**
3.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	m2	10.500,00	10.500,00	$ 39.795.000,00	100,00%
3.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	m3	17.250,00	0,00	$ -	0,00%
3.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	m3 - km	246.675,00	0,00	$ -	0,00%
4	**CAPÍTULO IV - RECUPERACION CAÑO CONVENTO**				**$ 81.864.000,00**	**8,93%**
4.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	m2	21.600,00	21.600,00	$ 81.864.000,00	100,00%
4.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	m3	22.146,00	0,00	$ -	0,00%
4.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	m3 - km	287.898,00	0,00	$ -	0,00%
5	**CAPÍTULO V - RECUPERACION CAÑO GRANDE**				**$ -**	**0,00%**
5.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	m2	24.300,00	0,00	$ -	0,00%
5.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	m3	7.570,00	0,00	$ -	0,00%
5.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	m3 - km	167.297,00	0,00	$ -	0,00%
6	**CAPÍTULO VI - LIMPIEZA ESTRUCTURAS HIDRAULICAS**				**$ -**	**0,00%**
6.01	Limpieza para Recuperacion Ambiental	m3	8.540,40	0,00	$ -	0,00%
6.02	Limpieza a Mano de Residuos Sólidos sobre Cauce (Incluye Retiro y Disposicion)	Und	5,00	0,00	$ -	0,00%
6.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	m3 - km	122.127,72	0,00	$ -	0,00%
7	**CAPÍTULO VII - COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL**				**$ 39.881.000,00**	**7,04%**
	Gestión Social				**$ 2.000.000,00**	**16,67%**
7.01	Campaña Radial	Und	1,00	1,00	$ 2.000.000,00	100,00%
7.02	Reuniones informativas con la Comunidad	Und	4,00	0,00	$ -	0,00%
	Educación Ambiental				**$ -**	**0,00%**
7.03	Inducción ambiental a Comunidades	Und	4,00	0,00	$ -	0,00%
7.04	Inducción ambiental a Trabajadores	Und	1,00	0,00	$ -	0,00%
	Fortalecimiento Institucional				**$ -**	**0,00%**
7.05	Socialización del proyecto con organismos y autoridades	Und	2,00	0,00	$ -	0,00%

Item	Nombre de tarea	Unid	Cant	ACUMULADO TOTAL		
				Cant Ejec	Vlr Parcial	%
	Gestión Ambiental				**$ 37.881.000,00**	**6,97%**
	Manejo de emisiones Atmosféricas de material particulado, gases y vapores al aire				**$ -**	**0,00%**
7.06	Monitoreo de partículas de gases PM10 (antes y durante la ejecución del proyecto en dos puntos)	Und	4,00	0,00	$ -	0,00%
	Manejo de niveles de Ruido y Vibración				**$ -**	**0,00%**
7.07	Monitoreo de emisiones de ruido (antes y durante la ejecución del proyecto)	Und	4,00	0,00	$ -	0,00%
	Manejo Ambiental de los Residuos Solidos				**$ 1.800.000,00**	**50,00%**
7.08	Punto ecológico para almacenar residuos solidos	Und	2,00	1,00	$ 1.800.000,00	50,00%
	Manejo Ambiental de los Residuos Líquidos				**$ 2.500.000,00**	**10,03%**
7.09	Alquiler de una (1) cabina sanitaria por cada frente de obra habilitado	Und	2,00	1,00	$ 2.500.000,00	50,00%
7.10	Monitoreo de Parámetros físicos, químicos y biológicos (antes y durante la ejecución del proyecto)	Und	12,00	0,00	$ -	0,00%
	Manejo Ambiental para monitorear los niveles del Hidrosistema				**$ -**	**0,00%**
7.11	Instalacion de miras Hidrologicas	Und	5,00	0,00	$ -	0,00%
	Manejo ambiental de las Migraciones de peces en el sistema de Ciénagas				**$ 6.893.000,00**	**14,29%**
7.12	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	Mes	7,00	1,00	$ 6.893.000,00	14,29%
	Salvamento de Fauna Silvestre				**$ -**	**0,00%**
7,13	Trampas tipo Tomahawk y Sherman. Varas con lazos, ganchos herpetológicos y bolsas plásticas y de tela.	Glb	1,00	0,00	$ -	0,00%
	Recursos Humanos				**$ 26.688.000,00**	**14,29%**
7,14	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	Mes	7,00	1,00	$ 26.688.000,00	14,29%
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 316.420.501,80**	
	ADMINISTRACION (22%)				**$ 69.612.510,40**	
	IMPREVISTOS (3%)				**$ 9.492.615,05**	
	UTILIDAD (5%)				**$ 15.821.025,09**	
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 94.926.150,54**	
	COSTO TOTAL				**$ 411.346.652,34**	8,15&%

Tabla 9 Consolidado de avance de Obra

De acuerdo a lo reportado y evidenciado en campo se tiene un avance de ejecución de 8,15% con respecto a un avance programado de 3,60%; lo que significa que se tiene un margen de 4,55% de adelanto de lo programado. En la imagen que se muestra a continuación se muestra lo citado:

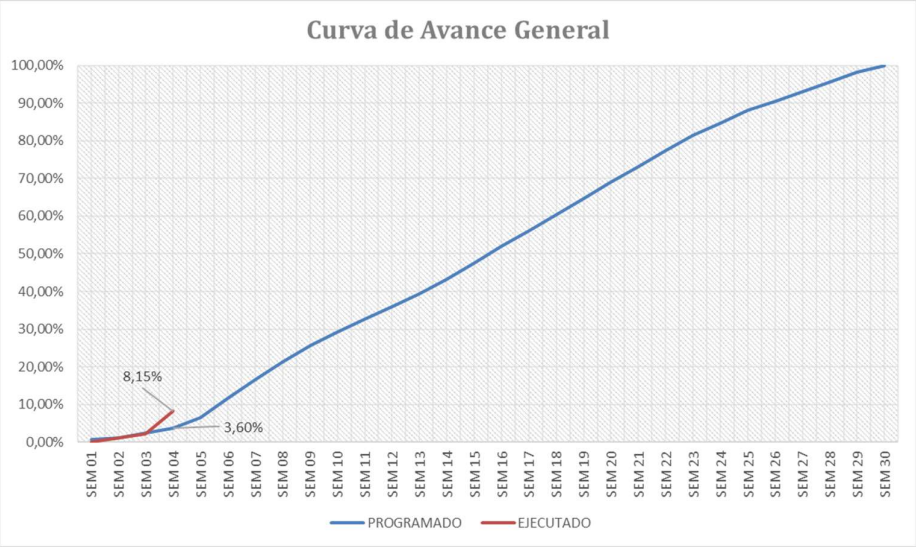


Ilustración 11Curva de Avance

6.3. COMPONENTE SST

El contratista presenta el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) adoptado de uno de los participantes del consorcio el cual es la empresa Transporte Ingeniería Construcciones y Maquinaria S.A. Para lo cual se realizará el seguimiento a todas las políticas, procedimientos, planes y programas definidos en dicho programa.

El personal en seguridad y salud en el trabajo realizó el seguimiento a la documentación enviada por los contratistas. Se realizó también recorrido en obra, inspeccionando las actividades relacionadas se revisaron las planillas de los aportes de seguridad social del personal presentado por el contratista, los preoperativos para la asignación de labores, el uso y mantenimiento de EPP, la señalización en obra.

Durante el periodo se ha realizado charlas preoperativas en campo a los trabajadores, se inspecciona la reglamentación de los EPP y se vigila por el buen uso durante las actividades.

Dentro de las tareas reportadas por nuestro equipo están:

- Seguimiento a la reglamentación de las señales instaladas
- Inspección y seguimiento al uso de elementos de seguridad y respuesta a emergencias.
- Revisión del uso adecuado de los Equipos de Protección Personal (EPP).
- Seguimiento al diligenciamiento de los formatos de inspecciones preoperacionales de equipos
- Seguimiento a los Análisis de Trabajo Seguro (AST)

Durante el periodo se reporta 8 inspecciones a elementos de seguridad en el trabajo y elementos para la atención de emergencias. Al igual que 11 charlas de seguridad dirigidas a los trabajadores en relación a temas pertinentes dentro del área.

CHARLAS SST		
Fecha	**Tema**	**Responsable**
14/02/2025	Políticas de Gestión	Gilary Romero
15/02/2025	Riesgo Público	Gilary Romero
17/02/2025	Orden y aseo en el área de trabajo	Gilary Romero
18/02/2025	Accidente de trabajo	Gilary Romero
19/02/2025	Seguridad Basada en comportamientos	Gilary Romero
21/02/2025	Temperaturas extremas	Gilary Romero
25/02/2025	Manejo de residuos	Gilary Romero
28/02/2025	Seguridad en riesgo vehicular	Gilary Romero
1/03/2025	Protección en cabeza	Gilary Romero
4/03/2025	Salud y protección auditiva de los trabajadores	Gilary Romero
5/03/2025	Preoperacionales y su importancia	Gilary Romero

Ilustración 12 Relación de Charlas de seguridad reportado dentro del informe contratista

Como producto generado se revisaron los formatos presentados por el contratista en cumplimientos de la normatividad en este sector. Se reportan todos los formatos y charlas adelantados por el personal capacitado a los operadores de las maquinarias y personal de campo.

6.4. COMPONENTE SOCIAL

Desde el componente social con actividades integradas, orientadas a fortalecer la interacción y el relacionamiento entre los ciudadanos y las entidades públicas alrededor del diseño, construcción y ejecución de obras, se busca mejorar la calidad de vida de las comunidades, garantizar derechos de la ciudadanía y fomentar el cuidado de lo público. Además, la ejecución del PGS permite identificar las características de los territorios, poblaciones o sectores donde se desarrollan las obras, anticiparse a los impactos negativos de la intervención e influir en la reducción de riesgos, incentivando así la confianza y el control social.

Dentro del PGS se han supervisado los siguientes componentes:

- Programa de información, Atención y Participación a la Comunidad
- Programa de educación ambiental
- Programa de conformación del comité de gestores ambientales
- Programa de reconocimiento de predios
- Programa de contratación de mano obra no calificada

Como mecanismo de integración con la comunidad se ha ubicado un Punto de Atención a la Comunidad (PAC), ubicado en el municipio de Palmar de Varela, en la Calle 11 # 13 – 16, en el Barrio Florencio, con el cual se están atendiendo los requerimientos y solicitudes que emanan de la comunidad. A continuación, se detallan la PQRS gestionadas

REGISTRO DE RECEPCIÓN DE PQRS CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL								
N.CONS	NOMBRE	DIRECCION	FRENTE DE OBRA	FECHA RECEPCIÓN	FECHA DE CIERRE	DESCRIPCION DE LA PQRS	ESTADO DE PQR	
							Abierta	Cerrada
1	Ricardo Cantillo	Lote Caño Tigre	Caño Tigre	19/02/2025	19/02/2025	Daño de cercado de lote de cultivo		1
2	Ricardo Cantillo	Lote Caño Tigre	Caño Tigre	19/02/2025		Daño de cultivo de yuca, guineo y plátano	1	
3	Luis Torres	Lote Caño Tigre	Caño Tigre	19/02/2025		Daño de cultivo de yuca, guineo y plátano	1	
4	Hernan Bolaños	Lote Caño Tigre	Caño Tigre	19/02/2025		Daño de cultivo de yuca, guineo y plátano	1	
5	Pedro Sosa	Lote Caño Tigre	Caño Tigre	19/02/2025		Daño de cultivo de yuca, guineo, papaya y plátano	1	
6								
7								

Ilustración 13 Estado de PQRS Gestionadas

Se han gestionado dos reuniones de ambientación y divulgación del proyecto a las comunidades. Una en la Jurisdicción de Parque Industrial Malambo SA, el 19 de febrero de 2025; y otra en el Municipio de Palmar de Varela 27 de febrero de 2025, con la participación detallada a continuación:

Fecha	Comunidad	Asistentes	Tipo de Reunión
19-02-2025	Puerto PIMSA	14	Socialización Inicial
27-02-2025	Palmar de Varela	46	Socialización Inicial
TOTAL		**60**	

Tabla 10 Relación de reuniones de socialización

Dentro de los protocolos de gestión social se han levantado las actas de vecindad de los predios dentro del área aferente a los caños a intervenir, para lo cual se ha realizado seguimiento y acompañamiento a este proceso. En el periodo se reporta el siguiente balance:

Frente	Actas de Vecindad	Actas de Entorno	Actas de Lote	Total
Caño Puerto de Sabanagrande	14			14
Caño Tigre	9	2	5	16
Caño Luisa	9	2	5	16

Tabla 11 Relación de Documentos formulados

Dentro del programa de información, Atención y Participación a la Comunidad, se reporta la realización de la campaña radial se realizó una emisión radial entre el 15 de febrero al 05 de marzo en la Emisora Oriente Stereo. Durante la transmisión, se explicaron los objetivos del proyecto, las actividades a desarrollar y las medidas adoptadas para minimizar los impactos en la población.

6.5. COMPONENTE AMBIENTAL

Los factores ambientales más sensibles a los cambios introducidos con la ejecución del proyecto son los componentes atmosférico y paisajístico. El

componente atmosférico se afectará en el sector de intervención por la suspensión de material particulado con el desarrollo de actividades que implican las actividades de excavación y rellenos.

El Consorcio Alianza Ambiental propone un Plan de Manejo Ambiental en donde prone las medidas para prevenir, controlar y mitigar los impactos negativos que pudieran generarse durante la ejecución del contrato de obra.

Dentro del control del PMA se deben realizar seguimiento a los programas formulados para el medio abiótico, biótico y socioeconómico, para lo cual se realiza el seguimiento y control de los indicadores de cumplimiento en cada punto. A continuación, se presenta un resumen de las actividades adelantadas en cada programa y en los anexos se detallan los indicadores de cumplimiento

MEDIO	CODIGO	TITULO	ACTIVIDAD
Biótico	FMB 1	Programa de protección y conservación de hábitat	• Durante este periodo se realizó unas charlas al personal de obra sobre como conservar la fauna silvestre, como podemos proteger y conservar el ecosistema. • Se realizo la elaboración de una encuesta de comprensión y/o apropiación hacia la conservación de la fauna silvestres.
	FMB 2	Programa de salvamento de fauna terrestre	• Durante este periodo se realizó unas charlas al personal de obra sobre como conservar la fauna silvestre. • Se realizo el ahuyetamiento y rescate y liberación de fauna local
	FMB 3	Programa de aprovechamiento forestal	• Durante este periodo se realizaron charlas al personal de obra sobre temas de cómo prevenir los daños en la vegetación y como hace un buen uso del suelo.
	FMB 4	Programa de revegetación	• No se reportan actividades
Abiótico	FMB 5	Programa de emisiones atmosféricas de material particulado, gases y vapores de aire	• Durante este periodo se realizaron charlas al personal de obra sobre salud y protección auditiva de los trabajadores. • Se están estableciendo los protocolos de monitoreos de calidad de aire de PM10, se establecerán dos puntos estratégicos de medición, los cuales permitirán obtener una línea base representativa de las condiciones actuales • Se realiza la revisión de la documentación los vehículos y maquinaria (SOAT, Tarjeta, Revisión de emisión de gases)
	FMB 6	Programa de manejo ambiental del recurso suelo	• Durante este periodo se realizaron charlas al personal de obra sobre cómo hacer un buen uso del suelo

MEDIO	CODIGO	TITULO	ACTIVIDAD
			• Se realizó el primer monitoreo de sedimentos para verificar la presencia de metales pesados • Se realizó la instalación de dos puntos ecológico de 55 galones y cabinas de baño • Se realizaron charlas sobre manejo de residuos y manejo y disposición de residuos líquidos con el personal de obra. • Se dispuso de suministro manual con surtidora mecánica a la maquinaria amarilla
	FMB 7	Programa de manejo ambiental del recurso hídrico	• Durante este periodo se realizaron charlas al personal de obra sobre uso racional del agua y energía. • Se dio inicio al primer monitoreo de calidad de agua en 3 puntos de monitoreos ubicados uno en el cuerpo de agua de Ciénaga Manatí en el Municipio de Palmar de Varela, uno en Ciénaga Santo Tomas y uno en Ciénega Sabanagrande
	FMB 8	Programa de manejo ambiental de los residuos sólidos	• Durante este periodo se realizaron charlas al personal de obra sobre manejo de residuos y manejo y disposición de residuos líquidos con el personal de obra • Se realizó la instalación de dos puntos ecológico de 55 galones
	FMB 9	Programa de manejo ambiental de los residuos líquidos	• Durante este periodo se realizó instalación de una cabina de baño en el frente de obra de caño tigre • Se realizó una charla al personal de obra manejo y disposición final de residuos líquidos
	FMB 10	Programa de mitigación de los impactos por tránsito vehicular	• Durante el periodo se realizó una charla sobre la seguridad en riesgo vehicular • Durante este periodo se revisó la documentación de los equipos y vehículos presentes
	FMB 11	Programa de mitigación para el transporte de materiales y equipos	• Para la operación y movilización de maquinaria, equipos y vehículos se utilizó una cama baja para el traslado de los equipos a utilizar en obra, desde la ciudad de Barranquillas hasta el Municipio de Palmar de Varela
	FMB 12	Programa para el manejo de campamentos de obra	• Durante este periodo se realizó la instalación de una carpa como

MEDIO	CODIGO	TITULO	ACTIVIDAD
			campamento en el frente de obra, que cuenta con el punto de emergencia dotado con botiquín, camilla y extintor
Paisajístico	FMB 13	Programa restauración paisajística	• No se reportan actividades
Socioeconómico	FMB 14	Programa de educación ambiental	• No se reportan actividades
	FMB 15	Programa de información y comunicación	• Se instaló el Punto de Atención a la Comunidad en el Municipio de Palmar de Varela en la calle 11 # 13 – 16 en el Barrio Florencia • Se instalo la valla informativa • Se realizaron dos socializaciones • Se atendieron 5 PQRS, las cuales están en tramite solo 1 ha sido cerrada • Se realiza Campaña radial
	FMB 16	Programa de vinculación de mano de obra no calificada	• No se reporta la contratación de mano de obra no calificada. • Solo se contrató personal calificado
	FMB 17	Programa de levantamiento de actas de vecindad	• Se han levantado las actas de vecindad de los predios dentro del área aferente a los caños a intervenir

El tema de los monitoreos es fundamental en el desarrollo de este proyecto para lo cual el contratista dispone de recorridos semanales con los profesionales a cargo, con el objeto de realizar los reportes que se presentan dentro de este documento.

6.5.1. Monitoreo de Calidad del Agua

Se llevaron a cabo las tomas de muestras para los monitoreos de calidad del agua. Estas ubicaciones fueron seleccionadas estratégicamente con el fin de obtener datos representativos sobre las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas del recurso hídrico en el área de estudio. Las coordenadas de los puntos se detallan a continuación:

Estación de Monitoreo	Ubicación	Latitud	Longitud
1	Ciénaga de Sabanagrande	10°47'28"N	74°44'40"W
2	Ciénaga de Santo Tomás	10°45'18"N	74°44'47"W
3	Ciénaga de Palmar de Varela	10°42'58"N	74°44'13"W

Las muestras fueron recolectadas bajo protocolos estandarizados por el Laboratorio para la Industria y el Medio Ambiente (LIMA), entidad debidamente

acreditada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Hasta la fecha, el laboratorio LIMA continúa con la realización de los ensayos correspondientes para la cuantificación de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos previamente mencionados

6.5.2. Monitoreo Biológico Pesquero

Durante el periodo reportado se llevó a cabo una jornada de socialización con los pescadores artesanales de los municipios de Palmar de Varela, Santo Tomás y Sabanagrande, en el departamento del Atlántico, llevada a cabo el 27 de febrero de 2025. La capacitación a los encuestadores se llevó a cabo el 28 de febrero de 2025. Los días 3, 4 y 5 de marzo de 2025 se llevó a cabo la puesta en marcha del monitoreo biológico pesquero con los parámetros pesqueros, biológicos y económicos, con la recolección de los datos de las encuestas realizas se procede a la ejecución de una base de datos para luego ser analizada por el equipo experto.

6.5.3. Manejo de emisiones atmosféricas y niveles de ruido

En el sector se producirá contaminación atmosférica fundamentalmente por partículas sólidas, polvo y gases derivada de la operación de la maquinaria, del tráfico de volquetas y maquinaria pesada. Estos efectos son temporales asociados con el periodo de construcción. Igualmente, en las mismas áreas se producirá contaminación sonora por ruidos como impactos temporales y muy mínimos

El proyecto contempla la implementación de un componente socioambiental con el fin de evaluar y controlar los posibles impactos derivados de su ejecución. Dentro de este plan, se incluye la medición de material particulado PM10 y la evaluación de los niveles de ruido ambiental, considerando tanto la fase previa al inicio de las actividades constructivas como su desarrollo. A cierre del presente informe solo se han identificado dos puntos estratégicos de medición, los cuales permitirán obtener una línea base, lo cual debe ser avalado por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) considerando criterios técnicos y normativos que garanticen la representatividad de los datos obtenidos.

6.5.4. Manejo Ambiental para el monitoreo de los niveles del hidrosistema

Se definió como parte del componente ambiental del proyecto la instalación de cinco (5) miras hidrológicas en puntos estratégicos. Actualmente, el Consorcio Alianza Ambiental se encuentra en la fase de adquisición de los dispositivos, garantizando que cumplan con los estándares técnicos requeridos. Una vez

completado el proceso de compra, se procederá con la instalación de las miras en los puntos establecidos por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA)

6.5.5. Manejo de Residuos

En cumplimiento con estas disposiciones, el Consorcio Alianza Ambiental llevó a cabo la instalación de un (1) punto ecológico en el frente de trabajo ubicado en Caño Tigre, asegurando la correcta segregación y almacenamiento de los residuos sólidos generados en la zona. Adicionalmente, se dispuso una (1) cabina sanitaria en este mismo frente de obra, garantizando el acceso a servicios sanitarios adecuados para los trabajadores y reduciendo el impacto ambiental derivado de la actividad constructiva

6.5.6. Salvamento de Fauna Silvestre

Como áreas de ecosistemas ambientalmente críticas, en el sector no se encuentra ningún ecosistema que sea necesario dañar para llevar a cabo las actividades del proyecto. No existirán áreas de ecosistemas ambientalmente críticos, por la creación de escombreras ya que las mismas no existirán.

La eliminación o alteración de hábitats vegetales terrestres para la fauna, así como desplazamientos o concentración de especies o individuos motivados por la ejecución del proyecto y cambios en las pautas de comportamiento de la fauna por perturbaciones causadas por el tráfico de volquetas y maquinaria pesada, serán impactos transitorios y de carácter moderado

Para la correcta ejecución de este programa, se definió la adquisición de una serie de insumos especializados que permitirán el manejo seguro y eficiente de los individuos capturados. Dentro de estos insumos se incluyen: dos (2) trampas tipo Tomahawk y dos (2) trampas tipo Sherman, diseñadas para la captura controlada de mamíferos y pequeños roedores; seis (6) varas con lazos y cinco (5) ganchos herpetológicos, herramientas utilizadas para la manipulación segura de reptiles; además de doscientas (200) bolsas plásticas y doscientas (200) bolsas de tela, destinadas al almacenamiento temporal y transporte adecuado de los ejemplares rescatados. Actualmente, El consorcio alianza ambiental se encuentra en proceso de adquisición de estos insumos; a la fecha se ha realizado actividades de ahuyentamiento de especies en el frente de trabajo de Caño Tigre, con la finalidad de prever cualquier afectación durante las actividades constructivas.

6.5.7. Educación Ambiental

El programa contempla la realización de cuatro (4) jornadas de capacitación dirigidas a la comunidad y una (1) jornada de capacitación para el equipo de trabajo. Estas jornadas se estructurarán con metodologías participativas, asegurando una mayor apropiación del conocimiento y fomentando el compromiso activo de los asistentes.

Actualmente, el Consorcio Alianza Ambiental se encuentra en la fase de planificación y logística para la ejecución de las primeras jornadas de capacitación, las cuales están programadas para llevarse a cabo en el mes de marzo de 2025

6.6. Pagos Realizados al Contratita

Hasta el corte del presente informe no se ha realizado pagos al contratista lo cual se resume en el siguiente cuadro

INFORME FINANIERO					
Valor total del contrato			$ 5 049.740.412,34	100%	
Anticipo			N/A	0%	
Concepto	Valor Acta	%	Valor neto recibido	Fecha de pago	Estado
TOTAL				**-**	**-**

Tabla 12 Tabla de Pagos al Contratista

7. CONCLUSIONES

Durante el periodo reportado la interventoría ha realizado el seguimiento y control del proyecto ejecutado por el Consorcio Alianza Ambiental, para lo cual ha evaluado y requerido al contratista en la incorporación del personal de base para la ejecución de las actividades y en la planificación del plan de acción de los componentes Socioambientales. Se evaluó y avalo la programación inicial no superando el termino contractual y de acuerdo la gestión de seguimiento y control para este periodo se reporta un avance de obra del 8,15%, el cual contrarrestado con la programación vigente de 3,60%; arroja un margen de 4,55% de avance de obras.

Durante el periodo se le ha realizado el seguimiento y control obras de relimpia en sección trapezoidal sobre el caño Tigre en una longitud de 240 Ml sobre el trazo del caño, empezando desde el encuentro del caño con el Rio Magdalena. Se está revisando la conformación de los taludes en proporción de 1:1 de acuerdo a los planos de diseño. Se reporta que de acuerdo a la dinámica hídrica se está presentando acceso de aguas del rio magdalena sobre el caño, lo que

ha dificultado las operaciones de la limpieza del canal, para lo cual se ha recomendado al contratista de realizar programaciones de actividades para 50 Ml lineales de canal y empezando en el sentido de aguas arriba hacia aguas abajo; de esta manera se trabaja en seco hasta que se empalme con la sección de canal ya conformada.

Se ha requerido al contratista en la implementación de los programas tendientes a los monitoreos Ambientales en apremio al inicio de las obras sobre todo en la etapa de las condiciones antes de las actividades.

Se ha requerido al contratista en cumplir en lo que más se pueda con los parámetros que contempla la licencia ambiental para los monitoreos Biológicos Pesqueros en lo atañe al presupuesto de obra y alcance del proyecto.

Se reportan condiciones de verano del primer trimestre del año, aunque se le ha reportado al contratista de los boletines de condiciones climáticas reportados por el IDEAM para que este previsto de las condiciones de lluvias pronosticadas en el primer semestre del año.

En los caños tigre y Luisa se han encontrado los cauces totalmente sedimentados y colmatados con vegetación propia de la zona, para lo cual se han tenido que realizar jornadas de retiro de vegetación antes de la etapa de limpieza del caño. Esta situación esta dando como resultado que los movimientos de masa de estos frentes sean mayores a los considerados inicialmente. Se ha requerido al contratista en la consolidación de las topografías de todos los frentes a fin de evaluar y realizar el primer balance real de las obras proyectadas.

Por otro lado, los Frentes Caño Sabanagrande, Convento y Caño Grande presentan lámina de agua en sus cauces para lo cual se requiere al contratista en la elaboración de un plan de acción teniendo en cuenta estas consideraciones y determinar la maquinaria apropiada para realizar su limpieza.

Se está realizando un seguimiento mensual al cumplimiento de las medidas de manejo ambiental definidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto, constatando que el contratista cumpla con lo estipulado en el PMA, para lo cual se muestran los indicadores de cumplimiento,

En lo referente al programa de seguridad en el trabajo se están llevando a cabo las inspecciones y seguimiento a interventoría supervisó la implementación del programa adoptado verificando que el contratista vele por las medidas para garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores. Algunas de estas medidas verificadas son la señalización de los frentes de obra, la designación de un punto de encuentro, la instalación de cabinas sanitarias. Además, se realizaron charlas de seguridad, se verifica el uso de las dotaciones al personal y se realizaron inspecciones para asegurar el uso adecuado de los equipos de

protección. También se verificó el diligenciamiento de los formatos y la realización de inspecciones preoperacionales de los equipos.

8. ANEXOS

- Informes Semanales
- Registro Fotográfico
- Bitácora de Obra
- Seguimiento al PMA
- Seguimiento al plan de gestión Social
- Seguimiento a programa de SST
- Soportes de Seguridad Social
- Planos y Carteras topografías
- Plano de Seguimiento a la ejecución

- Informes Semanales

CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S. Nit. 901.427.201-6	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	jueves, 13 de febrero de 2025	**PERIODO No.**	1	DEL	**6/02/2025**	AL	**12/02/2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL PROYECTO DE REGULACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CIÉNAGAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 293 DEL 2017".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIOS DE MALAMBO, SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	0496 DE 2024	CONTRATO No.:	0493 DE 2024
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SIETE (07) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SIETE (07) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	6 de febrero de 2025	FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	6 de febrero de 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de septiembre de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de septiembre de 2025
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	3 de septiembre de 2025	PLAZO ACTUALIZADO:	3 de septiembre de 2025
PLAZO TRANSCURRIDO:	7 EQUIVALE AL 0,02%	PLAZO TRANSCURRIDO:	7 EQUIVALE AL 0,02%
VALOR INICIAL :	$ 377.999.998,00	VALOR INICIAL :	$ 5.049.740.412,34
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 377.999.998,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 5.049.740.412,34
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 377.999.998,00	VALOR POR PAGAR:	$ 5.049.740.412,34
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE SAS

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)**	06/02/2025	06/02/2025	-
2	**CAPÍTULO I - RECUPERACION CAÑO PUERTO SABANAGRANDE**	26/04/2025		No Iniciado
3	Localizacion, Trazado y Replanteo	07/03/2025		No Iniciado
4	Limpieza para Recuperacion Ambiental	21/04/2025		No Iniciado
5	Retiro y Disposicion Final de Residuos	26/04/2025		No Iniciado
6	**CAPÍTULO II - RECUPERACION CAÑO TIGRE**	06/05/2025		No Iniciado
7	Localizacion, Trazado y Replanteo	07/03/2025		No Iniciado
8	Limpieza para Recuperacion Ambiental	01/05/2025		No Iniciado
9	Retiro y Disposicion Final de Residuos	06/05/2025		No Iniciado
10	**CAPÍTULO III- RECUPERACION CAÑO LUISA**	20/07/2025		No Iniciado
11	Localizacion, Trazado y Replanteo	22/03/2025		No Iniciado
12	Limpieza para Recuperacion Ambiental	15/07/2025		No Iniciado
13	Retiro y Disposicion Final de Residuos	20/07/2025		No Iniciado
14	**CAPÍTULO IV - RECUPERACION CAÑO CONVENTO**	30/07/2025		No Iniciado
15	Localizacion, Trazado y Replanteo	22/03/2025		No Iniciado
16	Limpieza para Recuperacion Ambiental	25/07/2025		No Iniciado
17	Retiro y Disposicion Final de Residuos	30/07/2025		No Iniciado
18	**CAPÍTULO V - RECUPERACION CAÑO GRANDE**	03/09/2025		No Iniciado
19	Localizacion, Trazado y Replanteo	06/04/2025		No Iniciado
20	Limpieza para Recuperacion Ambiental	29/08/2025		No Iniciado
21	Retiro y Disposicion Final de Residuos	03/09/2025		No Iniciado
22	**CAPÍTULO VI - LIMPIEZA ESTRUCTURAS HIDRAULICAS**	01/09/2025		No Iniciado
23	Limpieza para Recuperacion Ambiental	27/08/2025		No Iniciado
24	Limpieza a Mano de Residuos Sólidos sobre Cauce (Incluye Retiro y Disposicion)	26/05/2025		No Iniciado
25	Retiro y Disposicion Final de Residuos	01/09/2025		No Iniciado
26	**CAPÍTULO VII - COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL**	03/09/2025		No Iniciado
27	**Gestión Social**	20/02/2025		No Iniciado
28	Campaña Radial	12/02/2025		No Iniciado
29	Reuniones informativas con la Comunidad	20/02/2025		No Iniciado
30	**Educación Ambiental**	05/06/2025		No Iniciado
31	Inducción ambiental a Comunidades	05/06/2025		No Iniciado
32	Inducción ambiental a Trabajadores	10/03/2025		No Iniciado
33	**Fortalecimiento Institucional**	29/08/2025		No Iniciado
34	Socialización del proyecto con organismos y autoridades	29/08/2025		No Iniciado
35	**Gestión Ambiental**	03/09/2025		No Iniciado
36	**Manejo de emisiones Atmosféricas de material particulado, gases y vapores al aire**	03/09/2025		No Iniciado
37	Monitoreo de partículas de gases PM10 (antes y durante la ejecución del proyecto en dos puntos)	03/09/2025		No Iniciado
38	**Manejo de niveles de Ruido y Vibración**	03/09/2025		No Iniciado
39	Monitoreo de emisiones de ruido (antes y durante la ejecución del proyecto)	03/09/2025		No Iniciado
40	**Manejo Ambiental de los Residuos Solidos**	03/09/2025		No Iniciado
41	Punto ecológico para almacenar residuos solidos	03/09/2025		No Iniciado
42	**Manejo Ambiental de los Residuos Líquidos**	03/09/2025		No Iniciado
43	Alquiler de una (1) cabina sanitaria por cada frente de obra habilitado	03/09/2025		No Iniciado
44	Monitoreo de Parámetros físicos, químicos y biológicos (antes y durante la ejecución del proyecto)	03/09/2025		No Iniciado
45	**Manejo Ambiental para monitorear los niveles del Hidrosistema**	01/09/2025		No Iniciado
46	Instalacion de miras Hidrologicas	01/09/2025		No Iniciado
47	**Manejo ambiental de las Migraciones de peces en el sistema de Ciénagas**	03/09/2025		No Iniciado
48	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	03/09/2025		No Iniciado
49	**Salvamento de Fauna Silvestre**	01/09/2025		No Iniciado
50	Trampas tipo Tomahawk y Sherman. Varas con lazos, ganchos herpetológicos y bolsas plásticas y de tela.	01/09/2025		No Iniciado
51	**Recursos Humanos**	03/09/2025		No Iniciado
52	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	03/09/2025		No Iniciado
53	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**	03/09/2025		No Iniciado
Plazo del proyecto en días		209		

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos (capitulos de obra). Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 31.598.103,34	0,63%	-0,48%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 7.390.500,00	0,15%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S. Nit. 901.427.201-6	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	jueves, 13 de febrero de 2025	PERIODO No.	1	DEL	6/02/2025	AL	12/02/2025

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros.

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Durante la presente semana el contratista reporta actividades administrativas de organización y sobordinacion del equipo para atender las labores en campo de ejecucion del proyecto. Se realizo reunion con la interventoria exponiendo el alcance y el plan de accion a tomar. Se presentaron para evaluacion las hojas de vida del equipo a conformar. En campo se desarrollaron tareas de sobrevuelo con Drone Phanton 4 equipado con camara para evidenciar el estado inical del los tramos a intervenir en los caños Puerto SabanaGrande, Caño Tigre, Caño Luisa y Caño Convento.

En la parte social se adelanto la conformacion de las actas de vecindad para la apertura de las obras.

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Viernes 7 de Febrero realiza la reunion con la Interventoria previa al inicio de las obras.

Lunes 10 de Febrero Se hace entrega pro parte del contratista a la interventoria de la documentacion y soportes de los integrantes del equipo encargado del desarrollo del proyecto

Martes 11 de Frebrero se hace entrega de la documentacion previa al inicio, APU, presupuesto, Programacion de obra, relacion de equipos con soportes y Plan de calidad. Se realiza sobrevuelo en dron de los

Miercoles 12 de Febrero se inicia la apertura de las actas de vecindad previo al inicio de las actividades en el puerto SabanaGrande



7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Reunion Previa al Inicio de las obras



Actividades de Sobrevuelo con Drone



Actividades de Sobrevuelo con Drone



Actividades de apertura de actas de vecindad en Caño Puerto SabanaGrande

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: GUSTAVO RAFAEL CASTELLAR ARRIETA - ING RESIDENTE

CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S. Nit. 901.427.201-6	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	jueves, 20 de febrero de 2025	**PERIODO No.**	2	DEL	**13/02/2025**	AL	**19/02/2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL PROYECTO DE REGULACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CIÉNAGAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 293 DEL 2017".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIOS DE MALAMBO, SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	0496 DE 2024	CONTRATO No.:	0493 DE 2024
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SIETE (07) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SIETE (07) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	6 de febrero de 2025	FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	6 de febrero de 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de septiembre de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de septiembre de 2025
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	3 de septiembre de 2025	PLAZO ACTUALIZADO:	3 de septiembre de 2025
PLAZO TRANSCURRIDO:	14 EQUIVALE AL 0,03%	PLAZO TRANSCURRIDO:	14 EQUIVALE AL 0,03%
VALOR INICIAL :	$ 377.999.998,00	VALOR INICIAL :	$ 5.049.740.412,34
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 377.999.998,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 5.049.740.412,34
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 377.999.998,00	VALOR POR PAGAR:	$ 5.049.740.412,34
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE SAS

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)**	06/02/2025	06/02/2025	-
2	**CAPÍTULO I - RECUPERACION CAÑO PUERTO SABANAGRANDE**	26/04/2025		
3	Localizacion, Trazado y Replanteo	07/03/2025		
4	Limpieza para Recuperacion Ambiental	21/04/2025		
5	Retiro y Disposicion Final de Residuos	26/04/2025		
6	**CAPÍTULO II - RECUPERACION CAÑO TIGRE**	06/05/2025		
7	Localizacion, Trazado y Replanteo	07/03/2025	19/02/2025	
8	Limpieza para Recuperacion Ambiental	01/05/2025		
9	Retiro y Disposicion Final de Residuos	06/05/2025		
10	**CAPÍTULO III- RECUPERACION CAÑO LUISA**	20/07/2025		
11	Localizacion, Trazado y Replanteo	22/03/2025		
12	Limpieza para Recuperacion Ambiental	15/07/2025		
13	Retiro y Disposicion Final de Residuos	20/07/2025		
14	**CAPÍTULO IV - RECUPERACION CAÑO CONVENTO**	30/07/2025		
15	Localizacion, Trazado y Replanteo	22/03/2025		
16	Limpieza para Recuperacion Ambiental	25/07/2025		
17	Retiro y Disposicion Final de Residuos	30/07/2025		
18	**CAPÍTULO V - RECUPERACION CAÑO GRANDE**	03/09/2025		
19	Localizacion, Trazado y Replanteo	06/04/2025		
20	Limpieza para Recuperacion Ambiental	29/08/2025		
21	Retiro y Disposicion Final de Residuos	03/09/2025		
22	**CAPÍTULO VI - LIMPIEZA ESTRUCTURAS HIDRAULICAS**	01/09/2025		
23	Limpieza para Recuperacion Ambiental	27/08/2025		
24	Limpieza a Mano de Residuos Sólidos sobre Cauce (Incluye Retiro y Disposicion)	26/05/2025		
25	Retiro y Disposicion Final de Residuos	01/09/2025		
26	**CAPÍTULO VII - COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL**	03/09/2025		
27	**Gestión Social**	20/02/2025		
28	Campaña Radial	12/02/2025		
29	Reuniones informativas con la Comunidad	20/02/2025		
30	**Educación Ambiental**	05/06/2025		
31	Inducción ambiental a Comunidades	05/06/2025		
32	Inducción ambiental a Trabajadores	10/03/2025		
33	**Fortalecimiento Institucional**	29/08/2025		
34	Socialización del proyecto con organismos y autoridades	29/08/2025		
35	**Gestión Ambiental**	03/09/2025		
36	**Manejo de emisiones Atmosféricas de material particulado, gases y vapores al aire**	03/09/2025		
37	Monitoreo de partículas de gases PM10 (antes y durante la ejecución del proyecto en dos puntos)	03/09/2025		
38	**Manejo de niveles de Ruido y Vibración**	03/09/2025		
39	Monitoreo de emisiones de ruido (antes y durante la ejecución del proyecto)	03/09/2025		
40	**Manejo Ambiental de los Residuos Solidos**	03/09/2025		
41	Punto ecológico para almacenar residuos solidos	03/09/2025		
42	**Manejo Ambiental de los Residuos Líquidos**	03/09/2025		
43	Alquiler de una (1) cabina sanitaria por cada frente de obra habilitado	03/09/2025		
44	Monitoreo de Parámetros físicos, químicos y biológicos (antes y durante la ejecución del proyecto)	03/09/2025		
45	**Manejo Ambiental para monitorear los niveles del Hidrosistema**	01/09/2025		
46	Instalacion de miras Hidrologicas	01/09/2025		
47	**Manejo ambiental de las Migraciones de peces en el sistema de Ciénagas**	03/09/2025		
48	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	03/09/2025		
49	**Salvamento de Fauna Silvestre**	01/09/2025		
50	Trampas tipo Tomahawk y Sherman. Varas con lazos, ganchos herpetológicos y bolsas plásticas y de tela.	01/09/2025		
51	**Recursos Humanos**	03/09/2025		
52	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	03/09/2025		
53	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**	03/09/2025		
Plazo del proyecto en días		209		

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos (capitulos de obra). Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 60.743.277,39	1,20%	-0,09%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 56.101.741,43	1,11%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S. Nit. 901.427.201-6	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	jueves, 20 de febrero de 2025	PERIODO No.	2	DEL	13/02/2025	AL	19/02/2025

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros.

El contrato se encuentra en ejecucion, no se reportan lluvias en la region por lo que sigue el tiempo caracteristico del primer trimestre del año, operativamnete se ejecutan actividades en Palmar de Varela en Caño trigre con el movimiento de la maquinaria la frente de obra, la adecuacion de la zona de labores para movimiento y acopio de materiales, los prelimnares de topografia con el sobrevuelo de drone- En Sabangrande con la gestion social de actas de vecindad en CañonPuerto de Sabanagrande

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Durante la presnte semana el contratista reporta actividades de levantamiento topografico con Tecnologia GPS RTK con dos antenas una fija y otra movil, Rover, para establecer las curvas de nivel del terreno, en el caño Tigre del municipio de Palmar de Varela, al tiempo se continua con el lavntamiento de las actas de vecidad en los predios aferentes al Caño Puerto de SabanaGrande y se comienza las labores de limpieza para la recuperacion ambiental en el Caño tigre con la preracion del terreno que sevira como pista de operaciones para la maquinaria y los vehiculos tipo volquetas que retiraran el material al sitio de disposicion final

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Jueves 13 de febrero se realiza recorrido de inspeccion en el Caño Tigre y Luisa de Palmar de Varela, en conjunto con la comision topografica con el fin de inspeccionar la diponibilada de recursos para el acceso, rutas para la entrada de la maquinaria y tiempos de recorrido. esto con el fin reportarindicadores de rendimientos a la logistica de las operaciones

Viernes 14 de Febrero se realiza el movimiento de la maquinaria al frente de obra en el caño Tigre, previendo el incio delas actividades; seguido se realiza una faena de retiro de malezas (desmonte) del curso que en campo se tiene del cauce del caño con el objetivo de despejar el luagra de los obstaculos para realizar la labor de toma de puntos con el GPS RTK para la obtencion de secciones y volumenes del proyecto.

Sabado 15 de Febrero reliza el levantamiento con GPS RTK de 900 ML del cauce en el Caño Tigre de Plamar de Varela, inciando en el K0+000 que es el encuentro del caño con el Rio Magdalena y terminando en el K0+900 hacia el encuentro con la cienaga de Palmar. Como parte del componente socioambiental se coloca la Valla Inofrmativa en Palmar de Varela sobre la via oriental

Lunes 17 de Febrero Se realiza sobrevuelo con done en los 5 frente en los municipios de Palmar en Caño togre, en el municpio de Santo Tomas en Caño Luisa, en el municpio de Sabanagrande en Caño Puerto y Caño Convento y en Caño grnade en el area de PIMSA, y se da inicio a las actividades de conofrmacion y adecuacion del sitio para operaciones de maquinaria en caño Tigre entre las abscisas K0+000 al K0+030

Martes 18 de Febrero Continuan las actividades de adecuaciones de terreno en caño Tigre para las operaciones de maquinaria, acopio de material para retiro y repaleo de material entre las abscisas K0+030 al K0+060, la maquinaria empleada es una retroexcavdora Hitachi EX200

Miercoles 19 de Febrero Continuan las actividades de adecuaciones de terreno en caño Tigre para las operaciones de maquinaria, acopio de material para retiro y repaleo de material entre las abscisas K0+030 al K0+060, la maquinaria empleada es una retroexcavdora Hitachi EX200. Al minso tiempo se reporta la primera jornada de socializacion con pescadores y personal de la zona portuaria de PIMSA en jurisdicion de Sabanagrande, con el objeto de dar a conocer el alcance del proyecto

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Evidencia de la instalacion de la Valla



Sobrevuelo con Drone en Cano Puerto de Sabanagrande



Adecuaciones de tereno para operaciones en Caño Tigre K0+030



Adecuaciones de tereno para operaciones en Caño Tigre K0+030



Adecuaciones de tereno para operaciones en Caño Tigre K0+020



Adecuacion de una pista para trabajo en K0+020 Caño Tigre



Reunion informativa en Pimsa Caño Grande



Reunion informativa en Pimsa Caño Grande

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: Manuel Rodriguez Gomez - Director de Interventoria

CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S. Nit. 901.427.201-6	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	jueves, 27 de febrero de 2025	**PERIODO No.**	3	DEL	**20/02/2025**	AL	**26/02/2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL PROYECTO DE REGULACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CIÉNAGAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 293 DEL 2017".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIOS DE MALAMBO, SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	0496 DE 2024	CONTRATO No.:	0493 DE 2024
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SIETE (07) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SIETE (07) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	6 de febrero de 2025	FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	6 de febrero de 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de septiembre de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de septiembre de 2025
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	3 de septiembre de 2025	PLAZO ACTUALIZADO:	3 de septiembre de 2025
PLAZO TRANSCURRIDO:	21 EQUIVALE AL 0,05%	PLAZO TRANSCURRIDO:	21 EQUIVALE AL 0,05%
VALOR INICIAL :	$ 377.999.998,00	VALOR INICIAL :	$ 5.049.740.412,34
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 377.999.998,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 5.049.740.412,34
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 377.999.998,00	VALOR POR PAGAR:	$ 5.049.740.412,34
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE SAS

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)**	06/02/2025	06/02/2025	-
2	**CAPÍTULO I - RECUPERACION CAÑO PUERTO SABANAGRANDE**	26/04/2025		
3	Localizacion, Trazado y Replanteo	07/03/2025		
4	Limpieza para Recuperacion Ambiental	21/04/2025		
5	Retiro y Disposicion Final de Residuos	26/04/2025		
6	**CAPÍTULO II - RECUPERACION CAÑO TIGRE**	06/05/2025		
7	Localizacion, Trazado y Replanteo	07/03/2025	19/02/2025	
8	Limpieza para Recuperacion Ambiental	01/05/2025		
9	Retiro y Disposicion Final de Residuos	06/05/2025		
10	**CAPÍTULO III- RECUPERACION CAÑO LUISA**	20/07/2025		
11	Localizacion, Trazado y Replanteo	22/03/2025		
12	Limpieza para Recuperacion Ambiental	15/07/2025		
13	Retiro y Disposicion Final de Residuos	20/07/2025		
14	**CAPÍTULO IV - RECUPERACION CAÑO CONVENTO**	30/07/2025		
15	Localizacion, Trazado y Replanteo	22/03/2025		
16	Limpieza para Recuperacion Ambiental	25/07/2025		
17	Retiro y Disposicion Final de Residuos	30/07/2025		
18	**CAPÍTULO V - RECUPERACION CAÑO GRANDE**	03/09/2025		
19	Localizacion, Trazado y Replanteo	06/04/2025		
20	Limpieza para Recuperacion Ambiental	29/08/2025		
21	Retiro y Disposicion Final de Residuos	03/09/2025		
22	**CAPÍTULO VI - LIMPIEZA ESTRUCTURAS HIDRAULICAS**	01/09/2025		
23	Limpieza para Recuperacion Ambiental	27/08/2025		
24	Limpieza a Mano de Residuos Sólidos sobre Cauce (Incluye Retiro y Disposicion)	26/05/2025		
25	Retiro y Disposicion Final de Residuos	01/09/2025		
26	**CAPÍTULO VII - COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL**	03/09/2025		
27	**Gestión Social**	20/02/2025		
28	Campaña Radial	12/02/2025		
29	Reuniones informativas con la Comunidad	20/02/2025		
30	**Educación Ambiental**	05/06/2025		
31	Inducción ambiental a Comunidades	05/06/2025		
32	Inducción ambiental a Trabajadores	10/03/2025		
33	**Fortalecimiento Institucional**	29/08/2025		
34	Socialización del proyecto con organismos y autoridades	29/08/2025		
35	**Gestión Ambiental**	03/09/2025		
36	**Manejo de emisiones Atmosféricas de material particulado, gases y vapores al aire**	03/09/2025		
37	Monitoreo de partículas de gases PM10 (antes y durante la ejecución del proyecto en dos puntos)	03/09/2025		
38	**Manejo de niveles de Ruido y Vibración**	03/09/2025		
39	Monitoreo de emisiones de ruido (antes y durante la ejecución del proyecto)	03/09/2025		
40	**Manejo Ambiental de los Residuos Solidos**	03/09/2025		
41	Punto ecológico para almacenar residuos solidos	03/09/2025		
42	**Manejo Ambiental de los Residuos Líquidos**	03/09/2025		
43	Alquiler de una (1) cabina sanitaria por cada frente de obra habilitado	03/09/2025		
44	Monitoreo de Parámetros físicos, químicos y biológicos (antes y durante la ejecución del proyecto)	03/09/2025		
45	**Manejo Ambiental para monitorear los niveles del Hidrosistema**	01/09/2025		
46	Instalacion de miras Hidrologicas	01/09/2025		
47	**Manejo ambiental de las Migraciones de peces en el sistema de Ciénagas**	03/09/2025		
48	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	03/09/2025		
49	**Salvamento de Fauna Silvestre**	01/09/2025		
50	Trampas tipo Tomahawk y Sherman. Varas con lazos, ganchos herpetológicos y bolsas plásticas y de tela.	01/09/2025		
51	**Recursos Humanos**	03/09/2025		
52	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	03/09/2025		
53	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**	03/09/2025		
Plazo del proyecto en días		209		

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos (capitulos de obra). Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 118.902.367,18	2,35%	-0,11%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 113.163.808,09	2,24%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S. Nit. 901.427.201-6	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	jueves, 27 de febrero de 2025	PERIODO No.	3	DEL	20/02/2025	AL	26/02/2025

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros.

El contrato se encuentra en ejecucion, no se reportan lluvias en la region por lo que sigue el teimpon seco con algunas nuvosidades pero sin lluvias hasta el momento, se estan desarrollando actividades de gestion social y ambiental principalmente en los frentes de Sabanagrande, Caño Puerto de Sabanagrande y Caño Convento y en el municipio de Palmar de Varela Caño Tigre. Las activiades desarroldas son el monitoreo de la calida del agua en los cuerpos hidricos de Santo Tomas, Palmar de Varela y Sabangrande y el levantamiento de actas de vecindad en Sabanagrande y Palmar de Varela

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Durante la presente semana el contratista realiza trabajo administrativo en lo pertinente a la gestion Socio ambiental; por un lado se pretende consolidar los protocologos y gestion de los monitoreos de control ambinetal que se realizaran antes y durante la ejecucion del proyecto, y por otro lado se continuan las labores sociales de levantamiento de actas de vecindad en los frentes de Sabanagrande y Palmar de Varela. Esta actividades son indispensables para blindar tanto al contratista como la entidad de posibles reclamaciones y de que la comunidad se le garantice la calidad de los trabajos y la reparacion de daños colaterales. Las actividades se concentran en los municipio de Sabanagrande, en el frente Puerto Sabangrande y Covento y en el municpio de Plamar en el Frente Caño Tigre, en uso de los profesionales de trabajo social, ing residente, y la comision topografica

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Jueves 20 de febrero Se entrega por parte del contratista la informacion del sobrevuelo con Drone, Esta informacion es el insumo de la linea base del antes del proyecto en los frentes de obra; el protocolo a seguir es analizar la informacion y hacer la entrega a la entidad para su documentacion, lo cual se realizara en lo transcurrido de la semana

Viernes 21 de Febrero Se continua con el levantamiento de las actas de vecindad en el area de Caño Puerto Sabanagrande, en la jornada se levantaron 14 actas de vecindad de los locales al margen del caño y en el costado de la via al puerto; al tiempo se iniciaron los monitoreo de calidad de agua antes del inicio de los trabajos, el laboratorio responsable de este procedimeitno en LIMA SAS Servicios Ambientales y los sitios escogidos para esta primera toma son las desembocaduras de los caños con el Rio Magdalena en los Municiios de Plamar de Varela, Santo Tomas y Sabanagrande, para lo cual se utilizo un bote con motro fuera de borda. Dentro de los parametros a medir estan: Temperatura, Conductividad, Oxígeno Disuelto, PH, Sólidos Suspendidos Totales, Demanda Biológica de Oxigeno (DBO5), Demanda Química de Oxigeno (DQO), Coliforme termotolerantes y Coliformes totales

Sabado 22 de Febrero se continua con la adecuacion de vias de acceso a caño tigre, con el reapleo de material para acopio y con la conofrmacion de la písta para el acceso y maniobra de los vehiculo tipo volquetas, esta operación se realizo en la abscisa K 0+067 y en la K 0+073 al costado del caño

Lunes 24 de Febrero En esta jornada el contratista reporta adtividades adminitrativas planeacion de recorridos y monitoreso para gestion ambiental, al igual que el acercamiento a los comites mas representativos en Palmar para el tema de la socilizacion, que se proyecta para el 27/02/2025, por otro lado se continua levantamiento actas de vecindad en Sabanagrande, en los locales del puerto, en total en la jornado se levantaron 5 actas de vecindad

Martes 25 de Febrero En el dia de hoy se realiza Reunion CRA con la presencia de la supervision de la CRA, Contratista e Interventoria, con el objeto de presentar los lineamientos para la gestion social, el inicio de los monitoreos y tratar otros temas para el buen desarrollo del proyecto. Como resultado se aclararon temas de gestion documental para su presentación, se aclaro alcance de las socializaciones y los protocolos de los monitoreos

Miercoles 19 de Febrero Por parte de la interventoria se realizo recorrido de control de topografia en caño Tigre con el fin de verificar secciones de diseño, se utilizo un GPS GNSS Kolida K5 con dos Estaciones, este proceso se realizo en todo el cauce del cañom es decir entre las abscisas K 0+000 encuentro de caño con el rio y la Abscisa K 0+900 hacia la cienaga; Por parte del contratista reporta el levantamiento de 3 actas de vecinda a predios en Caño Convento. Al tiempo se realiza acercamientos e invitacion para la socializacion en el Municipio de Palamr de Varela por parte del equipo Social, la cual se programo para el 27/02/2025

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Monitoreo de calidad del Agua en Puerto Sabanagrande



Monitoreo de calidad del agua en PIMSA



Toma de muestra de agua para examanes en laboratorio



Control topografico de Intervenoria en Caño Tigre K0+067



Control topografico de Intervenoria en Caño Tigre K0+000



Control topografico de Intervenoria en Caño Tigre K0+270



Panoramica del Drone en Caño Tigre



Panoramica del Drone en Caño Luisa



Panoramica del Drone en Caño Puerto Sabangrande

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: Manuel Rodriguez Gomez - Director de Interventoria

CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S. Nit. 901.427.201-6	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	jueves, 6 de marzo de 2025	**PERIODO No.**	4	DEL	**27/02/2025**	AL	**5/03/2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL PROYECTO DE REGULACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CIÉNAGAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 293 DEL 2017".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIOS DE MALAMBO, SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	0496 DE 2024	CONTRATO No.:	0493 DE 2024
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SIETE (07) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SIETE (07) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	6 de febrero de 2025	FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	6 de febrero de 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de septiembre de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de septiembre de 2025
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	3 de septiembre de 2025	PLAZO ACTUALIZADO:	3 de septiembre de 2025
PLAZO TRANSCURRIDO:	28 EQUIVALE AL 13,21%	PLAZO TRANSCURRIDO:	28 EQUIVALE AL 13,21%
VALOR INICIAL :	$ 377.999.998,00	VALOR INICIAL :	$ 5.049.740.412,34
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 377.999.998,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 5.049.740.412,34
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 377.999.998,00	VALOR POR PAGAR:	$ 5.049.740.412,34
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE SAS

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)**	06/02/2025	06/02/2025	-
2	**CAPÍTULO I - RECUPERACION CAÑO PUERTO SABANAGRANDE**	26/04/2025		
3	Localizacion, Trazado y Replanteo	07/03/2025	28/03/2025	-21,00
4	Limpieza para Recuperacion Ambiental	21/04/2025		
5	Retiro y Disposicion Final de Residuos	26/04/2025		
6	**CAPÍTULO II - RECUPERACION CAÑO TIGRE**	06/05/2025		
7	Localizacion, Trazado y Replanteo	07/03/2025	19/02/2025	
8	Limpieza para Recuperacion Ambiental	01/05/2025		
9	Retiro y Disposicion Final de Residuos	06/05/2025		
10	**CAPÍTULO III- RECUPERACION CAÑO LUISA**	20/07/2025		
11	Localizacion, Trazado y Replanteo	22/03/2025	27/03/2025	-5,00
12	Limpieza para Recuperacion Ambiental	15/07/2025		
13	Retiro y Disposicion Final de Residuos	20/07/2025		
14	**CAPÍTULO IV - RECUPERACION CAÑO CONVENTO**	30/07/2025		
15	Localizacion, Trazado y Replanteo	22/03/2025	01/03/2025	
16	Limpieza para Recuperacion Ambiental	25/07/2025		
17	Retiro y Disposicion Final de Residuos	30/07/2025		
18	**CAPÍTULO V - RECUPERACION CAÑO GRANDE**	03/09/2025		
19	Localizacion, Trazado y Replanteo	06/04/2025		
20	Limpieza para Recuperacion Ambiental	29/08/2025		
21	Retiro y Disposicion Final de Residuos	03/09/2025		
22	**CAPÍTULO VI - LIMPIEZA ESTRUCTURAS HIDRAULICAS**	01/09/2025		
23	Limpieza para Recuperacion Ambiental	27/08/2025		
24	Limpieza a Mano de Residuos Sólidos sobre Cauce (Incluye Retiro y Disposicion)	26/05/2025		
25	Retiro y Disposicion Final de Residuos	01/09/2025		
26	**CAPÍTULO VII - COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL**	03/09/2025		
27	**Gestión Social**	20/02/2025		
28	Campaña Radial	12/02/2025	15/02/2025	-3,00
29	Reuniones informativas con la Comunidad	20/02/2025		
30	**Educación Ambiental**	05/06/2025		
31	Inducción ambiental a Comunidades	05/06/2025		
32	Inducción ambiental a Trabajadores	10/03/2025		
33	**Fortalecimiento Institucional**	29/08/2025		
34	Socialización del proyecto con organismos y autoridades	29/08/2025		
35	**Gestión Ambiental**	03/09/2025		
36	**Manejo de emisiones Atmosféricas de material particulado, gases y vapores al aire**	03/09/2025		
37	Monitoreo de partículas de gases PM10 (antes y durante la ejecución del proyecto en dos puntos)	03/09/2025		
38	**Manejo de niveles de Ruido y Vibración**	03/09/2025		
39	Monitoreo de emisiones de ruido (antes y durante la ejecución del proyecto)	03/09/2025		
40	**Manejo Ambiental de los Residuos Solidos**	03/09/2025		
41	Punto ecológico para almacenar residuos solidos	03/09/2025		
42	**Manejo Ambiental de los Residuos Líquidos**	03/09/2025		
43	Alquiler de una (1) cabina sanitaria por cada frente de obra habilitado	03/09/2025	18/03/2025	
44	Monitoreo de Parámetros físicos, químicos y biológicos (antes y durante la ejecución del proyecto)	03/09/2025		
45	**Manejo Ambiental para monitorear los niveles del Hidrosistema**	01/09/2025		
46	Instalacion de miras Hidrologicas	01/09/2025		
47	**Manejo ambiental de las Migraciones de peces en el sistema de Ciénagas**	03/09/2025		
48	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	03/09/2025		
49	**Salvamento de Fauna Silvestre**	01/09/2025		
50	Trampas tipo Tomahawk y Sherman. Varas con lazos, ganchos herpetológicos y bolsas plásticas y de tela.	01/09/2025		
51	**Recursos Humanos**	03/09/2025		
52	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	03/09/2025		
53	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**	03/09/2025		
Plazo del proyecto en días		209		

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos (capitulos de obra). Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 181.897.109,59	3,60%	4,55%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 411.482.070,00	8,15%	

CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S. Nit. 901.427.201-6	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Versión 001**	
		Fecha Aprobación	**2020-11-24**

FECHA	jueves, 6 de marzo de 2025	**PERIODO No.**	4	DEL	**27/02/2025**	AL	**5/03/2025**

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros.

A corte de la presente semana el contrato sigue vigente y en ejecucion, se continua con la gestion social, con las actividades de levantamiento de actas de vecindad en los predios aferentes de Caño tigre y Caño Luisa, en el municpio de Palmar de Varela, ademas de la primera socializacion para las asocioaciones de agricultores de Palmar de Varela y se inican las actividades de limpieza del Caño tigre en este mismo municpio.

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Durante la presente semana el contratista realiza trabajo administrativo en lo pertinente a la gestion Socio ambiental; por un lado se pretende consolidar los protocologos y gestion de los monitoreos de control ambinetal que se realizaran antes y durante la ejecucion del proyecto, y por otro lado se continuan las labores sociales de levantamiento de actas de vecindad en los frentes de Sabanagrande y Palmar de Varela. Esta actividades son indispensables para blindar tanto al contratista como la entidad de posibles reclamaciones y de que la comunidad se le garantice la calidad de los trabajos y la reparacion de daños colaterales. Las actividades se concentran en los municipio de Sabanagrande, en el frente Puerto Sabangrande y Covento y en el municpio de Plamar en el Frente Caño Tigre, en uso de los profesionales de trabajo social, ing residente, y la comision topografica

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Jueves 27 de febrero

*Se realizó una jornada de socialización en el Municipio de Palmar de Varela en la Calle 5 # 4A-08, contando con la participación del gremio de los agricultores y pescadores presentes en el área del frente de trabajo de Caño Tigre y se brindó información acerca del punto de atención a la comunidad, para tramitar PQRS y ser atendidas por parte del equipo de contratista de obra.

*Se dio inicio a las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Caño Tigre, mediante la operatividad de una retroexcavadora Hitachi EX200, entre las abscisas K0+000 (desembocadura del caño en el rio magdalena) hasta la abscisa K0+040, manejando anchos promedios de 5 metros. El material extraído se acopio temporalmente en los espacios habilitados previamente a la realización de actividades de recuperación, para posteriormente ser dispuestos en sitio autorizado.

*Implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la inspección del uso adecuado de los EPP por parte de los trabajadores en obra, el diligenciamiento de formatos previo al inicio de las
*Se llevó a cabo un recorrido exploratorio por el sistema de ciénagas de Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela con el propósito de realizar una inspección preliminar del área.

*Se elaboró el plan de trabajo para la realización del Monitoreo Biológico Pesquero, conformando los documentos técnicos y metodologías y ensayos a realizar para la puesta en marcha de esta actividad. Se remitió a la interventoría la documentación para su revisión.

*Se realizó la actividad de levantamiento topográfico del Caño Luisa en conjunto con la interventoría, mediante GPS RTK.

*Se llevó a cabo el proceso logístico para la organización y ejecución de las capacitaciones dirigidas a los encuestadores en el marco del monitoreo biológico pesquero. Como parte de esta planificación, se coordinaron los recursos necesarios, incluyendo materiales didácticos, espacio de formación y herramientas metodológicas para garantizar una capacitación efectiva.

Viernes 28 de Febrero

*Se continuó con las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Caño Tigre, mediante la operatividad de una retroexcavadora Hitachi EX200, entre las abscisas K0+040 hasta la abscisa K0+070, manejando secciones trapezoidales con anchos promedios de 5 metros en la base. Se acopio temporalmente el material extraído en los espacios habilitados previamente

*Implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la inspección del uso adecuado de EPP, así como el diligenciamiento de formatos (AST y preoperacionales), así como la verificación del botiquín de primeros auxilios y camilla de emergencia en el frente de obra de Caño Tigre
*Se dio inicio a las actividades de levantamiento de actas de vecindad en el frente de trabajo de Caño Luisa, lográndose levantar tres (3) actas precisándose el estado actual y registro fotográfico
*Se realizó la actividad de levantamiento topográfico del frente de trabajo de Caño Sabanagrande en conjunto con la interventoría, mediante GPS RTK.
*Durante la jornada se llevó a cabo un rescate y liberación de iguana que se encontraba en cercanía al área de trabajo
*Se llevó a cabo la capacitación a los encuestadores a las 10:30am en las instalaciones de la oficina central de Palmar de Varela ubicada en la Calle 11 # 13- 16 Barrio Florencia, se realizó entrega de materiales tales como ictiometros, balanzas, formatos de encuestas, durante la jornada se realizó la entrega de hidratación y alimentación

Sabado 01 de Marzo

*Se realizaron las actividades de perfilamiento de taludes en el frente de obra de Caño Tigre entre las abscisas K0+000 hasta la K0+070, tanto del lado izquierdo como derecho del caño, manejando una relación de 1:1 y un alto promedio de 2.8 metros.
*Se llevó a cabo la ejecución de las medidas establecidas en el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), asegurando el cumplimiento de los protocolos normativos. Se verificó la correcta utilización de los Equipos de Protección Personal (EPP) por parte del personal, así como el adecuado diligenciamiento y control de los formatos de Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) y listas de verificación preoperacionales. Adicionalmente, se supervisó la adherencia a los procedimientos establecidos para mitigar riesgos laborales y garantizar condiciones óptimas de seguridad en el entorno de trabajo
*Se realizó la actividad de levantamiento topográfico en el frente de trabajo de Caño convento, en conjunto con la interventoría, mediante GPS RTK.

Lunes 03 de Marzo

*Se continuó con las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Caño Tigre, mediante la operatividad de una retroexcavadora Hitachi EX200, entre las abscisas K0+070 hasta la abscisa K0+120, manejando secciones trapezoidales con anchos promedios de 5 metros en la base. Se acopio temporalmente el material extraído en los espacios habilitados previamente para posteriormente realizar su disposición final en el sitio autorizado por la CRA
*Se dio inicio la puesta en marcha del monitoreo biológico pesquero con los parámetros pesqueros, biológicos y económicos

Martes 04 de Marzo

*Se dio continuidad a las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Caño Tigre, utilizando una retroexcavadora Hitachi EX200. Los trabajos se desarrollaron entre las abscisas K0+120 y K0+180 (60 metros lineales), ejecutando el perfilado de secciones trapezoidales con un ancho promedio de 5 metros en la base. El material extraído fue acopiado temporalmente en las áreas previamente habilitadas, garantizando su posterior disposición final en el sitio autorizado por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), en cumplimiento de las normativas ambientales vigentes. Asi mismo, se realizó la actividad de reconformación de taludes, manejando relaciones de 1:1 y una altura promedio de 2.3 metros.

*Se llevó a cabo la implementación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), garantizando el cumplimiento de los protocolos establecidos para la prevención de riesgos laborales. Durante la jornada, se realizó la inspección del uso adecuado de los Equipos de Protección Personal (EPP) por parte de los trabajadores, verificando su correcta utilización según las actividades desempeñadas. Asimismo, se supervisó el diligenciamiento de los formatos de Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) y preoperacionales, asegurando que se registraran adecuadamente las condiciones de seguridad antes del inicio de las labores, con el fin de mitigar posibles incidentes y mejorar el ambiente laboral
*Durante la jornada se presentó un ahuyentamiento de culebra que se encontraba en cercanía del área de trabajo
*Se continuo con la puesta en marcha del monitoreo biológico pesquero con los parámetros pesqueros, biológicos y económicos.

Miercoles 05 de Marzo

*Se avanzó con las actividades de limpieza para la recuperación ambiental en el frente de obra de Caño Tigre, empleando una retroexcavadora Hitachi EX200. Las labores se ejecutaron entre las abscisas K0+180 y K0+240, abarcando un tramo de 60 metros lineales, donde se realizó el perfilado de secciones trapezoidales con un ancho promedio de 5 metros en la base. El material extraído fue temporalmente acopiado en las áreas previamente habilitadas, asegurando su disposición final conforme a las normativas establecidas por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA). Adicionalmente, se llevó a cabo la reconformación de taludes, aplicando una relación de inclinación de 1:1 y alcanzando una altura promedio de 2.3 metros, garantizando la estabilidad estructural y el cumplimiento de los estándares ambientales. El aumento en el nivel del río ha provocado la entrada de agua al canal, por lo que las labores se están desarrollando de manera secuencial, iniciando en las secciones ubicadas aguas arriba y empalmando con los tramos previamente finalizados. Esta estrategia tiene como objetivo mitigar el impacto del flujo de agua en las operaciones de limpieza, permitiendo una ejecución más eficiente y evitando interrupciones en el proceso

*Como parte de la implementación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se llevó a cabo la inspección del uso correcto de los Equipos de Protección Personal (EPP) por parte del personal. Asimismo, se verificó el adecuado diligenciamiento de los formatos de Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) y preoperacionales, garantizando el cumplimiento de los protocolos de seguridad y la mitigación de riesgos en el entorno laboral
*Se realizó una inspección en campo en conjunto con la interventoría en el frente de trabajo de Caño Grande, evidenciándose la presencia abundante de material vegetal (henea), por lo que se requiere programar una jornada de limpieza del área para poder realizar el levantamiento topográfico en este frente de trabajo
*Se realizaron encuestas de conocimiento local y uso de la fauna silvestre
*Se continuo con la puesta en marcha del monitoreo biológico pesquero con los parámetros pesqueros, biológicos y económicos.

CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S. Nit. 901.427.201-6	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Versión 001**	
		Fecha Aprobación	**2020-11-24**

FECHA	jueves, 6 de marzo de 2025	**PERIODO No.**	4	DEL	**27/02/2025**	AL	**5/03/2025**

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Reunion de Socializacion al gremio de agricultores de Palmar de Varela



Reunion de Socializacion al gremio de agricultores de Palmar de Varela



Elementos de Seguridad Industrial en Caño Tigre



Charlas de capacitacion por parte del contratista



Atencion a propietarios de parcelas para actas de vecindad Caño Tigre



Acercamientos en Caño Luisa para elaborar Actas de Vecindad



Operaciones de Limpieza Caño Tigre K 0+120



Operaciones de Limpieza Caño Tigre K 0+180

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: Manuel Rodriguez Gomez - Director de Interventoria

-
- Registro Fotográfico

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESTADO DE LOS FRENTES DE TRABAJO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL PROYECTO DE REGULACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CIÉNAGAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 293 DEL 2017".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
No. 0496 de 2024

CONTRUPROYECTOS DEL NORTE SAS
NIT: 901.427.201-6

Ubicación: Cano Puerto de Sabanagrande en Sabanagrande



Fotografía 1Ubicación: Cano Puerto de Sabanagrande y Caño Convento en Sabanagrande



Fotografía 2 Caño Puerto de Sabanagrande panorámica aérea



Fotografía 3 Caño Puerto de Sabanagrande panorámica aérea



Fotografía 4 Actividad de localización y replanteo en Caño Tigre

Ubicación: Caño Convento en Sabanagrande



Fotografía 5 Panorámica del estado en Caño Convento



Fotografía 6 Panorámica del estado en Caño Convento



Fotografía 7 Panorámica del estado en Caño Convento



Fotografía 8 Actividades de localización topográfico en caño Convento

Ubicación: Cano Luisa en Santo Tomas





Fotografía 9 Panorámica en Caño Luisa Encuentro con el Rio





Fotografía 10 Panorámica en Caño Luisa



Fotografía 11 Panorámica en Caño Luisa Encuentro con la ciénaga



Fotografía 12 Actividades de Localización Topográfica

Ubicación: Cano Tigre en Palmar de Varela



Fotografía 13 Panorámica en Caño tigre Compuertas



Fotografía 14 Panorámica caño tigre





Fotografía 15 Panorámica Caño Tigre con la ciénaga





Fotografía 16 Actividades de Localización Topográfica en Caño Tigre




Fotografía 17 Evidencia de sobrevuelo con Drone en Caño Tigre





Fotografía 18 Operaciones de traslado de maquinaria a caño tigre



Fotografía 19 Estado antes de la intervención en Caño Tigre K0+000 al K0+070



Fotografía 20 Estado durante la intervención en Caño Tigre K0+000 al K0+070



Fotografía 21 Estado final de la intervención en caño Tigre K0+000 al K0+070




Fotografía 22 Estado antes de la intervención en caño Tigre K0+075 al K0+180




Fotografía 23 Estado durante la intervención en caño Tigre K0+075 al K0+180




Fotografía 24 Estado final de la intervención en caño Tigre K0+075 al K0+180



Fotografía 25 Estado antes de la intervención Caño Tigre K0+180 al K0+240



Fotografía 26 Estado durante de la intervención Caño Tigre K0+180 al K0+240



Fotografía 27 Estado final de la intervención Caño Tigre K0+180 al K0+240





Fotografía 28 Socialización en Palmar de Varela





Fotografía 29 28 Socialización en Palmar de Varela





Fotografía 30 Inspecciones a elementos de emergencias en Caño Tigre





Fotografía 31 Charlas y capacitaciones al personal operativo





Fotografía 32 Actividades de gestión social en caño Tigre





Fotografía 33 Actividades de adecuaciones de vías en Caño Tigre





Fotografía 34 Toma de muestras para monitoreo de calidad del agua





Fotografía 35 Toma de muestras para monitoreo de calidad del agua





Fotografía 36 Toma de muestras para suelos en Caño Tigre

-
- Bitácora de Obra

Contrato No 0496 de 2024 Interventoria:

Objeto:

"Interventoria tecnica, administrativa y financiera" del contrato cuyo objeto es: "Realizar la limpieza y recuperacion ambiental de los caños y estructuras hidraulicas del proyecto de Regulación y manejo integral del sistema de cienagas de los municipios de Sabanagrande, Santo tomas y Palmar de Varela en cumplimiento de la Licencia ambiental otorgada mediante Resolución No 293 de 2017"

DIRECTOR OBRA

Siendo las 10:00 am de la mañana del día viernes 14 de febrero en el municipio de Palmar de Varela, departamento del Atlántico, dentro del área de influencia de los caños Tigre y Tuisa que están dentro del alcance del proyecto; se da apertura al libro de obra o "Bitacora"

Se entiende como bitacora de obra el libro oficial donde se registraran todas las anotaciones de los incidentes día a día más relevantes en la ejecución de la obra, las verificaciones de calidad, volumenes, especificaciones, control de avance y demás asunto de caracter técnico, administrativo, legal y de seguridad que se presenten durante el periodo de ejecución de los trabajos relativos al contrato de obra No 043 de 2021 celebrado en el Consorcio Alianza Ambiental y la Corporación Autonoma Regional del Atlantico CRA, con un termino de ejecución de 7 meses.

A continuación se procede a registrar las firmas de los profesionales que podrán participar en su desarrollo, reuniones de seguimiento y control de Avance:

Por parte de la Interventoria: Consorcio Proyectos del Norte SAS. -
Ing. Gustavo Castellar Arrieta – Residente –

Por parte del Consorcio Alianza Ambiental.
Ing. Humberto Maldonado Arevalo - Residente de obra

Powered by CamScanner

Viernes 14 de febrero de 2025.
- Estado del tiempo: seco y soleado durante todo el día.
- Personal en obra:
  Contratista: Ing. Residente, topografo, cadenero y operador de maquinaria.
  Interventoria: Ing. Residente.
- Equipo en obra: Retroexcavadora Hitachi EX 200.
- Actividades Ejecutadas:
  En el dia de hoy se realizó el traslado de la maquinaria en cama baja hasta el municipio de Palmar de Varela y de allí se movilizo hasta el sitio de las obras en caño tigre:
- Observaciones:
- Firmas:

Ing. Gustavo Castellar.

Sabado 15 de febrero de 2025.
- Estado del tiempo: seco y soleado durante todo el día
- Personal en obra: 1 Ing Residente, topografo, 1 cadenero, 1 operador de maquinaria.
- Equipo en obra: Retroexcavadora Hitachi Ex 200.
- Actividades Ejecutadas:
  Se realizo el retiro de la vegetacion tipo malezas a lo largo de los 900 m del alcance dentro del cauce del caño.
  El caño esta seco, su cauce hacia la abscisa K0+800 no está definido y con la ayuda de habitantes de la zona se logró ubicar su lecho. Se realiza levantamiento topografico con RTK.
  Firmas:

Ing. Gustavo Castellar.

Domingo 16 de febrero de 2025.
No se reportan actividades en el dia de hoy.

Ing. Gustavo Castellar.

Powered by CamScanner

lunes 17 de febrero de 2025.

- Estado del tiempo: seco y soleado durante todo el día.
- Hora inicio de actividades: 07:00 am.
- Personal en obra: Ing. Residente, 1 topografo, 1 cadenero, 1 operador de maquinaria, 1 operador de Drone.
- Equipo en obra: Retroexcavadora Hitachi 200, Drone.
- Actividades Ejecutadas:
  Se realizo sobrevuelo con drone en los caños: Tigre, Luisa, Puerto Sabana-grande, Corento y Grande. Se realizo nivelación en caño Tigre. Se inicio la excavación del pista en caño tigre entre las abscisas. K0+000 al K0+030 en un ancho de 5mts y espesor promedio de 0,6mts
- Anotaciones:
  En los anexos tecnicos (Planos) del pliego de condiciones indica corte en 0,80 m en las abscisas K0+067,84 y K0+073,21 sitios donde estan ubicadas las compuertas. Sobre estas estructuras existe una losa de fondo que al hacer una excavacion se debilitaria la estructura, y con la excavacion que produciria el flujo de agua, muy probablemente colapsaria dicha estructura. Por lo tanto una cota obligada sera la del fondo de la losa de las compuertas. Esto se elevara a consulta a la CRA.

Firmas:

Ing. Gustavo Castellar.

Martes 18 de febrero de 2025.

- Estado del tiempo: seco y soleado durante todo el dia.
- Hora Inicio de actividades: 07:00 am.
- Personal en obra: 1 topografo, 1 cadenero, 1 operador de maquinaria.
- Equipo utilizado: 1 Retroexcavadora Hitachi EX 200.
- Actividades Ejecutadas:
  Continuan las excavaciones sobre el lecho del caño Tigre entre las abscisas K0+030 al K0+080, para pista de operaciones y acceso se esta repaliando el material por lo dificil acceso para el deceso por lo que se está demorando las actividades.

Firmas:

Ing. Gustavo Castellar.

Powered by CamScanner

Miercoles 19 de febrero de 2025.

- Estado del tiempo: Seco y Soleado durante todo el día.
- Hora de Inicio de actividades: 07:00 am.
- Personal en obra: Ing. Residente, topografo, cadenero, operador maqui
- Equipo utilizado: Retroexcavadora Hitachi Ex 200.
- Actividades Ejecutadas:

Continua las excavaciones sobre el lado entre las abscisas K0+020 al K0+060 en ancho de 5mts y profundidad promedio de 0,80 m. x cola repaliando material hacia la compuerta K0+067 para dar acopio y posterior retiro, esta para conformar pista para operación y acopio.

Firmas:

Ing. Gustavo Castellar.

Jueves 20 de febrero de 2025.

- Estado del tiempo: Seco y Soleado durante todo el día
- Hora Inicio de actividades: 07:00 am.
- Personal en obra: Ing. Residente, topografo y cadenero, o
- Equipo en obra: Retroexcavadora:
- Actividades ejecutadas:

Se entrega por parte del contratista, la información del sobrevuelo con dron mediante link de descarga, se procede al analisis de dicha información, depurarla para luego compartirla con la entidad.

Firmas:


Gustavo Castellar.

Viernes 21 de febrero de 2025.

- Estado del tiempo: Seco y Soleado durante todo el día.
- Hora de Inicio de actividades: 07:00 Am.
- Personal en obra: Ing. Residente, topografo, cadenero, Profesional Social
- Equipo en obra: Retroexcavadora Hitachi.


Powered by CamScanner

- Actividades Ejecutadas:
Continuan el levantamiento de actas de vecindad en el area de caño Puerto de Sabanagrande, se levantaron 14 actas de los locales al margen del puerto. Por otro lado se inician los monitoreos de calidad del agua en las desembocaduras de los caños en el rio Magdalena en los municipios de Palmar de Varela, Santo tomas, y Sabanagrande. La empresa encargada es Lima SAS, se utilizo bote con motor fuera de borda. Este componente hace parte de los monitoreos antes de la ejecucion de labores.
Firmas:




Gustavo Castellar.

Sabado 22 de febrero de 2025.
- Estado del tiempo: Seco y Soleado durante todo el dia.
- Hora de Inicio de Actividades: 07:00 Am.
- Personal en obra: Ing. Residente, topografo, cadenero, operador de maquinaria.
- Equipo en obra: Retroexcavadora Hitachi.
- Actividades Ejecutadas:
Se continua con la adecuación de vías de acceso a caño Tigre, en Palmar de Varela, esto es indispensable para las maniobras de cargue y descargue de los volteos que retiraran el material.
Firmas:



Gustavo Castellar.

Domingo 23 de febrero de 2025.
No se reportan actividades el dia de hoy.



Gustavo Castellar.

Lunes 24 de febrero de 2025.
- Estado del tiempo: Seco y Soleado durante todo el dia.
- Hora de Inicio de actividades: 07:00 Am.

Powered by CamScanner

- Personal en obra: Ing. Residente, topografo, cadenero, profesional social
- Actividades ejecutadas
Solo se reporta actividades administrativas de planeación de recorridos y monitoreos para la gestión ambiental, se lograron acercamiento en Palmar de Varela con los comités para el tema de la socialización que se proyecta para el jueves 27. El profesional social realizó el levantamiento de 5 actas de vecindad en caño puerto de Sabana grande.

Firmas:

Gustavo Castellar.

Martes 25 de febrero de 2025.

- Estado del tiempo: Seco y Soleado durante todo el día.
- Hora de Inicio de actividades: 07:00 Am.
- Equipo en obra: Retroexcavadora.
- Actividades Ejecutadas:
Se realiza reunión en las instalación de la CRA, asistentes: Ing. Roque Muñoz (Contratista); Ing. Gustavo Castellar y David Marmolejo (Interventoria); Ing Fernando Aguirre y Vladimir Drago (contratista). Se trataron temas de lineamiento del plan social y ambiental del proyecto, alcance de socializaciones y protocolo para el monitoreo ~~de~~ ambientales a desarrollar.

Firmas:

Gustavo Castellar.

Miercoles 26 de febrero de 2025.

- Estado del tiempo: Seco y Soleado durante todo el día.
- Hora de Inicio de actividades: 07:00 am.
- Personal en obra: Ing. Residente, topografo. cadenero, profesional. Social.
- Actividades Ejecutadas:
Se realizó control topografico por parte de la Interventoria:

Powered by CamScanner

a lo largo del caño Tigre K0+000 al K0+900 con GPS GNSS Kolida K5. El contratista realizó el levantamiento de 3 actas de vecindad en caño Convento (Sabanagrande) y sigen las invitaciones para la socialización en Palmar de Varela.

Firmas:

Gustavo Castellon.


Jueves 27 de febrero de 2025.

- Estado del tiempo: Seco y soleado durante toda la jornada.
- Hora de Inicio de actividades: 07:00 Am.
- Equipo en obra: Retroexcavadora Hitachi EX 200.
- Personal en obra: Ing. Residente, Residente social, Residente ambiental, conductor y operador de maquinaria, topografo.
- Actividades Ejecutadas:
  - Se realiza socialización al gremio de agricultores y pescadores del municipio de Palmar de Varela. El lugar de la socialización fue en calle 5 #4A-08. La comunidad solicita aclarar que tipo de limpieza se haran sobre las estructuras hidraulicas. (compuertas en caño tigre). Ellos solicitan que se coloquen nuevas estructuras. Por parte del contratista se aclara que el alcance no contempla esta solicitud.
  - Una vez socializado se da inicio a la recuperacion ambiental en caño Tigre. Se trabaja en la seccion de cajon en las abscisas K0+000 al K0+040. Ancho de base 5,00 m. Se nivela la cota de la entrada a la cota de fondo de la compuerta.
  - Se acopia material en el costado derecho del talud.
  - Se realizan charlas de preoperacionales y se inspeccionan EPP, Botiquin, camilla.
  - Se realiza recorrido con equipo de Biologo e Ing. Ambiental para la formulacion del componente de caracterizacion para monitoreo Biologico pesquero.
  - Levantamiento topografico con GPS RTK (dos receptores) uno movil y otro estatico en caño Luisa

- Se gestionan actividades para capacitaciones e inducción para encuestas y caracterización dentro del monitoreo Biologico - pesquero.

- Hora cierre de actividades: 05:00 pm.

Firmas:




Gustavo Castellar

Viernes 28 de Febrero de 2025.

- Estado del tiempo: Seco y soleado durante todo el día.
- Hora Inicio de actividades: 07:00 Am.
- Equipo en obra: Retroexcavadora Hitachi EX200.
- Personal en obra: Ing. Residente, Residente social, topografo. cadenero, Auxiliar flora y fauna, cadenero, operador maquinaria
- Actividades Ejecutadas:
  - Preoperacionales a la actividad de limpieza ambiental (inspección de EPP, formulario de AST, charla).
  - Recuperación ambiental del caño tigre, entre abscisas. K0+040 al K0+070. Seccion trapezoidal ancho fondo de 5.00 m y talud 1:1.
  - levantamiento actas de vecindad en predio de caño tuira.
  - levantamiento topografico en Sabana grande con GPS RTK. dos receptores uno movil y otro fijo.
  - Se reporta el rescate y liberación de un reptil en el area intervenida a cargo del auxiliar de flora y fauna.
  - Capacitacion a encuestadores para monitoreo Biologico - Pesquero. y entrega de insumos para caracterizacion de especies;
- Hora fin de actividades: 05:00 pm.

Firmas:



Gustavo Castellar.

Sabado 01 de Marzo de 2025.

- Estado del tiempo: Seco y Soleado durante todo el dia.
- Hora de Inicio de actividades: 07:00 Am.
- Equipo en obra: Retroexcavadora Hitachi Ex 200 y camioneta.
- Personal en obra: Ing. Residente, Residente social, Resid. Ambiental, Auxiliar flora y fauna, topografo, cadenero, conductor, operador maquinaria.
- Actividades Ejecutadas:
  - Actividad de preoperacionales a la limpieza del caño.
  - limpieza ambiental, perfilamiento de taludes en caño Tigre abscisas K0+000 al K0+070 ambos margenes.
  - levantamiento topografico caño convento con GPS RTK, dos receptores (uno movil y otro estatico).
- Hora fin de actividad: 05:00 pm.
- firman:

Gustavo Castellar.


Domingo 02 de Marzo de 2025.

No se reportan actividades.


Lunes 03 de Marzo de 2025.

- Estado del tiempo: Seco y Soleado todo el dia.
- Hora Inicio de actividades: 07:00 am.
- Equipo en obra: Retroexcavadora Hitachi EX200 y camioneta.
- Personal en obra. Ing. Residente, Resid. Social, Resid. Ambiental, Biologo, Auxiliar fauna y flora, conductor, operador maquinaria, topografo y cadenero.
- Actividades Ejecutadas:
  - Actividades preoperacionales a la limpieza del caño. tigre
  - limpieza ambiental, de la seccion trapezoidal en caño tigre. en las abscisas K0+070 al K0+120 ancho de fondo 5,00 m

- Acordonamiento de material sobre talud derecho.
- Inicio de monitoreo Biologico - Pasquero
- Hora fin actividades: 05:00 pm.
- Firmas:




Gustavo Castellar.




Martes 04 de Marzo de 2025

- Estado del tiempo: Seco y soleado durante todo el día.
- Hora de inicio de actividades: 07:00 am.
- Equipo en obra: Retroexcavadora HHachi EX200 camioneta.
- Personal en obra: Ing. Residente, Resid. social y ambiental, aux. flora y fauna, Biologo, conductor, operador de maquinaria, topografo y cadenero.
- Actividades Ejecutadas:
  - Preoperacionales al personal y maquinaria.
  - limpieza ambiental en caño Tigre en seccion trapezoidal, ancho de fondo 5:00 m y talud 1:1 entre las abscisas K0+0 al K0+180.
  - acordonamiento de material talud derecho.
  - Se reporto el ahuyentamiento de culebras y abejas por el auxiliar de flora y fauna.
  - Continua monitoreo biologico - pasquero.
- Hora fin actividades: 05:00 pm.
- Firmas:



Gustavo Castellar.



Miercoles 05 de Marzo de 2025.

- Estado del tiempo: seco y soleado durante todo el día.
- Hora Inicio de actividades: 07:00 am.

Powered by CamScanner

- Equipo en obra: Retroexcavadora Hitachi EX 200 y camioneta.
- Personal en obra: Ing. Residente, Resid. Social y Ambiental, Biologo, Auxiliar flora y fauna, topografo, cadenero, conductor, operador maquinaria.
- Actividades Ejecutadas:
  - Actividades preoperacionales a trabajadores y maquinaria.
  - limpieza ambiental en cano tigre, seccion trapezoidal, ancho de base 5.00 m, talud 1:1
  - Acordonamiento de material en talud derecho.
  - Se reporto la entrada de agua del rio al canal. Se recomienda al contratista trabajar en seco en secciones de 40 m. en el sentido aguas arriba hacia aguas abajo empalmando con secciones ya listas.
  - Se realiza recorrido en caño Grande en la jurisdiccion de PIMSA. Se evidencia vegetacion espesa la cual hace peligrosa la actividad de replanteo topografico. Se recomienda al contratista programar una jornada de limpieza de la vegetacion para el ingreso del personal al caño.
  - Se realizan encuestas de conocimiento local y uso de fauna silvestre.
  - Continua monitoreo Biologico - Pesquero.
- Hora fin de actividades: 05:00 pm.
- Firmas:

Gustavo Castellar.

-
- Seguimiento al PMA

FORMATO SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL DEFINIDAS EN EL PMA DEL PROYECTO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

PERIODO REPORTADO: del 06 de febrero de 2025 al 05 de marzo de 2025

FECHA DE INSPECCIÓN: 05 de marzo de 2025


CONTRATO DE OBRA No.: 0493 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL.

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL PROYECTO DE REGULACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CIÉNAGAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 293 DEL 2017"

ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO - CRA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto se encuentra localizado en la región caribe en el departamento del Atlántico en la jurisdicción de los municipios de Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela
Las actividades de limpieza y disposición final de residuos se realizarán en los caños que intercomunican las ciénagas de los Municipios de Sabanagrade, Santo Tomas y Palmar de Varela, precisando los siguientes caños: Caño Puerto Sabanagrande, Caño Tigre, Caño Luisa, Caño Convento, Caño Grande

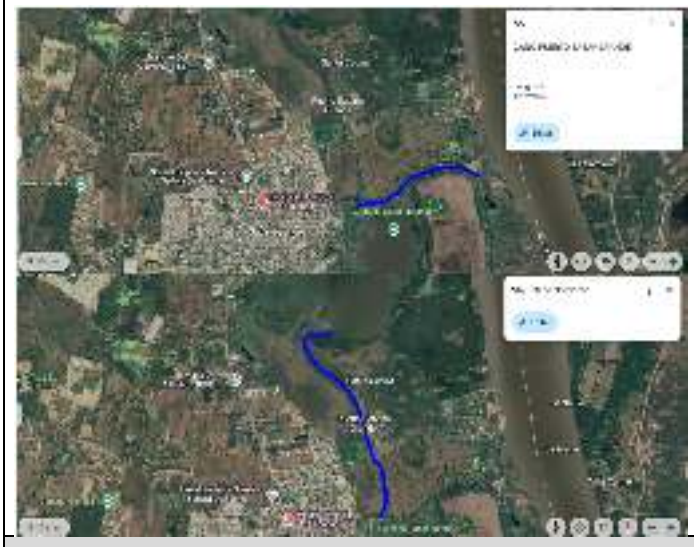







2. OBJETIVO

Llevar a cabo el seguimiento a las medidas de manejo ambiental definidas en los programas de manejo ambiental formulados por el Contratista de Obra en el Plan de Manejo Ambiental, con la finalidad de prever, controlar y mitigar la generación de efectos adversos en el área de influencia del proyecto.

3. INSPECCIÓN GENERAL Se debe diligenciar marcando con una “X” según corresponda en cada uno de los requerimientos descritos a continuación, de igual manera diligenciar los datos adicionales requeridos:					
Información ambiental general asociada al proyecto sujeta de inspección	**Si**	**No**	**NA**	**Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)**	**Marque (Si /No según sea el caso)**
Indicar el número de trabajadores en obra que se encuentran laborando durante el periodo reportado: 14 personas	**X**			Relación lista de personal en obra	**Sí**
				Inspección en obra	**Si**
				Otros:	
¿Se requiere de licencia Ambiental para la ejecución del proyecto?		**X**		En caso de requerirse, especificar:	
¿El proyecto cuenta con un Plan de Manejo Ambiental y/o documento equivalente para el manejo y control de impactos ambientales?	**X**			Plan de manejo ambiental aprobado	**Si**
¿El Contratista de Obra dispone del personal encargado para la implementación del PMA en la Obra?	**X**			Indique Nombre **Nombre:**	
¿El Contratista de Obra cuenta con un cronograma de charlas y/o capacitaciones?	**X**			Cronograma de capacitaciones	**Si**
¿Se llevan a cabo charlas y/o capacitaciones al equipo de trabajo relacionadas con temáticas ambientales?	**X**			Lista de asistencia de capacitaciones	**Si**
				Registro Fotográfico de capacitación	**Si**
¿El Contratista de Obra dio a conocer al equipo de trabajo el alcance y las medidas de manejo a realizar en la obra mediante una jornada de socialización?	**X**			Lista de asistencia	**Si**
¿El Contratista de Obra cuenta con los insumos, materiales didácticos, personal, y recursos disponibles para la implementación del PMA?	**X**			Registros fotográficos	**Si**
¿Se encuentran ubicados en obras puntos ecológicos (canecas) para la disposición adecuada de los residuos sólidos generados?	**X**			Registros fotográficos	**Si**

4. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN INSPECCIONES ANTERIORES

COMPROMISO	ESTADO

5. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL DEFINIDOS EN EL PMA

5.1. PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACACIÓN DE HABITAT

MEDIO BIÓTICO

Objetivo: Minimizar los impactos ocasionados por la presencia del proyecto sobre la fauna y flora que habitan la zona circundante.

Meta: Sensibilizar e informar al 100% del personal vinculado al proyecto acerca de la importancia de adoptar actitudes y comportamientos que promuevan la conservación de las especies silvestres

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(No de capacitaciones realizadas /No de capacitaciones programadas) X 100 (2X2)*100= 100%	X			Registro Asistencia capacitación. Registro fotográfico.	Si

VER ANEXO 1 SEGUIMIENTO DEL PMA



Durante este periodo el contratista realiza actividades de capacitación sobre como conservar la fauna silvestre, como proteger y conservar el ecosistema y se hace ahuyentamiento de fauna.

5.2. PROGRAMA DE SALVAMENTO DE FAUNA TERRESTRE						
MEDIO BIÓTICO						
Objetivo: Proteger la fauna existente en el Área de Influencia Directa e indirecta.						
Meta: Capacitar al 100% del personal de obra en mecanismos de protección de fauna Dejar registro del 100% de los mecanismos de rescate y/o ahuyentamiento realizado						
Ítem	**Indicador**	**Cumplimiento de Indicador**			**Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)**	**Marque (Si /No según sea el caso)**
		Si	**No**	**NA**		
1	(No de capacitaciones realizadas /No de capacitaciones programadas) X 100 **(2X2) *100=100%**	**X**			Registro Asistencia capacitación. Registro fotográfico.	**Si**
2	(No. de especies encontradas / No. De especies trasladadas) x 100% **(2X2)*100=100%**	**X**			Formato y Registro fotográfico.	**Si**
3	(No. de encuestas con compresión y/o apropiación hacia la conservación de la fauna silvestre / No. de encuestas realizadas de las actividades de sensibilización) x 100% **(3x3)*100=100%**	**X**			Formato y registros fotográficos	**Si**

Tabla 1 Control Rescate, Ahuyentamiento y/o Liberación - RAL

FECHA	CANTIDAD	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO	FRENTE DE OBRA
28-02-2025	1	Iguana	Iguana Iguana	Caño Tigre
04-03-2025	1	Culebra	Leptophis ahaetulla	Caño Tigre





Durante el mes el contratista llevo a cabo la puesta en marcha del monitoreo biológico, con los parámetros pesqueros, biológicos y económicos, mediante la recolección de los datos de encuestas realizasen campo.

5.3. PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL

MEDIO BIÓTICO

Objetivo: Proteger la flora existente en el Área de Influencia directa e indirecta.

Meta: Capacitar al 100% del personal de obra en mecanismos de protección de flora

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(No de capacitaciones realizadas /No de capacitaciones programadas) X 100 **(2/2)*100=100%**	X			Registro Asistencia capacitación. Registro fotográfico.	Si







Durante este periodo el contratista inicio con las actividades de descapote sobre la vía hacia caño tigre para proceder con la conformación del acceso para las volquetas, para estas limpiezas se contó con el apoyo de la fundación AGROAFRO.

5.4. PROGRAMA DE REVEGETACIÓN						
MEDIO BIÓTICO						
Objetivo: Proteger la flora existente en el Área de Influencia Directa e indirecta.						
Meta: Capacitar al 100% del personal de obra en mecanismos de protección de flora Revegetalizar el 100% del área intervenida						
Ítem	**Indicador**	**Cumplimiento de Indicador**			**Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)**	**Marque (Si /No según sea el caso)**
		Si	**No**	**NA**		
1	(No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas) X 100%		**X**		Formato de capacitaciones y registro fotográfico	**No**
2	(m3 de áreas revegetalizadas/ m3 de áreas a revegetalizar) X 100%			**X**	Formatos de revegetalización y registros fotográficos	**NO APLICA**

Durante este periodo no se realizó la siembra de especies nativas pertenecientes al bosque seco tropical. Esta actividad se llevará a cabo previo a la finalización del proyecto.

5.5. PROGRAMA DE EMISIONES ATMOSFERICAS DE MATERIAL PARTICULADO, GASES Y VAPORES DE AIRE

MEDIO ABIÓTICO

Objetivo:
Mitigar las molestias causadas a la comunidad durante la ejecución de la obra.
Controlar la generación de Controlar la generación de ruido y material en suspensión que se genere durante la ejecución de la obra.

Meta:
Capacitar al 100% del personal de obra en el manejo de los equipos y maquinaria y en el uso adecuado de los elementos de protección individual.
Revisar el 100% de los certificados de gases de los vehículos vinculados al proyecto
Monitorear el 100% de material particulado en el área de influencia.
Monitorear el 100% de del ruido en el área de influencia

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas) X 100 **(1/1) *100=110%**	**X**			Registro Asistencia capacitación. Registro fotográfico.	**Si**
2	((No de inspecciones realizadas/ No de inspecciones a realizar) x100% **(2/2) *100=100%**	**X**			Registro de inspecciones y preoperacionales	**Si**
3	(No de certificados vigentes/ No. total de certificados) x100% **(1/1)*100=100%**	**X**			Registro fotográfico y registro de tecnomecanica	**Si**

VER ANEXO 3 SEGUIMIENTO del PMA





5.6. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO

MEDIO ABIÓTICO

Objetivo: Realizar e implantar acciones necesarias para prevenir, controlar, corregir y mitigar los posibles impactos que se presenten o potencialicen procesos de erosión, sedimentación que puedan afectar el suelo

Meta:
Capacitar al 100% del personal del proyecto sobre el uso del suelo
Disponer el 100% del material sobrante de excavación en sitios autorizados
Monitorear los metales del 100% del material a retirar

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(No. de capacitaciones desarrolladas/No. de capacitaciones programadas) x 100% **(2/2) *100=100%**	X			Registro Asistencia capacitación. Registro fotográfico.	**Si**
2	(m3 de material dispuesto en cantera autorizada / m3 de material total a disponer) * 100%			X	Registro fotográfico y planilla de disposición final	**N/A**
3	No de monitoreos realizados / No de monitoreos a realizar) X 100% **(1/3) *100=33,33%**	X				

Coordenadas de monitoreo de sedimentos

Coordenadas Estaciones de Monitoreo		
Caño Tigre		
ESTACIÓN	LATITUD (N)	LONGITUD (O)
Punto 5	10°42´28.33"N	74°44´6.96"O
Caño Luisa		
ESTACIÓN	LATITUD (N)	LONGITUD (O)
Punto 6	10°45´0.73"N	74°44´22.20"O
Caño Puerto Sabanagrande		
ESTACIÓN	LATITUD (N)	LONGITUD (O)
Punto 7	10°47´31.44"N	74°44´49.78"O
Caño Convento		
ESTACIÓN	LATITUD (N)	LONGITUD (O)
Punto 8	10°47´36.04"N	74°44´53.48"O







En el mes el contratista realizó el primer monitoreo de sedimentos para verificar la presencia de metales pesados tales como plata, arsénico, selenio, bario, cadmio, cromo, plomo, mercurio; en el caño tigre, caño luisa, caño puerto Sabanagrande y caño convento, para este monitoreo se ubicaron los puntos dentro de los arroyos a intervenir a cargo del laboratorio para la industria y el medio ambiente – LIMA.

5.7. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DEL RECURSO HIDRICO

MEDIO ABIÓTICO

Objetivo: Garantizar el manejo adecuado de los residuos líquidos generados en proceso constructivo, evitando la contaminación del agua

Meta: Monitorear el 100% de la calidad agua de los caños y/o arroyos, antes durante y después de la ejecución de las actividades.

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(No de capacitaciones realizadas / No de Capacitaciones programadas) X 100% **(1/1)*100=100%**	X			Formatos de capacitaciones Registro fotográfico.	Si

2	(No de monitoreos realizados/ No de monitoreos a realizar) X 100% **(1/4)*100=100%**	**X**			Registro fotográfico e informes	**Si**

Puntos de monitoreo

Coordenadas Estaciones de Monitoreo		
Ciénaga de Sabanagrande		
ESTACIÓN	LATITUD (N)	LONGITUD (O)
Punto 1 Sabanagrande	10°47´28.53"N	74°44´40.62"O
Ciénaga de Santo Tomas		
ESTACIÓN	LATITUD (N)	LONGITUD (O)
Punto 3 Ciénaga de santo tomas P1	10°45´18.41"N	74°44´47.16"O
Ciénaga de Palmar		
ESTACIÓN	LATITUD (N)	LONGITUD (O)
Punto 3Ciénaga de Mana	10°42´58.78"N	74°44´13.53"O





Durante este periodo el contratista realiza charlas al personal de obra sobre uso racional del agua y energía, y se inician los monitoreos de calidad del agua.



5.8. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MEDIO ABIÓTICO

Objetivo: Minimizar cualquier impacto adverso sobre la salud de los trabajadores y el medio ambiente por el mal manejo y disposición final de los residuos sólidos generados durante el desarrollo del proyecto

Meta:
Capacitar al 100% del personal del proyecto en el manejo integral de residuos ordinarios, peligrosos y especiales.
Clasificar el 100% de los residuos sólidos desde la fuente
Instalar 100% de los puntos ecológicos en obra

Aprovechar el 100% de los residuos reutilizables

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(No de puntos instalados/No de puntos a instalar) x 100% **(2/2) *100=100%**	X			Registro fotográfico.	**Si**
2	(No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas) X 100 **(2/2) *100=100%**	X			Registro Asistencia capacitación. Registro fotográfico.	**Si**









5.9. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS LIQUIDOS
MEDIO ABIÓTICO
Objetivo: Minimizar cualquier impacto adverso sobre la salud de los trabajadores y el medio ambiente por el mal manejo y disposición final de los residuos líquidos generados durante el desarrollo del proyecto
Meta: Capacitar al 100% del equipo de trabajo de la obra en el manejo adecuado de los residuos sólidos y/o líquidos Instalar 100% de los baños móviles

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas) X 100 **(1/1)*100=100%**	X			Registro Asistencia capacitación. Registro fotográfico.	**Si**
2	(No de baños instalados / No de baños a instalar) x 100% **(1/1)*100=100%**	X			Registro fotográfico. Certificado de disposición de residuos líquidos	**Si**

Durante este periodo el contratista realizó la instalación de una cabina de baño en el frente de obra de caño tigre, con el fin de gestionar de manera eficiente los residuos líquidos domiciliarios y proporcionar las condiciones sanitarias adecuadas al personal de obra, esta cabina de baño es suministrada por la empresa SANIPUBLIC la es la encargada del mantenimiento y disposición final de los residuos líquidos generados; adicionalmente en la oficina central se encuentra un baño, a estos baños se le realizan mantenimientos constantes.





5.10. PROGRAMA DE MITIGACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS

MEDIO ABIÓTICO

Objetivo: Prevenir los impactos que se puedan generar por el manejo de la maquinaria, equipos y vehículos

Meta:
Capacitar al 100% del equipo de trabajo en obra sobre el manejo de las maquinarias, equipos y vehículos.
Realizar el 100% de las inspecciones de control.
El 100% de los vehículos utilizados en el proyecto deberán contar con los equipos de prevención y seguridad reglamentados.
El 100% de los vehículos utilizados en el proyecto deberán contar con los certificados de emisión de gases, SOAT, revisión técnico-mecánica.

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas) X 100 **(1/1)*100=100%**	X			Registro Asistencia capacitación. Registro fotográfico.	**Si**
2	(No. de inspecciones desarrolladas / No. Inspecciones Programadas) **X 100% (1/1)*100=100%**	X			Registros de mantenimiento y/o inspecciones.	**Si**
3	(No documentos revisados/ No de equipos en obra) x 100% **(2/2) X 100% = 100%**	X				

Vehículos y/o equipos en obra

Vehículo y/o Equipo	Cantidad
retroexcavadora Hitachi EX200	1
Camioneta EMZ 517	1

Para el periodo el contratista cuenta con la documentación correspondiente de los vehículos como la tarjeta de propiedad, SOAT y tecno mecánica vigente; esta documentación deberá ser anexada en los soportes adjuntos.





5.11. PROGRAMA DE MANEJO DE CAMPAMENTO EN OBRA

MEDIO ABIÓTICO

Objetivo: Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la instalación, operación y desmantelamiento del campamento y áreas de acopio temporal.de obra.

Meta:
Capacitar al 100% del personal del proyecto sobre el uso de las instalaciones temporales del proyecto.

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(No. De acciones desarrolladas/No. De acciones a ejecutar) x 100% **(1/2)*100=50%**	X			Registro Asistencia capacitación. Registro fotográfico.	Si

Durante este periodo el contratista realizó la instalación de una carpa como campamento en el frente de obra, donde fue ubicado el punto de emergencia dotado con botiquín, camilla y extintor, también cuenta con un puno ecológico, una cabina de baño, sillas y mesas para la atención de los trabajadores y comunidad







5.12. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

MEDIO SOCIOECONOMICO

Objetivo: Capacitar y sensibilizar al personal de obra y comunidades

Meta:
Capacitar al 100% del personal de obra sobre temas ambientales, seguridad y salud en el trabajo y sobre el comportamiento con las comunidades
Capacitar 160 personas de la comunidad sobre temática de gestión del riesgo, agua, suelo, legislación ambiental, fauna y flora.

Capacitar 160 personas de obra sobre temática de gestión del riesgo, agua, suelo, legislación ambiental, fauna y flora.

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas) X 100 **(2/2) *100=100%**	**X**			Registro Asistencia capacitación. Registro fotográfico.	**Si**
2	(No de personal que asistió / No de personal programado) X 100%	**X**			Registro Asistencia capacitación.	**Si**

VER ANEXO 1 SEGUIMIENTO DEL PMA






5.13. PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN A LA COMUNIDAD
MEDIO SOCIOECONÓMICO
Objetivo: Mantener informada y resolver dudas e inquietudes presentadas por comunidad y personal interesado.
Meta: Dar respuesta al 100% de las solicitudes (PQRS) presentadas por los habitantes del sector del Barrio El Pantano y demás interesados sobre temáticas relacionada con el proyecto.

Informar al 100% de la comunidad y actores convocados para las socializaciones del proyecto sobre el alcance y avances de obra.

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(No. de solicitudes atendidas / No. de Solicitudes recibidas) x 100%	X			Registro de solicitudes realizadas.	Si
2	(No. de reuniones realizadas/ No. de reuniones programadas) x 100%	X			Registro fotográfico y registro de asistencia.	Si

Durante este periodo no se presentaron PQRs por parte de la comunidad, y no se realizaron reuniones de socialización o información a la comunidad.

VER INFORME SOCIAL

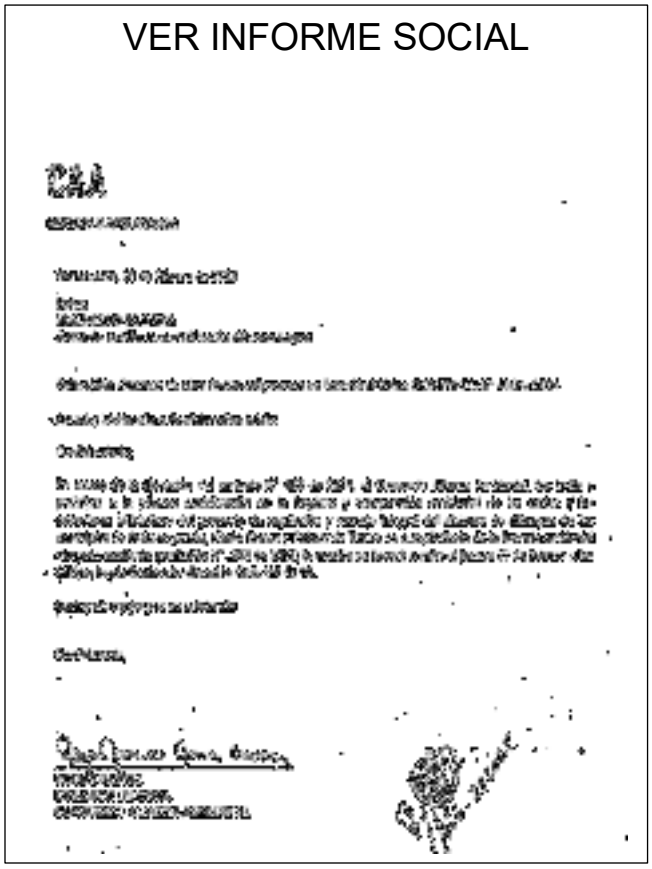

VER INFORME SOCIAL



5.14. PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD
MEDIO SOCIOECONÓMICO
Objetivo: Realizar levantamiento de actas de vecindad a los predios que se encuentren más próximos al área a intervenir.
Meta: Dejar registro 100% de los predios (viviendas, construcciones, establecimientos) que se encuentren cerca del área del proyecto.

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	No. De actas de vecindad elaboradas/ No. de viviendas y establecimientos identificados x 100%	X			Actas y registro fotográfico	Si





5.15. PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MEDIO SOCIOECONÓMICO
Objetivo: Contratar personal de mano de obra no calificada de las zonas cercanas al proyecto y/o del barrio El pantano.
Meta: Vincular al 100% del personal no calificado que requiera la obra.

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(No. de personas contratadas de la zona/ No. de personas requeridas de la zona) x 100%		X		Soportes contratación mano de obra.	SI

Durante este periodo no se realizó contratación de mano de obra no calificada local. **Los soportes de los contratos se encuentran en el programa de gestión social del proyecto.**

6. LISTADO DE COMPROMISOS	
COMPROMISOS	**FECHA**

-
- Seguimiento al Plan de gestión Social

INSPECCIÓN MENSUAL SOCIAL

FECHA DEL PERIODO: 06 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.: 0493 DE 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL

OBJETO DEL CONTRATO:
REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL PROYECTO DE REGULACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CIÉNAGAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 293 DEL 2017

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Municipios de Santo Tomas, Palmar de Varela y Sabanagrande

FRENTE DE OBRA: Caño Tigre y Caño Luisa

INTERVENTORÍA: CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE SAS

2. OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN

Desde el componente social con actividades integradas, orientadas a fortalecer la interacción y el relacionamiento entre los ciudadanos y las entidades públicas alrededor del diseño, construcción y ejecución de obras, se busca mejorar la calidad de vida de las comunidades, garantizar derechos de la ciudadanía y fomentar el cuidado de lo público. Además, la ejecución del PGS permite identificar las características de los territorios, poblaciones o sectores donde se desarrollan las obras, anticiparse a los impactos negativos de la intervención e influir en la reducción de riesgos, incentivando así la confianza y el control social. El objeto de la presente inspección es:
Realizar seguimiento a la implementación del Plan de gestión social.

3. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN INSPECCIONES ANTERIORES

COMPROMISO	ESTADO
Realización de levantamientos de actas de Vecindad en los Afluentes	Cumplido frentes Caño tigre y Caño luisa
Charlas a los trabajadores	Cumplido

1. PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN A LA COMUNIDAD

Ítem	Eje Social	Si	No	N.A	Indique evidencia u Observación (Registro fotográfico o	Marque
1	Reuniones de inicio	X			Se realizo en PIMSA y Palmar de Varela	Cumplido
2	Reuniones con líderes			X	N.A	N.A
3	Reuniones extraordinarias			X	N.A	N-A
4	Reunión final de obra			X	N.A	N.A
2. DIVULGACIÓN						
5	Valla publicitaria	X			Se instalo en la segunda semana de ejecución	Cumplido
6	Volantes de información			X	N.A	N.A
7	Volantes de invitación	X			Se comunico por escrito a los interesados los	
8	Oficios			X		N.A
9	Cartelera Informativas en el PAC			X	N.A	N.A

3 PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO DE PREDIOS						
10	Levantamiento de actas de vecindad	**X**			Formatos de Actas de Vecindad Registro Fotográfico	Cumplido
4. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA						
11	Establecer un punto de atención comunitaria				Calle 11 # 13 – 16, en el Barrio Florencio	Cumplido
12	Atención y solución a las PQRS presentadas				Anexo del informe contratista PQRS	Cumplido
13	Reuniones con los funcionarios de las alcaldías, e instituciones de servicios públicos.		**X**		No se han programado	No Cumple
5. PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL						
14	Talleres de sensibilización	**X**			Listado de asistencia y temática	N.A
15	Actividades lúdicas y recreativas			**X**	N.A	N.A
6. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA.						
16	Charlas educativas	**X**			Formato de asistencia a charlas o	Cumplido
17	A personal de cuadrilla y administrativo	**X**			Acta de capacitaciones	Cumplido
7. PROGRAMA VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA						
18	Contratación de mano de obra no calificada residente al área adyacente		**X**		No ha sido requerido	Cumplido
19	Listado del personal de obra no calificada			**X**	No se ha contratado mano de obra no calificada	Cumplido

8. OBSERVACIONES ADICIONALES

No. De Ítem	**OBSERVACIONES**
	Se está realizando un seguimiento mensual al cumplimiento de las medidas de manejo ambiental definidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto, constatando que el contratista cumpla con lo estipulado en el PMA, para lo cual se muestran los indicadores de cumplimiento. El contratista ha dado cumplimiento a los procesos de información y divulgación como parte fundamental en el desarrollo de las obras, afianzando de esta manera los procesos de comunicación, así mismo, se ha brindado la atención a la comunidad y se ha dado cabida a la participación de cada uno de los

COMPROMISOS	**FECHA**

9. LISTADO DE COMPROMISOS

CONTRATISTA	**INTERVENTORIA**
Nombre Luz Marina Barraza **Cargo** Auxiliar Social **Firma**	**Nombre** Liceth Maestre **Cargo** Ptofesional Social **Firma** Liceth Maestre.

-
- Seguimiento al Programa SST

INFORME MENSUAL DE SST No 1

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL PROYECTO DE REGULACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CIÉNAGAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 293 DEL 2017”.

PERIODO DE EJECUCION

DEL 6 DE FEBRERO DE 2025 AL 5 DE MARZO DE 2025

CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE SAS
NIT: 901. 427. 201 - 6

CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA 0496 DE 2024

INTRODUCCION

La Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores.

El presente informe indica las actividades relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, del proyecto **“REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL PROYECTO DE REGULACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CIÉNAGAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 293 DEL 2017”.**

OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer las actividades relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo realizadas durante del periodo comprendido entre el 6 de febrero de 2025 al 5 de marzo de 2025.

OBJETIVO ESPECIFICO

- ✓ Prevenir los accidentes y enfermedades laborales del personal del proyecto a **"REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL PROYECTO DE REGULACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CIÉNAGAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 293 DEL 2017"**., a través de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y aplicación de controles; y el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable en materia de riesgos laborales, con el fin de lograr el mejoramiento continuo de la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- ✓ Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar seguimiento y control de los factores de riesgo a los que se expone el personal que labora en el proyecto.
- ✓ Fomentar una cultura encaminada al autocuidado mediante la adopción de hábitos de vida saludable, promoviendo la salud y previniendo la enfermedad y conductas de riesgo en el proyecto.
- ✓ Garantizar las condiciones de seguridad mínimas requeridas de las máquinas, equipos y herramientas para la prevención de accidentes y enfermedades laborales.
- ✓ Supervisar las actividades en seguridad y salud en el trabajo que ejecuta el contratista.

SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA LAS ACTIVIDADES Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se evidencia que, durante este periodo el contratista entrego a Interventoría las planillas de seguridad social personal activo, afiliación a la ARL, EPS y certificados AFP.

2. INDUCION SST

Durante el periodo de desarrollo de actividades constructivas se evidencia que el contratista realizo inducción al personal contratista y sub contratista tal como se describen en la siguiente tabla:

Personal: Consorcio Alianza Ambiental					
Nombre	Cedula	Genero	Cargo	Dirección	Fecha de ingreso
Roque Muñoz	91281627	M	Director de Obra	Barranquilla	06-02-25
Humberto maldinado	1129524877	M	Residente de Obra	Barranquilla	06-02-25
Juan Miguel Hernández	1118848009	M	Especialista Ambiental	Barranquilla	06-02-25
Sonia Gonzalez	1140885236	F	Residente Ambiental	Barranquilla	06-02-25
Darío Vega	85476492	M	Biólogo	Barranquilla	06-02-25
Osman Aragón	1004353345	M	Auxiliar Flora y Fauna	Barranquilla	06-02-25
Rafael Rubio	72302363	M	Ing. Pesquero	Barranquilla	06-02-25
Gilary Romero	1123997747	M	Supervisor SISO	Barranquilla	06-02-25
Luz Marina Barraza	32876840	F	Residente Social	Barranquilla	12-02-25
Personal: Cuespro S. A					
Nombre	Cedula	Genero	Cargo	Dirección	Fecha de ingreso
Marvin Paredes	1118805770	F	Topógrafo	Palmar	12-02-25
Ekliss Gil Viloria	1131070566	M	Cadenero	Palmar	12-02-25
Jhon Carlos Troconiz	3821255	M	Conductor Camioneta	Barranquilla	14-02-25
Personal: Macroequipos LAND S.A.S					
Nombre	Cedula	Genero	Cargo	Dirección	Fecha de ingreso
Jhon Carlos Troconiz	3821255	M	Conductor Camioneta	Barranquilla	14-02-25
Personal: Jesús Viña					
Nombre	Cedula	Genero	Cargo	Dirección	Fecha de ingreso
Walter Paredes	8731832	M	Operador retroexcavadora	Palmar	14-02-25

3. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Interventoría evidencia que el contratista realizo entrega de elementos de protección personal a los trabajadores.
El personal en obra cuenta con sus elementos de protección personal como son:

- Casco.
- Gafas lente claro.
- Protección auditiva tipo inserción
- Botas de seguridad.

De acuerdo a las actividades que desarrollan, el contratista entrego otros elementos de protección personal, como son:

- Gafas lente claro.
- Protección auditiva de inserción y de copa (operadores)
- Protección respiratoria – Tapabocas

4. ACTIVIDADES DE FORMACION EN SST

4.1. Charlas
4.2. Capacitaciones ssta

Interventoría evidencia que durante este periodo el contratista realizo con apoyo el programa de capacitación charlas en seguridad y salud en el trabajo, con el fin de fomentar en el personal involucrado en el proyecto la prevención de accidentes y enfermedades laborales e incentivar el trabajo seguro.

Se evidencio formación de 18 empleados y las siguientes formaciones:

Charlas:

Tema	Fecha	Responsable
Política de gestión	14-02-25	Gilary Romero
Riesgo publico	15-02-25	Gilary Romero
Orden y aseo en el área de trabajo	17-02-25	Gilary Romero
Accidente de trabajo	18-02-25	Gilary Romero
Seguridad basada en comportamiento	19-02-25	Gilary Romero
Como conservar la flora silvestre	20-02-25	Sonia gonzalez
Temperaturas	21-02-25	Gilary Romero

Como prevenir los daños en excavación	22-02-25	Sonia gonzalez
Como hacer uso del suelo	24-02-25	Sonia gonzalez
Manejo de residuos	25-02-25	Gilary Romero
Manejo y disposición final de residuos	26-02-25	Sonia gonzalez
Uso racional de agua y energía	27-02-25	Sonia gonzalez
Seguridad en riesgo vehicular	28-02-25	Gilary Romero
Protección en la cabeza	01-03-25	Gilary Romero
Como podemos proteger y conservar el ecosistema	03-03-25	Sonia gonzalez
Salud y protección auditiva de los trabajadores	04-03-25	Gilary Romero
Pre operacionales y su importancia	05-03-25	Gilary Romero
Autocuidado	06-03-25	Gilary Romero

Capacitación ssta:

Tema	Fecha	Responsable
Diligenciamiento formatos para estudio biológico pesquero	28-02-25	Jasney Motta Pérez

5. INSPECCIONES SST

Durante el periodo se ejecutaron las inspecciones programadas mensualmente, el contratista realizo las siguientes inspecciones sst.

5.1. Kit de Emergencia (botiquín, camilla y extintores).

✓ ***EVIDENCIA DIGITAL REGISTRO FOTOGRAFICO***

5.2. Punto Ecológico

✓ ***EVIDENCIA DIGITAL REGISTRO FOTOGRAFICO***

5.3. Epp

✓ ***EVIDENCIA DIGITAL REGISTRO FOTOGRAFICO***

5.4. Orden y Aseo

✓ ***EVIDENCIA DIGITAL REGISTRO FOTOGRAFICO***

5.5. Vehículos y Maquinaria

✓ ***EVIDENCIA DIGITAL REGISTRO FOTOGRAFICO***

6. PREOPERACIONAL

La Inspección Preoperacional es una herramienta esencial para garantizar la seguridad laboral en cualquier entorno de trabajo, y siguiendo los consejos y mejores prácticas adecuados se puede garantizar que se lleva a cabo de manera efectiva y eficiente.

✓ ***EVIDENCIA DIGITAL REGISTRO FOTOGRAFICO***

7. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Durante el desarrollo de la obra se evidencio que el contratista identifica los riesgos inherentes al desarrollo de actividades diarias del proyecto mediante el diligenciamiento diario de ATS y socialización del mismo con los empleados.

✓ ***EVIDENCIA DIGITAL REGISTRO FOTOGRAFICO***

8. REPORTES Y ESTADISTICAS SST

Durante el periodo de la obra no se presentaron incidentes ni accidentes de trabajo, los trabadores conocen la importancia que tiene el reporte de incidentes, por cuanto nos permite tomar medidas correctivas y preventivas, y así mejorar los controles operacionales eliminando los peligros y riesgos sobre el desarrollo de actividades tal como se describen en los siguientes indicadores de accidentabilidad:

Indicadores de accidentabilidad

Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo	Es la relación entre el número de días perdidos y cargados por accidentes de Trabajo, durante un periodo y el total de HHT durante un periodo y multiplicado por K	ISAT= (N° Días perdidos y cargados por A.T en el periodo / N| HHT) X K

Índice de Lesiones Incapacitantes por A.T	Corresponde a la relación entre los índices de frecuencia y severidad de Accidentes de Trabajo con Incapacidad. Es un índice global de comportamiento de lesiones incapacitantes que no tiene unidad, su utilidad radica en la comparación entre diferentes periodos.	ILIAT= (IFIAT *ISAT) / 1000
Índice de Frecuencia de Incidentes de Trabajo	Es la relación entre el número total de I.T registrados en un periodo y el total de las HHT durante un periodo multiplicado por K (constante igual a 240.000).	IFIT = (N° Total de I.T. / N° HHT mensuales) X K

Caracterización de accidentabilidad

TABLA DE INDICADORES 2025									
MES	AREA	# DE EMPLEADOS	# DE AT	HHT	# DIAS AUSENCIA	TASA	IF	IS	ILI
Febrero	operativa	9	0	1584	0	**0,00%**	**0**	**0**	-

Horas hombre

COMPORTAMIENTO DIAS Y HORAS HOMBRES TRABAJADAS DURANTE EL 2025	
	FEB
DÍAS HÁBILES MES	22
HORAS ORDINARIAS DÍA	8
DIAS HOMBRES TRABAJADAS	**198**
HORAS HOMBRES TRABAJADAS	**1,584**


Ausentismo

COMPORTAMIENTO DE INCAPACIDADES Y DÍAS DE AUSENTISMO POR ENFERMEDAD GENERAL DURANTE EL 2025	
	FEB
No. INCAPACIDADES POR EG	0
DÍAS DE AUSENTISMO POR EG	0
HORAS DE AUSENTIMOS	0
AUSENTISMO POR EG	**0.00%**
TASA DE AUSENTISMO POR EG	**0.00%**

Indicador programa de capacitación

Nombre del indicador	Formula	Periocidad	Meta
Indicador Cumplimiento	# de Cap Programadas/ # de Cap EjecutadasX100	Trimestral	80%
Indicador Cobertura	# de asistentes a capacitación/ # total de trabajadores programadosX100	Trimestral	100%
Indicador Eficacia (las evaluaciones de la eficacia de las capacitaciones puedes ser: actividades, examen, supervision, talleres)	# trabajadores evaluados/ # de evaluaciones eficacesX100	Trimestral	70%

ANEXO DIGITAL (REGISTRO FOTOGRAFICO)

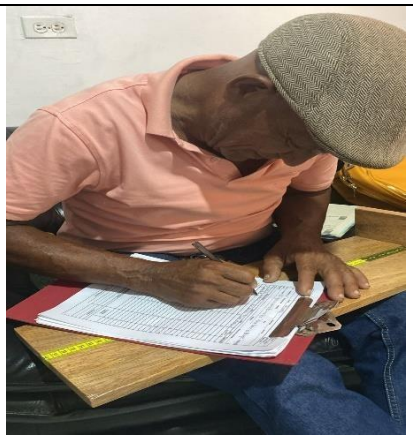INDUCCION SST	 
ENTREGA DE EPP	

ASISTENCIA A FORMACION SST	     

	 
INSPECCIONES SST BOTIQUÍN, CAMILLA Y EXTINTORES	   

INSPECCIONES PUNTO ECOLOGICO	 
INSPECCIONES EPP	
INSPECCIONES ORDEN Y ASEO	 

INSPECCIONES VEHICULOS Y MAQUINARIAS	 
PREOPERACIONALES VERIFICACION DILIGENCIAMIENTO	 
REGISTROS Y SOCIALIACION ATS	 

ADECUACION CAMPAMENTO	

9. CONCLUSION

Esta Interventoría evidencia que durante este periodo el contratista cumplió con los siguientes aspectos relevantes en materia de SST:

- Inducciones de sst
- Entrega de EPP
- Inducciones y formaciones sst
- Registro de ATS
- Registros de indicadores de gestión dende se evidencia cero ausentismos de AT y EG.

También, cabe resaltar que el contratista de obra entrega el informe mensual de seguridad y salud en el trabajo, teniendo esto en cuenta se presenta el presente informe de interventoría en el cual se resume de manera detalla la gestión por parte de la profesional encargada de llevar a cabo las labores de seguridad en el proyecto por parte del contratista de obra.

SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA SST
CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE SAS

Versión: 01
Fecha aprobación: 05/02/2025

FECHA: 13-02-2025 | RESPONSABLE: Amanda Trujillo

LUGAR: Palmar de Varela

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL PROYECTO DE REGULACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CIÉNAGAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 293 DEL 2017

SEMANA DEL 06 AL 12 DE Febrero.

		JUEVES			VIERNES			SABADO			LUNES			MARTES			MIERCOLES			OBSERVACIONES:
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
REQUISITOS LEGALES	¿Se ha sociabilizado las políticas de SST.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se cuenta con matriz de requisitos legales?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Incluye un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo y con otros requisitos que haya suscrito la organizacion?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Existe la identificación de los requisitos legales, matriz ambiental y de otra índole?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se cuenta con acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se cuenta con un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Existen un documento de SST para mejoramiento continuo?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
PLAN DE EMERGENCIA	¿Existe un documentos para la evolución y valoración de emergencia y la implementación de medidas de control necesarias?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se cuenta con inspección de botiquin y camilla?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se cuenta con inspección de señalización?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Existe un programa de brigada para la prevención conformada, capacitada y dotada?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se cuenta con un plan de comunicación?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	¿Existe un documentos para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se ha implementado medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se realizan charlas de riesgo y peligros?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se cuenta con ATS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se cuenta con verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se evidencias las acciones correctivas?			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	¿Se realizan pausas activas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se realizan reporte de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral ?			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	¿Se realizan Investigación de incidentes, accidentes y enfermecades laborales?			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
GESTIÓN DE LA SALUD	¿Se cuenta Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se ha realizado de Evaluaciones Médicas Ocupacionales?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se ha realizado inducciones y reinducciones?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Realizar las actividades de Promoción y Prevención en Salud?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se cuenta restricciones y recomendaciones médico/laborales?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se cuenta medición del ausentismo por causa médica?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
EPP	¿Cuenta con la matriz de EPP?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se ha realizado reporte diario de monitoreo y seguimiento de estado de los EPP?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Existe un programa de inspección de los EPP?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
INSPECCIONES	¿Se cuenta con un programa de inspecciones?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo de las herramientas manuales?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se cuenta con Preoperacional de equipos eléctricas?			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	¿Se ha realizado las inspecciones de Botiquín de primeros auxilios?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se ha realizado las inspecciones de extintores?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se ha realizado las inspecciones de maquinarias y/o equipos?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se ha realizado las inspecciones de orden y Aseo?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
ORDEN Y ASEO	¿Se cuenta con un programa de orden y aseo?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Cuenta con puntos ecológicos?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Cuenta con programa de manejo de residuos?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se cuenta con puntos de acopio de material e insumos?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se realiza seguimiento diario aleatorio de los puesto de trabajo?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Los campamento se encuentran debidamente señalizados y organizados			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	¿Realizar charlas informativas periódicas respecto de la implementación del orden y aseo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			

Firma del contratista: Gilary Romero
CC: 1123497747

Firma del Inspector HSE: Amanda trujillo.
Fecha: ___/___/___

El Responsable de HSE no validará el permiso si esta lista de chequeo no ha sido diligenciada totalmente o si verifica el no cumplimiento de todas las recomendaciones.

OBSERVACIONES GENERALES:

SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA SST
CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE SAS

Versión: 01
Fecha aprobación: 05/02/2025

FECHA: 19 / 02 / 2025 — RESPONSABLE: Amanda Trujillo

LUGAR: Palmar de Varela

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL PROYECTO DE REGULACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CIÉNAGAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 293 DEL 2017

SEMANA DEL 13 AL 19 DE Febrero.

		JUEVES			VIERNES			SABADO			LUNES			MARTES			MIERCOLES			OBSERVACIONES:
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
REQUISITOS LEGALES	¿Se ha sociabilizado las políticas de SST,	/			/			/			/			/			/			
	¿Se cuenta con matriz de requisitos legales?	/			/			/			/			/			/			
	¿Incluya un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo y con otros requisitos que haya suscrito la organización?	/			/			/			/			/			/			
	¿Existe la identificación de los requisitos legales, matriz ambiental y de otra índole?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se cuenta con acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se cuenta con un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?	/			/			/			/			/			/			
	¿Existen un documento de SST para mejoramiento continuo?	/			/			/			/			/			/			
PLAN DE EMERGENCIA	¿Existe un documentos para la evolución y valoración de emergencia y la implementación de medidas de control necesarias?	/			/			/			/			/			/			
	¿Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se cuenta con inspección de botiquín y camilla?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se cuenta con inspección de señalización?	/			/			/			/			/			/			
	¿Existe un programa de brigada para la prevención conformada, capacitada y dotada?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se cuenta con un plan de comunicación?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo?	/			/			/			/			/			/			
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	¿Existe un documentos para la Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se ha implementado medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se realizan charlas de riesgo y peligros?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se cuenta con ATS?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se cuenta con verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se evidencias las acciones correctivas?			/			/			/			/			/			/	
	¿Se realizan pausas activas?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se realizan reporte de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral ?			/			/			/			/			/			/	
	¿Se realizan Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales?			/			/			/			/			/			/	
GESTIÓN DE LA SALUD	¿Se cuenta Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se ha realizado de Evaluaciones Médicas Ocupacionales?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se ha realizado inducciones y reinducciones?	/			/			/			/			/			/			
	¿Realizar las actividades de Promoción y Prevención en Salud?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se cuenta restricciones y recomendaciones médico/laborales?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se cuenta medición del ausentismo por causa médica?	/			/			/			/			/			/			
EPP	¿Cuenta con la matriz de EPP?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se ha realizado reporte diario de monitoreo y seguimiento de estado de los EPP?	/			/			/			/			/			/			
	¿Existe un programa de inspección de los EPP?	/			/			/			/			/			/			
INSPECCIONES	¿Se cuenta con un programa de inspecciones?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo de las herramientas manuales?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se cuenta con Preoperacional de equipos eléctricas?			/			/			/			/			/			/	
	¿Se ha realizado las inspecciones de Botiquín de primeros auxilios?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se ha realizado las inspecciones de extintores?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se ha realizado las inspecciones de maquinarias y/o equipos?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se ha realizado las inspecciones de orden y Aseo?	/			/			/			/			/			/			
ORDEN Y ASEO	¿Se cuenta con un programa de orden y aseo?	/			/			/			/			/			/			
	¿Cuenta con puntos ecológicos?	/			/			/			/			/			/			
	¿Cuenta con programa de manejo de residuos?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se cuenta con puntos de acopio de material e insumos?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se realiza seguimiento diario aleatorio de los puesto de trabajo?	/			/			/			/			/			/			
	¿Los campamento se encuentran debidamente señalizados y organizados			/			/			/			/			/			/	
	¿Realizar charlas informativas periódicas respecto de la implementación del orden y aseo	/			/			/			/			/			/			

Firma del contratista: Glory Romero
CC: 1123947747

Firma del Inspector HSE: Amanda Trujillo.
Fecha: ___/___/___

El Responsable de HSE no validará el permiso si esta lista de chequeo no ha sido diligenciada totalmente o si verifica el no cumplimiento de todas las recomendaciones.

OBSERVACIONES GENERALES:

SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA SST
CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE SAS

Versión: 01
Fecha aprobación: 05/02/2025

FECHA: 26 / 02 / 2025 | RESPONSABLE: Amanda Trujillo

LUGAR: Palmar de Varela

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS DEL PROYECTO DE REGULACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CIÉNAGAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALVAR DE VARELA EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 293 DEL 2017

SEMANA DEL 20 AL 26 DE Febrero

		JUEVES			VIERNES			SABADO			LUNES			MARTES			MIERCOLES			OBSERVACIONES:
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
REQUISITOS LEGALES	¿Se ha sociabilizado las políticas de SST.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se cuenta con matriz de requisitos legales?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Incluya un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo y con otros requisitos que haya suscrito la organización?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Existe la identificación de los requisitos legales, matriz ambiental y de otra índole?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se cuenta con acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se cuenta con un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Existen un documento de SST para mejoramiento continuo?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
PLAN DE EMERGENCIA	¿Existe un documentos para la evolución y valoración de emergencia y la implementación de medidas de control necesarias?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se cuenta con inspección de botiquín y camilla?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se cuenta con inspección de señalización?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Existe un programa de brigada para la prevención conformada, capacitada y dotada?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se cuenta con un plan de comunicación?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	¿Existe un documentos para la Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se ha implementado medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se realizan charlas de riesgo y peligros?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se cuenta con ATS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se cuenta con verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se evidencias las acciones correctivas?			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	¿Se realizan pausas activas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se realizan reporte de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral ?			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	¿Se realizan Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales?			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
GESTIÓN DE LA SALUD	¿Se cuenta Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se ha realizado de Evaluaciones Médicas Ocupacionales?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se ha realizado inducciones y reinducciones?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Realizar las actividades de Promoción y Prevención en Salud?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se cuenta restricciones y recomendaciones médico/laborales?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se cuenta medición del ausentismo por causa médica?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
EPP	¿Cuenta con la matriz de EPP?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se ha realizado reporte diario de monitoreo y seguimiento de estado de los EPP?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Existe un programa de inspección de los EPP?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
INSPECCIONES	¿Se cuenta con un programa de inspecciones?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo de las herramientas manuales?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se cuenta con Preoperacional de equipos eléctricas?			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	¿Se ha realizado las inspecciones de Botiquín de primeros auxilios?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se ha realizado las inspecciones de extintores?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se ha realizado las inspecciones de maquinarias y/o equipos?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se ha realizado las inspecciones de orden y Aseo?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
ORDEN Y ASEO	¿Se cuenta con un programa de orden y aseo?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Cuenta con puntos ecológicos?		✓		✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Cuenta con programa de manejo de residuos?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se cuenta con puntos de acopio de material o insumos?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Se realiza seguimiento diario aleatorio de los puesto de trabajo?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Los campamento se encuentran debidamente señalizados y organizados			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	¿Realizar charlas informativas periódicas respecto de la implementación del orden y aseo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			

Firma del contratista Gelary Romero
cc: 1143997747

Firma del Inspector HSE Amanda trujillo.
Fecha: ___/___/___

El Responsable de HSE no validará el permiso si esta lista de chequeo no ha sido diligenciada totalmente o si verifica el no cumplimiento de todas las recomendaciones.

OBSERVACIONES GENERALES:

SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA SST
CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE SAS

Versión: 01
Fecha aprobación: 05/02/2025

FECHA: 5/03/2025 | RESPONSABLE: Amanda Trujillo

LUGAR: Palmar de Varela

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL PROYECTO DE REGULACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CIÉNAGAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 293 DEL 2017

SEMANA DEL 27 de febrero al 5 marzo.

		JUEVES			VIERNES			SABADO			LUNES			MARTES			MIERCOLES			OBSERVACIONES:
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
REQUISITOS LEGALES	¿Se ha sociabilizado las políticas de SST.	/			/			/			/			/			/			
	¿Se cuenta con matriz de requisitos legales?	/			/			/			/			/			/			
	¿Incluya un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo y con otros requisitos que haya suscrito la organización?	/			/			/			/			/			/			
	¿Existe la identificación de los requisitos legales, matriz ambiental y de otra índole?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se cuenta con acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se cuenta con un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?	/			/			/			/			/			/			
	¿Existen un documento de SST para mejoramiento continuo?	/			/			/			/			/			/			
PLAN DE EMERGENCIA	¿Existe un documentos para la evolución y valoración de emergencia y la implementación de medidas de control necesarias?	/			/			/			/			/			/			
	¿Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se cuenta con inspección de botiquín y camilla?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se cuenta con inspección de señalización?	/			/			/			/			/			/			
	¿Existe un programa de brigada para la prevención conformada, capacitada y dotada?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se cuenta con un plan de comunicación?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo?	/			/			/			/			/			/			
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	¿Existe un documentos para la Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se ha implementado medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se realizan charlas de riesgo y peligros?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se cuenta con ATS?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se cuenta con verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores?	/			/			/			/			/						
	¿Se evidencias las acciones correctivas?			/			/			/			/			/			/	
	¿Se realizan pausas activas?	/			/			/			/						/			
	¿Se realizan reporte de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral ?			/			/			/			/	/		/			/	
	¿Se realizan Investigación de incidentes, accidentes y enfermeciades laborales?			/			/			/			/			/			/	
GESTIÓN DE LA SALUD	¿Se cuenta Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se ha realizado de Evaluaciones Médicas Ocupacionales?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se ha realizado inducciones y reinducciones?	/			/			/			/			/			/			
	¿Realizar las actividades de Promoción y Prevención en Salud?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se cuenta restricciones y recomendaciones médico/laborales?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se cuenta medición del ausentismo por causa médica?	/			/			/			/			/			/			
EPP	¿Cuenta con la matriz de EPP?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se ha realizado reporte diario de monitoreo y seguimiento de estado de los EPP?	/			/			/			/			/			/			
	¿Existe un programa de inspección de los EPP?	/			/			/			/			/			/			
INSPECCIONES	¿Se cuenta con un programa de inspecciones?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo de las herramientas manuales?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se cuenta con Preoperacional de equipos eléctricas?			/			/			/			/			/			/	
	¿Se ha realizado las inspecciones de Botiquín de primeros auxilios?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se ha realizado las inspecciones de extintores?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se ha realizado las inspecciones de maquinarias y/o equipos?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se ha realizado las inspecciones de orden y Aseo?	/			/			/			/			/			/			
ORDEN Y ASEO	¿Se cuenta con un programa de orden y aseo?	/			/			/			/			/			/			
	¿Cuenta con puntos ecológicos?	/			/			/			/			/			/			
	¿Cuenta con programa de manejo de residuos?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se cuenta con puntos de acopio de material e insumos?	/			/			/			/			/			/			
	¿Se realiza seguimiento diario aleatorio de los puesto de trabajo?	/			/			/			/			/			/			
	¿Los campamento se encuentran debidamente señalizados y organizados			/			/			/			/			/			/	
	¿Realizar charlas informativas periódicas respecto de la implementación del orden y aseo	/			/			/			/			/			/			

Firma del contratista Gilary Romero
CC: 1123997747

Firma del Inspector HSE Amanda trujillo.
Fecha: ____/____/____

El Responsable de HSE no validará el permiso si esta lista de checueo no ha sido diligenciada totalmente o si verifica el no cumplimiento de todas las recomendaciones.

OBSERVACIONES GENERALES:

-
- Soportes de Seguridad Social

RELACION DE PERSONAL APORTADO POR LA INTERVENTORIA

ITEM	CARGO	NOMBRE	CC	SALARIO	IBC	PENSION	SALUD	C COMP	ARL	PLANILLA
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	8.726.301	$ 7.250.000,00	$ 6.000.000,00		SANITAS		SURA	32868603
2	PROFESIONAL AMBIENTAL	EYLEEN PEREZ MAESTRE	1.065.608.102	$ 5.880.000,00	$ 1.186.250,00	PROTECCION	SANITAS	CONFAMILIAR	SURA	32579628
3	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	GUSTAVO CASTELLAR ARRIETA	80.066.599	$ 4.150.000,00	$ 3.458.334,00	PORVENIR	SALUD TOTA	CONFAMILIAR	SURA	32579628
4	PROFESIONAL SEG INDUSTRIAL	AMANDA TRUJILLO NIÑO	22.668.158	$ 2.300.000,00	$ 3.000.000,00	PORVENIR	SANITAS		SURA	1071312543
5	TOPOGRAFO	JEYSON ALVAREZ BRITO	1.121.042.629	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	PORVENIR	SANITAS	CONFENALCO	SURA	32894324
6	CADENERO 1	TANIA PATRICIA CABRERA PADILLA	1.001.779.481	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	PORVENIR	EPS SURA	CONFAMILIAR	SURA	32579628

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901427201	6	CONSTRU PROYECTOS DEL NORTE SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CR 43 75 54 AP 1 P 3	3153139296	ADMON.CONSTRUPROYECTOS@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	32579628	E	2025-03-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.423.200	19.800	BANCO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
6	32579628	2025-03-04	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 22523559	TORRES RIVERO MILENA	2.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.500.000	400.000	0	0	EPS SURA-EPS010	2.500.000	100.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	2.500.000	100.000	2.500.000	13.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	613.100	S	1711001
2	CC 80066599	CASTELLAR ARRIETA GUSTAVO RAFAEL	4.150.000	F	X															0			25	25	25	25	PORVENIR-230301	3.458.334	553.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	3.458.334	138.400	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	3.458.334	138.400	3.458.334	240.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.071.000	S	5711001
3	CC 1001779481	CABRERA PADILLA TANIA PATRICIA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1701001
4	CC 1065608102	PEREZ MAESTRE EYLEEN TATIANA	1.423.500	F	X															0			25	25	25	25	PROTECCION-230201	1.186.250	189.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.186.250	47.500	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	1.186.250	47.500	1.186.250	82.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	367.400	S	5711001
5	CC 1140867122	QUINTANILLA MONSALVE ANDREA FERNANDA	3.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.300.000	528.000	0	0	EPS SURA-EPS010	3.300.000	132.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	3.300.000	132.000	3.300.000	229.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.021.700	S	1701001
6	CC 1143439582	VILLAR PADILLA JEFREY ELIAS	4.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.000.000	640.000	0	0	EPS SURA-EPS010	4.000.000	160.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	4.000.000	160.000	4.000.000	20.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	980.900	S	5711001

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901427201	6	CONSTRU PROYECTOS DEL NORTE SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CR 43 75 54 AP 1 P 3		3153139296			ADMON.CONSTRUPROYECTOS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	32579628	E	2025-03-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.423.200	19.800	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	32579628	2025-03-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
15.868.084	15.868.084	15.868.084	15.868.084	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				6	2.539.000	0	11.300	0	2.550.300
PORVENIR	230301	800224808	8	3	1.181.200	0	5.200	0	1.186.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	640.000	0	2.900	0	642.900
PROTECCION	230201	800229739	0	2	717.800	0	3.200	0	721.000
EPS(Administradoras: 3)				6	634.900	0	3.000	0	637.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	47.500	0	300	0	47.800
EPS SURA	EPS010	800088702	2	4	449.000	0	2.000	0	451.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	138.400	0	700	0	139.100
ARP(Administradoras: 1)				6	594.600	0	2.700	0	597.300
ARL SURA	14-11	890903790	5	6	594.600	0	2.700	0	597.300
CCF(Administradoras: 1)				6	634.900	0	2.800	0	637.700
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890101994	9	6	634.900	0	2.800	0	637.700
Gran Total					4.403.400	0	19.800	0	4.423.200

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 8726301	0	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CALLE 45F 18-94		3107115296			INGMAROGO@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	32868603	I	2025-03-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.179.400	11.800	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32868603	2025-03-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 8726301	RODRIGUEZ GOMEZ MANUEL DE JESUS	6.000.000		X															0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	6.000.000	750.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	6.000.000	417.600	0,06960	0	0	0	0	0	57	4	1.167.600	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 8726301	0	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CALLE 45F 18-94		3107115296			INGMAROGO@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	32868603	I	2025-03-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.179.400	11.800	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32868603	2025-03-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	6.000.000	6.000.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS(Administradoras: 1)				1	750.000	0	7.600	0	757.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	750.000	0	7.600	0	757.600
ARP(Administradoras: 1)				1	417.600	0	4.200	0	421.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	417.600	0	4.200	0	421.800
Gran Total					1.167.600	0	11.800	0	1.179.400

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901427201	6	CONSTRU PROYECTOS DEL NORTE SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CR 43 75 54 AP 1 P 3		3153139296			ADMON.CONSTRUPROYECTOS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	32894324	E	2025-03-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	371.000	3.600	BANCO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	32894324	2025-03-04	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1121042629	ALVAREZ BRITO JEISON DAVID	1.423.500	F	X															0			25	25	25	25	PORVENIR-230301	1.186.250	189.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.186.250	47.500	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	1.186.250	47.500	1.186.250	82.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	367.400	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901427201	6	CONSTRU PROYECTOS DEL NORTE SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CR 43 75 54 AP 1 P 3		3153139296			ADMON.CONSTRUPROYECTOS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	32894324	E	2025-03-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	371.000	3.600	BANCO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	32894324	2025-03-04	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.186.250	1.186.250	1.186.250	1.186.250	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	189.800	0	1.800	0	191.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	189.800	0	1.800	0	191.600
EPS(Administradoras: 1)				1	47.500	0	500	0	48.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	47.500	0	500	0	48.000
ARP(Administradoras: 1)				1	82.600	0	800	0	83.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	82.600	0	800	0	83.400
CCF(Administradoras: 1)				1	47.500	0	500	0	48.000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890480023	7	1	47.500	0	500	0	48.000
Gran Total					367.400	0	3.600	0	371.000

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-20, 02:14:45 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1071312543

Periodo Cotización: febrero de 2025 **Periodo Servicio:** febrero de 2025

PAGADO 20/03/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	AMANDA TRUJILLO NINO		
Documento	CC22668158	**Dirección**	CR 9G #128 - 165 TORRE 11 APT 302
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3566978
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 22668158	AMANDA TRUJILLO NINO	57	00	X																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.000.000	$ 375.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.063.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 0	$ 480.000	$ 375.000	$ 208.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.063.800	$ 4.200	$ 1.068.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

RELACION DE PERSONAL APORTADO POR EL CONTRATISTA

ITEM	CARGO	NOMBRE	CC	SALARIO	IBC	PENSION	SALUD	C COMP	ARL	PLANILLA
1	Director de obra	Roque Muñoz	91.281.627	$ 8.035.900,00	$ 8.035.900,00	COLPENSIONES	EPS SURA	COMFAMILIAR	COLMEDA	76812440
2	Residente de obra	Humberto Maldonado	1.129.524.877	$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00	PORVENIR	EPS SURA	COMFAMILIAR	COLMEDA	76875183
3	Especialista Ambiental	Juan Miguel Hernández	1.118.848.009	$ 1.186.250,00	$ 1.186.250,00	PROTECCION	SANITAS	COMFAMILIAR	COLMEDA	76824114
4	Residente ambiental	Sonia González	1.140.885.236	$ 1.920.000,00	$ 1.920.000,00	PORVENIR	SANITAS	COMFAMILIAR	COLMEDA	75682813
5	Biólogo	Darío Vega	85.476.492	$ 4.714.285,00	$ 4.714.285,00	COLPENSIONES	SANITAS	COMFAMILIAR	COLMEDA	76824114
6	Aux. flora y fauna	Osman Aragón	1.004.353.345	$ 2.985.712,00	$ 2.985.712,00	COLPENSIONES	ADRES	COMFAMILIAR	COLMEDA	76824114
7	Ing. Pesquero	Rafael Rubio	72.302.363	$ 1.186.250,00	$ 1.186.250,00	COLFONDOS	SANITAS	COMFAMILIAR	COLMEDA	76824114
8	Supervisor SISO	Gilary Romero	1.123.997.747	$ 1.186.250,00	$ 1.186.250,00	PORVENIR	FAMISANAR	COMFAMILIAR	COLMEDA	76824114
9	Residente Social	Luz Marina Barraza	32.876.840	$ 1.425.000,00	$ 1.425.000,00	PROTECCION	EPS SURA	COMFAMILIAR	COLMEDA	76824114
10	Topografo	Marvin Arregoces	1.118.805.770	$ 806.650,00	$ 806.650,00	PROTECCION	SANITAS	COMFAMILIAR	POSITIVA	84771178
11	Cadenero	Ekliss Gil Viloria	1.131.070.566	$ 806.650,00	$ 806.650,00	PROTECCION	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	POSITIVA	84771178
12	Conductor Camioneta	Jhon Carlos Troconiz Gómez	3.821.255	$ 806.650,00	$ 806.650,00	PORVENIR	SALUD TOTA	COMFAMILIAR	COLMEDA	75948662
13	Operador de motoniveladora	Cesar Cabarcas	1.043.017.263	$ 2.587.200,00	$ 2.587.200,00	PORVENIR	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	COLMEDA	75948662
14	Operador Retroexcavadora	Luis Molina Brochero	8.729.191	$ 2.110.827,00	$ 2.110.827,00	COLPENSIONES	EPS SURA	COMFAMILIAR	COLMEDA	75948662

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-21, 01:16:50 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 76812440

Periodo Cotización: febrero de 2025 **Periodo Servicio:** marzo de 2025

PAGADO 17/03/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL 01		
Documento	NI901893943	**Dirección**	CR 53 #110 BC - 00 BC EMPRESARIAL
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3853677
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal	VECINO VILLARREAL JOSE MARIA	**Identificación**	CC 72162008
Total Afiliados	1	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 91281627	ROQUE MAURICIO MUÑOZ BARRERA	01	00	X																0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.635.900	$ 1.468.200	(EPS010) EPS SURA	$ 8.635.900	$ 345.500	6,960	$ 8.635.900	$ 601.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 8.635.900	$ 345.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.760.300
CC 91281627	ROQUE MAURICIO MUÑOZ BARRERA	01	00											X						0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 616.850	$ 74.100	(EPS010) EPS SURA	$ 616.850	$ 0	0,000	$ 616.850	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 9.252.750	$ 9.252.750	$ 9.252.750	$ 8.635.900	$ 1.542.300	$ 345.500	$ 601.100	$ 345.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.834.400	$ 9.100	$ 2.843.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901081028-0	CUESTECITEROS PROFESIONALES	CL 2 15 81 CORR CUESTECITA	3176591068	cuesteciterosprofesionales@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			LA GUAJIRA	ALBANIA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E		84771178	$507.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	32.300	0		0		0	0	0	0	32.300	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.900	0		0		0	0	0	0	1.900	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	32.300	0		0		0	0	0	0	32.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	129.100	0	0	0	0	0	0		129.100	1
230301	Porvenir	800224808-8	129.100	0	0	0	0	0	0		129.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	115.800				115.800	0	0	115.800			1.158	115.800	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF30	Caja Fliar La Guajira	892115006-5	66.500	0	0	66.500	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	66.500	66.500
Pensión	2	258.200	258.200
Riesgos Laborales	1	115.800	115.800
CCF	1	66.500	66.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	507.000	507.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901081028-0	CUESTECITEROS PROFESIONALES		CL 2 15 81 CORR CUESTECITA	3176591068	cuesteciterosprofesionales@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			LA GUAJIRA	ALBANIA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E		84771178	$507.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1118805770	ARREGOCES LOPEZ MARVIN SILFREDO	1	0			S	X																230301	806.650	129.100	0	0	0	0	EPS005	806.650	32.300	14-23	806.650	5	56.200	CCF30	806.650	32.300	0	0	0	0	0
2	CC	1131070566	GIL VILORIA EKLISS JOSE	1	0			S	X																230201	806.650	129.100	0	0	0	0	EPS037	806.650	32.300	14-23	806.650	5	56.200	CCF30	806.650	32.300	0	0	0	0	0
3	CC	19360273	AVILA ARENAS JOSE RODRIGO	1	1			S	X	X																0	0	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF30	47.450	1.900	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-21, 01:17:25 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 76824114

Periodo Cotización: febrero de 2025 **Periodo Servicio:** marzo de 2025

PAGADO 17/03/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL02		
Documento	NI901896859	**Dirección**	CR 53 #110 BC - 00 BC EMPRESARIAL
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3853677
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal	VECINO VILLARREAL JOSE MARIA	**Identificación**	CC 72162008
Total Afiliados	7	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1004353345	OSMAN DAVID ARAGON POLO	01	00	X																0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.985.712	$ 477.800	(MIN001) ADRES MIN001	$ 2.985.712	$ 119.500	6,960	$ 2.985.712	$ 207.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.985.712	$ 119.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 924.700
CC 1118848009	JUAN MIGUEL HERNANDEZ RANGEL	01	00	X																0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION	$ 1.186.250	$ 189.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.186.250	$ 47.500	6,960	$ 1.186.250	$ 82.600	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.186.250	$ 47.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.400
CC 1123997747	GILARI ODETTE ROMERO CELEDON	01	00	X																0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.186.250	$ 189.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.186.250	$ 47.500	6,960	$ 1.186.250	$ 82.600	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.186.250	$ 47.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.400
CC 32876840	LUZ MARINA BARRAZA PACHECO	01	00	X																0	19	19	19	19	(230201) PROTECCION	$ 1.425.000	$ 228.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.425.000	$ 57.000	6,960	$ 1.425.000	$ 99.200	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.425.000	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.200
CC 72302363	RAFAEL GUILLERMO RUBIO JIMENO	01	00	X																0	25	25	25	25	(231001) COLFONDOS	$ 1.186.250	$ 189.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.186.250	$ 47.500	6,960	$ 1.186.250	$ 82.600	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.186.250	$ 47.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.400
CC 85476492	DARIO VEGA DIAZ	01	00	X																0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.714.285	$ 754.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.714.285	$ 188.600	6,960	$ 4.714.285	$ 328.200	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 4.714.285	$ 188.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.459.700
CC 91281627	ROQUE MAURICIO MUÑOZ BARRERA	01	00	X																0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.635.900	$ 1.468.200	(EPS010) EPS SURA	$ 8.635.900	$ 345.500	6,960	$ 8.635.900	$ 601.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 8.635.900	$ 345.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.760.300
CC 91281627	ROQUE MAURICIO MUÑOZ BARRERA	01	00											X						0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 616.850	$ 74.100	(EPS010) EPS SURA	$ 616.850	$ 0	0,000	$ 616.850	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 21.936.497	$ 21.936.497	$ 21.936.497	$ 21.319.647	$ 3.571.800	$ 853.100	$ 1.484.200	$ 853.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.762.200	$ 13.200	$ 6.775.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-03-21, 01:20:30 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 76875183

Periodo Cotización 202502 **Periodo Servicio** 202503

PAGADA 2025-03-20 10:48:38.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	TICOM				
Documento	NI 830509276	**Dirección**	METROPARQUE BODM1-24		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3288603		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO		
Representante Legal	VECINO VILLAREAL JOSEMARIA MARIA	**Identificación**	CC 72162008		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1129524877		**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00	MALDONADO AREVALO HUMBERTO CARLOS	8001000 - 08		ATLANTICO

Residente: | Exonerado: S

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
		X													0	30	30	30	30			F	$ 6.500.000	230201		16 %	$ 6.500.000	$ 1.040.000	$ 32.500	$ 32.500	EPS048		4 %	$ 6.500.000	$ 260.000	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 6.500.000	$ 452.400	CCF07	4 %	$ 6.500.000	$ 260.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS MUTUAL SER	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.040.000	$ 32.500	$ 32.500	$ 260.000	$ 452.400	$ 260.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.077.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-02-07, 10:22:59 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 75948662

Periodo Cotización: enero de 2025 **Periodo Servicio:** febrero de 2025

PAGADO 06/02/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MACROEQUIPOS LAND SAS	**Nombre Sucursal**	EQUIPOS	**Código Sucursal**	OP001
Documento	NI901301115	**Dirección**	CRV 22 #1 - 22 METROPARQUE BOD M1 - 22		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3228603		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO		
Representante Legal	VECINO VILLAREAL JOSE MARIA	**Identificación**	CC 72162008		
Total Afiliados	26	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1038097776	LUIS GUILLERMO TRESPALACIOS ACEVEDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.900.000	$ 304.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.900.000	$ 76.000	6,960	$ 1.900.000	$ 132.300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 588.300
CC 1043017263	CESAR ANTONIO CABARCAS MENDOZA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.587.200	$ 414.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.587.200	$ 103.500	6,960	$ 2.587.200	$ 180.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.587.200	$ 103.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 801.100
CC 1045235310	JESUS ALBERTO JULIO JIMENEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.284.800	$ 365.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.284.800	$ 91.400	6,960	$ 2.284.800	$ 159.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.284.800	$ 91.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 707.500
CC 11075728	DOMINGO EMIGDIO GONZALEZ ALEAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.993.600	$ 319.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.993.600	$ 79.800	6,960	$ 1.993.600	$ 138.800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.993.600	$ 79.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 617.400
CC 1143381261	JEIDER ALBERTO AYOLA ORTEGA	01	00																	0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 1.203.333	$ 192.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.203.333	$ 48.200	6,960	$ 1.203.333	$ 83.800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.203.333	$ 48.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 372.800
CC 1143381261	JEIDER ALBERTO AYOLA ORTEGA	01	00														X			0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 696.667	$ 111.500	(EPS010) EPS SURA	$ 696.667	$ 27.900	0,000	$ 696.667	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 696.667	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167.300
CC 1151188856	YANCARLOS DIAZ BARON	01	00	X																0	7	7	7	7	(231001) COLFONDOS	$ 381.500	$ 61.100	(EPS048) EPS MUTUAL SER	$ 381.500	$ 15.300	6,960	$ 381.500	$ 26.600	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.103.080	$ 44.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.200
CC 1151188856	YANCARLOS DIAZ BARON	01	00												X					0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 54.501	$ 8.800	(EPS048) EPS MUTUAL SER	$ 54.501	$ 2.200	0,000	$ 54.501	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.000
CC 1234888624	HUMBERTO JUNIOR ESCORCIA VELASCO	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 17952061	JOSE LUIS VILORIA USTARIS	01	00																	0	16	16	16	16	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.290.667	$ 206.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.290.667	$ 51.700	6,960	$ 1.290.667	$ 89.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.290.667	$ 51.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 399.900
CC 17952061	JOSE LUIS VILORIA USTARIS	01	00														X			0	14	14	14	14	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.129.334	$ 180.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.129.334	$ 45.200	0,000	$ 1.129.334	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.129.334	$ 45.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.100
CC 3738929	ROBINSON FARITH GOENAGA GOENAGA	01	00																	0	24	24	24	24	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.308.000	$ 209.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.308.000	$ 52.400	6,960	$ 1.308.000	$ 91.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.308.000	$ 52.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.200
CC 3738929	ROBINSON FARITH GOENAGA GOENAGA	01	00											X						0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 327.000	$ 39.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 327.000	$ 0	0,000	$ 327.000	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.300
CC 3821255	JHON CARLOS TROCONIS GOMEZ	01	00	X																0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 806.650	$ 129.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 806.650	$ 32.300	6,960	$ 806.650	$ 56.200	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 806.650	$ 32.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.900
CC 72014572	ALVARO ENRIQUE SILVERA HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.475.200	$ 396.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.475.200	$ 99.100	6,960	$ 2.475.200	$ 172.300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.475.200	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 766.600
CC 72144924	OSCAR DE JESUS PAREDES DURANGO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.497.600	$ 399.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.497.600	$ 100.000	6,960	$ 2.497.600	$ 173.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.497.600	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 773.600
CC 72154403	EDGAR JOSE GARCIA MORALES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.475.200	$ 396.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.475.200	$ 99.100	6,960	$ 2.475.200	$ 172.300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.475.200	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 766.600
CC 72157900	ROBERTO CARLOS ROMERO FELIZZOLA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.993.600	$ 319.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.993.600	$ 79.800	6,960	$ 1.993.600	$ 138.800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.993.600	$ 79.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 617.400
CC 72166813	LUIS EDUARDO MIZZAR MEZA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.635.200	$ 261.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.635.200	$ 65.500	6,960	$ 1.635.200	$ 113.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.635.200	$ 65.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 506.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 06/02/2025 **Empresa NI901301115 MACROEQUIPOS LAND SAS** **Planilla Nro: 75948662** **Periodo Cotización: enero de 2025** **Periodo Servicio: febrero de 2025**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 72202834	EDINSON ALONSO ABREU BLANCO	01	00													L				0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 49.280	$ 7.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 49.280	$ 2.000	0,000	$ 49.280	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 49.280	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.900
CC 72202834	EDINSON ALONSO ABREU BLANCO	01	00												X					0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 739.200	$ 118.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 739.200	$ 29.600	0,000	$ 739.200	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 739.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.900
CC 72202834	EDINSON ALONSO ABREU BLANCO	01	00												X					0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 147.840	$ 23.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 147.840	$ 6.000	0,000	$ 147.840	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 147.840	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.700
CC 72202834	EDINSON ALONSO ABREU BLANCO	01	00													X				0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 197.120	$ 31.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 197.120	$ 7.900	0,000	$ 197.120	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 197.120	$ 7.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.400
CC 72202834	EDINSON ALONSO ABREU BLANCO	01	00																	0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 344.960	$ 55.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 344.960	$ 13.800	6,960	$ 344.960	$ 24.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 344.960	$ 13.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.900
CC 72238056	FREDDYS ARMANDO VALDEZ ESCORCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.635.000	$ 261.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.635.000	$ 65.400	6,960	$ 1.635.000	$ 113.800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.635.000	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 506.200
CC 72239235	VICTOR MANUEL DIAZ ZABALA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.650.000	$ 264.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.650.000	$ 66.000	6,960	$ 1.650.000	$ 114.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.900
CC 72241348	HICLES ABEL BALLESTEROS SERNA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 72244084	GASPAR ARAEL CALVO HERRERA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.475.200	$ 396.100	(EPS010) EPS SURA	$ 2.475.200	$ 99.100	6,960	$ 2.475.200	$ 172.300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.475.200	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 766.600
CC 72244085	JOSE DARIO MORENO QUINTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.710.400	$ 433.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.710.400	$ 108.500	6,960	$ 2.710.400	$ 188.700	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.710.400	$ 108.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 839.400
CC 72308083	RUBEN LEONIDAS MORENO QUINTERO	01	00						X											0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.153.387	$ 344.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.153.387	$ 86.200	6,960	$ 2.153.387	$ 149.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.153.387	$ 86.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 666.900
CC 72308083	RUBEN LEONIDAS MORENO QUINTERO	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 153.814	$ 24.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 153.814	$ 6.200	0,000	$ 153.814	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.900
CC 8568575	MARIO ALBERTO OROZCO BUSTILLO	01	00	X																0	14	14	14	14	(230201) PROTECCION	$ 763.094	$ 122.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 763.094	$ 30.600	6,960	$ 763.094	$ 53.200	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 763.094	$ 30.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.500
CC 8729191	LUIS CARLOS MOLINA BROCHERO	01	00																	0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.110.827	$ 337.800	(EPS010) EPS SURA	$ 2.110.827	$ 84.500	6,960	$ 2.110.827	$ 147.000	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.110.827	$ 84.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 653.800
CC 8729191	LUIS CARLOS MOLINA BROCHERO	01	00																	8	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 767.574	$ 122.900	(EPS010) EPS SURA	$ 767.574	$ 30.800	0,000	$ 767.574	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 153.700
CC 8742576	LUIS ALBERTO CHING CACERES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.993.600	$ 319.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.993.600	$ 79.800	6,960	$ 1.993.600	$ 138.800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.993.600	$ 79.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 617.400
CC 92250208	JADER JOSE VITAL ACOSTA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.635.200	$ 261.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.635.200	$ 65.500	6,960	$ 1.635.200	$ 113.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.635.200	$ 65.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 506.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 49.413.548	$ 49.413.548	$ 49.413.548	$ 48.832.239	$ 7.894.700	$ 1.965.300	$ 3.143.900	$ 1.919.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.923.300	$ 0	$ 14.923.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

-
- Planos topografías
