OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE UN PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 13 NO. 2 - 32/34, COMÚNMENTE DENOMINADO "PUEBLITO CRIOLLO" DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA.

INFORME DE SUPERVISION No. 01 FINAL

LINO RODRIGUEZ OCHOA

SUPERVISOR TÉCNICO

MARTHA JULIETH MORENO BAQUER

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO Y FINACNIERO

MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

TAURAMENA 2025

FECHA: 22/05/2024

INFORME DE SUPERVISION No. 01 FINAL

CONTRATO No.	595 del 20 de diciembre del 2024
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Obra Pública
OBJETO	OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE UN PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 13 NO. 2 - 32/34, COMÚNMENTE DENOMINADO "PUEBLITO CRIOLLO" DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ C.C. o NIT: 79799614-9
R/LEGAL	N.A. C.C.: N.A.
SUPERVISOR TÉCNICO	LINO RODRIGUEZ OCHOA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO
APOYO SUPERVISIÓN	N.A. Contrato No. N.A.
VALOR CONTRATO	$36,346,739.00
FECHA INICIACIÓN	27 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINACIÓN	17 DE MARZO DE 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN	27 A 31 DE DICIEMBRE DE 2024; 11 A 17 DE MARZO DE 2025
% AVANCE FINANCIERO	99.87%
% AVANCE FISICO	99.87%
FECHA PRESENTE INFORME	22 DE MAYO DE 2025

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, y demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en el literal No. 6 del Contrato de obra pública No. 595 del 20 de diciembre del 2024; me permito rendir en el presente informe el seguimiento sobre el cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. EJECUCIÓN FÍSICIA (CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES)

ACTIVIDAD DESARROLLADA	RESULTADOS OBTENIDOS
Desmonte de barandas y pasamanos en madera.	Desmonte de aproximadamente 49 metros lineales de barandas en madera.
Desmonte de cielo raso con retiro.	Desmonte de 11 m2 de cielo raso en dos salones del segundo piso del Pueblito Criollo.
Baranda en acero inoxidable 1 hilo D=1 1/2 +2 hilos D= 1/2 H prom 0.90 m Cal 18. Incluye soportes y anclajes a todo costo instalada.	Instalación de aproximadamente 49 metros de barandas en acero inoxidable con soportes y anclajes.
Rejilla removible en platina de 2x1/4" hueco de 3" para tapa o pasarela función de inspección y limpieza o drenaje (in. Marco y contramarco) e instalación.	Instalación de 3 rejillas (1.35 m2) en hierro de 2 x 1/4" con hueco de 3" en los drenajes.

Escalera gato en angulo 2"x 1/8" suministro e instal.	Instalación de 3.10 mts de escalera en hierro de 2" x 1/8", para el acceso al tanque aéreo.
Cerrojo seguridad doble cilindro para puerta de acceso. Suministro e instal.	No se instaló ni se suministró este ítem, pues se realizaron maximas y menores cantidades para reparar mas grietas y goteras identificadas en la ejecución del ítem de impermeabilización.
Suministro e instalación de lámina para cielo raso en superboard pintado 8mm con vinitex o similar calidad.	Se instaló lámina para cielo raso en superboard con pintura Viniltex para mejorar la durabilidad, en una cantidad de 11 m2.
Impermeabilización con mortero acrílico reforzado con fibras para tanques y piscinas E= 2 mm.	Se impermeabilizó dentro del tanque, y en la superfiice de la placa superior, un total de 55.25 m2.
VISITAS O INSPECCIONES REALIZADAS 2	

2. GARANTÍAS

El contratista presentó las siguientes garantías para el inicio del contrato:	SI	NO	N.A	FECHA APROBACIÓN
Cumplimiento	X			26/12/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	X			26/12/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	X			26/12/2024
Responsabilidad civil extracontractual	X			26/12/2024

PÓLIZA N°	COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		MODIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FIN	
166974	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.S.	Cumplimiento	$3,634,673.90	20/12/2024	08/05/2025	N.A.
		Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$18,173,369.50	20/12/2024	08/05/2025	N.A.
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$1,817,336.95	20/12/2024	08/01/2025	N.A.
16143	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.S.	Responsabilidad civil extracontractual	$260,000,000.00	20/12/2024	08/01/2025	N.A.

El contratista presentó las siguientes garantías para el reinicio del contrato:	SI	NO	N.A	FECHA APROBACIÓN
Cumplimiento	X			21/04/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	X			21/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	X			21/04/2025
Responsabilidad civil extracontractual	X			21/04/2025

PÓLIZA N°	COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		MODIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FIN	
166974	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.S.	Cumplimiento	$3,634,673.90	20/12/2024	18/07/2025	N.A.
		Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$18,173,369.50	20/12/2024	18/07/2025	N.A.
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$1,817,336.95	20/12/2024	19/03/2025	N.A.
16143	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.S.	Responsabilidad civil extracontractual	$284,700,000.00	20/12/2024	20/03/2025	N.A.

3. EJECUCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
		ANTICIPADO		
Valor contratado	$36,346,739.00			
Valor Anticipo o Pago Anticipado		$18,173,369.00		$18,173,369.00
Valor Adicional No. XXX				
Valor presente Acta		-$18,173,369.00	$36,299,436.00	$18,126,067.00
Saldo por ejecutar			$47,303.00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	**$36,346,739.00**		**$36,346,739.00**	**$36,299,436.00**

4. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

No se materializó ningún riesgo previsto dentro de la matriz de riesgos del proceso precontractual.

5. DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN

DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
ACTA DE INICIO	27/12/2024
ACTA DE SUSPENSIÓN N°(1)	31/12/2024
ACTA DE AMPLIACIÓN N°(1) SUSPENSIÓN N°(1)	20/01/2025
ACTA DE AMPLIACIÓN N°(2) SUSPENSIÓN N°(1)	07/02/2025
ACTA DE REINICIO N° (1)	11/03/2025
ACTA DE TERMINACIÓN	17/03/2025
ACTA DE RECIBO FINAL	22/05/2025
INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA	19/05/2025

Se deja constancia, que el Contratista hizo entrega de: **Informe Final** con sus respectivos soportes como copia de pagos de seguridad social del personal vinculado a la obra, registros fotográficos, balance de cantidades ejecutadas, descripción de actividades realizadas, pago de contribución FIC, certificado de paz y salvo de personería, los cuales se remiten a la oficina Asesora de Jurídica del Municipio, para que reposen en el expediente del contrato.

REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR	BUENO	PUNTAJE:	96	

6. ANEXOS

1. Anexo 1. Descripción de actividades realizadas
2. Anexo 2. Registros Fotográficos
3 Anexo 3. Balance de cantidades ejectudas
4 Anexo 4. Gráfica de ejecución
5 Anexo 5. Programa de seguimiento

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Cargo: SUPERVISOR TÉCNICO

MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO
Cargo: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ANEXO 1
INFORME DE SUPERVISION No. 01 FINAL

OBJETO	OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE UN PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 13 NO. 2 - 32/34, COMÚNMENTE DENOMINADO "PUEBLITO CRIOLLO" DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ C.C. o NIT: 79799614-9
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO
SUPERVISOR TÉCNICO	LINO RODRIGUEZ OCHOA

DESCRIPCION DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1 *Desmonte de barandas y pasamanos en madera.*

Durante la ejecución de la primera actividad, correspondiente al desmontaje o desinstalación de las barandas de madera ubicadas en el segundo piso del establecimiento, se llevó a cabo la medición final del material retirado, la cual arrojó un total de 48,9 metros lineales. Este valor resultó ser ligeramente inferior al estimado inicialmente.

La intervención se realizó utilizando herramientas menores, siguiendo en todo momento los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de trabajos. Las barandas desmontadas fueron trasladadas al primer piso para su disposición final, sin que se presentaran inconvenientes durante el proceso.

2 *Desmonte de cielo raso con retiro.*

Al llegar al sitio, correspondiente a los dos salones ubicados en el segundo piso del bloque de la edificación "Pueblito Criollo", se constató la presencia de humedad previamente registrada en las actas de visita técnica elaboradas durante la fase de diagnóstico del proyecto. Esta afectación fue ocasionada por la infiltración de agua de lluvia a través de la cubierta, lo que generó deterioro en el cielo raso de dichas áreas.

Ante esta situación, se procedió a ejecutar el retiro del material dañado, aplicando los procedimientos establecidos para este tipo de intervención, y empleando herramienta menor. El desmontaje del cielo raso afectado se realizó de forma manual, en las áreas previamente vistas.

La actividad se llevó a cabo sin presentar inconvenientes durante su ejecución.

3 *Baranda en acero inoxidable 1 hilo D=1 1/2 +2 hilos D= 1/2 H prom 0.90 m Cal 18. Incluye soportes y anclajes a todo costo instalada.*

Una vez finalizado el desmonte total de las barandas de madera por parte del contratista, y adquirido en su totalidad el insumo correspondiente al ítem descrito (incluyendo todos los accesorios, soportes y anclajes necesarios), se procedió, mediante el uso de herramienta menor, a la instalación de 48,9 metros lineales de baranda en acero inoxidable.

La instalación se realizó conforme a las especificaciones técnicas establecidas en la planeación del proceso, cumpliendo con los requisitos de diámetro, calibre y demás características técnicas definidas en los planos y fichas del proyecto.

La ejecución de esta actividad se desarrolló sin presentar inconvenientes técnicos, logrando una correcta fijación y alineación de los elementos instalados, garantizando su funcionalidad y estabilidad estructural.

4	***Rejilla removible en platina de 2x1/4" hueco de 3" para tapa o pasarela función de inspección y limpieza o drenaje (in. Marco y contramarco) e instalación.***

Previamente a la ejecución del ítem que nos hace referencia, se acompañó al contratista en la inspección al momento de medir las dimensiones del especio a ocupar con la rejilla, la cual, su diametro de espesores, distancias y demás dimensiones, debían obedecer a las dispuestas dentro del APU del ítem, por tanto, en el momento de ser elaborada, debía guardar similitudes con las demás del recinto, pues, estas poseen las mismas especificaciones de las que hacen parte del proceso; las cantidades contratadas por metro cuadrádo, correspondían a tres rejillas en sitio, en el momento de su puesta se usaron los equipos y demás herramienta menor planificada, y sin ningún inconveniente se logró su instalación.

5	***Escalera gato en angulo 2"x 1/8" suministro e instal.***

Para la ejecución de este ítem, se realizó el acompañamiento con el contratista, teniendo en cuenta que, ya existían unas condiciones aprobadas para la contratación de este ítem, las cuales, hacen parte dentro de las memorias de cantidades y del presupuesto oficial, no obstante, era necesario medir nuevamente para corroborar y verificar tanto las dimensiones como la distancia, y los puntos de anclaje para el apoyo de la escalera en la pared, posterior a lo anterior, se mandó a elaborar la escalera tomando en cuenta las medidas, al tener los insumos en sitio, se procedió a realizar la instalación y anclaje de la escalera gato en ángulo, esta se pudo realizar sin ningún inconveniente.

6	***Cerrojo seguridad doble cilindro para puerta de acceso. Suministro e instal.***

Durante la ejecución del contrato, se evidenció un avanzado estado de deterioro en la placa superior del tanque aéreo de la edificación, el cual tiene como función el almacenamiento de agua para el funcionamiento de la sede. Dicho deterioro facilitaba la infiltración de un volumen considerable de agua lluvia, lo que generaba manifestaciones patológicas asociadas a la humedad tanto en la estructura como en los acabados interiores, y que se pueden divisar considerablemente en los salones del segundo piso.

Ante esta situación, y considerando la necesidad de mitigar dichas afectaciones, se determinó ajustar las cantidades de obra mediante máximas y menores cantidades de obra, con el fin de ampliar el área a impermeabilizar en la superficie de la placa del tanque aéreo. Esta medida tuvo como propósito aumentar la cobertura del tratamiento impermeabilizante y, en consecuencia, reducir al máximo posible las filtraciones presentes.

7	***Suministro e instalación de lámina para cielo raso en superboard pintado 8mm con vinitex o similar calidad.***

Para la ejecución del ítem, se tomaron las medidas del cielo raso a instalar, luego de haber desmontado el que existia, y que estaba ya afectado por las condiciones de humedad. Con las cantidades corroboradas se adquirió el insumo de lámina en superboard, y haciendo uso de la herramienta menor se realizó el procedimiento para la instalación y aplicación de pintura Vinitex, para proporcionarle a las láminas cubrimiento y la máxima durabilidad. Al realizar esta actividade no se presentó ningún inconveniente.

8	***Impermeabilización con mortero acrílico reforzado con fibras para tanques y piscinas E= 2 mm.***

Para la ejecución de esta actividad, el personal técnico ingresó al interior del tanque aéreo en concreto. En primera instancia, se procedió al vaciado del mismo, el cual contenía una lámina de agua residual. Una vez desocupado el interior, se inició la remoción manual del recubrimiento anterior de mortero, utilizando herramienta menor adecuada para este tipo de trabajo, como cinceles, espátulas y martillos.

Finalizada la remoción, se realizó una limpieza exhaustiva del interior del tanque con el fin de eliminar polvo, partículas sueltas y residuos que pudieran afectar la adherencia del nuevo material. Posteriormente, se preparó la mezcla de mortero acrílico, siguiendo estrictamente las especificaciones técnicas del proceso constructivo y las recomendaciones del fabricante del producto.

Al obtener una mezcla homogénea, se procedió con su aplicación sobre las paredes internas del tanque en capas uniformes de aproximadamente 2 mm de espesor, asegurando una cobertura continua y sin discontinuidades. Finalizada la aplicación en el interior, se extendió la intervención a la placa superior del tanque, la cual era una de las causantes de tanta filtraciones de agua lluvia dentro de la estructura.

La actividad fue ejecutada de acuerdo con los protocolos técnicos establecidos y no se presentaron inconvenientes durante su desarrollo.

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Cargo: SUPERVISOR TÉCNICO

MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO
Cargo: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 01 FINAL


OBJETO	OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE UN PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 13 NO. 2 - 32/34, COMÚNMENTE DENOMINADO "PUEBLITO CRIOLLO" DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ C.C. o NIT: 79799614-9
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO
SUPERVISOR TÉCNICO	LINO RODRIGUEZ OCHOA

INFORME FOTOGRAFICO


FOTOGRAFÍA No. 1
Estado final del cielo raso con material de lámina en superboard, finalizado y pintado con Viniltex.

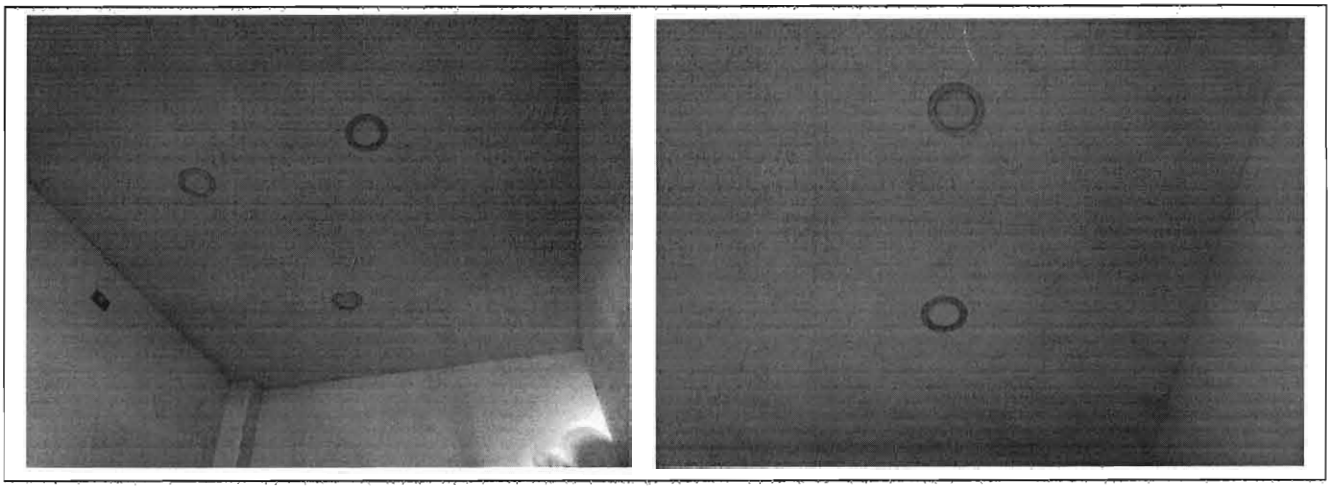


FOTOGRAFÍA No. 2
Barandas en acero inóxidables instaladas, con las especificaciones técnicas requieridas.

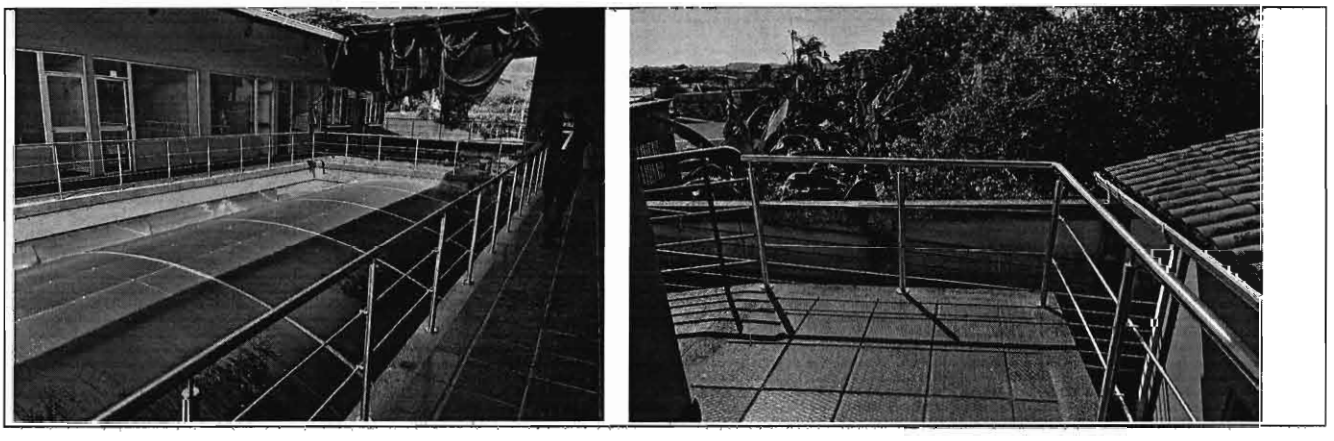


FOTOGRAFÍA No. 3
Instalación de barandas en acero inoxidables, y instalación de rejillas en acero.

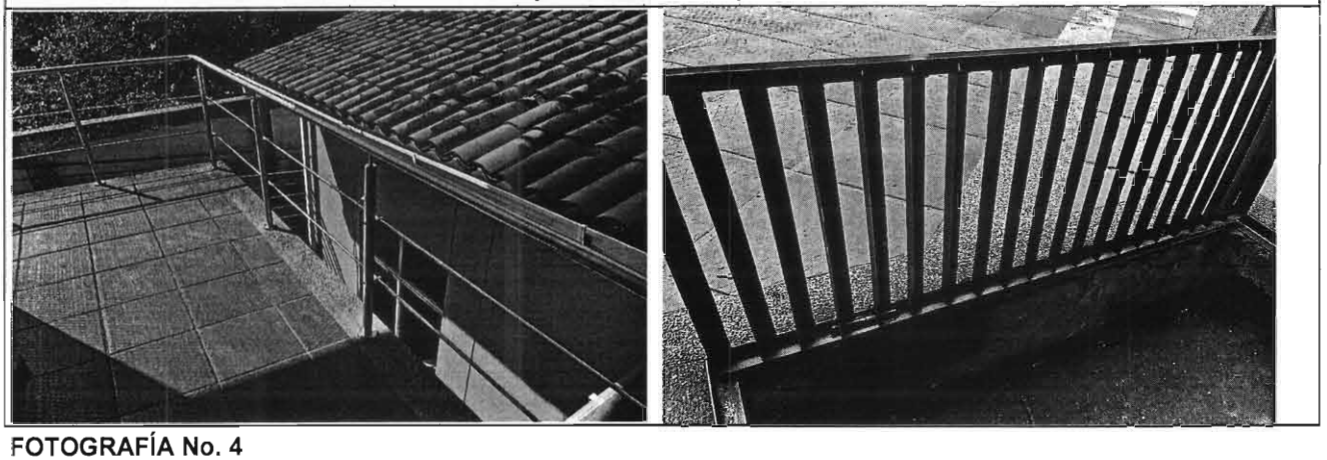

FOTOGRAFÍA No. 4
Rejillas en acero instaladas y pintadas, según especificaciones técnicas del proceso.

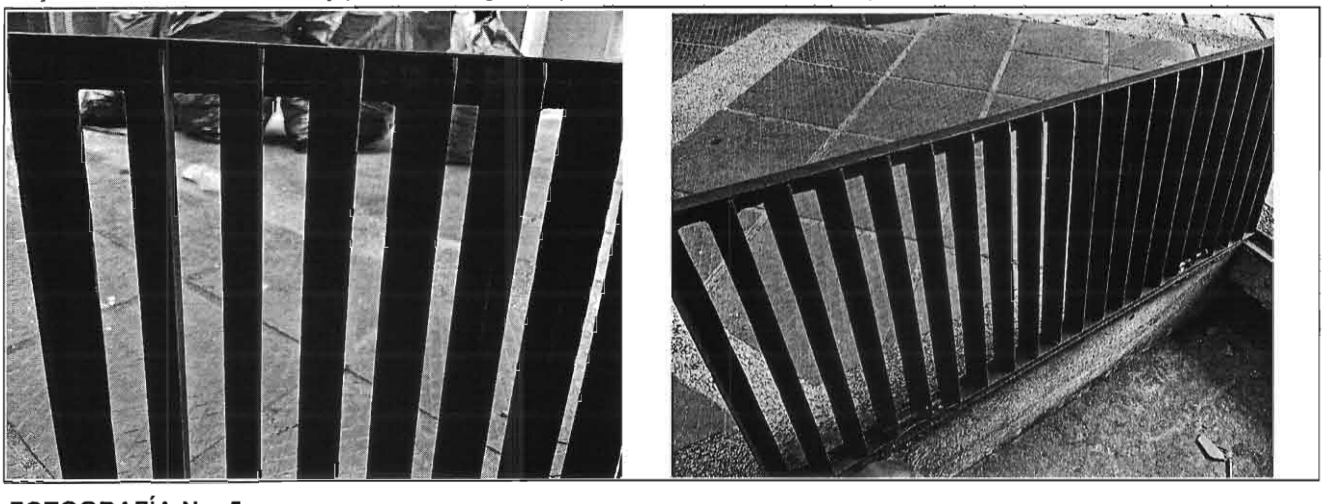

FOTOGRAFÍA No. 5
Rejillas en acero instaladas y pintadas, según especificaciones técnicas del proceso, vista en planta.

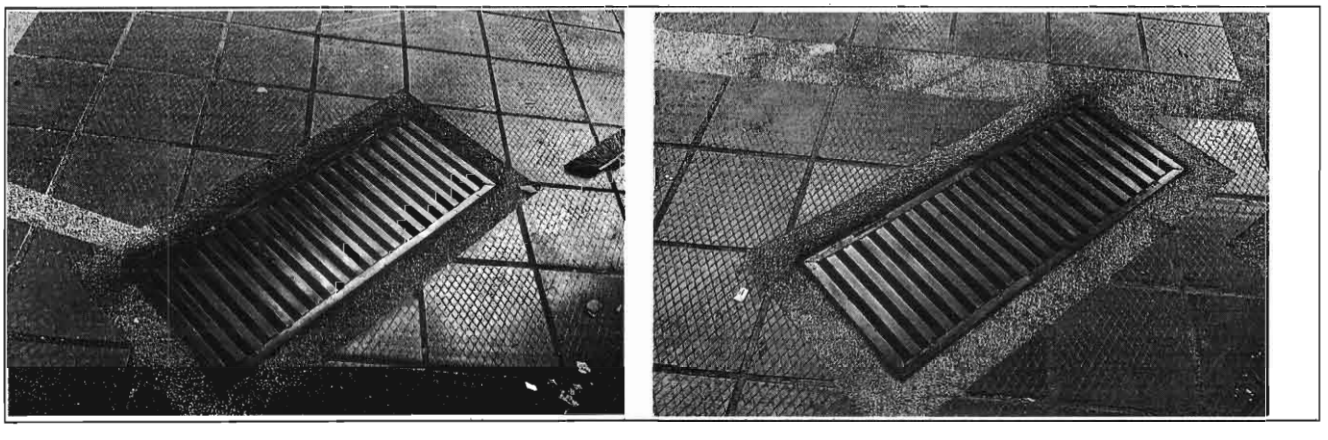

FOTOGRAFÍA No. 6
Impermeabilización aplicada en tanque aéreo en concreto, intertamente y en placa superior.



LINO RODRIGUEZ OCHOA
Cargo: SUPERVISOR TÉCNICO

MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO
Cargo: SUPERVISOR ADMIN. Y FINANCIERO

ANEXO 3
INFORME DE SUPERVISION No. 01 FINAL

OBJETO	OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE UN PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 13 NO. 2 - 32/34, COMÚNMENTE DENOMINADO "PUEBLITO CRIOLLO" DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ C.C. o NIT: 79799614-9
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO
SUPERVISOR TÉCNICO	LINO RODRIGUEZ OCHOA

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO
Desmonte de barandas y pasamanos en madera.	ml	50.00	48.90	100.00%	97.80%	1.10	$ 6,398.00	$ 319,900.00	$ 312,862.00
Desmonte de cielo raso con retiro.	m2	11.00	11.00	100.00%	100.00%	0.00	$ 19,643.00	$ 216,073.00	$ 216,073.00
Baranda en acero inoxidable 1 hilo D=1 1/2 +2 hilos D= 1/2 H prom 0.90 m Cal 18. Incluye soportes y anclajes a todo costo instalada.	ml	50.00	48.90	100.00%	97.80%	1.10	$ 522,000.00	$ 26,100,000.00	$ 25,525,800.00
Rejilla removible en platina de 2x1/4" hueco de 3" para tapa o pasarela función de inspección y limpieza o drenaje (in. Marco y contramarco) e instalación.	m2	1.35	1.35	100.00%	100.00%	0.00	$ 920,222.00	$ 1,242,300.00	$ 1,242,300.00
Escalera gato en angulo 2"x 1/8" suministro e instal.	ml	3.10	3.10	100.00%	100.00%	0.00	$ 201,274.00	$ 623,949.00	$ 623,949.00
Cerrojo seguridad doble cilindro para puerta de acceso. Suministro e instal.	und	5.00	0.00	100.00%	0.00%	5.00	$ 136,411.00	$ 682,055.00	$ -
Suministro e instalación de lámina para cielo raso en superboard pintado 8mm con vinitex o similar calidad.	m2	11.00	11.00	100.00%	100.00%	0.00	$ 135,258.00	$ 1,487,838.00	$ 1,487,838.00
Impermeabilización con mortero acrílico reforzado con fibras para tanques y piscinas E= 2 mm.	m2	45.50	55.25	100.00%	121.43%	-9.75	$ 124,717.00	$ 5,674,624.00	$ 6,890,614.00
							COSTO DIRECTO TOTAL	**$ 36,346,739**	**$ 36,299,436**
							SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 47,303

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Cargo: SUPERVISOR TÉCNICO


MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO
Cargo: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ANEXO 4

INFORME DE SUPERVISION No. 01 FINAL

OBJETO	OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE UN PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 13 NO. 2 - 32/34, COMÚNMENTE DENOMINADO "PUEBLITO CRIOLLO" DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ C.C. o NIT: 79799614-9
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO
SUPERVISOR TÉCNICO	LINO RODRIGUEZ OCHOA

GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)

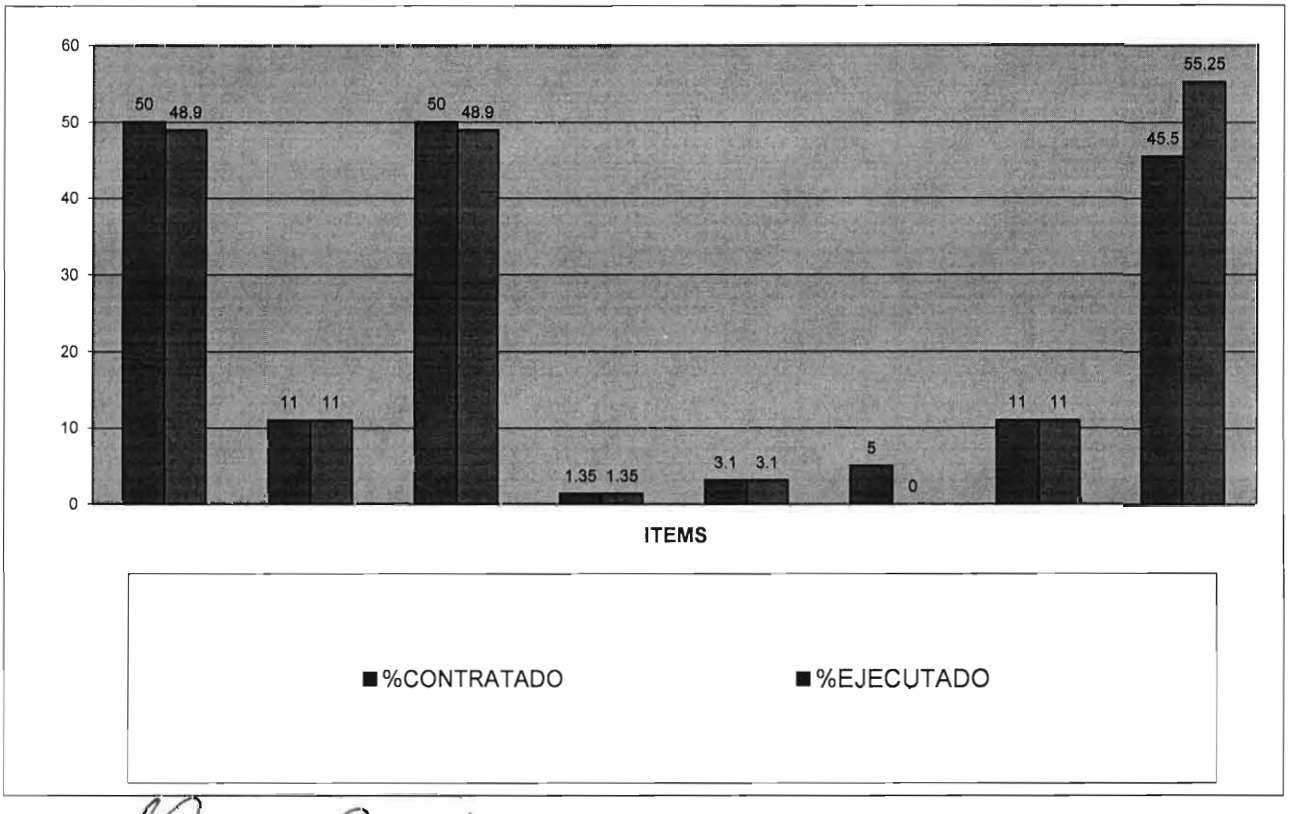

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Cargo: SUPERVISOR TÉCNICO

MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO
Cargo: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ANEXO 5

INFORME DE SUPERVISION No. 01 FINAL

OBJETO	OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE UN PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 13 NO. 2 - 32/34, COMÚNMENTE DENOMINADO "PUEBLITO CRIOLLO" DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ C.C. o NIT: 79799614-9
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
SUPERVISOR TÉCNICO	LINO RODRIGUEZ OCHOA

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA

TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE DOCUMENTOS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE SUPERVISIÓN
DICIEMBRE 2024	1					
	2					
	3					
	4	Revision de Documentos		Acta de Inicio y Acta de Suspensión	Seguimiento	
ENERO 2025	1					
	2					
	3			Acta de ampliación N°1 a la suspensión N°1		
	4					
FEBRERO 2025	1					
	2			Acta de ampliación N°2 a la suspensión N°1		
	3					
	4					
MARZO 2025	1					
	2					
	3			Acta de reinicio	Seguimiento	
	4			Acta de terminación contractual	Seguimiento	
MAYO 2025	1					
	2					
	3			Acta de recibo final	Seguimiento	Informe de Supervisión Final
	4					

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Cargo: SUPERVISOR TÉCNICO

MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO
Cargo: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
