INFORME DE SUPERVISIÓN No. 6, DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0069 DE 2024

NÚMERO DEL CONTRATO: 0069 del 20224		**VALOR DEL CONTRATO**: $55.131.702,00 M/L **VALOR ADICIONAL:**	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS.		**PERSONA NATURAL** ☐ **PERSONA JURÍDICA** x	
IDENTIFICACIÓN:	**NIT**: 900.026.388-1	**CEDULA DE CIUDADANÍA**: 79.555.163	
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA			
FECHA DE INICIO: 08/07/2024		**FECHA DE TERMINACION**: 07/11/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/10/2024		**FECHA DE PRORROGA A LA SUSPENSIÓN:** 30/11/2024	
FECHA DE REINICIO: 23/12/2024		**NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN # 2:** 31/12/2024	
PLAZO PRORROGA No. 01: 60 días		**PLAZO FINAL:** 6 MESES	
FECHA INICIO DE LA PRORROGA No. 01: 01/01/2025		**FECHA DE FINALIZACIÓN FINAL:** 01/03/2024	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: SEGUROS DEL ESTADO S. R. NIT: 860.009.578 – 6 **N° PÓLIZA:** 33-44-101250443		**FECHA DE CONSTITUCIÓN**: 09 – 07 – 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN**: 08 – 10 - 2027

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS: (Ley 1474 de 2011)

Teniendo en cuenta que de acuerdo con el oficio número 202406203300015083 con fecha del 20 de junio de 2024, por medio del cual se me designo como supervisora del contrato de interventoría No. 0069 de 2024, está supervisión revisará y realizará sus observaciones al Informe No 5 entregado por La Interventoría del Contrato de Obra, el cual corresponde al periodo del 01 de febrero de 2025 al 01

de marzo de 2025.

Administrativas:

1. Se evidencia el pago de los parafiscales del recurso humano contratado por la interventoría para la ejecución de sus actividades correspondiente a los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Diciembre de 2024, Enero y Febrero de 2025.

2. Se anexa el paz y salvo de honorarios por parte de los profesionales contratados por la interventoría para la ejecución de las actividades del contrato.

Técnicas

De acuerdo con el informe presentado por la Interventoría y las visitas realizadas a las estufas construidas por parte de esta supervisión, se pueden evidenciar el seguimiento realizado por este a las Actividades del proyecto:

1. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

CRONOGRAMA DE EJECUCION

CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA

1.ESTUFA FIJA ECOEFICIENTE		ME S 1				ME S 2				ME S 3				ME S 4			
Item	Descripción	S 1	S 2	S 3	S 4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
A	ACTIVIDADES PREVIAS																
	Verificación y Validación Información deBeneficiarios																
	Realización de Cotizaciones																
	Realización de Compras de Materiales eInsumos																
1	TALLERES SENSIBILIZACION Y DIVULGACION																
1.1	Taller de socialización del proyecto yauditoria visible																
1.2	Taller de capacitación para la operación ymantenimiento de la estufa Ecoeficiente (Manual, carta de beneficio y otros)																
1.3	Divulgación del proyecto																
2	PRELIMINARES																
2.1	Localización y replanteo																
3	CONSTRUCCION ESTUFA ECO (0,73m*1,05m) h:0,83m																
3.1	Placa maciza en concreto 1:2:3 de 10 cmde espesor																
3.2	Mamposteria ladrillo tipo bocadillo, macizoliviano de 6*12*24 cm																
3.3	Mamposteria ladrillo adobe macizo de5*10*20 cm																
3.4	Mamposteria ladrillo tipo farol de10*20*40 cm																
3.5	Suministro e instalación de STC vitrificado																
3.6	Suministro e instalación KIT de Herrajes																

CRONOGRAMA DE EJECUCION

CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA

1.ESTUFA FIJA ECOEFICIENTE						MES 1				MES 2				
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Vr Parcial	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	TOTAL EJECUCION
A	ACTIVIDADES PREVIAS													
	Acarreo de Materiales e Insumos a los Predios Beneficiarios													
1	TALLERES SENSIBILIZACION Y DIVULGACION													
1.1	Taller de socialización del proyecto y auditoria visible	Und.	1	$ 869.826	$ 869.826							$ 869.826		$ 869.826
1.2	Taller de capacitación para la operación y mantenimiento de la estufa Ecoeficiente (Manual, carta de beneficio y otros)	Und.	2	$ 1.069.786	$ 2.139.572							$ 1.069.786	$ 1.069.786	$ 2.139.572
1.3	Divulgación del proyecto	Und.	1	$ 6.508.698	$ 3.960.000					$ 1.980.000		$ 1.980.000		$ 3.960.000
2	PRELIMINARES													
2.1	Localización y replanteo	M2	112,50	$ 4.246	$ 477.675				$ 179.127	$ 119.418	$ 59.709	$ 59.709	$ 59.709	$ 477.673
3	CONSTRUCCION ESTUFA ECO (0,73m*1,05m) h:0,83m													
3.1	Placa maciza en concreto 1.2:3 de 10 cm de espesor	M2	130,50	$ 115.770	$ 15.107.985				$ 5.665.494	$ 1.888.498	$ 3.776.996	$ 1.888.498	$ 1.888.498	$ 15.107.984
3.2	Mampostería ladrillo tipo bocadillo, macizo liviano de 6*12*24 cm	M2	316,50	$ 199.268	$ 63.068.322				$ 23.650.620	$ 7.883.540	$ 15.767.080	$ 7.883.540	$ 7.883.540	$ 63.068.321
3.3	Mampostería ladrillo adobe macizo de 5*10*20 cm	M2	120,00	$ 167.006	$ 20.040.720				$ 7.515.270	$ 2.505.090	$ 5.010.180	$ 2.505.090	$ 2.505.090	$ 20.040.720
3.4	Mampostería ladrillo tipo farol de 10*20*40 cm	M2	183,00	$ 118.335	$ 21.655.305				$ 8.120.739	$ 2.706.913	$ 5.413.826	$ 2.706.913	$ 2.706.913	$ 21.655.304
3.5	Suministro e instalación de STC vitrificado	M2	150	$ 97.508	$ 14.626.200				$ 5.484.825	$ 1.828.275	$ 3.656.550	$ 1.828.275	$ 1.828.275	$ 14.626.200
3.6	Suministro e instalación KIT de Herrajes	Und.	150	$ 1.552.778	$ 232.916.700				$ 87.343.764	$ 29.114.588	$ 58.229.176	$ 29.114.588	$ 29.114.588	$ 232.916.703
	Costo Total Directo				$ 374.862.305	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137.959.839	$ 48.026.322	$ 91.913.517	$ 49.906.225	$ 47.056.399	$ 374.862.303
			AIU	$ 0	$ 116.019.884	$ 7.485.532	$ 7.485.532	$ 7.485.532	$ 7.485.532	$ 7.485.532	$ 7.485.532	$ 7.485.532	$ 7.485.532	$ 59.884.253
	Administración			$ 0	$ 89.966.953	$ 5.622.935	$ 5.622.935	$ 5.622.935	$ 5.622.935	$ 5.622.935	$ 5.622.935	$ 5.622.935	$ 5.622.935	$ 44.983.477
	Imprevistos			$ 0	$ 3.748.623	$ 468.578	$ 468.578	$ 468.578	$ 468.578	$ 468.578	$ 468.578	$ 468.578	$ 468.578	$ 3.748.623
	Utilidad			$ 0	$ 18.743.115	$ 1.171.445	$ 1.171.445	$ 1.171.445	$ 1.171.445	$ 1.171.445	$ 1.171.445	$ 1.171.445	$ 1.171.445	$ 9.371.558
	Iva sobre utilidad			$ 0	$ 3.561.192	$ 222.575	$ 222.575	$ 222.575	$ 222.575	$ 222.575	$ 222.575	$ 222.575	$ 222.575	$ 1.780.596
	Total Costo de Obra				$ 495.358.745	$ 7.485.532	$ 7.485.532	$ 7.485.532	$ 145.445.371	$ 55.511.854	$ 99.399.049	$ 57.391.757	$ 54.541.931	$ 434.746.556

2. ACTIVIDADES TÉCNICAS

Nombre del Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA".			
No. De contrato	084 de 2023			
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA IND. GESTIÓN	META INDICADOR DE GESTIÓN		EJECUCIÓN FINAL (%)
		CANT.	EJECUTADO	
Construir estufas ecoeficientes	Numero	150	150	100%
Realizar taller de socialización del proyecto y auditoria visible	Numero	2	2	100%
Realizar taller de capacitación para la operación y mantenimiento de la estufa ecoeficiente	Numero	2	2	100%
Realizar divulgación del proyecto	Numero	1	1	100%

3. CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES

La interventoría en su informe establece la verificación de la construcción de las 150 estufas ecoeficientes, las cuales se evidencian a continuación:

ESTUFAS CONSTRUIDAS			
Nº	BENEFICIARIO	VEREDA	COORDENADAS
1	ADALBERTO VEGA MINDIOLA	Arroyo Arena	N 11°16'11.022" W 72°54'02.514
2	AVELINO ANTONIO MOSCOTE SUAREZ	Arroyo Arena	N 11°17'16" W 72°51'52"
3	EDER GOMEZ JARARIYU	Arroyo Arena	N 11°19'09.721" W 72°57'08.028"
4	EMERSON RAFAEL PINTO AMAYA	Arroyo Arena	N 11°16.09.282" W 72°54'37.439"

5	EVA MARGARITA GUERRA IGUARAN	Arroyo Arena	N 11°16'08.171" W 72°54'41.087"
6	FRANCISCO EPINAYU	Arroyo Arena	N 11°16'44.592" W 72°54'30.876"
7	JOSÉ LEÓN IGUARAN AMAYA	Arroyo Arena	N11°17'39.882" W 72°53'49.655"
8	JUAN IBARRA CASTRO	Arroyo Arena	N11°19'16.397" W 72°57'19.397"
9	JULIO CESAR MOSCOTE SUAREZ	Arroyo Arena	N 11°28'16" W 72°52'49"
10	MANUEL SILFREDO LOPEZ COTES	Arroyo Arena	N 11°16'40.146" W 72°54'32.147"
11	MAREICA TEOTISTE PINTO AMAYA	Arroyo Arena	N 11°16'19.980" W 72°54'28.818"
12	PEDRO EMILIO IGUARAN BRITO	Arroyo Arena	N 11° 16'21.089" W 72°54'41.472"
13	ROJER REINOSO IBARRA	Arroyo Arena	N 11°18'31.947" W 72°54'09.725"
14	WILFRAN JOSE IBARRA OÑATE	Arroyo Arena	N 11°19'12.318" W 72°55'11.388"
15	YOELIS MAILETH IBARRA ALVARADO	Arroyo Arena	N 11°16'12.612" W 72°54'32.801"
16	YOLEIMA BELARMINA BERMUDEZ	Arroyo Arena	N 11°15'53.105" W 72°53'25.217"
17	BIENVENIDO ANTONIO DIAZ	Barbacoa	N 11°12' 37" W 72°53'20"

18	JUAN MANUEL DIAZ COTES	Barbacoa	N 11°12’38”	W 72°53’10”
19	MARCOS JOSE LUBO	Barbacoa	N 11°15’10”	W 72°52’38”
20	MARCIANO IPUANA	Camarones	N 11°13’ 7”	W 72°46’56”
21	ROBERTO PICHÓN	Camarones	N 11°5’20.27”	W 73°1’39.87”
22	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ	Camarones	N 11°25'55.755”	W 73°04'36.917"
23	ELIS MORALES SALAS	Choles	N 11°14'51"	W 73°3'9.0"
24	MARTA LOZANO GUZMÁN	Choles	N 11°14'59"	W 73°3'9.0"
25	JOSE DOMINGO PICHON	Cerrillo	N 11°13’38”	W 72°51’54”
26	GENITH FARIDE TAPIA PEDROZA	Cerroperalta	N11°15'30.7"	W 72°50'54.9"
27	ALCIDES RAFAEL SOLANO AMAYA	Juan de Aragón	N 11°26'18.0"	W 72°56'50.1”
28	ALCIDES SOLANO DIAZ	Juan de Aragón	N 11°26'58.4"	W 72°56'17.7"
29	DEIDER VALDEZ	Juan de Aragón	N11°29'42.75"	W 72°55’50.74"
30	LUIS EDUARDO DAGOBETH FLÓREZ	Juan de Aragón	N 11°29'22.48"	W 72°56'50.1"
31	MILENA CURVELO IPUANA	Juan de Aragón	N 11°26'18.0"	W 72°70'38.2"
32	YORGIS ENRIQUE GRIEGO	Juan de Aragon	N 11°26'29.2"	W 72°56'48.2"

33	VEPEIBRY IGUARAN IGUARAN	Arroyo Arena	N 11°16'20.387"	W 72°54'41.547"
34	ALICIA ISABELLA VILLADIEGO HERNANDEZ	Cerroperalta	N 11° 15'30.7"	W 72°50'50.8"
35	PEDRO JOSÉ VÁSQUEZ POLO	Cerroperalta	N 11°15'25.4"	W 72°50'52.7"
36	YAKELINE CABRALES TAPIA	Cerroperalta	N 11° 15'26.3"	W 72°50'51.5"
37	LUIS ALBERTO VELEZ BRITO	Cotoprix	N 11°8'17"	W 72°50'15"
38	MANUEL LUIS BRITO MEJÍA	Cotoprix	N 11°08'55.265"	W 72°50'49.032"
39	JULIA MAR DE ARMAS BARROS	Corregimiento Galán	N 11°10'117.585'	W72°54'16.800"
40	MARCIANO MOSCOTE MENDOZA	Corregimiento Galán	N11°07'50.001"	W 72°53'38.534"
41	CALIXTO NICOLAS MOSCOTE	Corregimiento Galán	N11°12'16.64"	W 72°58'08.176"
42	GUILLERMO ARTURO IGUARAN SIERRA	Corregimiento Galán	N11°11'06.074"	W 72°54'12.136"
43	JUAN BAUTISTA MOSCOTE MENDOZA	Corregimiento Galán	N 11°11'205.77"	W 72°54'55.388"
44	JUANA ROSA BRITO MOSCOTE	Corregimiento Galán	N 11°72'14.678"	W 72°58'05.027"
45	LEOVANIS JAVIER IGUARAN	Corregimiento	N11°10'18.000"	W 72°54'51.504"

	MOSCOTE	Galán	
46	SEGUNDO MARCIANO RODRÍGUEZ PINTO	Corregimiento Galán	N11°11'32.390" W 72°55'24.986"
47	YONY MOSCOTE	Corregimiento Galán	N 11°07’50.001” W 72°53’38.534”
48	WILCAR ISAIT IGUARAN MOSCOTE	Corregimiento Galán	N11°08'09.640' W 72°53'02.351"
49	ELVER MANJARREZ	Juan y medio	N 11°07'07.3" W 73°00'05.8"
50	HERNÁN RODRÍGUEZ TORO	Juan y medio	N 11°33'09.7" W72°54'32.6”
51	BORIS GONZALEZ MARINO	Juan y medio	N11°06'31.3" W 73°02'18.8"
52	TEODOCIA OCHOA	Juan y medio	N 11°05'20.0" W 73°01'42.2"
53	ADALCEINDA OCHOA DE RIVERA	Corregimiento Las Palmas	N11°05'11.7"N W 73°02'46.0"
54	LUIS HOLGUIN GUERRA OCHOA	Las Palmas	N11°03'05.871" W 73°03´21.725"
55	WALTER RAFAEL GÓMEZ ROMERO	Las Palmas	N 11°04'25.1" W 73°03'14.6"
56	YARLYS YARLETH DAZA CÓRDOBA	Corregimiento Las Palmas	N11°3'16.75008" W73°3'21.27.6"
57	OMAR JOSÉ RODRÍGUEZ	Tomarrazon	N 11° 7'22.91" W 72°57'2,63"

58	LUIS FRAGOZO CAMARGO	Corregimiento La Arena	N 11°12'15.97" W 72°44'9.12"
59	WILFREDO FRAGOZO FANDIÑO	Corregimiento La Arena	N 11°12'40.10" W 72°44'27.62"
60	GUSTAVO RAFAEL MEJIA MORENO	Ebanal	N 11°2872632 W 73°108544
61	JOSÉ GREGORIO MEDINA MEJIA	Ebanal	N 11°16'57.18" W 73°6'50.79"
62	LUIS MANUEL MOSCOTE GIL	Corregimiento Galán	N 11°11'20.6" W 72°53'56.0"
63	EDILFREDO QUINTERO MENDOZA	Corregimiento Galán	N 11°03'48.9" W 72°56'08.0"
64	ARINSON JOSÉ MENDOZA BOLiVAR	Corregimiento Galán	N 11°03'53.7" W 72°56'17.1"
65	JOSE JUAQUIN FUENMAYOR PARODI	Corregimiento Galán	N 11°438124 W 72°949368
66	MARCELINO SOTO NAVARRO	Juan de Aragon	N 11°453492' W 72°941029'
67	VICTOR JOSE RODRIGUEZ	Via Acueducto	N 11°25'35.135" W 72°57'13.811"
68	CARMEN PINEDO DE GUTIERREZ	Via Acueducto	N 11°24'19.717" W 72°57'44.763"
69	LUIS SEGUNDO MEZA AGUILAR	Arroyo arena-Ebanal	N 11° 17'26.8" W 73°6'16.49"
70	ANGELINA YOSMERY	Rancheria aujero	N 11°30’31” W 72°52’3”

	ARPUSHANA			
71	FULGENCIO ANTONIO MEJIA ACOSTA	Via Acueducto	N 11°30'10.276	W 72°55'34.266
72	ARNOLDO FUENTES	La Gloria	N 11°3’14”	W 72°57’27”
73	CARMEN EDITH MEJIA GUERRA	La Gloria	N 11°3’22”	W 72°56’42”
74	JOSE DOMINGO PALACIO PIMENTAL	La Gloria	N 11°3’11”	W 72°57’48”
75	JUAN CRISOSTOMO PINTO	La Gloria	N 1123220	W 1714615
76	LENIS MARIA RODRIGUEZ GUERRA	La Gloria	N 1123669	W 1714659
77	MILADYS CURIEL	La Gloria	N 1121722	W 1714309
78	MILENE MARIA MANJARREZ BOLiVAR	La Gloria	N 1120564	W 1714416
79	SERGIO LUIS TORREZ PÉREZ	La Gloria	N 1120873	W 1714124
80	JOSE VELASQUEZ SINOJA	Linea Acueducto	N 11°24'43.303"	W 72°57'50.107"
81	LUZ MARINA MANOTAS SOLANO	Linea Acueducto	N 11°24'19.6"	W 72°57'44.6"
82	MAILETH ALEAN CASTRILLON	Linea Acueducto	N 11°35'46"	W 74°04'39"

83	GABRIEL IPUANA	Loma Fresca	
84	ADANIES IBARRA	Los Cerritos	N 11°29'33.87" W 72°55'22.20"
85	AGUSTIN ROSERO DE LA CRUZ	Los Cerritos	N 11°26'59.0" W 72°56'50.5"
86	DIOBILDO MERIÑO MENDOZA	Los Cerritos	N 11°30' 24" W 72°55'4"
87	ELIS EMETERIO FALON	Los Cerritos	N 11°29'21.84' W 72°55'33.23"
88	ISELYS GOMEZ O.	Los Cerritos	N 11° 29'21.89" W 72°55'34.37"
89	JAINER VALDES GONZALES	Los Cerritos	N 11°29'48.34" W 72°55'51.97'
90	JORGE CORRALES A.	Los Cerritos	N 11°29'22.09" W 72°55'43.78"
91	JUANA BAUTISTA COTES	Los Cerritos	N 11°29'22.6" W 72°56'17.9"
92	LUZ MARINA RICO	Los Cerritos	N 72°55'58.5" W 11°29'31.8"
93	MARTA SOTO	Los Cerritos	N 11°29'25.8" W 72°55'32.5"
94	NILSON PEREZ	Los Cerritos	N 11°29'59.47" W 72°55'20.47"
95	PEDRO CORTES	Los Cerritos	N 11°29'31.8" W 72°55'22.8"
96	WILMER SOLIS	Los Cerritos	N 11°30'2.51' W 72°55'37.53"
97	LAURA PEREZ	Los Cerritos	N 11°29'46.87" W 72°55'42.19"
98	DENIS MEJIA RIVADENEIRA	Los Comejenes	N 1110873.433 W 1737236.525
99	MIGUEL BARROS SUAREZ	Los Comejenes	N 1111023.389 W 1737188.603
100	CÁNDIDA BRITO	Los Gorros	N 11°2’44” W 72°56’12”

	BRITO		
101	CRISTOBAL RAFAEL MENDOZA	Los Gorros	N 11°2’32” W 72°56’23”
102	DILIA CASTRO EPIAYU	Los Gorros	N 11°2’50” W 72°56’2”
103	LUIS MANUEL OSPINO	Los Gorros	N 11°2’1” W 72°55’56”
104	MARIA ELENA IGUARÁN DE ROBLES	Los Gorros	N 11°2’14” W 72°56’11”
105	NELIA MARTINEZ POLO	Los Gorros	N 11°2’45” W 72°56’14”
106	PEDRO LUIS IGUARAN	Los Gorros	N 11°2’49” W 72°56’15”
107	WILDER BADILLO SOLANO	Los Gorros	N 11°2’25” W 72°56’25”
108	ALCIDES MAGDANIEL MEDINA	Machobayo	N 11°13'01.139" W 72°46'55.38"
109	DAYCY LEONOR DUARTE BERTY	Machobayo	N 11°12'48.907" W 72°46'57.07"
110	MARLENE IPUANA AMAYA	Machobayo	N 11°13'20.128" W 72°46'42.44"
111	ROBINSON RAUL GRIEGO OSPINO	Machobayo	N 11°12'07.366" W 72°48'28.133"
112	YAICARIS RONDON AMAYA	Machobayo	N 11°13'41.014" W 72°46'07.353"
113	ENRIQUE ROY DAZA	Matitas	N 11°22'58.70" W 72°57'19.671"

114	LORENZO MEDINA	Matitas	N 11°16'24.033"	W 72°59'10.680"
115	WILFRIDE DE ARMAS	Matitas	N 11°16'09.470"	W 72°59'24.388"
116	ANTONIO ARPUSHANA COTES	Mochomana	N 11°23’58”	W 72°47’30”
117	JOSE SEGUNDO COTES ARPUSHANA	Mochomana	N 11°24’6”	W 72°47’31”
118	LOURDES EPINAYU	Mochomana	N 11°24’0”	W 72°47’31”
119	ESCILDA MENDOZA	Monguí	N 11°13’42”	W 72°49’21”
120	LUZ MARINA ACOSTA	Monguí	N 11°13’40”	W 72°49’20”
121	MARTA BRITO IGUARAN	Monguí	N 11°13’42”	W 72°49’15”
122	OCTAVIA RODRIGUEZ VEGA	Monguí	N 11°13’42”	W 72°49’15”
123	ARMANDO BAUTISTA FREYLE	Mundo Nuevo	N 11°31’43.57”	W 72°53’16.85”
124	JHON FREDIS BENJUMEA	Perico	N 11°22'09.2"	W 73°05'20.8"
125	WILLIAM OSPINO QUINTANA	Perico	N 11°22'11.5"	W 73°04'41.0"
126	JOSE GREGORIO MEJIA HERRERA	Puente Guerrero	N 11°31'2"	W 72°58'18.0"
127	ISABEL IPUANA	Puerto Chentico	N 11°25’50”	W 73°5’0”
128	USECHON IPUANA	Puerto Chentico	N 11°25’58”	W 73°5’6”

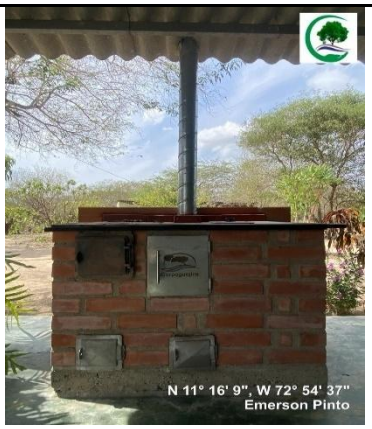
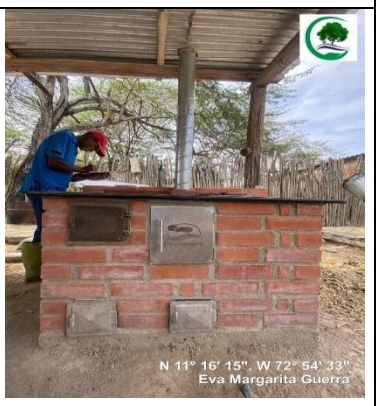
129	ZUNILDA PUSHAINA	Puerto Chentico	N 11°25’51”	W 73°5’1”
130	LEONEL ASIS VEGA	Puerto Colombia	N 11°06'91.51"	W 73°04'48.42"
131	CLEMENTE LAUDELINO HERRERA EPINAYU	Ranchería La Plazoleta	N 11°23'41.930"	W 73°00'03.326"
132	FRANCISCO JESITH HERRERA EPINAYU	Ranchería La Plazoleta	N 11°23'41.994"	W 73°00'03.343"
133	JUANITA HERRERA	Ranchería La Plazoleta	N 11°23'45.426"	W 73°00'04.453"
134	OLVER GALINDO	Ranchería La Plazoleta	N 11°24'36.625"	W °01'08.528"
135	SILVIA HERRERA	Ranchería La Plazoleta	N 11°23'45.709"	W 73°00'04.822"
136	ALOIMA RAFAEL MIRANDA ARREGOCES	Tigreras	N 11°17'14.8"	W 73°6'17.06"
137	ILVA CURVELO IPUANA	Tigreras	N 11°17'14.2"	W 73°6'9.569"
138	OLFRIS PINTO BRITO	Tomarrazon	N 11°8’14”	W 72°55’39”
139	PEDRO DANIEL BOLAÑO	Tomarrazon		
140	FELIPE ELIAS FUENTES	Tomarrazon	N 11°6’45”	W 72°54’35”
141	FRANKLIN MENDOZA	Tomarrazon	N 11°5’57”	W 72°54’46”

	RIVADENEIRA		
142	ELBER GRIEGO MEJIA	Tomarrazon	N 11.1568234 W 72.9396915
143	SANTIAGO GUTIERREZ VERTIS	Tomarrazon	N 11.1576948 W 72.9462868
144	EBERT LUIS QUINTERO MENDOZA	Tomarrazon	N 11°03'58.7 W 72°56'17.1
145	MADELEINE BARROS PALACIO	Tomarrazon	N 11°04'04.5" W 72°56'42.3"
146	YONI MOSCOTE	Tomarrazon	N 11°20’16” W 72°54’4”
147	ELDER JOSÉ BRITO LEBETE	Tomarrazon	N 11°3’29” W 72°56’51”
148	ELEODORO RAFAEL CASTRELLON	Vereda Cascajalito	N 11°3’56” W 73°0’39”
149	RICARDO EPINAYU	Vía Maicao	N 11°30’28” W 72°52’7”
150	EDER SAMIR MARTELO	Los Cerritos	N 11°16’02.100” W 72°54’35.7”

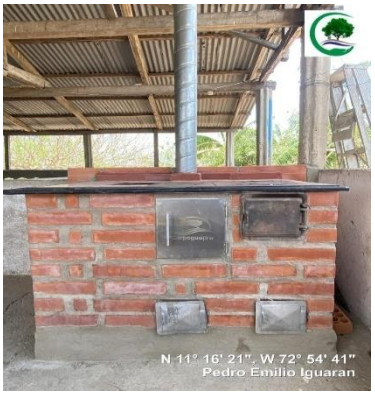
3.1. Evidencias fotográficas de las estufas ecoeficientes construidas

ESTUFAS CONSTRUIDAS				
Nº	BENEFICIARIO	VEREDA	FOTOGRAFIA	
			Antes	Después

1	Adalberto Vega Mindiola	Arroyo Arena		
2	Avelino Antonio Moscote	Arroyo Arena		
3	Eder Gomez Jarariyu	Arroyo Arena		

4	Emerson Rafael Pinto	Arroyo Arena		
5	Eva Margarita Guerra Iguaran	Arroyo Arena		
6	Francisco Epinayu	Arroyo Arena		

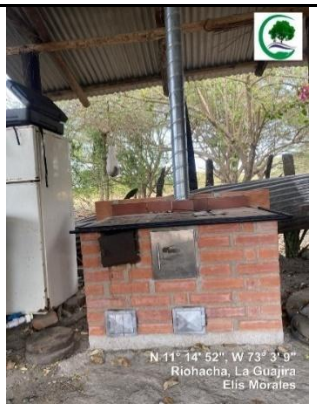
7	Jose Leon Iguaran Amaya	Arroyo Arena		
8	Juan Ibarra Castro	Arroyo Arena		
9	Julio Cesar Moscote Suarez	Arroyo Arena		

10	Manuel Silfredo Lopez Cotes	Arroyo Arena		
11	Mareica Teotiste Pinto Amaya	Arroyo Arena		
12	Pedro Emilio Iguaran Brito	Arroyo Arena		

13	Roger Reinoso Ibarra	Arroyo Arena		
14	Wilfran Jose Ibarra Oñate	Arroyo Arena		
15	Yoelis Maileth Ibarra Alvarado	Arroyo Arena		

16	Yoleima Belarmina Bermudez	Arroyo Arena		
17	Bienvenido Antonio Diaz	Barbacoa		
18	Juan Manuel Diaz Cotes	Barbacoa		
19	Marcos Jose Lubo	Barbacoa		

20	Marciano Ipuana	Camarones		
21	Roberto Pichon	Camarones		
22	Luis Eduardo Rodriguez	Camarones		

23	Elis Morales Salas	Choles		
24	Martha Lozano Guzman	Choles		
25	Jose Domingo Pichon	Cerrillo		

26	Genith Faride Tapia	Cerroperalta		
27	Alcides Rafael Solano Amaya	Juan de Aragon		
28	Alcides Solano Diaz	Juan de Aragon		

29	Deider Valdez	Juan de Aragon		
30	Luis Eduardo Dagoveth Flores	Juan de Aragon		
31	Milena Curvelo Ipuana	Juan de Aragon		

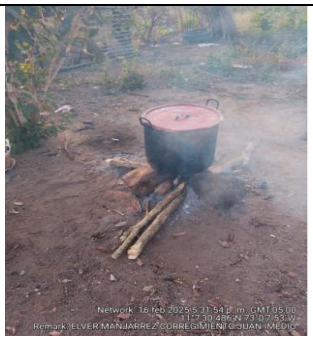
32	Yorgis Enrique Griego	Juan de Aragon		
33	Vepeibry Iguaran Iguaran	Arroyo Arena		
34	Alicia Isabela Villadiego	Cerrillo		

35	Pedro Jose Vasquez	Cerrillo		
36	Yackeline Cabrales Tapia	Cerrillo		
37	Luis Alberto Vélez Brito	Cotoprix		

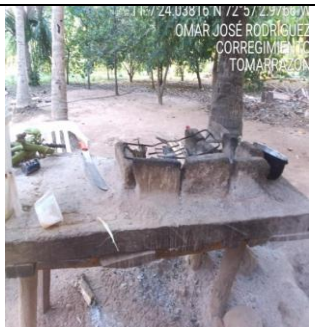
38	Manuel Luis Brito Mejía	Cotoprix		
39	Julia de Armas	Galan		
40	Marciano Moscote Mendoza	Galán		

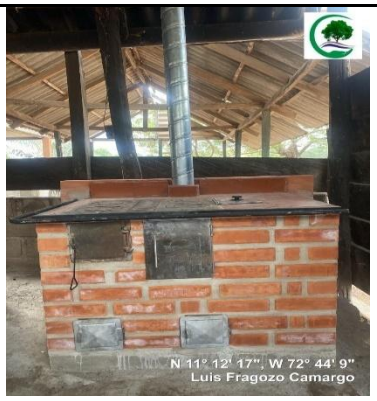
41	Calixto Nicolas Moscote	Galán		
42	Guillermo Arturo Iguaran Sierra	Galán		
43	Juan Bautista Moscote Mendoza	Galán		

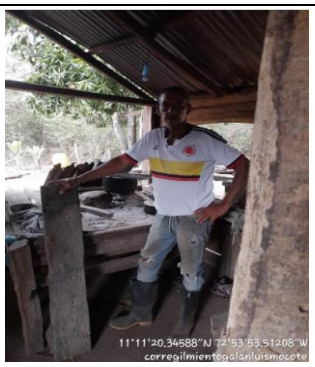
44	Juana Rosa Brito Moscote	Galán		
45	Leovanis Javier Iguaran Moscote	Galán		
46	Segundo Marciano Rodriguez	Galán		

47	Yony Moscote	Galán		
48	Wilkar Isait Iguaran Moscote	Galán		
49	Elver Manjarrez	Juan y Medio		

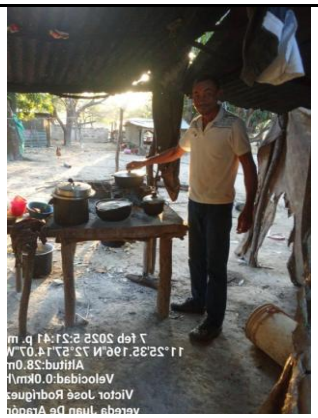
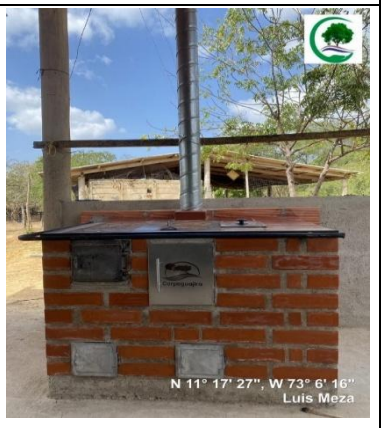
50	Hernan Rodriguez Toro	Juan y Medio		
51	Boris Gonzales Marino	Juan y Medio		
52	Teodocia Ochoa	Juan y Medio		
53	Adalceinda Ochoa	Las Palmas		

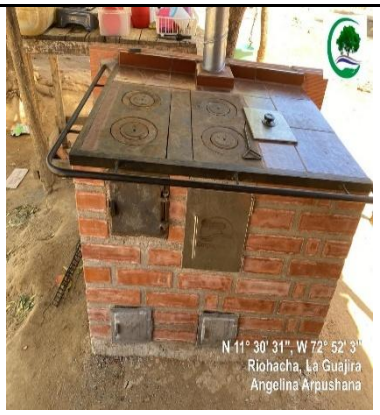
54	Luis Holguin Guerra Ochoa	Las Palmas		
55	Walter Rafael Gomez Romero	Las Palmas		
56	Yarlys Yarleth Daza Cordoba	Las Palmas		
57	Omar Jose Rodriguez	Tomarrazon		

58	Luis Fragozo Camargo	Arroyo Arena		
59	Wilfredo Fragozo Fandiño	Arroyo Arena		
60	Gustavo Rafael Mejia Moreno	El Ebanal		

61	Jose Gregorio Medina Mejia	El Ebanal		
62	Luis Manuel Moscote Gil	Galán		
63	Edilfredo Quintero Mendoza	Galan		

64	Arinson Jose Mendoza Bolivar	Galán		
65	Jose Joaquin Fuenmayor	Galán		
66	Marcelino Soto Navarro	Juan de Aragón		al 

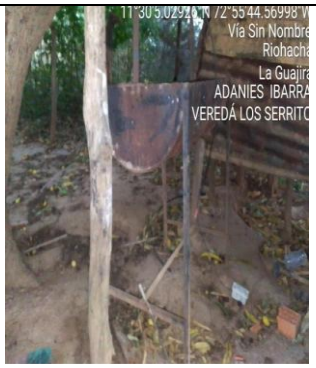
67	Victor Jose Rodriguez	Rancheria Aujero		
68	Carmen Pinedo de Gutierrez	Rancheria Aujero		
69	Luis Segundo Meza Aguilar	Arroyo Arena		

70	Angelina Yosmery Arpushana	Rancheria el Aujero		
71	Fulgencio Antonio Mejia Acosta	Rancheria el Aujero		
72	Arnoldo Fuentes	La Gloria		

73	Carmen Edith Mejia Guerra	La Gloria		
74	Jose Domingo Palacio	La Gloria		
75	Juan Crisostomo Pinto	La Gloria		

76	Lenis Maria Rodriguez Guerra	La Gloria		
77	Miladys Curiel	La Gloria		
78	Milene Maria Manjarrez Bolivar	La Gloria		

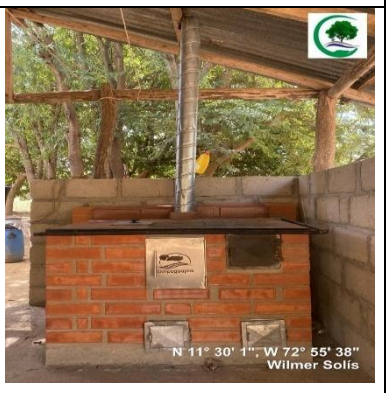
79	Sergio Luis Torres Perez	La Gloria		
80	Jose Velasquez Sinoja			
81	Luz Marina Manitas Solano	Los Cerritos		

82	Maileth Alean Castrillón	Los Cerritos		
83	Gabriel Ipuana	Loma Fresca		
84	Adanies Ibarra	Los Cerritos		

85	Agustín Rosero de la Cruz	Los Cerritos		
86	Diobildo Meriño Mendoza	Los Cerritos		
87	Elis Emeterio Falon	Los Cerritos		

88	Iselis Gómez	Los Cerritos		
89	Jainer Valdez Gonzales	Los Cerritos		
90	Jorge Corrales	Los Cerritos		

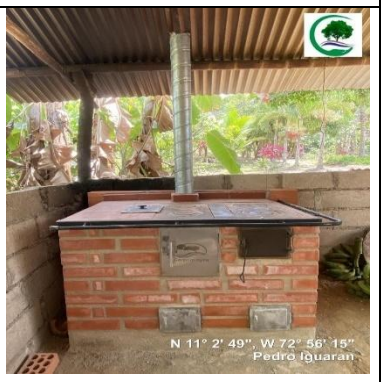
91	Juana Bautista Cotes	Los Cerritos		
92	Luz Marina Rico	Los Cerritos		
93	Martha Soto	Los Cerritos		

94	Nilson Pérez	Los Cerritos		
95	Pedro Cortes	Los Cerritos		
96	Wilmer Solís	Los Cerritos		

97	Elder José Brito Lebette	Tomarrazon		
98	Laura Pérez	Los Cerritos		
99	Denis Mejía Rivadeneira	Comejenes		

100	Miguel Barros Suarez	Comejenes		
101	Cándida Brito Brito	Los Gorros		
102	Cristóbal Rafael Mendoza	Los Gorros		

103	Dilia Castro Epiayu	Los Gorros		
104	Luis Manuel Ospino	Los Gorros		
105	María Elena Iguaran	Los Gorros		

106	Nelia Martínez Polo	Los Gorros		
107	Pedro Luis Iguaran	Los Gorros		
108	Wilder Badillo Solano	Los Gorros		

109	Alcides Magdaniel Medina	Machobayo		
110	Daisy Leonor Duarte Bertys	Machobayo		
111	Marlene Ipuana Amaya	Machobayo		

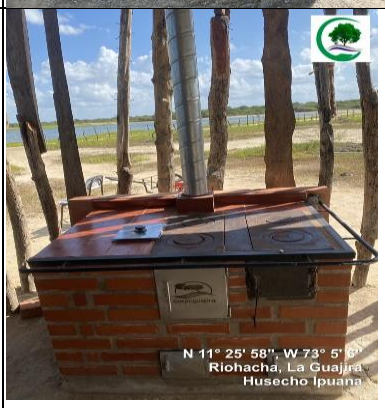
112	Robinson Raúl Griego Ospino	Machobayo		
113	Yaicaris Rondón Amaya	Machobayo		
114	Enrique Roy Daza	Matitas		

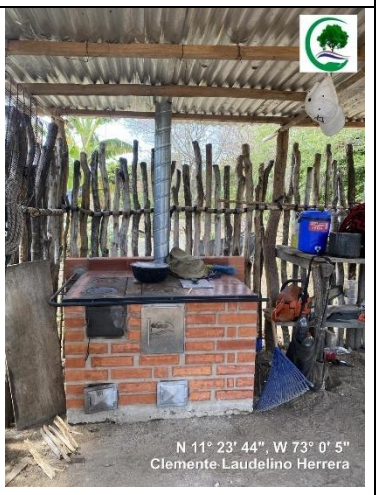
115	Lorenzo Medina	Matitas		
116	Wilfride de Armas	Matitas		
117	Antonio Arpushana Cotes	Mochomana		

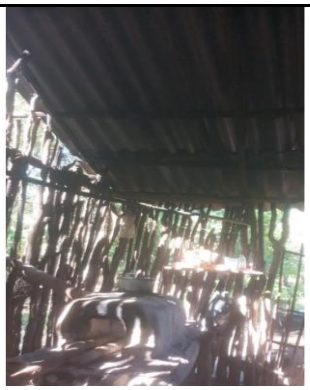
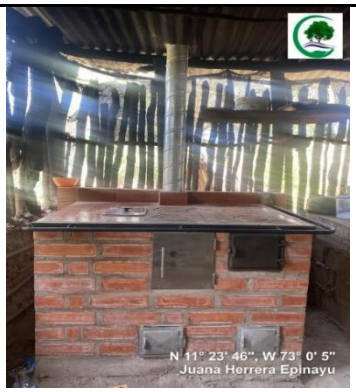
118	José Segundo Cotes Arpushana	Mochomana		
119	Lourdes Epinayu	Mochomana		
120	Escilda Mendoza	Monguí		
121	Luz Marina Acosta	Monguí		

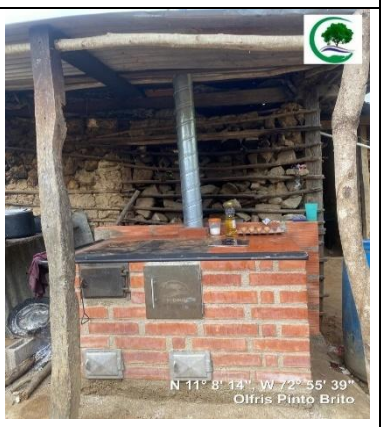
122	Martha Brito Iguaran	Monguí		
123	Octavia Rodríguez Vega	Monguí		
124	Armando Bautista Freyle	Mundo Nuevo		

125	Jhon Fredis Benjumea	Perico		
126	William Ospino Quintana	Perico		
127	José Gregorio Mejía Herrera	Puente Guerrero		

128	Isabel Ipuana	Puerto Chentico		
129	Usecho Ipuana	Puerto Chentico		
130	Zunilda Pushaina	Puerto Chentico		

131	Leonel Asís Vega	Las Palmas		
132	Clemente Laudelino Herrera Epinayu	Ranchería La Plazoleta		
133	Francisco Herrera Epinayu	Ranchería La Plazoleta		

134	Juana Herrera	Ranchería La Plazoleta		
135	Olver Galindo	Ranchería La Plazoleta		
136	Silvia Herrera	Ranchería La Plazoleta		

137	Aloima Rafael Miranda Arregocés	Tigreras		
138	Ilva Curvelo Ipuana	Tigreras		
139	Olfris Pinto Brito	Tomarrazon		

140	Pedro Daniel Bolaños	Tomarrazon		
141	Felipe Elías Fuentes	Tomarrazon		
142	Franklin Mendoza Rivadeneira	Tomarrazon		

143	Elber Griego Mejía	Tomarrazon		
144	Santiago Gutiérrez Bertys	Tomarrazon		
145	Ebert Luis Quintero Mendoza	Tomarrazon		

146	Madeleine Barros Palacio	Tomarrazon		
147	Yoni Quintero	Tomarrazon		
148	Eleodoro Rafael Castrillón	Juan y Medio		

149	Ricardo Epinayu	Ranchería el Aujero		
150	Eder Samir Martelo Vega	Los Cerritos		

4. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y AUDITORIA VISIBLE

En el informe la interventoría certifica el cumplimiento de las dos (2) jornadas de socialización una al inicio, la cual se llevó a cabo el 05 de agosto de 2024 y la segunda se llevó a cabo el 29 de febrero de 2025.





Jornada de fecha 5 de agosto de 2024 en el Auditorio de CORPOGUAJIRA



Jornada de Fecha 29 de febrero de 2025 en el Auditorio I.E Agrícola de Tomarrazón

5. CAPACITACIÓN PARA LA OERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE

En el informe la interventoría certifica el cumplimiento de las dos (2) capacitaciones para la operación y mantenimiento de la estufa ecoeficiente.









6. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO

La interventoría certifica las siguientes actividades desarrolladas en la actividad de divulgación:

- Instalación de valla publicitaria



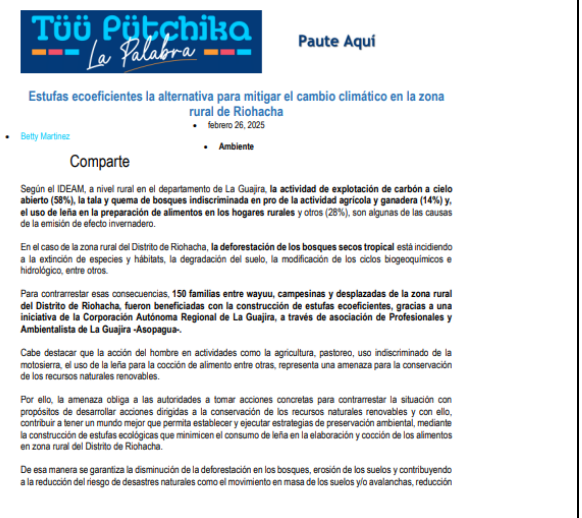
- Publicación en medios impresos



8 | Actualidad | Diario del Norte | Riohacha, miércoles 26 de febrero de 2025

Se mejora la calidad de vida

Estufas coeficientes, alternativa para mitigar el cambio climático en la zona rural del Distrito de Riohacha



Tüü Pütchika La Palabra

Paute Aquí

Estufas ecoeficientes la alternativa para mitigar el cambio climático en la zona rural de Riohacha

- Betty Martinez
- febrero 26, 2025
- Ambiente

Comparte

Según el IDEAM, a nivel rural en el departamento de La Guajira, **la actividad de explotación de carbón a cielo abierto (58%), la tala y quema de bosques indiscriminada en pro de la actividad agrícola y ganadera (14%) y, el uso de leña en la preparación de alimentos en los hogares rurales** y otros (28%), son algunas de las causas de la emisión de efecto invernadero.

En el caso de la zona rural del Distrito de Riohacha, **la deforestación de los bosques secos tropical** está incidiendo a la extinción de especies y hábitats, la degradación del suelo, la modificación de los ciclos biogeoquímicos e hidrológico, entre otros.

Para contrarrestar esas consecuencias, **150 familias entre wayuu, campesinas y desplazadas de la zona rural del Distrito de Riohacha, fueron beneficiadas con la construcción de estufas ecoeficientes, gracias a una iniciativa de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, a través de asociación de Profesionales y Ambientalista de La Guajira -Asopagua-.**

Cabe destacar que la acción del hombre en actividades como la agricultura, pastoreo, uso indiscriminado de la motosierra, el uso de la leña para la cocción de alimento entre otras, representa una amenaza para la conservación de los recursos naturales renovables.

Por ello, la amenaza obliga a las autoridades a tomar acciones concretas para contrarrestar la situación con propósitos de desarrollar acciones dirigidas a la conservación de los recursos naturales renovables y con ello, contribuir a tener un mundo mejor que permita establecer y ejecutar estrategias de preservación ambiental, mediante la construcción de estufas ecológicas que minimicen el consumo de leña en la elaboración y cocción de los alimentos en zona rural del Distrito de Riohacha.

De esa manera se garantiza la disminución de la deforestación en los bosques, erosión de los suelos y contribuyendo a la reducción del riesgo de desastres naturales como el movimiento en masa de los suelos y/o avalanchas, reducción

Financiera – Presupuestal (conciliación cifras del contrato)

Dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control

de costos. El resumen del Balance hasta la fecha, es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO:	$ 55.131.702,00	
MENOS ANTICIPO:		27.565.851,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:		$ 0,00
VALOR PRESENTE PAGO:		$ 55.131.702,00
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO:		27.565.851,00
SALDO POR EJECUTAR		$ 0,00
SUMAS IGUALES	$ 55.131.702,00	$ 55.131.702,00

7. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Imagen 1. Plan de Inversión del Anticipo.

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO
CONTRATO 069 DE 2024

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	TOTAL
ITEM					
SALARIOS	$ 6.813.112	$ 6.813.112	$ 4.401.271		
GASTOS DE OFICINA Y VARIOS	$ 4.769.178	$ 4.769.178			
Total Mensual	$ 11.582.290	$ 11.582.290	$ 4.401.271	$ 0	$ 27.565.851

Imagen 2. Ejecución del Contrato

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA

		A	B	C	D	E	F	
ITEM	ACTIVIDAD	SUELDO MES BASICO	CANT	% DEDICACION	F.M.	Valor Mes (A * B * C * D)	MESES	TOTAL PARCIAL(E * F)
1	COSTOS DEL PERSONAL							
1.1	Personal de Supervisión							
1.1.1	Director de Interventoria	$ 5.000.000	1	50%	1,70	$ 4.250.000	4	$ 17.000.000
1.1.2	Ingeniero Ambiental ocivil	$ 3.200.000	1	100%	1,70	$ 5.440.000	4	$ 21.760.000
1.1.3	Trabajadora Social	$ 2.226.224	1	50%	1,70	$ 1.892.290	4	$ 7.569.161
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS								$ 46.329.161
RESUMEN GENERAL								
COSTO TOTAL								$ 46.329.161
IVA 19%								$ 8.802.541
VALOR TOTAL INTERVENTORIA								$ 55.131.702

Jurídicas:

Haciendo una revisión de las pólizas de garantías, se encuentran actualizadas y aprobadas. Ver la siguiente imagen

Garantías del proveedor:


Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.16272021	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	52.375.116,90 COP	SEGUROS DEL ESTADO	1/03/2028 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.16271529	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	52.375.116,90 COP	SEGUROS DEL ESTADO	8/12/2027 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.16271522	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	22 días de tiempo transcurrido (30/04/2025 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Caducado	Detalle
CO1.WRT.16271507	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	1/03/2025 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Caducado	Detalle
CO1.WRT.14716614	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	52.375.116,90 COP	SEGUROS DEL ESTADO	8/11/2027 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado	Detalle

CONCLUSIONES:

Teniendo en cuanta la revisión realizada al Informe No. 6, esta supervisión recomienda lo siguiente:

1. Realizar el cargue del informe en la página del SECOP II dentro del tiempo fijado para su revisión por parte de la supervisión del contrato.
2. Presentar informes el primer (01) día hábil de cada mes y cada vez que el supervisor lo requiera para dar cuenta de la correcta ejecución del contrato y de sus acciones donde se describa el avance alcanzado físico y financiero de las actividades, estado de las obras, y actividades, los inconvenientes presentados, con todos los soportes y registros legales pertinentes.

FIRMA:



SUPERVISOR O INTERVENTOR
(CARGO)
FECHA DEL INFORME: 23 de mayo de 2025
CON ANEXO: SI

1. Anexo 1. Actas de visita
2. Anexo 2. Actas de recibo de estufas ecoeficientes
3. Información cartográfica
4. Anexo 3. Listado de asistencia Socialización, Capacitación y ficha de satisfacción
5. Anexo 4. Divulgación
6. Anexo 5. Correspondencia, Oficios enviados y Actas de reunión
7. Anexo 6. Contrato de Recursos Humano, parafiscales y certificado de paz y salvo de honorarios.
