Nombre del Evento:	Comité virtual de seguimiento técnico, contrato de obra pública N° 084 de 2023
Tema/Proyecto/Asunto: Comité de seguimiento técnico, contrato de obra pública N°084 de 2023	**Fecha:** 10/02/2025 **Lugar:** virtual **Hora de Inicio:** 9:00 a.m. **Hora de Final:** 10:00 a.m.
Agenda:	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Yuri Hurtado	Supervisor de Obra	Corpoguajira
Angelica Patricia Mendoza	Supervisor de interventoría	Corpoguajira
Yondilver Maestre	R.Legal	Asopagua
Juan Carlos Amaya	Director interventoría	Prida S.A.S
Heiser Lopez	Residente	Prida S.A.S

SEGUIMIENTO COMPROMISOS REUNION ANTERIOR

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES

DESARROLLO

El día 10 lunes de febrero de 2025, se procede a celebrar el Comité virtual de seguimiento técnico al contrato de obra pública N° 084 de 2023, convocado por parte de la interventoría; donde se contó con la asistencia de los participantes anteriormente mencionado

Inicialmente el señor Yondilver Maestre presentó el informe de avance de obra, destacando la construcción de 52 estufas y la finalización de tres más. Se acordó la necesidad de un informe el lunes sobre el avance real y se estableció la importancia de mantener una comunicación constante para evitar retrasos. Juan Amaya sugirió asignar a una persona para acompañar las verificaciones en el terreno, mientras que se discutió la necesidad de un acompañamiento para abordar observaciones sobre la construcción, dado que el trabajo previo no fue satisfactorio.

Yondilver Maestre expuso dificultades en la entrega de materiales a beneficiarios en zonas de difícil acceso y la necesidad de verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos. Se debatió sobre la responsabilidad de la alcaldía en la entrega de beneficiarios y se propusieron soluciones prácticas para manejar la situación. También se destacó la importancia de realizar talleres para capacitar a los beneficiarios en el uso de las estufas y se acordó realizar reuniones grupales para asegurar su participación y socializar el avance del proyecto.

Yondilver Maestre informó que se han construido 52 estufas y que se están finalizando tres más. Se acordó que se enviará un informe el lunes con el avance real de la semana y la

programación de las estufas restantes. Juan Amaya enfatizó la importancia de recibir actualizaciones en tiempo real para un mejor seguimiento del proyecto.

Juan Amaya solicitó apoyo para resolver observaciones sobre la construcción de estufas, indicando que el trabajo anterior no fue productivo. Yondilver Maestre se comprometió a firmar las actas y a recibir las observaciones, pero enfatizó que el enfoque debe estar en avanzar en la construcción. Yuri Paulin Hurtado García expresó preocupación por el tiempo restante para completar el proyecto.

Yondilver Maestre y Juan Amaya discutieron la situación de las chimeneas, destacando que algunas están por debajo del techo, lo que podría afectar la evacuación del humo. Heiser Rafael Lopez Cuello informó que, de 15 estufas medidas, la mayoría tenía una altura de 2.4 centímetros, lo que es inferior a las especificaciones. Angélica Patricia Mendoza Redondo también participó, mencionando que las mediciones de las estufas eran consistentes.

Juan Amaya y Angélica Patricia Mendoza Redondo discutieron la elaboración de un acta para ajustar las cantidades de vitrificado en las estufas, destacando la necesidad de ser precisos en los cálculos. Angélica advirtió sobre la importancia de evitar pagos excesivos o insuficientes. Yondilver Maestre pidió que se documentara adecuadamente el proceso de entrega de las estufas para prevenir problemas futuros.

Yondilver Maestre describe la situación de Marta Cecilia Lozano, quien está construyendo en un nuevo predio sin haber cumplido con los requisitos de vivienda. Juan Amaya y Yuri Paulin Hurtado enfatizan la importancia de verificar que los beneficiarios realmente habiten las construcciones antes de proceder con la entrega de materiales. La conversación gira en torno a la necesidad de asegurar que se cumplan las condiciones establecidas para evitar problemas futuros.

Yondilver Maestre explicó que cinco hermanos y su madre viven en un predio bien organizado para sus cultivos y cría de animales. Juan Amaya y Yuri Paulin Hurtado Garcia comentaron sobre la ubicación del cambuche y la falta de vivienda, mientras que Yondilver destacó el compromiso de la señora Marta de cumplir con la construcción del cambuche antes del 28.

Yondilver Maestre destacó que la entrega de materiales a ocho beneficiarios se complica por la inclinación extrema de la vía, que presenta riesgos para los conductores. Aunque se ha concertado con un transportador local, la situación de las vías sigue siendo un desafío. Maestre está a la espera de confirmación sobre el estado de la maquinaria que podría facilitar el acceso.

Angélica Patricia Mendoza Redondo destacó la responsabilidad de la alcaldía en la entrega de beneficiarios, mientras que Yondilver Maestre cuestionó la veracidad de esta afirmación. Juan Amaya propuso tener un plan alternativo y buscar justificaciones para el desistimiento de beneficiarios, sugiriendo la necesidad de evidencia fotográfica y la firma de una autoridad local para respaldar la situación.

Juan Amaya enfatizó que la vivencia fotográfica es crucial para identificar techos deteriorados que no cumplen su función de proteger las estufas. Yondilver Maestre mencionó que la

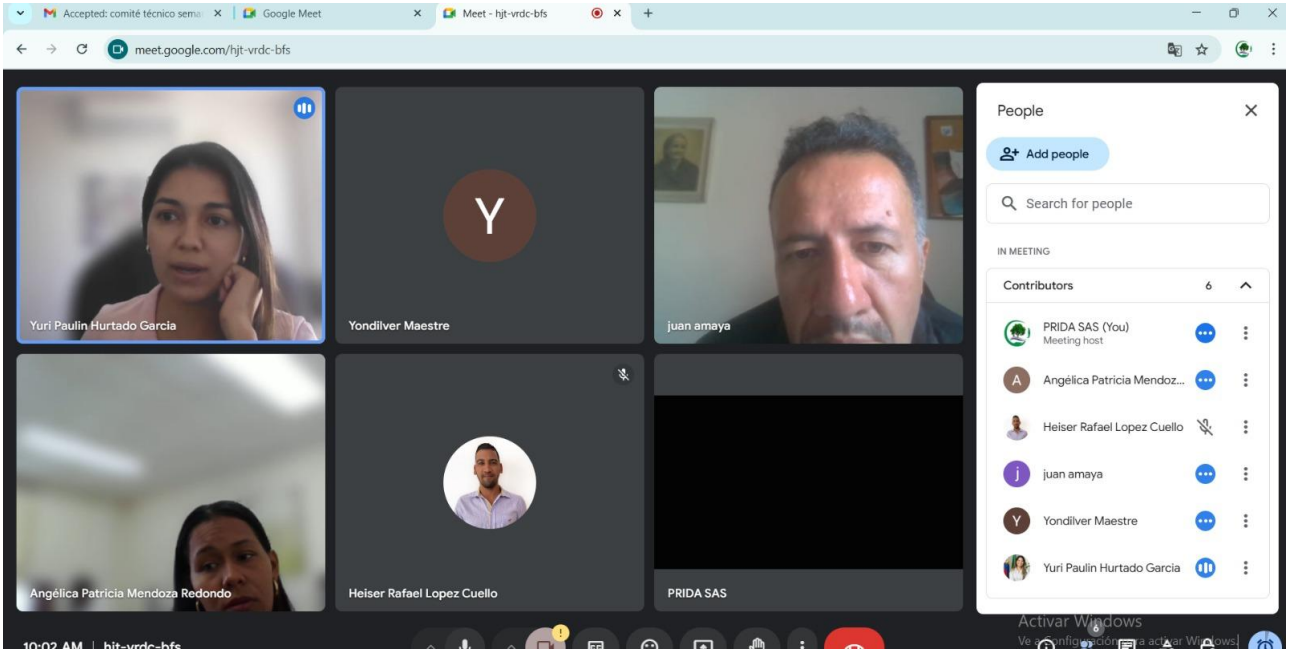
colaboración en mano de obra es necesaria, mientras que Angélica Patricia Mendoza sugirió soluciones estéticas como la impermeabilización. La discusión se centró en cómo abordar estos problemas sin depender de materiales adicionales.

Angélica Patricia Mendoza Redondo mencionó la necesidad de avanzar en la organización de talleres para beneficiarios. Yondilver Maestre sugirió convocar a los beneficiarios por sectores para realizar reuniones grupales, donde se capacitaría sobre el uso de estufas y se socializaría el avance del proyecto. Juan Amaya enfatizó la importancia de convocar a los beneficiarios, aunque no se les puede obligar a asistir.

COMPROMISO		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Enviar Programación semanal	Asopagua	
Enviar avance real de construcción		
Enviar listado de beneficiarios que no cumplen con las especificaciones técnicas.		
Enviar programación para las capacitaciones y talleres.		

Se cierra el acta con 4 folios.

Evidencia del comité virtual


meet.google.com/hjt-vrdc-bfs
Yuri Paulin Hurtado Garcia
Yondilver Maestre
juan amaya
Angélica Patricia Mendoza Redondo
Heiser Rafael Lopez Cuello
PRIDA SAS
People
Add people
Search for people
IN MEETING
Contributors 6
PRIDA SAS (You)
Meeting host
Angélica Patricia Mendoz...
Heiser Rafael Lopez Cuello
juan amaya
Yondilver Maestre
Yuri Paulin Hurtado Garcia
Activar Windows
