INFORME INTERVENTORÍA N°02



INTERVENTOR:
ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.

Entre los suscritos **LUIS HUMBERTO PAZ TIMANÁ** en nombre y representación de la **NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO** quien se denominará el Contratante, por una parte; y por otra parte el **ING. ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO** identificado con cedula de ciudadanía No 9.731.335 de Armenia-Quindío, quien se denominará el Contratista, celebraron el día 01 de noviembre de 2024 el Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.6973355 cuyo objeto es **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO".**

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 5
2 DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO 6
3 INFORMACION GENERAL 8
3.1 Información general del contrato de interventoría 8
3.2 Información general del contrato de obra 8
4 ASPECTOS TÉCNICOS DE LA OBRA 9
4.1 Aspecto de diseño 9
5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 13
6 SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA 14
6.1 Avance de los contratos de obra e interventoría 14
6.1.1 Contrato de obra 14
6.1.2 Contrato de interventoría. 16
7. AVANCE EN TIEMPO DE LOS CONTRATOS 17
7.1 Para el contrato de obra: 17
7.2 Para el contrato de interventoría: 17
8. PROGRAMACIÓN DE OBRA 18
9. ACTIVIDADES Y CANTIDADES INICIALES 22
10. ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS EN EL MES 28
11. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA 35
11.1 CAPÍTULO 1 PRELIMINARES 35
12. PMA: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 51
13. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 52
13.1 Actas de inicio 52
13.2 Socialización del proyecto: 52
13.3 Comités de obra: 53
14. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL 53
14.1 Clausula 8 Forma de pago contrato de obra 53
14.2 Clausula 8 Forma de pago contrato de interventoría 54
15. PERSONAL Y EQUIPO UTILIZADO EN OBRA 54
16. CONTROL DE CALIDAD 55
16.1 Metodología de medición y cuantificación de obra ejecutada 55
17. CONTROL DE PÓLIZAS Y RESERVAS PRESUPUÉSTALES 55
17.1 Pólizas contratista de obra 55
17.2 Pólizas contratista de interventoría. 56
18. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 58
19. ACTIVIDADES RELEVANTES 58
20. ESTADO DEL TIEMPO 59
21. INCONVENIENTES ENCONTRADOS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA 59
22. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 60
23. ANEXOS 62

LISTA DE TABLAS

TABLA 1. *INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.* 8
TABLA 2. *INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.* 9
TABLA 3. *AVANCE TÉCNICO AL CONTRATO DE OBRA.* 15
TABLA 4. *AVANCE TÉCNICO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.* 17
TABLA 5. *AVANCE EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA.* 17
TABLA 6. *AVANCE EN TIEMPO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.* 18
TABLA 7. *PROGRAMACIÓN AL CONTRATO DE OBRA.* 22
TABLA 8. *CANTIDADES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA.* 28
TABLA 9. *CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA.* 35
TABLA 10. PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ANEXO 0 56
TABLA 11. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0 . 56
TABLA 12. PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES. ANEXO 0 57

LISTA DE IMÁGENES

IMAGEN 1: *LOCALIZACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.* 7
IMAGEN 2:LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL ÁREA A INTERVENIR EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 7
IMAGEN 3: PLANOS ESTRUCTURALES 9
IMAGEN 4: PLANOS PLANTA PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA. 10
IMAGEN 5: *PLANO PERFIL PALACIO DE JUSTICIA MOCOA.* 10
IMAGEN 6: PROTECCIÓN ARQUITECTÓNICOS. 11
IMAGEN 7: *PLANO DE FACHADA PRINCIPAL.* 11
IMAGEN 8: MODELO. 12
IMAGEN 9 PLANO POR PLANTA EN CADA PISO 12
IMAGEN 10: LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO. 36
IMAGEN 11: LOCALIZACIÓN MURO UNA CARA DRYWALL. 36
IMAGEN 12: DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS. 37
IMAGEN 13: DESMONTE DE CIELO RASO. 38
IMAGEN 14: DESMONTE DE TASAS SANITARIAS, ORINALES Y LAVAMANOS. 39
IMAGEN 15: DESMONTE DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. 39
IMAGEN 16: DESMONTE DE LUMINARIAS. 41
IMAGEN 17: DESMONTE DE REDES ELÉCTRICAS. 41
IMAGEN 18: DEMOLICIÓN DE MUROS E ≤ 15CM. 42
IMAGEN 19: DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PARED. 42
IMAGEN 20: DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS. 43
IMAGEN 21: DEMOLICIÓN REPELLO DE PISOS. 43
IMAGEN 22: DEMOLICIÓN REPELLO DE PARED. 44
IMAGEN 23: CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO. 44
IMAGEN 24: DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO. 45
IMAGEN 25: *REGISTRO FOTOGRÁFICO – SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO* 53

LISTA DE GRAFICOS

GRÁFICO 1: *PROGRAMADO VS EJECUTADO CONTRATO DE OBRA MES 2* 16

INTRODUCCIÓN

La Nación - Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Distrito Pasto en nombre y representación de **LUIS HUMBERTO PAZ TIMANÁ**, busca solucionar el deterioro actual que vive la infraestructura física del palacio de justicia de mocoa no permite prestar una atencion de manera integral, organizada, coordinada y de cumplimiento en infraestructura de calidad, que satisfaga las necesidades de sus usuarios y personal del palacio de justicia. Por tal razón,contrató con el **ING. ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO**, la realización de la interventoria del contrato **N° CO1.PCCNTR.6973355,** cuyo objeto es: **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO".**Este proyecto comprende actividades preliminares, instalaciones hidrosanitarias,red electrica, muros, repellos, enchapes, estucos, pintura,carpinteria,cubierta y cielos rasos,aparatos sanitarios,varios y aseo, con el fin de garantizar la seguridad de los servidores judiciales, usuarios y visitantes, asegurando un entorno libre de riesgos, eficiencia en la administración de justicia, un espacio físico adecuado y funcional facilita la labor de los servidores judiciales, permitiendo unaatención más eficiente y oportuna a los usuarios.

Por lo tanto, el presente informe contiene toda la informacion necesaria para que la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Distrito Pasto pueda verificar el cumplimiento de estas obligaciones, tanto en lo relativo a la ejecucion fisica como la ejecucion financiera, soportada con datos obtenidos en campo. En los anexos a este informe, se registran todos los controles realizados al proyecto de acuerdo a las especificaciones técnicas.

También se presenta un resumen de las actividades ejecutadas, los problemas presentados, las acciones correctivas tomadas y la manera como se superaron, junto a registro fotográfico de los trabajos. Para finalizar se formulan las conclusiones y recomendaciones, para el periodo comprendido en este informe entre el 14 de diciembre y el 23 de diciembre del 2024 y desde el 14 de enero hasta el 31 de enero del 2025.

2 DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO

2.1. Descripción del Proyecto

El desarrollo de las actividades del contrato de la obra nos lleva a solucionar el inconveniente, que radica en el actual deterioro que se encuentra la infraestructura física del palacio de justicia municipio de Mocoa Departamento del Putumayo, dado que no cuenta con instalaciones apropiadas, generando incumpliendo con la normatividad y regulaciones vigentes en materia de seguridad, salud ocupacional y accesibilidad, como también, la preservación de la imagen institucional, un edificio bien mantenido y restaurado refleja la imagen de la institución y su compromiso con la justicia y el servicio a la comunidad.

Para el efecto la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Distrito Pasto, presentó el proyecto **"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA";** que fue viabilizado y aprobado, para financiar su ejecución. Los estudios y diseños del proyecto fueron aportados por la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Distrito Pasto, siendo beneficiario directo palacio de justicia del municipio de Mocoa departamento del Putumayo.

2.2. Localización del proyecto

La ejecución de las actividades contractuales se encuentra localizadas en el Municipio de Mocoa que se encuentra localizado está ubicado en la parte norte del Departamento del Putumayo, específicamente en el palacio de justicia, Calle 7 No 6 - 42, Barrio Centro.



Imagen 1: *Localización General del Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo.*
Fuente: *www.googlemaps.com*

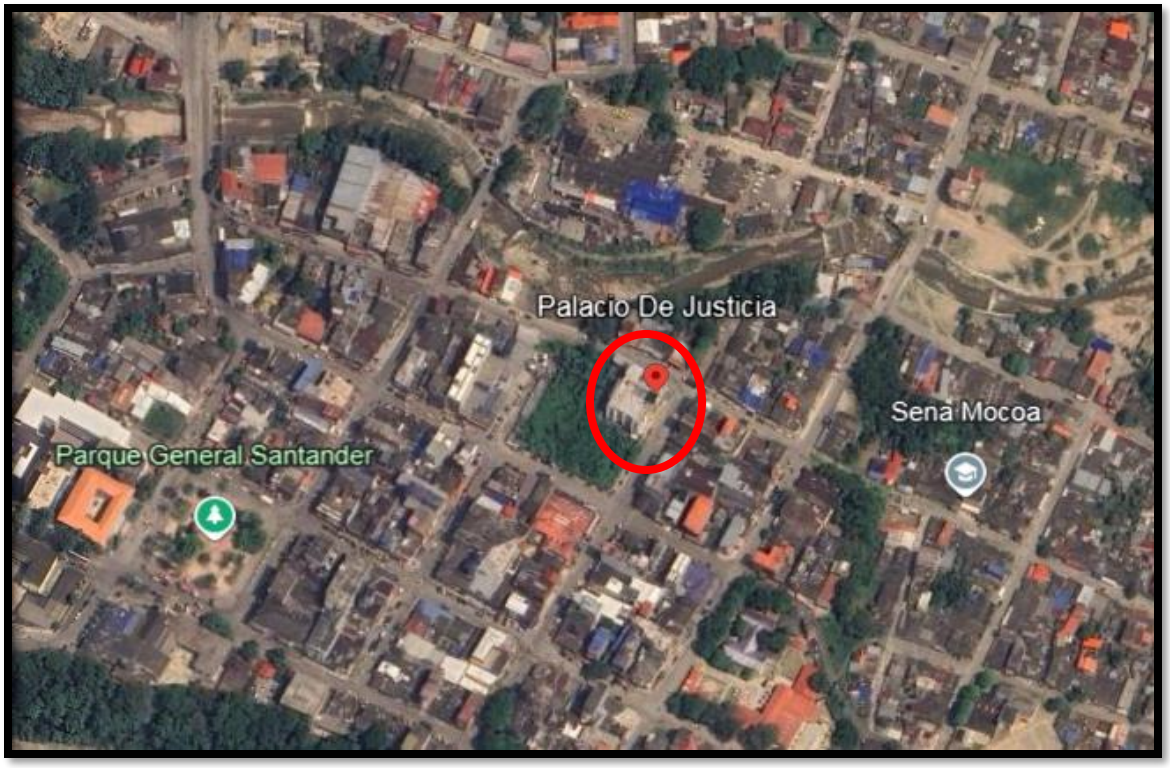


Imagen 2:*Localización especifica del área a intervenir en el municipio de Mocoa departamento del Putumayo.*
Fuente: *www.earth.google.com*

3 INFORMACION GENERAL

3.1 Información general del contrato de interventoría

CONTRATO No	01.PCCNTR.6973355 DEL 01/11/2024
OBJETO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
FECHA DEL CONTRATO	01 DE NOVIEMBRE DEL 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUARETA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO
VALOR INICIAL	TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($33.336.660.00) M/CTE
ADICION N°1	VEINTISEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS DIESCISIETE PESOS ($ 26.113.717.00) M/CTE.
VALOR INICIAL + ADICION N°1.	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($ 59.450.377.00) M/CTE.
FECHA DE INICIACIÓN	14 DE NOVIEMBRE DEL 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	31 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE REINICIO	13 DE ENERO DEL 2025
FECHA DE TERMINACION N°2	21 DE ENERO DEL 2025
PRORROGA N°1	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACION N°3	21 DE MARZO DEL 2024

***TABLA 1**. Información general del contrato de interventoría.*
***Fuente:** Elaboración Propia.*

3.2 Información general del contrato de obra

CONTRATO No	O1.PCCNTR.6947019 DEL 29 DE OCTUBRE 2024
OBJETO	"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S
FECHA DEL CONTRATO	29 DE OCTUBRE DEL 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (2) MESES
VALOR INICIAL	NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($955.501.990.00) M/CTE
FECHA DE INICIACIÓN	14 DE NOVIEMBRE DEL 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	13 DE ENERO DEL 2025
FECHA SUSPENSION N°1	31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE REINICIO	13 DE ENERO 2025

FECHA TERMINACION N°2	21 DE ENERO 2025
PRORROGA N°1	DOS (2) MESES
FECHA TERMINACION N°3	21 DE MARZO 2025

TABLA 2. *Información general del contrato de obra.*
Fuente: *Elaboración Propia.*

4 ASPECTOS TÉCNICOS DE LA OBRA

4.1 Aspecto de diseño

El proyecto consiste en realizar el mantenimiento de las áreas del palacio de justicia del municipio de Mocoa, departamento del putumayo.

El contratista de obra efectuó una revisión detallada de los estudios y diseños suministrados por la entidad una vez revisada la información técnica del proyecto, el contratista de obra encontró algunas inconsistencias en los planos arquitectónicos, eléctricos y sanitarios.

La interventoría reviso detenidamente las observaciones presentadas por el contratista de obra donde efectivamente se evidencias inconsistencias que se tienen en consideración en comité con supervisión.

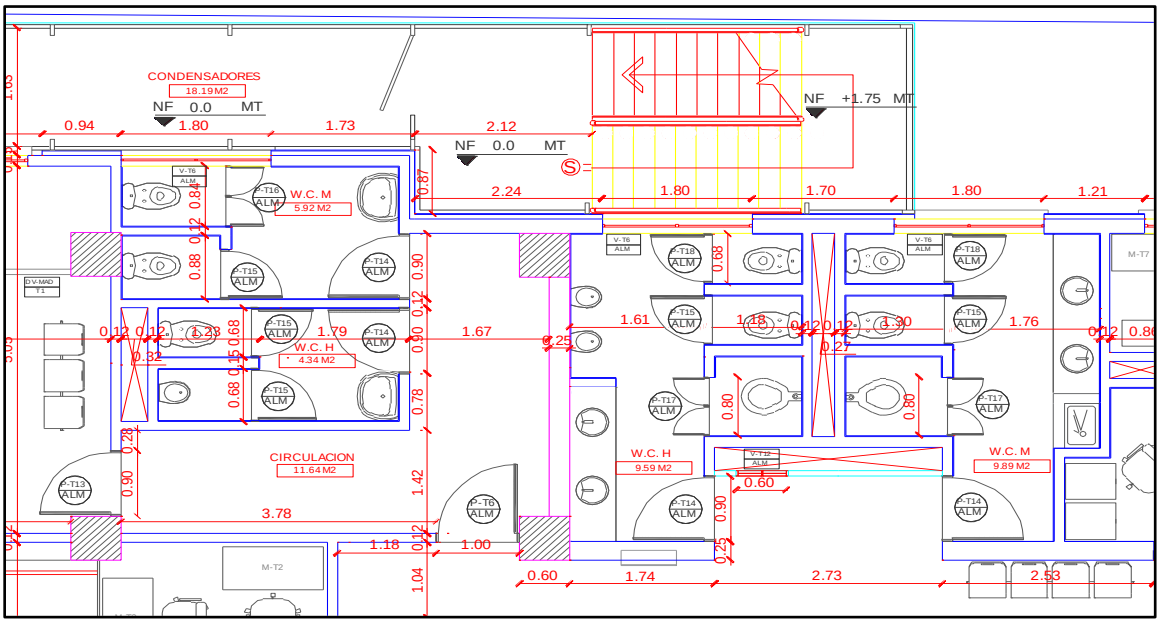


Imagen 3: *Planos estructurales*
Fuente: *Documentos otorgados por la entidad.*

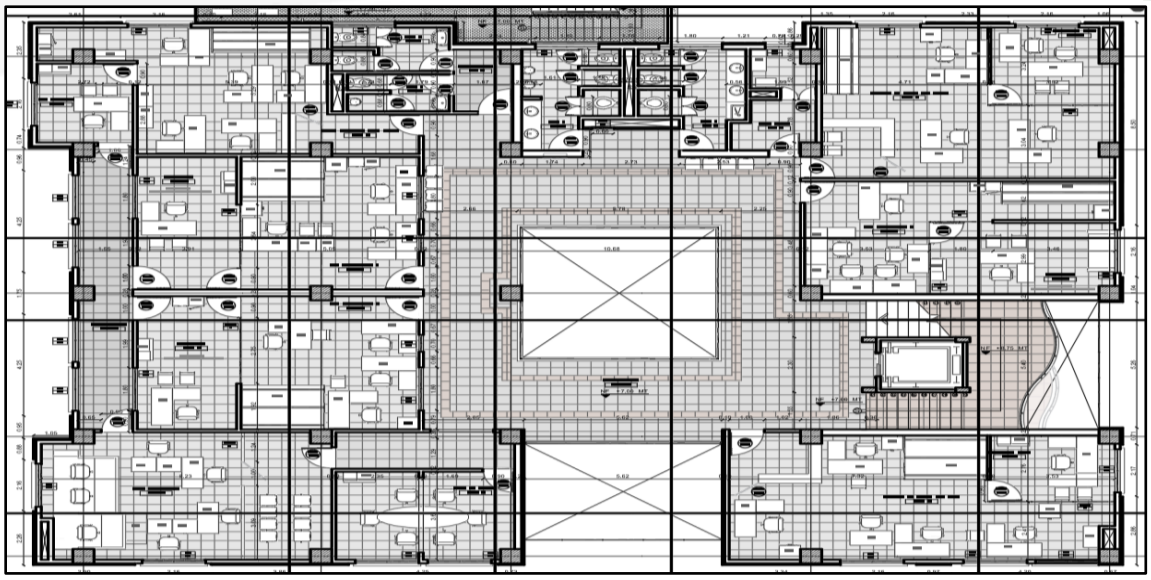


Imagen 4: Planos planta palacio de justicia de Mocoa.
Fuente: *Documentos otorgados por la entidad.*

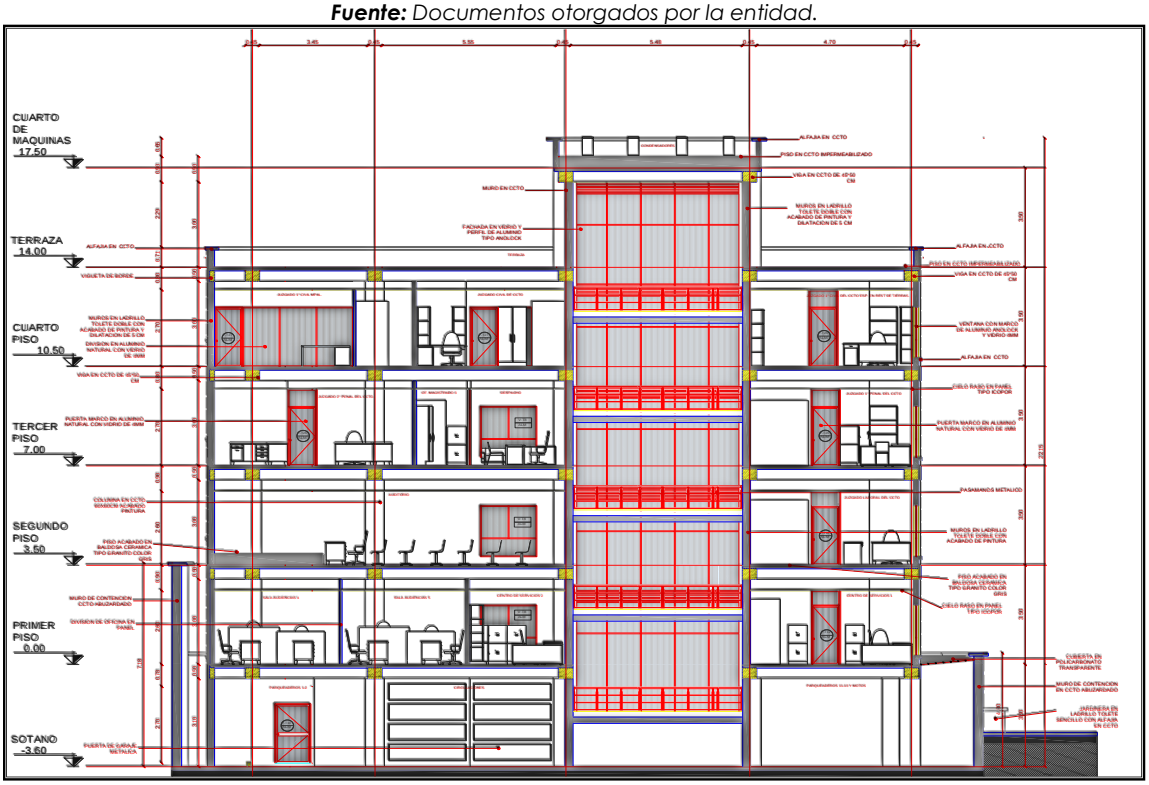


Imagen 5: *Plano perfil palacio de justicia Mocoa.*
Fuente: *Documentos otorgados por la entidad.*

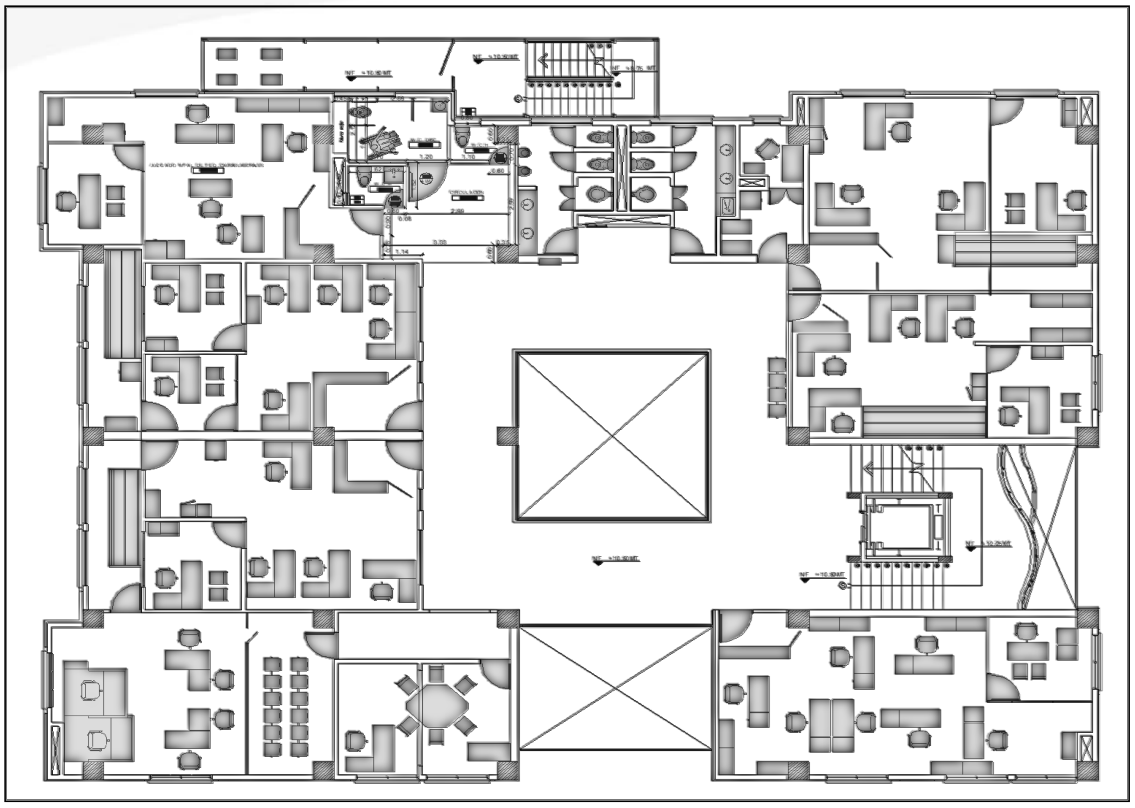


Imagen 6: Protección arquitectónicos.
Fuente: Documentos otorgados por la entidad.

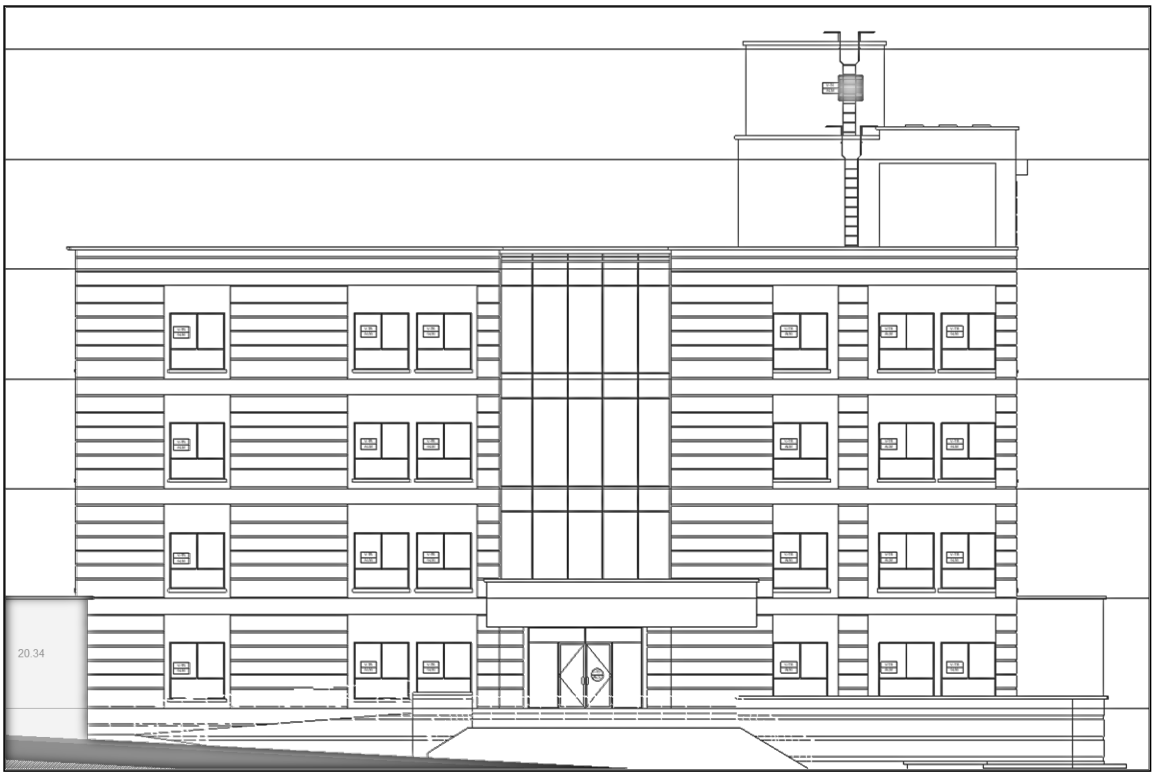


Imagen 7: *Plano de fachada principal.*
Fuente: *Documentos otorgados por la entidad.*



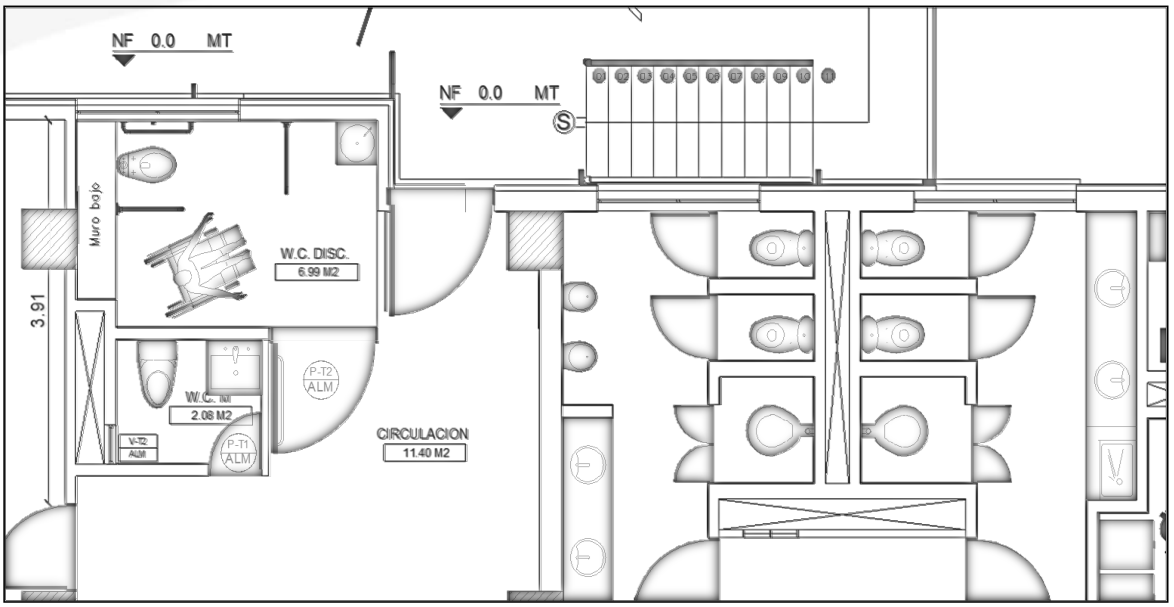


Imagen 8: *Modelo.*
Fuente: *Documentos otorgados por la entidad.*


PRIMER PISO

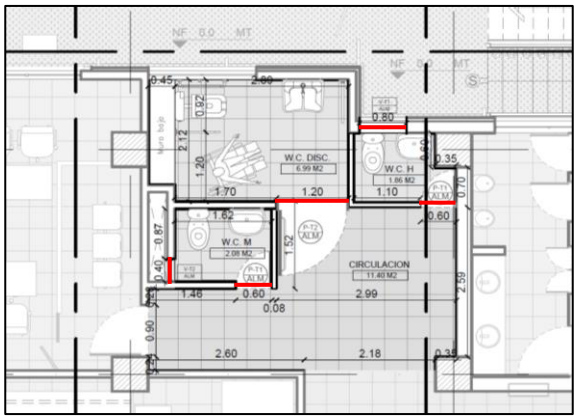

SEGUNDO PISO

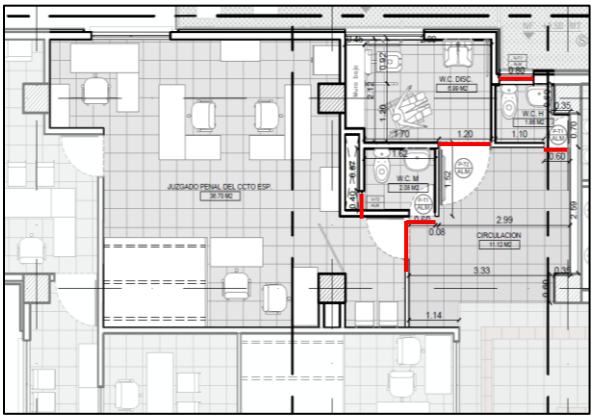

TERCER PISO

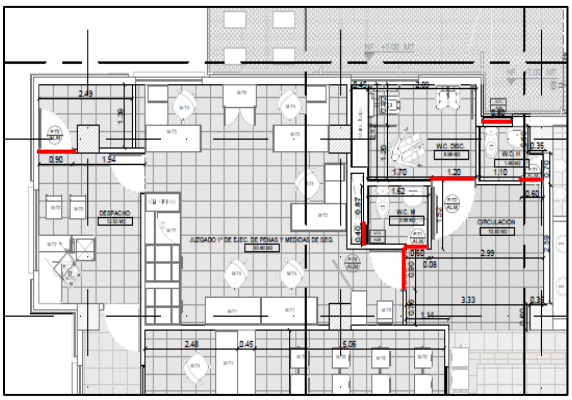

CUARTO PISO

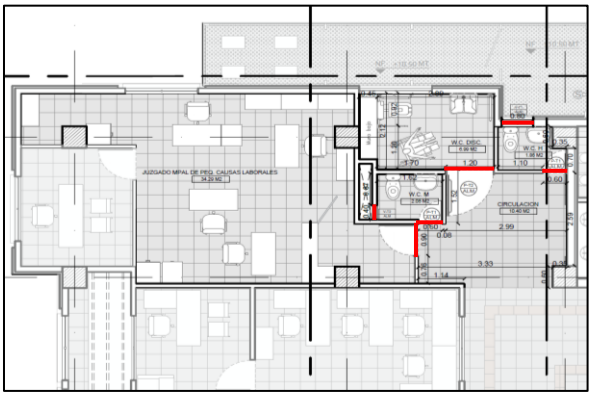


Imagen 9 *Plano por planta en cada piso*
Fuente: Documentos otorgados por la entidad

5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

Se desarrolló revisión y aprobación de la documentación requerida para el avance del contrato de obra según las obligaciones contractuales tales como equipo mínimo requerido, análisis de precios unitarios, cronograma, plan de manejo ambiental (PMA), plan de seguridad y salud en el trabajo (SST), etc.Se viene desarrollando un plan de trabajo según la propuesta presentada inicialmente por la interventoría, haciendo énfasis en el estricto seguimiento al desarrollo del contrato de obra, garantizando la calidad de los trabajos efectuados.

Se ha verificado el seguimiento técnico mediante la supervisión, inspección y control de calidad de los trabajos de obra, informes y documentos que se generan del proyecto garantizando el correcto cumplimiento de las obligaciones técnicas contractuales.
Durante el periodo comprendido entre el día 14 de diciembre al 23 diciembre del 2024 y desde el 13 de enero al 31 de enero del 2025, se realizaron las siguientes actividades principales:

- ✓ Socialización del proyecto.
- ✓ Firma acta de inicio de obra y de interventoría.
- ✓ Control técnico a las actividades ejecutadas de acuerdo a las especificaciones y normas técnicas.
- ✓ Control administrativo, realizando las actas, oficios y documentación pertinente a la ejecución del contrato para su buen desarrollo.
- ✓ Ejecución del informe mensual N.02
- ✓ Seguimiento y control a los procesos constructivos entregados por el contratista.
- ✓ Verificación de afiliaciones y pagos a seguridad social y riesgos profesionales.
- ✓ Solicitudes de certificados de calidad de los materiales utilizados en obra.
- ✓ Comunicación permanente con la entidad contratante para informar del avance y actividades adelantadas referentes al proyecto.
- ✓ Reuniones con el contratista, antes y durante la suscripción del acta de inicio, para definir las directrices a seguir durante la ejecución del proyecto.
- ✓ Control técnico, económico y financiero del proyecto en desarrollo.

- ✓ Revisión de estudios, diseños, planos y memorias de cálculo del proyecto, se emiten observaciones a los mismos.
- ✓ Suscripción de documentos contractuales.
- ✓ Revisión y localización de sitios de obra.
- ✓ Solicitud al contratista, de toda la documentación pertinente.
- ✓ Control de dotación del personal en obra.
- ✓ Seguimiento y control al programa de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST), y al Plan manejo ambiental (PMA) durante la ejecución del proyecto.
- ✓ Solicitar al contratista los informes mensuales de los diferentes planes de seguimiento y control.
- ✓ Las demás inherentes a sus obligaciones.

6 SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA

6.1 Avance de los contratos de obra e interventoría

6.1.1 Contrato de obra

Se resalta de forma relevante, que, a la fecha de ejecución con respecto a la programación de obra inicial, se evidencian avances significativos para la obra; las actividades desarrolladas en el marco del contrato de obra No, CO1.PCCNTR.6947019 del 29 de octubre 2024 corresponden a ***Capítulo 1 actividades preliminares, subcapítulo 1.1 iniciales,*** ítem 1.1.1 Localización y replanteo arquitectónico, incluye planos récord. ítem 1.1.2 Instalación y desinstalación de muro una cara DRYWALL, provisional para cerrar las obras, incluye puerta con marco para ingreso de trabajadores, ítem 1.1.3 Señalización de obra en lona de 60x40cm impresión full color, incluye marco y anclaje, ***subcapítulo 1.2 desmontes y retiros,*** ítem 1.2.1 Desmonte de marcos y puertas, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia. ítem 1.2.3 Desmonte de cielo raso en fibra mineral y/o panel yeso y/o fibrocemento, incluye estructura soporte, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta. ítem 1.2.4 Desmonte de Tasas sanitarias, orinales y lavamanos, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta. ítem 1.2.5 Desmonte de instalaciones hidrosanitarias, incluye tuberías y accesorios, regatas y sellos provisionales, cargue a volqueta. ítem 1.2.6 Rasqueteo, cepillo y limpieza manual de superficies, con el fin de retirar impurezas y capas de pintura existentes. ítem 1.2.7 Retiro de luminarias ubicadas en cielos rasos y pared, incluye trasiego a punto de acopio. ítem 1.2.8 Retiro de

redes eléctricas en piso, techo y pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta. ***subcapítulo 1.3 demoliciones***, ítem 1.3.1 Demolición muro E ≤ 15CM en mampostería maciza o hueca, incluye cortes con pulidora, trasiegos y cargue a volqueta. ítem 1.3.2 Demolición de enchape de pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta. ítem 1.3.3 Demolición de enchapes de piso, incluye trasiego y cargue a volqueta. ítem 1.3.4 Demolición repello de piso, incluye picado Eprom = 0.03m, incluye trasiego y cargue a volqueta. ítem 1.3.5 Demolición repello de pared, muros mampostería eprom= 0.02m, incluye trasiegos y cargue a volqueta. ítem 1.3.6 Cargue, transporte y retiro del material sobrante proveniente de las obras de mantenimiento, hasta el botadero. ítem 1.3.7 Demolición de mesones en concreto, recubierto con granito incluye salpicadero. ***Capítulo 2 instalaciones hidrosanitarias, subcapítulo 2.1 red suministro agua potable*** ítem 2.1.1 Instalaciones PVC 1/2" RDE 13.5. ítem 2.1.2 Instalaciones PVC 3/4" RDE 21. ítem 2.1.3 Instalaciones PVC RDE 21 1". ítem 2.1.5 Punto hidráulico PVC 1/2". ***subcapítulo 2.2 iniciales*** ítem 2.2.1 Instalaciones sanitarias PVC 2". ítem 2.2.2 Instalaciones sanitarias PVC 4". ítem 2.2.5 Punto sanitario 4" WC. ítem 2.2.6 Punto sanitario 2". ***Capítulo 5 Repellos,*** ítem 5.1 Repello de piso y pared con mortero 1:4 espesor 2cm. Incluye aditivo impermeabilizante. ***Capítulo 7 estucos,*** ítem 7.2 Estuco plástico para muros y resanes incluye juntas, filos y dilataciones. ***Capítulo 8 pintura*** ítem 8.1 Pintura de muros en mampostería 3 manos, vinilo tipo 1, lavable.

De acuerdo con la evaluación del periodo No 02 de ejecución, la obra presenta un porcentaje ejecutado acumulado del 25.07% que corresponde a una inversión de $239.479.805,00 un porcentaje programado acumulado de 22.34% que corresponde a una inversión de $ 213.473.942.00 con respecto del valor contratado.

DESCRIPCIÓN OBRA	VALOR
Valor Inicial costo de la obra:	$ 955.501.961
Valor programado para el periodo No. 2:	$ 213.473.942
Porcentaje programado para el periodo No. 2:	22,34%
Valor ejecutado periodo No. 02 (14/12/2024-23/12/2024 al 13/01/2025-31/01/2025):	$ 239.479.805
Porcentaje ejecutado periodo No. 02 (14/12/2024-23/12/2024 al 13/01/2025-31/01/2025):	25,07%
Valor programado acumulado:	$ 213.473.942
Porcentaje programado acumulado:	22,34%
Valor ejecutado acumulado:	$ 239.479.805
Porcentaje de ejecución acumulado:	25,07%
Déficit (-) / Superávit (+) de avance en obra:	2.73 %

TABLA 3. *Avance técnico al contrato de Obra.*
Fuente: *Elaboración Propia.*

PROGRAMADO VS EJECUTADO OBRA

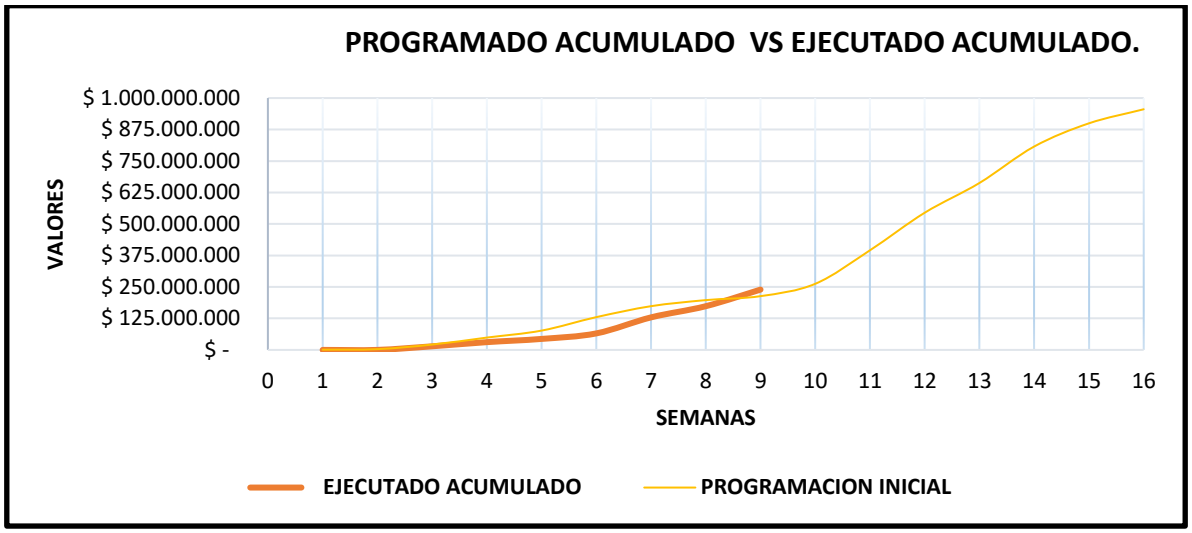


Gráfico 1: *Programado vs ejecutado contrato de obra Mes 2*
Fuente: *Elaboración Propia.*

6.1.2 Contrato de interventoría.

La Interventoría ha cumplido sus funciones desde la suscripción del acta de inicio, verificando que las actividades pactadas por el contratista de obra se cumplan a cabalidad de acuerdo con las especificaciones técnicas, normatividad vigente y acatando recomendaciones por parte de Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Distrito Pasto.

Básicamente durante el periodo comprendido entre la firma del contrato y la presente fecha, se realizaron las actividades técnicas de revisión general del proyecto, estimación de cantidades de obra, revisión de documentos contractuales, acompañamiento en la revisión de los diseños, y el seguimiento y control a la ejecución de la obra, entre otros, a fin de garantizar todas las herramientas e insumos que permitan el normal y adecuado desarrollo del proyecto.

De acuerdo con la evaluación del periodo de ejecución 14 de diciembre al 23 de diciembre del 2024 y desde el 13 de enero al 31 de diciembre, la interventoría presenta un porcentaje ejecutado del 54,81% que corresponde a una inversión de $ 18.271.054,04 respecto del valor contratado.

GENERAL INTERVENTORIA	
DESCRIPCIÓN	**VALOR**
Valor Inicial Costo de la Interventoría:	$ 33.336.660,00
Valor adición N°1	$ 26.113.717.00
Valor Inicial + Valor adición N°1	$ 59.450.377.00
Porcentaje de ejecución presente mes:	54,81%
Valor ejecutado periodo No. 02 ((14/12/2024-23/12/2024 al 13/01/2025-31/01/2025):	$ 18.271.054,04
Porcentaje de ejecución acumulado:	54,81%
Valor ejecutado acumulado:	$ 18.271.054,04

TABLA 4. *Avance técnico al contrato de Interventoría.*
Fuente: *Elaboración Propia.*

7. AVANCE EN TIEMPO DE LOS CONTRATOS

7.1 Para el contrato de obra:

El tiempo acumulado de labores es de treinta (30) días respecto del plazo total pactado de dos (2) meses iniciales y prorroga de dos (2) meses de ejecución, contados desde el día 14 de diciembre al 23 de diciembre 2024 y desde 13 de enero al 31 de enero del 2025 que corresponden al 54.81% de avance en tiempo con respecto al plazo del contrato.

Plazo inicial	Dos (2) meses
Prorroga N°1	Dos (2) meses
Avance en tiempo	54 días
Porcentaje de avance en tiempo	54,81%

TABLA 5. *Avance en tiempo al contrato de Obra.*
Fuente: *Elaboración Propia.*

7.2 Para el contrato de interventoría:

El tiempo acumulado de labores es de cuarenta y cinco (45) días respecto del plazo total pactado de cuarenta y cinco (45) días de ejecución, y prorroga de dos (2) meses de ejecución, contados desde el día 14 de diciembre al 23 de diciembre 2024 y desde 13 de enero al 31 de enero del 2025 que corresponden al 54,81% de avance en tiempo con respecto al plazo del contrato.

Plazo inicial	Cuarenta y cinco (45) días
Prorroga N°1	Dos (2) meses
Avance en tiempo	54 días

Porcentaje de avance en tiempo	54,81%

TABLA 6. *Avance en tiempo al contrato de Interventoría.*
Fuente: *Elaboración Propia.*

8. PROGRAMACIÓN DE OBRA

El control de la programación y el presupuesto del contrato se realizó con base en el cronograma y el flujo de caja presentado por el contratista, del que se extrae los capítulos principales y los diversos ítems del proyecto, para efectuar el seguimiento y control de las actividades proyectadas vs las actividades ejecutadas, con el fin de evitar que se genere un incumplimiento de los plazos iniciales y el valor presupuestado de la construcción. A continuación, se presentan los datos iniciales proyectados para la ejecución de la obra:

REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA.			
CRONOGRAMA			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**INICIO**	**FINAL**
1	**PRELIMINARES**		
1.1	**INICIALES**		
1.1.1	Localización y replanteo arquitectónico, incluye planos récord	14/11/2024	17/11/2024
1.1.2	Instalación y desinstalación de muro una cara drywall, provisional para cerrar las obras, incluye puerta con marco para ingreso de trabajadores	14/11/2024	15/12/2024
1.1.3	Señalización de obra en lona de 60x40cm impresión full color, incluye marco y anclaje	28/11/2024	04/12/2024
1.2	**DESMONTES Y RETIROS**		
1.2.1	Desmonte de marcos y puertas, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	21/11/2024	15/12/2024
1.2.2	Desmonte de marco, ventana y vidrio, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	21/11/2024	15/12/2024
1.2.3	Desmonte de cielo raso en fibra mineral y/o panel yeso y/o fibrocemento, incluye estructura soporte, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	21/11/2024	15/12/2024
1.2.4	Desmonte de Tasas sanitarias, orinales y lavamanos, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	21/11/2024	15/12/2024
1.2.5	Desmonte de instalaciones hidrosanitarias, incluye tuberías y accesorios, regatas y sellos provisionales, cargue a volqueta	21/11/2024	15/12/2024
1.2.6	Rasqueteo, cepillo y limpieza manual de superficies, con el fin de retirar impurezas y capas de pintura existentes.	28/11/2024	15/12/2024
1.2.7	Retiro de luminarias ubicadas en cielos rasos y pared, incluye trasiego a punto de acopio	21/11/2024	15/12/2024
1.2.8	Retiro de redes eléctricas en piso, techo y pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	21/11/2024	15/12/2024
1.3	**DEMOLICIONES**		

1.3.1	Demolición muro E ≤ 15CM en mampostería maciza o hueca, incluye cortes con pulidora, trasiegos y cargue a volqueta.	21/11/2024	15/12/2024
1.3.2	Demolición de enchape de pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	21/11/2024	15/12/2024
1.3.3	Demolición de enchapes de piso, incluye trasiego y cargue a volqueta	21/11/2024	15/12/2024
1.3.4	Demolición repello de piso, incluye picado Eprom = 0.03m, incluye trasiego y cargue a volqueta	21/11/2024	15/12/2024
1.3.5	Demolición repello de pared, muros mampostería eprom= 0.02m, incluye trasiegos y cargue a volqueta	21/11/2024	15/12/2024
1.3.6	Cargue, transporte y retiro del material sobrante proveniente de las obras de mantenimiento, hasta el botadero.	28/11/2024	18/12/2024
1.3.7	Demolición de mesones en concreto, recubierto con granito incluye salpicadero	21/11/2024	15/12/2024
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**		
2.1	**RED SUMINISTRO AGUA POTABLE**		
2.1.1	Instalaciones PVC 1/2" RDE 13.5	02/12/2024	18/12/2024
2.1.2	Instalaciones PVC 3/4" RDE 21	02/12/2024	18/12/2024
2.1.3	Instalaciones PVC RDE 21 1"	02/12/2024	18/12/2024
2.1.4	Instalaciones PVC RDE 21 2"	02/12/2024	18/12/2024
2.1.5	Punto hidráulico PVC 1/2"	02/12/2024	18/12/2024
2.1.6	Punto hidráulico PVC 3/4"	02/12/2024	18/12/2024
2.1.7	Punto hidráulico PVC 1/2" incluye válvula control paso 1/2" y tapa PVC Blanca 15x15cm	02/12/2024	18/12/2024
2.2	**RED SANITARIA, PLUVIAL, VENTILACION**		
2.2.1	Instalaciones sanitarias PVC 2"	02/12/2024	18/12/2024
2.2.2	Instalaciones sanitarias PVC 4"	02/12/2024	18/12/2024
2.2.3	Instalaciones ventilación PVC 2"	02/12/2024	18/12/2024
2.2.4	Instalaciones ventilación PVC 3"	02/12/2024	18/12/2024
2.2.5	Punto sanitario 4" WC	02/12/2024	18/12/2024
2.2.6	Punto sanitario 2"	02/12/2024	18/12/2024
2.2.7	Suministro e instalación de rejilla de piso en acero inoxidable cuadrada de 10cm salida a tubería 2"	02/12/2024	18/12/2024
2.2.8	Suministro e instalación de tubería de conexión de desagües de aires acondicionados	02/12/2024	18/12/2024
3	**RED ELECTRICA**		
3.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
3.1.1	S.I.P. Salida toma doble GFCI 1F/20AMP en tubería PVC SCH40 1/2", caja galvanizada y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	09/12/2024	18/12/2024
3.1.2	S.I.P. Salida sensor de movimiento tipo interruptor 360° 1F/15AMP En muro, Tubería PVC SCH40 D:1/2", Cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	09/12/2024	18/12/2024
3.1.3	S.I.P Luminaria de sobreponer 400x120 para uso interior, fabricada en lámina de acero COLD ROLLED, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate y difusor lamina acrílico opalizado L11. Producto para instalación de sobreponer, en temperatura de color 5000K flujo lumínico de 4400Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 28.56W.	09/12/2024	18/12/2024

3.1.4	S.I.P. Luminaria tipo bala 72x83 para incrustar, Producto tipo DOWNLIGHT de uso interior fabricado en aluminio inyectado, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate en temperatura de color 6500K flujo lumínico de 550Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 6.00W.	09/12/2024	18/12/2024
3.1.5	S.I.P Luminaria tipo bala GS 15W 5000K	09/12/2024	18/12/2024
3.1.6	S.I.P Letrero lumínico de emergencia SALIDA 90E 300X185X45 2.6W 120-277V SOBREPONER	09/12/2024	18/12/2024
3.1.7	S.I.P Luminaria de emergencia 185X50X108 SOBREPONER 2-BL 2W	09/12/2024	18/12/2024
3.1.8	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP en techo, Tubería D:1/2" SCH40, Caja octogonal y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	09/12/2024	18/12/2024
3.1.9	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP emergencia, Tubería D:1/2 EMT, Caja RADWELL 5800 y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, incluye fijación, Libre de halogenuros, incluye aparato	09/12/2024	18/12/2024
3.1.10	S.I.A. Tablero de circuitos para baños, incluye 6 protecciones de 20A	09/12/2024	18/12/2024
4	**MUROS**		
4.1	Suministro e instalación de muro doble cara en lámina de fibrocemento 8mm. Estructura base 6. incluye estuco y dos manos de pintura	16/12/2024	29/12/2024
4.2	Carteras en lámina de fibrocemento 8mm dos caras, en marco ventana y puertas	16/12/2024	29/12/2024
5	**REPELLOS**		
5.1	Repello de piso y pared con mortero 1:4 espesor 2cm. Incluye aditivo impermeabilizante.	16/12/2024	29/12/2024
5.2	Impermeabilización de losa de entrepiso y muros laterales de terraza, con recubrimiento impermeabilizante acrílico de alto desempeño con tecnología DFX y fibras para impermeabilizar cubiertas	16/12/2024	29/12/2024
6	**ENCHAPES**		
6.1	**PISOS**		
6.1.1	Enchape cerámica de piso estructurado 20.6x92.6cm, uso comercial moderado	16/12/2024	29/12/2024
6.1.2	Enchape cerámica de piso 60x60cm color gris, uso exteriores tráfico comercial	16/12/2024	29/12/2024
6.1.3	Acabado para uniones entre muro y losa de piso en media caña con mortero 1-4 H: 0,07m	23/12/2024	29/12/2024
6.2	**PARED**		
6.2.1	Enchape cerámica de pared color marfil caras diferenciadas 30.1x75.3cm	16/12/2024	29/12/2024
6.2.2	Guarda canto flecha 8 milímetros cromo aluminio mate	23/12/2024	29/12/2024
6.2.3	Suministro e instalación de espejo E= 3mm flotante biselado en sus cuatro lados sobre soporte metálico	26/12/2024	29/12/2024
6.2.4	Mesón en granito artificial verde uva tuba incluye solapa inferior en aglomerado ancho 50cm con melamina, ancho de mesón 0.60m	19/12/2024	29/12/2024
7	**ESTUCOS**		

7.1	Estuco acrílico para exteriores, incluye juntas, filos y dilataciones	02/12/2024	25/12/2024
7.2	Estuco plástico para muros y resanes incluye juntas, filos y dilataciones	02/12/2024	25/12/2024
8	**PINTURA**		
8.1	Pintura de muros en mampostería 3 manos, vinilo tipo 1, lavable	09/12/2024	31/12/2024
8.2	Pintura para exteriores (3 manos) para paredes.	09/12/2024	31/12/2024
8.3	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial ancho 10cm, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, para pavimento rígido	12/12/2024	25/12/2024
8.4	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial, números con circunferencias de 66 y 40cm para carros y motos. imprimación en negro y pintura tráfico vehicular, incluye micro esferas, para pavimento rígido	12/12/2024	25/12/2024
8.5	Aplicación de pintura en frio base solvente para flechas de ingreso y salida, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, sobre pavimento rígido	12/12/2024	25/12/2024
9	**CARPINTERIAS**		
9.1	Suministro e instalación de puerta de dos hojas batientes elaborada en tubular aluminio estriado ANOLOC, incluye chapa pomo de alcoba metálica pasador y argolla para candado. Medidas de cada hoja 0.9mx2.10m (ver plano A-022, P-T3)	19/12/2024	25/12/2024
9.2	Sellado de juntas entre muros y marcos de ventanería con sellador de juntas de poliuretano.	19/12/2024	25/12/2024
10	**CUBIERTAS Y CIELO RASO**		
10.2	Limpieza, lavado, cambio de amarras y ganchos, aplicación de sellante en amarras de policarbonato alveolar	09/12/2024	22/12/2024
10.3	Suministro e instalación de cielo raso desmontable, láminas de fibra mineral 0,60m x 0,60m, incluye estructura	09/12/2024	22/12/2024
11	**APARATOS SANITARIOS Y DOTACION BAÑOS**		
11.1	Kit Taza sanitaria entrada superior con fluxómetro con sensor, blanco institucional (Incluye Taza Sanitaria para Fluxómetro, asiento sanitario, sensor, sistema conexión entrada superior)	19/12/2024	31/12/2024
11.2	Taza sanitaria alongado, blanco institucional ultra ahorradora (Sanitario con push)	19/12/2024	31/12/2024
11.3	Barra de seguridad Fija Recta en acero inoxidable (baño para personas con movilidad reducida), incluye anclajes	19/12/2024	31/12/2024
11.4	Barra de seguridad abatible (baño para personas con movilidad reducida) incluye anclajes	19/12/2024	31/12/2024
11.5	Lavamanos blanco institucional, para personas con movilidad reducida, incluye anclajes	19/12/2024	31/12/2024
11.6	Lavamanos blanco institucional, para incrustar en mesones	19/12/2024	31/12/2024
11.7	Suministro e instalación de brazo de soporte para lavamanos	19/12/2024	31/12/2024
11.8	Suministro e instalación de grifería para lavamanos y desagüe tipo botella sencillo incluye acople	19/12/2024	31/12/2024

11.9	Construcción lava traperos 70x50x50cm, enchapado.	19/12/2024	31/12/2024
11.10	Kit Orinal arrecife o similar para fluxómetro	19/12/2024	31/12/2024
11.11	Dispensador De Papel Higiénico Acero Inoxidable Diámetro De 26 Cm	19/12/2024	31/12/2024
11.12	Papelera metálica en acero inoxidable según especificaciones	19/12/2024	31/12/2024
11.13	Dispensador de jabón para empotrar en pared, en acero inoxidable, 1.2Litros	19/12/2024	31/12/2024
11.14	Suministro e instalación de divisiones sanitarias a piso en acero inoxidable AISI SAE 304 para baños de uso institucional. Batería completa con tres (3) cubículos para unidades sanitarias. Incluye tornillería y accesorios.	19/12/2024	31/12/2024
11.15	Dispensador De Toallas De Papel En Z Acero Inoxidable De 27x27x10 Cm	19/12/2024	31/12/2024
12	**SEÑALIZACIÓN**		
12.1	Suministro e instalación de placa de señalización de 0,65 x 0,50 m con planimetría salidas de emergencia, en acrílico de 2.4 con impresión full color y regletas en MDF para su instalación.	26/12/2024	31/12/2024
12.2	Suministro e instalación Franjas Guías longitudinales de ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	26/12/2024	31/12/2024
12.3	Suministro e instalación de Punto alerta ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	26/12/2024	31/12/2024
12.4	Suministro e Instalación de Loseta alerta en policarbonato, 20 x 20 cm., Altura total: 5mm, Peso 150 gr, incluye anclaje	26/12/2024	31/12/2024
12.5	Suministro e instalación de letreros luminosos informativos en parqueadero doble cara, ubicado en sótano 1.50x0.40m	26/12/2024	31/12/2024
12.6	Suministro e instalación de letras en acero inoxidable de la frase: PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA y Escudo de la Rama judicial diámetro 50cm, tamaño de letra 30cm cada una, según diseño	26/12/2024	31/12/2024
13	**VARIOS Y ASEO GENERAL**		
13.1	Brigada de aseo	30/12/2024	31/12/2024

TABLA 7. *Programación al contrato de obra.*
Fuente: *Elaboración Propia.*

9. ACTIVIDADES Y CANTIDADES INICIALES

Las actividades para realizarse en condiciones iniciales en la etapa de ejecución se especifican en la siguiente tabla:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1.1	**INICIALES**				
1.1.1	Localización y replanteo arquitectónico, incluye planos récord	M2	332,00	4.020	1.334.640
1.1.2	Instalación y desinstalación de muro una cara drywall, provisional para cerrar las obras, incluye puerta con marco para ingreso de trabajadores	M2	53,00	80.367	4.259.451

1.1.3	Señalización de obra en lona de 60x40cm impresión full color, incluye marco y anclaje	UND	9,00	63.143	568.287
				Sub Total	**6.162.378**
1.2	**DESMONTES Y RETIROS**				
1.2.1	Desmonte de marcos y puertas, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	57,00	27.472	1.565.904
1.2.2	Desmonte de marco, ventana y vidrio, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	1,00	28.472	28.472
1.2.3	Desmonte de cielo raso en fibra mineral y/o panel yeso y/o fibrocemento, incluye estructura soporte, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	M2	250,00	30.983	7.745.750
1.2.4	Desmonte de Tasas sanitarias, orinales y lavamanos, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	UND	48,00	55.750	2.676.000
1.2.5	Desmonte de instalaciones hidrosanitarias, incluye tuberías y accesorios, regatas y sellos provisionales, cargue a volqueta	UND	72,00	60.060	4.324.320
1.2.6	Rasqueteo, cepillo y limpieza manual de superficies, con el fin de retirar impurezas y capas de pintura existentes.	M2	1017,00	5.059	5.145.003
1.2.7	Retiro de luminarias ubicadas en cielos rasos y pared, incluye trasiego a punto de acopio	UND	46,00	22.534	1.036.564
1.2.8	Retiro de redes eléctricas en piso, techo y pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	GL	1,00	2.323.710	2.323.710
				Sub Total	**24.845.723**
1.3	**DEMOLICIONES**				
1.3.1	Demolición muro E ≤ 15CM en mampostería maciza o hueca, incluye cortes con pulidora, trasiegos y cargue a volqueta.	M2	220,00	18.665	4.106.300
1.3.2	Demolición de enchape de pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	704,36	15.356	10.816.214
1.3.3	Demolición de enchapes de piso, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	283,00	14.544	4.115.952
1.3.4	Demolición repello de piso, incluye picado Eprom = 0.03m, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	835,00	13.482	11.257.470
1.3.5	Demolición repello de pared, muros mampostería eprom= 0.02m, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	291,80	15.728,53	4.589.649
1.3.6	Cargue, transporte y retiro del material sobrante proveniente de las obras de mantenimiento, hasta el botadero.	M3	234,00	41.793	9.779.562
1.3.7	Demolición de mesones en concreto, recubierto con granito incluye salpicadero	M2	11,00	39.245	431.695
				Sub Total	**45.096.842**
				TOTAL PRELIMINARES	**76.104.943**
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
2.1	**RED SUMINISTRO AGUA POTABLE**				
2.1.1	Instalaciones PVC 1/2" RDE 13.5	ML	95,00	7.881	748.695
2.1.2	Instalaciones PVC 3/4" RDE 21	ML	28,00	11.381	318.668
2.1.3	Instalaciones PVC RDE 21 1"	ML	50,21	12.524	628.830
2.1.4	Instalaciones PVC RDE 21 2"	ML	6,00	28.037	168.222
2.1.5	Punto hidráulico PVC 1/2"	UND	60,00	25.150	1.509.000
2.1.6	Punto hidráulico PVC 3/4"	UND	8,00	27.387	219.096

2.1.7	Punto hidráulico PVC 1/2" incluye válvula control paso 1/2" y tapa PVC Blanca 15x15cm	UND	18,00	62.356	1.122.408
				Sub Total	**4.714.919**
2.2	**RED SANITARIA, PLUVIAL, VENTILACION**				
2.2.1	Instalaciones sanitarias PVC 2"	ML	58,00	26.100	1.513.800
2.2.2	Instalaciones sanitarias PVC 4"	ML	119,00	43.702	5.200.538
2.2.3	Instalaciones ventilación PVC 2"	ML	183,00	21.009	3.844.647
2.2.4	Instalaciones ventilación PVC 3"	ML	35,00	32.923	1.152.305
2.2.5	Punto sanitario 4" WC	UND	32,00	47.820	1.530.240
2.2.6	Punto sanitario 2"	UND	44,00	35.262	1.551.528
2.2.7	Suministro e instalación de rejilla de piso en acero inoxidable cuadrada de 10cm salida a tubería 2"	UND	24,00	50.333	1.207.992
2.2.8	Suministro e instalación de tubería de conexión de desagües de aires acondicionados	ML	36,00	21.009	756.324
				Sub Total	**16.757.374**
				TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	**21.472.293**
3	**RED ELECTRICA**				
3.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
3.1.1	S.I.P. Salida toma doble GFCI 1F/20AMP en tubería PVC SCH40 1/2", caja galvanizada y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	16,00	178.052	2.848.832
3.1.2	S.I.P. Salida sensor de movimiento tipo interruptor 360° 1F/15AMP En muro, Tubería PVC SCH40 D:1/2", Cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	32,00	144.299	4.617.568
3.1.3	S.I.P Luminaria de sobreponer 400x120 para uso interior, fabricada en lámina de acero COLD ROLLED, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate y difusor lamina acrílico opalizado L11. Producto para instalación de sobreponer, en temperatura de color 5000K flujo lumínico de 4400Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 28.56W.	UND	4,00	441.238	1.764.952
3.1.4	S.I.P. Luminaria tipo bala 72x83 para incrustar, Producto tipo DOWNLIGHT de uso interior fabricado en aluminio inyectado, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate en temperatura de color 6500K flujo lumínico de 550Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 6.00W.	UND	40,00	67.839	2.713.560
3.1.5	S.I.P Luminaria tipo bala GS 15W 5000K	UND	12,00	150.791	1.809.492
3.1.6	S.I.P Letrero lumínico de emergencia SALIDA 90E 300X185X45 2.6W 120-277V SOBREPONER	UND	20,00	111.758	2.235.160
3.1.7	S.I.P Luminaria de emergencia 185X50X108 SOBREPONER 2-BL 2W	UND	40,00	117.027	4.681.080
3.1.8	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP en techo, Tubería D:1/2" SCH40, Caja octogonal y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	66,00	127.969	8.445.954
3.1.9	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP emergencia, Tubería D:1/2 EMT, Caja RADWELL 5800 y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T,	UND	45,00	185.338	8.340.210

	incluye fijación, Libre de halogenuros, incluye aparato				
3.1.10	S.I.A. Tablero de circuitos para baños, incluye 6 protecciones de 20A	UND	4,00	860.000	3.440.000
				Sub Total	**40.896.808**
				TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS	**40.896.808**
4	**MUROS**				
4.1	Suministro e instalación de muro doble cara en lámina de fibrocemento 8mm. Estructura base 6. incluye estuco y dos manos de pintura	M2	84,00	178.468	14.991.312
4.2	Carteras en lámina de fibrocemento 8mm dos caras, en marco ventana y puertas	ML	163,80	71.565	11.722.347
				Sub Total	**26.713.659**
				TOTAL MAMPOSTERIA	**26.713.659**
5	**REPELLOS**				
5.1	Repello de piso y pared con mortero 1:4 espesor 2cm. Incluye aditivo impermeabilizante.	M2	1374,87	46.194	63.510.837
5.2	Impermeabilización de losa de entrepiso y muros laterales de terraza, con recubrimiento impermeabilizante acrílico de alto desempeño con tecnología DFX y fibras para impermeabilizar cubiertas	M2	660,00	53.308	35.183.280
				Sub Total	**98.694.117**
				TOTAL REPELLOS	**98.694.117**
6	**ENCHAPES**				
6.1	**PISOS**				
6.1.1	Enchape cerámica de piso estructurado 20.6x92.6cm, uso comercial moderado	M2	258,00	137.958	35.593.164
6.1.2	Enchape cerámica de piso 60x60cm color gris, uso exteriores tráfico comercial	M2	88,00	104.329	9.180.952
6.1.3	Acabado para uniones entre muro y losa de piso en media caña con mortero 1-4 H: 0,07m	ML	85,00	28.430	2.416.550
				Sub Total	**7.190.666**
6.2	**PARED**				
6.2.1	Enchape cerámica de pared color marfil caras diferenciadas 30.1x75.3cm	M2	457,00	118.370	54.095.090
6.2.2	Guarda canto flecha 8 milímetros cromo aluminio mate	ML	31,00	13.512	418.872
6.2.3	Suministro e instalación de espejo E= 3mm flotante biselado en sus cuatro lados sobre soporte metálico	M2	20,00	376.443	7.528.860
6.2.4	Mesón en granito artificial verde uva tuba incluye solapa inferior en aglomerado ancho 50cm con melamina, ancho de mesón 0.60m	ML	17,00	1.193.000	20.281.000
				Sub Total	**2.323.822**
				TOTAL ENCHAPES	**129.514.488**
7	**ESTUCOS**				
7.1	Estuco acrílico para exteriores, incluye juntas, filos y dilataciones	M2	320,00	22.628	7.240.960

7.2	Estuco plástico para muros y resanes incluye juntas, filos y dilataciones	M2	973,00	17.313	16.845.549
				Sub Total	**24.086.509**
				TOTAL ESTUCOS	**24.086.509**
8	**PINTURA**				
8.1	Pintura de muros en mampostería 3 manos, vinilo tipo 1, lavable	M2	5137,00	13.301	68.327.237
8.2	Pintura para exteriores (3 manos) para paredes.	M2	1280,00	28.775	36.832.000
8.3	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial ancho 10cm, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, para pavimento rígido	ML	173,52	15.000	2.602.800
8.4	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial, números con circunferencias de 66 y 40cm para carros y motos. imprimación en negro y pintura tráfico vehicular, incluye micro esferas, para pavimento rígido	UND	42,00	32.000	1.344.000
8.5	Aplicación de pintura en frio base solvente para flechas de ingreso y salida, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, sobre pavimento rígido	M2	27,00	62.000	1.674.000
				Sub Total	**110.780.037**
				TOTAL PINTURA	**110.780.037**
9	**CARPINTERIAS**				
9.1	Suministro e instalación de puerta de dos hojas batientes elaborada en tubular aluminio estriado ANOLOC, incluye chapa pomo de alcoba metálica pasador y argolla para candado. Medidas de cada hoja 0.9mx2.10m (ver plano A-022, P-T3)	UND	1,00	2.469.971	2.469.971
9.2	Sellado de juntas entre muros y marcos de ventanería con sellador de juntas de poliuretano.	ML	367,00	11.494	4.218.298
				Sub Total	**6.688.269**
				TOTAL CARPINTERIAS	**6.688.269**
10	**CUBIERTAS Y CIELO RASO**				
10.2	Limpieza, lavado, cambio de amarras y ganchos, aplicación de sellante en amarras de policarbonato alveolar	M2	33,00	34.060	1.123.980
10.3	Suministro e instalación de cielo raso desmontable, láminas de fibra mineral 0,60m x 0,60m, incluye estructura	M2	220,00	92.868	20.430.960
				Sub Total	**21.554.940**
				TOTAL CUBIERTAS Y CIELO RASO	**21.554.940**
11	**APARATOS SANITARIOS Y DOTACION BAÑOS**				
11.1	Kit Taza sanitaria entrada superior con fluxómetro con sensor, blanco institucional (Incluye Taza Sanitaria para Fluxómetro, asiento sanitario, sensor, sistema conexión entrada superior)	UND	4	3.931.160	15.724.640
11.2	Taza sanitaria alongado, blanco institucional ultra ahorradora (Sanitario con push)	UND	28	1.278.084	35.786.352
11.3	Barra de seguridad Fija Recta en acero inoxidable (baño para personas con movilidad reducida), incluye anclajes	UND	4	482.550	1.930.200
11.4	Barra de seguridad abatible (baño para personas con movilidad reducida) incluye anclajes	UND	4	667.550	2.670.200

11.5	Lavamanos blanco institucional, para personas con movilidad reducida, incluye anclajes	UND	4	575.674	2.302.696
11.6	Lavamanos blanco institucional, para incrustar en mesones	UND	20	341.287	6.825.740
11.7	Suministro e instalación de brazo de soporte para lavamanos	JUEGO	4	300.000	1.200.000
11.8	Suministro e instalación de grifería para lavamanos y desagüe tipo botella sencillo incluye acople	UND	24	64.635	1.551.240
11.9	Construcción lava traperos 70x50x50cm, enchapado.	UND	4	647.450	2.589.800
11.10	Kit Orinal arrecife o similar para fluxómetro	UND	8	1.336.000	10.688.000
11.11	Dispensador De Papel Higiénico Acero Inoxidable Diámetro De 26 Cm	UND	16	163.813	2.621.008
11.12	Papelera metálica en acero inoxidable según especificaciones	UND	32	551.813	17.658.016
11.13	Dispensador de jabón para empotrar en pared, en acero inoxidable, 1.2Litros	UND	16	263.643	4.218.288
11.14	Suministro e instalación de divisiones sanitarias a piso en acero inoxidable AISI SAE 304 para baños de uso institucional. Batería completa con tres (3) cubículos para unidades sanitarias. Incluye tornillería y accesorios.	UND	8,00	8.760.190	70.081.520
11.15	Dispensador De Toallas De Papel En Z Acero Inoxidable De 27x27x10 Cm	UND	16,00	193.813	3.101.008
				Sub Total	**178.948.708**
				TOTAL APARATOS SANITARIOS	**178.948.708**
12	**SEÑALIZACIÓN**				
12.1	Suministro e instalación de placa de señalización de 0,65 x 0,50 m con planimetría salidas de emergencia, en acrílico de 2.4 con impresión full color y regletas en MDF para su instalación.	UND	5,00	238.429	1.192.145
12.2	Suministro e instalación Franjas Guías longitudinales de ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	600,00	11.158	6.694.800
12.3	Suministro e instalación de Punto alerta ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	2100,00	5.886	12.360.600
12.4	Suministro e Instalación de Loseta alerta en policarbonato, 20 x 20 cm., Altura total: 5mm, Peso 150 gr, incluye anclaje	UND	15,00	45.015	675.225
12.5	Suministro e instalación de letreros luminosos informativos en parqueadero doble cara, ubicado en sótano 1.50x0.40m	UND	3,00	600.000	1.800.000
12.6	Suministro e instalación de letras en acero inoxidable de la frase: PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA y Escudo de la Rama judicial diámetro 50cm, tamaño de letra 30cm cada una, según diseño	UND	1,00	6.000.000	6.000.000
				Sub Total	**28.722.770**
				TOTAL SEÑALIZACIÓN	**28.722.770**
13	**VARIOS Y ASEO GENERAL**				
13.1	Brigada de aseo	PERSONA /MES	6,00	2.397.504	14.385.024
				Sub Total	**14.385.024**
				TOTAL VARIOS Y ASEO	**14.385.024**
				TOTAL COSTO DIRECTO:	778.562.565

ADMINISTRACIÓN (18.73%)	145.824.768
IMPREVISTOS (3%)	23.356.877
UTILIDAD (5%)	38.928.128
IVA (19%)	7.396.344
TOTAL, PRESUPUESTO:	**994.068.682**

TABLA 8. *Cantidades iniciales del contrato de obra.*
Fuente: *Elaboración Propia.*

10. ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS EN EL MES

En este periodo se registró un avance por debajo de lo programado inicialmente de actividades físicas, por lo tanto, se informa de un avance acumulado ejecutado del 25,07% que corresponde a una inversión de $239.479.805,00 un porcentaje programado acumulado de 22.34% que corresponde a una inversión de $ 213.473.942 con respecto del valor contratado.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT EJECUTADAS	VR TOTAL EJECUTADAS
1	**PRELIMINARES**						
1.1	**INICIALES**						
1.1.1	Localización y replanteo arquitectónico, incluye planos récord	M2	332,00	4.020	1.334.640	199,00	768.936
1.1.2	Instalación y desinstalación de muro una cara drywall, provisional para cerrar las obras, incluye puerta con marco para ingreso de trabajadores	M2	53,00	80.367	4.259.451	22,00	1.699.478
1.1.3	Señalización de obra en lona de 60x40cm impresión full color, incluye marco y anclaje	UND	9,00	63.143	568.287	9,00	546.237
				Sub Total	**6.162.378**		**3.014.651**
1.2	**DESMONTES Y RETIROS**						
1.2.1	Desmonte de marcos y puertas, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	57,00	27.472	1.565.904	55,00	1.452.330
1.2.2	Desmonte de marco, ventana y vidrio, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	1,00	28.472	28.472	1.00	27.367
1.2.3	Desmonte de cielo raso en fibra mineral y/o panel yeso y/o fibrocemento, incluye estructura soporte, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	M2	250,00	30.983	7.745.750	199,00	5.926.419
1.2.4	Desmonte de Tasas sanitarias, orinales y lavamanos, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	UND	48,00	55.750	2.676.000	48,00	2.572.176

1.2.5	Desmonte de instalaciones hidrosanitarias, incluye tuberías y accesorios, regatas y sellos provisionales, cargue a volqueta	UND	72,00	60.060	4.324.320	63,00	3.636.990
1.2.6	Rasqueteo, cepillo y limpieza manual de superficies, con el fin de retirar impurezas y capas de pintura existentes.	M2	1017,00	5.059	5.145.003	803.00	3.904.989
1.2.7	Retiro de luminarias ubicadas en cielos rasos y pared, incluye trasiego a punto de acopio	UND	46,00	22.534	1.036.564	46,00	996.360
1.2.8	Retiro de redes eléctricas en piso, techo y pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	GL	1,00	2.323.710	2.323.710	1,00	2.233.550
				Sub Total	**24.845.723**		**20.750.181**
1.3	**DEMOLICIONES**						
1.3.1	Demolición muro E ≤ 15CM en mampostería maciza o hueca, incluye cortes con pulidora, trasiegos y cargue a volqueta.	M2	220,00	18.665	4.106.300	184,00	3.301.144
1.3.2	Demolición de enchape de pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	704,36	15.356	10.816.214	553,00	8.162.280
1.3.3	Demolición de enchapes de piso, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	283,00	14.544	4.115.952	142,00	1.985.160
1.3.4	Demolición repello de piso, incluye picado Eprom = 0.03m, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	835,00	13.482	11.257.470	142.00	1.840.178
1.3.5	Demolición repello de pared, muros mampostería eprom= 0.02m, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	291,80	15.728,53	4.589.649	291,00	4.399.509
1.3.6	Cargue, transporte y retiro del material sobrante proveniente de las obras de mantenimiento, hasta el botadero.	M3	234,00	41.793	9.779.562	128,00	5.141.888
1.3.7	Demolición de mesones en concreto, recubierto con granito incluye salpicadero	M2	11,00	39.245	431.695	7,00	264.054
				Sub Total	**45.096.842**		**25.094.213**
				TOTAL PRELIMINARES	**76.104.943**		**48.859.045**
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**						
2.1	**RED SUMINISTRO AGUA POTABLE**						
2.1.1	Instalaciones PVC 1/2" RDE 13.5	ML	95,00	7.881	748.695	95.00	719.625
2.1.2	Instalaciones PVC 3/4" RDE 21	ML	28,00	11.381	318.668	28.00	306.292
2.1.3	Instalaciones PVC RDE 21 1"	ML	50,21	12.524	628.830	50.20	604.308
2.1.4	Instalaciones PVC RDE 21 2"	ML	6,00	28.037	168.222	6.00	161.694
2.1.5	Punto hidráulico PVC 1/2"	UND	60,00	25.150	1.509.000	60.00	1.450.440
2.1.6	Punto hidráulico PVC 3/4"	UND	8,00	27.387	219.096		
2.1.7	Punto hidráulico PVC 1/2" incluye válvula control paso 1/2" y tapa PVC Blanca 15x15cm	UND	18,00	62.356	1.122.408		
				Sub Total	**4.714.919**		**3.242.359**
2.2	**RED SANITARIA, PLUVIAL, VENTILACION**						
2.2.1	Instalaciones sanitarias PVC 2"	ML	58,00	26.100	1.513.800	58.00	1.455.046

2.2.2	Instalaciones sanitarias PVC 4"	ML	119,00	43.702	5.200.538	72.00	3.024.432
2.2.3	Instalaciones ventilación PVC 2"	ML	183,00	21.009	3.844.647	24.00	484.656
2.2.4	Instalaciones ventilación PVC 3"	ML	35,00	32.923	1.152.305		
2.2.5	Punto sanitario 4" WC	UND	32,00	47.820	1.530.240	32.00	1.470.880
2.2.6	Punto sanitario 2"	UND	44,00	35.262	1.551.528	36.00	1.220.184
2.2.7	Suministro e instalación de rejilla de piso en acero inoxidable cuadrada de 10cm salida a tubería 2"	UND	24,00	50.333	1.207.992	24.00	1.161.120
2.2.8	Suministro e instalación de tubería de conexión de desagües de aires acondicionados	ML	36,00	21.009	756.324		
				Sub Total	**16.757.374**		**8.816.318**
	TOTAL, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				**21.472.293**		**12.058.677**
3	**RED ELECTRICA**						
3.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						
3.1.1	S.I.P. Salida toma doble GFCI 1F/20AMP en tubería PVC SCH40 1/2", caja galvanizada y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	16,00	178.052	2.848.832		
3.1.2	S.I.P. Salida sensor de movimiento tipo interruptor 360° 1F/15AMP En muro, Tubería PVC SCH40 D:1/2", Cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	32,00	144.299	4.617.568		
3.1.3	S.I.P Luminaria de sobreponer 400x120 para uso interior, fabricada en lámina de acero COLD ROLLED, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate y difusor lamina acrílico opalizado L11. Producto para instalación de sobreponer, en temperatura de color 5000K flujo lumínico de 4400Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 28.56W.	UND	4,00	441.238	1.764.952		
3.1.4	S.I.P. Luminaria tipo bala 72x83 para incrustar, Producto tipo DOWNLIGHT de uso interior fabricado en aluminio inyectado, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate en temperatura de color 6500K flujo lumínico de 550Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 6.00W.	UND	40,00	67.839	2.713.560		
3.1.5	S.I.P Luminaria tipo bala GS 15W 5000K	UND	12,00	150.791	1.809.492		
3.1.6	S.I.P Letrero lumínico de emergencia SALIDA 90E 300X185X45 2.6W 120-277V SOBREPONER	UND	20,00	111.758	2.235.160		

3.1.7	S.I.P Luminaria de emergencia 185X50X108 SOBREPONER 2-BL 2W	UND	40,00	117.027	4.681.080		
3.1.8	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP en techo, Tubería D:1/2" SCH40, Caja octogonal y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	66,00	127.969	8.445.954		
3.1.9	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP emergencia, Tubería D:1/2 EMT, Caja RADWELL 5800 y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, incluye fijación, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	45,00	185.338	8.340.210		
3.1.10	S.I.A. Tablero de circuitos para baños, incluye 6 protecciones de 20A	UND	4,00	860.000	3.440.000		
				Sub Total	**40.896.808**		
				TOTAL, INSTALACIONES ELECTRICAS	**40.896.808**		
4	**MUROS**						
4.1	Suministro e instalación de muro doble cara en lámina de fibrocemento 8mm. Estructura base 6. incluye estuco y dos manos de pintura	M2	84,00	178.468	14.991.312	67.00	11.497.535
4.2	Carteras en lámina de fibrocemento 8mm dos caras, en marco ventana y puertas	ML	163,80	71.565	11.722.347	56.00	3.853.136
				Sub Total	**26.713.659**		**15.350.671**
				TOTAL, MAMPOSTERIA	**26.713.659**		**15.350.671**
5	**REPELLOS**						
5.1	Repello de piso y pared con mortero 1:4 espesor 2cm. Incluye aditivo impermeabilizante.	M2	1374,87	46.194	63.510.837	301.00	13.490.519
5.2	Impermeabilización de losa de entrepiso y muros laterales de terraza, con recubrimiento impermeabilizante acrílico de alto desempeño con tecnología DFX y fibras para impermeabilizar cubiertas	M2	660,00	53.308	35.183.280		
				Sub Total	**98.694.117**		**13.490.519**
				TOTAL, REPELLOS	**98.694.117**		**13.490.519**
6	**ENCHAPES**						
6.1	**PISOS**						
6.1.1	Enchape cerámica de piso estructurado 20.6x92.6cm, uso comercial moderado	M2	258,00	137.958	35.593.164		
6.1.2	Enchape cerámica de piso 60x60cm color gris, uso exteriores tráfico comercial	M2	88,00	104.329	9.180.952		
6.1.3	Acabado para uniones entre muro y losa de piso en media caña con mortero 1-4 H: 0,07m	ML	85,00	28.430	2.416.550		
				Sub Total	**7.190.666**		
6.2	**PARED**						

6.2.1	Enchape cerámica de pared color marfil caras diferenciadas 30.1x75.3cm	M2	457,00	118.370	54.095.090		
6.2.2	Guarda canto flecha 8 milímetros cromo aluminio mate	ML	31,00	13.512	418.872		
6.2.3	Suministro e instalación de espejo E= 3mm flotante biselado en sus cuatro lados sobre soporte metálico	M2	20,00	376.443	7.528.860		
6.2.4	Mesón en granito artificial verde uva tuba incluye solapa inferior en aglomerado ancho 50cm con melamina, ancho de mesón 0.60m	ML	17,00	1.193.000	20.281.000		
				Sub Total	**2.323.822**		
				TOTAL, ENCHAPES	**129.514.488**		
7	**ESTUCOS**						
7.1	Estuco acrílico para exteriores, incluye juntas, filos y dilataciones	M2	320,00	22.628	7.240.960	961.00	15.992.001
7.2	Estuco plástico para muros y resanes incluye juntas, filos y dilataciones	M2	973,00	17.313	16.845.549		
				Sub Total	**24.086.509**		**15.992.001**
				TOTAL, ESTUCOS	**24.086.509**		**15.992.001**
8	**PINTURA**						
8.1	Pintura de muros en mampostería 3 manos, vinilo tipo 1, lavable	M2	5137,00	13.301	68.327.237	5029.00	64.290.736
8.2	Pintura para exteriores (3 manos) para paredes.	M2	1280,00	28.775	36.832.000		
8.3	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial ancho 10cm, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, para pavimento rígido	ML	173,52	15.000	2.602.800		
8.4	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial, números con circunferencias de 66 y 40cm para carros y motos. imprimación en negro y pintura tráfico vehicular, incluye micro esferas, para pavimento rígido	UND	42,00	32.000	1.344.000		
8.5	Aplicación de pintura en frio base solvente para flechas de ingreso y salida, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, sobre pavimento rígido	M2	27,00	62.000	1.674.000		
				Sub Total	**110.780.037**		**64.290.736**
				TOTAL, PINTURA	**110.780.037**		**64.290.736**
9	**CARPINTERIAS**						
9.1	Suministro e instalación de puerta de dos hojas batientes elaborada en tubular aluminio estriado ANOLOC, incluye chapa pomo de alcoba metálica pasador y argolla para candado. Medidas de	UND	1,00	2.469.971	2.469.971		

	cada hoja 0.9mx2.10m (ver plano A-022, P-T3)						
9.2	Sellado de juntas entre muros y marcos de ventanería con sellador de juntas de poliuretano.	ML	367,00	11.494	4.218.298		
				Sub Total	**6.688.269**		
				TOTAL, CARPINTERIAS	**6.688.269**		
10	**CUBIERTAS Y CIELO RASO**						
10.2	Limpieza, lavado, cambio de amarras y ganchos, aplicación de sellante en amarras de policarbonato alveolar	M2	33,00	34.060	1.123.980		
10.3	Suministro e instalación de cielo raso desmontable, láminas de fibra mineral 0,60m x 0,60m, incluye estructura	M2	220,00	92.868	20.430.960		
				Sub Total	**21.554.940**		
				TOTAL, CUBIERTAS Y CIELO RASO	**21.554.940**		
11	**APARATOS SANITARIOS Y DOTACION BAÑOS**						
11.1	Kit Taza sanitaria entrada superior con fluxómetro con sensor, blanco institucional (Incluye Taza Sanitaria para Fluxómetro, asiento sanitario, sensor, sistema conexión entrada superior)	UND	4	3.931.160	15.724.640		
11.2	Taza sanitaria alongado, blanco institucional ultra ahorradora (Sanitario con push)	UND	28	1.278.084	35.786.352		
11.3	Barra de seguridad Fija Recta en acero inoxidable (baño para personas con movilidad reducida), incluye anclajes	UND	4	482.550	1.930.200		
11.4	Barra de seguridad abatible (baño para personas con movilidad reducida) incluye anclajes	UND	4	667.550	2.670.200		
11.5	Lavamanos blanco institucional, para personas con movilidad reducida, incluye anclajes	UND	4	575.674	2.302.696		
11.6	Lavamanos blanco institucional, para incrustar en mesones	UND	20	341.287	6.825.740		
11.7	Suministro e instalación de brazo de soporte para lavamanos	JUEGO	4	300.000	1.200.000		
11.8	Suministro e instalación de grifería para lavamanos y desagüe tipo botella sencillo incluye acople	UND	24	64.635	1.551.240		
11.9	Construcción lava traperos 70x50x50cm, enchapado.	UND	4	647.450	2.589.800		
11.10	Kit Orinal arrecife o similar para fluxómetro	UND	8	1.336.000	10.688.000		
11.11	Dispensador De Papel Higiénico Acero Inoxidable Diámetro De 26 Cm	UND	16	163.813	2.621.008		

11.12	Papelera metálica en acero inoxidable según especificaciones	UND	32	551.813	17.658.016		
11.13	Dispensador de jabón para empotrar en pared, en acero inoxidable, 1.2Litros	UND	16	263.643	4.218.288		
11.14	Suministro e instalación de divisiones sanitarias a piso en acero inoxidable AISI SAE 304 para baños de uso institucional. Batería completa con tres (3) cubículos para unidades sanitarias. Incluye tornillería y accesorios.	UND	8,00	8.760.190	70.081.520		
11.15	Dispensador De Toallas De Papel En Z Acero Inoxidable De 27x27x10 Cm	UND	16,00	193.813	3.101.008		
				Sub Total	**178.948.708**		
				TOTAL, APARATOS SANITARIOS	**178.948.708**		
12	**SEÑALIZACIÓN**						
12.1	Suministro e instalación de placa de señalización de 0,65 x 0,50 m con planimetría salidas de emergencia, en acrílico de 2.4 con impresión full color y regletas en MDF para su instalación.	UND	5,00	238.429	1.192.145		
12.2	Suministro e instalación Franjas Guías longitudinales de ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	600,00	11.158	6.694.800		
12.3	Suministro e instalación de Punto alerta ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	2100,00	5.886	12.360.600		
12.4	Suministro e Instalación de Loseta alerta en policarbonato, 20 x 20 cm., Altura total: 5mm, Peso 150 gr, incluye anclaje	UND	15,00	45.015	675.225		
12.5	Suministro e instalación de letreros luminosos informativos en parqueadero doble cara, ubicado en sótano 1.50x0.40m	UND	3,00	600.000	1.800.000		
12.6	Suministro e instalación de letras en acero inoxidable de la frase: PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA y Escudo de la Rama judicial diámetro 50cm, tamaño de letra 30cm cada una, según diseño	UND	1,00	6.000.000	6.000.000		
				Sub Total	**28.722.770**		
				TOTAL, SEÑALIZACIÓN	**28.722.770**		
13	**VARIOS Y ASEO GENERAL**						
13.1	Brigada de aseo	PERSONA/MES	6,00	2.397.504	14.385.024	3	6.913.443
				Sub Total	**14.385.024**		
				TOTAL, VARIOS Y ASEO	**14.385.024**		**6.913.443**
				TOTAL, COSTO DIRECTO:	778.562.565		176.955.092
				ADMINISTRACIÓN (18.73%)	145.824.768		33.143.689
				IMPREVISTOS (3%)	23.356.877		5.308.653

UTILIDAD (5%)	38.928.128		8.847.755
IVA (19%)	7.396.344		1.681.073
TOTAL, PRESUPUESTO:	**994.068.682**		**$225.936.262**

TABLA 9. *Cantidades ejecutadas del contrato de obra.*
Fuente: *Elaboración Propia.*

11. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Previo al inicio de la ejecución de las labores de obra, se realizó el día 14 de noviembre del 2024 la suscripción del acta de inicio de la interventoría y obra en la ciudad de Pasto departamento de Nariño.

Por otra parte 12 de noviembre del 2023 se realizó socialización del proyecto del Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.6947019 del 29 de octubre 2024, contando con la presencia de la el señor Eduardo Manrique Pinzón, representante legal de COINCO S.A.S en calidad de Contratista de obra, el señor Allan Edward Sánchez Quiceno en calidad de Interventor, el señor Luis Humberto Paz Timaná, en calidad de Director Ejecutivo de Administración Judicial Pasto y Diana María Vivanco Burbano profesional de la Dirección Seccional Pasto, en calidad de líder del Proyecto, en las instalaciones del palacio de justicia, con el objetivo de informar a los asistentes sobre el objeto y generalidades del proyecto como la parte contractual.

Las obras se vienen ejecutando se efectúan de acuerdo con las especificaciones técnicas indicadas en el proyecto y a los diseños y planos suministrados por la entidad. A continuación, se resume las actividades que se llevaron a cabo entre el 14 de diciembre al 23 de diciembre del 2024 y desde el 13 de enero al 31 de enero del 2025.

11.1 CAPÍTULO 1 PRELIMINARES

ítem 1.1.1 Localización y replanteo arquitectónico, incluye planos récord: El proyecto deberá localizarse horizontal y verticalmente dejando elementos de referencia permanente con base en los planos del proyecto. El replanteo y nivelación de la obra será ejecutado por el Contratista. Este ítem se refiere al suministro de materiales, equipo y personal por parte del contratista para la localización y materialización de ejes, niveles y alineamientos de acuerdo con los planos e indicaciones de interventoría, incluye la elaboración de planos récord de las nuevas instalaciones hidráulicas, sanitarias, ventilación y eléctricas, así como las nuevas baterías sanitarias.

	
Foto 1: Localización y replanteo	***Foto 2: Localizacion y replanteo***

Imagen 10: *Localización y replanteo.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 1.1.2 Instalación y desinstalación de muro una cara DRYWALL, provisional para cerrar las obras, incluye puerta con marco para ingreso de trabajadores: se realizó la elaboración de un elemento que impida el ingreso de polvo o material particulado a las áreas del palacio de justicia, evitando afectaciones a la salud de los funcionarios y/o visitantes de palacio de justicia. Son cierres provisionales en materiales desmontables.

	
Foto 1: instalacion de muro primer piso.	***Foto 2: instalacion de muro segundo piso.***

Imagen 11: *Localización muro una cara DRYWALL.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 1.1.3 Señalización de obra en lona de 60x40cm impresión full color, incluye marco y anclaje: Se trata de la elaboración señalización, preventiva e informativa según diseño entregado por la entidad, se trata de impresión en lonas de 60x40cm con marco en varengas de madera instalados en puntos visibles del cerramiento.

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Foto 1: Señalización de obra en lona.</td><td>Foto 2: Señalización de obra en lona.</td></tr>
</table>

Imagen 12: *Señalización de obra en lona.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 1.2.1 Desmonte de marcos y puertas, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia:
se realizaron los trabajos necesarios para desmontar y retirar de las zonas sometidas a adecuación, las puertas y ventanas con sus marcos previamente indicados en los planos arquitectónicos, en las especiaciones particulares o definidas por la interventoría.

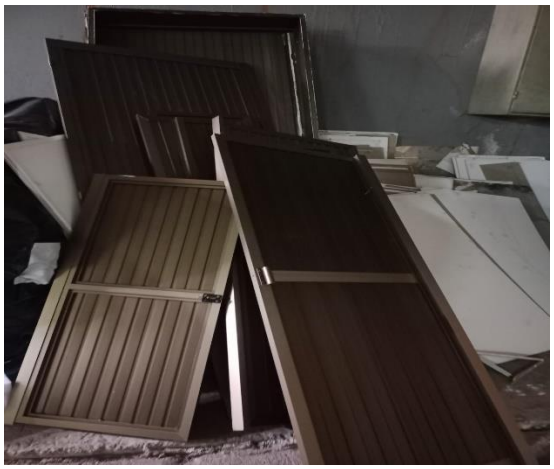
<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto 1: desmonte de marcos y puertas.</td><td>Foto 2: desmonte de marcos y puertas.</td></tr>
</table>

Imagen 13: *Desmonte de marcos y puertas.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 1.2.3 Desmonte de cielo raso en fibra mineral y/o panel yeso y/o fibrocemento, incluye estructura soporte, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta:

se realizó al desmonte de todos los elementos que constituyen el cielo raso como son las láminas, perfiles y demás accesorios que lo constituyen, incluyendo el retiro de los escombros o residuos generados.

	
Foto 1: Desmonte de cielo raso.	***Foto 2: Desmonte de cielo raso.***

Imagen 14: *Desmonte de cielo raso.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 1.2.4 Desmonte de Tasas sanitarias, orinales y lavamanos, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta:

se realizó al retiro de aparatos sanitarios incluyendo accesorios, tanques de agua y tuberías de conexión y desagüe. Debe tenerse en cuenta el conjunto de operaciones para soltar las conexiones de agua. Habiendo cerrado el registro de agua para no contar con paso de esta hacia los aparatos sanitarios se retira el ACOFLEX sanitario o manguera que permite el paso de agua. Sellar la salida hidráulica con tapones PVC con diámetro correspondientes según le requiera. (1/2" normalmente) Desmontar accesorios tanque y tuberías de desagüe. Sellar con un tapón de inspección la salida sanitaria o desagüe.

	
Foto 1: Desmonte de tasas sanitarias, orinales y lavamanos.	***Foto 2: Desmonte tasas sanitarias, orinales y lavamanos.***

Imagen 15: *Desmonte de tasas sanitarias, orinales y lavamanos.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 1.2.5 Desmonte de instalaciones hidrosanitarias, incluye tuberías y accesorios, regatas y sellos provisionales, cargue a volqueta:
se realizó desmonte y desarmado de redes existentes y serán retiradas adecuadamente. Protección de las redes en uso, tales como hidrosanitarias, pluviales de ventilación y aguas lluvias. La protección consiste, en evitar los golpes y daños a las redes en uso, para que las mismas sigan funcionando, posterior a la construcción de la nueva cubierta. Acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Se deben tomar todas las precauciones necesarias, para evitar daños en las instalaciones hidrosanitarias y redes contra incendios funcionales, que no se van a retirar. Los materiales objeto de retiro que se encuentren en buen estado, serán de propiedad de la rama judicial y serán acopiados en el punto que la entidad defina.

	
Foto 1: Desmonte de instalaciones hidrosanitarias.	***Foto 2: Desmonte de instalaciones hidrosanitarias.***

Imagen 16: *Desmonte de instalaciones hidrosanitarias.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 1.2.6 Rasqueteo, cepillo y limpieza manual de superficies, con el fin de retirar impurezas y capas de pintura existentes:

se realizó retiro y remoción de estuco y pintura en mal estado o afectados por la humedad de manera manual.

	
Foto 1: Desmonte de instalaciones hidrosanitarias.	***Foto 2: Desmonte de instalaciones hidrosanitarias.***

Imagen 17: *Desmonte de instalaciones hidrosanitarias.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 1.2.7 Retiro de luminarias ubicadas en cielos rasos y pared, incluye trasiego a punto de acopio:

Se identifica las luminarias a retirar, con interventoría y previa revisión de su correcto funcionamiento. Reconocer el tablero de circuitos. Retirar el aparato eléctrico sea cuadrado, rectangular o redondo. Desconectar el cableado que alimenta la luminaria. Cerrar los cables expuestos con cinta aislante o terminales electros de manera suficiente, que impida el contacto del cobre con cualquier elemento. Acopiar las lámparas en un lugar seguro, que impida el contacto con materiales o personas que puedan generar daños a la lámpara. Una vez se haga el montaje del nuevo cielo raso, establecer la nueva instalación de los paneles según su ubicación. Instalar las luminarias de manera técnica.

	
Foto 1: Desmonte de luminarias.	***Foto 2: Desmonte de luminarias.***

Imagen 18: *Desmonte de luminarias.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 1.2.8 Retiro de redes eléctricas en piso, techo y pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta:

se realiza el desmonte y retiro de todas las luminarias, toma corriente, interruptores, y todos los elementos que conforman las instalaciones eléctricas (ductos y/o tuberías, bandejas y cables conductores), así como el desarme de las conexiones a los tableros eléctricos actuales, es decir toda conexión eléctrica de las baterías sanitarias ubicadas en los pisos 1-4.

	
Foto 1: Retiro de redes electricas.	***Foto 2: Retiro de redes electricas.***

Imagen 19: *Desmonte de redes eléctricas.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 1.3.1 Demolición muro E ≤ 15CM en mampostería maciza o hueca, incluye cortes con pulidora, trasiegos y cargue a volqueta:

se realiza los trabajos de demolición de los muros existentes parcial o total, que la obra demande, incluye cortes con pulidora, transportes internos en el edificio y el cargue a volqueta.

	
Foto 1: Demolicion de muros E ≤ 15CM.	***Foto 2: Demolicion de muros E ≤ 15CM.***

Imagen 20: *Demolición de muros E ≤ 15CM.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 1.3.2 Demolición de enchape de pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta:

se realiza remoción y retiro de enchapes ubicados en pared de baños, sin daño a las estructuras que cubren, cuidando los elementos estructurales, elementos no estructurales, puertas, ventanas y todos los elementos que integran la educación, que puedan ser afectados con el retiro de este material de recubrimiento.

	
Foto 1: Demolicion enchape de pared.	***Foto 2: Demolicion enchape de pared.***

Imagen 21: *Demolición enchape de pared.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 1.3.3 Demolición de enchape de piso, incluye trasiegos y cargue a volqueta:

se realiza remoción y retiro de enchapes ubicados en piso de baños, además del enchape de piso del patio posterior, sin daño a las estructuras que cubren, cuidando los elementos estructurales, elementos no estructurales, puertas, ventanas y todos los elementos que integran la

educación, que puedan ser afectados con el retiro de este material de recubrimiento.

	
Foto 1: Demolicion enchape de pisos.	***Foto 2: Demolicion enchape de pisos.***

Imagen 22: *Demolición enchape de pisos.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 1.3.4 Demolición repello de piso, incluye picado Eprom = 0.03m, incluye trasiego y cargue a volqueta:

se realiza demolición y retiro de morteros, refriéndose a pañetes o repellos, que se encuentran adheridos a los diferentes elementos que integran la edificación y que se han visto afectados por las condiciones climáticas, nivel freáticos y condensación de aire, así como el retiro de materiales cerámicos. En esta actividad el contratista debe garantizar la recolección y el retiro de materiales que resulten de esta actividad.

	
Foto 1: Demolicion repello de pisos.	***Foto 2: Demolicion repello de pisos.***

Imagen 23: *Demolición repello de pisos.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 1.3.5 Demolición repello de pared, incluye picado Eprom = 0.03m, incluye trasiego y cargue a volqueta:

se realiza demolición y retiro de morteros, refriéndose a pañetes o repellos, que se encuentran adheridos a los diferentes elementos que integran la edificación y que se han visto afectados por las condiciones climáticas, nivel

freáticos y condensación de aire, así como el retiro de materiales cerámicos. En esta actividad el contratista debe garantizar la recolección y el retiro de materiales que resulten de esta actividad.



Foto 1: Demolicion repello de pared.



Foto 2: Demolicion repello de pared.

Imagen 24: *Demolición repello de pared.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 1.3.6 Cargue, transporte y retiro del material sobrante proveniente de las obras de mantenimiento, hasta el botadero:

se realiza Cargue, transporte y retiro de los materiales sobrantes de las obras de mantenimiento de la infraestructura física, hacia el botadero oficial. Medido en sitio.



Foto 1: Cargue, transporte y retiro.



Foto 2: Cargue, transporte y retiro.

Imagen 25: *Cargue, transporte y retiro.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 1.3.7 Demolición de mesones en concreto, recubierto con granito incluye salpicadero:

se realiza demolición de los mesones en granito pulido, incluye el granito, la losa en concreto reforzado (Corte de aceros de refuerzo), incluye cortes con pulidora, retiro de anclajes, transportes internos en el edificio y el cargue a volqueta.

	
Foto 1: Demolicion de mesones en concreto.	***Foto 2: Demolicion de mesones en concreto.***

Imagen 26: *Demolición de mesones en concreto.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 2.1.1 Instalaciones PVC 1/2" RDE 13.5:

se realiza suministro e instalación de red hidráulica en ½", siguiendo las indicaciones y especiaciones contenidas en los Planos hidráulicos del Proyecto.

	
Foto 1: Instalaciones PVC 1/2" RDE 13.5.	***Foto 2: Instalaciones PVC 1/2" RDE 13.5.***

Imagen 27: *Instalaciones PVC 1/2" RDE 13.5.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 2.1.2 Instalaciones PVC 3/4" RDE 21:

se realiza suministro e instalación de red hidráulica en 3/4", siguiendo las indicaciones y especiaciones contenidas en los Planos hidráulicos del Proyecto.

	
Foto 1: Instalaciones PVC 3/4" RDE 21.	***Foto 2: Instalaciones PVC 3/4" RDE 21.***

Imagen 28: *Instalaciones PVC 3/4" RDE 21.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 2.1.3 Instalaciones PVC RDE 21 1":

se realiza suministro e instalación de red hidráulica en 1", siguiendo las indicaciones y especiaciones contenidas en los Planos hidráulicos del Proyect.

	
Foto 1: Instalaciones PVC RDE 21 1".	***Foto 2: Instalaciones PVC RDE 21 1".***

Imagen 29: *Instalaciones PVC RDE 21 1".*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 2.1.5 Punto hidráulico PVC 1/2":

Suministro e instalación de puntos hidráulicos en ½", siguiendo las indicaciones y especiaciones contenidas en los Planos hidráulicos del Proyecto, incluye tubería y accesorios específicos para cada punto que se requiere.

	
Foto 1: Punto hidráulico PVC 1/2".	***Foto 2: Punto hidráulico PVC 1/2".***

Imagen 30: *Punto hidráulico PVC 1/2".*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 2.2.1 Instalaciones sanitarias PVC 2":

Se realiza suministro e instalación de la red de desagües de aguas sanitarias y aguas lluvias en los diámetros específicos para cada ítem, siguiendo las indicaciones y especiaciones contenidas en los Planos Hidrosanitarios del Proyecto.

	
Foto 1: Instalaciones sanitarias PVC 2".	***Foto 2: Instalaciones sanitarias PVC 2".***

Imagen 31: *Instalaciones sanitarias PVC 2".*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 2.2.2 Instalaciones sanitarias PVC 4":

Se realiza suministro e instalación de la red de desagües de aguas sanitarias y aguas lluvias en los diámetros específicos para cada ítem, siguiendo las indicaciones y especiaciones contenidas en los Planos Hidrosanitarios del Proyecto.

	
Foto 1: Instalaciones sanitarias PVC 4".	***Foto 2: Instalaciones sanitarias PVC 4".***

Imagen 32: *Instalaciones sanitarias PVC 4".*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 2.2.5 Punto sanitario 4" WC:

Se realiza suministro e instalación de la red de desagües de aguas sanitarias y aguas lluvias en los diámetros específicos para cada ítem, siguiendo las indicaciones y especiaciones contenidas en los Planos Hidrosanitarios del Proyecto.

	
Foto 1: Punto sanitario 4" WC.	***Foto 2: Punto sanitario 4" WC.***

Imagen 33: *Punto sanitario 4" WC.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 2.2.6 Punto sanitario 2":

Se realiza suministro e instalación de la red de desagües de aguas sanitarias y aguas lluvias en los diámetros específicos para cada ítem, siguiendo las indicaciones y especiaciones contenidas en los Planos Hidrosanitarios del Proyecto.

	
Foto 1: Punto sanitario 2".	***Foto 2: Punto sanitario 2".***

Imagen 34: *Punto sanitario 2".*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 5.1 Repello de piso y pared con mortero 1:4 espesor 2cm. Incluye aditivo impermeabilizante:

Se realizo la aplicación del acabado liso sobre las superficie con una o varias capas de mezcla de arena lavada fina y cemento, llamada mortero en proporción 1:4 incluye aditivo impermeabilizante y cuyo fin es emparejar la superficie de tal manera que las pendientes y niveles permitan drenar las aguas lluvias que recoge esta placa; y la aplicación del aditivo impermeabilizante le brinda mayor resistencia y estabilidad al área de piso a intervenir, así como a los muros que se van a enchapar. Este proceso también es llamado revoque o repello impermeabilizado, el cual incluye materiales, equipo y retiro de residuos generados, de acuerdo las áreas definidas por la entidad. En este ítem se incluye el retiro de capas de repello existente que impidan que el área a repellar no este nivelada o con protuberancias que afecten la nivelación del piso, así como la adecuación de la superficie, con tal rugosidad que permita la adherencia con la losa existente. El mortero debe quedar con un acabado rustico, antideslizante, pero a la vista homogéneo.

Foto 1: Relleno con mortero 1:4.	Foto 2: Relleno con mortero 1:4.

Imagen 35: *Relleno con mortero 1:4.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 7.2 Estuco plástico para muros y resanes incluye juntas, filos y dilataciones:

Esta actividad se refiere al suministro, transporte y aplicación de estuco sobre muros internos y empañetados, una vez seco el pañete se aplica estuco o en este caso en muros que ya cuentan con este tipo de recubrimiento y que requieren un retoque por el paso del tiempo o por situaciones ocasionadas por la humedad, este estuco se aplica para sellar todas las juntas o grietas e imperfecciones, incluye filos; finalmente se pule la superficie con una lija dejando la superficie lista para las capas de pintura.

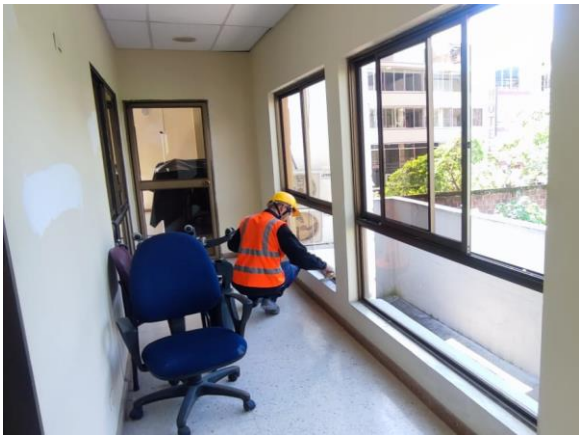
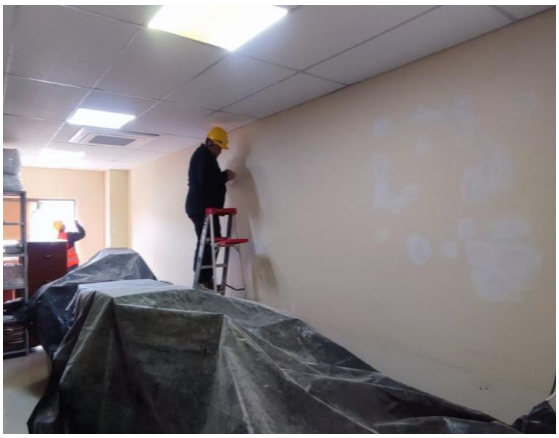
	
Foto 1: Estuco platico para muros y resanes.	**Foto 2: Estuco plastico para muros y resanes.**

Imagen 36: *Estuco plástico para muros y resanes.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 8.1 Pintura de muros en mampostería 3 manos, vinilo tipo 1, lavable:

Esta actividad se refiere a la aplicación de pintura en muros interiores directamente sobre revoque para las áreas especificadas en el proyecto, se aplicarán pinturas con base en agua tipo emulsión con resina de polinivil-acetato modificada con acrílica, que cumpla con los requisitos exigidos por la Norma NTC1335, para el Tipo 1, entre otros: viscosidad a 25 grados centígrados de 77 a 95 U.Krebs; finura de dispersión 4 U.Hegman mínimo; resistencia a la abrasión húmeda 700 ciclos mínimo

	
Foto 1: Pintura vinilo tipo 1.	***Foto 2: pintura vinilo tipo 1.***

Imagen 37: *Pintura vinilo tipo 1.*
Fuente: *Elaboración propia.*

12. PMA: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Para la Interventoría es primordial realizar el seguimiento y control al cumplimiento de la normatividad ambiental y a los programas contractualmente estipulados en el proyecto para este caso en específico el PMA plan de manejo ambiental donde es prioridad minimizar el impacto ambiental que la ejecución del proyecto pueda ocasionar sobre la comunidad particular y el medio ambiente.

En este orden de ideas, el contratista, entiende que la ejecución de cualquier proyecto, de obra o actividad - POA interactúa con el ambiente a través de las actividades a ejecutarse lo cual, se define como elemento, de las actividades, productos o servicios de la organización que pueden interactuar con el medio ambiente; ejemplo de estos incluyen: emisión, consumo o reutilización de materiales pétreos o la generación de ruido. Por este motivo realiza el análisis de impactos, inicialmente identifican las actividades que interactúan con el medio ambiente y que pueden generar un efecto ya sea, positivo o negativo; posteriormente se caracteriza el ambiente receptor del impacto en componentes y elementos; y finalmente se identifican y evalúan los impactos potenciales asociados a la realización de las diferentes actividades del proyecto. Para la evaluación de impactos tomó como base la metodología propuesta por CONESA (1997), con algunas adaptaciones a la condición del entorno y a las condiciones particulares del proyecto.

13. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante este período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

13.1 Actas de inicio

El día 14 de noviembre del 2024, se reunieron en San Juan de Pasto, el representante legal de Constructora De Infraestructura Colombiana COINCO S.A.S Contratista de obra, el Interventor de obra, director ejecutivo de Administración Judicial Pasto y la supervisora con el fin de suscribir acta de inicio para la ejecución del contrato de obra. (Ver ***Anexo*** acta de inicio de obra).

El día 14 de noviembre del 2024, se reunieron en San Juan de Pasto, el Interventor de obra, director ejecutivo de Administración Judicial Pasto y la supervisora del contrato, con el fin de dejar constancia del inicio de las labores del contrato de interventoría. (Ver ***Anexo*** acta de inicio de interventoría).

13.2 Socialización del proyecto:

El día 12 de noviembre del 2024, se desarrolló socialización del Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.6947019 del 12 de noviembre 2024 en las instalaciones del palacio de justicia de Mocoa dirigida por el Contratista de obra y el contratista de Interventoría, se procedió a proporcionar la información del proyecto, su alcance, recibir inquietudes y concluir con acuerdos para el libre y normal desarrollo de la obra. (Ver **Anexo** acta de socialización).

Registro fotográfico – Socialización del proyecto.



Foto 1: *socialización del proyecto*

Imagen 38: *Registro fotográfico – socialización del proyecto*
Fuente: *Elaboración Propia.*

13.3 Comités de obra:

El día 22 de noviembre del 2024, de manera virtual se desarrolló comité técnico N°1 entre contratista de obra, el contratista de interventoría, Supervisora; donde los temas a tratar posible incumplimiento a las obligaciones contractuales (Ver **Anexo** acta de comité técnico).

14. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

14.1 Clausula 8 Forma de pago contrato de obra

Pagos parciales: El 90% del valor del contrato se pagará mediante pagos parciales por cantidades de obras ejecutadas por el contratista, previa presentación de: a) Informe de ejecución, con sus respectivos anexos, b) Factura de venta electrónica o su equivalente, c) certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato y d) Planilla de pago a aportes de seguridad social en salud (Salud, Pensión, Riesgos Laborales) aportes parafiscales en el caso que tenga personal a cargo. No obstante, lo anterior, si a criterio de la supervisión se requiere de otro requisito, el mismo deberá ser cumplido por el contratista.

Pago final: Equivalente hasta el 10% del total de contrato, al finalizar la ejecución del contrato, previa presentación de: a) Informe de ejecución, con sus respectivos anexos, b) Factura de venta electrónica o su equivalente, c) Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato y d) Planilla de pago a aportes de seguridad social en salud (Salud,

pensión, riesgos laborales) aportes parafiscales en el caso que tenga personal a cargo y e) Suscripción del acta de liquidación. No obstante, lo anterior, si a criterio de la supervisión se requiere otro requisito, el mismo deberá ser cumplido por el contratista.

14.2 Clausula 8 Forma de pago contrato de interventoría

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, realizará el pago de forma mensual durante el periodo contratado, una vez se verifique el cumplimiento cabal de las obligaciones a cargo del contratista, previa presentación de los siguientes documentos: a) La factura o cuenta de cobro según corresponda. b) Certificación emitida por el supervisor del contrato de haberse cumplido con el objeto contractual. c) Certificación expedida por el Revisor Fiscal, por el Representante Legal o contratista persona natural según corresponda, de conformidad con el Art. 50 de la ley 789 de 2002, que acredite estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones) y Parafiscales (ICBF, Cajas de Compensación Familiar y Sena, cuando a ello hubiere lugar), allegando la planilla de pago por estos conceptos. PARÁGRAFO 1: El pago se realizará dentro de los 45 días siguientes a la radicación de la factura y/o cuenta de cobro, conforme los recursos que la Dirección General del Tesoro-Ministerio de Hacienda y Crédito Público sitúe a la Entidad. En caso de no cumplir con los requisitos de pago, se aplicará lo establecido en el artículo 11 de la ley 2024 de 2020. PARÁGRAFO 2: En caso de estar obligado a facturar electrónicamente, el contratista deberá presentar factura conforme a la financiación de cada rubro y PCI que corresponda, acatando las directrices de la DIAN y SIIF Nación. PARÁGRAFO 3: La Entidad descontará de cada pago el valor correspondiente a los impuestos, tasas, contribuciones o retenciones que apliquen, según los parámetros legalmente establecidos y conforme a los lineamientos del SIIF Nación.

15. PERSONAL Y EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

La Interventoría mediante el control diario de Obra relaciona la cantidad de equipos utilizados por el Contratista durante el presente periodo y el personal en cada uno de los frentes de obra, dicha información se anexa.

El contratista de obra ha cumplido con los requisitos de ley en lo referente a la Afiliación a EPS, ARL Y PENSIONES del personal de obra. El contratista en obra cuenta con personal discriminado así: Un (01) Ing. director de obra, Un (01) Ing. Residente de obra, Un (1) profesional en salud y seguridad industrial, Un (01) Maestros, dos (02) oficial, dos (2) eléctricos, seis (6) ayudantes de obra, Equipo de obra, Una (01) Pulidora, Un (01) Taladro, volqueta y herramienta menor.

16. CONTROL DE CALIDAD

Durante el desarrollo de todas las actividades se ha comprobado el respectivo proceso de calidad de acuerdo con el tipo de proyecto a realizar riéndose a la norma técnica colombianas ICONTEC NTC 382, NTC 1339, NTC539, normas american SOCIETY FOR TESTING materiales ASTM, ensayos para concretos NSR 2010 y Resolución número 5194 del 2010.

Durante el presente periodo el contratista de interventoría verifico que se realicen los ensayos correspondientes y entrega de certificados de calidad de los materiales utilizados para la construcción con el fin de validar el cumplimiento del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas y de esta forma comprobar, aceptar o rechazarlos una vez obtenidos los resultados del laboratorio.

Adicionalmente se solicitó los respectivos certificados de calidad y especificaciones técnicas de los materiales a utilizar dando cumplimiento a las especificaciones técnicas (Ver **Anexos** control de calidad).

16.1 Metodología de medición y cuantificación de obra ejecutada

El proceso de medición y cuantificación de la obra ejecutada se realizó a través de la toma continua de medidas convencionales por medio de cinta métrica, cubicación convencional y cuantificación numérica, que luego fueron comparadas con las carteras topográficas de campo.

17. CONTROL DE PÓLIZAS Y RESERVAS PRESUPUÉSTALES

17.1 Pólizas contratista de obra

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

ANEXO 0: Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal.

COMPAÑÍA ASEGURADORA	PÓLIZA No.	AMPARO Y PORCENTAJE	FECHA DE INICIO DEL AMPARO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101454743	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/10/2024	29/06/2025	191.100.398,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101454743	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	29/12/2024	29/12/2029	191.100.398,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101454743	ESTABLILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	29/10/2024	29/12/2027	191.100.398,00

TABLA 10. *Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal Anexo 0*
Fuente: *Elaboración propia.*

La póliza de seguro de garantía única de cumplimiento en favor de las entidades estatales, está debidamente aprobada. Cabe añadir que la póliza se encuentra vigente; **se anexa póliza.**

Aclaración por parte de la seguradora desde la fecha de finalización del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo.

ANEXO 0: Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual

COMPAÑÍA ASEGURADORA	PÓLIZA No.	AMPARO Y PORCENTAJE	FECHA DE INICIO DEL AMPARO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-40-101242689	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	29/10/2024	29/12/2024	260.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-40-101242689	CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	29/10/2024	29/12/2024	260.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-40-101242689	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29/10/2024	29/12/2024	260.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-40-101242689	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL.	29/10/2024	29/12/2024	260.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-40-101242689	GASTOS MEDICOS	29/10/2024	29/12/2024	260.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-40-101242689	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.	29/10/2024	29/12/2024	260.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-40-101242689	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.	29/10/2024	29/12/2024	260.000.000,00

TABLA 11. *Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual Anexo 0*
Fuente: *Elaboración propia.*

17.2 Pólizas contratista de interventoría.

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

ANEXO 0: Póliza de seguro de cumplimiento entidades estatales.

COMPAÑÍA ASEGURADORA	PÓLIZA No.	AMPARO Y PORCENTAJE	FECHA DE INICIO DEL AMPARO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101239016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/11/2024	01/07/2025	6.667.332,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15-44-101285819	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	01/11/2024	31/12/2027	6.667.332,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15-44-101285819	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2024	31/12/2029	6.667.332,00

TABLA 12. *Póliza de seguro de cumplimiento entidades estatales. Anexo 0*
Fuente: *Elaboración propia.*

Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO
NIT 860.009.578-6
Oficina Bogotá
Cod. Suc 11
Fecha de Emisión 01 noviembre del 2024.

La póliza de seguro de garantía única de cumplimiento en favor de las entidades estatales, está debidamente aprobada. Cabe añadir que la póliza se encuentra vigente; **se anexa póliza.**

ANEXO 1: Póliza de seguro de cumplimiento entidades estatales.

COMPAÑÍA ASEGURADORA	PÓLIZA No.	AMPARO Y PORCENTAJE	FECHA DE INICIO DEL AMPARO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101239016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/11/2024	01/07/2025	6.667.332,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15-44-101285819	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	01/11/2024	31/12/2027	6.667.332,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15-44-101285819	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2024	31/12/2029	6.667.332,00

TABLA 13. *Póliza de seguro de cumplimiento entidades estatales. Anexo 0*
Fuente: *Elaboración propia.*

Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO
NIT 860.009.578-6
Oficina Bogotá
Cod. Suc 11

Fecha de Emisión 01 noviembre del 2024.

La póliza de seguro de garantía única de cumplimiento en favor de las entidades estatales, está debidamente aprobada. Cabe añadir que la póliza se encuentra vigente; **se anexa póliza.**

ANEXO 2: Póliza de seguro de cumplimiento entidades estatales.

COMPAÑÍA ASEGURADORA	PÓLIZA No.	AMPARO Y PORCENTAJE	FECHA DE INICIO DEL AMPARO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101239016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/11/2024	03/08/2025	6.667.332,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101239016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	01/11/2024	03/02/2028	6.667.332,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101239016	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2024	31/12/2029	6.667.332,00

TABLA 14. *Póliza de seguro de cumplimiento entidades estatales. Anexo 2*
Fuente: *Elaboración propia.*

Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO
NIT 860.009.578-6
Oficina Bogotá
Cod. Suc 11
Fecha de Emisión 29 ENERO del 2025.

La póliza de seguro de garantía única de cumplimiento en favor de las entidades estatales, está debidamente aprobada. Cabe añadir que la póliza se encuentra vigente; **se anexa póliza.**

18. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cumpliendo con los requerimientos dados por la Interventoría, el personal empleado por el contratista debe cumplir con los requisitos de la ley 100, (Afiliación a ARP, EPS, Pensión, Caja de compensación, Sena e ICBF),para este periodo el contratista de obra realizó la entrega de afiliaciones y los soportes de los pagos de seguridad social y parafiscal, correspondiente a los meses laborados, por otra parte, el contratista de obra entrego al personal la dotación y los elementos de seguridad necesarios para la ejecución de este tipo de trabajos. Al respecto, **Ver Anexo** de los pagos de seguridad social y parafiscales.

19. ACTIVIDADES RELEVANTES

Durante el presente mes se ha trabajado en las siguientes actividades.

- Verificación de equipos y personal aprobados por la interventoría
- Elaboración de informe mensual.
- Elaboración de formatos, tiempo, personal y equipo.
- Revisión de cantidades ejecutadas durante el mes.
- Seguimiento fotográfico de las obras
- Revisión de la bitácora
- Seguimiento y control de afiliaciones al personal.
- Todo lo anterior en concordancia con las especificaciones técnicas, documentos contractuales y normativa legal.

20. ESTADO DEL TIEMPO

Para el periodo del 14 de diciembre y el 23 de diciembre del 2024 y desde el 13 de enero hasta el 31 de enero 2025, el estado del tiempo se comporta con estado variable como se presenta ver anexo estado del clima.

21. INCONVENIENTES ENCONTRADOS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA

Durante el mes se presentaron algunos inconvenientes que afectaron al desarrollo normal de las actividades, El plazo de 48 días calendario es insuficiente para la adecuada ejecución de las obras, dadas las particularidades técnicas y logísticas del proyecto. Las especificaciones técnicas del enchape cerámico para pisos y paredes requieren materiales que no se encuentran en stock en los proveedores locales. Esto ha obligado a realizar pedidos especiales con tiempos de entrega estimados a partir de los primeros días de febrero de 2025. Durante el periodo de diciembre de 2024 y enero de 2025, se registraron lluvias constantes y prolongadas que afectaron las actividades en fachadas y exteriores. Estos eventos fueron debidamente documentados en el libro de bitácora. Restricciones operativas en el Palacio de Justicia. La ejecución de actividades internas debe coordinarse con el personal de las instalaciones para habilitar espacios, lo que ha limitado el avance del proyecto. Igualmente, Las reuniones y audiencias programadas en el Palacio han requerido la

suspensión completa de actividades, conforme a solicitudes expresas de la coordinación del edificio. Este tipo de interrupciones continuarán ocurriendo, afectando el desarrollo normal del proyecto.

22. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Con corte al primer mes de labores, se registra un porcentaje programado acumulado del 22,34% que representa una inversión del orden de $ 213.473.942, además el porcentaje ejecutado acumulado es del 25,07% que representa una ejecución del orden de $ 239.479.805,00; situación que expone y evidencia un avance porcentual con un déficit de 2,72% que representa una ejecución del orden de -$ 26.005.641. Por lo que se sugiere al contratista de obra contemplar las medidas necesarias para cumplir con la programación inicialmente propuesta.

- El contratista de obra, a la fecha no presenta los informes mensuales en el plazo estipulado para tal fin, correspondiente a los cinco (05) primeros días de cada mes, situación que viene presentando inconvenientes a la interventoría en el normal desarrollo de sus labores de seguimiento y control, por lo que se coloca en conocimiento de la supervisión y del contratista de obra, en aras de que se corrija oportunamente, so pena de incurrir en incumplimiento por la no entrega de informes en los tiempos programados y con la calidad requerida.

- Durante el periodo comprendido entre en día 14 de diciembre y 23 de diciembre del 2024 y desde el 13 de enero al 31 de diciembre del 2025, no se realizó intervenciones que generen impactos o afectaciones ambientales, de igual forma se efectúa un manejo adecuado de los residuos propios generados por las actividades realizadas dentro del proyecto. Se recalcó al contratista de manera verbal, se mantenga un constante aseo y acopio de material sobrante que no genere daño al medio ambiente, el mínimo impacto urbano y mayores condiciones de seguridad industrial. Fue función primordial de la interventoría asegurar que se minimice el impacto ambiental que el proyecto pueda ocasionar sobre las instalaciones y en el entorno donde se desarrollarán las actividades constructivas, es decir, sobre el medioambiente.

- La interventoría en cumplimiento de sus obligaciones de vigilancia, control y seguimiento durante la ejecución del contrato de obra recomendó al contratista realizar la señalización correspondiente a las áreas de trabajo.

- Respecto del seguimiento al Plan de Salud y seguridad en el Trabajo, se informa que los mismos se vienen desarrollando por parte del personal SST de la firma contratista y se cumplen a cabalidad, se anexan al presente informe de interventoría No. 02 el informe mensual SST con sus soportes.

- La interventoría recomendó y vigiló que el contratista de obra cumpla con las especificaciones del contrato como el suministro de los elementos de protección personal, seguridad industrial, dotación de implementos de seguridad, señalización y aseo de los sitios de obra, velando de esta manera porque se cumplan todas las normativas vigentes sobre seguridad industrial, y exigiendo al contratista el cumplimiento de las mismas con el personal a su cargo durante el desarrollo de la obra.

- Se realiza diligenciamiento del libro de Bitácora en conjunto con el contratista.
- Se llevó un registro fotográfico, con el fin de evidenciar visualmente la evolución del proyecto.
- A la fecha el contrato de obra e interventoría se encuentran vigentes y en ejecución.

ING. ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
Contratista de Interventoría

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

23. ANEXOS

- Anexo 1 Pólizas contratista de obra.
- Anexo 2 Informes semanales.
- Anexo 3 Copia de actas de comité técnico.
- Anexo 4 Control diario de equipo contratista de obra.
- Anexo 5 Control diario del personal contratista de obra
- Anexo 6 Estado general del tiempo
- Anexo 7 Aportes de seguridad social y parafiscales contratistas de obra.
- Anexo 8 Pólizas contratista de interventoría.
- Anexo 9 Control diario del equipo de interventoría.
- Anexo 10 Control diario del personal de interventoría.
- Anexo 11 Aportes de seguridad social y parafiscales contratistas de interventoría.
- Anexo 12 Bitácora de obra.
- Anexo 13 Informe seguridad y salud en el trabajo.
- Anexo 14 Informe ambiental.

ANEXO 1 PÓLIZAS CONTRATISTA DE OBRA.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101242689	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	02	2025	29	10	2024	00:00	21	03	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S	NIT: 900.628.905-1

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	CL 93 NRO. 11 A - 28 OFICINA 302		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6015362099

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	NACION- CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DISTRITO PASTO	NIT: 800.165.872-6

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO	
	CALLE 19 NRO 23-00		PASTO, NARIÑO		7292851

BENEFICIARIO: 800165872 - NACION- CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DISTRITO PAS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO CO1.PCCNTR.6947019 CUYO OBJETO ES : REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	29/10/2024	21/03/2025	$260,000,000.00	$260,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	29/10/2024	21/03/2025	$260,000,000.00	$260,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	29/10/2024	21/03/2025	$260,000,000.00	$260,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON DOCUMENTO PRORROGA DEL 21 DE ENERO DE 2025, SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN DOS (2) MESES, HASTA EL VEINTIUNO (21) DE MARZO DE 2.025. TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIOINES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****123,945.00	$ *******3,000.00	$ ******24,119.00	$ **********151,064.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
HR ASESORES INTEGRALES LTDA	194664	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101242689

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101242689	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	02	2025	29	10	2024	00:00	21	03	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S		**NIT: 900.628.905-1**
DIRECCIÓN: CL 93 NRO. 11 A - 28 OFICINA 302	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6015362099

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DISTRITO PASTO		**NIT: 800.165.872-6**
DIRECCIÓN: CALLE 19 NRO 23-00	**CIUDAD:** PASTO, NARIÑO	**TELÉFONO:**	7292851

BENEFICIARIO: 800165872 - NACION- CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DISTRITO PAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	29/10/2024	21/03/2025	$260,000,000.00	$260,000,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	29/10/2024	21/03/2025	$260,000,000.00	$260,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	29/10/2024	21/03/2025	$260,000,000.00	$260,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	29/10/2024	21/03/2025	$260,000,000.00	$260,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101242689

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101242689	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	02	2025	29	10	2024	00:00	21	03	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S		**NIT: 900.628.905-1**
DIRECCIÓN: CL 93 NRO. 11 A - 28 OFICINA 302	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6015362099

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DISTRITO PASTO		**NIT: 800.165.872-6**
DIRECCIÓN: CALLE 19 NRO 23-00	**CIUDAD:** PASTO, NARIÑO	**TELÉFONO:**	7292851

BENEFICIARIO: 800165872 - NACION- CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DISTRITO PAS

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101242689

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101454743	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	02	2025	29	10	2024	00:00	21	03	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S	NIT: 900.628.905-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 93 NRO. 11 A - 28 OFICINA 302	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6015362099

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
NACION- CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DISTRITO PASTO	NIT: 800.165.872-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 19 NRO 23-00	PASTO, NARIÑO	7292851

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO CO1.PCCNTR.6947019 CUYO OBJETO ES : REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/10/2024	21/09/2025	$191,100,398.00	$191,100,398.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	29/12/2024	29/12/2029	$191,100,398.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/10/2024	21/03/2028	$191,100,398.00	$191,100,398.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON DOCUMENTO PRORROGA DEL 21 DE ENERO DE 2025, SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN DOS (2) MESES, HASTA EL VEINTIUNO (21) DE MARZO DE 2.025. TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIOINES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****113,089.00	$ *******8,000.00	$ ******23,007.00	$ **********144,096.00	$ ******573,301,194.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
HR ASESORES INTEGRALES LTDA	194664	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

21-44-101454743

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101454743	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	02	2025	29	10	2024	00:00	21	03	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S		**NIT: 900.628.905-1**
DIRECCIÓN: CL 93 NRO. 11 A - 28 OFICINA 302	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6015362099

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DISTRITO PASTO		**NIT: 800.165.872-6**
DIRECCIÓN: CALLE 19 NRO 23-00	**CIUDAD:** PASTO, NARIÑO	**TELÉFONO:**	7292851

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101454743

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101454743, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 05 días del mes de FEBRERO de 2025

21-44-101454743

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

ANEXO 2 INFORMES SEMANALES.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

INFORME SEMANAL DE OBRA N° 1

PÁGINA	1	DE	1

SECRETARIA EJECUTORA: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO

FECHA: 17 / 11 / 2024

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.6947019

Semana Número: 1 Del: 14/11/2024 Al: 17/11/2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 4 Días Corresponde al : 6,67% del Plazo total del Contrato

Supervisor Técnico de Contrato

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO"

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,25%	0,25%
Valor básico de la Obra programada:	$ 2.384.722	$ 2.384.722

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	0,00%
Valor básico de Obra Ejecutada:	$ 0,00	$ 0,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.
Contrato No.	CO1.PCCNTR.6947019
Valor Inicial:	$ 955.501.990,00
Plazo Inicial:	2 MESES
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	14 de noviembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
Contrato No.	O1.PCCNTR.6973355 DEL 01/11/2024
Valor Actualizado:	$ 33.336.660,00
Plazo Inicial:	45 cuarenta y cinco dias calendario
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	14 de noviembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza reconocimiento y verificación de medidas en campo.
Se realiza verificación de planos disponibles del palacio de justicia.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realiza reconocimiento y verificación de medidas en campo.
Cotizaciones de insumos para la construcción

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO


Acta de inicio el 14 de noviembre de 2024.
Fecha de terminación inicial 31 de diciembre de 2024

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO	Firma: Nombre: MARLON FERNANDO ARTEAGA P. Matrícula 52202-323602 NRÑ	Firma: Nombre: Matrícula



Fotografía: 1

Se realiza reconocimiento y verificación de medidas en campo.

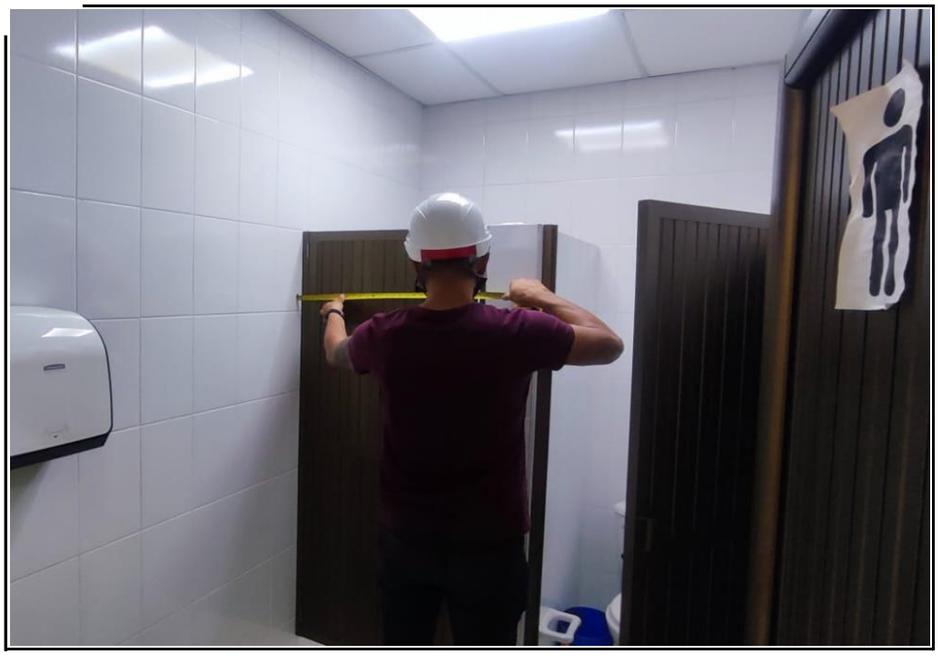

Fotografía: 2

Se realiza reconocimiento y verificación de medidas en campo.

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No.	CO1.PCCNTR.6947019
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.
INTERVENTOR:	ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO

OBJETO "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO"

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	% EJECUTADO
1	**PRELIMINARES**							
1.1	**INICIALES**							
1.1.1	Localización y replanteo arquitectónico, incluye planos récord	M2	332,00	3.864	1.282.848		-	
1.1.2	Instalación y desinstalación de muro una cara drywall, provisional para cerrar las obras, incluye puerta con marco para ingreso de trabajadores	M2	53,00	77.249	4.094.197		-	
1.1.3	Señalización de obra en lona de 60x40cm impresión full color, incluye marco y anclaje	UND	9,00	60.693	546.237		-	
				Sub Total	**5.923.282**		**-**	**0%**
1.2	**DESMONTES Y RETIROS**							
1.2.1	Desmonte de marcos y puertas, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	57,00	26.406	1.505.142		-	
1.2.2	Desmonte de marco, ventana y vidrio, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	1,00	27.367	27.367		-	
1.2.3	Desmonte de cielo raso en fibra mineral y/o panel yeso y/o fibrocemento, incluye estructura soporte, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	M2	250,00	29.781	7.445.250		-	
1.2.4	Desmonte de Tasas sanitarias, orinales y lavamanos, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	UND	48,00	53.587	2.572.176		-	
1.2.5	Desmonte de instalaciones hidrosanitarias, incluye tuberías y accesorios, regatas y sellos provisionales, cargue a volqueta	UND	72,00	57.730	4.156.560		-	
1.2.6	Rasqueteo, cepillo y limpieza manual de superficies, con el fin de retirar impurezas y capas de pintura existentes.	M2	1017,00	4.863	4.945.671		-	
1.2.7	Retiro de luminarias ubicadas en cielos rasos y pared, incluye trasiego a punto de acopio	UND	46,00	21.660	996.360		-	
1.2.8	Retiro de redes eléctricas en piso, techo y pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	GL	1,00	2.233.550	2.233.550		-	
				Sub Total	**23.882.076**		**-**	**0%**
1.3	**DEMOLICIONES**							
1.3.1	Demolición muro E ≤ 15CM en mampostería maciza o hueca, incluye cortes con pulidora, trasiegos y cargue a volqueta.	M2	220,00	17.941	3.947.020		-	
1.3.2	Demolición de enchape de pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	704,40	14.760	10.396.413		-	
1.3.3	Demolición de enchapes de piso, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	283,00	13.980	3.956.340		-	
1.3.4	Demolición repello de piso, incluye picado Eprom = 0.03m, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	835,00	12.959	10.820.765		-	
1.3.5	Demolición repello de pared, muros mampostería eprom= 0.02m, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	291,80	15.119	4.411.785		-	
1.3.6	Cargue, transporte y retiro del material sobrante proveniente de las obras de mantenimiento, hasta el botadero.	M3	234,00	40.171	9.400.014		-	
1.3.7	Demolición de mesones en concreto, recubierto con granito incluye salpicadero	M2	11,00	37.722	414.942		-	
				Sub Total	**43.347.279**		**-**	**0%**
		TOTAL PRELIMINARES			**73.152.637**		**-**	**0%**
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**							
2.1	**RED SUMINISTRO AGUA POTABLE**							
2.1.1	Instalaciones PVC 1/2" RDE 13.5	ML	95,00	7.575	719.625		-	
2.1.2	Instalaciones PVC 3/4" RDE 21	ML	28,00	10.939	306.292		-	
2.1.3	Instalaciones PVC RDE 21 1"	ML	50,21	12.038	604.428		-	
2.1.4	Instalaciones PVC RDE 21 2"	ML	6,00	26.949	161.694		-	
2.1.5	Punto hidráulico PVC 1/2"	UND	60,00	24.174	1.450.440		-	
2.1.6	Punto hidráulico PVC 3/4"	UND	8,00	26.324	210.592		-	
2.1.7	Punto hidráulico PVC 1/2" incluye válvula control paso 1/2" y tapa PVC Blanca 15x15cm	UND	18,00	59.937	1.078.866		-	
				Sub Total	**4.531.937**		**-**	**0%**
2.2	**RED SANITARIA, PLUVIAL, VENTILACION**							
2.2.1	Instalaciones sanitarias PVC 2"	ML	58,00	25.087	1.455.046		-	
2.2.2	Instalaciones sanitarias PVC 4"	ML	119,00	42.006	4.998.714		-	
2.2.3	Instalaciones ventilación PVC 2"	ML	183,00	20.194	3.695.502		-	
2.2.4	Instalaciones ventilación PVC 3"	ML	35,00	31.646	1.107.610		-	
2.2.5	Punto sanitario 4" WC	UND	32,00	45.965	1.470.880		-	
2.2.6	Punto sanitario 2"	UND	44,00	33.894	1.491.336		-	
2.2.7	Suministro e instalación de rejilla de piso en acero inoxidable cuadrada de 10cm salida a tubería 2"	UND	24,00	48.380	1.161.120		-	
2.2.8	Suministro e instalación de tubería de conexión de desagües de aires acondicionados	ML	36,00	20.194	726.984		-	
				Sub Total	**16.107.192**		**-**	**0%**
		TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**20.639.129**		**-**	**0%**
3	**RED ELECTRICA**							
3.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**							
3.1.1	S.I.P. Salida toma doble GFCI 1F/20AMP en tubería PVC SCH40 1/2", caja galvanizada y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	16,00	171.144	2.738.304		-	
3.1.2	S.I.P. Salida sensor de movimiento tipo interruptor 360° 1F/15AMP En muro, Tubería PVC SCH40 D:1/2", Cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	32,00	138.700	4.438.400		-	

3.1.3	S.I.P Luminaria de sobreponer 400x120 para uso interior, fabricada en lámina de acero COLD ROLLED, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate y difusor lamina acrílico opalizado L11. Producto para instalación de sobreponer, en temperatura de color 5000K flujo lumínico de 4400Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 28.56W	UND	4,00	424.118	1.696.472		-	
3.1.4	S.I.P. Luminaria tipo bala 72x83 para incrustar, Producto tipo DOWNLIGHT de uso interior fabricado en aluminio inyectado, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate en temperatura de color 6500K flujo lumínico de 550Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 6.00W	UND	40,00	65.207	2.608.280		-	
3.1.5	S.I.P Luminaria tipo bala GS 15W 5000K	Und	12,00	144.940	1.739.280		-	
3.1.6	S.I.P Letrero lumínico de emergencia SALIDA 90E 300X185X45 2.6W 120-277V SOBREPONER	UND	20,00	107.422	2.148.440		-	
3.1.7	S.I.P Luminaria de emergencia 185X50X108 SOBREPONER 2-BL 2W	UND	40,00	112.486	4.499.440		-	
3.1.8	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP en techo, Tubería D:1/2" SCH40, Caja octogonal y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	66,00	123.004	8.118.264		-	
3.1.9	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP emergencia, Tubería D:1/2 EMT, Caja RADWELL 5800 y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, incluye fijación, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	45,00	178.147	8.016.615		-	
3.1.10	S.I.A. Tablero de circuitos para baños, incluye 6 protecciones de 20A	UND	4,00	826.632	3.306.528		-	
				Sub Total	**39.310.023**		**-**	**0%**
		TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS			**39.310.023**		**-**	**0%**
4	**MUROS**							
4.1	Suministro e instalación de muro doble cara en lámina de fibrocemento 8mm. Estructura base 6. incluye estuco y dos manos de pintura	M2	84,00	171.543	14.409.612		-	
4.2	Carteras en lámina de fibrocemento 8mm dos caras, en marco ventana y puertas	ML	163,80	68.788	11.267.474		-	
				Sub Total	**25.677.086**		**-**	**0%**
		TOTAL MAMPOSTERIA			**25.677.086**		**-**	**0%**
5	**REPELLOS**							
5.1	Repello de piso y pared con mortero 1:4 espesor 2cm. Incluye aditivo impermeabilizante.	M2	1374,872	44.402	61.047.067		-	
5.2	Impermeabilización de losa de entrepiso y muros laterales de terraza, con recubrimiento impermeabilizante acrílico de alto desempeño con tecnología DFX y fibras para impermeabilizar cubiertas	M2	660,0	51.240	33.818.400		-	
				Sub Total	**94.865.467**		**-**	**0%**
		TOTAL REPELLOS			**94.865.467**		**-**	**0%**
6	**ENCHAPES**							
6.1	**PISOS**							
6.1.1	Enchape cerámica de piso estructurado 20.6x92.6cm, uso comercial moderado	M2	258,00	132.605	34.212.090		-	
6.1.2	Enchape cerámica de piso 60x60cm color gris, uso exteriores tráfico comercial	M2	88,00	100.281	8.824.728		-	
6.1.3	Acabado para uniones entre muro y losa de piso en media caña con mortero 1-4 H: 0,07m	ML	85,00	27.327	2.322.795		-	
				Sub Total	**45.359.613**		**-**	
6.2	**PARED**							
6.2.1	Enchape cerámica de pared color marfil caras diferenciadas 30.1x75.3cm	M2	457,00	113.777	51.996.089		-	
6.2.2	Guarda canto flecha 8 milímetros cromo aluminio mate	ML	31,00	12.988	402.628		-	
6.2.3	Suministro e instalación de espejo E= 3mm flotante biselado en sus cuatro lados sobre soporte metálico	M2	20,00	361.837	7.236.740		-	
6.2.4	Mesón en granito artificial verde uva tuba incluye solapa inferior en aglomerado ancho 50cm con melamina, ancho de mesón 0.60m	ML	17,00	1.146.712	19.494.104		-	
				Sub Total	**79.129.561**		**-**	**0%**
		TOTAL ENCHAPES			**124.489.174**		**-**	**0%**
7	**ESTUCOS**							
7.1	Estuco acrílico para exteriores, incluye juntas, filos y dilataciones	M2	320,00	21.750	6.960.000		-	
7.2	Estuco plástico para muros y resanes incluye juntas, filos y dilataciones	M2	973,00	16.641	16.191.693		-	
				Sub Total	**23.151.693**		**-**	**0%**
		TOTAL ESTUCOS			**23.151.693**		**-**	**0%**
8	**PINTURA**							
8.1	Pintura de muros en mampostería 3 manos, vinilo tipo 1, lavable	M2	5137,00	12.785	65.676.545		-	
8.2	Pintura para exteriores (3 manos) para paredes.	M2	1280,00	27.659	35.403.520		-	
8.3	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial ancho 10cm, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, para pavimento rígido	ML	173,52	14.418	2.501.811		-	
8.4	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial, números con circunferencias de 66 y 40cm para carros y motos. imprimación en negro y pintura tráfico vehicular, incluye micro esferas, para pavimento rígido	UND	42,00	30.758	1.291.836		-	
8.5	Aplicación de pintura en frio base solvente para flechas de ingreso y salida, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, sobre pavimento rígido	M2	27,00	59.594	1.609.038		-	
				Sub Total	**106.482.750**		**-**	**0%**
		TOTAL PINTURA			**106.482.750**		**-**	**0%**
9	**CARPINTERIAS**							
9.1	Suministro e instalación de puerta de dos hojas batientes elaborada en tubular aluminio estriado ANOLOC, incluye chapa pomo de alcoba metálica pasador y argolla para candado. Medidas de cada hoja 0.9mx2.10m (ver plano A-022. P-T3)	UND	1,00	2.374.136	2.374.136		-	
9.2	Sellado de juntas entre muros y marcos de ventanería con sellador de juntas de poliuretano.	ML	367,00	11.048	4.054.616		-	

				Sub Total	**6.428.752**		**-**	**0%**
		TOTAL CARPINTERIAS			**6.428.752**		**-**	**0%**
10	**CUBIERTAS Y CIELO RASO**							
10.2	Limpieza, lavado, cambio de amarras y ganchos, aplicación de sellante en amarras de policarbonato alveolar	M2	33,00	32.738	1.080.354		-	
10.3	Suministro e instalación de cielo raso desmontable, láminas de fibra mineral 0,60m x 0,60m, incluye estructura	M2	220,00	89.265	19.638.300		-	
				Sub Total	**20.718.654**		**-**	**0%**
		TOTAL CUBIERTAS Y CIELO RASO			**20.718.654**		**-**	**0%**
11	**APARATOS SANITARIOS Y DOTACION BAÑOS**							
11.1	Kit Taza sanitaria entrada superior con fluxómetro con sensor, blanco institucional (Incluye Taza Sanitaria para Fluxómetro, asiento sanitario, sensor, sistema conexión entrada superior)	UND	4	3.778.631	15.114.524		-	
11.2	Taza sanitaria alongado, blanco institucional ultra ahorradora (Sanitario con push)	UND	28	1.228.494	34.397.832		-	
11.3	Barra de seguridad Fija Recta en acero inoxidable (baño para personas con movilidad reducida), incluye anclajes	UND	4	463.827	1.855.308		-	
11.4	Barra de seguridad abatible (baño para personas con movilidad reducida) incluye anclajes	UND	4	641.649	2.566.596		-	
11.5	Lavamanos blanco institucional, para personas con movilidad reducida, incluye anclajes	UND	4	553.338	2.213.352		-	
11.6	Lavamanos blanco institucional, para incrustar en mesones	UND	20	328.045	6.560.900		-	
11.7	Suministro e instalación de brazo de soporte para lavamanos	JUEGO	4	288.360	1.153.440		-	
11.8	Suministro e instalación de grifería para lavamanos y desagüe tipo botella sencillo incluye acople	UND	24	62.127	1.491.048		-	
11.9	Construcción lava traperos 70x50x50cm, enchapado.	UND	4	622.329	2.489.316		-	
11.10	Kit Orinal arrecife o similar para fluxómetro	UND	8	1.284.163	10.273.304		-	
11.11	Dispensador De Papel Higiénico Acero Inoxidable Diámetro De 26 Cm	UND	16	157.457	2.519.312		-	
11.12	Papelera metálica en acero inoxidable según especificaciones	UND	32	530.403	16.972.896		-	
11.13	Dispensador de jabón para empotrar en pared, en acero inoxidable, 1.2Litros	UND	16	253.414	4.054.624		-	
11.14	Suministro e instalación de divisiones sanitarias a piso en acero inoxidable AISI SAE 304 para baños de uso institucional. Batería completa con tres (3) cubículos para unidades sanitarias. Incluye tornillería y accesorios.	UND	8,00	8.420.295	67.362.360		-	
11.15	Dispensador De Toallas De Papel En Z Acero Inoxidable De 27x27x10 Cm	UND	16,00	186.293	2.980.688		-	
				Sub Total	**172.005.500**		**-**	**0%**
		TOTAL APARATOS SANITARIOS			**172.005.500**		**-**	**0%**
12	**SEÑALIZACIÓN**							
12.1	Suministro e instalación de placa de señalización de 0,65 x 0,50 m con planimetría salidas de emergencia, en acrílico de 2.4 con impresión full color y regletas en MDF para su instalación	UND	5,00	229.178	1.145.890		-	
12.2	Suministro e instalación Franjas Guías longitudinales de ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	600,00	10.725	6.435.000		-	
12.3	Suministro e instalación de Punto alerta ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	2100,00	5.658	11.881.800		-	
12.4	Suministro e Instalación de Loseta alerta en policarbonato, 20 x 20 cm., Altura total: 5mm, Peso 150 gr, incluye anclaje	UND	15,00	43.268	649.020		-	
12.5	Suministro e instalación de letreros luminosos informativos en parqueadero doble cara, ubicado en sótano 1.50x0.40m	UND	3,00	576.720	1.730.160		-	
12.6	Suministro e instalación de letras en acero inoxidable de la frase: PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA y Escudo de la Rama judicial diámetro 50cm, tamaño de letra 30cm cada una, según diseño	UND	1,00	5.767.200	5.767.200		-	
				Sub Total	**27.609.070**		**-**	**0%**
		TOTAL SEÑALIZACIÓN			**27.609.070**		**-**	**0%**
13	**VARIOS Y ASEO GENERAL**							
13.1	Brigada de aseo	PERSONA/ MES	6,00	2.304.481	13.826.886		-	
				Sub Total	**13.826.886**		**-**	**0%**
		TOTAL VARIOS Y ASEO			**13.826.886**		**-**	**0%**

TOTAL COSTO DIRECTO:	748.356.821		-	**0%**
ADMINISTRACIÓN (18.73%)	140.167.233		-	
IMPREVISTOS (3%)	22.450.705		-	
UTILIDAD (5%)	37.417.841		-	
IVA (19%)	7.109.390		-	
TOTAL PRESUPUESTO:	**955.501.990**		**-**	**0%**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO
INFORME SEMANAL DE OBRA N° 1

COINCO

I. INFORMACIÓN GENERAL

N° CONTRATO Y FECHA: CO1.PCCNTR.6947019 del 29 de octubre de 2024 — TRAMO (S): N.A. — FECHA: 17/11/2024

ENTIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO — SEMANA No.: 1 del 14/11/2024 al 17/11/2024

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. DIANA VIVANCO — ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO

OBJETO: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO" — FECHA DE INICIO: 14/11/2024

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA
INTEGRANTES: REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO MANRIQUE

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.6947019 del 29 de octubre de 2024 — VALOR INICIAL: $ 955.501.990,00
PLAZO INICIAL: 60 dias — ADICIONES: $ 0,00
PLAZO ACUMULADO: — VALOR ACUMULADO: $ 955.501.990,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
INTEGRANTES:

CONTRATO No.: O1.PCCNTR.6973355 — VALOR INICIAL: $ 33.336.660,00
PLAZO INICIAL: 45 cuarenta y cinco días — ADICIONES:
PLAZO ACUMULADO: — VALOR ACUMULADO: $ 33.336.660,00

II. AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS OBRA:


ESTUDIOS Y DISEÑOS:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:
OBRA:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:
TOTAL OBRA + EST Y DISEÑOS:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

INTERVENTORÍA:
COSTOS EJECUTADOS ACUMULADOS:
COSTOS PROGRAMADOS ACUMULADOS:

ESTUDIOS Y DISEÑOS SEMANAL:
PROGRAMADA: $ -
EJECUTADA: $ -
OBRA SEMANAL:
PROGRAMADA: $ 0,00
EJECUTADA: $ 0,00
TOTAL OBRA + E Y D SEMANAL:
PROGRAMADA: $ 0,00
EJECUTADA: $ 0,00

III. AVANCE FÍSICO

DESCRIPCIÓN	EJECUTADO ACUMULADO PROYECTO S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	TOTAL
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
AVANCE OBRA COSTOS DIRECTOS														0,00%
AVANCE OBRA TOTAL														0,00%



MAQUINARIA Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	MES 1	TOTAL
HERRAMIENTA MENOR		

MES 1: $ 0,00 — MES 2: $ 0,00 — MES 3: — MES 4: — MES 5: — MES 6:

MES 7: — MES 8: — MES 9: — MES 10: — MES 11: — MES 12: — MES 13:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

	SI	NO	N/A
BOTADEROS	X		
LICENCIA AMBIENTAL:			
APROVECHAMIENTO FORESTAL:			
CONCESIÓN DE AGUAS:			
OCUPACIÓN DE CAUCES:			
VERTIMIENTOS:			
EMISIONES:			

OBSERVACIONE: La escombrera Palermo, se encuentra ubicada en la verada Caliyaco, ubicada en zona rural del municipio de Mocoa Putumayo, Gestor de disposición final de RCD, autorizado mediante resolución 00003 de 08/07/2019 código de Inscripción DPT-3389-25-07-2019 / km 1:200 Vía a Villagarzón.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0,0
SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 0,0

OBSERVACIONES: El personal mano de obra no calificada es en su totalidad es de la vereda brisas del Mocoa. La selección de las hojas de vida se realizo de la documentación entregada por la JAC quienes realizaron la convocatoria y certificaron que las persona sean del sector.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ADMINISTRATIVAS, LEGALES, FINANCIERAS

FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA E INTERVENTORIA, AFILIACION DEL PERSONAL A LAS ENTIDADES ASEGURADORAS Y DE SALUD.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO
INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N° 1

COINCO

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO" — TRAMO (S): N.A. — FECHA: 17/11/2024

SECRETARIA EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO — RAMA JUDICIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 1 del 14/11/2024 al 17/11/2024

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

TÉCNICAS

Se realiza reconocimiento y verificación de medidas en campo.

Se realiza verificación de planos disponibles del palacio de justicia.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

AMBIENTAL Y SST

El componente de seguridad y salud en el trabajo realizo el seguimiento punto a punto del plan de manejo básico de seguridad y salud en el trabajo en el cual se encontró lo siguiente :

No se desarrollan actividades de SST

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Se realiza reconocimiento y verificación de medidas en campo.

Cotizaciones de insumos para la construcción

NOTA:

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES

Acta de inicio el 14 de noviembre de 2024.

Fecha de terminación inicial 31 de diciembre de 2024

OBSERVACIONES:	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA:	FIRMA:
	NOMBRE: MARLON FERNANDO ARTEAGA P.	NOMBRE: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
	N° MAT: 52202-333602 NRÑ	No. MAT: 63202094726 QND

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO
INFORME SEMANAL DE OBRA N° 2

PÁGINA	1	DE	1

SECRETARIA EJECUTORA: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO

FECHA: 24 / 11 / 2024

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.6947019

Semana Número: 2 Del: 18/11/2024 Al: 24/11/2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 11 Días Corresponde al : 18,33% del Plazo total del Contrato

Supervisor Técnico de Contrato

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO"

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,57%	1,82%
Valor básico de la Obra programada:	$ 14.997.937	$ 17.382.659

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	0,00%
Valor básico de Obra Ejecutada:	$ 0,00	$ 0,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.
Contrato No.	CO1.PCCNTR.6947019
Valor Inicial:	$ 955.501.990,00
Plazo Inicial:	2 MESES
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	14 de noviembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
Contrato No.	O1.PCCNTR.6973355 DEL 01/11/2024
Valor Actualizado:	$ 33.336.660,00
Plazo Inicial:	45 cuarenta y cinco dias calendario
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	14 de noviembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se continúa con el reconocimiento y verificación de medidas en campo.
Se realiza verificación de planos disponibles del palacio de justicia.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realiza reconocimiento y verificación de medidas en campo.
Cotizaciones de insumos para la construcción

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se firma acta de inicio el 14 de noviembre de 2024.
Fecha de terminación inicial 31 de diciembre de 2024

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO	Firma: Nombre: MARLON FERNANDO ARTEAGA P. Matrícula 52202-339602 NRÑ	Firma: Nombre: Matrícula



Fotografía: 1

Se continúa con el reconocimiento y verificación de medidas en campo.



Fotografía: 2

Se continúa con el reconocimiento y verificación de medidas en campo.

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No.	CO1.PCCNTR.6947019
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.
INTERVENTOR:	ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO

OBJETO "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO"

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	% EJECUTADO
1	**PRELIMINARES**							
1.1	**INICIALES**							
1.1.1	Localización y replanteo arquitectónico, incluye planos récord	M2	332,00	3.864	1.282.848		-	
1.1.2	Instalación y desinstalación de muro una cara drywall, provisional para cerrar las obras, incluye puerta con marco para ingreso de trabajadores	M2	53,00	77.249	4.094.197		-	
1.1.3	Señalización de obra en lona de 60x40cm impresión full color, incluye marco y anclaje	UND	9,00	60.693	546.237		-	
				Sub Total	**5.923.282**		**-**	**0,00%**
1.2	**DESMONTES Y RETIROS**							
1.2.1	Desmonte de marcos y puertas, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	57,00	26.406	1.505.142		-	
1.2.2	Desmonte de marco, ventana y vidrio, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	1,00	27.367	27.367		-	
1.2.3	Desmonte de cielo raso en fibra mineral y/o panel yeso y/o fibrocemento, incluye estructura soporte, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	M2	250,00	29.781	7.445.250		-	
1.2.4	Desmonte de Tasas sanitarias, orinales y lavamanos, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	UND	48,00	53.587	2.572.176		-	
1.2.5	Desmonte de instalaciones hidrosanitarias, incluye tuberías y accesorios, regatas y sellos provisionales, cargue a volqueta	UND	72,00	57.730	4.156.560		-	
1.2.6	Rasqueteo, cepillo y limpieza manual de superficies, con el fin de retirar impurezas y capas de pintura existentes.	M2	1017,00	4.863	4.945.671		-	
1.2.7	Retiro de luminarias ubicadas en cielos rasos y pared, incluye trasiego a punto de acopio	UND	46,00	21.660	996.360		-	
1.2.8	Retiro de redes eléctricas en piso, techo y pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	GL	1,00	2.233.550	2.233.550		-	
				Sub Total	**23.882.076**		**-**	**0,00%**
1.3	**DEMOLICIONES**							
1.3.1	Demolición muro E ≤ 15CM en mampostería maciza o hueca, incluye cortes con pulidora, trasiegos y cargue a volqueta.	M2	220,00	17.941	3.947.020		-	
1.3.2	Demolición de enchape de pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	704,40	14.760	10.396.413		-	
1.3.3	Demolición de enchapes de piso, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	283,00	13.980	3.956.340		-	
1.3.4	Demolición repello de piso, incluye picado Eprom = 0.03m, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	835,00	12.959	10.820.765		-	
1.3.5	Demolición repello de pared, muros mampostería eprom= 0.02m, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	291,80	15.119	4.411.785		-	
1.3.6	Cargue, transporte y retiro del material sobrante proveniente de las obras de mantenimiento, hasta el botadero.	M3	234,00	40.171	9.400.014		-	
1.3.7	Demolición de mesones en concreto, recubierto con granito incluye salpicadero	M2	11,00	37.722	414.942		-	
				Sub Total	**43.347.279**		**-**	**0,00%**
		TOTAL PRELIMINARES			**73.152.637**		**-**	**0,00%**
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**							
2.1	**RED SUMINISTRO AGUA POTABLE**							
2.1.1	Instalaciones PVC 1/2" RDE 13.5	ML	95,00	7.575	719.625		-	
2.1.2	Instalaciones PVC 3/4" RDE 21	ML	28,00	10.939	306.292		-	
2.1.3	Instalaciones PVC RDE 21 1"	ML	50,21	12.038	604.428		-	
2.1.4	Instalaciones PVC RDE 21 2"	ML	6,00	26.949	161.694		-	
2.1.5	Punto hidráulico PVC 1/2"	UND	60,00	24.174	1.450.440		-	
2.1.6	Punto hidráulico PVC 3/4"	UND	8,00	26.324	210.592		-	
2.1.7	Punto hidráulico PVC 1/2" incluye válvula control paso 1/2" y tapa PVC Blanca 15x15cm	UND	18,00	59.937	1.078.866		-	
				Sub Total	**4.531.937**		**-**	**0,00%**
2.2	**RED SANITARIA, PLUVIAL, VENTILACION**							
2.2.1	Instalaciones sanitarias PVC 2"	ML	58,00	25.087	1.455.046		-	
2.2.2	Instalaciones sanitarias PVC 4"	ML	119,00	42.006	4.998.714		-	
2.2.3	Instalaciones ventilación PVC 2"	ML	183,00	20.194	3.695.502		-	
2.2.4	Instalaciones ventilación PVC 3"	ML	35,00	31.646	1.107.610		-	
2.2.5	Punto sanitario 4" WC	UND	32,00	45.965	1.470.880		-	
2.2.6	Punto sanitario 2"	UND	44,00	33.894	1.491.336		-	
2.2.7	Suministro e instalación de rejilla de piso en acero inoxidable cuadrada de 10cm salida a tubería 2"	UND	24,00	48.380	1.161.120		-	
2.2.8	Suministro e instalación de tubería de conexión de desagües de aires acondicionados	ML	36,00	20.194	726.984		-	
				Sub Total	**16.107.192**		**-**	**0,00%**
		TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**20.639.129**		**-**	**0,00%**
3	**RED ELECTRICA**							
3.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**							
3.1.1	S.I.P. Salida toma doble GFCI 1F/20AMP en tubería PVC SCH40 1/2", caja galvanizada y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	16,00	171.144	2.738.304		-	
3.1.2	S.I.P. Salida sensor de movimiento tipo interruptor 360° 1F/15AMP En muro, Tubería PVC SCH40 D:1/2", Cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	32,00	138.700	4.438.400		-	

3.1.3	S.I.P Luminaria de sobreponer 400x120 para uso interior, fabricada en lámina de acero COLD ROLLED, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate y difusor lamina acrílico opalizado L11. Producto para instalación de sobreponer, en temperatura de color 5000K flujo lumínico de 4400Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 28.56W	UND	4,00	424.118	1.696.472		-	
3.1.4	S.I.P. Luminaria tipo bala 72x83 para incrustar, Producto tipo DOWNLIGHT de uso interior fabricado en aluminio inyectado, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate en temperatura de color 6500K flujo lumínico de 550Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 6.00W	UND	40,00	65.207	2.608.280		-	
3.1.5	S.I.P Luminaria tipo bala GS 15W 5000K	Und	12,00	144.940	1.739.280		-	
3.1.6	S.I.P Letrero lumínico de emergencia SALIDA 90E 300X185X45 2.6W 120-277V SOBREPONER	UND	20,00	107.422	2.148.440		-	
3.1.7	S.I.P Luminaria de emergencia 185X50X108 SOBREPONER 2-BL 2W	UND	40,00	112.486	4.499.440		-	
3.1.8	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP en techo, Tubería D:1/2" SCH40, Caja octogonal y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	66,00	123.004	8.118.264		-	
3.1.9	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP emergencia, Tubería D:1/2 EMT, Caja RADWELL 5800 y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, incluye fijación, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	45,00	178.147	8.016.615		-	
3.1.10	S.I.A. Tablero de circuitos para baños, incluye 6 protecciones de 20A	UND	4,00	826.632	3.306.528		-	
				Sub Total	**39.310.023**		**-**	**0,00%**
		TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS			**39.310.023**		**-**	**0,00%**
4	**MUROS**							
4.1	Suministro e instalación de muro doble cara en lámina de fibrocemento 8mm. Estructura base 6. incluye estuco y dos manos de pintura	M2	84,00	171.543	14.409.612		-	
4.2	Carteras en lámina de fibrocemento 8mm dos caras, en marco ventana y puertas	ML	163,80	68.788	11.267.474		-	
				Sub Total	**25.677.086**		**-**	**0,00%**
		TOTAL MAMPOSTERIA			**25.677.086**		**-**	**0,00%**
5	**REPELLOS**							
5.1	Repello de piso y pared con mortero 1:4 espesor 2cm. Incluye aditivo impermeabilizante.	M2	1374,872	44.402	61.047.067		-	
5.2	Impermeabilización de losa de entrepiso y muros laterales de terraza, con recubrimiento impermeabilizante acrílico de alto desempeño con tecnología DFX y fibras para impermeabilizar cubiertas	M2	660,0	51.240	33.818.400		-	
				Sub Total	**94.865.467**		**-**	**0,00%**
		TOTAL REPELLOS			**94.865.467**		**-**	**0,00%**
6	**ENCHAPES**							
6.1	**PISOS**							
6.1.1	Enchape cerámica de piso estructurado 20.6x92.6cm, uso comercial moderado	M2	258,00	132.605	34.212.090		-	
6.1.2	Enchape cerámica de piso 60x60cm color gris, uso exteriores tráfico comercial	M2	88,00	100.281	8.824.728		-	
6.1.3	Acabado para uniones entre muro y losa de piso en media caña con mortero 1-4 H: 0,07m	ML	85,00	27.327	2.322.795		-	
				Sub Total	**45.359.613**		**-**	
6.2	**PARED**							
6.2.1	Enchape cerámica de pared color marfil caras diferenciadas 30.1x75.3cm	M2	457,00	113.777	51.996.089		-	
6.2.2	Guarda canto flecha 8 milímetros cromo aluminio mate	ML	31,00	12.988	402.628		-	
6.2.3	Suministro e instalación de espejo E= 3mm flotante biselado en sus cuatro lados sobre soporte metálico	M2	20,00	361.837	7.236.740		-	
6.2.4	Mesón en granito artificial verde uva tuba incluye solapa inferior en aglomerado ancho 50cm con melamina, ancho de mesón 0.60m	ML	17,00	1.146.712	19.494.104		-	
				Sub Total	**79.129.561**		**-**	**0,00%**
		TOTAL ENCHAPES			**124.489.174**		**-**	**0,00%**
7	**ESTUCOS**							
7.1	Estuco acrílico para exteriores, incluye juntas, filos y dilataciones	M2	320,00	21.750	6.960.000		-	
7.2	Estuco plástico para muros y resanes incluye juntas, filos y dilataciones	M2	973,00	16.641	16.191.693		-	
				Sub Total	**23.151.693**		**-**	**0,00%**
		TOTAL ESTUCOS			**23.151.693**		**-**	**0,00%**
8	**PINTURA**							
8.1	Pintura de muros en mampostería 3 manos, vinilo tipo 1, lavable	M2	5137,00	12.785	65.676.545		-	
8.2	Pintura para exteriores (3 manos) para paredes.	M2	1280,00	27.659	35.403.520		-	
8.3	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial ancho 10cm, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, para pavimento rígido	ML	173,52	14.418	2.501.811		-	
8.4	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial, números con circunferencias de 66 y 40cm para carros y motos. imprimación en negro y pintura tráfico vehicular, incluye micro esferas, para pavimento rígido	UND	42,00	30.758	1.291.836		-	
8.5	Aplicación de pintura en frio base solvente para flechas de ingreso y salida, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, sobre pavimento rígido	M2	27,00	59.594	1.609.038		-	
				Sub Total	**106.482.750**		**-**	**0,00%**
		TOTAL PINTURA			**106.482.750**		**-**	**0,00%**
9	**CARPINTERIAS**							
9.1	Suministro e instalación de puerta de dos hojas batientes elaborada en tubular aluminio estriado ANOLOC, incluye chapa pomo de alcoba metálica pasador y argolla para candado. Medidas de cada hoja 0.9mx2.10m (ver plano A-022. P-T3)	UND	1,00	2.374.136	2.374.136		-	
9.2	Sellado de juntas entre muros y marcos de ventanería con sellador de juntas de poliuretano.	ML	367,00	11.048	4.054.616		-	

				Sub Total	**6.428.752**		**-**	**0,00%**
		TOTAL CARPINTERIAS			**6.428.752**		**-**	**0,00%**
10	**CUBIERTAS Y CIELO RASO**							
10.2	Limpieza, lavado, cambio de amarras y ganchos, aplicación de sellante en amarras de policarbonato alveolar	M2	33,00	32.738	1.080.354		-	
10.3	Suministro e instalación de cielo raso desmontable, láminas de fibra mineral 0,60m x 0,60m, incluye estructura	M2	220,00	89.265	19.638.300		-	
				Sub Total	**20.718.654**		**-**	**0,00%**
		TOTAL CUBIERTAS Y CIELO RASO			**20.718.654**		**-**	**0,00%**
11	**APARATOS SANITARIOS Y DOTACION BAÑOS**							
11.1	Kit Taza sanitaria entrada superior con fluxómetro con sensor, blanco institucional (Incluye Taza Sanitaria para Fluxómetro, asiento sanitario, sensor, sistema conexión entrada superior)	UND	4	3.778.631	15.114.524		-	
11.2	Taza sanitaria alongado, blanco institucional ultra ahorradora (Sanitario con push)	UND	28	1.228.494	34.397.832		-	
11.3	Barra de seguridad Fija Recta en acero inoxidable (baño para personas con movilidad reducida), incluye anclajes	UND	4	463.827	1.855.308		-	
11.4	Barra de seguridad abatible (baño para personas con movilidad reducida) incluye anclajes	UND	4	641.649	2.566.596		-	
11.5	Lavamanos blanco institucional, para personas con movilidad reducida, incluye anclajes	UND	4	553.338	2.213.352		-	
11.6	Lavamanos blanco institucional, para incrustar en mesones	UND	20	328.045	6.560.900		-	
11.7	Suministro e instalación de brazo de soporte para lavamanos	JUEGO	4	288.360	1.153.440		-	
11.8	Suministro e instalación de grifería para lavamanos y desagüe tipo botella sencillo incluye acople	UND	24	62.127	1.491.048		-	
11.9	Construcción lava traperos 70x50x50cm, enchapado.	UND	4	622.329	2.489.316		-	
11.10	Kit Orinal arrecife o similar para fluxómetro	UND	8	1.284.163	10.273.304		-	
11.11	Dispensador De Papel Higiénico Acero Inoxidable Diámetro De 26 Cm	UND	16	157.457	2.519.312		-	
11.12	Papelera metálica en acero inoxidable según especificaciones	UND	32	530.403	16.972.896		-	
11.13	Dispensador de jabón para empotrar en pared, en acero inoxidable, 1.2Litros	UND	16	253.414	4.054.624		-	
11.14	Suministro e instalación de divisiones sanitarias a piso en acero inoxidable AISI SAE 304 para baños de uso institucional. Batería completa con tres (3) cubículos para unidades sanitarias. Incluye tornillería y accesorios.	UND	8,00	8.420.295	67.362.360		-	
11.15	Dispensador De Toallas De Papel En Z Acero Inoxidable De 27x27x10 Cm	UND	16,00	186.293	2.980.688		-	
				Sub Total	**172.005.500**		**-**	**0,00%**
		TOTAL APARATOS SANITARIOS			**172.005.500**		**-**	**0,00%**
12	**SEÑALIZACIÓN**							
12.1	Suministro e instalación de placa de señalización de 0,65 x 0,50 m con planimetría salidas de emergencia, en acrílico de 2.4 con impresión full color y regletas en MDF para su instalación	UND	5,00	229.178	1.145.890		-	
12.2	Suministro e instalación Franjas Guías longitudinales de ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	600,00	10.725	6.435.000		-	
12.3	Suministro e instalación de Punto alerta ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	2100,00	5.658	11.881.800		-	
12.4	Suministro e Instalación de Loseta alerta en policarbonato, 20 x 20 cm., Altura total: 5mm, Peso 150 gr, incluye anclaje	UND	15,00	43.268	649.020		-	
12.5	Suministro e instalación de letreros luminosos informativos en parqueadero doble cara, ubicado en sótano 1.50x0.40m	UND	3,00	576.720	1.730.160		-	
12.6	Suministro e instalación de letras en acero inoxidable de la frase: PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA y Escudo de la Rama judicial diámetro 50cm, tamaño de letra 30cm cada una, según diseño	UND	1,00	5.767.200	5.767.200		-	
				Sub Total	**27.609.070**		**-**	**0,00%**
		TOTAL SEÑALIZACIÓN			**27.609.070**		**-**	**0,00%**
13	**VARIOS Y ASEO GENERAL**							
13.1	Brigada de aseo	PERSONA/ MES	6,00	2.304.481	13.826.886		-	
				Sub Total	**13.826.886**		**-**	**0,00%**
		TOTAL VARIOS Y ASEO			**13.826.886**		**-**	**0,00%**

TOTAL COSTO DIRECTO:	748.356.821		-	**0,00%**
ADMINISTRACIÓN (18.73%)	140.167.233		-	
IMPREVISTOS (3%)	22.450.705		-	
UTILIDAD (5%)	37.417.841		-	
IVA (19%)	7.109.390		-	
TOTAL PRESUPUESTO:	**955.501.990**		**-**	**0,00%**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO
INFORME SEMANAL DE OBRA N° 2

I. INFORMACIÓN GENERAL

N° CONTRATO Y FECHA: CO1.PCCNTR.6947019 del 29 de octubre de 2024 | TRAMO (S): N.A. | FECHA: 24/11/2024

ENTIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO | SEMANA No.: 2 del 18/11/2024 al 24/11/2024

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. DIANA VIVANCO | ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO

OBJETO: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO" | FECHA DE INICIO: 14/11/2024

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA
INTEGRANTES: REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO MANRIQUE

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.6947019 del 29 de octubre de 2024
PLAZO INICIAL: 60 dias
PLAZO ACUMULADO:
VALOR INICIAL: $ 955.501.990,00
ADICIONES: $ 0,00
VALOR ACUMULADO: $ 955.501.990,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
INTEGRANTES:

CONTRATO No.: O1.PCCNTR.6973355
PLAZO INICIAL: 45 cuarenta y cinco días
PLAZO ACUMULADO:
VALOR INICIAL: $ 33.336.660,00
ADICIONES: $ 0,00
VALOR ACUMULADO: $ 33.336.660,00

II. AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS OBRA:


ESTUDIOS Y DISEÑOS:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:
OBRA:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:
TOTAL OBRA + EST Y DISEÑOS:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

INTERVENTORÍA:
COSTOS EJECUTADOS ACUMULADOS:
COSTOS PROGRAMADOS ACUMULADOS:

ESTUDIOS Y DISEÑOS SEMANAL:
PROGRAMADA: $ -
EJECUTADA: $ -
OBRA SEMANAL:
PROGRAMADA: $ 0,00
EJECUTADA: $ 0,00
TOTAL OBRA + E Y D SEMANAL:
PROGRAMADA: $ 0,00
EJECUTADA: $ 0,00

III. AVANCE FÍSICO

DESCRIPCIÓN	EJECUTADO ACUMULADO PROYECTO MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	TOTAL
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
AVANCE OBRA COSTOS DIRECTOS														0,00%
AVANCE OBRA TOTAL														0,00%



MAQUINARIA Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	MES 1	TOTAL
HERRAMIENTA MENOR		
TALADRO PERCUTOR		

MES 1: $ 0,00 | MES 2: $ 0,00 | MES 3: | MES 4: | MES 5: | MES 6:
MES 7: | MES 8: | MES 9: | MES 10: | MES 11: | MES 12: | MES 13:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___
UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___
UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___
UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

	SI	NO	N/A
BOTADEROS	X		
LICENCIA AMBIENTAL:			
APROVECHAMIENTO FORESTAL:			
CONCESIÓN DE AGUAS:			
OCUPACIÓN DE CAUCES:			
VERTIMIENTOS:			
EMISIONES:			

OBSERVACIONE: La escombrera Palermo, se encuentra ubicada en la verada Caliyaco, ubicada en zona rural del municiipio de Mocoa Putumayo, Gestor de disposición final de RCD, autorizado mediante resolución 00003 de 08/07/2019 código de Inscripción DPT-3389-25-07-2019 / km 1:200 Vía a Villagarzón.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0,0
SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 0,0

OBSERVACIONES: El personal mano de obra no calificada es en su totalidad es de la vereda brisas del Mocoa. La selección de las hojas de vida se realizo de la documentación entregada por la JAC quienes realizaron la convocatoria y certificaron que las persona sean del sector.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ADMINISTRATIVAS, LEGALES, FINANCIERAS

FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA E INTERVENTORIA, AFILIACION DEL PERSONAL A LAS ENTIDADES ASEGURADORAS Y DE SALUD.

Fecha de terminación inicial 31 de diciembre de 2024

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO
INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N° 2

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO" | TRAMO (S): N.A. | FECHA: 24/11/2024

SECRETARIA EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO | RAMA JUDICIAL: PUTUMAYO | SEMANA No.: 2 del 18/11/2024 al 24/11/2024

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

TÉCNICAS

Se continúa con el reconocimiento y verificación de medidas en campo.

Se realiza verificación de planos disponibles del palacio de justicia.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

AMBIENTAL Y SST

El componente de seguridad y salud en el trabajo realizo el seguimiento punto a punto del plan de manejo básico de seguridad y salud en el trabajo en el cual se encontró lo siguiente :

No se desarrollan actividades de SST

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Se realiza reconocimiento y verificación de medidas en campo.

Cotizaciones de insumos para la construcción

NOTA:

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES

Se firma acta de inicio el 14 de noviembre de 2024.

Fecha de terminación inicial 31 de diciembre de 2024

OBSERVACIONES:	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA:	FIRMA:
	NOMBRE: MARLON FERNANDO ARTEAGA POTOSI	NOMBRE: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
	N° MAT: 52202-333602 NRÑ	No. MAT: 63202094726 QND

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO
INFORME SEMANAL DE OBRA N° 3

PÁGINA	1	DE	1

SECRETARIA EJECUTORA: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO

FECHA: 1 / 12 / 2024

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.6947019

Semana Número: 3 Del: 25/11/2024 Al: 1/12/2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 18 Días Corresponde al : 30,00% del Plazo total del Contrato

Supervisor Técnico de Contrato ING. DIANA VIVANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO"

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,15%	4,97%
Valor básico de la Obra programada:	$ 30.113.955	$ 47.496.614

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,49%	1,49%
Valor básico de Obra Ejecutada:	$ 14.250.052	$ 14.250.052

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.
Contrato No.	CO1.PCCNTR.6947019
Valor Inicial:	$ 955.501.990,00
Plazo Inicial:	2 MESES
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	14 de noviembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
Contrato No.	O1.PCCNTR.6973355 DEL 01/11/2024
Valor Actualizado:	$ 33.336.660,00
Plazo Inicial:	45 cuarenta y cinco dias calendario
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	14 de noviembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza afiliaciones del personal a laborar, ademas se entrega dotación.
Se inician actividades de demolición de enchapes, mesones, pisos y demas elementos a remover en baños y baterias sanitarias en piso 1 y 2.
Desmonte de puertas, ventanas y aparatos sanitarios.
Se inicia demonte de cielo razos
Se inicia revisión y desmonte de redes eléctricas en baños y unidades sanitarias en piso 1 y 2.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con demoliciones de concretos, enchapes y demas materiales.
Realizar retiro de escombros
Iniciar con resane de paredes en piso 1, en todas las áreas internas.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se firma acta de inicio el 14 de noviembre de 2024.
Fecha de terminación inicial 13 de enero de 2025

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO	Firma: Nombre: MARLON FERNANDO ARTEAGA P. Matrícula 52202-339602 NRÑ	Firma: Nombre: Matrícula



Fotografía: 1

Se realiza afiliaciones del personal a laborar, ademas se entrega dotación.




Fotografía: 2

Se inician actividades de demolición de enchapes, mesones, pisos y demas elementos a remover en baños y baterias sanitarias en piso 1 y 2.



Fotografía: 3

Desmonte de puertas, ventanas y aparatos sanitarios.

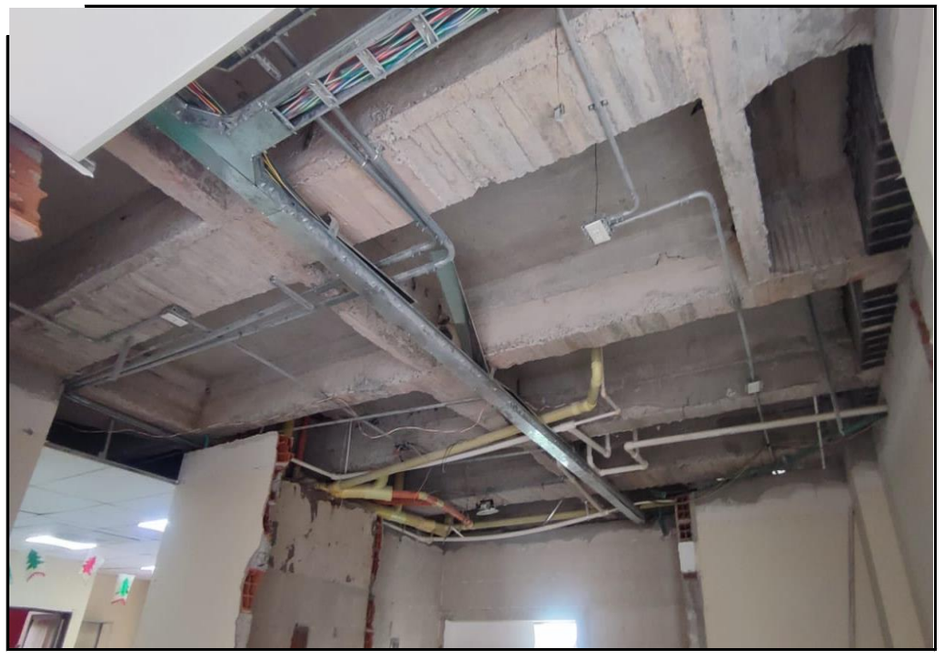

Fotografía: 4

Se inicia demonte de cielo razos



Fotografía: 5

Se inicia revisión y desmonte de redes eléctricas en baños y unidades sanitarias en piso 1 y 2.



Fotografía: 6

Se inicia revisión y desmonte de redes eléctricas en baños y unidades sanitarias en piso 1 y 2.

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No.	CO1.PCCNTR.6947019
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.
INTERVENTOR:	ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO

OBJETO "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO"

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	% EJECUTADO
1	**PRELIMINARES**							
1.1	**INICIALES**							
1.1.1	Localización y replanteo arquitectónico, incluye planos récord	M2	332,00	3.864	1.282.848	43,98	169.939	13,25%
1.1.2	Instalación y desinstalación de muro una cara drywall, provisional para cerrar las obras, incluye puerta con marco para ingreso de trabajadores	M2	53,00	77.249	4.094.197	5,50	424.870	10,38%
1.1.3	Señalización de obra en lona de 60x40cm impresión full color, incluye marco y anclaje	UND	9,00	60.693	546.237		-	0,00%
				Sub Total	**5.923.282**		**594.809**	**10,04%**
1.2	**DESMONTES Y RETIROS**							
1.2.1	Desmonte de marcos y puertas, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	57,00	26.406	1.505.142	12,00	316.872	21,05%
1.2.2	Desmonte de marco, ventana y vidrio, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	1,00	27.367	27.367		-	0,00%
1.2.3	Desmonte de cielo raso en fibra mineral y/o panel yeso y/o fibrocemento, incluye estructura soporte, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	M2	250,00	29.781	7.445.250	43,99	1.309.917	17,59%
1.2.4	Desmonte de Tasas sanitarias, orinales y lavamanos, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	UND	48,00	53.587	2.572.176	18,00	964.566	37,50%
1.2.5	Desmonte de instalaciones hidrosanitarias, incluye tuberías y accesorios, regatas y sellos provisionales, cargue a volqueta	UND	72,00	57.730	4.156.560	18,00	1.039.140	25,00%
1.2.6	Rasqueteo, cepillo y limpieza manual de superficies, con el fin de retirar impurezas y capas de pintura existentes.	M2	1017,00	4.863	4.945.671		-	0,00%
1.2.7	Retiro de luminarias ubicadas en cielos rasos y pared, incluye trasiego a punto de acopio	UND	46,00	21.660	996.360	6,00	129.960	13,04%
1.2.8	Retiro de redes eléctricas en piso, techo y pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	GL	1,00	2.233.550	2.233.550	0,50	1.116.775	50,00%
				Sub Total	**23.882.076**		**4.877.230**	**20,42%**
1.3	**DEMOLICIONES**							
1.3.1	Demolición muro E ≤ 15CM en mampostería maciza o hueca, incluye cortes con pulidora, trasiegos y cargue a volqueta.	M2	220,00	17.941	3.947.020	25,87	464.170	11,76%
1.3.2	Demolición de enchape de pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	704,40	14.760	10.396.413	116,81	1.724.153	16,58%
1.3.3	Demolición de enchapes de piso, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	283,00	13.980	3.956.340	43,98	614.891	15,54%
1.3.4	Demolición repello de piso, incluye picado Eprom = 0.03m, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	835,00	12.959	10.820.765	43,98	569.984	5,27%
1.3.5	Demolición repello de pared, muros mampostería eprom= 0.02m, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	291,80	15.119	4.411.785	116,81	1.766.038	40,03%
1.3.6	Cargue, transporte y retiro del material sobrante proveniente de las obras de mantenimiento, hasta el botadero.	M3	234,00	40.171	9.400.014	12,00	482.052	5,13%
1.3.7	Demolición de mesones en concreto, recubierto con granito incluye salpicadero	M2	11,00	37.722	414.942	1,79	67.428	16,25%
				Sub Total	**43.347.279**		**5.688.716**	**13,12%**
		TOTAL PRELIMINARES			**73.152.637**		**11.160.755**	**15,26%**
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**							
2.1	**RED SUMINISTRO AGUA POTABLE**							
2.1.1	Instalaciones PVC 1/2" RDE 13.5	ML	95,00	7.575	719.625		-	
2.1.2	Instalaciones PVC 3/4" RDE 21	ML	28,00	10.939	306.292		-	
2.1.3	Instalaciones PVC RDE 21 1"	ML	50,21	12.038	604.428		-	
2.1.4	Instalaciones PVC RDE 21 2"	ML	6,00	26.949	161.694		-	
2.1.5	Punto hidráulico PVC 1/2"	UND	60,00	24.174	1.450.440		-	
2.1.6	Punto hidráulico PVC 3/4"	UND	8,00	26.324	210.592		-	
2.1.7	Punto hidráulico PVC 1/2" incluye válvula control paso 1/2" y tapa PVC Blanca 15x15cm	UND	18,00	59.937	1.078.866		-	
				Sub Total	**4.531.937**		**-**	**0,00%**
2.2	**RED SANITARIA, PLUVIAL, VENTILACION**							
2.2.1	Instalaciones sanitarias PVC 2"	ML	58,00	25.087	1.455.046		-	
2.2.2	Instalaciones sanitarias PVC 4"	ML	119,00	42.006	4.998.714		-	
2.2.3	Instalaciones ventilación PVC 2"	ML	183,00	20.194	3.695.502		-	
2.2.4	Instalaciones ventilación PVC 3"	ML	35,00	31.646	1.107.610		-	
2.2.5	Punto sanitario 4" WC	UND	32,00	45.965	1.470.880		-	
2.2.6	Punto sanitario 2"	UND	44,00	33.894	1.491.336		-	
2.2.7	Suministro e instalación de rejilla de piso en acero inoxidable cuadrada de 10cm salida a tubería 2"	UND	24,00	48.380	1.161.120		-	
2.2.8	Suministro e instalación de tubería de conexión de desagües de aires acondicionados	ML	36,00	20.194	726.984		-	
				Sub Total	**16.107.192**		**-**	**0,00%**
		TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**20.639.129**		**-**	**0,00%**
3	**RED ELECTRICA**							
3.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**							
3.1.1	S.I.P. Salida toma doble GFCI 1F/20AMP en tubería PVC SCH40 1/2", caja galvanizada y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	16,00	171.144	2.738.304		-	
3.1.2	S.I.P. Salida sensor de movimiento tipo interruptor 360° 1F/15AMP En muro, Tubería PVC SCH40 D:1/2", Cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	32,00	138.700	4.438.400		-	

3.1.3	S.I.P Luminaria de sobreponer 400x120 para uso interior, fabricada en lámina de acero COLD ROLLED, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate y difusor lamina acrílico opalizado L11. Producto para instalación de sobreponer, en temperatura de color 5000K flujo lumínico de 4400Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 28.56W	UND	4,00	424.118	1.696.472		-	
3.1.4	S.I.P. Luminaria tipo bala 72x83 para incrustar, Producto tipo DOWNLIGHT de uso interior fabricado en aluminio inyectado, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate en temperatura de color 6500K flujo lumínico de 550Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 6.00W	UND	40,00	65.207	2.608.280		-	
3.1.5	S.I.P Luminaria tipo bala GS 15W 5000K	Und	12,00	144.940	1.739.280		-	
3.1.6	S.I.P Letrero lumínico de emergencia SALIDA 90E 300X185X45 2.6W 120-277V SOBREPONER	UND	20,00	107.422	2.148.440		-	
3.1.7	S.I.P Luminaria de emergencia 185X50X108 SOBREPONER 2-BL 2W	UND	40,00	112.486	4.499.440		-	
3.1.8	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP en techo, Tubería D:1/2" SCH40, Caja octogonal y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	66,00	123.004	8.118.264		-	
3.1.9	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP emergencia, Tubería D:1/2 EMT, Caja RADWELL 5800 y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, incluye fijación, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	45,00	178.147	8.016.615		-	
3.1.10	S.I.A. Tablero de circuitos para baños, incluye 6 protecciones de 20A	UND	4,00	826.632	3.306.528		-	
				Sub Total	**39.310.023**		**-**	**0,00%**
		TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS			**39.310.023**		**-**	**0,00%**
4	**MUROS**							
4.1	Suministro e instalación de muro doble cara en lámina de fibrocemento 8mm. Estructura base 6. incluye estuco y dos manos de pintura	M2	84,00	171.543	14.409.612		-	
4.2	Carteras en lámina de fibrocemento 8mm dos caras, en marco ventana y puertas	ML	163,80	68.788	11.267.474		-	
				Sub Total	**25.677.086**		**-**	**0,00%**
		TOTAL MAMPOSTERIA			**25.677.086**		**-**	**0,00%**
5	**REPELLOS**							
5.1	Repello de piso y pared con mortero 1:4 espesor 2cm. Incluye aditivo impermeabilizante.	M2	1374,872	44.402	61.047.067		-	
5.2	Impermeabilización de losa de entrepiso y muros laterales de terraza, con recubrimiento impermeabilizante acrílico de alto desempeño con tecnología DFX y fibras para impermeabilizar cubiertas	M2	660,00	51.240	33.818.400		-	
				Sub Total	**94.865.467**		**-**	**0,00%**
		TOTAL REPELLOS			**94.865.467**		**-**	**0,00%**
6	**ENCHAPES**							
6.1	**PISOS**							
6.1.1	Enchape cerámica de piso estructurado 20.6x92.6cm, uso comercial moderado	M2	258,00	132.605	34.212.090		-	
6.1.2	Enchape cerámica de piso 60x60cm color gris, uso exteriores tráfico comercial	M2	88,00	100.281	8.824.728		-	
6.1.3	Acabado para uniones entre muro y losa de piso en media caña con mortero 1-4 H: 0,07m	ML	85,00	27.327	2.322.795		-	
				Sub Total	**45.359.613**		**-**	
6.2	**PARED**							
6.2.1	Enchape cerámica de pared color marfil caras diferenciadas 30.1x75.3cm	M2	457,00	113.777	51.996.089		-	
6.2.2	Guarda canto flecha 8 milímetros cromo aluminio mate	ML	31,00	12.988	402.628		-	
6.2.3	Suministro e instalación de espejo E= 3mm flotante biselado en sus cuatro lados sobre soporte metálico	M2	20,00	361.837	7.236.740		-	
6.2.4	Mesón en granito artificial verde uva tuba incluye solapa inferior en aglomerado ancho 50cm con melamina, ancho de mesón 0.60m	ML	17,00	1.146.712	19.494.104		-	
				Sub Total	**79.129.561**		**-**	**0,00%**
		TOTAL ENCHAPES			**124.489.174**		**-**	**0,00%**
7	**ESTUCOS**							
7.1	Estuco acrílico para exteriores, incluye juntas, filos y dilataciones	M2	320,00	21.750	6.960.000		-	
7.2	Estuco plástico para muros y resanes incluye juntas, filos y dilataciones	M2	973,00	16.641	16.191.693		-	
				Sub Total	**23.151.693**		**-**	**0,00%**
		TOTAL ESTUCOS			**23.151.693**		**-**	**0,00%**
8	**PINTURA**							
8.1	Pintura de muros en mampostería 3 manos, vinilo tipo 1, lavable	M2	5137,00	12.785	65.676.545		-	
8.2	Pintura para exteriores (3 manos) para paredes.	M2	1280,00	27.659	35.403.520		-	
8.3	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial ancho 10cm, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, para pavimento rígido	ML	173,52	14.418	2.501.811		-	
8.4	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial, números con circunferencias de 66 y 40cm para carros y motos. imprimación en negro y pintura tráfico vehicular, incluye micro esferas, para pavimento rígido	UND	42,00	30.758	1.291.836		-	
8.5	Aplicación de pintura en frio base solvente para flechas de ingreso y salida, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, sobre pavimento rígido	M2	27,00	59.594	1.609.038		-	
				Sub Total	**106.482.750**		**-**	**0,00%**
		TOTAL PINTURA			**106.482.750**		**-**	**0,00%**
9	**CARPINTERIAS**							
9.1	Suministro e instalación de puerta de dos hojas batientes elaborada en tubular aluminio estriado ANOLOC, incluye chapa pomo de alcoba metálica pasador y argolla para candado. Medidas de cada hoja 0.9mx2.10m (ver plano A-022. P-T3)	UND	1,00	2.374.136	2.374.136		-	
9.2	Sellado de juntas entre muros y marcos de ventanería con sellador de juntas de poliuretano.	ML	367,00	11.048	4.054.616		-	

				Sub Total	**6.428.752**		**-**	**0,00%**
		TOTAL CARPINTERIAS			**6.428.752**		**-**	**0,00%**
10	**CUBIERTAS Y CIELO RASO**							
10.2	Limpieza, lavado, cambio de amarras y ganchos, aplicación de sellante en amarras de policarbonato alveolar	M2	33,00	32.738	1.080.354		-	
10.3	Suministro e instalación de cielo raso desmontable, láminas de fibra mineral 0,60m x 0,60m, incluye estructura	M2	220,00	89.265	19.638.300		-	
				Sub Total	**20.718.654**		**-**	**0,00%**
		TOTAL CUBIERTAS Y CIELO RASO			**20.718.654**		**-**	**0,00%**
11	**APARATOS SANITARIOS Y DOTACION BAÑOS**							
11.1	Kit Taza sanitaria entrada superior con fluxómetro con sensor, blanco institucional (Incluye Taza Sanitaria para Fluxómetro, asiento sanitario, sensor, sistema conexión entrada superior)	UND	4	3.778.631	15.114.524		-	
11.2	Taza sanitaria alongado, blanco institucional ultra ahorradora (Sanitario con push)	UND	28	1.228.494	34.397.832		-	
11.3	Barra de seguridad Fija Recta en acero inoxidable (baño para personas con movilidad reducida), incluye anclajes	UND	4	463.827	1.855.308		-	
11.4	Barra de seguridad abatible (baño para personas con movilidad reducida) incluye anclajes	UND	4	641.649	2.566.596		-	
11.5	Lavamanos blanco institucional, para personas con movilidad reducida, incluye anclajes	UND	4	553.338	2.213.352		-	
11.6	Lavamanos blanco institucional, para incrustar en mesones	UND	20	328.045	6.560.900		-	
11.7	Suministro e instalación de brazo de soporte para lavamanos	JUEGO	4	288.360	1.153.440		-	
11.8	Suministro e instalación de grifería para lavamanos y desagüe tipo botella sencillo incluye acople	UND	24	62.127	1.491.048		-	
11.9	Construcción lava traperos 70x50x50cm, enchapado.	UND	4	622.329	2.489.316		-	
11.10	Kit Orinal arrecife o similar para fluxómetro	UND	8	1.284.163	10.273.304		-	
11.11	Dispensador De Papel Higiénico Acero Inoxidable Diámetro De 26 Cm	UND	16	157.457	2.519.312		-	
11.12	Papelera metálica en acero inoxidable según especificaciones	UND	32	530.403	16.972.896		-	
11.13	Dispensador de jabón para empotrar en pared, en acero inoxidable, 1.2Litros	UND	16	253.414	4.054.624		-	
11.14	Suministro e instalación de divisiones sanitarias a piso en acero inoxidable AISI SAE 304 para baños de uso institucional. Batería completa con tres (3) cubículos para unidades sanitarias. Incluye tornillería y accesorios.	UND	8,00	8.420.295	67.362.360		-	
11.15	Dispensador De Toallas De Papel En Z Acero Inoxidable De 27x27x10 Cm	UND	16,00	186.293	2.980.688		-	
				Sub Total	**172.005.500**		**-**	**0,00%**
		TOTAL APARATOS SANITARIOS			**172.005.500**		**-**	**0,00%**
12	**SEÑALIZACIÓN**							
12.1	Suministro e instalación de placa de señalización de 0,65 x 0,50 m con planimetría salidas de emergencia, en acrílico de 2.4 con impresión full color y regletas en MDF para su instalación	UND	5,00	229.178	1.145.890		-	
12.2	Suministro e instalación Franjas Guías longitudinales de ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	600,00	10.725	6.435.000		-	
12.3	Suministro e instalación de Punto alerta ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	2100,00	5.658	11.881.800		-	
12.4	Suministro e Instalación de Loseta alerta en policarbonato, 20 x 20 cm., Altura total: 5mm, Peso 150 gr, incluye anclaje	UND	15,00	43.268	649.020		-	
12.5	Suministro e instalación de letreros luminosos informativos en parqueadero doble cara, ubicado en sótano 1.50x0.40m	UND	3,00	576.720	1.730.160		-	
12.6	Suministro e instalación de letras en acero inoxidable de la frase: PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA y Escudo de la Rama judicial diámetro 50cm, tamaño de letra 30cm cada una, según diseño	UND	1,00	5.767.200	5.767.200		-	
				Sub Total	**27.609.070**		**-**	**0,00%**
		TOTAL SEÑALIZACIÓN			**27.609.070**		**-**	**0,00%**
13	**VARIOS Y ASEO GENERAL**							
13.1	Brigada de aseo	PERSONA/ MES	6,00	2.304.481	13.826.886		-	
				Sub Total	**13.826.886**		**-**	**0,00%**
		TOTAL VARIOS Y ASEO			**13.826.886**		**-**	**0,00%**
				TOTAL COSTO DIRECTO:	748.356.821		11.160.755	**1,49%**
				ADMINISTRACIÓN (18.73%)	140.167.233		2.090.409	
				IMPREVISTOS (3%)	22.450.705		334.823	
				UTILIDAD (5%)	37.417.841		558.038	
				IVA (19%)	7.109.390		106.027	
				TOTAL PRESUPUESTO:	**955.501.990**		**14.250.052**	**1,49%**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO
INFORME SEMANAL DE OBRA N° 3

I. INFORMACIÓN GENERAL

N° CONTRATO Y FECHA: CO1.PCCNTR.6947019 del 29 de octubre de 2024 — TRAMO (S): N.A. — FECHA: 25/11/2024

ENTIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO — SEMANA No.: 1 del 25/11/2024 al 1/12/2024

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. DIANA VIVANCO — ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO

OBJETO: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO" — FECHA DE INICIO: 14/11/2024

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA
INTEGRANTES: REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO MANRIQUE

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.6947019 del 29 de octubre de 2024 — VALOR INICIAL: $ 955.501.990,00
PLAZO INICIAL: 60 dias — ADICIONES: $ 0,00
PLAZO ACUMULADO: — VALOR ACUMULADO: $ 955.501.990,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
INTEGRANTES:

CONTRATO No.: O1.PCCNTR.6973355 — VALOR INICIAL: $ 33.336.660,00
PLAZO INICIAL: 45 cuarenta y cinco días — ADICIONES: $ 0,00
PLAZO ACUMULADO: — VALOR ACUMULADO: $ 33.336.660,00

II. AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS OBRA:

ESTUDIOS Y DISEÑOS:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ -
OBRA:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:
TOTAL OBRA + EST Y DISEÑOS:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:


INTERVENTORÍA:
COSTOS EJECUTADOS ACUMULADOS:
COSTOS PROGRAMADOS ACUMULADOS:

ESTUDIOS Y DISEÑOS SEMANAL:
PROGRAMADA: $ -
EJECUTADA: $ -
OBRA SEMANAL:
PROGRAMADA: $ 0,00
EJECUTADA: $ 0,00
TOTAL OBRA + E Y D SEMANAL:
PROGRAMADA: $ 0,00
EJECUTADA: $ 0,00

III. AVANCE FÍSICO

EJECUTADO ACUMULADO PROYECTO

DESCRIPCIÓN	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	TOTAL
Iniciales			10,04%											10,04%
Desmonte y Retiros			20,42%											20,42%
Demoliciones			13,12%											13,12%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
AVANCE OBRA COSTOS DIRECTOS														0,00%
AVANCE OBRA TOTAL														0,00%

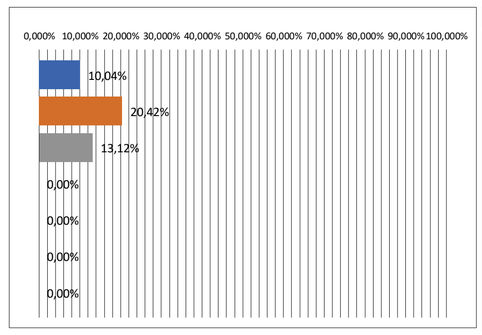

MAQUINARIA Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	MES 1	TOTAL
HERRAMIENTA MENOR		
TALADRO PERCUTOR		

S 1 — S 2 — S 3: $ 14.250.052,00 — S 4 — S 5 — S 6

S 7 — S 8 — S 9 — S 10 — S 11 — S 12 — S 13

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

BOTADEROS	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONE: La escombrera Palermo, se encuentra ubicada en la verada Caliyaco, ubicada en zona rural del municiipio de Mocoa Putumayo, Gestor de disposición final de RCD, autorizado mediante resolución 00003 de 08/07/2019 código de Inscripción DPT-3389-25-07-2019 / km 1:200 Vía a Villagarzón.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 15
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0,0
SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 0,0

OBSERVACIONES: El personal mano de obra no calificada es en su totalidad es de la vereda brisas del Mocoa. La selección de las hojas de vida se realizo de la documentación entregada por la JAC quienes realizaron la convocatoria y certificaron que las persona sean del sector.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ADMINISTRATIVAS, LEGALES, FINANCIERAS

FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA E INTERVENTORIA, AFILIACION DEL PERSONAL A LAS ENTIDADES ASEGURADORAS Y DE SALUD.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO
INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N° 3

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO" — TRAMO (S): N.A. — FECHA: 25/11/2024

SECRETARIA EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO — RAMA JUDICIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 3 del 25/11/2024 al 1/12/2024

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

TÉCNICAS

Se realiza afiliaciones del personal a laborar, ademas se entrega dotación.

Se inician actividades de demolición de enchapes, mesones, pisos y demas elementos a remover en baños y baterias sanitarias en piso 1 y 2.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

AMBIENTAL Y SST

El componente de seguridad y salud en el trabajo realizo el seguimiento punto a punto del plan de manejo básico de seguridad y salud en el trabajo en el cual se encontró lo siguiente :

Se realizan charlas preoperacionales, entrega en epps, demarcación de zonas con cinta peligro.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con demoliciones de concretos, enchapes y demas materiales.

Continuar con demoliciones de concretos, enchapes y demas materiales.

NOTA:

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES

Se firma acta de inicio el 14 de noviembre de 2024.

Fecha de terminación inicial 13 de enero de 2025

OBSERVACIONES:	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
S	FIRMA:	FIRMA:
	NOMBRE: MARLON FERNANDO ARTEAGA POTOSI	NOMBRE: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
	N° MAT: 52202-333602 NRÑ	No. MAT: 63202094726 QND

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO
INFORME SEMANAL DE OBRA N° 4

PÁGINA	1	DE	1

SECRETARIA EJECUTORA: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO — FECHA: 8 / 12 / 2024

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.6947019

Semana Número: 4 Del: 2/12/2024 Al: 8/12/2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 25 Días — Corresponde al : 41,67% del Plazo total del Contrato

Supervisor Técnico de Contrato: ING. DIANA VIVANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO"

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,19%	8,16%
Valor básico de la Obra programada:	$ 30.497.296	$ 77.993.910

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,73%	3,22%
Valor básico de Obra Ejecutada:	$ 16.506.584	$ 30.756.741

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.
Contrato No.	CO1.PCCNTR.6947019
Valor Inicial:	$ 955.501.990,00
Plazo Inicial:	2 MESES
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	14 de noviembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
Contrato No.	O1.PCCNTR.6973355 DEL 01/11/2024
Valor Actualizado:	$ 33.336.660,00
Plazo Inicial:	45 cuarenta y cinco dias calendario
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	14 de noviembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Continuar con demoliciones de concretos, enchapes y demas materiales.
Realizar retiro de escombros
Iniciar con resane de paredes en piso 1, en todas las áreas internas.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con demoliciones de concretos, enchapes y demas materiales.
Realizar retiro de escombros
Continuar con resane de paredes en piso 1, en todas las áreas internas.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se firma acta de inicio el 14 de noviembre de 2024.
Fecha de terminación inicial 13 de enero de 2025

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO	Firma: Nombre: MARLON FERNANDO ARTEAGA P. Matrícula 52202-339602 NRÑ	Firma: Nombre: Matrícula



Fotografía: 1

Continuar con demoliciones de concretos, enchapes y demas materiales.



Fotografía: 2

Continuar con demoliciones de concretos, enchapes y demas materiales.



Fotografía: 3

Realizar retiro de escombros



Fotografía: 4

Iniciar con resane de paredes en piso 1, en todas las áreas internas.

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No.	CO1.PCCNTR.6947019
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.
INTERVENTOR:	ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO

OBJETO "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO"

PRESUPUESTO DE OBRA

						SEMANA 4		ACUMULADO		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR TOTAL**	**% EJECUTADO SEMANA 4**
1	**PRELIMINARES**									
1.1	**INICIALES**									
1.1.1	Localización y replanteo arquitectónico, incluye planos récord	M2	332,00	3.864	1.282.848	43,98	169.939	87,96	339.877	13,25%
1.1.2	Instalación y desinstalación de muro una cara drywall, provisional para cerrar las obras, incluye puerta con marco para ingreso de trabajadores	M2	53,00	77.249	4.094.197	5,50	424.870	11,00	849.739	10,38%
1.1.3	Señalización de obra en lona de 60x40cm impresión full color, incluye marco y anclaje	UND	9,00	60.693	546.237					
				Sub Total	**5.923.282**		**594.809**		**1.189.616**	**10,04%**
1.2	**DESMONTES Y RETIROS**									
1.2.1	Desmonte de marcos y puertas, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	57,00	26.406	1.505.142	12,00	316.872	24,00	633.744	21,05%
1.2.2	Desmonte de marco, ventana y vidrio, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	1,00	27.367	27.367					
1.2.3	Desmonte de cielo raso en fibra mineral y/o panel yeso y/o fibrocemento, incluye estructura soporte, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	M2	250,00	29.781	7.445.250	43,99	1.310.066	87,98	2.620.132	17,60%
1.2.4	Desmonte de Tasas sanitarias, orinales y lavamanos, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	UND	48,00	53.587	2.572.176	18,00	964.566	36,00	1.929.132	37,50%
1.2.5	Desmonte de instalaciones hidrosanitarias, incluye tuberías y accesorios, regatas y sellos provisionales, cargue a volqueta	UND	72,00	57.730	4.156.560	18,00	1.039.140	36,00	2.078.280	25,00%
1.2.6	Rasqueteo, cepillo y limpieza manual de superficies, con el fin de retirar impurezas y capas de pintura existentes.	M2	1017,00	4.863	4.945.671					
1.2.7	Retiro de luminarias ubicadas en cielos rasos y pared, incluye trasiego a punto de acopio	UND	46,00	21.660	996.360	17,00	368.220	23,00	498.180	36,96%
1.2.8	Retiro de redes eléctricas en piso, techo y pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	GL	1,00	2.233.550	2.233.550		-	0,50	1.116.775	
				Sub Total	**23.882.076**		**3.998.864**		**8.876.243**	**16,74%**
1.3	**DEMOLICIONES**									
1.3.1	Demolición muro E ≤ 15CM en mampostería maciza o hueca, incluye cortes con pulidora, trasiegos y cargue a volqueta.	M2	220,00	17.941	3.947.020	25,87	464.134	51,74	928.267	11,76%
1.3.2	Demolición de enchape de pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	704,40	14.760	10.396.413	116,81	1.724.116	233,62	3.448.231	16,58%
1.3.3	Demolición de enchapes de piso, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	283,00	13.980	3.956.340	13,02	182.020	57,00	796.860	4,60%
1.3.4	Demolición repello de piso, incluye picado Eprom = 0.03m, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	835,00	12.959	10.820.765	43,98	569.937	87,96	1.139.874	5,27%
1.3.5	Demolición repello de pared, muros mampostería eprom= 0.02m, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	291,80	15.119	4.411.785	116,81	1.766.050	233,62	3.532.101	40,03%
1.3.6	Cargue, transporte y retiro del material sobrante proveniente de las obras de mantenimiento, hasta el botadero.	M3	234,00	40.171	9.400.014	12,00	482.052	24,00	964.104	5,13%
1.3.7	Demolición de mesones en concreto, recubierto con granito incluye salpicadero	M2	11,00	37.722	414.942	1,79	67.522	3,58	135.045	16,27%
				Sub Total	**43.347.279**		**5.255.831**		**10.944.482**	**12,12%**
		TOTAL PRELIMINARES			**73.152.637**		**9.849.504**		**21.010.341**	**13,46%**
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**									
2.1	**RED SUMINISTRO AGUA POTABLE**									
2.1.1	Instalaciones PVC 1/2" RDE 13.5	ML	95,00	7.575	719.625		-		-	
2.1.2	Instalaciones PVC 3/4" RDE 21	ML	28,00	10.939	306.292		-		-	
2.1.3	Instalaciones PVC RDE 21 1"	ML	50,21	12.038	604.428		-		-	
2.1.4	Instalaciones PVC RDE 21 2"	ML	6,00	26.949	161.694		-		-	
2.1.5	Punto hidráulico PVC 1/2"	UND	60,00	24.174	1.450.440		-		-	
2.1.6	Punto hidráulico PVC 3/4"	UND	8,00	26.324	210.592		-		-	
2.1.7	Punto hidráulico PVC 1/2" incluye válvula control paso 1/2" y tapa PVC Blanca 15x15cm	UND	18,00	59.937	1.078.866		-		-	
				Sub Total	**4.531.937**		**-**		**-**	**0,00%**
2.2	**RED SANITARIA, PLUVIAL, VENTILACION**									
2.2.1	Instalaciones sanitarias PVC 2"	ML	58,00	25.087	1.455.046		-		-	
2.2.2	Instalaciones sanitarias PVC 4"	ML	119,00	42.006	4.998.714		-		-	
2.2.3	Instalaciones ventilación PVC 2"	ML	183,00	20.194	3.695.502		-		-	
2.2.4	Instalaciones ventilación PVC 3"	ML	35,00	31.646	1.107.610		-		-	
2.2.5	Punto sanitario 4" WC	UND	32,00	45.965	1.470.880		-		-	
2.2.6	Punto sanitario 2"	UND	44,00	33.894	1.491.336		-		-	
2.2.7	Suministro e instalación de rejilla de piso en acero inoxidable cuadrada de 10cm salida a tubería 2"	UND	24,00	48.380	1.161.120		-		-	
2.2.8	Suministro e instalación de tubería de conexión de desagües de aires acondicionados	ML	36,00	20.194	726.984		-		-	
				Sub Total	**16.107.192**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**20.639.129**		**-**		**-**	**0,00%**
3	**RED ELECTRICA**									
3.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**									
3.1.1	S.I.P. Salida toma doble GFCI 1F/20AMP en tubería PVC SCH40 1/2", caja galvanizada y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	16,00	171.144	2.738.304		-		-	
3.1.2	S.I.P. Salida sensor de movimiento tipo interruptor 360° 1F/15AMP En muro, Tubería PVC SCH40 D:1/2", Cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	32,00	138.700	4.438.400		-		-	
3.1.3	S.I.P Luminaria de sobreponer 400x120 para uso interior, fabricada en lámina de acero COLD ROLLED, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate y difusor lamina acrílico opalizado L11. Producto para instalación de sobreponer, en temperatura de color 5000K flujo lumínico de 4400Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 38.5GW	UND	4,00	424.118	1.696.472		-		-	
3.1.4	S.I.P. Luminaria tipo bala 72x85 para incrustar, Producto tipo DOWNLIGHT de uso interior fabricado en aluminio inyectado, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate en temperatura de color 6500K flujo lumínico de 550Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 6.00W	UND	40,00	65.207	2.608.280		-		-	
3.1.5	S.I.P Luminaria tipo bala GS 15W 5000K	Und	12,00	144.940	1.739.280		-		-	
3.1.6	S.I.P Letrero lumínico de emergencia SALIDA 90E 300X185X45 2.6W 120-277V SOBREPONER	UND	20,00	107.422	2.148.440		-		-	
3.1.7	S.I.P Luminaria de emergencia 185X50X108 SOBREPONER 2-BL 2W	UND	40,00	112.486	4.499.440		-		-	
3.1.8	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP en techo, Tubería D:1/2" SCH40, Caja octogonal y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	66,00	123.004	8.118.264		-		-	
3.1.9	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP emergencia, Tubería D:1/2 EMT, Caja RADWELL 5800 y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, incluye fijación, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	45,00	178.147	8.016.615		-		-	
3.1.10	S.I.A. Tablero de circuitos para baños, incluye 6 protecciones de 20A	UND	4,00	826.632	3.306.528		-		-	

				Sub Total	**39.310.023**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS			**39.310.023**		**-**		**-**	**0,00%**
4	**MUROS**									
4.1	Suministro e instalación de muro doble cara en lámina de fibrocemento 8mm. Estructura base 6. incluye estuco y dos manos de pintura	M2	84,00	171.543	14.409.612		-		-	
4.2	Carteras en lámina de fibrocemento 8mm dos caras, en marco ventana y puertas	ML	163,80	68.788	11.267.474		-		-	
				Sub Total	**25.677.086**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL MAMPOSTERIA			**25.677.086**		**-**		**-**	**0,00%**
5	**REPELLOS**									
5.1	Repello de piso y pared con mortero 1:4 espesor 2cm. Incluye aditivo impermeabilizante.	M2	1374,872	44.402	61.047.067		-		-	
5.2	Impermeabilización de losa de entrepiso y muros laterales de terraza, con recubrimiento impermeabilizante acrílico de alto desempeño con tecnología DFX y fibras para impermeabilizar cubiertas	M2	660,00	51.240	33.818.400		-		-	
				Sub Total	**94.865.467**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL REPELLOS			**94.865.467**		**-**		**-**	**0,00%**
6	**ENCHAPES**									
6.1	**PISOS**									
6.1.1	Enchape cerámica de piso estructurado 20.6x92.6cm, uso comercial moderado	M2	258,00	132.605	34.212.090		-		-	
6.1.2	Enchape cerámica de piso 60x60cm color gris, uso exteriores tráfico comercial	M2	88,00	100.281	8.824.728		-		-	
6.1.3	Acabado para uniones entre muro y losa de piso en media caña con mortero 1-4 H: 0,07m	ML	85,00	27.327	2.322.795		-		-	
				Sub Total	**45.359.613**		**-**		**-**	
6.2	**PARED**									
6.2.1	Enchape cerámica de pared color marfil caras diferenciadas 30.1x75.3cm	M2	457,00	113.777	51.996.089		-		-	
6.2.2	Guarda canto flecha 8 milímetros cromo aluminio mate	ML	31,00	12.988	402.628		-		-	
6.2.3	Suministro e instalación de espejo E= 3mm flotante biselado en sus cuatro lados sobre soporte metálico	M2	20,00	361.837	7.236.740		-		-	
6.2.4	Mesón en granito artificial verde uva tuba incluye solapa inferior en aglomerado ancho 50cm con melamina, ancho de mesón 0.60m	ML	17,00	1.146.712	19.494.104		-		-	
				Sub Total	**79.129.561**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL ENCHAPES			**124.489.174**		**-**		**-**	**0,00%**
7	**ESTUCOS**									
7.1	Estuco acrílico para exteriores, incluye juntas, filos y dilataciones	M2	320,00	21.750	6.960.000		-		-	
7.2	Estuco plástico para muros y resanes incluye juntas, filos y dilataciones	M2	973,00	16.641	16.191.693	185,00	3.078.585	185,00	3.078.585	19,01%
				Sub Total	**23.151.693**		**3.078.585**		**3.078.585**	**13,30%**
		TOTAL ESTUCOS			**23.151.693**		**3.078.585**		**3.078.585**	**13,30%**
8	**PINTURA**									
8.1	Pintura de muros en mampostería 3 manos, vinilo tipo 1, lavable	M2	5137,00	12.785	65.676.545		-		-	
8.2	Pintura para exteriores (3 manos) para paredes.	M2	1280,00	27.659	35.403.520		-		-	
8.3	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial ancho 10cm, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, para pavimento rígido	ML	173,52	14.418	2.501.811		-		-	
8.4	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial, números con circunferencias de 66 y 40cm para carros y motos. imprimación en negro y pintura tráfico vehicular, incluye micro esferas, para pavimento rígido	UND	42,00	30.758	1.291.836		-		-	
8.5	Aplicación de pintura en frio base solvente para flechas de ingreso y salida, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, sobre pavimento rígido	M2	27,00	59.594	1.609.038		-		-	
				Sub Total	**106.482.750**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL PINTURA			**106.482.750**		**-**		**-**	**0,00%**
9	**CARPINTERIAS**									
9.1	Suministro e instalación de puerta de dos hojas batientes elaborada en tubular aluminio estriado ANOLOC, incluye chapa pomo de alcoba metálica pasador y argolla para candado. Medidas de cada hoja 0.9mx2.10m (ver plano A-022_P-T3)	UND	1,00	2.374.136	2.374.136		-		-	
9.2	Sellado de juntas entre muros y marcos de ventanería con sellador de juntas de poliuretano.	ML	367,00	11.048	4.054.616		-		-	
				Sub Total	**6.428.752**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL CARPINTERIAS			**6.428.752**		**-**		**-**	**0,00%**
10	**CUBIERTAS Y CIELO RASO**									
10.2	Limpieza, lavado, cambio de amarras y ganchos, aplicación de sellante en amarras de policarbonato alveolar	M2	33,00	32.738	1.080.354		-		-	
10.3	Suministro e instalación de cielo raso desmontable, láminas de fibra mineral 0,60m x 0,60m, incluye estructura	M2	220,00	89.265	19.638.300		-		-	
				Sub Total	**20.718.654**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL CUBIERTAS Y CIELO RASO			**20.718.654**		**-**		**-**	**0,00%**
11	**APARATOS SANITARIOS Y DOTACION BAÑOS**									
11.1	Kit Taza sanitaria entrada superior con fluxómetro con sensor, blanco institucional (Incluye Taza Sanitaria para Fluxómetro, asiento sanitario, sensor, sistema conexión entrada superior)	UND	4	3.778.631	15.114.524		-		-	
11.2	Taza sanitaria alongado, blanco institucional ultra ahorradora (Sanitario con push)	UND	28	1.228.494	34.397.832		-		-	
11.3	Barra de seguridad Fija Recta en acero inoxidable (baño para personas con movilidad reducida), incluye anclajes	UND	4	463.827	1.855.308		-		-	
11.4	Barra de seguridad abatible (baño para personas con movilidad reducida) incluye anclajes	UND	4	641.649	2.566.596		-		-	
11.5	Lavamanos blanco institucional, para personas con movilidad reducida, incluye anclajes	UND	4	553.338	2.213.352		-		-	
11.6	Lavamanos blanco institucional, para incrustar en mesones	UND	20	328.045	6.560.900		-		-	
11.7	Suministro e instalación de brazo de soporte para lavamanos	JUEGO	4	288.360	1.153.440		-		-	
11.8	Suministro e instalación de grifería para lavamanos y desagüe tipo botella sencillo incluye acople	UND	24	62.127	1.491.048		-		-	
11.9	Construcción lava traperos 70x50x50cm, enchapado.	UND	4	622.329	2.489.316		-		-	
11.10	Kit Orinal arrecife o similar para fluxómetro	UND	8	1.284.163	10.273.304		-		-	
11.11	Dispensador De Papel Higiénico Acero Inoxidable Diámetro De 26 Cm	UND	16	157.457	2.519.312		-		-	
11.12	Papelera metálica en acero inoxidable según especificaciones	UND	32	530.403	16.972.896		-		-	
11.13	Dispensador de jabón para empotrar en pared, en acero inoxidable, 1.2Litros	UND	16	253.414	4.054.624		-		-	
11.14	Suministro e instalación de divisiones sanitarias a piso en acero inoxidable AISI SAE 304 para baños de uso institucional. Batería completa con tres (3) cubículos para unidades sanitarias. Incluye tornillería y accesorios.	UND	8,00	8.420.295	67.362.360		-		-	
11.15	Dispensador De Toallas De Papel En Z Acero Inoxidable De 27x27x10 Cm	UND	16,00	186.293	2.980.688		-		-	
				Sub Total	**172.005.500**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL APARATOS SANITARIOS			**172.005.500**		**-**		**-**	**0,00%**
12	**SEÑALIZACIÓN**									
12.1	Suministro e instalación de placa de señalización de 0,65 x 0,50 m con planimetría salidas de emergencia, en acrílico de 2.4 con impresión full color y regletas en MDF para su instalación	UND	5,00	229.178	1.145.890		-		-	

12.2	Suministro e instalación Franjas Guías longitudinales de ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	600,00	10.725	6.435.000		-		-	
12.3	Suministro e instalación de Punto alerta ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	2100,00	5.658	11.881.800		-		-	
12.4	Suministro e Instalación de Loseta alerta en policarbonato, 20 x 20 cm., Altura total: 5mm, Peso 150 gr, incluye anclaje	UND	15,00	43.268	649.020		-		-	
12.5	Suministro e instalación de letreros luminosos informativos en parqueadero doble cara, ubicado en sótano 1.50x0.40m	UND	3,00	576.720	1.730.160		-		-	
12.6	Suministro e instalación de letras en acero inoxidable de la frase: PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA y Escudo de la Rama judicial diámetro 50cm, tamaño de letra 30cm cada una, según diseño	UND	1,00	5.767.200	5.767.200		-		-	
				Sub Total	**27.609.070**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL SEÑALIZACIÓN			**27.609.070**		**-**		**-**	**0,00%**
13	**VARIOS Y ASEO GENERAL**									
13.1	Brigada de aseo	PERSONA/ MES	6,00	2.304.481	13.826.886		-		-	
				Sub Total	**13.826.886**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL VARIOS Y ASEO			**13.826.886**		**-**		**-**	**0,00%**
				TOTAL COSTO DIRECTO:	748.356.821		12.928.089		24.088.926	**1,73%**
				ADMINISTRACIÓN (18.73%)	140.167.233		2.421.431		4.511.856	
				IMPREVISTOS (3%)	22.450.705		387.843		722.668	
				UTILIDAD (5%)	37.417.841		646.404		1.204.446	
				IVA (19%)	7.109.390		122.817		228.845	
				TOTAL PRESUPUESTO:	**955.501.990**		**16.506.584**		**30.756.741**	**1,73%**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO
INFORME SEMANAL DE OBRA N° 4

I. INFORMACIÓN GENERAL

N° CONTRATO Y FECHA: CO1.PCCNTR.6947019 del 29 de octubre de 2024 | TRAMO (S): N.A. | FECHA: 8/12/2024

ENTIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO | SEMANA No.: 4 del 2/12/2024 al 8/12/2024

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. DIANA VIVANCO | ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO

OBJETO: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO" | FECHA DE INICIO: 14/11/2024

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA
INTEGRANTES: REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO MANRIQUE

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.6947019 del 29 de octubre de 2024 | VALOR INICIAL: $ 955.501.990,00
PLAZO INICIAL: 60 dias | ADICIONES: $ 0,00
PLAZO ACUMULADO: | VALOR ACUMULADO: $ 955.501.990,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
INTEGRANTES:

CONTRATO No.: O1.PCCNTR.6973355 | VALOR INICIAL: $ 33.336.660,00
PLAZO INICIAL: 45 cuarenta y cinco días | ADICIONES: $ 0,00
PLAZO ACUMULADO: | VALOR ACUMULADO: $ 33.336.660,00

II. AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS OBRA:

ESTUDIOS Y DISEÑOS:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ -
OBRA:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 0,00
TOTAL OBRA + EST Y DISEÑOS:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 0,00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 0,00


INTERVENTORÍA:
COSTOS EJECUTADOS ACUMULADOS:
COSTOS PROGRAMADOS ACUMULADOS:

ESTUDIOS Y DISEÑOS SEMANAL:
PROGRAMADA: $ -
EJECUTADA: $ -
OBRA SEMANAL:
PROGRAMADA: $ 0,00
EJECUTADA: $ 0,00
TOTAL OBRA + E Y D SEMANAL:
PROGRAMADA: $ 0,00
EJECUTADA: $ 0,00

III. AVANCE FÍSICO

EJECUTADO ACUMULADO PROYECTO

DESCRIPCIÓN	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	TOTAL
Iniciales			10,04%	10,04%										20,08%
Desmonte y Retiros			20,42%	16,74%										37,16%
Demoliciones			13,12%	12,12%										25,24%
Estucos				13,30%										13,30%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
AVANCE OBRA COSTOS DIRECTOS														0,00%
AVANCE OBRA TOTAL														0,00%

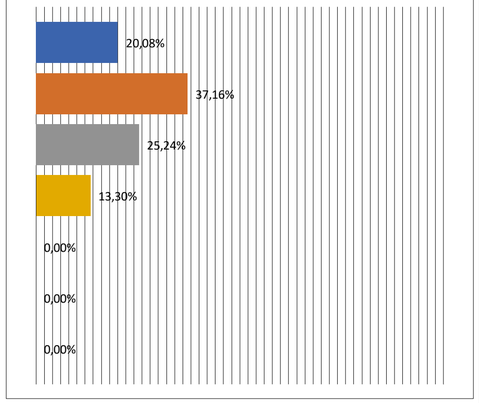

MAQUINARIA Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	MES 1	TOTAL
HERRAMIENTA MENOR		
TALADRO PERCUTOR		

S 1: | S 2: | S 3: $ 14.250.052,00 | S 4: $ 16.506.584,00 | S 5: | S 6:
S 7: | S 8: | S 9: | S 10: | S 11: | S 12: | S 13:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI NO | LICENCIA AMBIENTAL: SI NO
UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI NO | LICENCIA AMBIENTAL: SI NO
UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI NO | LICENCIA AMBIENTAL: SI NO
UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI NO | LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

BOTADEROS	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONE: La escombrera Palermo, se encuentra ubicada en la verada Caliyaco, ubicada en zona rural del municiipio de Mocoa Putumayo, Gestor de disposición final de RCD, autorizado mediante resolución 00003 de 08/07/2019 código de Inscripción DPT-3389-25-07-2019 / km 1:200 Vía a Villagarzón.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 15
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0,0
SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 0,0

OBSERVACIONES: El personal mano de obra no calificada es en su totalidad es de la vereda brisas del Mocoa. La selección de las hojas de vida se realizo de la documentación entregada por la JAC quienes realizaron la convocatoria y certificaron que las persona sean del sector.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ADMINISTRATIVAS, LEGALES, FINANCIERAS

FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA E INTERVENTORIA, AFILIACION DEL PERSONAL A LAS ENTIDADES ASEGURADORAS Y DE SALUD.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO
INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N° 4

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO" | TRAMO (S): N.A. | FECHA: 8/12/2024

SECRETARIA EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO | RAMA JUDICIAL: PUTUMAYO | SEMANA No.: 4 del 2/12/2024 al 8/12/2024

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

TÉCNICAS

Continuar con demoliciones de concretos, enchapes y demas materiales.

Se inicia resanes de paredes

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

AMBIENTAL Y SST

El componente de seguridad y salud en el trabajo realizo el seguimiento punto a punto del plan de manejo básico de seguridad y salud en el trabajo en el cual se encontró lo siguiente :

Se realizan charlas preoperacionales, entrega en epps, demarcación de zonas con cinta peligro.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con demoliciones de concretos, enchapes y demas materiales.

Iniciar con resane de paredes en piso 1, en todas las áreas internas.

NOTA:

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES

Se firma acta de inicio el 14 de noviembre de 2024.

Fecha de terminación inicial 13 de enero de 2025

OBSERVACIONES:	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA:	FIRMA:
	NOMBRE: MARLON FERNANDO ARTEAGA POTOSI	NOMBRE: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
	N° MAT: 52202-333602 NRÑ	No. MAT: 63202094726 QND

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

INFORME SEMANAL DE OBRA N° 5

PÁGINA	1	DE	1

SECRETARIA EJECUTORA: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO

FECHA: 15 / 12 / 2024

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.6947019

Semana Número: 5 Del: 9/12/2024 Al: 15/12/2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 32 Días Corresponde al : 53,33% del Plazo total del Contrato

Supervisor Técnico de Contrato ING. DIANA VIVANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO"

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	13,19%	21,35%
Valor básico de la Obra programada:	$ 125.983.247	$ 203.977.157

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,35%	4,57%
Valor básico de Obra Ejecutada:	$ 12.860.904	$ 43.617.644

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.

Contrato No.	CO1.PCCNTR.6947019
Valor Inicial:	$ 955.501.990,00
Plazo Inicial:	2 MESES
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	14 de noviembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

Contrato No.	O1.PCCNTR.6973355 DEL 01/11/2024
Valor Actualizado:	$ 33.336.660,00
Plazo Inicial:	45 cuarenta y cinco dias calendario
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	14 de noviembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Continuar con demoliciones de concretos, enchapes y demas materiales.
Realizar retiro de escombros
Iniciar con resane de paredes en piso 1, en todas las áreas internas.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con demoliciones de concretos, enchapes y demas materiales.
Realizar retiro de escombros
Continuar con resane de paredes en piso 1, en todas las áreas internas.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se firma acta de inicio el 14 de noviembre de 2024.
Se inicia con la verificación de cantidades en campo
Se inician actividades de demolición y desmonte en unidades sanitarias de piso 1 y piso 2.

OBSERVACIONES

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO

DIRECTOR DE OBRA

Firma:
Nombre: MARLON FERNANDO ARTEAGA P.
Matrícula 52202-339602 NRÑ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
Matrícula 63202094726 QND



Fotografía: 1

Continuar con demoliciones de concretos, enchapes y demas materiales.



Fotografía: 2

Continuar con demoliciones de concretos, enchapes y demas materiales.



Fotografía: 3

Realizar retiro de escombros



Fotografía: 4

Iniciar con resane de paredes en piso 1, en todas las áreas internas.

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO		
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**CONTRATO DE OBRA No.**	CO1.PCCNTR.6947019
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.
	INTERVENTOR:	ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO

OBJETO "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO"

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	SEMANA 5		ACUMULADO		% EJECUTADO SEMANA 5
						CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	
1	**PRELIMINARES**									
1.1	**INICIALES**									
1.1.1	Localización y replanteo arquitectónico, incluye planos récord	M2	332,00	3.864	1.282.848	43,98	169.939	131,94	509.816	13,25%
1.1.2	Instalación y desinstalación de muro una cara drywall, provisional para cerrar las obras, incluye puerta con marco para ingreso de trabajadores	M2	53,00	77.249	4.094.197	5,50	424.870	16,50	1.274.609	10,38%
1.1.3	Señalización de obra en lona de 60x40cm impresión full color, incluye marco y anclaje	UND	9,00	60.693	546.237		-			
				Sub Total	**5.923.282**		**594.809**		**1.784.425**	**10,04%**
1.2	**DESMONTES Y RETIROS**									
1.2.1	Desmonte de marcos y puertas, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	57,00	26.406	1.505.142	12,00	316.872	36,00	950.616	21,05%
1.2.2	Desmonte de marco, ventana y vidrio, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	1,00	27.367	27.367		-			
1.2.3	Desmonte de cielo raso en fibra mineral y/o panel yeso y/o fibrocemento, incluye estructura soporte, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	M2	250,00	29.781	7.445.250	43,99	1.310.066	131,97	3.930.199	17,60%
1.2.4	Desmonte de Tasas sanitarias, orinales y lavamanos, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	UND	48,00	53.587	2.572.176	12,00	643.044	48,00	2.572.176	25,00%
1.2.5	Desmonte de instalaciones hidrosanitarias, incluye tuberías y accesorios, regatas y sellos provisionales, cargue a volqueta	UND	72,00	57.730	4.156.560	7,00	404.110	43,00	2.482.390	9,72%
1.2.6	Rasqueteo, cepillo y limpieza manual de superficies, con el fin de retirar impurezas y capas de pintura existentes.	M2	1017,00	4.863	4.945.671		-			
1.2.7	Retiro de luminarias ubicadas en cielos rasos y pared, incluye trasiego a punto de acopio	UND	46,00	21.660	996.360	17,00	368.220	40,00	866.400	36,96%
1.2.8	Retiro de redes eléctricas en piso, techo y pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	GL	1,00	2.233.550	2.233.550		-	0,50	1.116.775	
				Sub Total	**23.882.076**		**3.042.312**		**11.918.556**	**12,74%**
1.3	**DEMOLICIONES**									
1.3.1	Demolición muro E ≤ 15CM en mampostería maciza o hueca, incluye cortes con pulidora, trasiegos y cargue a volqueta.	M2	220,00	17.941	3.947.020	30,50	547.201	82,24	1.475.468	13,86%
1.3.2	Demolición de enchape de pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	704,40	14.760	10.396.413	85,50	1.261.980	319,12	4.710.211	12,14%
1.3.3	Demolición de enchapes de piso, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	283,00	13.980	3.956.340	-	-	57,00	796.860	
1.3.4	Demolición repello de piso, incluye picado Eprom = 0.03m, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	835,00	12.959	10.820.765	52,50	680.348	140,46	1.820.221	6,29%
1.3.5	Demolición repello de pared, muros mampostería eprom= 0.02m, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	291,80	15.119	4.411.785	57,38	867.528	291,00	4.399.629	19,66%
1.3.6	Cargue, transporte y retiro del material sobrante proveniente de las obras de mantenimiento, hasta el botadero.	M3	234,00	40.171	9.400.014		-	24,00	964.104	
1.3.7	Demolición de mesones en concreto, recubierto con granito incluye salpicadero	M2	11,00	37.722	414.942		-	3,58	135.045	
				Sub Total	**43.347.279**		**3.357.057**		**14.301.538**	**7,74%**
		TOTAL PRELIMINARES			**73.152.637**		**6.994.178**		**28.004.519**	**9,56%**
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**									
2.1	**RED SUMINISTRO AGUA POTABLE**									
2.1.1	Instalaciones PVC 1/2" RDE 13.5	ML	95,00	7.575	719.625		-		-	
2.1.2	Instalaciones PVC 3/4" RDE 21	ML	28,00	10.939	306.292		-		-	
2.1.3	Instalaciones PVC RDE 21 1"	ML	50,21	12.038	604.428		-		-	
2.1.4	Instalaciones PVC RDE 21 2"	ML	6,00	26.949	161.694		-		-	
2.1.5	Punto hidráulico PVC 1/2"	UND	60,00	24.174	1.450.440		-		-	
2.1.6	Punto hidráulico PVC 3/4"	UND	8,00	26.324	210.592		-		-	
2.1.7	Punto hidráulico PVC 1/2" incluye válvula control paso 1/2" y tapa PVC Blanca 15x15cm	UND	18,00	59.937	1.078.866		-		-	
				Sub Total	**4.531.937**		**-**		**-**	**0%**
2.2	**RED SANITARIA, PLUVIAL, VENTILACION**									
2.2.1	Instalaciones sanitarias PVC 2"	ML	58,00	25.087	1.455.046		-		-	
2.2.2	Instalaciones sanitarias PVC 4"	ML	119,00	42.006	4.998.714		-		-	
2.2.3	Instalaciones ventilación PVC 2"	ML	183,00	20.194	3.695.502		-		-	
2.2.4	Instalaciones ventilación PVC 3"	ML	35,00	31.646	1.107.610		-		-	
2.2.5	Punto sanitario 4" WC	UND	32,00	45.965	1.470.880		-		-	
2.2.6	Punto sanitario 2"	UND	44,00	33.894	1.491.336		-		-	
2.2.7	Suministro e instalación de rejilla de piso en acero inoxidable cuadrada de 10cm salida a tubería 2"	UND	24,00	48.380	1.161.120		-		-	
2.2.8	Suministro e instalación de tubería de conexión de desagües de aires acondicionados	ML	36,00	20.194	726.984		-		-	
				Sub Total	**16.107.192**		**-**		**-**	**0%**
		TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**20.639.129**		**-**		**-**	**0%**
3	**RED ELECTRICA**									
3.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**									
3.1.1	S.I.P. Salida toma doble GFCI 1F/20AMP en tubería PVC SCH40 1/2", caja galvanizada y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	16,00	171.144	2.738.304		-		-	
3.1.2	S.I.P. Salida sensor de movimiento tipo interruptor 360° 1F/15AMP En muro, Tubería PVC SCH40 D:1/2", Cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	32,00	138.700	4.438.400		-		-	
3.1.3	S.I.P Luminaria de sobreponer 400x120 para uso interior, fabricada en lámina de acero COLD ROLLED, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate y difusor lamina acrílico opalizado L11. Producto para instalación de sobreponer, en temperatura de color 5000K flujo lumínico de 4400Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 28.56W	UND	4,00	424.118	1.696.472		-		-	

3.1.4	S.I.P. Luminaria tipo bala 72x83 para incrustar, Producto tipo DOWNLIGHT de uso interior fabricado en aluminio inyectado, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate en temperatura de color 6500K flujo lumínico de 550Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 6.00W	UND	40,00	65.207	2.608.280		-		-	
3.1.5	S.I.P Luminaria tipo bala GS 15W 5000K	Und	12,00	144.940	1.739.280		-		-	
3.1.6	S.I.P Letrero lumínico de emergencia SALIDA 90E 300X185X45 2.6W 120-277V SOBREPONER	UND	20,00	107.422	2.148.440		-		-	
3.1.7	S.I.P Luminaria de emergencia 185X50X108 SOBREPONER 2-BL 2W	UND	40,00	112.486	4.499.440		-		-	
3.1.8	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP en techo, Tubería D:1/2" SCH40, Caja octogonal y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	66,00	123.004	8.118.264		-		-	
3.1.9	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP emergencia, Tubería D:1/2 EMT, Caja RADWELL 5800 y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, incluye fijación, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	45,00	178.147	8.016.615		-		-	
3.1.10	S.I.A. Tablero de circuitos para baños, incluye 6 protecciones de 20A	UND	4,00	826.632	3.306.528		-		-	
				Sub Total	**39.310.023**		**-**		**-**	**0%**
		TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS			**39.310.023**		**-**		**-**	**0%**
4	**MUROS**									
4.1	Suministro e instalación de muro doble cara en lámina de fibrocemento 8mm. Estructura base 6. incluye estuco y dos manos de pintura	M2	84,00	171.543	14.409.612		-		-	
4.2	Carteras en lámina de fibrocemento 8mm dos caras, en marco ventana y puertas	ML	163,80	68.788	11.267.474		-		-	
				Sub Total	**25.677.086**		**-**		**-**	**0%**
		TOTAL MAMPOSTERIA			**25.677.086**		**-**		**-**	**0%**
5	**REPELLOS**									
5.1	Repello de piso y pared con mortero 1:4 espesor 2cm. Incluye aditivo impermeabilizante.	M2	1374,872	44.402	61.047.067		-		-	
5.2	Impermeabilización de losa de entrepiso y muros laterales de terraza, con recubrimiento impermeabilizante acrílico de alto desempeño con tecnología DFX y fibras para impermeabilizar cubiertas	M2	660,00	51.240	33.818.400		-		-	
				Sub Total	**94.865.467**		**-**		**-**	**0%**
		TOTAL REPELLOS			**94.865.467**		**-**		**-**	**0%**
6	**ENCHAPES**									
6.1	**PISOS**									
6.1.1	Enchape cerámica de piso estructurado 20.6x92.6cm, uso comercial moderado	M2	258,00	132.605	34.212.090		-		-	
6.1.2	Enchape cerámica de piso 60x60cm color gris, uso exteriores tráfico comercial	M2	88,00	100.281	8.824.728		-		-	
6.1.3	Acabado para uniones entre muro y losa de piso en media caña con mortero 1-4 H: 0,07m	ML	85,00	27.327	2.322.795		-		-	
				Sub Total	**45.359.613**		**-**		**-**	
6.2	**PARED**									
6.2.1	Enchape cerámica de pared color marfil caras diferenciadas 30.1x75.3cm	M2	457,00	113.777	51.996.089		-		-	
6.2.2	Guarda canto flecha 8 milímetros cromo aluminio mate	ML	31,00	12.988	402.628		-		-	
6.2.3	Suministro e instalación de espejo E= 3mm flotante biselado en sus cuatro lados sobre soporte metálico	M2	20,00	361.837	7.236.740		-		-	
6.2.4	Mesón en granito artificial verde uva tuba incluye solapa inferior en aglomerado ancho 50cm con melamina, ancho de mesón 0.60m	ML	17,00	1.146.712	19.494.104		-		-	
				Sub Total	**79.129.561**		**-**		**-**	**0%**
		TOTAL ENCHAPES			**124.489.174**		**-**		**-**	**0%**
7	**ESTUCOS**									
7.1	Estuco acrílico para exteriores, incluye juntas, filos y dilataciones	M2	320,00	21.750	6.960.000		-		-	
7.2	Estuco plástico para muros y resanes incluye juntas, filos y dilataciones	M2	973,00	16.641	16.191.693	185,00	3.078.585	370,00	6.157.170	19,01%
				Sub Total	**23.151.693**		**3.078.585**		**6.157.170**	**13,30%**
		TOTAL ESTUCOS			**23.151.693**		**3.078.585**		**6.157.170**	**13,30%**
8	**PINTURA**									
8.1	Pintura de muros en mampostería 3 manos, vinilo tipo 1, lavable	M2	5137,00	12.785	65.676.545		-		-	
8.2	Pintura para exteriores (3 manos) para paredes.	M2	1280,00	27.659	35.403.520		-		-	
8.3	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial ancho 10cm, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, para pavimento rígido	ML	173,52	14.418	2.501.811		-		-	
8.4	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial, números con circunferencias de 66 y 40cm para carros y motos. imprimación en negro y pintura tráfico vehicular, incluye micro esferas, para pavimento rígido	UND	42,00	30.758	1.291.836		-		-	
8.5	Aplicación de pintura en frio base solvente para flechas de ingreso y salida, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, sobre pavimento rígido	M2	27,00	59.594	1.609.038		-		-	
				Sub Total	**106.482.750**		**-**		**-**	**0%**
		TOTAL PINTURA			**106.482.750**		**-**		**-**	**0%**
9	**CARPINTERIAS**									
9.1	Suministro e instalación de puerta de dos hojas batientes elaborada en tubular aluminio estriado ANOLOC, incluye chapa pomo de alcoba metálica pasador y argolla para candado. Medidas de cada hoja 0.9mx2.10m (ver plano A-022. P-T3)	UND	1,00	2.374.136	2.374.136		-		-	
9.2	Sellado de juntas entre muros y marcos de ventanería con sellador de juntas de poliuretano.	ML	367,00	11.048	4.054.616		-		-	
				Sub Total	**6.428.752**		**-**		**-**	**0%**
		TOTAL CARPINTERIAS			**6.428.752**		**-**		**-**	**0%**
10	**CUBIERTAS Y CIELO RASO**									
10.2	Limpieza, lavado, cambio de amarras y ganchos, aplicación de sellante en amarras de policarbonato alveolar	M2	33,00	32.738	1.080.354		-		-	
10.3	Suministro e instalación de cielo raso desmontable, láminas de fibra mineral 0,60m x 0,60m, incluye estructura	M2	220,00	89.265	19.638.300		-		-	
				Sub Total	**20.718.654**		**-**		**-**	**0%**
		TOTAL CUBIERTAS Y CIELO RASO			**20.718.654**		**-**		**-**	**0%**
11	**APARATOS SANITARIOS Y DOTACION BAÑOS**									

11.1	Kit Taza sanitaria entrada superior con fluxómetro con sensor, blanco institucional (Incluye Taza Sanitaria para Fluxómetro, asiento sanitario, sensor, sistema conexión entrada superior)	UND	4	3.778.631	15.114.524		-		-	
11.2	Taza sanitaria alongado, blanco institucional ultra ahorradora (Sanitario con push)	UND	28	1.228.494	34.397.832		-		-	
11.3	Barra de seguridad Fija Recta en acero inoxidable (baño para personas con movilidad reducida), incluye anclajes	UND	4	463.827	1.855.308		-		-	
11.4	Barra de seguridad abatible (baño para personas con movilidad reducida) incluye anclajes	UND	4	641.649	2.566.596		-		-	
11.5	Lavamanos blanco institucional, para personas con movilidad reducida, incluye anclajes	UND	4	553.338	2.213.352		-		-	
11.6	Lavamanos blanco institucional, para incrustar en mesones	UND	20	328.045	6.560.900		-		-	
11.7	Suministro e instalación de brazo de soporte para lavamanos	JUEGO	4	288.360	1.153.440		-		-	
11.8	Suministro e instalación de grifería para lavamanos y desagüe tipo botella sencillo incluye acople	UND	24	62.127	1.491.048		-		-	
11.9	Construcción lava traperos 70x50x50cm, enchapado.	UND	4	622.329	2.489.316		-		-	
11.10	Kit Orinal arrecife o similar para fluxómetro	UND	8	1.284.163	10.273.304		-		-	
11.11	Dispensador De Papel Higiénico Acero Inoxidable Diámetro De 26 Cm	UND	16	157.457	2.519.312		-		-	
11.12	Papelera metálica en acero inoxidable según especificaciones	UND	32	530.403	16.972.896		-		-	
11.13	Dispensador de jabón para empotrar en pared, en acero inoxidable, 1.2Litros	UND	16	253.414	4.054.624		-		-	
11.14	Suministro e instalación de divisiones sanitarias a piso en acero inoxidable AISI SAE 304 para baños de uso institucional. Batería completa con tres (3) cubículos para unidades sanitarias. Incluye tornillería y accesorios.	UND	8,00	8.420.295	67.362.360		-		-	
11.15	Dispensador De Toallas De Papel En Z Acero Inoxidable De 27x27x10 Cm	UND	16,00	186.293	2.980.688		-		-	
				Sub Total	**172.005.500**		**-**		**-**	**0%**
		TOTAL APARATOS SANITARIOS			**172.005.500**		**-**		**-**	**0%**
12	**SEÑALIZACIÓN**									
12.1	Suministro e instalación de placa de señalización de 0,65 x 0,50 m con planimetría salidas de emergencia, en acrílico de 2.4 con impresión full color y regletas en MDF para su instalación.	UND	5,00	229.178	1.145.890		-		-	
12.2	Suministro e instalación Franjas Guías longitudinales de ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	600,00	10.725	6.435.000		-		-	
12.3	Suministro e instalación de Punto alerta ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	2100,00	5.658	11.881.800		-		-	
12.4	Suministro e Instalación de Loseta alerta en policarbonato, 20 x 20 cm., Altura total: 5mm, Peso 150 gr, incluye anclaje	UND	15,00	43.268	649.020		-		-	
12.5	Suministro e instalación de letreros luminosos informativos en parqueadero doble cara, ubicado en sótano 1.50x0.40m	UND	3,00	576.720	1.730.160		-		-	
12.6	Suministro e instalación de letras en acero inoxidable de la frase: PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA y Escudo de la Rama judicial diámetro 50cm, tamaño de letra 30cm cada una, según diseño	UND	1,00	5.767.200	5.767.200		-		-	
				Sub Total	**27.609.070**		**-**		**-**	**0%**
		TOTAL SEÑALIZACIÓN			**27.609.070**		**-**		**-**	**0%**
13	**VARIOS Y ASEO GENERAL**									
13.1	Brigada de aseo	PERSONA/ MES	6,00	2.304.481	13.826.886		-		-	
				Sub Total	**13.826.886**		**-**		**-**	**0%**
		TOTAL VARIOS Y ASEO			**13.826.886**		**-**		**-**	**0%**
				TOTAL COSTO DIRECTO:	748.356.821		10.072.763		34.161.689	**1,35%**
				ADMINISTRACIÓN (18.73%)	140.167.233		1.886.629		6.398.484	
				IMPREVISTOS (3%)	22.450.705		302.183		1.024.851	
				UTILIDAD (5%)	37.417.841		503.638		1.708.084	
				IVA (19%)	7.109.390		95.691		324.536	
				TOTAL PRESUPUESTO:	**955.501.990**		**12.860.904**		**43.617.644**	**1,35%**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO
INFORME SEMANAL DE OBRA N° 5

I. INFORMACIÓN GENERAL

N° CONTRATO Y FECHA: CO1.PCCNTR.6947019 del 29 de octubre de 2024 | TRAMO (S): N.A. | FECHA: 15/12/2024

ENTIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO | SEMANA No.: 5 del 9/12/2024 al 15/12/2024

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. DIANA VIVANCO | ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO

OBJETO: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO" | FECHA DE INICIO: 14/11/2024

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA
INTEGRANTES: REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO MANRIQUE

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.6947019 del 29 de octubre de 2024 | VALOR INICIAL: $ 955.501.990,00
PLAZO INICIAL: 60 dias | ADICIONES: $ 0,00
PLAZO ACUMULADO: | VALOR ACUMULADO: $ 955.501.990,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
INTEGRANTES:

CONTRATO No.: O1.PCCNTR.6973355 | VALOR INICIAL: $ 33.336.660,00
PLAZO INICIAL: 45 cuarenta y cinco días | ADICIONES: $ 0,00
PLAZO ACUMULADO: | VALOR ACUMULADO: $ 33.336.660,00

II. AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS OBRA:

ESTUDIOS Y DISEÑOS:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ -
OBRA:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 0,00
TOTAL OBRA + EST Y DISEÑOS:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 0,00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 0,00


INTERVENTORÍA:
COSTOS EJECUTADOS ACUMULADOS:
COSTOS PROGRAMADOS ACUMULADOS:

ESTUDIOS Y DISEÑOS SEMANAL:
PROGRAMADA: $ -
EJECUTADA: $ -
OBRA SEMANAL:
PROGRAMADA: $ 0,00
EJECUTADA: $ 0,00
TOTAL OBRA + E Y D SEMANAL:
PROGRAMADA: $ 0,00
EJECUTADA: $ 0,00

III. AVANCE FÍSICO

EJECUTADO ACUMULADO PROYECTO

DESCRIPCIÓN	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	TOTAL
Iniciales			10,04%	10,04%	10,04%									30,12%
Desmonte y Retiros			20,42%	16,74%	12,74%									49,90%
Demoliciones			13,12%	12,12%	7,74%									32,98%
Estucos				13,30%	13,30%									26,60%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
AVANCE OBRA COSTOS DIRECTOS														0,00%
AVANCE OBRA TOTAL														0,00%

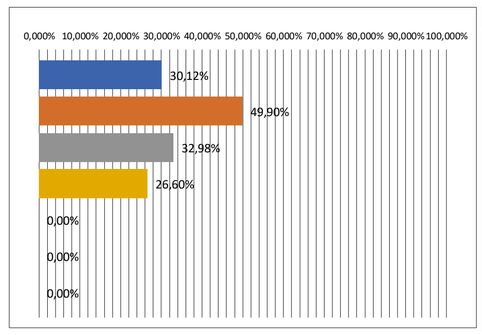

MAQUINARIA Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	MES 1	TOTAL
HERRAMIENTA MENOR		
TALADRO PERCUTOR		

S 1 | S 2 | S 3 $ 14.250.052,00 | S 4 $ 16.506.584,00 | S 5 $ 12.860.904,00 | S 6

S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

BOTADEROS	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONE: La escombrera Palermo, se encuentra ubicada en la verada Caliyaco, ubicada en zona rural del municiipio de Mocoa Putumayo, Gestor de disposición final de RCD, autorizado mediante resolución 00003 de 08/07/2019 código de Inscripción DPT-3389-25-07-2019 / km 1:200 Vía a Villagarzón.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 15
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: El personal mano de obra no calificada es en su totalidad es de la vereda brisas del Mocoa. La selección de las hojas de vida se realizo de la documentación entregada por la JAC quienes realizaron la convocatoria y certificaron que las persona sean del sector.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ADMINISTRATIVAS, LEGALES, FINANCIERAS

FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA E INTERVENTORIA, AFILIACION DEL PERSONAL A LAS ENTIDADES ASEGURADORAS Y DE SALUD.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO
INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N° 5

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO" | TRAMO (S): N.A. | FECHA: 15/12/2024

SECRETARIA EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO | RAMA JUDICIAL: PUTUMAYO | SEMANA No.: 5 del 9/12/2024 al 15/12/2024

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

TÉCNICAS

Continuar con demoliciones de concretos, enchapes y demas materiales.

Se inicia resanes de paredes

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

AMBIENTAL Y SST

El componente de seguridad y salud en el trabajo realizo el seguimiento punto a punto del plan de manejo básico de seguridad y salud en el trabajo en el cual se encontró lo siguiente :

Se realizan charlas preoperacionales, entrega en epps, demarcación de zonas con cinta peligro.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con demoliciones de concretos, enchapes y demas materiales.

Iniciar con resane de paredes en piso 1, en todas las áreas internas.

NOTA:

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES

Se firma acta de inicio el 14 de noviembre de 2024.

Fecha de terminación inicial 13 de enero de 2025

OBSERVACIONES:	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA:	FIRMA:
	NOMBRE: MARLON FERNANDO ARTEAGA POTOSI	NOMBRE: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
	N° MAT: 52202-333602 NRÑ	No. MAT: 63202094726 QND

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

INFORME SEMANAL DE OBRA N° 6

PÁGINA	1	DE	1

SECRETARIA EJECUTORA: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO

FECHA: 23 / 12 / 2024

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.6947019

Semana Número: 6 Del: 16/12/2024 Al: 23/12/2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 40 Días Corresponde al : 66,67% del Plazo total del Contrato

Supervisor Técnico de Contrato: ING. DIANA VIVANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO"

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	31,56%	52,91%
Valor básico de la Obra programada:	$ 301.607.941	$ 505.585.098

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	2,30%	6,87%
Valor básico de Obra Ejecutada:	$ 21.932.972	$ 65.550.646

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.
Contrato No.	CO1.PCCNTR.6947019
Valor Inicial:	$ 955.501.990,00
Plazo Inicial:	2 MESES
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	14 de noviembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
Contrato No.	O1.PCCNTR.6973355 DEL 01/11/2024
Valor Actualizado:	$ 33.336.660,00
Plazo Inicial:	45 cuarenta y cinco dias calendario
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	14 de noviembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Realizar repellos en muros en zona de baterias sanitarias
Realizar retiro de escombros
Continuar resane de paredes en piso 1, en todas las áreas internas.
Iniciar con pintura para interiores en piso 1.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con demoliciones de concretos, enchapes y demas materiales.
Realizar retiro de escombros
Continuar con resane de paredes en piso 1, 2, en todas las áreas internas.
Continuar con pintura con pintura para interiores.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO


Se firma acta de inicio el 14 de noviembre de 2024.
Fecha de terminación inicial 31 de diciembre de 2024

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO	Firma: Nombre: MARLON FERNANDO ARTEAGA P. Matrícula 52202-339602 NRÑ	Firma: Nombre: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO Matrícula 63202094726 QND




Fotografía: 1

Realizar repellos en muros en zona de baterias sanitarias

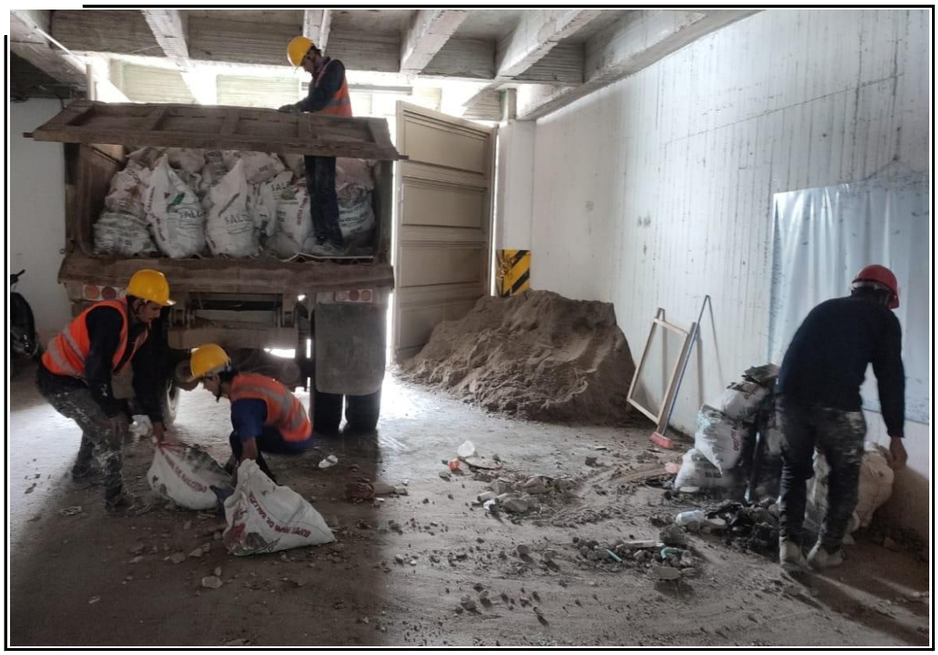

Fotografía: 2

Realizar retiro de escombros

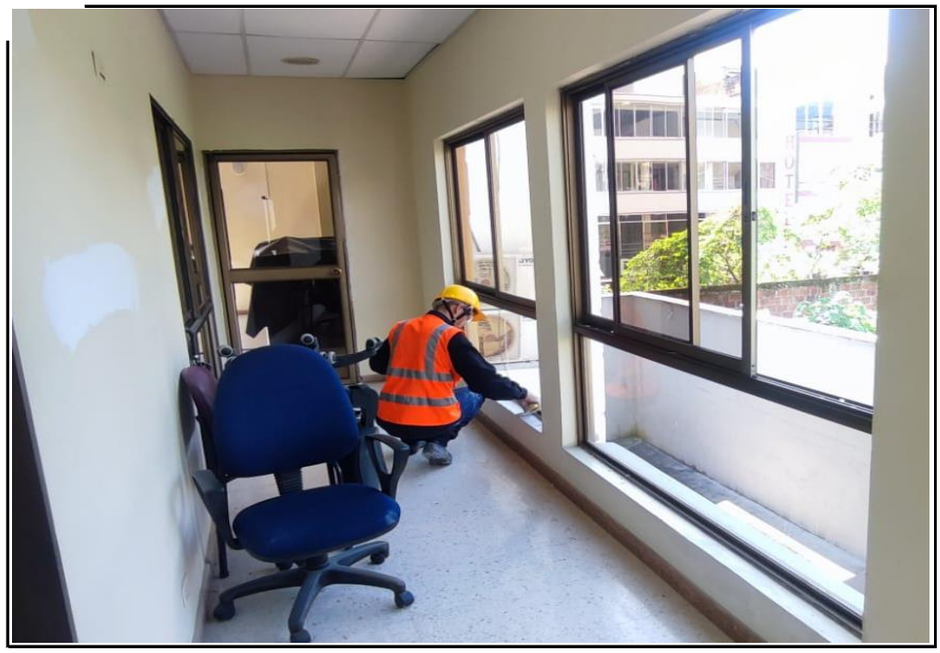

Fotografía: 3

Continuar resane de paredes en piso 1, en todas las áreas internas.



Fotografía: 4

Continuar resane de paredes en piso 1, en todas las áreas internas.



Fotografía: 5

Iniciar con pintura para interiores en piso 1.



Fotografía: 6

Iniciar con pintura para interiores en piso 1.

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No.	CO1.PCCNTR.6947019
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.
INTERVENTOR:	ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO

OBJETO "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO"

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	SEMANA 6		ACUMULADO		% EJECUTADO SEMANA 6
						CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	
1	**PRELIMINARES**									
1.1	**INICIALES**									
1.1.1	Localización y replanteo arquitectónico, incluye planos récord	M2	332,00	3.864	1.282.848		-	131,94	509.816	
1.1.2	Instalación y desinstalación de muro una cara drywall, provisional para cerrar las obras, incluye puerta con marco para ingreso de trabajadores	M2	53,00	77.249	4.094.197		-	16,50	1.274.609	
1.1.3	Señalización de obra en lona de 60x40cm impresión full color, incluye marco y anclaje	UND	9,00	60.693	546.237	9,00	546.237	9,00	546.237	100,00%
				Sub Total	**5.923.282**		**546.237**		**2.330.662**	**9,22%**
1.2	**DESMONTES Y RETIROS**									
1.2.1	Desmonte de marcos y puertas, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	57,00	26.406	1.505.142		-	36,00	950.616	
1.2.2	Desmonte de marco, ventana y vidrio, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	1,00	27.367	27.367		-			
1.2.3	Desmonte de cielo raso en fibra mineral y/o panel yeso y/o fibrocemento, incluye estructura soporte, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	M2	250,00	29.781	7.445.250	42,01	1.251.100	173,98	5.181.298	16,80%
1.2.4	Desmonte de Tasas sanitarias, orinales y lavamanos, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	UND	48,00	53.587	2.572.176		-	48,00	2.572.176	
1.2.5	Desmonte de instalaciones hidrosanitarias, incluye tuberías y accesorios, regatas y sellos provisionales, cargue a volqueta	UND	72,00	57.730	4.156.560		-	43,00	2.482.390	
1.2.6	Rasqueteo, cepillo y limpieza manual de superficies, con el fin de retirar impurezas y capas de pintura existentes.	M2	1017,00	4.863	4.945.671	71,00	345.273	71,00	345.273	6,98%
1.2.7	Retiro de luminarias ubicadas en cielos rasos y pared, incluye trasiego a punto de acopio	UND	46,00	21.660	996.360		-	40,00	866.400	
1.2.8	Retiro de redes eléctricas en piso, techo y pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	GL	1,00	2.233.550	2.233.550	0,30	670.065	0,80	1.786.840	30,00%
				Sub Total	**23.882.076**		**2.266.438**		**14.184.993**	**9,49%**
1.3	**DEMOLICIONES**									
1.3.1	Demolición muro E ≤ 15CM en mampostería maciza o hueca, incluye cortes con pulidora, trasiegos y cargue a volqueta.	M2	220,00	17.941	3.947.020	45,00	807.345	127,24	2.282.813	20,45%
1.3.2	Demolición de enchape de pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	704,40	14.760	10.396.413		-	319,12	4.710.211	
1.3.3	Demolición de enchapes de piso, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	283,00	13.980	3.956.340	85,00	1.188.300	142,00	1.985.160	30,04%
1.3.4	Demolición repello de piso, incluye picado Eprom = 0.03m, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	835,00	12.959	10.820.765	1,54	19.957	142,00	1.840.178	0,18%
1.3.5	Demolición repello de pared, muros mampostería eprom= 0.02m, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	291,80	15.119	4.411.785		-	291,00	4.399.629	
1.3.6	Cargue, transporte y retiro del material sobrante proveniente de las obras de mantenimiento, hasta el botadero.	M3	234,00	40.171	9.400.014		-	24,00	964.104	
1.3.7	Demolición de mesones en concreto, recubierto con granito incluye salpicadero	M2	11,00	37.722	414.942		-	3,58	135.045	
				Sub Total	**43.347.279**		**2.015.602**		**16.317.140**	**4,65%**
		TOTAL PRELIMINARES			**73.152.637**		**4.828.277**		**32.832.795**	**6,60%**
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**									
2.1	**RED SUMINISTRO AGUA POTABLE**									
2.1.1	Instalaciones PVC 1/2" RDE 13.5	ML	95,00	7.575	719.625	42,00	318.150	42,00	318.150	44,21%
2.1.2	Instalaciones PVC 3/4" RDE 21	ML	28,00	10.939	306.292	14,00	153.146	14,00	153.146	50,00%
2.1.3	Instalaciones PVC RDE 21 1"	ML	50,21	12.038	604.428	12,80	154.086	12,80	154.086	25,49%
2.1.4	Instalaciones PVC RDE 21 2"	ML	6,00	26.949	161.694		-		-	
2.1.5	Punto hidráulico PVC 1/2"	UND	60,00	24.174	1.450.440	30,00	725.220	30,00	725.220	50,00%
2.1.6	Punto hidráulico PVC 3/4"	UND	8,00	26.324	210.592		-		-	
2.1.7	Punto hidráulico PVC 1/2" incluye válvula control paso 1/2" y tapa PVC Blanca 15x15cm	UND	18,00	59.937	1.078.866		-		-	
				Sub Total	**4.531.937**		**1.350.602**		**1.350.602**	**29,80%**
2.2	**RED SANITARIA, PLUVIAL, VENTILACION**									
2.2.1	Instalaciones sanitarias PVC 2"	ML	58,00	25.087	1.455.046	13,00	326.131	13,00	326.131	22,41%
2.2.2	Instalaciones sanitarias PVC 4"	ML	119,00	42.006	4.998.714	26,00	1.092.156	26,00	1.092.156	21,85%
2.2.3	Instalaciones ventilación PVC 2"	ML	183,00	20.194	3.695.502		-		-	
2.2.4	Instalaciones ventilación PVC 3"	ML	35,00	31.646	1.107.610		-		-	
2.2.5	Punto sanitario 4" WC	UND	32,00	45.965	1.470.880	16,00	735.440	16,00	735.440	50,00%
2.2.6	Punto sanitario 2"	UND	44,00	33.894	1.491.336	14,00	474.516	14,00	474.516	31,82%
2.2.7	Suministro e instalación de rejilla de piso en acero inoxidable cuadrada de 10cm salida a tubería 2"	UND	24,00	48.380	1.161.120		-		-	
2.2.8	Suministro e instalación de tubería de conexión de desagües de aires acondicionados	ML	36,00	20.194	726.984		-		-	
				Sub Total	**16.107.192**		**2.628.243**		**2.628.243**	**16,32%**
		TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**20.639.129**		**3.978.845**		**3.978.845**	**19,28%**
3	**RED ELECTRICA**									
3.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**									
3.1.1	S.I.P. Salida toma doble GFCI 1F/20AMP en tubería PVC SCH40 1/2", caja galvanizada y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	16,00	171.144	2.738.304		-		-	
3.1.2	S.I.P. Salida sensor de movimiento tipo interruptor 360° 1F/15AMP En muro, Tubería PVC SCH40 D:1/2", Cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	32,00	138.700	4.438.400		-		-	
3.1.3	S.I.P Luminaria de sobreponer 400x120 para uso interior, fabricada en lámina de acero COLD ROLLED, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate y difusor lamina acrílico opalizado L11. Producto para instalación de sobreponer, en temperatura de color 5000K flujo lumínico de 4400Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 28.56W	UND	4,00	424.118	1.696.472		-		-	
3.1.4	S.I.P. Luminaria tipo bala 72x83 para incrustar, Producto tipo DOWNLIGHT de uso interior fabricado en aluminio inyectado, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate en temperatura de color 6500K flujo lumínico de 550Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 6.00W	UND	40,00	65.207	2.608.280		-		-	
3.1.5	S.I.P Luminaria tipo bala GS 15W 5000K	Und	12,00	144.940	1.739.280		-		-	
3.1.6	S.I.P Letrero lumínico de emergencia SALIDA 90E 300X185X45 2.6W 120-277V SOBREPONER	UND	20,00	107.422	2.148.440		-		-	
3.1.7	S.I.P Luminaria de emergencia 185X50X108 SOBREPONER 2-BL 2W	UND	40,00	112.486	4.499.440		-		-	
3.1.8	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP en techo, Tubería D:1/2" SCH40, Caja octogonal y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	66,00	123.004	8.118.264		-		-	
3.1.9	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP emergencia, Tubería D:1/2 EMT, Caja RADWELL 5800 y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, incluye fijación, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	45,00	178.147	8.016.615		-		-	

3.1.10	S.I.A. Tablero de circuitos para baños, incluye 6 protecciones de 20A	UND	4,00	826.632	3.306.528		-		-	
				Sub Total	**39.310.023**		**-**		**-**	**0%**
		TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS			**39.310.023**		**-**		**-**	**0%**
4	**MUROS**									
4.1	Suministro e instalación de muro doble cara en lámina de fibrocemento 8mm. Estructura base 6. incluye estuco y dos manos de pintura	M2	84,00	171.543	14.409.612		-		-	
4.2	Carteras en lámina de fibrocemento 8mm dos caras, en marco ventana y puertas	ML	163,80	68.788	11.267.474		-		-	
				Sub Total	**25.677.086**		**-**		**-**	**0%**
		TOTAL MAMPOSTERIA			**25.677.086**		**-**		**-**	**0%**
5	**REPELLOS**									
5.1	Repello de piso y pared con mortero 1:4 espesor 2cm. Incluye aditivo impermeabilizante.	M2	1374,872	44.402	61.047.067	87,96	3.905.600	87,96	3.905.600	6,40%
5.2	Impermeabilización de losa de entrepiso y muros laterales de terraza, con recubrimiento impermeabilizante acrílico de alto desempeño con tecnología DFX y fibras para impermeabilizar cubiertas	M2	660,00	51.240	33.818.400		-		-	
				Sub Total	**94.865.467**		**3.905.600**		**3.905.600**	**4,12%**
		TOTAL REPELLOS			**94.865.467**		**3.905.600**		**3.905.600**	**4,12%**
6	**ENCHAPES**									
6.1	**PISOS**									
6.1.1	Enchape cerámica de piso estructurado 20.6x92.6cm, uso comercial moderado	M2	258,00	132.605	34.212.090		-		-	
6.1.2	Enchape cerámica de piso 60x60cm color gris, uso exteriores tráfico comercial	M2	88,00	100.281	8.824.728		-		-	
6.1.3	Acabado para uniones entre muro y losa de piso en media caña con mortero 1-4 H: 0,07m	ML	85,00	27.327	2.322.795		-		-	
				Sub Total	**45.359.613**		**-**		**-**	
6.2	**PARED**									
6.2.1	Enchape cerámica de pared color marfil caras diferenciadas 30.1x75.3cm	M2	457,00	113.777	51.996.089		-		-	
6.2.2	Guarda canto flecha 8 milímetros cromo aluminio mate	ML	31,00	12.988	402.628		-		-	
6.2.3	Suministro e instalación de espejo E= 3mm flotante biselado en sus cuatro lados sobre soporte metálico	M2	20,00	361.837	7.236.740		-		-	
6.2.4	Mesón en granito artificial verde uva tuba incluye solapa inferior en aglomerado ancho 50cm con melamina, ancho de mesón 0.60m	ML	17,00	1.146.712	19.494.104		-		-	
				Sub Total	**79.129.561**		**-**		**-**	**0%**
		TOTAL ENCHAPES			**124.489.174**		**-**		**-**	**0%**
7	**ESTUCOS**									
7.1	Estuco acrílico para exteriores, incluye juntas, filos y dilataciones	M2	320,00	21.750	6.960.000		-		-	
7.2	Estuco plástico para muros y resanes incluye juntas, filos y dilataciones	M2	973,00	16.641	16.191.693	132,35	2.202.436	502,35	8.359.606	13,60%
				Sub Total	**23.151.693**		**2.202.436**		**8.359.606**	**9,51%**
		TOTAL ESTUCOS			**23.151.693**		**2.202.436**		**8.359.606**	**9,51%**
8	**PINTURA**									
8.1	Pintura de muros en mampostería 3 manos, vinilo tipo 1, lavable	M2	5137,00	12.785	65.676.545	177,00	2.262.945	177,00	2.262.945	3,45%
8.2	Pintura para exteriores (3 manos) para paredes.	M2	1280,00	27.659	35.403.520		-		-	
8.3	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial ancho 10cm, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, para pavimento rígido	ML	173,52	14.418	2.501.811		-		-	
8.4	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial, números con circunferencias de 66 y 40cm para carros y motos. imprimación en negro y pintura tráfico vehicular, incluye micro esferas, para pavimento rígido	UND	42,00	30.758	1.291.836		-		-	
8.5	Aplicación de pintura en frio base solvente para flechas de ingreso y salida, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, sobre pavimento rígido	M2	27,00	59.594	1.609.038		-		-	
				Sub Total	**106.482.750**		**2.262.945**		**2.262.945**	**2,13%**
		TOTAL PINTURA			**106.482.750**		**2.262.945**		**2.262.945**	**2,13%**
9	**CARPINTERIAS**									
9.1	Suministro e instalación de puerta de dos hojas batientes elaborada en tubular aluminio estriado ANOLOC, incluye chapa pomo de alcoba metálica pasador y argolla para candado. Medidas de cada hoja 0.9mx2.10m (ver plano A-022_P-T3)	UND	1,00	2.374.136	2.374.136		-		-	
9.2	Sellado de juntas entre muros y marcos de ventanería con sellador de juntas de poliuretano.	ML	367,00	11.048	4.054.616		-		-	
				Sub Total	**6.428.752**		**-**		**-**	**0%**
		TOTAL CARPINTERIAS			**6.428.752**		**-**		**-**	**0%**
10	**CUBIERTAS Y CIELO RASO**									
10.2	Limpieza, lavado, cambio de amarras y ganchos, aplicación de sellante en amarras de policarbonato alveolar	M2	33,00	32.738	1.080.354		-		-	
10.3	Suministro e instalación de cielo raso desmontable, láminas de fibra mineral 0,60m x 0,60m, incluye estructura	M2	220,00	89.265	19.638.300		-		-	
				Sub Total	**20.718.654**		**-**		**-**	**0%**
		TOTAL CUBIERTAS Y CIELO RASO			**20.718.654**		**-**		**-**	**0%**
11	**APARATOS SANITARIOS Y DOTACION BAÑOS**									
11.1	Kit Taza sanitaria entrada superior con fluxómetro con sensor, blanco institucional (Incluye Taza Sanitaria para Fluxómetro, asiento sanitario, sensor, sistema conexión entrada superior)	UND	4	3.778.631	15.114.524		-		-	
11.2	Taza sanitaria alongado, blanco institucional ultra ahorradora (Sanitario con push)	UND	28	1.228.494	34.397.832		-		-	
11.3	Barra de seguridad Fija Recta en acero inoxidable (baño para personas con movilidad reducida), incluye anclajes	UND	4	463.827	1.855.308		-		-	
11.4	Barra de seguridad abatible (baño para personas con movilidad reducida) incluye anclajes	UND	4	641.649	2.566.596		-		-	
11.5	Lavamanos blanco institucional, para personas con movilidad reducida, incluye anclajes	UND	4	553.338	2.213.352		-		-	
11.6	Lavamanos blanco institucional, para incrustar en mesones	UND	20	328.045	6.560.900		-		-	
11.7	Suministro e instalación de brazo de soporte para lavamanos	JUEGO	4	288.360	1.153.440		-		-	
11.8	Suministro e instalación de grifería para lavamanos y desagüe tipo botella sencillo incluye acople	UND	24	62.127	1.491.048		-		-	
11.9	Construcción lava traperos 70x50x50cm, enchapado.	UND	4	622.329	2.489.316		-		-	
11.10	Kit Orinal arrecife o similar para fluxómetro	UND	8	1.284.163	10.273.304		-		-	
11.11	Dispensador De Papel Higiénico Acero Inoxidable Diámetro De 26 Cm	UND	16	157.457	2.519.312		-		-	
11.12	Papelera metálica en acero inoxidable según especificaciones	UND	32	530.403	16.972.896		-		-	
11.13	Dispensador de jabón para empotrar en pared, en acero inoxidable, 1.2Litros	UND	16	253.414	4.054.624		-		-	
11.14	Suministro e instalación de divisiones sanitarias a piso en acero inoxidable AISI SAE 304 para baños de uso institucional. Batería completa con tres (3) cubículos para unidades sanitarias. Incluye tornillería y accesorios.	UND	8,00	8.420.295	67.362.360		-		-	
11.15	Dispensador De Toallas De Papel En Z Acero Inoxidable De 27x27x10 Cm	UND	16,00	186.293	2.980.688		-		-	
				Sub Total	**172.005.500**		**-**		**-**	**0%**
		TOTAL APARATOS SANITARIOS			**172.005.500**		**-**		**-**	**0%**
12	**SEÑALIZACIÓN**									

12.1	Suministro e instalación de placa de señalización de 0,65 x 0,50 m con planimetría salidas de emergencia, en acrílico de 2.4 con impresión full color y regletas en MDF para su instalación	UND	5,00	229.178	1.145.890		-		-	
12.2	Suministro e instalación Franjas Guías longitudinales de ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	600,00	10.725	6.435.000		-		-	
12.3	Suministro e instalación de Punto alerta ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	2100,00	5.658	11.881.800		-		-	
12.4	Suministro e Instalación de Loseta alerta en policarbonato, 20 x 20 cm., Altura total: 5mm, Peso 150 gr, incluye anclaje	UND	15,00	43.268	649.020		-		-	
12.5	Suministro e instalación de letreros luminosos informativos en parqueadero doble cara, ubicado en sótano 1.50x0.40m	UND	3,00	576.720	1.730.160		-		-	
12.6	Suministro e instalación de letras en acero inoxidable de la frase: PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA y Escudo de la Rama judicial diámetro 50cm, tamaño de letra 30cm cada una, según diseño	UND	1,00	5.767.200	5.767.200		-		-	
				Sub Total	**27.609.070**		**-**		**-**	**0%**
		TOTAL SEÑALIZACIÓN			**27.609.070**		**-**		**-**	**0%**
13	**VARIOS Y ASEO GENERAL**									
13.1	Brigada de aseo	PERSONA/ MES	6,00	2.304.481	13.826.886		-		-	
				Sub Total	**13.826.886**		**-**		**-**	**0%**
		TOTAL VARIOS Y ASEO			**13.826.886**		**-**		**-**	**0%**

TOTAL COSTO DIRECTO:	748.356.821		17.178.103		51.339.791	**2,30%**
ADMINISTRACIÓN (18.73%)	140.167.233		3.217.459		9.615.943	
IMPREVISTOS (3%)	22.450.705		515.343		1.540.194	
UTILIDAD (5%)	37.417.841		858.905		2.566.990	
IVA (19%)	7.109.390		163.192		487.728	
TOTAL PRESUPUESTO:	**955.501.990**		**21.932.972**		**65.550.646**	**2,30%**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO
INFORME SEMANAL DE OBRA N° 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

N° CONTRATO Y FECHA: CO1.PCCNTR.6947019 del 29 de octubre de 2024 — TRAMO (S): N.A. — FECHA: 22/12/2024

ENTIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO — SEMANA No.: 6 del 16/12/2024 al 22/12/2024

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. DIANA VIVANCO — ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO

OBJETO: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO" — FECHA DE INICIO: 14/11/2024

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA
INTEGRANTES: REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO MANRIQUE

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.6947019 del 29 de octubre de 2024 — VALOR INICIAL: $ 955.501.990,00
PLAZO INICIAL: 60 dias — ADICIONES: $ 0,00
PLAZO ACUMULADO: — VALOR ACUMULADO: $ 955.501.990,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
INTEGRANTES:

CONTRATO No.: O1.PCCNTR.6973355 — VALOR INICIAL: $ 33.336.660,00
PLAZO INICIAL: 45 cuarenta y cinco días — ADICIONES: $ 0,00
PLAZO ACUMULADO: — VALOR ACUMULADO: $ 33.336.660,00

II. AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS OBRA:

ESTUDIOS Y DISEÑOS:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ -
OBRA:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 0,00
TOTAL OBRA + EST Y DISEÑOS:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 0,00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 0,00


INTERVENTORÍA:
COSTOS EJECUTADOS ACUMULADOS:
COSTOS PROGRAMADOS ACUMULADOS:

ESTUDIOS Y DISEÑOS SEMANAL:
PROGRAMADA: $ -
EJECUTADA: $ -
OBRA SEMANAL:
PROGRAMADA: $ 0,00
EJECUTADA: $ 0,00
TOTAL OBRA + E Y D SEMANAL:
PROGRAMADA: $ 0,00
EJECUTADA: $ 0,00

III. AVANCE FÍSICO

EJECUTADO ACUMULADO PROYECTO

DESCRIPCIÓN	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	TOTAL
Iniciales			10,04%	10,04%	10,04%	9,22%								39,34%
Desmonte y Retiros			20,42%	16,74%	12,74%	9,49%								59,39%
Demoliciones			13,12%	12,12%	7,74%	4,65%								37,63%
Estucos				13,30%	13,30%	9,51%								36,11%
Red Suministro Agua Potable						29,80%								29,80%
Red Sanitaria, Pluvial, Ventilación						16,32%								16,32%
Repellos						4,12%								4,12%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
AVANCE OBRA COSTOS DIRECTOS														0,00%
AVANCE OBRA TOTAL														0,00%

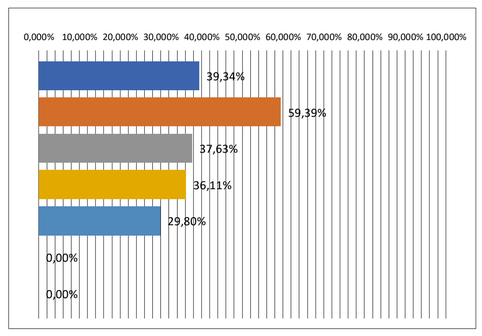

MAQUINARIA Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	MES 1	TOTAL
HERRAMIENTA MENOR		
TALADRO PERCUTOR		

S 1 — S 2 — S 3 $ 14.250.052,00 — S 4 $ 16.506.584,00 — S 5 $ 12.860.904,00 — S 6 $ 21.932.972,00

S 7 — S 8 — S 9 — S 10 — S 11 — S 12 — S 13

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

BOTADEROS	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONE: La escombrera Palermo, se encuentra ubicada en la verada Caliyaco, ubicada en zona rural del municipio de Mocoa Putumayo, Gestor de disposición final de RCD, autorizado mediante resolución 00003 de 08/07/2019 código de Inscripción DPT-3389-25-07-2019 / km 1:200 Vía a Villagarzón.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 15
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 15
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0,0
SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 0,0

OBSERVACIONES: El personal mano de obra no calificada es en su totalidad es de la vereda brisas del Mocoa. La selección de las hojas de vida se realizo de la documentación entregada por la JAC quienes realizaron la convocatoria y certificaron que las persona sean del sector.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ADMINISTRATIVAS, LEGALES, FINANCIERAS

FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA E INTERVENTORIA, AFILIACION DEL PERSONAL A LAS ENTIDADES ASEGURADORAS Y DE SALUD.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO
INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N° 6

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO" — TRAMO (S): N.A. — FECHA: 22/12/2024

SECRETARIA EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO — RAMA JUDICIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 6 del 16/12/2024 al 23/12/2024

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

TÉCNICAS

Realizar repellos en muros en zona de baterias sanitarias
Se inicia resanes de paredes

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

AMBIENTAL Y SST

El componente de seguridad y salud en el trabajo realizo el seguimiento punto a punto del plan de manejo básico de seguridad y salud en el trabajo en el cual se encontró lo siguiente :

Se realizan charlas preoperacionales, entrega en epps, demarcación de zonas con cinta peligro.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con demoliciones de concretos, enchapes y demas materiales.
Continuar resane de paredes en piso 1, en todas las áreas internas.

NOTA:

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES

Se firma acta de inicio el 14 de noviembre de 2024.
Fecha de terminación inicial 31 de diciembre de 2024

OBSERVACIONES:	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA:	FIRMA:
	NOMBRE: MARLON FERNANDO ARTEAGA POTOSI	NOMBRE: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
	N° MAT: 52202-333602 NRÑ	No. MAT: 63202094726 QND

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

INFORME SEMANAL DE OBRA N° 7

PÁGINA	1	DE	1

SECRETARIA EJECUTORA: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO

FECHA: 19 / 1 / 2025

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.6947019

Semana Número: 7 Del: 14/01/2025 Al: 19/01/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 46 Días Corresponde al : 43,81% del Plazo total del Contrato

Supervisor Técnico de Contrato: ING. DIANA VIVANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO"

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	4,55%	18,17%
Valor básico de la Obra programada:	$ 43.517.207	$ 173.608.102

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	6,65%	13,52%
Valor básico de Obra Ejecutada:	$ 63.571.724	$ 129.122.401

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.
Contrato No.	CO1.PCCNTR.6947019
Valor Inicial:	$ 955.501.990,00
Plazo Inicial:	2 MESES
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	14 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Fecha de Suspensión 1	23 de diciembre de 2024
Fecha de Reinicio 1	14 de enero de 2025
Fecha de Terminación 2	22 de enero de 2024
Tiempo de Adición 1	2 MESES
Fecha de Terminación Con Adición en Tiempo 1	22 de marzo de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
Contrato No.	O1.PCCNTR.6973355 DEL 01/11/2024
Valor Actualizado:	$ 33.336.660,00
Plazo Inicial:	45 cuarenta y cinco dias calendario
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	14 de noviembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Realizar retiro de escombros
Continuar resane de paredes en piso 1, 2, 3 Y 4 en todas las áreas internas.
Continuar pintura para interiores en piso 1, 2, 3 Y 4 en áreas internas

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con pinturas en los 4 pisos en áreas interiores
Continuar con la instalación de todos los temas eléctricos

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Fecha de inicio 14 de noviembre de 2024
Fecha de terminación inicial 31 de diciembre de 2024
Fecha de suspensión No.1 23 de diciembre de 2024
Fecha de reinicio No. 1 14 de enero de 2025
Fecha de terminación No.2 22 de enero de 2025
Tiempo de adición No. 1 dos meses
Fecha de terminación según adición en tiempo No.1 22 de marzo de 2025

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO	Firma: Nombre: MARLON FERNANDO ARTEAGA P. Matrícula 52202-339602 NRÑ	Firma: Nombre: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO Matrícula 63202094726 QND



Fotografía: 1

Realizar retiro de escombros



Fotografía: 2

Realizar retiro de escombros



Fotografía: 3

Continuar resane de paredes en piso 1, 2, 3 Y 4 en todas las áreas internas.



Fotografía: 4

Continuar resane de paredes en piso 1, 2, 3 Y 4 en todas las áreas internas.



Fotografía: 5

Continuar pintura para interiores en piso 1, 2, 3 Y 4 en áreas internas



Fotografía: 6

Continuar pintura para interiores en piso 1, 2, 3 Y 4 en áreas internas

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No.	CO1.PCCNTR.6947019
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.
INTERVENTOR:	ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO

OBJETO "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO"

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	SEMANA 7		ACUMULADO		% EJECUTADO SEMANA 7
						CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	
1	**PRELIMINARES**									
1.1	**INICIALES**									
1.1.1	Localización y replanteo arquitectónico, incluye planos récord	M2	332,00	3.864	1.282.848		-	131,94	509.816	
1.1.2	Instalación y desinstalación de muro una cara drywall, provisional para cerrar las obras, incluye puerta con marco para ingreso de trabajadores	M2	53,00	77.249	4.094.197		-	16,50	1.274.609	
1.1.3	Señalización de obra en lona de 60x40cm impresión full color, incluye marco y anclaje	UND	9,00	60.693	546.237		-	9,00	546.237	
				Sub Total	**5.923.282**		**-**		**2.330.662**	**0%**
1.2	**DESMONTES Y RETIROS**									
1.2.1	Desmonte de marcos y puertas, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	57,00	26.406	1.505.142		-	36,00	950.616	
1.2.2	Desmonte de marco, ventana y vidrio, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	1,00	27.367	27.367		-			
1.2.3	Desmonte de cielo raso en fibra mineral y/o panel yeso y/o fibrocemento, incluye estructura soporte, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	M2	250,00	29.781	7.445.250		-	173,98	5.181.298	
1.2.4	Desmonte de Tasas sanitarias, orinales y lavamanos, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	UND	48,00	53.587	2.572.176		-	48,00	2.572.176	
1.2.5	Desmonte de instalaciones hidrosanitarias, incluye tuberías y accesorios, regatas y sellos provisionales, cargue a volqueta	UND	72,00	57.730	4.156.560		-	43,00	2.482.390	
1.2.6	Rasqueteo, cepillo y limpieza manual de superficies, con el fin de retirar impurezas y capas de pintura existentes.	M2	1017,00	4.863	4.945.671		-	71,00	345.273	
1.2.7	Retiro de luminarias ubicadas en cielos rasos y pared, incluye trasiego a punto de acopio	UND	46,00	21.660	996.360		-	40,00	866.400	
1.2.8	Retiro de redes eléctricas en piso, techo y pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	GL	1,00	2.233.550	2.233.550		-	0,80	1.786.840	
				Sub Total	**23.882.076**		**-**		**14.184.993**	**0%**
1.3	**DEMOLICIONES**									
1.3.1	Demolición muro E ≤ 15CM en mampostería maciza o hueca, incluye cortes con pulidora, trasiegos y cargue a volqueta.	M2	220,00	17.941	3.947.020		-	127,24	2.282.813	
1.3.2	Demolición de enchape de pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	704,40	14.760	10.396.413	126,00	1.859.760	445,12	6.569.971	17,89%
1.3.3	Demolición de enchapes de piso, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	283,00	13.980	3.956.340		-	142,00	1.985.160	
1.3.4	Demolición repello de piso, incluye picado Eprom = 0.03m, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	835,00	12.959	10.820.765	36,00	466.524	178,00	2.306.702	4,31%
1.3.5	Demolición repello de pared, muros mampostería eprom= 0.02m, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	291,80	15.119	4.411.785		-	291,00	4.399.629	
1.3.6	Cargue, transporte y retiro del material sobrante proveniente de las obras de mantenimiento, hasta el botadero.	M3	234,00	40.171	9.400.014	70,00	2.811.970	94,00	3.776.074	29,91%
1.3.7	Demolición de mesones en concreto, recubierto con granito incluye salpicadero	M2	11,00	37.722	414.942		-	3,58	135.045	
				Sub Total	**43.347.279**		**5.138.254**		**21.455.394**	**11,85%**
		TOTAL PRELIMINARES			**73.152.637**		**5.138.254**		**37.971.049**	**7,02%**
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**									
2.1	**RED SUMINISTRO AGUA POTABLE**									
2.1.1	Instalaciones PVC 1/2" RDE 13.5	ML	95,00	7.575	719.625	42,00	318.150	84,00	636.300	44,21%
2.1.2	Instalaciones PVC 3/4" RDE 21	ML	28,00	10.939	306.292	14,00	153.146	28,00	306.292	50,00%
2.1.3	Instalaciones PVC RDE 21 1"	ML	50,21	12.038	604.428	12,80	154.086	25,60	308.173	25,49%
2.1.4	Instalaciones PVC RDE 21 2"	ML	6,00	26.949	161.694		-		-	
2.1.5	Punto hidráulico PVC 1/2"	UND	60,00	24.174	1.450.440	30,00	725.220	60,00	1.450.440	50,00%
2.1.6	Punto hidráulico PVC 3/4"	UND	8,00	26.324	210.592		-		-	
2.1.7	Punto hidráulico PVC 1/2" incluye válvula control paso 1/2" y tapa PVC Blanca 15x15cm	UND	18,00	59.937	1.078.866		-		-	
				Sub Total	**4.531.937**		**1.350.602**		**2.701.205**	**29,80%**
2.2	**RED SANITARIA, PLUVIAL, VENTILACION**									
2.2.1	Instalaciones sanitarias PVC 2"	ML	58,00	25.087	1.455.046	13,00	326.131	26,00	652.262	22,41%
2.2.2	Instalaciones sanitarias PVC 4"	ML	119,00	42.006	4.998.714	26,00	1.092.156	52,00	2.184.312	21,85%
2.2.3	Instalaciones ventilación PVC 2"	ML	183,00	20.194	3.695.502		-		-	
2.2.4	Instalaciones ventilación PVC 3"	ML	35,00	31.646	1.107.610		-		-	
2.2.5	Punto sanitario 4" WC	UND	32,00	45.965	1.470.880	16,00	735.440	32,00	1.470.880	50,00%
2.2.6	Punto sanitario 2"	UND	44,00	33.894	1.491.336	22,00	745.668	36,00	1.220.184	50,00%
2.2.7	Suministro e instalación de rejilla de piso en acero inoxidable cuadrada de 10cm salida a tubería 2"	UND	24,00	48.380	1.161.120		-		-	
2.2.8	Suministro e instalación de tubería de conexión de desagües de aires acondicionados	ML	36,00	20.194	726.984		-		-	
				Sub Total	**16.107.192**		**2.899.395**		**5.527.638**	**18,00%**
		TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**20.639.129**		**4.249.997**		**8.228.843**	**20,59%**
3	**RED ELECTRICA**									
3.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**									
3.1.1	S.I.P. Salida toma doble GFCI 1F/20AMP en tubería PVC SCH40 1/2", caja galvanizada y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	16,00	171.144	2.738.304		-		-	
3.1.2	S.I.P. Salida sensor de movimiento tipo interruptor 360° 1F/15AMP En muro, Tubería PVC SCH40 D:1/2", Cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	32,00	138.700	4.438.400		-		-	
3.1.3	S.I.P Luminaria de sobreponer 400x120 para uso interior, fabricada en lámina de acero COLD ROLLED, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate y difusor lamina acrílico opalizado L11. Producto para instalación de sobreponer, en temperatura de color 5000K flujo lumínico de 4400Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 28.56W	UND	4,00	424.118	1.696.472		-		-	

3.1.4	S.I.P. Luminaria tipo bala 72x83 para incrustar, Producto tipo DOWNLIGHT de uso interior fabricado en aluminio inyectado, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate en temperatura de color 6500K flujo lumínico de 550Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 6.00W.	UND	40,00	65.207	2.608.280		-		-	
3.1.5	S.I.P Luminaria tipo bala GS 15W 5000K	Und	12,00	144.940	1.739.280		-		-	
3.1.6	S.I.P Letrero lumínico de emergencia SALIDA 90E 300X185X45 2.6W 120-277V SOBREPONER	UND	20,00	107.422	2.148.440		-		-	
3.1.7	S.I.P Luminaria de emergencia 185X50X108 SOBREPONER 2-BL 2W	UND	40,00	112.486	4.499.440		-		-	
3.1.8	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP en techo, Tubería D:1/2" SCH40, Caja octogonal y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	66,00	123.004	8.118.264		-		-	
3.1.9	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP emergencia, Tubería D:1/2 EMT, Caja RADWELL 5800 y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, incluye fijación, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	45,00	178.147	8.016.615		-		-	
3.1.10	S.I.A. Tablero de circuitos para baños, incluye 6 protecciones de 20A	UND	4,00	826.632	3.306.528		-		-	
				Sub Total	**39.310.023**		**-**		**-**	**0%**
		TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS			**39.310.023**		**-**		**-**	**0%**
4	**MUROS**									
4.1	Suministro e instalación de muro doble cara en lámina de fibrocemento 8mm. Estructura base 6. incluye estuco y dos manos de pintura	M2	84,00	171.543	14.409.612		-		-	
4.2	Carteras en lámina de fibrocemento 8mm dos caras, en marco ventana y puertas	ML	163,80	68.788	11.267.474		-		-	
				Sub Total	**25.677.086**		**-**		**-**	**0%**
		TOTAL MAMPOSTERIA			**25.677.086**		**-**		**-**	**0%**
5	**REPELLOS**									
5.1	Repello de piso y pared con mortero 1:4 espesor 2cm. Incluye aditivo impermeabilizante.	M2	1374,872	44.402	61.047.067	87,96	3.905.600	175,92	7.811.200	6,40%
5.2	Impermeabilización de losa de entrepiso y muros laterales de terraza, con recubrimiento impermeabilizante acrílico de alto desempeño con tecnología DFX y fibras para impermeabilizar cubiertas	M2	660,00	51.240	33.818.400		-		-	
				Sub Total	**94.865.467**		**3.905.600**		**7.811.200**	**4,12%**
		TOTAL REPELLOS			**94.865.467**		**3.905.600**		**7.811.200**	**4,12%**
6	**ENCHAPES**									
6.1	**PISOS**									
6.1.1	Enchape cerámica de piso estructurado 20.6x92.6cm, uso comercial moderado	M2	258,00	132.605	34.212.090		-		-	
6.1.2	Enchape cerámica de piso 60x60cm color gris, uso exteriores tráfico comercial	M2	88,00	100.281	8.824.728		-		-	
6.1.3	Acabado para uniones entre muro y losa de piso en media caña con mortero 1-4 H: 0,07m	ML	85,00	27.327	2.322.795		-		-	
				Sub Total	**45.359.613**		**-**		**-**	
6.2	**PARED**									
6.2.1	Enchape cerámica de pared color marfil caras diferenciadas 30.1x75.3cm	M2	457,00	113.777	51.996.089		-		-	
6.2.2	Guarda canto flecha 8 milímetros cromo aluminio mate	ML	31,00	12.988	402.628		-		-	
6.2.3	Suministro e instalación de espejo E= 3mm flotante biselado en sus cuatro lados sobre soporte metálico	M2	20,00	361.837	7.236.740		-		-	
6.2.4	Mesón en granito artificial verde uva tuba incluye solapa inferior en aglomerado ancho 50cm con melamina, ancho de mesón 0.60m	ML	17,00	1.146.712	19.494.104		-		-	
				Sub Total	**79.129.561**		**-**		**-**	**0%**
		TOTAL ENCHAPES			**124.489.174**		**-**		**-**	**0%**
7	**ESTUCOS**									
7.1	Estuco acrílico para exteriores, incluye juntas, filos y dilataciones	M2	320,00	21.750	6.960.000		-		-	
7.2	Estuco plástico para muros y resanes incluye juntas, filos y dilataciones	M2	973,00	16.641	16.191.693	470,65	7.832.087	973,00	16.191.693	48,37%
				Sub Total	**23.151.693**		**7.832.087**		**16.191.693**	**33,83%**
		TOTAL ESTUCOS			**23.151.693**		**7.832.087**		**16.191.693**	**33,83%**
8	**PINTURA**									
8.1	Pintura de muros en mampostería 3 manos, vinilo tipo 1, lavable	M2	5137,00	12.785	65.676.545	2.242,00	28.663.970	2.419,00	30.926.915	43,64%
8.2	Pintura para exteriores (3 manos) para paredes.	M2	1280,00	27.659	35.403.520		-		-	
8.3	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial ancho 10cm, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, para pavimento rígido	ML	173,52	14.418	2.501.811		-		-	
8.4	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial, números con circunferencias de 66 y 40cm para carros y motos. imprimación en negro y pintura tráfico vehicular, incluye micro esferas, para pavimento rígido	UND	42,00	30.758	1.291.836		-		-	
8.5	Aplicación de pintura en frio base solvente para flechas de ingreso y salida, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, sobre pavimento rígido	M2	27,00	59.594	1.609.038		-		-	
				Sub Total	**106.482.750**		**28.663.970**		**30.926.915**	**26,92%**
		TOTAL PINTURA			**106.482.750**		**28.663.970**		**30.926.915**	**26,92%**
9	**CARPINTERIAS**									
9.1	Suministro e instalación de puerta de dos hojas batientes elaborada en tubular aluminio estriado ANOLOC, incluye chapa pomo de alcoba metálica pasador y argolla para candado. Medidas de cada hoja 0.9mx2.10m (ver plano A-022, P-T3)	UND	1,00	2.374.136	2.374.136		-		-	
9.2	Sellado de juntas entre muros y marcos de ventanería con sellador de juntas de poliuretano.	ML	367,00	11.048	4.054.616		-		-	
				Sub Total	**6.428.752**		**-**		**-**	**0%**
		TOTAL CARPINTERIAS			**6.428.752**		**-**		**-**	**0%**
10	**CUBIERTAS Y CIELO RASO**									
10.2	Limpieza, lavado, cambio de amarras y ganchos, aplicación de sellante en amarras de policarbonato alveolar	M2	33,00	32.738	1.080.354		-		-	
10.3	Suministro e instalación de cielo raso desmontable, láminas de fibra mineral 0,60m x 0,60m, incluye estructura	M2	220,00	89.265	19.638.300		-		-	
				Sub Total	**20.718.654**		**-**		**-**	**0%**
		TOTAL CUBIERTAS Y CIELO RASO			**20.718.654**		**-**		**-**	**0%**
11	**APARATOS SANITARIOS Y DOTACION BAÑOS**									

11.1	Kit Taza sanitaria entrada superior con fluxómetro con sensor, blanco institucional (Incluye Taza Sanitaria para Fluxómetro, asiento sanitario, sensor, sistema conexión entrada superior)	UND	4	3.778.631	15.114.524		-		-	
11.2	Taza sanitaria alongado, blanco institucional ultra ahorradora (Sanitario con push)	UND	28	1.228.494	34.397.832		-		-	
11.3	Barra de seguridad Fija Recta en acero inoxidable (baño para personas con movilidad reducida), incluye anclajes	UND	4	463.827	1.855.308		-		-	
11.4	Barra de seguridad abatible (baño para personas con movilidad reducida) incluye anclajes	UND	4	641.649	2.566.596		-		-	
11.5	Lavamanos blanco institucional, para personas con movilidad reducida, incluye anclajes	UND	4	553.338	2.213.352		-		-	
11.6	Lavamanos blanco institucional, para incrustar en mesones	UND	20	328.045	6.560.900		-		-	
11.7	Suministro e instalación de brazo de soporte para lavamanos	JUEGO	4	288.360	1.153.440		-		-	
11.8	Suministro e instalación de grifería para lavamanos y desagüe tipo botella sencillo incluye acople	UND	24	62.127	1.491.048		-		-	
11.9	Construcción lava traperos 70x50x50cm, enchapado.	UND	4	622.329	2.489.316		-		-	
11.10	Kit Orinal arrecife o similar para fluxómetro	UND	8	1.284.163	10.273.304		-		-	
11.11	Dispensador De Papel Higiénico Acero Inoxidable Diámetro De 26 Cm	UND	16	157.457	2.519.312		-		-	
11.12	Papelera metálica en acero inoxidable según especificaciones	UND	32	530.403	16.972.896		-		-	
11.13	Dispensador de jabón para empotrar en pared, en acero inoxidable, 1.2Litros	UND	16	253.414	4.054.624		-		-	
11.14	Suministro e instalación de divisiones sanitarias a piso en acero inoxidable AISI SAE 304 para baños de uso institucional. Batería completa con tres (3) cubículos para unidades sanitarias. Incluye tornillería y accesorios.	UND	8,00	8.420.295	67.362.360		-		-	
11.15	Dispensador De Toallas De Papel En Z Acero Inoxidable De 27x27x10 Cm	UND	16,00	186.293	2.980.688		-		-	
				Sub Total	**172.005.500**		**-**		**-**	**0%**
		TOTAL APARATOS SANITARIOS			**172.005.500**		**-**		**-**	**0%**
12	**SEÑALIZACIÓN**									
12.1	Suministro e instalación de placa de señalización de 0,65 x 0,50 m con planimetría salidas de emergencia, en acrílico de 2.4 con impresión full color y regletas en MDF para su instalación.	UND	5,00	229.178	1.145.890		-		-	
12.2	Suministro e instalación Franjas Guías longitudinales de ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	600,00	10.725	6.435.000		-		-	
12.3	Suministro e instalación de Punto alerta ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	2100,00	5.658	11.881.800		-		-	
12.4	Suministro e Instalación de Loseta alerta en policarbonato, 20 x 20 cm., Altura total: 5mm, Peso 150 gr, incluye anclaje	UND	15,00	43.268	649.020		-		-	
12.5	Suministro e instalación de letreros luminosos informativos en parqueadero doble cara, ubicado en sótano 1.50x0.40m	UND	3,00	576.720	1.730.160		-		-	
12.6	Suministro e instalación de letras en acero inoxidable de la frase: PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA y Escudo de la Rama judicial diámetro 50cm, tamaño de letra 30cm cada una, según diseño	UND	1,00	5.767.200	5.767.200		-		-	
				Sub Total	**27.609.070**		**-**		**-**	**0%**
		TOTAL SEÑALIZACIÓN			**27.609.070**		**-**		**-**	**0%**
13	**VARIOS Y ASEO GENERAL**									
13.1	Brigada de aseo	PERSONA/ MES	6,00	2.304.481	13.826.886		-		-	
				Sub Total	**13.826.886**		**-**		**-**	**0%**
		TOTAL VARIOS Y ASEO			**13.826.886**		**-**		**-**	**0%**
				TOTAL COSTO DIRECTO:	748.356.821		49.789.908		101.129.700	**6,65%**
				ADMINISTRACIÓN (18.73%)	140.167.233		9.325.650		18.941.593	
				IMPREVISTOS (3%)	22.450.705		1.493.697		3.033.891	
				UTILIDAD (5%)	37.417.841		2.489.495		5.056.485	
				IVA (19%)	7.109.390		473.004		960.732	
				TOTAL PRESUPUESTO:	**955.501.990**		**63.571.724**		**129.122.401**	**6,65%**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO
INFORME SEMANAL DE OBRA N° 7

I. INFORMACIÓN GENERAL

N° CONTRATO Y FECHA: CO1.PCCNTR.6947019 del 29 de octubre de 2024 — TRAMO (S): N.A. — FECHA: 19/01/2025

ENTIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO — SEMANA No.: 7 del 14/01/2025 al 19/01/2025

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. DIANA VIVANCO — ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO

OBJETO: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO" — FECHA DE INICIO: 14/11/2024

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA
INTEGRANTES: REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO MANRIQUE

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.6947019 del 29 de octubre de 2024
PLAZO INICIAL: 45 días
PLAZO ADICIONAL: 60 días
PLAZO ACUMULADO: 105 días
VALOR INICIAL: $ 955.501.990,00
ADICIONES: $ 0,00
VALOR ACUMULADO: $ 955.501.990,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
INTEGRANTES:

CONTRATO No.: O1.PCCNTR.6973355
PLAZO INICIAL: 45 cuarenta y cinco días
PLAZO ACUMULADO:
VALOR INICIAL: $ 33.336.660,00
ADICIONES: $ 0,00
VALOR ACUMULADO: $ 33.336.660,00

II. AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS OBRA:


ESTUDIOS Y DISEÑOS:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ -
OBRA:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 0,00
TOTAL OBRA + EST Y DISEÑOS:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 0,00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 0,00

INTERVENTORÍA:
COSTOS EJECUTADOS ACUMULADOS:
COSTOS PROGRAMADOS ACUMULADOS:

ESTUDIOS Y DISEÑOS SEMANAL:
PROGRAMADA: $ -
EJECUTADA: $ -
OBRA SEMANAL:
PROGRAMADA: $ 0,00
EJECUTADA: $ 0,00
TOTAL OBRA + E Y D SEMANAL:
PROGRAMADA: $ 0,00
EJECUTADA: $ 0,00

III. AVANCE FÍSICO

DESCRIPCIÓN	EJECUTADO ACUMULADO PROYECTO													
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	TOTAL
Iniciales			10,04%	10,04%	10,04%	9,22%								39,34%
Desmonte y Retiros			20,42%	16,74%	12,74%	9,49%								59,39%
Demoliciones			13,12%	12,12%	7,74%	4,65%	11,85%							49,48%
Estucos				13,30%	13,30%	9,51%	33,83%							69,94%
Red Suministro Agua Potable						29,80%	29,80%							59,60%
Red Sanitaria, Pluvial, Ventilación						16,32%	18,00%							34,32%
Repellos						4,12%	4,12%							8,24%
Pinturas							26,92%							26,92%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
AVANCE OBRA COSTOS DIRECTOS														0,00%
AVANCE OBRA TOTAL														0,00%

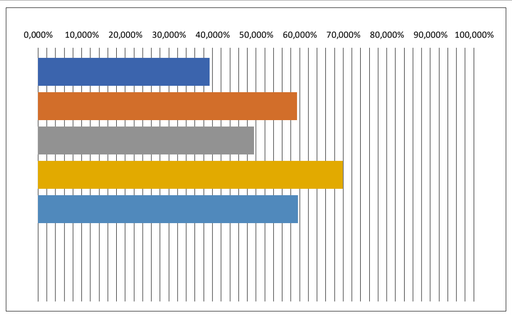

MAQUINARIA Y EQUIPOS		
DESCRIPCIÓN	MES 1	TOTAL
HERRAMIENTA MENOR		
TALADRO PERCUTOR		

S 1 $ 0,00 — S 2 $ 0,00 — S 3 $ 14.250.052,00 — S 4 $ 16.506.584,00 — S 5 $ 12.860.904,00 — S 6 $ 21.932.972,00

S 7 $ 63.571.724,00 — S 8 — S 9 — S 10 — S 11 — S 12 — S 13

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

BOTADEROS	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONE: La escombrera Palermo, se encuentra ubicada en la verada Caliyaco, ubicada en zona rural del municiipio de Mocoa Putumayo, Gestor de disposición final de RCD, autorizado mediante resolución 00003 de 08/07/2019 código de Inscripción DPT-3389-25-07-2019 / km 1:200 Vía a Villagarzón.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 13
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 13
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0,0
SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 0,0

OBSERVACIONES: El personal mano de obra no calificada es en su totalidad es de la vereda brisas del Mocoa. La selección de las hojas de vida se realizo de la documentación entregada por la JAC quienes realizaron la convocatoria y certificaron que las persona sean del sector.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ADMINISTRATIVAS, LEGALES, FINANCIERAS

FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA E INTERVENTORIA, AFILIACION DEL PERSONAL A LAS ENTIDADES ASEGURADORAS Y DE SALUD.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO
INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N° 7

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO" — TRAMO (S): N.A. — FECHA: 19/01/2025

SECRETARIA EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO — RAMA JUDICIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 7 del 14/01/2025 al 19/01/2025

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

TÉCNICAS

Realizar retiro de escombros
Continuar resane de paredes en piso 1, 2, 3 Y 4 en todas las áreas internas.
Continuar pintura para interiores en piso 1, 2, 3 Y 4 en áreas internas

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

AMBIENTAL Y SST

El componente de seguridad y salud en el trabajo realizo el seguimiento punto a punto del plan de manejo básico de seguridad y salud en el trabajo en el cual se encontró lo siguiente :

Se realizan charlas preoperacionales, entrega en epps, demarcación de zonas con cinta peligro.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con pinturas en los 4 pisos en áreas interiores
Continuar con la instalación de todos los temas eléctricos

NOTA:

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES

Fecha de inicio 14 de noviembre de 2024
Fecha de terminación inicial 31 de diciembre de 2024
Fecha de suspensión No.1 23 de diciembre de 2024
Fecha de reinicio No. 1 14 de enero de 2025
Fecha de terminación No.2 22 de enero de 2025
Tiempo de adición No. 1 dos meses

OBSERVACIONES:	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA:	FIRMA:
	NOMBRE: MARLON FERNANDO ARTEAGA POTOSI	NOMBRE: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
	N° MAT: 52202-333602 NRÑ	No. MAT: 63202094726 QND

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

INFORME SEMANAL DE OBRA N° 8

PÁGINA	1	DE	1

SECRETARIA EJECUTORA: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO

FECHA: 26 / 1 / 2025

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.6947019

Semana Número: 8 Del: 20/01/2025 Al: 26/01/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 53 Días Corresponde al : 50,48% del Plazo total del Contrato

Supervisor Técnico de Contrato ING. DIANA VIVANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO"

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,52%	20,68%
Valor básico de la Obra programada:	$ 25.439.086	$ 197.639.085

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	4,65%	18,17%
Valor básico de Obra Ejecutada:	$ 44.417.781	$ 173.540.211

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.
Contrato No.	CO1.PCCNTR.6947019
Valor Inicial:	$ 955.501.990,00
Plazo Inicial:	2 MESES
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	14 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Fecha de Suspensión 1	23 de diciembre de 2024
Fecha de Reinicio 1	14 de enero de 2025
Fecha de Terminación 2	22 de enero de 2024
Tiempo de Adición 1	2 MESES
Fecha de Terminación Con Adición en Tiempo 1	22 de marzo de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
Contrato No.	O1.PCCNTR.6973355 DEL 01/11/2024
Valor Actualizado:	$ 33.336.660,00
Plazo Inicial:	45 cuarenta y cinco dias calendario
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	14 de noviembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Continuar resane de paredes en piso 1, 2, 3 Y 4 en todas las áreas internas.
Continuar pintura para interiores en piso 1, 2, 3 Y 4 en áreas internas


ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con pinturas en los 4 pisos en áreas interiores
Continuar con la instalación de todos los temas eléctricos

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Fecha de inicio 14 de noviembre de 2024
Fecha de terminación inicial 31 de diciembre de 2024
Fecha de suspensión No.1 23 de diciembre de 2024
Fecha de reinicio No. 1 14 de enero de 2025
Fecha de terminación No.2 22 de enero de 2025
Tiempo de adición No. 1 dos meses
Fecha de terminación según adición en tiempo No.1 22 de marzo de 2025

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO	Firma: Nombre: MARLON FERNANDO ARTEAGA P. Matrícula 52202-338602 NRÑ	Firma: Nombre: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO Matrícula 63202094726 QND

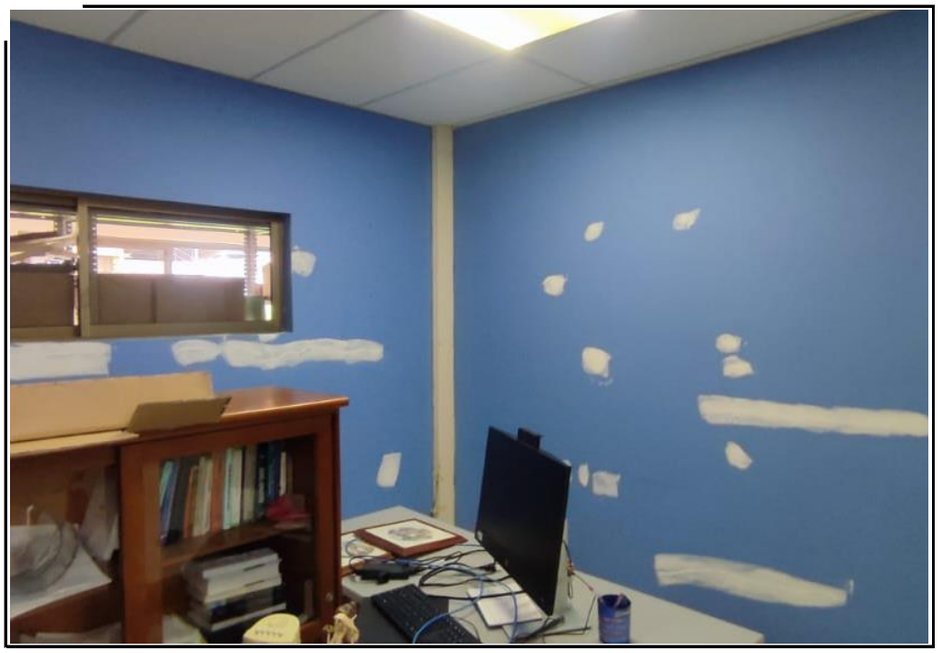

Fotografía: 1

Continuar resane de paredes en piso 1, 2, 3 Y 4 en todas las áreas internas.



Fotografía: 2

Continuar pintura para interiores en piso 1, 2, 3 Y 4 en áreas internas



Fotografía: 3

Continuar resane de paredes en piso 1, 2, 3 Y 4 en todas las áreas internas.



Fotografía: 4

Continuar con la instalación de todos los temas eléctricos



Fotografía: 5

Continuar resane de paredes en piso 1, 2, 3 Y 4 en todas las áreas internas.



Fotografía: 6

Continuar resane de paredes en piso 1, 2, 3 Y 4 en todas las áreas internas.

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO		
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**CONTRATO DE OBRA No.**	CO1.PCCNTR.6947019
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.
	INTERVENTOR:	ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO

OBJETO "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO"

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	SEMANA 8		ACUMULADO		% EJECUTADO SEMANA 8
						CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	
1	**PRELIMINARES**									
1.1	**INICIALES**									
1.1.1	Localización y replanteo arquitectónico, incluye planos récord	M2	332,00	3.864	1.282.848		-	131,94	509.816	
1.1.2	Instalación y desinstalación de muro una cara drywall, provisional para cerrar las obras, incluye puerta con marco para ingreso de trabajadores	M2	53,00	77.249	4.094.197	5,00	386.245	21,50	1.660.854	9,43%
1.1.3	Señalización de obra en lona de 60x40cm impresión full color, incluye marco y anclaje	UND	9,00	60.693	546.237		-	9,00	546.237	
				Sub Total	**5.923.282**		**386.245**		**2.716.907**	**6,52%**
1.2	**DESMONTES Y RETIROS**									
1.2.1	Desmonte de marcos y puertas, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	57,00	26.406	1.505.142		-	36,00	950.616	0,00%
1.2.2	Desmonte de marco, ventana y vidrio, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	1,00	27.367	27.367		-			
1.2.3	Desmonte de cielo raso en fibra mineral y/o panel yeso y/o fibrocemento, incluye estructura soporte, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	M2	250,00	29.781	7.445.250		-	173,98	5.181.298	
1.2.4	Desmonte de Tasas sanitarias, orinales y lavamanos, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	UND	48,00	53.587	2.572.176		-	48,00	2.572.176	
1.2.5	Desmonte de instalaciones hidrosanitarias, incluye tuberías y accesorios, regatas y sellos provisionales, cargue a volqueta	UND	72,00	57.730	4.156.560		-	43,00	2.482.390	0,00%
1.2.6	Rasqueteo, cepillo y limpieza manual de superficies, con el fin de retirar impurezas y capas de pintura existentes.	M2	1017,00	4.863	4.945.671	456,00	2.217.528	527,00	2.562.801	44,84%
1.2.7	Retiro de luminarias ubicadas en cielos rasos y pared, incluye trasiego a punto de acopio	UND	46,00	21.660	996.360		-	40,00	866.400	0,00%
1.2.8	Retiro de redes eléctricas en piso, techo y pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	GL	1,00	2.233.550	2.233.550	0,20	446.710	1,00	2.233.550	20,00%
				Sub Total	**23.882.076**		**2.664.238**		**16.849.231**	**11,16%**
1.3	**DEMOLICIONES**									
1.3.1	Demolición muro E ≤ 15CM en mampostería maciza o hueca, incluye cortes con pulidora, trasiegos y cargue a volqueta.	M2	220,00	17.941	3.947.020	12,00	215.292	139,24	2.498.105	5,45%
1.3.2	Demolición de enchape de pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	704,40	14.760	10.396.413	123,00	1.815.480	568,12	8.385.451	17,46%
1.3.3	Demolición de enchapes de piso, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	283,00	13.980	3.956.340		-	142,00	1.985.160	
1.3.4	Demolición repello de piso, incluye picado Eprom = 0.03m, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	835,00	12.959	10.820.765		-	178,00	2.306.702	
1.3.5	Demolición repello de pared, muros mampostería eprom= 0.02m, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	291,80	15.119	4.411.785		-	291,00	4.399.629	
1.3.6	Cargue, transporte y retiro del material sobrante proveniente de las obras de mantenimiento, hasta el botadero.	M3	234,00	40.171	9.400.014		-	94,00	3.776.074	
1.3.7	Demolición de mesones en concreto, recubierto con granito incluye salpicadero	M2	11,00	37.722	414.942		-	3,58	135.045	
				Sub Total	**43.347.279**		**2.030.772**		**23.486.166**	**4,68%**
		TOTAL PRELIMINARES			**73.152.637**		**5.081.255**		**43.052.304**	**6,95%**
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**									
2.1	**RED SUMINISTRO AGUA POTABLE**									
2.1.1	Instalaciones PVC 1/2" RDE 13.5	ML	95,00	7.575	719.625		-	84,00	636.300	
2.1.2	Instalaciones PVC 3/4" RDE 21	ML	28,00	10.939	306.292		-	28,00	306.292	
2.1.3	Instalaciones PVC RDE 21 1"	ML	50,21	12.038	604.428		-	25,60	308.173	
2.1.4	Instalaciones PVC RDE 21 2"	ML	6,00	26.949	161.694		-		-	
2.1.5	Punto hidráulico PVC 1/2"	UND	60,00	24.174	1.450.440		-	60,00	1.450.440	
2.1.6	Punto hidráulico PVC 3/4"	UND	8,00	26.324	210.592		-		-	
2.1.7	Punto hidráulico PVC 1/2" incluye válvula control paso 1/2" y tapa PVC Blanca 15x15cm	UND	18,00	59.937	1.078.866		-		-	
				Sub Total	**4.531.937**		**-**		**2.701.205**	**0,00%**
2.2	**RED SANITARIA, PLUVIAL, VENTILACION**									
2.2.1	Instalaciones sanitarias PVC 2"	ML	58,00	25.087	1.455.046		-	26,00	652.262	
2.2.2	Instalaciones sanitarias PVC 4"	ML	119,00	42.006	4.998.714		-	52,00	2.184.312	
2.2.3	Instalaciones ventilación PVC 2"	ML	183,00	20.194	3.695.502		-		-	
2.2.4	Instalaciones ventilación PVC 3"	ML	35,00	31.646	1.107.610		-		-	
2.2.5	Punto sanitario 4" WC	UND	32,00	45.965	1.470.880		-	32,00	1.470.880	
2.2.6	Punto sanitario 2"	UND	44,00	33.894	1.491.336		-	36,00	1.220.184	
2.2.7	Suministro e instalación de rejilla de piso en acero inoxidable cuadrada de 10cm salida a tubería 2"	UND	24,00	48.380	1.161.120		-		-	
2.2.8	Suministro e instalación de tubería de conexión de desagües de aires acondicionados	ML	36,00	20.194	726.984		-		-	
				Sub Total	**16.107.192**		**-**		**5.527.638**	**0,00%**
		TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**20.639.129**		**-**		**8.228.843**	**0,00%**
3	**RED ELECTRICA**									
3.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**									
3.1.1	S.I.P. Salida toma doble GFCI 1F/20AMP en tubería PVC SCH40 1/2", caja galvanizada y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	16,00	171.144	2.738.304		-		-	
3.1.2	S.I.P. Salida sensor de movimiento tipo interruptor 360° 1F/15AMP En muro, Tubería PVC SCH40 D:1/2", Cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	32,00	138.700	4.438.400		-		-	
3.1.3	S.I.P Luminaria de sobreponer 400x120 para uso interior, fabricada en lámina de acero COLD ROLLED, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate y difusor lamina acrílico opalizado L11. Producto para instalación de sobreponer, en temperatura de color 5000K flujo lumínico de 4400Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 28.56W	UND	4,00	424.118	1.696.472		-		-	

3.1.4	S.I.P. Luminaria tipo bala 72x83 para incrustar, Producto tipo DOWNLIGHT de uso interior fabricado en aluminio inyectado, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate en temperatura de color 6500K flujo lumínico de 550Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 6.00W	UND	40,00	65.207	2.608.280		-		-	
3.1.5	S.I.P Luminaria tipo bala GS 15W 5000K	Und	12,00	144.940	1.739.280		-		-	
3.1.6	S.I.P Letrero lumínico de emergencia SALIDA 90E 300X185X45 2.6W 120-277V SOBREPONER	UND	20,00	107.422	2.148.440		-		-	
3.1.7	S.I.P Luminaria de emergencia 185X50X108 SOBREPONER 2-BL 2W	UND	40,00	112.486	4.499.440		-		-	
3.1.8	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP en techo, Tubería D:1/2" SCH40, Caja octogonal y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	66,00	123.004	8.118.264		-		-	
3.1.9	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP emergencia, Tubería D:1/2 EMT, Caja RADWELL 5800 y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, incluye fijación, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	45,00	178.147	8.016.615		-		-	
3.1.10	S.I.A. Tablero de circuitos para baños, incluye 6 protecciones de 20A	UND	4,00	826.632	3.306.528		-		-	
				Sub Total	**39.310.023**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS			**39.310.023**		**-**		**-**	**0,00%**
4	**MUROS**									
4.1	Suministro e instalación de muro doble cara en lámina de fibrocemento 8mm. Estructura base 6. incluye estuco y dos manos de pintura	M2	84,00	171.543	14.409.612		-	-	-	0,00%
4.2	Carteras en lámina de fibrocemento 8mm dos caras, en marco ventana y puertas	ML	163,80	68.788	11.267.474		-	-	-	0,00%
				Sub Total	**25.677.086**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL MAMPOSTERIA			**25.677.086**		**-**		**-**	**0,00%**
5	**REPELLOS**									
5.1	Repello de piso y pared con mortero 1:4 espesor 2cm. Incluye aditivo impermeabilizante.	M2	1374,872	44.402	61.047.067	89,00	3.951.778	264,92	11.762.978	6,47%
5.2	Impermeabilización de losa de entrepiso y muros laterales de terraza, con recubrimiento impermeabilizante acrílico de alto desempeño con tecnología DFX y fibras para impermeabilizar cubiertas	M2	660,00	51.240	33.818.400		-		-	
				Sub Total	**94.865.467**		**3.951.778**		**11.762.978**	**4,17%**
		TOTAL REPELLOS			**94.865.467**		**3.951.778**		**11.762.978**	**4,17%**
6	**ENCHAPES**									
6.1	**PISOS**									
6.1.1	Enchape cerámica de piso estructurado 20.6x92.6cm, uso comercial moderado	M2	258,00	132.605	34.212.090		-		-	
6.1.2	Enchape cerámica de piso 60x60cm color gris, uso exteriores tráfico comercial	M2	88,00	100.281	8.824.728		-		-	
6.1.3	Acabado para uniones entre muro y losa de piso en media caña con mortero 1-4 H: 0,07m	ML	85,00	27.327	2.322.795		-		-	
				Sub Total	**45.359.613**		**-**		**-**	
6.2	**PARED**									
6.2.1	Enchape cerámica de pared color marfil caras diferenciadas 30.1x75.3cm	M2	457,00	113.777	51.996.089		-		-	
6.2.2	Guarda canto flecha 8 milímetros cromo aluminio mate	ML	31,00	12.988	402.628		-		-	
6.2.3	Suministro e instalación de espejo E= 3mm flotante biselado en sus cuatro lados sobre soporte metálico	M2	20,00	361.837	7.236.740		-		-	
6.2.4	Mesón en granito artificial verde uva tuba incluye solapa inferior en aglomerado ancho 50cm con melamina, ancho de mesón 0.60m	ML	17,00	1.146.712	19.494.104		-		-	
				Sub Total	**79.129.561**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL ENCHAPES			**124.489.174**		**-**		**-**	**0,00%**
7	**ESTUCOS**									
7.1	Estuco acrílico para exteriores, incluye juntas, filos y dilataciones	M2	320,00	21.750	6.960.000		-		-	
7.2	Estuco plástico para muros y resanes incluye juntas, filos y dilataciones	M2	973,00	16.641	16.191.693		-	973,00	16.191.693	
				Sub Total	**23.151.693**		**-**		**16.191.693**	**0,00%**
		TOTAL ESTUCOS			**23.151.693**		**-**		**16.191.693**	**0,00%**
8	**PINTURA**									
8.1	Pintura de muros en mampostería 3 manos, vinilo tipo 1, lavable	M2	5137,00	12.785	65.676.545	1.654,00	21.146.390	4.073,00	52.073.305	32,20%
8.2	Pintura para exteriores (3 manos) para paredes.	M2	1280,00	27.659	35.403.520		-		-	
8.3	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial ancho 10cm, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, para pavimento rígido	ML	173,52	14.418	2.501.811		-		-	
8.4	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial, números con circunferencias de 66 y 40cm para carros y motos. imprimación en negro y pintura tráfico vehicular, incluye micro esferas, para pavimento rígido	UND	42,00	30.758	1.291.836		-		-	
8.5	Aplicación de pintura en frio base solvente para flechas de ingreso y salida, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, sobre pavimento rígido	M2	27,00	59.594	1.609.038		-		-	
				Sub Total	**106.482.750**		**21.146.390**		**52.073.305**	**19,86%**
		TOTAL PINTURA			**106.482.750**		**21.146.390**		**52.073.305**	**19,86%**
9	**CARPINTERIAS**									
9.1	Suministro e instalación de puerta de dos hojas batientes elaborada en tubular aluminio estriado ANOLOC, incluye chapa pomo de alcoba metálica pasador y argolla para candado. Medidas de cada hoja 0.9mx2.10m (ver plano A-022. P-T3)	UND	1,00	2.374.136	2.374.136		-		-	
9.2	Sellado de juntas entre muros y marcos de ventanería con sellador de juntas de poliuretano.	ML	367,00	11.048	4.054.616		-		-	
				Sub Total	**6.428.752**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL CARPINTERIAS			**6.428.752**		**-**		**-**	**0,00%**
10	**CUBIERTAS Y CIELO RASO**									
10.2	Limpieza, lavado, cambio de amarras y ganchos, aplicación de sellante en amarras de policarbonato alveolar	M2	33,00	32.738	1.080.354		-		-	
10.3	Suministro e instalación de cielo raso desmontable, láminas de fibra mineral 0,60m x 0,60m, incluye estructura	M2	220,00	89.265	19.638.300		-		-	
				Sub Total	**20.718.654**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL CUBIERTAS Y CIELO RASO			**20.718.654**		**-**		**-**	**0,00%**
11	**APARATOS SANITARIOS Y DOTACION BAÑOS**									

11.1	Kit Taza sanitaria entrada superior con fluxómetro con sensor, blanco institucional (Incluye Taza Sanitaria para Fluxómetro, asiento sanitario, sensor, sistema conexión entrada superior)	UND	4	3.778.631	15.114.524		-		-	
11.2	Taza sanitaria alongado, blanco institucional ultra ahorradora (Sanitario con push)	UND	28	1.228.494	34.397.832		-		-	
11.3	Barra de seguridad Fija Recta en acero inoxidable (baño para personas con movilidad reducida), incluye anclajes	UND	4	463.827	1.855.308		-		-	
11.4	Barra de seguridad abatible (baño para personas con movilidad reducida) incluye anclajes	UND	4	641.649	2.566.596		-		-	
11.5	Lavamanos blanco institucional, para personas con movilidad reducida, incluye anclajes	UND	4	553.338	2.213.352		-		-	
11.6	Lavamanos blanco institucional, para incrustar en mesones	UND	20	328.045	6.560.900		-		-	
11.7	Suministro e instalación de brazo de soporte para lavamanos	JUEGO	4	288.360	1.153.440		-		-	
11.8	Suministro e instalación de grifería para lavamanos y desagüe tipo botella sencillo incluye acople	UND	24	62.127	1.491.048		-		-	
11.9	Construcción lava traperos 70x50x50cm, enchapado.	UND	4	622.329	2.489.316		-		-	
11.10	Kit Orinal arrecife o similar para fluxómetro	UND	8	1.284.163	10.273.304		-		-	
11.11	Dispensador De Papel Higiénico Acero Inoxidable Diámetro De 26 Cm	UND	16	157.457	2.519.312		-		-	
11.12	Papelera metálica en acero inoxidable según especificaciones	UND	32	530.403	16.972.896		-		-	
11.13	Dispensador de jabón para empotrar en pared, en acero inoxidable, 1.2Litros	UND	16	253.414	4.054.624		-		-	
11.14	Suministro e instalación de divisiones sanitarias a piso en acero inoxidable AISI SAE 304 para baños de uso institucional. Batería completa con tres (3) cubículos para unidades sanitarias. Incluye tornillería y accesorios.	UND	8,00	8.420.295	67.362.360		-		-	
11.15	Dispensador De Toallas De Papel En Z Acero Inoxidable De 27x27x10 Cm	UND	16,00	186.293	2.980.688		-		-	
				Sub Total	**172.005.500**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL APARATOS SANITARIOS			**172.005.500**		**-**		**-**	**0,00%**
12	**SEÑALIZACIÓN**									
12.1	Suministro e instalación de placa de señalización de 0,65 x 0,50 m con planimetría salidas de emergencia, en acrílico de 2.4 con impresión full color y regletas en MDF para su instalación.	UND	5,00	229.178	1.145.890		-		-	
12.2	Suministro e instalación Franjas Guías longitudinales de ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	600,00	10.725	6.435.000		-		-	
12.3	Suministro e instalación de Punto alerta ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	2100,00	5.658	11.881.800		-		-	
12.4	Suministro e Instalación de Loseta alerta en policarbonato, 20 x 20 cm., Altura total: 5mm, Peso 150 gr, incluye anclaje	UND	15,00	43.268	649.020		-		-	
12.5	Suministro e instalación de letreros luminosos informativos en parqueadero doble cara, ubicado en sótano 1.50x0.40m	UND	3,00	576.720	1.730.160		-		-	
12.6	Suministro e instalación de letras en acero inoxidable de la frase: PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA y Escudo de la Rama judicial diámetro 50cm, tamaño de letra 30cm cada una, según diseño	UND	1,00	5.767.200	5.767.200		-		-	
				Sub Total	**27.609.070**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL SEÑALIZACIÓN			**27.609.070**		**-**		**-**	**0,00%**
13	**VARIOS Y ASEO GENERAL**									
13.1	Brigada de aseo	PERSONA/ MES	6,00	2.304.481	13.826.886	2,00	4.608.962	2,00	4.608.962	
				Sub Total	**13.826.886**		**4.608.962**		**4.608.962**	**33,33%**
		TOTAL VARIOS Y ASEO			**13.826.886**		**4.608.962**		**4.608.962**	**33,33%**

TOTAL COSTO DIRECTO:	748.356.821		34.788.385		135.918.085	**4,65%**
ADMINISTRACIÓN (18.73%)	140.167.233		6.515.865		25.457.457	
IMPREVISTOS (3%)	22.450.705		1.043.652		4.077.543	
UTILIDAD (5%)	37.417.841		1.739.419		6.795.904	
IVA (19%)	7.109.390		330.490		1.291.222	
TOTAL PRESUPUESTO:	**955.501.990**		**44.417.781**		**173.540.211**	**4,65%**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO
INFORME SEMANAL DE OBRA N° 8

I. INFORMACIÓN GENERAL

N° CONTRATO Y FECHA: CO1.PCCNTR.6947019 del 29 de octubre de 2024 — TRAMO (S): N.A. — FECHA: 26/01/2025

ENTIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO — SEMANA No.: 8 del 20/01/2025 al 26/01/2025

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. DIANA VIVANCO — ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO

OBJETO: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO" — FECHA DE INICIO: 14/11/2024

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA
INTEGRANTES: REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO MANRIQUE

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.6947019 del 29 de octubre de 2024 — VALOR INICIAL: $ 955.501.990,00
PLAZO INICIAL: 45 dias — ADICIONES: $ 0,00
PLAZO ADICIONAL: 60 días
PLAZO ACUMULADO: 105 días — VALOR ACUMULADO: $ 955.501.990,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
INTEGRANTES:

CONTRATO No.: O1.PCCNTR.6973355 — VALOR INICIAL: $ 33.336.660,00
PLAZO INICIAL: 45 cuarenta y cinco días — ADICIONES: $ 0,00
PLAZO ACUMULADO: — VALOR ACUMULADO: $ 33.336.660,00

II. AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS OBRA:

ESTUDIOS Y DISEÑOS:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ -
OBRA:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 0,00
TOTAL OBRA + EST Y DISEÑOS:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 0,00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 0,00


INTERVENTORÍA:
COSTOS EJECUTADOS ACUMULADOS:
COSTOS PROGRAMADOS ACUMULADOS:

ESTUDIOS Y DISEÑOS SEMANAL:
PROGRAMADA: $ -
EJECUTADA: $ -
OBRA SEMANAL:
PROGRAMADA: $ 0,00
EJECUTADA: $ 0,00
TOTAL OBRA + E Y D SEMANAL:
PROGRAMADA: $ 0,00
EJECUTADA: $ 0,00

III. AVANCE FÍSICO

EJECUTADO ACUMULADO PROYECTO

DESCRIPCIÓN	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	TOTAL
Iniciales			10,04%	10,04%	10,04%	9,22%		6,52%						45,86%
Desmonte y Retiros			20,42%	16,74%	12,74%	9,49%		11,16%						70,55%
Demoliciones			13,12%	12,12%	7,74%	4,65%	11,85%	4,68%						54,16%
Estucos				13,30%	13,30%	9,51%	33,83%							69,94%
Red Suministro Agua Potable						29,80%	29,80%							59,60%
Red Sanitaria, Pluvial, Ventilación						16,32%	18,00%							34,32%
Repellos						4,12%	4,12%	4,17%						12,41%
Pinturas							26,92%	19,86%						46,78%
Varios y Aseo General								33,33%						33,33%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
AVANCE OBRA COSTOS DIRECTOS														0,00%
AVANCE OBRA TOTAL														0,00%

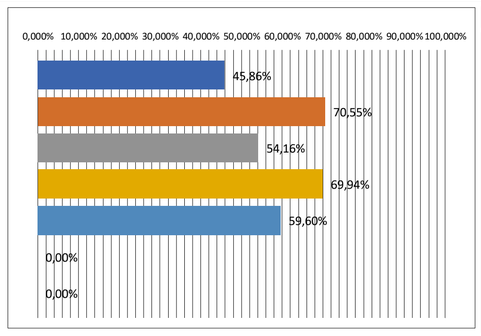

MAQUINARIA Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	MES 1	TOTAL
HERRAMIENTA MENOR		
TALADRO PERCUTOR		

S 1 $ 0,00 — S 2 $ 0,00 — S 3 $ 14.250.052,00 — S 4 $ 16.506.584,00 — S 5 $ 12.860.904,00 — S 6 $ 21.932.972,00

S 7 $ 63.571.724,00 — S 8 $ 44.417.781,00 — S 9 — S 10 — S 11 — S 12 — S 13

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

BOTADEROS	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONE: La escombrera Palermo, se encuentra ubicada en la verada Caliyaco, ubicada en zona rural del municipio de Mocoa Putumayo, Gestor de disposición final de RCD, autorizado mediante resolución 00003 de 08/07/2019 código de Inscripción DPT-3389-25-07-2019 / km 1:200 Vía a Villagarzón.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 13
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 13
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: El personal mano de obra no calificada es en su totalidad es de la vereda brisas del Mocoa. La selección de las hojas de vida se realizo de la documentación entregada por la JAC quienes realizaron la convocatoria y certificaron que las persona sean del sector.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ADMINISTRATIVAS, LEGALES, FINANCIERAS

FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA E INTERVENTORIA, AFILIACION DEL PERSONAL A LAS ENTIDADES ASEGURADORAS Y DE SALUD.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO
INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N° 8

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO" — TRAMO (S): N.A. — FECHA: 26/01/2025

SECRETARIA EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO — RAMA JUDICIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 8 del 20/01/2025 al 26/01/2025

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

TÉCNICAS

Continuar resane de paredes en piso 1, 2, 3 Y 4 en todas las áreas internas.
Continuar pintura para interiores en piso 1, 2, 3 Y 4 en áreas internas

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

AMBIENTAL Y SST

El componente de seguridad y salud en el trabajo realizo el seguimiento punto a punto del plan de manejo básico de seguridad y salud en el trabajo en el cual se encontró lo siguiente :
Se realizan charlas preoperacionales, entrega en epps, demarcación de zonas con cinta peligro.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con pinturas en los 4 pisos en áreas interiores
Continuar con la instalación de todos los temas eléctricos

NOTA:

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES

Fecha de reinicio No. 1 14 de enero de 2025
Fecha de terminación No.2 22 de enero de 2025
Tiempo de adición No. 1 dos meses
Fecha de terminación según adición en tiempo No.1 22 de marzo de 2025

OBSERVACIONES:	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA:	FIRMA:
	NOMBRE: MARLON FERNANDO ARTEAGA POTOSI	NOMBRE: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
	N° MAT: 52202-333602 NRÑ	No. MAT: 63202094726 QND

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

INFORME SEMANAL DE OBRA N° 9

PÁGINA	1	DE	1

SECRETARIA EJECUTORA: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO

FECHA: 2 / 2 / 2025

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.6947019

Semana Número: 9 Del: 27/01/2025 Al: 2/02/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 60 Días Corresponde al : 57,14% del Plazo total del Contrato

Supervisor Técnico de Contrato ING. DIANA VIVANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO"

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,66%	22,34%
Valor básico de la Obra programada:	$ 15.834.857	$ 213.473.942
Obra Física Ejecutada (%)	6,90%	25,07%
Valor básico de Obra Ejecutada:	$ 65.939.566	$ 239.479.805

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.
Contrato No.	CO1.PCCNTR.6947019
Valor Inicial:	$ 955.501.990,00
Plazo Inicial:	2 MESES
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	14 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Fecha de Suspensión 1	23 de diciembre de 2024
Fecha de Reinicio 1	14 de enero de 2025
Fecha de Terminación 2	22 de enero de 2024
Tiempo de Adición 1	2 MESES
Fecha de Terminación Con Adición en Tiempo 1	22 de marzo de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
Contrato No.	O1.PCCNTR.6973355 DEL 01/11/2024
Valor Actualizado:	$ 33.336.660,00
Plazo Inicial:	45 cuarenta y cinco dias calendario
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	14 de noviembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Continuar resane de paredes en piso 1, 2, 3 Y 4 en todas las áreas internas.
Continuar pintura para interiores en piso 1, 2, 3 Y 4 en áreas internas

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con pinturas en los 4 pisos en áreas interiores
Continuar con la instalación de todos los temas eléctricos

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Fecha de inicio 14 de noviembre de 2024
Fecha de terminación inicial 31 de diciembre de 2024
Fecha de suspensión No.1 23 de diciembre de 2024
Fecha de reinicio No. 1 14 de enero de 2025
Fecha de terminación No.2 22 de enero de 2025
Tiempo de adición No. 1 dos meses
Fecha de terminación según adición en tiempo No.1 22 de marzo de 2025

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO	Firma: Nombre: MARLON FERNANDO ARTEAGA P. Matrícula 52202-338602 NRÑ	Firma: Nombre: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO Matrícula 63202094726 QND



Fotografía: 1

Continuar resane de paredes en piso 1, 2, 3 Y 4 en todas las áreas internas.



Fotografía: 2

Continuar pintura para interiores en piso 1, 2, 3 Y 4 en áreas internas



Fotografía: 3

Continuar resane de paredes en piso 1, 2, 3 Y 4 en todas las áreas internas.



Fotografía: 4

Continuar con la instalación de todos los temas eléctricos



Fotografía: 5

Continuar resane de paredes en piso 1, 2, 3 Y 4 en todas las áreas internas.



Fotografía: 6

Continuar resane de paredes en piso 1, 2, 3 Y 4 en todas las áreas internas.

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO		
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**CONTRATO DE OBRA No.**	CO1.PCCNTR.6947019
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.
	INTERVENTOR:	ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO

OBJETO "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO"

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	SEMANA 9		ACUMULADO		% EJECUTADO SEMANA 9
						CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	
1	**PRELIMINARES**									
1.1	**INICIALES**									
1.1.1	Localización y replanteo arquitectónico, incluye planos récord	M2	332,00	3.864	1.282.848	67,06	259.120	199,00	768.936	20,20%
1.1.2	Instalación y desinstalación de muro una cara drywall, provisional para cerrar las obras, incluye puerta con marco para ingreso de trabajadores	M2	53,00	77.249	4.094.197	0,50	38.625	22,00	1.699.478	0,94%
1.1.3	Señalización de obra en lona de 60x40cm impresión full color, incluye marco y anclaje	UND	9,00	60.693	546.237		-	9,00	546.237	
				Sub Total	**5.923.282**		**297.745**		**3.014.651**	**5,03%**
1.2	**DESMONTES Y RETIROS**									
1.2.1	Desmonte de marcos y puertas, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	57,00	26.406	1.505.142	19,00	501.714	55,00	1.452.330	33,33%
1.2.2	Desmonte de marco, ventana y vidrio, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	1,00	27.367	27.367	1,00	27.367	1,00	27.367	100,00%
1.2.3	Desmonte de cielo raso en fibra mineral y/o panel yeso y/o fibrocemento, incluye estructura soporte, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	M2	250,00	29.781	7.445.250	25,02	745.121	199,00	5.926.419	10,01%
1.2.4	Desmonte de Tasas sanitarias, orinales y lavamanos, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	UND	48,00	53.587	2.572.176		-	48,00	2.572.176	
1.2.5	Desmonte de instalaciones hidrosanitarias, incluye tuberías y accesorios, regatas y sellos provisionales, cargue a volqueta	UND	72,00	57.730	4.156.560	20,00	1.154.600	63,00	3.636.990	27,78%
1.2.6	Rasqueteo, cepillo y limpieza manual de superficies, con el fin de retirar impurezas y capas de pintura existentes.	M2	1017,00	4.863	4.945.671	490,00	2.382.870	1.017,00	4.945.671	48,18%
1.2.7	Retiro de luminarias ubicadas en cielos rasos y pared, incluye trasiego a punto de acopio	UND	46,00	21.660	996.360	6,00	129.960	46,00	996.360	13,04%
1.2.8	Retiro de redes eléctricas en piso, techo y pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	GL	1,00	2.233.550	2.233.550	-	-	1,00	2.233.550	
				Sub Total	**23.882.076**		**4.941.632**		**21.790.863**	**20,69%**
1.3	**DEMOLICIONES**									
1.3.1	Demolición muro E ≤ 15CM en mampostería maciza o hueca, incluye cortes con pulidora, trasiegos y cargue a volqueta.	M2	220,00	17.941	3.947.020	44,76	803.039	184,00	3.301.144	20,35%
1.3.2	Demolición de enchape de pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	704,40	14.760	10.396.944	80,00	1.180.800	648,12	9.566.251	11,36%
1.3.3	Demolición de enchapes de piso, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	283,00	13.980	3.956.340		-	142,00	1.985.160	
1.3.4	Demolición repello de piso, incluye picado Eprom = 0.03m, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	835,00	12.959	10.820.765		-	178,00	2.306.702	
1.3.5	Demolición repello de pared, muros mampostería eprom= 0.02m, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	291,80	15.119	4.411.724		-	291,00	4.399.629	
1.3.6	Cargue, transporte y retiro del material sobrante proveniente de las obras de mantenimiento, hasta el botadero.	M3	234,00	40.171	9.400.014	68,00	2.731.628	162,00	6.507.702	29,06%
1.3.7	Demolición de mesones en concreto, recubierto con granito incluye salpicadero	M2	11,00	37.722	414.942	3,42	129.009	7,00	264.054	31,09%
				Sub Total	**43.347.749**		**4.844.476**		**28.330.642**	**11,18%**
		TOTAL PRELIMINARES			**73.153.107**		**10.083.853**		**53.136.156**	**13,78%**
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**									
2.1	**RED SUMINISTRO AGUA POTABLE**									
2.1.1	Instalaciones PVC 1/2" RDE 13.5	ML	95,00	7.575	719.625	11,00	83.325	95,00	719.625	11,58%
2.1.2	Instalaciones PVC 3/4" RDE 21	ML	28,00	10.939	306.292		-	28,00	306.292	
2.1.3	Instalaciones PVC RDE 21 1"	ML	50,21	12.038	604.428	24,60	296.135	50,20	604.308	48,99%
2.1.4	Instalaciones PVC RDE 21 2"	ML	6,00	26.949	161.694	6,00	161.694	6,00	161.694	100,00%
2.1.5	Punto hidráulico PVC 1/2"	UND	60,00	24.174	1.450.440		-	60,00	1.450.440	
2.1.6	Punto hidráulico PVC 3/4"	UND	8,00	26.324	210.592	-	-		-	
2.1.7	Punto hidráulico PVC 1/2" incluye válvula control paso 1/2" y tapa PVC Blanca 15x15cm	UND	18,00	59.937	1.078.866	-	-		-	
				Sub Total	**4.531.937**		**541.154**		**3.242.359**	**11,94%**
2.2	**RED SANITARIA, PLUVIAL, VENTILACION**									
2.2.1	Instalaciones sanitarias PVC 2"	ML	58,00	25.087	1.455.046	32,00	802.784	58,00	1.455.046	55,17%
2.2.2	Instalaciones sanitarias PVC 4"	ML	119,00	42.006	4.998.714	20,00	840.120	72,00	3.024.432	16,81%
2.2.3	Instalaciones ventilación PVC 2"	ML	183,00	20.194	3.695.502	24,00	484.656	24,00	484.656	13,11%
2.2.4	Instalaciones ventilación PVC 3"	ML	35,00	31.646	1.107.610		-		-	
2.2.5	Punto sanitario 4" WC	UND	32,00	45.965	1.470.880		-	32,00	1.470.880	
2.2.6	Punto sanitario 2"	UND	44,00	33.894	1.491.336		-	36,00	1.220.184	
2.2.7	Suministro e instalación de rejilla de piso en acero inoxidable cuadrada de 10cm salida a tubería 2"	UND	24,00	48.380	1.161.120	24,00	1.161.120	24,00	1.161.120	100,00%
2.2.8	Suministro e instalación de tubería de conexión de desagües de aires acondicionados	ML	36,00	20.194	726.984		-		-	
				Sub Total	**16.107.192**		**3.288.680**		**8.816.318**	**20,42%**
		TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**20.639.129**		**3.829.834**		**12.058.677**	**18,56%**
3	**RED ELECTRICA**									
3.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**									
3.1.1	S.I.P. Salida toma doble GFCI 1F/20AMP en tubería PVC SCH40 1/2", caja galvanizada y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	16,00	171.144	2.738.304		-		-	
3.1.2	S.I.P. Salida sensor de movimiento tipo interruptor 360° 1F/15AMP En muro, Tubería PVC SCH40 D:1/2", Cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	32,00	138.700	4.438.400		-		-	
3.1.3	S.I.P Luminaria de sobreponer 400x120 para uso interior, fabricada en lámina de acero COLD ROLLED, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate y difusor lamina acrílico opalizado L11. Producto para instalación de sobreponer, en temperatura de color 5000K flujo lumínico de 4400Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 28.56W	UND	4,00	424.118	1.696.472		-		-	

3.1.4	S.I.P. Luminaria tipo bala 72x83 para incrustar, Producto tipo DOWNLIGHT de uso interior fabricado en aluminio inyectado, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate en temperatura de color 6500K flujo lumínico de 550Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 6.00W.	UND	40,00	65.207	2.608.280		-		-	
3.1.5	S.I.P Luminaria tipo bala GS 15W 5000K	Und	12,00	144.940	1.739.280		-		-	
3.1.6	S.I.P Letrero lumínico de emergencia SALIDA 90E 300X185X45 2.6W 120-277V SOBREPONER	UND	20,00	107.422	2.148.440		-		-	
3.1.7	S.I.P Luminaria de emergencia 185X50X108 SOBREPONER 2-BL 2W	UND	40,00	112.486	4.499.440		-		-	
3.1.8	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP en techo, Tubería D:1/2" SCH40, Caja octogonal y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	66,00	123.004	8.118.264		-		-	
3.1.9	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP emergencia, Tubería D:1/2 EMT, Caja RADWELL 5800 y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, incluye fijación, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	45,00	178.147	8.016.615		-		-	
3.1.10	S.I.A. Tablero de circuitos para baños, incluye 6 protecciones de 20A	UND	4,00	826.632	3.306.528		-		-	
				Sub Total	**39.310.023**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS			**39.310.023**		**-**		**-**	**0,00%**
4	**MUROS**									
4.1	Suministro e instalación de muro doble cara en lámina de fibrocemento 8mm. Estructura base 6. incluye estuco y dos manos de pintura	M2	84,00	171.543	14.409.612	67,00	11.493.381	67,00	11.493.381	79,76%
4.2	Carteras en lámina de fibrocemento 8mm dos caras, en marco ventana y puertas	ML	163,80	68.788	11.267.474	56,00	3.852.128	56,00	3.852.128	34,19%
				Sub Total	**25.677.086**		**15.345.509**		**15.345.509**	**59,76%**
		TOTAL MAMPOSTERIA			**25.677.086**		**15.345.509**		**15.345.509**	**59,76%**
5	**REPELLOS**									
5.1	Repello de piso y pared con mortero 1:4 espesor 2cm. Incluye aditivo impermeabilizante.	M2	1374,872	44.402	61.047.067	125,08	5.553.802	390,00	17.316.780	9,10%
5.2	Impermeabilización de losa de entrepiso y muros laterales de terraza, con recubrimiento impermeabilizante acrílico de alto desempeño con tecnología DFX y fibras para impermeabilizar cubiertas	M2	660,00	51.240	33.818.400		-		-	
				Sub Total	**94.865.467**		**5.553.802**		**17.316.780**	**5,85%**
		TOTAL REPELLOS			**94.865.467**		**5.553.802**		**17.316.780**	**5,85%**
6	**ENCHAPES**									
6.1	**PISOS**									
6.1.1	Enchape cerámica de piso estructurado 20.6x92.6cm, uso comercial moderado	M2	258,00	132.605	34.212.090		-		-	
6.1.2	Enchape cerámica de piso 60x60cm color gris, uso exteriores tráfico comercial	M2	88,00	100.281	8.824.728		-		-	
6.1.3	Acabado para uniones entre muro y losa de piso en media caña con mortero 1-4 H: 0,07m	ML	85,00	27.327	2.322.795		-		-	
				Sub Total	**45.359.613**		**-**		**-**	
6.2	**PARED**									
6.2.1	Enchape cerámica de pared color marfil caras diferenciadas 30.1x75.3cm	M2	457,00	113.777	51.996.089		-		-	
6.2.2	Guarda canto flecha 8 milímetros cromo aluminio mate	ML	31,00	12.988	402.628		-		-	
6.2.3	Suministro e instalación de espejo E= 3mm flotante biselado en sus cuatro lados sobre soporte metálico	M2	20,00	361.837	7.236.740		-		-	
6.2.4	Mesón en granito artificial verde uva tuba incluye solapa inferior en aglomerado ancho 50cm con melamina, ancho de mesón 0.60m	ML	17,00	1.146.712	19.494.104		-		-	
				Sub Total	**79.129.561**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL ENCHAPES			**124.489.174**		**-**		**-**	**0,00%**
7	**ESTUCOS**									
7.1	Estuco acrílico para exteriores, incluye juntas, filos y dilataciones	M2	320,00	21.750	6.960.000		-		-	
7.2	Estuco plástico para muros y resanes incluye juntas, filos y dilataciones	M2	973,00	16.641	16.191.693		-	973,00	16.191.693	
				Sub Total	**23.151.693**		**-**		**16.191.693**	**0,00%**
		TOTAL ESTUCOS			**23.151.693**		**-**		**16.191.693**	**0,00%**
8	**PINTURA**									
8.1	Pintura de muros en mampostería 3 manos, vinilo tipo 1, lavable	M2	5137,00	12.785	65.676.545	956,00	12.222.460	5.029,00	64.295.765	18,61%
8.2	Pintura para exteriores (3 manos) para paredes.	M2	1280,00	27.659	35.403.520		-		-	
8.3	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial ancho 10cm, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, para pavimento rígido	ML	173,52	14.418	2.501.811		-		-	
8.4	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial, números con circunferencias de 66 y 40cm para carros y motos. imprimación en negro y pintura tráfico vehicular, incluye micro esferas, para pavimento rígido	UND	42,00	30.758	1.291.836		-		-	
8.5	Aplicación de pintura en frio base solvente para flechas de ingreso y salida, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, sobre pavimento rígido	M2	27,00	59.594	1.609.038		-		-	
				Sub Total	**106.482.750**		**12.222.460**		**64.295.765**	**11,48%**
		TOTAL PINTURA			**106.482.750**		**12.222.460**		**64.295.765**	**11,48%**
9	**CARPINTERIAS**									
9.1	Suministro e instalación de puerta de dos hojas batientes elaborada en tubular aluminio estriado ANOLOC, incluye chapa pomo de alcoba metálica pasador y argolla para candado. Medidas de cada hoja 0.9mx2.10m (ver plano A-022, P-T3)	UND	1,00	2.374.136	2.374.136		-		-	
9.2	Sellado de juntas entre muros y marcos de ventanería con sellador de juntas de poliuretano.	ML	367,00	11.048	4.054.616		-		-	
				Sub Total	**6.428.752**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL CARPINTERIAS			**6.428.752**		**-**		**-**	**0,00%**
10	**CUBIERTAS Y CIELO RASO**									
10.2	Limpieza, lavado, cambio de amarras y ganchos, aplicación de sellante en amarras de policarbonato alveolar	M2	33,00	32.738	1.080.354		-		-	
10.3	Suministro e instalación de cielo raso desmontable, láminas de fibra mineral 0,60m x 0,60m, incluye estructura	M2	220,00	89.265	19.638.300		-		-	
				Sub Total	**20.718.654**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL CUBIERTAS Y CIELO RASO			**20.718.654**		**-**		**-**	**0,00%**
11	**APARATOS SANITARIOS Y DOTACION BAÑOS**									

11.1	Kit Taza sanitaria entrada superior con fluxómetro con sensor, blanco institucional (Incluye Taza Sanitaria para Fluxómetro, asiento sanitario, sensor, sistema conexión entrada superior)	UND	4	3.778.631	15.114.524		-		-	
11.2	Taza sanitaria alongado, blanco institucional ultra ahorradora (Sanitario con push)	UND	28	1.228.494	34.397.832		-		-	
11.3	Barra de seguridad Fija Recta en acero inoxidable (baño para personas con movilidad reducida), incluye anclajes	UND	4	463.827	1.855.308		-		-	
11.4	Barra de seguridad abatible (baño para personas con movilidad reducida) incluye anclajes	UND	4	641.649	2.566.596		-		-	
11.5	Lavamanos blanco institucional, para personas con movilidad reducida, incluye anclajes	UND	4	553.338	2.213.352		-		-	
11.6	Lavamanos blanco institucional, para incrustar en mesones	UND	20	328.045	6.560.900		-		-	
11.7	Suministro e instalación de brazo de soporte para lavamanos	JUEGO	4	288.360	1.153.440		-		-	
11.8	Suministro e instalación de grifería para lavamanos y desagüe tipo botella sencillo incluye acople	UND	24	62.127	1.491.048		-		-	
11.9	Construcción lava traperos 70x50x50cm, enchapado.	UND	4	622.329	2.489.316		-		-	
11.10	Kit Orinal arrecife o similar para fluxómetro	UND	8	1.284.163	10.273.304		-		-	
11.11	Dispensador De Papel Higiénico Acero Inoxidable Diámetro De 26 Cm	UND	16	157.457	2.519.312		-		-	
11.12	Papelera metálica en acero inoxidable según especificaciones	UND	32	530.403	16.972.896		-		-	
11.13	Dispensador de jabón para empotrar en pared, en acero inoxidable, 1.2Litros	UND	16	253.414	4.054.624		-		-	
11.14	Suministro e instalación de divisiones sanitarias a piso en acero inoxidable AISI SAE 304 para baños de uso institucional. Batería completa con tres (3) cubículos para unidades sanitarias. Incluye tornillería y accesorios.	UND	8,00	8.420.295	67.362.360		-		-	
11.15	Dispensador De Toallas De Papel En Z Acero Inoxidable De 27x27x10 Cm	UND	16,00	186.293	2.980.688		-		-	
				Sub Total	**172.005.500**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL APARATOS SANITARIOS			**172.005.500**		**-**		**-**	**0,00%**
12	**SEÑALIZACIÓN**									
12.1	Suministro e instalación de placa de señalización de 0,65 x 0,50 m con planimetría salidas de emergencia, en acrílico de 2.4 con impresión full color y regletas en MDF para su instalación.	UND	5,00	229.178	1.145.890		-		-	
12.2	Suministro e instalación Franjas Guías longitudinales de ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	600,00	10.725	6.435.000		-		-	
12.3	Suministro e instalación de Punto alerta ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	2100,00	5.658	11.881.800		-		-	
12.4	Suministro e Instalación de Loseta alerta en policarbonato, 20 x 20 cm., Altura total: 5mm, Peso 150 gr, incluye anclaje	UND	15,00	43.268	649.020		-		-	
12.5	Suministro e instalación de letreros luminosos informativos en parqueadero doble cara, ubicado en sótano 1.50x0.40m	UND	3,00	576.720	1.730.160		-		-	
12.6	Suministro e instalación de letras en acero inoxidable de la frase: PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA y Escudo de la Rama judicial diámetro 50cm, tamaño de letra 30cm cada una, según diseño	UND	1,00	5.767.200	5.767.200		-		-	
				Sub Total	**27.609.070**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL SEÑALIZACIÓN			**27.609.070**		**-**		**-**	**0,00%**
13	**VARIOS Y ASEO GENERAL**									
13.1	Brigada de aseo	PERSONA/ MES	6,00	2.304.481	13.826.886	2,00	4.608.962	4,00	9.217.924	33,33%
				Sub Total	**13.826.886**		**4.608.962**		**9.217.924**	**33,33%**
		TOTAL VARIOS Y ASEO			**13.826.886**		**4.608.962**		**9.217.924**	**33,33%**

TOTAL COSTO DIRECTO:	748.357.291		51.644.420		187.562.504	**6,90%**
ADMINISTRACIÓN (18.73%)	140.167.321		9.673.000		35.130.457	
IMPREVISTOS (3%)	22.450.719		1.549.333		5.626.875	
UTILIDAD (5%)	37.417.865		2.582.221		9.378.125	
IVA (19%)	7.109.394		490.622		1.781.844	
TOTAL PRESUPUESTO:	**955.502.590**		**65.939.566**		**239.479.805**	**6,90%**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO
INFORME SEMANAL DE OBRA N° 9

I. INFORMACIÓN GENERAL

N° CONTRATO Y FECHA: CO1.PCCNTR.6947019 del 29 de octubre de 2024 — TRAMO (S): N.A. — FECHA: 2/02/2025

ENTIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO — SEMANA No.: 8 del 27/01/2025 al 2/02/2025

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. DIANA VIVANCO — ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO

OBJETO: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO" — FECHA DE INICIO: 14/11/2024

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA
INTEGRANTES: REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO MANRIQUE

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.6947019 del 29 de octubre de 2024
PLAZO INICIAL: 45 dias
PLAZO ADICIONAL: 60 días
PLAZO ACUMULADO: 105 días
VALOR INICIAL: $ 955.501.990,00
ADICIONES: $ 0,00
VALOR ACUMULADO: $ 955.501.990,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
INTEGRANTES:

CONTRATO No.: O1.PCCNTR.6973355
PLAZO INICIAL: 45 cuarenta y cinco días
PLAZO ACUMULADO:
VALOR INICIAL: $ 33.336.660,00
ADICIONES: $ 0,00
VALOR ACUMULADO: $ 33.336.660,00

II. AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS OBRA:

ESTUDIOS Y DISEÑOS:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ -
OBRA:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 0,00
TOTAL OBRA + EST Y DISEÑOS:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 0,00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 0,00


INTERVENTORÍA:
COSTOS EJECUTADOS ACUMULADOS:
COSTOS PROGRAMADOS ACUMULADOS:

ESTUDIOS Y DISEÑOS SEMANAL:
PROGRAMADA: $ -
EJECUTADA: $ -
OBRA SEMANAL:
PROGRAMADA: $ 0,00
EJECUTADA: $ 0,00
TOTAL OBRA + E Y D SEMANAL:
PROGRAMADA: $ 0,00
EJECUTADA: $ 0,00

III. AVANCE FÍSICO

EJECUTADO ACUMULADO PROYECTO

DESCRIPCIÓN	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	TOTAL
Iniciales			10,04%	10,04%	10,04%	9,22%		6,52%	5,03%					50,89%
Desmonte y Retiros			20,42%	16,74%	12,74%	9,49%		11,16%	20,69%					91,24%
Demoliciones			13,12%	12,12%	7,74%	4,65%	11,85%	4,68%	11,18%					65,34%
Estucos				13,30%	13,30%	9,51%	33,83%							69,94%
Red Suministro Agua Potable						29,80%	29,80%		11,94%					71,54%
Red Sanitaria, Pluvial, Ventilación						16,32%	18,00%		20,42%					54,74%
Repellos						4,12%	4,12%	4,17%	5,85%					18,26%
Pinturas							26,92%	19,86%	11,48%					58,26%
Varios y Aseo General								33,3%	33,33%					66,63%
Muros									59,76%					59,76%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
AVANCE OBRA COSTOS DIRECTOS														0,00%
AVANCE OBRA TOTAL														0,00%

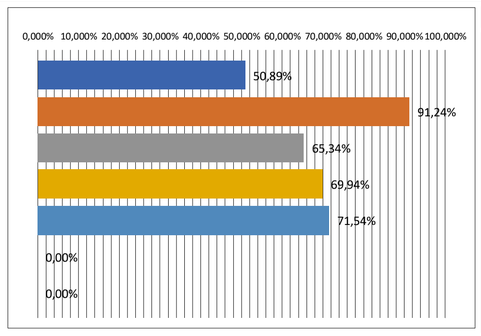

MAQUINARIA Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	MES 1	TOTAL
HERRAMIENTA MENOR		
TALADRO PERCUTOR		

S 1: $ 0,00 — S 2: $ 0,00 — S 3: $ 14.250.052,00 — S 4: $ 16.506.584,00 — S 5: $ 12.860.904,00 — S 6: $ 21.932.972,00

S 7: $ 63.571.724,00 — S 8: $ 44.417.781,00 — S 9: $ 65.939.566,00 — S 10: — S 11: — S 12: — S 13:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

BOTADEROS	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONE: La escombrera Palermo, se encuentra ubicada en la verada Caliyaco, ubicada en zona rural del municiipio de Mocoa Putumayo, Gestor de disposición final de RCD, autorizado mediante resolución 00003 de 08/07/2019 código de Inscripción DPT-3389-25-07-2019 / km 1:200 Vía a Villagarzón.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 10
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0,0
SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 0,0

OBSERVACIONES: El personal mano de obra no calificada es en su totalidad es de la vereda brisas del Mocoa. La selección de las hojas de vida se realizo de la documentación entregada por la JAC quienes realizaron la convocatoria y certificaron que las persona sean del sector.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ADMINISTRATIVAS, LEGALES, FINANCIERAS

FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA E INTERVENTORIA, AFILIACION DEL PERSONAL A LAS ENTIDADES ASEGURADORAS Y DE SALUD.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO
INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N° 9

PÁGINA 2 DE 2

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO" — TRAMO (S): N.A. — FECHA: 2/02/2025

SECRETARIA EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO — RAMA JUDICIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 8 del 27/01/2025 al 2/02/2025

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

TÉCNICAS

Continuar resane de paredes en piso 1, 2, 3 Y 4 en todas las áreas internas.
Continuar pintura para interiores en piso 1, 2, 3 Y 4 en áreas internas

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

AMBIENTAL Y SST

El componente de seguridad y salud en el trabajo realizo el seguimiento punto a punto del plan de manejo básico de seguridad y salud en el trabajo en el cual se encontró lo siguiente :
Se realizan charlas preoperacionales, entrega en epps, demarcación de zonas con cinta peligro.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con pinturas en los 4 pisos en áreas interiores
Continuar con la instalación de todos los temas eléctricos

NOTA:

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES

Fecha de reinicio No. 1 14 de enero de 2025
Fecha de terminación No.2 22 de enero de 2025
Tiempo de adición No. 1 dos meses
Fecha de terminación según adición en tiempo No.1 22 de marzo de 2025

OBSERVACIONES:	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA:	FIRMA:
	NOMBRE: MARLON FERNANDO ARTEAGA POTOSI	NOMBRE: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
	N° MAT: 52202-333602 NRÑ	No. MAT: 63202094726 QND

ANEXO 3 COPIA DE ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

JUSTIFICACIÓN DE SUSPENSION DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO No. : CO1.PCCNTR.6973355 de 1 de noviembre de 2024

MODALIDAD DE SELECCIÓN : Proceso de Mínima cuantía

PROCESO DE CONTRATACIÓN No: : MC029_2024

OBJETO : Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental al contrato de obra para el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura física del Palacio de Justicia de Mocoa – Putumayo.

LOCALIZACIÓN : Mocoa - Putumayo

FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA : 06/11/2024

CONTRATISTA : ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.731.335

SUPERVISORA DE CONTRATO: : Diana Maria Vivanco Burbano

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	$33.336.660,00
VALOR ADICIÓN 1	N.A.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$33.336.660,00
FECHA DE INICIO	14/11/2024
PLAZO INICIAL	: Dos (2) meses, sin que ello exceda el treinta y uno (31) de diciembre de 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	23/12/2024
SUSPENSIÓN 1	Veintiún (21) días calendario
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	21/01/2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL	60%

Diana Maria Vivanco, profesional universitario de la Dirección Seccional Pasto en calidad de supervisora del contrato, deja constancia de la justificación de la suspensión No. 1 del contrato.

El contratista de interventoría, expresa las razones para realizar la suspensión:

…" …Como es de su conocimiento el ingeniero ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO, el señor Luis Humberto Paz Timaná en nombre y representación de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO, le asignó la vigilancia, el control y seguimiento al contratista de obra durante la ejecución de su contrato, encaminadas a cumplir las especificaciones técnicas, actividades administrativas, requerimientos socio- ambientales, legales y presupuestales, entre otros. Teniendo en cuenta, que para efectuar un adecuado control y seguimiento al contrato de obra No CO1.PCCNTR.6947019, el contrato de interventoría en sus obligaciones generales establece: Realizar el Seguimiento integral al proyecto "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO". Así mismo, considera en sus obligaciones específicas que la interventoría deberá "Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista"; Por tanto, la interventoría en cumplimiento de sus obligaciones por medio del presente solicita la suspensión N°1, al Contrato de interventoría O1.PCCNTR.6973355 DEL 01/11/2024, debido a que las festividad de fin de año (Navidad y Año Nuevo) y las festividades típicas que se desarrollan anualmente en la región (Carnaval de Negros y Blancos) coinciden con el periodo de finalización del contrato. Las festividades de fin de año y la celebración del "Carnaval de Negros y Blancos" en los departamentos de Nariño y Putumayo, son eventos considerados patrimonio cultural del país, por lo cual generan alto impacto social y por ende afectan el normal desarrollo y ejecución de los proyectos. Por tanto, la interventoría solicita la suspensión N°1 del contrato de interventoría desde el 23 de diciembre del 2024 hasta el 13 de enero del 2025.
De igual forma, y teniendo en cuenta lo anterior, es necesaria la modificación de la vigencia del contrato, extendiendo su plazo de ejecución en un período equivalente al de la suspensión, es decir 9 días, a partir del 13 de enero del 2025, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del contrato…" …

La supervisora del contrato, confirma la necesidad de realizar la suspensión, considerando las razones expuestas por el contratista de interventoría, en los que sustenta que durante los días de fin de año las ferreterías y depósitos de materiales se encuentran en ejecución de inventarios y cierres de año, afectando la compra y suministro de materiales, aunado a lo anterior la cercanía del Palacio de Justicia de Pasto a la senda del carnaval, agrava las condiciones de cierres de vías, para el ingreso tanto del personal de obra, como de los equipos y materiales. Por tal razón se justifica la suspensión No. 1, en los términos analizados por la interventoría.

En este orden de ideas la supervisora del contrato recomienda al señor Director Seccional, realizar la correspondiente suspensión por el termino de veintidós (22) días calendario, desde el veintitrés (23) de diciembre de 2024, hasta el 13 de enero de 2025.

La suspensión se realizará dentro del término de ejecución del contrato, cumpliéndose de esa manera la exigencia según la cual, una entidad pública no puede modificar el contrato cuando el plazo de este haya fenecido

El Contratista en su solicitud no contempla ningún tipo de sobre costos por efectos de la suspensión.

CLAUSULAS OBJETO DE MODIFICACIÓN.

La relativa a las garantías del contrato: Las pólizas serán actualizadas con el acta de reinicio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2024.



DIANA MARIA VIVANCO BURBANO
Supervisora del contrato
P. Universitario - Dirección Seccional Pasto

Anexo, Solicitud de suspensión de interventoría

Mocoa, 20 de diciembre del 2024

CI-015

Ingeniera:
DIANA VIVANCO
SUPERVISORA

Referencia: Contrato de obra N°CO1.PCCNTR.6947019: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO".


Asunto: Solicitud de suspensión N°1 contrato de interventoría N° O1.PCCNTR.6973355 DEL 01/11/2024.

Como es de su conocimiento el ingeniero ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO, el señor Luis Humberto Paz Timaná en nombre y representación de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO, le asignó la vigilancia, el control y seguimiento al contratista de obra durante la ejecución de su contrato, encaminadas a cumplir las especificaciones técnicas, actividades administrativas, requerimientos socio- ambientales, legales y presupuestales, entre otros. Teniendo en cuenta, que para efectuar un adecuado control y seguimiento al contrato de obra No CO1.PCCNTR.6947019, el contrato de interventoría en sus obligaciones generales establece: Realizar el Seguimiento integral al proyecto "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO". Así mismo, considera en sus obligaciones específicas que la interventoría deberá "Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista"; Por tanto, la interventoría en cumplimiento de sus obligaciones por medio del presente solicita la suspensión N°1, al Contrato de interventoría O1.PCCNTR.6973355 DEL 01/11/2024, debido a que las festividad de fin de año (Navidad y Año Nuevo) y las festividades típicas que se desarrollan anualmente en la región (Carnaval de Negros y Blancos) coinciden con el periodo de finalización del contrato. Las festividades de fin de año y la celebración del "Carnaval de Negros y Blancos" en los departamentos de Nariño y Putumayo, son eventos considerados patrimonio cultural del país, por lo cual generan alto impacto social y por ende afectan el normal desarrollo y ejecución de los proyectos. Por tanto, la interventoría solicita la suspensión N°1 del contrato de interventoría desde el 23 de diciembre del 2024 hasta el 13 de enero del 2025.

De igual forma, y teniendo en cuenta lo anterior, es necesaria la modificación de la vigencia del contrato, extendiendo su plazo de ejecución en un período equivalente al de la suspensión, es decir 9 días, a partir del 13 de enero del 2025, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

Anexo: Solicitud suspensión de obra.

Atentamente,



ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO

INTERVENTOR
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°CO1.PCCNTR.6973355

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6973355
Versión del contrato	2
Estado de contrato	Suspendido
Fecha de generación del estado	31/10/2024 8:31:41 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6973355
Objeto del contrato	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental al contrato de obra para el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura física del Palacio de Justicia de Mocoa - Putumayo.
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	14/11/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14 días de tiempo transcurrido *(31/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	13 días de tiempo transcurrido *(2/01/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	2/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	31/10/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	14 días de tiempo transcurrido *(31/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Rama Judicial Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto

COLOMBIA, Pasto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

COLOMBIA, Mocoa
Número de documento 9731335

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO* ***Fecha de aprobación:*** *1/11/2024 1:50:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Luis Humberto Paz Timana* ***Fecha de aprobación:*** *1/11/2024 2:28:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6973355_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_6973355_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	31/10/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	31/10/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(31/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2029 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 1/11/2024 5:46:52 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15546652	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	20.001.996,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	50	16.668.330,00	-
☐ Pago 002	50	16.668.330,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6973355

Proveedor ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	COMUNICACION DE ACEPTACION MC029-2024.pdf	COMUNICACION DE ACEPTACION MC029-2024.pdf	Descargar Detalle
	ANEXO CONTRATO CO1.PCCNTR.6973355 INTERVENTORIA MANTENIMIENTO PALACIO MOCOA.pdf (Archivado)	ANEXO CONTRATO CO1.PCCNTR.6973355 INTERVENTORIA MANTENIMIENTO PALACIO MOCOA.pdf	Descargar Detalle
☐	ANEXO CONTRATO CO1.PCCNTR.6973355 INTERVENTORIA MANTENIMIENTO PALACIO MOCOA.pdf	ANEXO CONTRATO CO1.PCCNTR.6973355 INTERVENTORIA MANTENIMIENTO PALACIO MOCOA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 19 No 23-00

Ubicación CO-NAR-52001 - Pasto

País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Pasto
Dirección Calle 19 No 23-00
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Mocoa	COLOMBIA > Putumayo > Mocoa

1 CO1.PCCNTR.6973355

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							55.561.100,00	33.336.660,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		80101600	Valor total del contrato	1,00	VG	55.561.100,00	33.336.660,00	55.561.100,00	33.336.660,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Luis Humberto Paz Tima	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12990134	Guardar y notificar
Supervisor	Diana Maria Vivanco Bu	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	36757597	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Susana Córdoba Angulo	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	30718692	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Diana Maria Vivanco Burbano	1/11/2024 2:28:30 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Luis Humberto Paz Timana
Ordenador del pago	Susana Córdoba Angulo	1/11/2024 2:28:30 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Luis Humberto Paz Timana
Ordenador del Gasto	Luis Humberto Paz Timana	1/11/2024 2:28:30 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Luis Humberto Paz Timana

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	33.336.660
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		33.336.660

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 27-01-08-016

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
☐	14224	CDP	Generado	55.561.100 COP	55.561.100 COP	27-01-02-016	Validado

Saldo de CDP 55.561.100 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 55.561.100 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 18/10/2024 1:11 PM

Compromiso presupuestal de gastos

⚠ **Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante**

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
34124	Presupuestal (CDP)	7/11/2024 12:00 AM	Generado	33.336.660 COP	33.336.660 COP	-	C-2701-0800-37-20111D-2701019-02	SIIF Detalle

Saldo de compromisos CDP 33.336.660 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 33.336.660 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 20/11/2024 8:31 AM

ANEXO 4
CONTROL DIARIO DE EQUIPO CONTRATISTA DE OBRA.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANEXO PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

CÓDIGO	FT-SID-007		
VERSIÓN	1		
PAGINA	1	DE	2

FECHA 31 1 2025

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO

INTERVENTOR ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

MES DICIEMBRE **CONTRATO No.** No. CO1.PCCNTR.6973355 **MUNICIPIO** MOCOA, PUTUMAYO

CONTRATISTA CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S

DIA / PROFESIONAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	10	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HERRAMIENTA MENOR														X		X	X	X	X	X	X		X								
PULIDORA														X		X	X	X	X	X	X		X								
TALADRO														X		X	X	X	X	X	X		X								

Firma

Nombre: Allan Edward Sanchez Quiceno
Director de Interventoría
Matricula No.: 63202-094726 QND

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CÓDIGO	FT-SID-007		
VERSIÓN	1		
PAGINA	2	DE	2

FECHA 31 1 2025

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO

INTERVENTOR ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

MES ENERO **CONTRATO No.** No. CO1.PCCNTR.6973355 **MUNICIPIO** MOCOA, PUTUMAYO

CONTRATISTA CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S

DIA / PROFESIONAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HERRAMIENTA MENOR													X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
PULIDORA													X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
TALADRO													X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
H																															

Firma

Nombre: Allan Edward Sanchez Quiceno
Director de Interventoría
Matricula No.: 63202-094726 QND

ANEXO 5
CONTROL DIARIO DEL PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia ANEXO PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA	CÓDIGO	FT-SID-007	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	1 DE 2	

FECHA 31 1 2025

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO

INTERVENTOR ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

MES DICIEMBRE **CONTRATO No.** No. CO1.PCCNTR.6973355 **MUNICIPIO** MOCOA, PUTUMAYO

CONTRATISTA CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S

DIA / PROFESIONAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	10	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DIRECTOR DE OBRA													X	X		X	X	X	X	X	X		X								
RESIDENTE DE OBRA													X	X		X	X	X	X	X	X		X								
RESIDENTE SST													X	X		X	X	X	X	X	X		X								
MAESTRO													X	X		X	X	X	X	X	X		X								
OFICIAL 1													X	X		X	X	X	X	X	X		X								
OFICIAL 2													X	X		X	X	X	X	X	X		X								
AUXILIAR 1													X	X		X	X	X	X	X	X		X								
AUXILIAR 2													X	X		X	X	X	X	X	X		X								
AUXILIAR 3													X	X		X	X	X	X	X	X		X								
AUXILIAR 4													X	X		X	X	X	X	X	X		X								
ELECTRISISTA 1													X	X		X	X	X	X	X	X		X								
ELECTRISISTA 2													X	X		X	X	X	X	X	X		X								

Firma

Nombre: Allan Edward Sanchez Quiceno
Director de Interventoría
Matricula No.: 63202-094726 QND

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CÓDIGO	FT-SID-007		
VERSIÓN	1		
PAGINA	2	DE	2

FECHA 31 1 2025

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO

INTERVENTOR ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

MES ENERO **CONTRATO No.** No. CO1.PCCNTR.6973355 **MUNICIPIO** MOCOA, PUTUMAYO

CONTRATISTA CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S

PROFESIONAL / DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DIRECTOR DE OBRA													X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
RESIDENTE DE OBRA													X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
RESIDENTE SST													X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
MAESTRO													X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
OFICIAL 1													X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
OFICIAL 2													X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
AUXILIAR 1													X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
AUXILIAR 2													X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
AUXILIAR 3													X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
AUXILIAR 4													X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
ELECTRISISTA 1													X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
ELECTRISISTA 2													X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X

Firma

Nombre: Allan Edward Sanchez Quiceno
Director de Interventoría
Matricula No.: 63202-094726 QND

ANEXO 6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

ANEXO 7 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

CÓDIGO	FT-SID-007		
VERSIÓN	1		
FECHA		DE	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANEXO ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

FECHA 31 1 2025

OBJETO: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO**

INTERVENTOR ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

MES DICIEMBRE

CONTRATO No: **No. CO1.PCCNTR.6973355**

CONTRATISTA CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	10	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Clase de tiempo																															
Seco														X		X		X	X	X	X		X								
Lluvias moderadas														X			X		X	X			X								
Lluvias intensas																X		X			X										

Firma

Nombre: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

Residente de Interventoría

CÓDIGO	FT-SID-007		
VERSIÓN	1		
FECHA		DE	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FECHA 31 1 2024

OBJETO: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO**

INTERVENTOR ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

MES ENERO

CONTRATO No: **No. CO1.PCCNTR.6973355**

CONTRATISTA CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Clase de tiempo																															
Seco													X				X			X				X			X				X
Lluvias moderadas														X	X	X		X			X	X	X		X			X	X	X	
Lluvias intensas														X	X						X	X						X	X		

Firma

Nombre: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
Residente de Interventoría

ANEXO 8
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CONTRATISTAS DE OBRA.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1124313123		MUÑOZ BECERRA LUIS ALFREDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	B villa del Norte cll 27n9 84	MOCOA-PUTUMAYO	4204224	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1157015835	9479609901	I	2024/12/06	2024/12/27	BANCOLOMBIA	21	$267,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1124313123	MUÑOZ BECERRA LUIS ALFREDO	230301	17	$906,667	$145,100	ESSC18	17	$906,667	$113,400		0	$0	$0	14-23	17	$906,667	$4,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$906,667**	**$145,100**			**$906,667**	**$113,400**			**$0**	**$0**			**$906,667**	**$4,800**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,100	$2,100	$0	$147,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,100	$2,100	$0	$147,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,800	$100	$0	$4,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,800	$100	$0	$4,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,400	$1,600	$0	$115,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$113,400	$1,600	$0	$115,000
TOTAL				**1**	**$263,300**	**$3,800**	**$0**	**$267,100**

2024/12/27 03:35 PM

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): MAYERLY CAROLINA ARANZAZU SARASTY
No. Identificación: CC1124862736
Dirección: VEREDA SAN ANTONIO
Telefono: 3223821876
Correo: maranzazusa1314@gmail.com
Ciudad: MOCOA
Número de Planilla: 8382955134

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	MAYERLY CAROLINA ARANZAZU SARASTY
Tipo y número de identificación	CC1124862736
Número de planilla	8382955134
Fecha pago	2024-12-30
Número de autorización pago	43031858
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Pensión	noviembre de 2024
Número de Administradoras	2
Total Pagado	229300
Total Intereses de Mora	3100

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	128700	1
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	100600	1

8382955134

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1124862736
APELLIDOS Y NOMBRES: MAYERLY CAROLINA ARANZAZU SARASTY

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS037	25-14	793334	793334	0	0	99200	0	127000	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085249647		ARTEAGA POTOSI MARLON FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 5 CASA 18 LAS BRISAS	PASTO-NARIÑO	7360636	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1212960457	9480633795	I	2025/01/14	2025/01/22	NEQUI	8	$687,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1085249647	ARTEAGA MARLON	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,000	$2,000	$0	$386,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$384,000	$2,000	$0	$386,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$1,600	$0	$301,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$300,000	$1,600	$0	$301,600
TOTAL				**1**	**$684,000**	**$3,600**	**$0**	**$687,600**

2025/01/22 04:27 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1124313123		MUÑOZ BECERRA LUIS ALFREDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	B villa del Norte cll 27n9 84	MOCOA-PUTUMAYO	4204224	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1201293375	9480386732	I	2025/01/09	2025/01/17	BANCOLOMBIA	8	$351,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1124313123	MUÑOZ BECERRA LUIS ALFREDO	230301	23	$1,226,667	$196,300	ESSC18	23	$1,226,667	$153,400		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,226,667**	**$196,300**			**$1,226,667**	**$153,400**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$196,300	$1,000	$0	$197,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$196,300	$1,000	$0	$197,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$153,400	$800	$0	$154,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$153,400	$800	$0	$154,200
TOTAL				**1**	**$349,700**	**$1,800**	**$0**	**$351,500**

2025/01/17 11:14 AM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1124862736	MAYERLY CAROLINA ARANZAZU SARASTY	vereda san antonio	3223821876	maranzazusa1314@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		PUTUMAYO	MOCOA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	11/02/2025	83500100	$325.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	140.000	0		0		0	29	2.600	0	142.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	179.200	0	0	0	0	29	3.400	0	182.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	29	0	0	0
ICBF				
0	29	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	140.000	142.600
Pensión	1	179.200	182.600
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	319.200	325.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1124862736	MAYERLY CAROLINA ARANZAZU SARASTY		vereda san antonio	3223821876	maranzazusa1314@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			PUTUMAYO	MOCOA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	11/02/2025	83500100	$325.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1124862736	ARANZAZU SARASTY MAYERLY CAROLINA	3	0			N	X																25-14	1.120.000	179.200	0	0	0	0	EPS037	1.120.000	140.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901887481	4	SAS ALTURAS TSA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	Principal	TRASVERSAL 70D BIS 68-75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3209872640	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1130384922	9478943376	E	2024/12/18	2024/12/16	BANCOLOMBIA	0	$592,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (11 Afiliados)																							$1,906,674	$305,800			$1,906,674	$77,000			$1,906,674	$77,000			$1,906,674		$133,100		$0	$0		$592,900
Centro de Trabajo: JAVIER VEGA (11 Afiliados)																							$1,906,674	$305,800			$1,906,674	$77,000			$1,906,674	$77,000			$1,906,674		$133,100		$0	$0		$592,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados)																							$1,906,674	$305,800			$1,906,674	$77,000			$1,906,674	$77,000			$1,906,674		$133,100		$0	$0		$592,900
1	CC	1007553784	ACOSTA ORTIZ JUAN CAMILO	X																	23020 1	4	$173,334	$27,800	ESSC62	4	$173,334	$7,000	CCF21	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	6.960%	$12,100	4	$0	$0	Si	$53,900
2	CC	1233188189	CHAÑA MADROÑERO JOHNNY FABIAN	X																	23020 1	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$7,000	CCF21	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	6.960%	$12,100	4	$0	$0	Si	$53,900
3	CC	1080041374	CUPACAN FIGUEROA DAVID SANTIAGO	X																	23020 1	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$7,000	CCF21	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	6.960%	$12,100	4	$0	$0	Si	$53,900
4	PT	5447111	DIAZ MORALES RAUL GUILLERMO	X																	23030 1	4	$173,334	$27,800	EPS002	4	$173,334	$7,000	CCF21	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	6.960%	$12,100	4	$0	$0	Si	$53,900
5	PT	5442865	GALLARDO SANCHEZ UBENCIO EDUARDO	X																	23030 1	4	$173,334	$27,800	EPS002	4	$173,334	$7,000	CCF21	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	6.960%	$12,100	4	$0	$0	Si	$53,900
6	PT	5022647	GARCIA MENDOZA YEISON JOSE	X																	23030 1	4	$173,334	$27,800	EPS042	4	$173,334	$7,000	CCF21	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	6.960%	$12,100	4	$0	$0	Si	$53,900
7	CC	1005098706	GRANADA TABA VICTOR MANUEL	X																	23030 1	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$7,000	CCF21	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	6.960%	$12,100	4	$0	$0	Si	$53,900
8	CC	18182206	MENESES CAJAS SILVIO ALBERTO	X																	23030 1	4	$173,334	$27,800	EPSIC5	4	$173,334	$7,000	CCF21	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	6.960%	$12,100	4	$0	$0	Si	$53,900
9	PT	4970647	PEREZ ROJAS MOISES RAFAEL	X																	23020 1	4	$173,334	$27,800	EPS002	4	$173,334	$7,000	CCF21	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	6.960%	$12,100	4	$0	$0	Si	$53,900
10	PT	4668946	POLANCO CHIRINOS JORGE LUIS	X																	23030 1	4	$173,334	$27,800	ESSC24	4	$173,334	$7,000	CCF21	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	6.960%	$12,100	4	$0	$0	Si	$53,900
11	PT	5674135	VALERO ALARCON JOSE YOEL	X																	23030 1	4	$173,334	$27,800	ESSC24	4	$173,334	$7,000	CCF21	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	6.960%	$12,100	4	$0	$0	Si	$53,900
Total			**Afiliados(11)**																				$1,906,674	$305,800			$1,906,674	$77,000			$1,906,674	$77,000			$1,906,674		$133,100		$0	$0		$592,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901887481	4	SAS ALTURAS TSA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	Principal	TRASVERSAL 70D BIS 68-75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3209872640	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1130384922	9478943376	E	2024/12/18	2024/12/16	BANCOLOMBIA	0	$592,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$305,800	$0	$0	$305,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$194,600	$0	$0	$194,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$111,200	$0	$0	$111,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$133,100	$0	$0	$133,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$133,100	$0	$0	$133,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$77,000	$0	$0	$77,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	11	$77,000	$0	$0	$77,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				11	$77,000	$0	$0	$77,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$7,000	$0	$0	$7,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$7,000	$0	$0	$7,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$14,000	$0	$0	$14,000
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$7,000	$0	$0	$7,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$21,000	$0	$0	$21,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$21,000	$0	$0	$21,000
TOTAL				**11**	**$592,900**	**$0**	**$0**	**$592,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085249647		ARTEAGA POTOSI MARLON FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 5 CASA 18 LAS BRISAS	PASTO-NARIÑO	7360636	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1261042795	9480804496	I	2025/02/12	2025/02/12	BANCOLOMBIA	0	$684,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1085249647	ARTEAGA POTOSI MARLON FERNANDO																		230301	30	EPS005	30		0		0	0	No
Total	**Afiliados(1)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085249647		ARTEAGA POTOSI MARLON FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 5 CASA 18 LAS BRISAS	PASTO-NARIÑO	7360636	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1261042795	9480804496	I	2025/02/12	2025/02/12	BANCOLOMBIA	0	$684,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,000	$0	$0	$384,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$384,000	$0	$0	$384,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$0	$300,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$300,000	$0	$0	$300,000
TOTAL				1	$684,000	$0	$0	$684,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1124313123		MUÑOZ BECERRA LUIS ALFREDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	B villa del Norte cll 27n9 84	MOCOA-PUTUMAYO	4204224	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1259819759	9481327015	I	2025/02/07	2025/02/11	BANCOLOMBIA	4	$259,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1124313123	MUÑOZ BECERRA LUIS ALFREDO	230301	17	$906,667	$145,100	ESSC18	17	$906,667	$113,400		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$906,667**	**$145,100**			**$906,667**	**$113,400**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,100	$400	$0	$145,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,100	$400	$0	$145,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,400	$400	$0	$113,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$113,400	$400	$0	$113,800
TOTAL				**1**	**$258,500**	**$800**	**$0**	**$259,300**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1124862736	MAYERLY CAROLINA ARANZAZU SARASTY	vereda san antonio	3223821876	maranzazusa1314@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			PUTUMAYO	MOCOA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	11/02/2025	83900299	$230.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	100.900	0		0		0	0	0	0	100.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	129.100	0	0	0	0	0	0		129.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	100.900	100.900
Pensión	1	129.100	129.100
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	230.000	230.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1124862736	MAYERLY CAROLINA ARANZAZU SARASTY		vereda san antonio	3223821876	maranzazusa1314@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			PUTUMAYO	MOCOA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	11/02/2025	83900299	$230.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1124862736	ARANZAZU SARASTY MAYERLY CAROLINA	3	0			N	X																25-14	806.650	129.100	0	0	0	0	EPS037	806.650	100.900		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900628905-1	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO	CR 7 109 28	6013003019	administrativo@coincosas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	MOCOA PUTUMAY	020	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	Y		83798115	$396.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	396.400				396.400	0	0	396.400			3.964	396.400	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	396.400	396.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	396.400	396.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900628905-1	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO		CR 7 109 28	6013003019	administrativo@coincosas.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	MOCOA PUTUMAY	020	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	Y		83798115	$396.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1085249647	ARTEAGA POTOSI MARLON FERNANDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1124313123	MUÑOZ BECERRA LUIS ALFREDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1124862736	ARANZAZU SARASTY MAYERLY CAROLINA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	87574554	FAJARDO BARCO NORBERTO DAVID	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901887481	4	SAS ALTURAS TSA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	TRASVERSAL 70D BIS 68-75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3209872640	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1203045485	9480409553	E	2025/01/21	2025/01/20	BANCOLOMBIA	0	$1,632,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (6 Afiliados)																								**$6,326,672**	**$943,800**			**$6,326,672**	**$184,100**			**$6,326,672**	**$184,100**			**$6,326,672**		**$320,100**		**$0**	**$0**		**$1,632,100**
Centro de Trabajo: MOCOA (6 Afiliados)																								**$6,326,672**	**$943,800**			**$6,326,672**	**$184,100**			**$6,326,672**	**$184,100**			**$6,326,672**		**$320,100**		**$0**	**$0**		**$1,632,100**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																								**$6,326,672**	**$943,800**			**$6,326,672**	**$184,100**			**$6,326,672**	**$184,100**			**$6,326,672**		**$320,100**		**$0**	**$0**		**$1,632,100**
1	CC	18126897	CHICUNQUE BECERRA JESUS CLEMENTE										X									230301	8	$346,667	$41,700	ESSC18	8	$346,667	$0	CCF21	8	$346,667	$0	14-11	8	$346,667	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$41,700
2	CC	18126897	CHICUNQUE BECERRA JESUS CLEMENTE	X																		230301	13	$563,334	$90,200	ESSC18	13	$563,334	$22,600	CCF21	13	$563,334	$22,600	14-11	13	$563,334	6.960%	$39,300	13	$0	$0	Si	$174,700
3	PT	5447111	DIAZ MORALES RAUL GUILLERMO										X									230301	8	$346,667	$41,700	EPS002	8	$346,667	$0	CCF21	8	$346,667	$0	14-11	8	$346,667	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$41,700
4	PT	5447111	DIAZ MORALES RAUL GUILLERMO																			230301	22	$953,334	$152,600	EPS002	22	$953,334	$38,200	CCF21	22	$953,334	$38,200	14-11	22	$953,334	6.960%	$66,400	22	$0	$0	Si	$295,400
5	CC	18130265	ESQUIBEL ROJAS WINDEN ORLANDO										X									230301	8	$346,667	$41,700	EPSIC3	8	$346,667	$0	CCF21	8	$346,667	$0	14-11	8	$346,667	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$41,700
6	CC	18130265	ESQUIBEL ROJAS WINDEN ORLANDO	X																		230301	13	$563,334	$90,200	EPSIC3	13	$563,334	$22,600	CCF21	13	$563,334	$22,600	14-11	13	$563,334	6.960%	$39,300	13	$0	$0	Si	$174,700
7	CC	85439632	GUTIERREZ CARREÑO ELEXI	X	X																	230201	14	$606,667	$97,100	EPSIC5	14	$606,667	$24,300	CCF21	14	$606,667	$24,300	14-11	14	$606,667	6.960%	$42,300	14	$0	$0	Si	$188,000
8	CC	18182206	MENESES CAJAS SILVIO ALBERTO										X									230301	8	$346,667	$41,700	EPSIC5	8	$346,667	$0	CCF21	8	$346,667	$0	14-11	8	$346,667	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$41,700
9	CC	18182206	MENESES CAJAS SILVIO ALBERTO																			230301	22	$953,334	$152,600	EPSIC5	22	$953,334	$38,200	CCF21	22	$953,334	$38,200	14-11	22	$953,334	6.960%	$66,400	22	$0	$0	Si	$295,400
10	PT	4970647	PEREZ ROJAS MOISES RAFAEL										X									230201	8	$346,667	$41,700	EPS002	8	$346,667	$0	CCF21	8	$346,667	$0	14-11	8	$346,667	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$41,700
11	PT	4970647	PEREZ ROJAS MOISES RAFAEL																			230201	22	$953,334	$152,600	EPS002	22	$953,334	$38,200	CCF21	22	$953,334	$38,200	14-11	22	$953,334	6.960%	$66,400	22	$0	$0	Si	$295,400
Total			**Afiliados(6)**																					$6,326,672	$943,800			$6,326,672	$184,100			$6,326,672	$184,100			$6,326,672		$320,100		$0	$0		$1,632,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901887481	4	SAS ALTURAS TSA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	TRASVERSAL 70D BIS 68-75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3209872640	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1203045485	9480409553	E	2025/01/21	2025/01/20	BANCOLOMBIA	0	$1,632,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$943,800	$0	$0	$943,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$652,400	$0	$0	$652,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$291,400	$0	$0	$291,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$320,100	$0	$0	$320,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$320,100	$0	$0	$320,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$184,100	$0	$0	$184,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	$184,100	$0	$0	$184,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$184,100	$0	$0	$184,100
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$22,600	$0	$0	$22,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$22,600	$0	$0	$22,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	2	$62,500	$0	$0	$62,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$76,400	$0	$0	$76,400
TOTAL				**6**	**$1,632,100**	**$0**	**$0**	**$1,632,100**

ANEXO 9
PÓLIZAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**BOGOTA**	**11**	**11-44-101239016**	**1**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	**01**	**2025**	**01**	**11**	**2024**	**00:00**	**21**	**01**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	SANCHEZ QUICENO, ALLAN EDWARD		**CC: 9.731.335**
DIRECCIÓN: BR EL DORADO CRA 9A 15B 20	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELÉFONO:	3185311222

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO		**NIT: 800.165.872-6**
DIRECCIÓN: CALLE 19 NO. 23-00 PISO 2	CIUDAD: PASTO, NARIÑO	TELÉFONO	7292851
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6973355, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA - PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**01/11/2024**	**21/07/2025**	**$6,667,332.00**	**$6,667,332.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**01/11/2024**	**21/01/2028**	**$6,667,332.00**	**$6,667,332.00**
CALIDAD DEL SERVICIO	**31/12/2024**	**31/12/2029**	**$6,667,332.00**	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA SEGUN ACTA DE SUSPENSION No. 1 DE FECHA FIRMA 20/12/2024 Y ACTA DE REINICIO DE FECHA FIRMA 14/01/2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SE ACTUALIZA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******8,000.00	$ *******4,000.00	$ *******2,280.00	$ ***********14,280.00	$ *******20,001,996.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASINPETROL LIMITADA ASESORES DE SEG	83052	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

11-44-101239016

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101239016	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	01	2025	01	11	2024	00:00	21	01	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	SANCHEZ QUICENO, ALLAN EDWARD		**CC: 9.731.335**
DIRECCIÓN: BR EL DORADO CRA 9A 15B 20	**CIUDAD:** MOCOA, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	3185311222

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO		**NIT: 800.165.872-6**
DIRECCIÓN: CALLE 19 NO. 23-00 PISO 2	**CIUDAD:** PASTO, NARIÑO	**TELÉFONO:**	7292851

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101239016

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**BOGOTA**	**11**	**11-44-101239016**	**2**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	**01**	**2025**	**01**	**11**	**2024**	**00:00**	**03**	**02**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
SANCHEZ QUICENO, ALLAN EDWARD	**CC: 9.731.335**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
BR EL DORADO CRA 9A 15B 20	MOCOA, PUTUMAYO	3185311222

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO	**NIT: 800.165.872-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 19 NO. 23-00 PISO 2	PASTO, NARIÑO	7292851

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6973355, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA - PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**01/11/2024**	**03/08/2025**	**$6,667,332.00**	**$6,667,332.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**01/11/2024**	**03/02/2028**	**$6,667,332.00**	**$6,667,332.00**
CALIDAD DEL SERVICIO	**31/12/2024**	**31/12/2029**	**$6,667,332.00**	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA SEGUN ACTA DE REINICIO CORREGIDA DE FECHA FIRMA 10/01/2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SE ACTUALIZA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******8,000.00	$ *******4,000.00	$ *******2,280.00	$ ***********14,280.00	$ *******20,001,996.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASINPETROL LIMITADA ASESORES DE SEG	83052	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101239016

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101239016	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	01	2025	01	11	2024	00:00	03	02	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	SANCHEZ QUICENO, ALLAN EDWARD		**CC: 9.731.335**
DIRECCIÓN: BR EL DORADO CRA 9A 15B 20	**CIUDAD:** MOCOA, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	3185311222

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO		**NIT: 800.165.872-6**
DIRECCIÓN: CALLE 19 NO. 23-00 PISO 2	**CIUDAD:** PASTO, NARIÑO	**TELÉFONO:**	7292851

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101239016

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 10
CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE INTERVENTORÍA.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia **ANEXO EQUIPO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	FT-SID-007	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	1 DE 2	

		FECHA	31 / 1 / 2025	

OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO

INTERVENTOR ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DICIEMBRE **CONTRATO No.** CO1.PCCNTR.6973355 **MUNICIPIO** MOCOA

CONTRATISTA ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

DIA / MAQUINA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	10	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
COMPUTADORES														A		A	A	A	A	A	A		A								
HERRAMIENTA MENOR														A		A	A	A	A	A	A		A								

CONVENCIONES
ACTIVO = **A**
REPARACION = **R**
INACTIVO = **I**

Firma
Nombre: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
Matricula No.: 63202-094726 QND

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANEXO EQUIPO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PAGINA	2	DE	2

FECHA	31	1	2025

OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO

INTERVENTOR ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ENERO **CONTRATO No.** CO1.PCCNTR.6973355 **MUNICIPIO** MOCOA

CONTRATISTA ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

DIA / MAQUINA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
COMISION TOPOGRAFICA	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
HERRAMIENTA MENOR	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A

CONVENCIONES
ACTIVO = **A**
REPARACION = **R**
INACTIVO = **I**

Firma
Nombre: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
Matricula No.: 68202-094726 QND

ANEXO 11
CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	CÓDIGO		
		VERSIÓN	1	
	ANEXO PERSONAL DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	PAGINA	1 DE 2	

		FECHA	31 / 1 / 2025
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO	**INTERVENTOR**	ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MES DICIEMBRE **CONTRATO No.** No. CO1.PCCNTR.6973355 **MUNICIPIO** MOCOA-PUTUMAYO

CONTRATISTA ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

DIA / PROFESIONAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DIRECTOR DE INTERVENTORIA																X				X	X										
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													X	X		X	X	X	X	X	X										
PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD INDUSTRIAL													X	X		X	X	X	X	X	X										
PROFESIONAL AMBIENTAL														X					X	X	X										

Firma

Nombre: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

Matricula No.: 63202-094726 QND

	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia **ANEXO PERSONAL DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO		
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	2 DE 2	

FECHA 31 1 2025

OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO

INTERVENTOR ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MES ENERO **CONTRATO No.** No. CO1.PCCNTR.6973355 **MUNICIPIO** MOCOA PUTUMAYO

CONTRATISTA ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

DIA / PROFESIONAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	1	20	21	22	23	24	25	1	27	28	29	30	31
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	X	X				X				X	X			X	X		X			X		X		X				X	X		X
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD INDUSTRIAL	X	X				X	X	X	X		X		X	X	X	X		X		X	X	X	X		X		X	X	X	X	
PROFESIONAL AMBIENTAL	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X

Firma

Nombre: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

Matricula No.: 68202-094726 QND

ANEXO 12 APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CONTRATISTAS DE INTERVENTORÍA.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANEXO CONTROL DE APORTES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE LA INTERVENTORÍA

SEGÚN RELACIÓN DE NÓMINA DEL FORMULARIO N° 2 MES

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	31	1	2025

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	SUELDO MENSUAL (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL-SEPTIEMBRE ARP	EPS	PENSIÓN	TOTAL MES	TOTAL ACUMULADO
1	ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO	9.731.335	$ 3.000.000,00	$ 208.800	$ 255.000	$ 360.000		
2	FHANOR BRAVO GARCIA	1.124.856.458	$ 2.500.000,00	$ 174.000	$ 212.500	$ 300.000		
3	Erika Daniela Arias Revelo	1.124.857.971	$ 1.300.000,00	$ 90.480	$ 110.500	$ 156.000		
4	JAVIER ARTURO VILLOTA ROSERO	1.123.304.080	$ 2.000.000,00	$ 139.200	$ 170.000	$ 240.000		
TOTA	**TOTAL NÓMINA**		**$ 8.800.000**	**$ 612.480**	**$ 748.000**	**$ 1.056.000**	**$ 2.416.480**	**$ 2.416.480**
2. APORTES PARAFISCALES				**CAJA**	**SENA**	**ICBF**		
BASE APORTES PROYECTO			**$ 8.800.000**	**4%**	**2%**	**3%**		
TOTAL APORTES MENSUALES PAGADOS POR PARAFISCALES				$ 352.000	$ 176.000	$ 264.000	**$ 792.000**	**$ 792.000**
TOTAL PAGOS SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES							**$ 3.208.480**	**$ 3.208.480**

Firma

Nombre: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

Matricula No.: 63202-094726 QND

ANEXO 13
BITÁCORA DE OBRA.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

Viernes 13 de diciembre de 2024
clima: mañana nublada, tarde soleada.
Personal: 1 maestro, 2 oficiales, 4 ayudantes, 2 electricos, hsq, residente y director de obra, y 3 oficiales nuevos.
Actividades.

Se realiza resane de paredes en auditorio Piso 2, y otras áreas internas, se resanan humedades en ventanas, se continua con demolición de piso en unidades sanitarias de piso 2.

Residente obra

Residente interventoria.

Sábado 14 de diciembre de 2024
clima: mañana lluvias moderadas
Personal: 1 maestro, 2 oficiales, 4 ayudantes, 2 electricos, hsq, residente, y director de obra. + 3 oficiales
Actividades:

Se continua con desalojo de escombros, y demoliciones, se carga volqueta con escombros en el sótano, se continua con resane de paredes en piso 2 oficinas internas.

Powered by CamScanner

Domingo 15 de diciembre 2024
clima:
Personal:

Actividades.

No se desarrollan actividades durante esta jornada.

Residente obra

Residente interventoría

Lunes 16 de diciembre 2024
clima: mañana nublada, tarde lluvias moderadas.
Personal: 1 maestro, 2 oficiales, 4 ayudantes, 2 electricos, hsq, residente y director de obra. + 3 oficiales
Actividades:

Se continua con la realización de regatas para la instalación de tubería conduit para el tema eléctrico en unidades sanitarias de piso 2, se continua con resane de paredes y filos para oficinas internas, en piso 2.
se solicita parar actividades 8-10 am por temas de ruido, para que se desarrollen actividades del palacio de justicia.

Residente obra

Residente interventoría

Powered by CamScanner

martes 17 de diciembre de 2024
clima: mañana soleada, tarde nublada.
Personal: 1 maestro, 2 oficiales, 4 ayudantes, 2 eléctricos, hsq, residente y director de obra. + 3 oficiales
Actividades:

se Realiza cambios y ajustes en tuberias sanitarias e hidráulicas en unidades sanitarias en piso 2, se realizan regatas para el tema eléctrico en baterías de piso 2, se continua con resanes de oficinas piso 1 y piso 2.

LUIS ALFREDO MUÑOZ
Residente OBRA

Residente interventoria

miercoles 18 de diciembre de 2024
clima: lluvias moderadas, tarde nublada.
Personal: 1 maestro, 2 oficiales, 4 ayudantes, 2 eléctricos, hsq, residente y director de obra., + 3 oficiales.
Actividades:

se continua adecuando tuberias sanitarias e hidráulica en baterías sanitarias, se continua con resane de paredes y filos con estuco. en oficinas interiores de piso 1 y piso 2.

LUIS ALFREDO MUÑOZ
Residente OBRA

Residente interventoria

Powered by CamScanner

Jueves 19 de diciembre de 2024.
Personal: 1 maestro, 2 oficiales, 4 ayudantes, 2 electricos, hsq, residente y director de obra, + 3 oficiales.
clima:

Actividades:

Se da inicio a pintura interna de oficinas, se continua con resanes, tambien con retiro de escombros, se continua con demoliciones. nos solicitan parar actividades por temas de reuniones en un auditorio. se realiza demoliciones a nivel de sótano para accesos nuevos.

USA Residente OBRA

Residente Interventoria.

Viernes 20 de diciembre de 2024
Personal: 1 maestro, 2 oficiales, 4 ayudantes, 2 eléctricos, hsq. residente y director de obra. + 2 oficiales.
clima:

Actividades:

Se continua con actividades de pintura, y resane de paredes y filos, en oficinas de piso 1 y piso 2, se organizan tuberias hidrosanitarias en baterias sanitarias de piso 1.

Nota: Interventoria el dia de hoy envia OFICIO-CI-014 de asunto Concepto de viabilidad para suspensión N°1 y OFICIO-CI-015 de asunto Solicitud de suspension N°1 del contrato de interventoria.

Powered by CamScanner

Sábado 21 de diciembre de 2024
Personal: 1 maestro, 2 oficiales, 4 ayudantes, 2 electricos hsq, residente y director de obra, + 2 oficiales.
clima: lluvias moderadas en la mañana.

Actividades:

Se continua con actividas de pintura de oficinas en Piso 1, así mismo se continua con resanes de Paredes y Filos, se realiza aseo general.

LUIS ALFREDO Muñoz
Residente OBRA

Residente Interventoria

Domingo 22 de diciembre de 2024.
Personal.

clima:

Actividades:
No se desarrollan actividades durante esta jornada

LUIS ALFREDO Muñoz

Powered by CamScanner

lunes 23 de diciembre de 2024
Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes, 2 eléctricos, hsq, residente y director de obra.
Clima: Mañana lluvias Intensas, tarde soleada.
Actividades:
Se realizan cambio y ajuste de tuberías en Piso 3, tanto hidráulicas como sanitarias, se desarrollan actividades de estuco para resanes de paredes en Piso 1 y Piso 2.

Residente Obra

Residente Inter

Clima: lluvias moderadas en la mañana, soleado en la tarde.
Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 4 ayudantes, 2 eléctricos, hsq, residente y director de obra.
Actividades:

Se desarrollan actividades de resane de pintura dentro de oficinas en piso 1 y Piso 2, se instala formaleta para resanes en baterías de primer piso, los eléctricos instalan tubería y cajas en los nuevos puntos requeridos en las baterías sanitarias.

Residente Obra

Residente Inter.

Powered by CamScanner

martes 14 de diciembre de 2024 (14 de Enero 2025)
Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes, hsq, residente y director de obra.
clima: lluvias moderadas la mayor parte del día.

Actividades:

No se desarrollan actividades en exteriores, se desarrollan trabajos de pintura en interiores oficinas 1, 2 y 3er piso.

Nota: Interventoria en cumplimiento de sus obligaciones reliza a dos obreros que no cuentan con afiliacion a Riesgos ARL y NO cuentan con los EPP necesarios.

Luis Alfonso Muñoz
RESIDENTE OBRA.

Residente Inter

miercoles 15 de enero de 2025
clima: mañana con lluvias intensas, tarde soleada.

Personal: 1 maestro, 3 oficial, 3 ayudante, hsq, residente obra, y director de obra.

Actividades:

Se continuan con trabajos de pintura en piso 1, 2 y 3. se realizan alguna demolición en baños del tercer piso.

Nota: No se encuentra en obra el residente de obra y la Profesional SST y parte del personal operativo.

Luis Alfonso Muñoz

Powered by CamScanner

Jueves 16 de enero de 2025
Personal : 1 maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes, hsq, residente y director de obra.
clima : día nublado.

Actividades:

Se continua con trabajos de lija, estuco y Pintura en oficinas interes, en Piso 2, Piso 3 y Piso 4.
Por temas de ruido, solicitan que se furen actividades de demolicion.

Nota: la Interventoria ante la no entresa de Planillas de SS. de todo el personal, ordena retirar a todo el personal de obra apartir de las 10.00 am.

Residente Obra

Residente Inter

Viernes 17 de enero de 2025
Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes, hsq, residente y director de obra.

clima: dia soleado.

Actividades.

Se continua con trabajos de lijado y preparación de superficies para pintar en piso 2, Piso 3 y Piso 4.

Nota: Interventoria da un plazo hasta las 9:00 am para la entrega de planillas. Ante la negativa y la falta de información Se suspende nuevamente Actividades de obra.

Residente OBRA

Residente Inter

Powered by CamScanner

Sábado 18 de enero de 2025
Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes, hsq, residente obra, director de obra.

clima: nublado.

Actividades.

Se desarrollan trabajos de Pintura en interiores entre Piso 1 y Piso 4.

Residente OBRA

Residente Inter.

Domingo 19 de enero de 2025
Personal: 1 maestro, 2 ayudantes, 3 oficiales, hsq, director de obra, residente.

clima: día nublado, tarde de sol.

Actividades:

Se realizan trabajos de pintura en lugares habilitados para fin de semana en Piso 2 y Piso 3.

Residente obra

Residente Inter.

Powered by CamScanner

lunes 20 de enero de 2025
Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes.
hsg, residente y director de obra.

clima: dia soleado.

Actividades:

Se realizan trabajos de estuco y pintura, resanes en piso 1, 2, 4.

Nota: Interventoria envia OFICIO-CI-018 de asunto Concepto de viabilidad a solicitud de adición de tiempo del contrato de obra y mediante OFICIO-CI-019 - solicitud de adición en tiempo para el contrato de Interventoria

Residente Obra

Residente Interventoria

martes 21 de enero de 2025
Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes, hsg.
residente y director de obra.

clima: lluvias moderadas.

Actividades:

Se desarrollan actividades de estuco y pintura piso 1, 2, 3, y se solicita al contratista no generar ningun tipo de ruido cuando hayan audiencias.

Residente Obra.

Residente Interventoria

miercoles 22 de enero de 2025
Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes, hsq, Residente y director de obra.

clima: día nublado.

Actividades:

Se desarrollan actividades de estuco, resanes y preparación de superficies, se pintan oficinas en piso 1, piso 2 y piso 4, se instala super board en baños primer piso.

USA/Frenco Muñoz
Residente obra

Residente Inter.

Jueves 23 de enero de 2025
Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 4 ayudantes hsq, residente y director de obra.

clima: mañana de sol, tarde nublada.

Actividades.

Se continua preparando superficies para resanar, estucar y pintar, en piso, 2, 3 y piso 4.

USA/Frenco Muñoz

Viernes 24 de enero de 2025
Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 4 ayudantes, hsq. residente y director de obra.

clima: día nublado

Actividades.

Se desarrollan actividade de estuco y pintura. oficinas interna piso 2, 3, y 4, se instala super board en baño 2 piso.

Residente obra

Residente Inter.

sábado 25 de enero de 2025
Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 4 ayudantes, hsq Residente y directer de obra.

Clima: dia soleado.

Actividades:

Se realizan actividades de estuco y pintura en los pisos 2, 3, 4 y.

Nota. Se remite oficio-CI-020 Respuesta al oficio RM-018-Mayo. solicitud de aprobacion de enchapes de piso actualizada.

Residente obra

Residente Inter.

Powered by CamScanner

domingo 26 de enero de 2025
Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes, hsg., residente y director de obra.

clima: dia soleado.

Actividades:

Se desarrollan actividades de estuco y pintura, en Pisos 2, 3, y 4.

Residente OBRA

Residente Inter.

lunes 27 de enero de 2025
Personal: 1 maestro, 3 oficiales y ayudantes, hsg residente y director de obra.

clima: lluvias moderadas.

Actividades:

Se desarrollan trabajos de estuco y pintura en Pisos 1, 2, 3 y 4, se suspende instalación de muros en Super Board por temas de ruido,
Nota: se envia OFICIO-CI-022 Respuesta al oficio RM-018-MOROA Solicitud de aprobación de enchapes de piso actualizada.

Residente OBRA

Residente Inter.

Powered by CamScanner

martes 28 de enero de 2025
Personal: 1 maestro, 3 oficiales, y ayudantes, 1 electrico, hsy, residente y director de obra

clima: lluvias intensas.

Actividades.

Se desarrollan actividades de estuco y pintura en oficinas en pisos 2, 3 y 4.
Se continua con instalaciones eléctricas en baños segundo piso.

Nota: Se envia Oficio solicitud de proroga del contrato de Interventoria.

Residente OBRA

Residente Inter.

miercoles 29 de enero de 2025
Personal. 1 maestro, 3 oficiales, y ayudantes 1 electrico, hsy, residente y director de obra.

clima: dia nublado

Actividades

Se desarrollan actividades de estuco y Pinturas en los diferentes pisos.
Se ejecutan trabajos eléctricos en baños piso 2.

Residente OBRA

Residente Inter.

Powered by CamScanner

Jueves 30 de enero de 2025
Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 4 ayudantes, 1 eléctrico, hsg, residente y director de obra.

clima: lluvias Intensas.

Actividades.

Se continua con actividades de estuco y pintura, así como actividades eléctricas en baño de piso 2.

Residente OBRA

Residente Inter

Viernes 31 de enero de 2025
Personal: 4 maestro, 3 oficiales, 4 ayudantes, 1 electrico, hsg, residente y director de obra.

clima: dia nublado.

Actividades.

Se continua con trabajos de estuco y pintura en los diferentes pisos, así mismo se avanza en el tema electrico en baños piso 2.

Residente OBRA

Residente Inter.

Powered by CamScanner

ANEXO 14
INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

INFORME No. 02

INFORME SEGUIMIENTO MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Contrato de obra N°CO1.PCCNTR.6947019: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO".

ELABORÓ:

ERIKA DANIELA ARIAS REVELO

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PERIODO COMPRENDIDO: 14 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2024 Y DEL 14 AL 31 DE ENERO

MOCOA PUTUMAYO

2025

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán - Mocoa - Putumayo

Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN. 3
2. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA 3
3. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL 4
4. EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES. 4
5. ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 4
6. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 5
7. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5

7.1. INSPECCION DEL ESTADO Y USO ADECUADO DE LOS EPP 5

8. CAPACITACIONES Y CHALAS PREOPERACIONALES ENSEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 6

8.1. INDUCCIONES CONCIENTIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO. 7

9. PAUSAS ACTIVAS 8
10. CONFORMACIÓN DE LOS COMITES. 9
11. TRABAJO EN ALTURAS. 9
12. AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL 9
13. SEÑALIZACIÓN COMPLEMENTARIA 9
14. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES. 11

1. INTRODUCCIÓN.

El presente documento es el informe N°01 de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se relaciona las actividades de SST, del contrato Contrato de obra N°CO1.PCCNTR.6947019: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO". Dentro de las actividades realizadas en obra durante el periodo ejecutado se realiza por medio de inspecciones de seguridad correspondientes a la interventoría, de esta manera se determinan las condiciones laborales teniendo en cuenta el riesgo al cual labora el personal. Dentro de las actividades de inspección de SST, se hace la verificación documental y operativa con el fin de verificar la garantía de un trabajo seguro.

El cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido un compromiso para el contratista COINCO primando siempre la promoción y prevención de accidentes y enfermedades laborales mejorando las condiciones de trabajo con el proceso PHVA, Planear, Hacer, Verificar y Actuar, haciendo evaluación y corrección para tener como resultado un plan de mejora activo.

Realizar controles de factores de riesgo en las condiciones de trabajo evidenciadas permite implementar de manera adecuada un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde a las actividades que el contratista programe, realizando diferentes actividades que permiten incrementar la seguridad la seguridad física y la salud mental de los colaboradores afianzando su desarrollo laboral dentro de la programación de las actividades de obra.

A continuación, se presenta información general del contrato de obra, así como también se especifican las actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a la normatividad (Decreto 1443 de 2014, Decreto 1072 de 2015, Resolución 312 de 2019), en la ejecución de las actividades en relación a la inspección y seguimiento diario.

2. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

En la siguiente tabla se relaciona al personal que ingresó a dar inicio en las actividades del presente contrato.

	Personal Administrativo						
NOMBRE	**CARGO**	**C.C**	**INGRESO**	**EGRESO**	**EPS**	**F. P**	**ARL**
Marlon Arteaga	director Obra	1.085.249.647			SANITAS	PORVENIR	SURA
Luis Alberto Muñoz	Residente	1.124.313.123	28/11/2024		EMSSANAR	PORVENIR	SURA
Mayerli Carolina Aránzazu	Residente SST	1.124.862.736	28/11/204		COLPENSIONES	NUEVA EPS	SURA
	Personal Operativo						
NOMBRE	**CARGO**	**C.C**	**INGRESO**		**EPS**	**F. P**	**ARL**
Yeison García	Maestro	23419583	28/11/2024		COOSALUD		SURA
Jorge Luis Polanco	oficial	24466859	28/11/2024		COOSALUD		SURA
José Yoel Valero	oficial	29958308		20/12/2024	COOSALUD		SURA
Juan Camilo Acosta	Aux de obra	1007553784	26/11/2024	26/12/2024			SURA
Moisés Rafael Pérez	Aux de obra	4970647	27/11/2024		SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	SURA

Silvio Meneses	Aux de obra	18182206	02/12/2024			PORVENIR	SURA
Alexis Gutiérrez Carreño	oficial	85439632	10/12/2024	27/12/2024	MALLAMAS	PORVENIR	SURA
Víctor Manuel Granada	Aux de obra	1005098706	26/11/2024		NUEVA EPS	PORVENIR	SURA
Norberto Ramón Pelayo 17 dias	oficial	5331907	14/01/2025				
Raul Guillermo Diaz Morales	Oficial	5447111	14/01/2025				
Jhoefry Jose Bustamante	ayudante	5626299	14/01/2025		NUEVA EPS	PORVENIR	
Hugo Ernesto Vega	Oficial	108522889	23/01/2025		SANITAS	PORVENIR	SURA
	Personal Electricista						
NOMBRE	**CARGO**	**C.C**	**INGRESO**		**EPS**	**F. P**	**ARL**
David Santiago Cupacan	Electricista	1080041379	28/11/2024	26/12/2024	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA
Johnny Chaña - Eléctrico	Electricista	1233188189	28/11/2024		NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA

3. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Se anexan para el periodo del informe la consolidación del cumplimiento de pago de planillas de parte del contratista, la cual es revisada previamente.

Ver anexo 2. Planillas de Pago de Seguridad Social.

4. EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES.

El contratista realiza evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso para tres nuevos colaboradores operativos que ingresaron en este periodo al presente contrato, de igual manera se reportan 4 retiros en el mes de diciembre 2024,

Ver anexo 3. Exámenes Ocupacionales de Ingreso.

5. ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Durante el transcurso de los periodos en operación de la obra se observó que el personal es dotado de todos los elementos necesarios para realizar las actividades requeridas, se realizó de parte de la interventoría la inspección de los EPP entregados y en caso de cambios realizar la respectiva reposición, de igual manera se observó el adecuado uso de elementos de seguridad.

Anexo 4: Entrega de elementos de protección personal



Ilustración 1. entrega de EPP

6. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

Durante este periodo no se identificaron accidentes o incidentes dentro del grupo que comprende el personal del presente contrato de igual manera se evidencia el control y verificación de las condiciones inseguras a las que se enfrentan.

7. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se verificó que durante este mes que se continuara realizando las actividades de sensibilización y cultura de auto cuidado donde el componente SST realiza charlas de manera eventual antes de iniciar la jornada laboral en donde se busca informar sobre los riesgos inherentes en sus labores diarias, La Interventoría SST recomienda continuar realizando esta actividad que refuerza los conocimientos y cuidados individuales y grupales dentro de las actividades de obra programadas. Se verificó el uso adecuado de los EPP y la dotación. **Ver anexo 5: Inspecciones de seguridad y Anexo 6: documentos de vehículo tipo Volqueta.**





Ilustración 2. Inspección de Seguridad

7.1. INSPECCION DEL ESTADO Y USO ADECUADO DE LOS EPP

Se verificó que el componente SST continúa dando cumplimiento en la entrega de elementos de protección personal contra lluvias como es el traje impermeable al personal que estaba

pendiente, de esta manera se subsana los compromisos con el personal y se contrarresta la posibilidad de enfrentar accidentes o enfermedades laborales. *Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Titulo IV, Capitulo II De Los Equipos Y Elementos De Protección, Artículo 176 a 201*).

Se continúa dando cumplimiento a las normas del SG-SST realizando entrega de reposición de elementos de protección personal se sugiere al contratista continuar realizando inspección de EPP además de su adecuado uso preventivo.



Ilustración 3. Inspección del uso adecuado de los EPP.

8. CAPACITACIONES Y CHALAS PREOPERACIONALES ENSEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La realización de capacitaciones del personal es de vital importancia ya que de esta manera se previenen accidentes y enfermedades laborales, que se pueden dar paso por las actividades y procesos del proyecto teniendo en cuenta los estándares establecidos por el SG-SST. *Decreto 1072, artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en seguridad y salud en el trabajo – SST. El empleador o contratante debe definir los requisitos de conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo necesarios para sus trabajadores.*

- Comité de convivencia laboral. ¿qué es? Funciones y obligaciones
- ¿Qué es COPASST? ¿Funciones y obligaciones?
- Lesiones Osteomusculares.
- Recomendaciones de SST, recomendaciones generales de obra – Calistenia
- Posturas prolongadas Ergonomía
- 10 factores humanos que causan accidentes.
- Improvisación
- Movimiento repetitivo – mala postura
- Carga suspendida e izaje
- Barandas y protecciones
- Línea de fuego

- Tableros Eléctricos
- Proyección de Partículas
- Calistenia – ARL
- ¿Que son las paradas de emergencia?
- Actividad mental – Proactividad
- Primeros auxilios básicos
- Act. Manzana, naranja y pera (escucha, atención, ordenes)
- Calistenia – Inspección herramienta menor
- Cambios rotativos – Calistenia
- Riesgo eléctrico
- ¿Qué es el ODI?
- Exposición al ruido
- Abuso de consumo de bebidas energéticas



Ilustración 4. Charlas y Capacitaciones

Ver anexo 6. Charlas preoperacionales

8.1. INDUCCIONES CONCIENTIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO.

En coordinación del componente SST se realizó inducción de personal nuevo que prestó su servicio durante este periodo, la interventoría verificó que los estándares y normas de seguridad terminaran con éxito se observó la realización de notificación de riesgos laborales, con el propósito de brindar una efectiva orientación de los riesgos, su clasificación, las funciones que desempeñará los fines y objetivos de la empresa, su estructura y demás temas relacionados con el Sistema de Gestión, de igual manera se realiza evaluaciones del conocimiento adquirido en esta actividad de vital importancia para la realización de actividades.

Ver anexo7: Inducciones a personal Nuevo





Ilustración 5. Inducción general al personal

9. PAUSAS ACTIVAS

Se realiza actividades de pausas activas, dinámicas y calentamiento o calistenia, antes, durante y al finalizar la jornada laboral estas actividades fortalecen a los trabajadores debido que por medio de ellas se puede recuperar energías, fortalecer el desempeño laboral y aumentar la eficiencia en el desarrollo de las actividades propuestas en el día a día para continuar con el proyecto, estas actividades ayudan a minimizar las enfermedades osteomusculares y reducir el estrés laboral.

Mediante seguimiento diario a las pausas activas se evidencia el cumplimiento, con la práctica de estiramientos y calentamiento muscular previo al inicio labores y mediante breves descansos durante la jornada laboral que sirven para recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo esto en cumplimiento a la normatividad legal vigente colombiana.





Ilustración 6. Pausas activas preoperacionales.

10.CONFORMACIÓN DE LOS COMITES.

Teniendo en cuenta el inicio de obra no ha sido posible conformar los comités ya que la totalidad del personal aún se encuentra siendo mínimo, más sin embargo se hace la recomendación al contratista SST de hacer la elección de los comités lo más pronto posible.

11. TRABAJO EN ALTURAS.

Para dar cumplimiento al presente contrato están programadas actividades en las cuales se realizarán trabajos de alto riesgo en alturas, hasta el momento no se han dado inicio a dichas actividades, es por eso que de parte de la interventoría se vienen realizando sugerencias para la preparación del proceso de inicio de estas.

12. AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL

Se verificó la documentación de COINCO y el cumplimiento de sus obligaciones legales y que realice las respectivas afiliaciones y aportes al Sistema General de seguridad Social - SGSS de los empleados vinculados al proyecto. Profesional SST diligencia formato de control de personal en el que se detalla los datos del trabajador, fechas de ingreso y egreso, se relaciona ARL, EPS, AFP, a las cuales se encuentra afiliados.

Ver Anexo 1 – Certificaciones de afiliación y anexo 2 - planillas de pago de seguridad social

De la misma manera, el personal activo de interventoría cuenta con afiliación al sistema General de Seguridad Social-SGSS (EPS, ARL, AFP y caja de compensación familiar) y mensualmente se hace verificación de los respectivos aportes, dando cumplimiento a la normatividad correspondiente.

Ver anexo 8. Planilla de Seguridad Social de Interventoría.

13.SEÑALIZACIÓN COMPLEMENTARIA

La señalización reglamentaria ha sido permanente para la regulación de velocidad. Interventoría recomienda realizar seguimiento a esta, garantizando su funcionalidad y visibilidad.









Ilustración 7. señalización

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán - Mocoa - Putumayo

14. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

Durante la ejecución de la obra se pudo observar la colaboración y compromiso de parte del componente SST y la alta dirección con un avance positivo de mejora continua en los procesos de atención, cuidado y prevención dirigida al bienestar de los trabajadores, colaboradores y demás personal perteneciente al proyecto, de la misma manera se observó el cuidado preventivo a los equipos, maquinarias, herramientas e instalaciones, de esta manera el contratista COINCO da cumplimiento al SG-SST en su Decreto 1072 de 2015 como regulador de seguridad y salud en el trabajo de igual manera se vio el cumplimiento en la aplicación del protocolo de bioseguridad.


La interventoría realizó de manera continua el acompañamiento en los procesos y actividades programados por el contratista de igual manera se realizó sugerencias y recomendaciones con el fin de mejorar las condiciones de trabajo, se realizó identificación de riesgos y peligros presentes en obra logrando de la mano del componente SST mitigarlos implementando de manera adecuada el plan de emergencia.

ANEXO 15
INFORME AMBIENTAL.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.6947019

OBJETO:
REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA

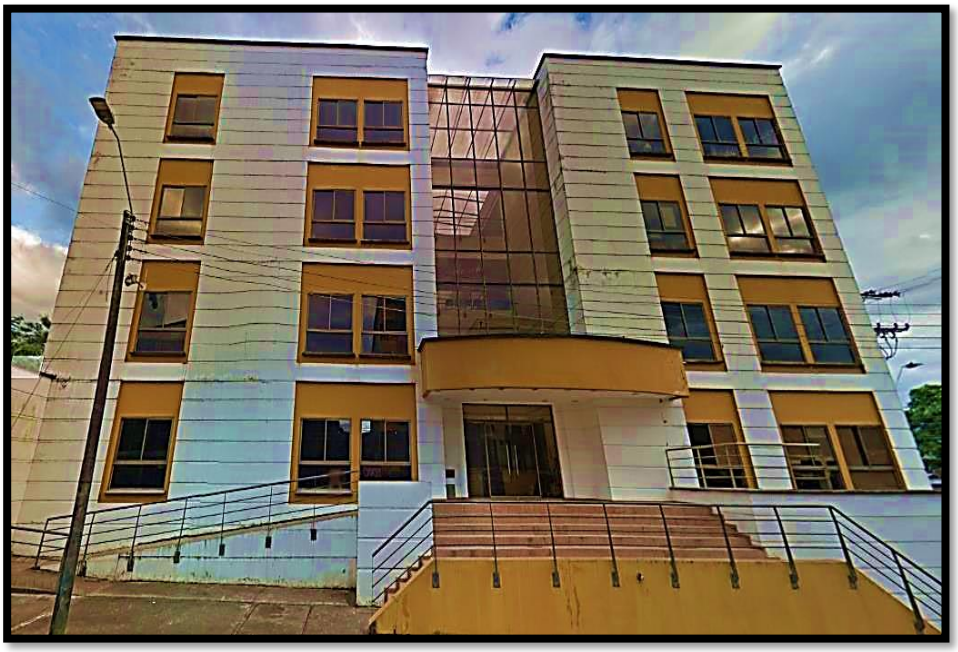

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:
ING. ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

14 DICIEMBRE -23 DICIEMBRE 2024 Y 13 DE ENERO – 31 ENERO 2025

MOCOA – PUTUMAYO

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galan – Mocoa – Putumayo

INTRODUCCION

Las políticas ambientales y las normas legales establecidas en Colombia, determinan claramente la compatibilidad que debe existir entre la ejecución de los proyectos de infraestructura civil que se desarrollan y la conservación del Ambiente basados en criterios de Desarrollo Sostenible, razón por lo cual las entidades contratistas, elaboran un Plan De Manejo Ambiental (PMA), dónde se identifican, evalúan, valoran los posibles impactos y alteraciones al ambiente que se pueden generar durante la ejecución de éste tipo de proyectos para así establecer las medidas requeridas para prevenir, controlar, mitigar o compensar éstos impactos.

Mediante el presente informe ambiental tiene como objetivo evaluar y mitigar los impactos ambientales asociados con la ejecución de las obras de mantenimiento correctivo y preventivo en el Palacio de Justicia. Este documento se elabora con el fin de presentar un trabajo detallado durante el periodo comprendido entre 14 diciembre al 23 diciembre del año 2024 y desde el 13 de enero al 31 de enero del 2025 del componente ambiental que hace parte del Proyecto denominado; REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA.

La interventoría desde la parte ambiental hace la supervisión y control de todas las actividades ejecutadas por el contratista de obra para mitigar los impactos ambientales generados por la construcción del proyecto antes en mención, es claro que toda obra genera un impacto al ambiente, una de las herramientas fundamentales para la verificación de este, se lo realiza mediante la revisión del Plan De Manejo Ambiental (PMA), herramienta con la cual se tendrá un control de las afectaciones realizadas al entorno, teniendo como medio, el registro de seguimiento ambiental, que nos ayudara a la verificación de información, documentos, soportes que permitan evaluar el cumplimiento del contratista y de esa manera tomar las acciones necesarias que garanticen el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el componente ambiental, por parte de interventoría se realizara la respectiva revisión y aprobación del PMA, los informes de avance de cumplimiento de acuerdo al cronograma presentado y a lo exigido en los pliegos de condiciones del mismo.

1. PROBLEMÁTICA

La infraestructura física del Palacio de Justicia es fundamental para garantizar la adecuada prestación de los servicios judiciales, ofreciendo un entorno seguro, funcional y digno tanto para los ciudadanos como para los servidores públicos. Sin embargo, con el paso del tiempo y debido al uso continuo de las instalaciones, surgen diversas problemáticas que comprometen la operatividad, seguridad y conservación del edificio, lo que hace necesaria la implementación de un contrato para realizar obras de mantenimiento correctivo y preventivo.

Entre los principales problemas que justifican este contrato se encuentra el deterioro de elementos estructurales, causado por factores como el desgaste natural, la exposición a condiciones climáticas adversas y el uso intensivo de los espacios. Este deterioro se manifiesta en grietas, filtraciones, corrosión de materiales metálicos y debilitamiento de techos, paredes y pisos. Asimismo, los sistemas eléctricos, hidráulicos y de ventilación pueden presentar fallas debido a su antigüedad o falta de mantenimiento, generando riesgos para los usuarios y posibles interrupciones en el servicio.

Además, estas deficiencias afectan la imagen institucional, ya que un edificio en mal estado transmite una percepción de descuido y falta de compromiso con la justicia. Por otra parte, la falta de cumplimiento con normativas de seguridad, accesibilidad y sostenibilidad puede derivar en sanciones legales y en un impacto negativo sobre el entorno ambiental.

En este contexto, el contrato se plantea como una solución al deterioro actual que vive la infraestructura física del palacio de justicia del municipio de Mocoa, departamento del Putumayo, para prevenir daños mayores y garantizar la sostenibilidad de la infraestructura a largo plazo, preservando así su funcionalidad y su rol como símbolo del sistema de justicia.

2. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.1 Descripción del proyecto

El desarrollo de las actividades como reparación de techos, paredes y pisos, mantenimiento de sistemas eléctricos e hidráulicos, pintura y acabados y otros trabajos correctivos y preventivos necesarios del contrato de la obra nos lleva a solucionar el inconveniente, que radica en el actual deterioro que se encuentra la infraestructura física del palacio de justicia municipio de Mocoa Departamento del Putumayo, dado que no cuenta con instalaciones apropiadas, generando incumpliendo con la normatividad y regulaciones vigentes en materia de seguridad, salud ocupacional y accesibilidad, como también, la preservación de la imagen institucional, un edificio bien mantenido y restaurado refleja la imagen de la institución y su compromiso con la justicia y el servicio a la comunidad.

Para el efecto, el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Distrito Pasto, presentó el proyecto "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA"; que fue viabilizado y aprobado, para financiar su ejecución.

2.2 Localización del proyecto

La ejecución de las actividades contractuales se encuentra localizadas en el Departamento del Putumayo ubicado al suroeste del país, en la región Amazónica.

En el municipio de Mocoa que se encuentra localizado está ubicado en la parte norte del Departamento del Putumayo, específicamente en el palacio de justicia, Calle 7 No 6 - 42, Barrio Centro.



Ilustración 1: *Localización General del Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo.*
***Fuente**: www.googlemaps.com*

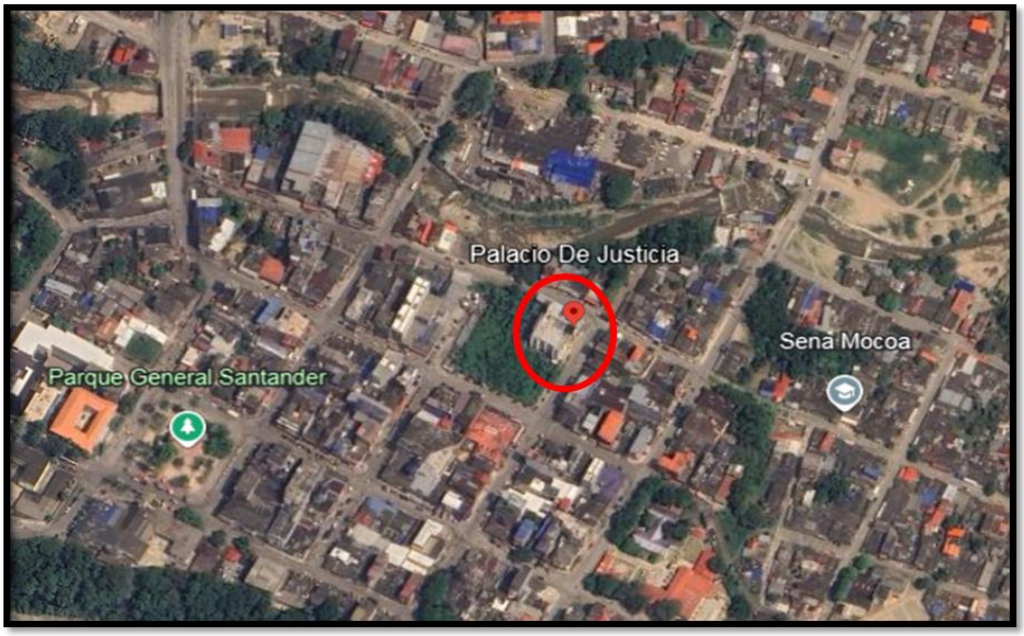


***Ilustración 2**: Localización especifica del área a intervenir en el municipio de Mocoa, Putumayo.*
***Fuente**: www.earth.google.com*

3. REVISIÓN PRELIMINAR DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

De acuerdo a las funciones de la interventoría sobre el componente ambiental, es encargada de la recepción, revisión y seguimiento del PMA, la documentación e informes de cumplimiento ambiental, y todo aquello en el que se involucre este componente, todo esto se debe hacer de acuerdo al cronograma y pliegos de obra, y según los requerimientos de la autoridad ambiental Corpoamazonia como de la supervisión del proyecto que está a cargo. Si la documentación mencionada anteriormente tiene comentarios, observaciones o inconsistencias, el responsable en este caso el profesional ambiental deberá ajustar y subsanarlas dentro del término previsto para su entrega. Con base a lo anterior interventoría hace revisión del Plan de manejo Ambiental, presentado por el contratista de obra mediante oficio RM-001 de 8 noviembre 2024. Una vez realizada la revisión respectiva del PMA, se evidencian que el documento contiene 36 folios dentro de los cuales se encuentran los requisitos, lineamientos ambientales y las tres fases del proyecto como Fase 1 caracterización y diagnóstico, fase 2 ejecución de la obra y fase 3 cierre del proyecto.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES INFORMADO POR INTERVENTORÍA

De acuerdo con la actividad establecida en el contrato de obra CONTRATO N°. CO1.PCCNTR.6947019 DEL 29 DE OCTUBRE 2024, para el presente periodo informado de ejecución del contrato, se realizó verificación seguimiento a las siguientes actividades:

- Programar y coordinar con el Contratista de obra ambiental, las actividades de seguimiento del PMA y la ejecución del contrato e informar previo a su realización.
- Cumplir con la entrega del informe mensual requeridos en los cuales se presente el estado de ejecución, avance del contrato además de las conclusiones y recomendaciones, de acuerdo con la metodología, los formatos y listas de chequeo para tal fin.
- Verificación de la legalidad ambiental de los materiales adquiridos por el contratista de obra, en aras de velar por su calidad, oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas correspondientes; Igualmente se solicitará de manera oportuna la

certificación y/o acreditación de la calidad y legalidad de los materiales al Contratista de obra.

- Verificación del cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad ambiental vigente.
- Control y seguimiento diario de todas las actividades que está ejecutando el contratista de obra, quedando éstas plasmadas en la Bitácora de obra.
- Toma registro fotográfico del estado de avance de la obra en cada visita realizada.
- Elaboración del informe mensual de interventoría.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto 1: Acopio de los materiales</td><td>Foto 2: Acopio de escombros</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>Foto 3: Manejo de escombros</td><td>Foto 4: Cargue de escombros para disposición final</td></tr>
</table>

	
Foto 5: *Cerramiento del área a intervenir*	***Foto 6:*** *Señalización de áreas de acopio*

5. DESARROLLO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

De acuerdo con el avance en la ejecución técnica de las obras correspondientes al periodo informado, se relaciona el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental establecidas en las fichas de manejo ambiental, prestándole particular atención a las medidas formuladas para mitigar los impactos ambientales negativos que la actividad puede causar sobre el ambiente y la comunidad.

A continuación, se presentan los componentes contemplados dentro del Plan de Manejo Ambiental, el cual se va a desarrollar durante la ejecución de las obras del CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.6947019 DEL 29 DE OCTUBRE 2024 cuyo objeto es "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA".

5.1 Componente Biótico

Dado que el presente programa trata de actividades de "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA", no se ve la necesidad de utilización o intervención de áreas circundantes en las que pueda resultar vegetación, fauna y/o floras afectadas.

5.2 Componente Físico

5.2.1 Control De Emisiones Atmosféricas

La contaminación atmosférica generada durante el desarrollo de un programa procede de tres fuentes principales: emisiones difusas de material particulado, gases de combustión y ruido generado por la operación de maquinaria y demolición de estructuras.
El adecuado control a estas fuentes minimiza los efectos adversos al medio ambiente y disminuye los efectos negativos que éstos pueden ocasionar sobre la salud humana. Así mismo, el control de los niveles de ruido por debajo de los límites permisibles permite reducir los problemas de salud ocupacional que estas actividades puedan generar, así como atenuar las incomodidades producidas a la comunidad.

PLAN DE MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS		
IMPACTOS ASOCIADOS	**MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL**	**SEGUIMIENTO Y MONITOREO**
Aumento de las concentraciones de material particulado, humos, gases y ruido en la atmósfera del Palacio de Justicia y alrededores. Afectación a la salud de los trabajadores y de la comunidad cercana al proyecto. Afectación a la calidad del aire en la zona.	**Emisiones atmosféricas (material particulado y gases)** Cuando se requiera realizar algún tipo de demolición, debido a la magnitud de las actividades, el frente de obra debe estar protegido para el control del material particulado con cerramiento perimetral. Mantener control sobre los materiales de construcción que se encuentren en el frente de obra, mantenerlos debidamente cubiertos y protegidos del aire y el agua. Controlar las actividades de construcción que generan gran cantidad de polvo, regando las áreas de	Verificación de la cobertura y humedecimiento de las zonas de acopio de material sobrante y de insumos de la construcción. Inspección de seguridad para vehículos de carga.

	trabajo con agua por lo menos 2 veces al día; realizar esta misma operación a los materiales que se encuentren almacenados temporalmente en el frente de obra (que lo permitan) y que sean susceptibles de generar material particulado. □ Conservar con una humedad suficiente los materiales generados en excavaciones y demoliciones, para evitar que se levante material particulado y cubrirlos, mientras se utilizan, con material plástico o cualquier otro material para impedir las emisiones de partículas al aire □ Inspeccionar que los vehículos que cargan y descargan materiales dentro de las obras estén acondicionados con carpas y lonas para cubrir los materiales. Verificar que cuenten con certificados vigentes de revisión tecno mecánica y de gases. □ Solicitar el apagado de los vehículos mientras se encuentren estacionados en el lugar de la obra.	
	Ruido □ Cuando se requiera usar equipos muy sonoros, a más de 80 decibeles se debe trabajar solo en jornada diurna y por períodos cortos	

	de tiempo siguiendo los parámetros legales aplicables al área donde se desarrolla la obra. □ Programar ciclos de trabajo de máximo 2 horas de ruido continuo, cuando el ruido continuo supere el nivel de ruido del ambiente se debe contar con 32 horas de descanso después de las horas de operación o utilizar equipos insonorizados. □ Advertir previamente a la comunidad sobre la utilización de equipos sonoros, con el fin de que tomen las medidas pertinentes. □ Suministrar elementos de control auditivo al personal de la obra. □ Cuando se requiera realizar trabajos que generen ruido durante las horas de la noche es necesario tramitar permiso de ruido nocturno con la autoridad competente. □ Prohibir a los vehículos que en la obra accionen las bocinas, salvo la alarma de reversa.	

5.2.2 Prevención De La Contaminación De Cuerpos De Agua Y Redes De Servicios Públicos.

El agua resultante de las obras de construcción tiene un alto contenido de partículas minerales suspendidas y en ocasiones puede estar mezclada con restos de cemento, concreto u otras sustancias. Estos materiales provocan

taponamientos en los conductos en alcantarillas, impiden un tratamiento efectivo en las plantas de tratamiento y generan contaminación en los cuerpos de agua que actúan como sus receptores.

PLAN DE MANEJO DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS		
IMPACTOS ASOCIADOS	**MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL**	**SEGUIMIENTO Y MONITOREO**
Alteración de las características del agua. Contaminación de redes de alcantarillado	No realizar vertimientos de residuos líquidos a las calles, calzadas, canales y cuerpos de agua. No eliminar el material sobrante con agua ni dirigirlo a los canales de desagüe. En caso de derrame de mezcla de concreto, ésta se deberá recoger y disponer de manera inmediata, siguiendo los protocolos establecidos. Se prohíben los vertimientos de aceites, pinturas y demás materiales o productos químicos a la red de alcantarillado o su disposición sobre el suelo. Se prohíbe el lavado de vehículos y el descargue de mezclas de concreto en las estructuras de alcantarillado, lo mismo que el vertimiento de cualquier sustancia perjudicial que se genere en la obra. En caso de utilizar concreto mezclado en planta, se recomienda extremar	Informe de clasificación de cuerpos hídricos y manejo de aguas. Inspecciones de seguridad en las actividades laborales. Control de vertimientos provenientes de obra. Manejo de aguas residuales con empresas autorizadas por autoridades ambientales

	las medidas de precaución en el transporte de la mezcla a los frentes de trabajo, con el fin de evitar vertimientos accidentales.	

5.2.3 Disposición De Residuos Sólidos

Una adecuada clasificación de los residuos sólidos permitirá recuperar, reciclar o reutilizar algunos de los materiales, minimizando así la cantidad de desechos no aprovechados. De esta forma, se reducen costos de disposición final, se optimiza el uso de los materiales y se logra un menor impacto ambiental.

Debido al impacto y a las características de los diferentes elementos resultantes de las obras, se elabora el Plan de Gestión Integral de Residuos PGIR.

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS		
IMPACTOS ASOCIADOS	**MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL**	**SEGUIMIENTO Y MONITOREO**
Modificación de las características del suelo y/o del agua. Afectación de la calidad el aire en la zona. Generación y aporte de sólidos en las redes de alcantarillado. Deterioro del paisaje. Generación de focos de contaminación. Inconformidades por parte de la comunidad aledaña. Afectación a la salud de los trabajadores y de la comunidad cercana al proyecto.	**Residuos no peligrosos:** Realizar la clasificación y separación adecuada de los residuos sólidos. El almacenamiento de los residuos debe hacerse en recipientes tipo caneca plástica con tapa. Los recipientes deben estar rotulados con el nombre de acuerdo con el tipo de residuos. Las etiquetas de los recipientes deben contener información clara y entendible para todos, además de ser resistentes al agua o a otros agentes. Las canecas deben ubicarse en sitios estratégicos o puntos ecológicos. Capacitar y sensibilizar a todo el personal de la obra, sobre la gestión integral de los residuos.	Inspección de seguridad para centros de acopio. Tabla de identificación de residuos sólidos. Certificados y licencias ambientales de los gestores de transporte, tratamiento y disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos. Actas y/o certificados de disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos.

	Los recipientes no deben tener sobrecarga de residuos. Identificar a las empresas gestoras encargadas de la recolección periódica, transporte y disposición final de los residuos no aprovechables. Identificar empresas o asociaciones de recicladores y realizar la entrega de residuos aprovechables. Al finalizar la jornada, se debe realizar una limpieza general de la zona donde se realicen las obras con el objeto de recoger todos los residuos presentes en el área.	
	Residuos Especiales y/o Peligrosos Realizar el manejo adecuado de los residuos especiales y/o peligrosos. Para los residuos peligrosos se deben seguir todos los lineamientos establecidos en la normatividad ambiental vigente para su etiquetado, rotulado, almacenamiento y transporte. Separar los residuos de construcción y demolición RCD como escombros, sobrantes de concreto, morteros, cordones, tuberías, etc., de los demás residuos. Los lugares o zonas de almacenamiento temporal del material reciclable de construcción y demolición deben estar provistos de canales	

	perimetrales estructuras para el control de sedimentos. □ Los RCD no pueden obstaculizar el tráfico peatonal y vehicular, deben estar apilados, bien protegidos de agentes externos y ubicados en zonas seguras. □ Se prohíbe: o depositar RCD en zonas verdes, humedales o cerca de cuerpos de agua, o quemar residuos o desechos peligrosos a cielo abierto, □ ingresar residuos o desechos peligrosos en rellenos sanitarios, sino existen celdas de seguridad dentro de éste, autorizadas para la disposición final de este tipo de residuos, la disposición o enterramiento de residuos o desechos peligrosos en sitios no autorizados para esta finalidad por la autoridad ambiental competente, □ El abandono de residuos o desechos peligrosos en vías, suelos, humedales, parques, cuerpos de agua o en cualquier otro sitio. □ Contratar la disposición de los residuos especiales y/o peligrosos con gestores autorizados. □ El manejo, transporte y disposición final de	

	escombros y materiales de construcción, deberá seguir los criterios establecidos por las autoridades competentes.	

5.2.4 Manejo De Movilidad Y Señalización

Las zonas diseñadas para el almacenamiento temporal de los materiales de trabajo y para los trabajos de los desechos deben mantenerse correctamente identificados con cinta de demarcación y con soportes.
Cuando se programe la entrada de vehículos para la descarga o carga de material o la recolección de desechos, es necesario llevar a cabo el control del tráfico con el fin de evitar cualquier incidente de tráfico y crear traumas para los peatones.
Señalar los caminos temporales de paso para peatones y/o vehículos de los cuales es necesario realizar un registro fotográfico e incluirlo en los reportes de administración mensuales.

5.2.5 Uso Y Almacenamiento Adecuado De Materiales De Construcción

Establecer un sistema de manejo adecuado para el transporte, cargue, descargue y manipulación de los materiales de construcción (arenas, grava, triturados, recebos, ladrillos, triturados de arcilla y otros) se evitan pérdidas del mismo y por lo tanto se generan múltiples ventajas de orden financiero, logístico y ambiental. Al mismo tiempo, se reduce la cantidad de escombros y residuos generados, y el aporte de sedimentos y otros contaminantes a las redes de servicios públicos y fuentes de agua.

PLAN DE MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					
IMPACTOS ASOCIADOS Contaminación o alteración de las características del agua, el suelo o el aire. Ocupación del espacio público.					
MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL Almacenamiento de Materiales de Construcción.					
Material	**Alm. en Cubierto**	**Alm. en áreas seguras**	**Alm. sobre estibas**	**Alm. Ligados**	**Requerimientos especiales**

Arena y grava	X				Cubrir con lona grava
Cemento	X		X		Evitar que se humedezcan
Ladrillos, adobes, tejas y adoquine			X	X	almacenar en los embalajes originales hasta el momento de uso, lejos del tráfico de vehículos
Metales	X	X			
Prefabricados				X	
Baldosas	X	X			Envolver con plástico para prevenir que se rayen
Tubería			X	X	Usar separadores es para prevenir que se rueden.
Madera	X	X			Proteger de roturas causadas por mal manejo.
Pinturas		X			Proteger del robo

Material impermeabilizante	X	X			Almacenar Envuelto en Plástico.
Aceites y combustibles		X	X		Almacenar en tanques o toneles cerrados según las cantidades.

Manejo de los materiales:

 Todos los materiales deben provenir de fuentes legales, es decir, deben contar con permisos ambientales y mineros, aspectos que deberán ser certificados por los proveedores.

 Garantizar que el transporte de los materiales se realice en volquetas con cajón totalmente cubierto para impedir el derrame o dispersión de los materiales y de material particulado en el recorrido.

 La cubierta debe ser de material resistente como lona y estar sujeta firmemente a las paredes exteriores del contenedor.

 Evitar el escurrimiento del material húmedo durante el transporte. Para ello, asegurarse que el contenedor del vehículo esté construido con una estructura continua que en su contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios.

Adecuar los horarios y las vías para la circulación de vehículos de carga a los establecidos por la autoridad local.

 Demarcar los sitios de almacenamiento con la señalización establecida.

 Se sugiere el uso de carretillas planas para el traslado del material, para evitar fisuras y daños en el material.

 Cuando se requiera realizar mezclas de concreto en el sitio de la obra, hacerlo sobre una plataforma metálica o sobre un geotextil de un calibre que garantice que no haya contacto con el suelo, de tal forma que el lugar permanezca en óptimas condiciones. No hacer la mezcla directamente sobre el suelo o sobre las zonas duras existentes.

 Utilizar formaletas de madera sólo para la fundición de obras de concreto. Se exceptúan los casos en que se requieren formas especiales.

 En el caso de derrames de mezcla de concreto, es necesario recogerla y disponerla de manera inmediata.

 Siempre y cuando sea posible (por calidad), mantener húmedo el material de

playa que sea necesario (material de recebo), tal como en la construcción de pisos, andenes, etc.
SEGUIMIENTO Y MONITOREO Mapa de identificación de puntos de almacenamientos de materiales de construcción. Inspección de seguridad para centros de acopio.

5.2.6 Protección Del Suelo

En la ejecución de proyectos de obra civil, el suelo puede resultar uno de los recursos más afectado debido la necesidad de su uso para disposición o almacenamiento de materiales de construcción y/o residuos los cuales, debido a un mal manejo o eventos no deseados pueden generar derrames o vertimientos directos lo que conlleva a su contaminación y afectación.

Es por esto qué se deben tomar medidas preventivas para la protección de este recurso y, en caso de alguna afectación producto de las actividades del proyecto, para su rehabilitación o restitución con el fin de que el suelo afectado vuelva a sus condiciones iniciales o mejores.

PLAN DE PROTECCIÓN DEL SUELO		
IMPACTOS ASOCIADOS	**MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL**	**SEGUIMIENTO Y MONITOREO**
□ Modificación de las características del suelo. □ Deterioro del paisaje. □ Generación de focos de contaminación. □ Inconformidades por parte de la comunidad aledaña. □ Afectación a la salud de los trabajadores y de la comunidad cercana al proyecto.	□ No realizar vertimientos de residuos líquidos a las calles, parques, zonas verdes, separadores, canales, entre otros. □ Realizar el manejo adecuado de los residuos, aprovechables y no aprovechables, no peligrosos, peligrosos y especiales. □ Identificar empresas o asociaciones de recicladores y realizar la entrega de residuos aprovechables.	□Plan de intervención y recuperación de suelos. Inspección de seguridad para centros de acopio.

	Identificar gestores de residuos peligrosos y especiales, así como programas pos consumo, cercanos al lugar de la obra para la gestión adecuada de estos residuos. □ Al finalizar la jornada, se debe realizar una limpieza general de la zona donde se realicen las obras con el objeto de recoger todos los residuos presentes en el área. □ En caso de derrames o vertimientos al suelo, realizar su recolección inmediatamente y reportar el evento. Dependiendo de las características del material o producto derramado, en caso de que sea contaminante o peligroso, establecer el plan de intervención y recuperación del suelo.	

6. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

6.1 Componente Biótico

No hay la necesidad de utilización o intervención de áreas circundantes en las que pueda resultar vegetación, fauna y/o floras afectadas.

6.2 Componente Físico

6.2.1 Control De Emisiones Atmosféricas

Acciones de manejo	Método de verificación	Estado
Cuando se realice demolición, debe estar protegido con cerramiento perimetral para el control del material particulado.	Registro fotográfico	Cumple
Los materiales de construcción mantenerlos debidamente cubiertos y protegidos del aire y el agua.	Registro fotográfico	Cumple
los materiales generados en demoliciones, cubrirlos con material plástico o cualquier otro material para impedir las emisiones de partículas al aire.	Registro fotográfico	Cumple
Inspeccionar los vehículos que cargan y descargan materiales estén con carpas y lonas para cubrir los materiales. Verificar que cuenten con certificados vigentes de revisión tecno mecánica y de gases.	Registro fotográfico y actas de inspecciones	No Cumple
Advertir a la comunidad sobre la utilización de equipos sonoros, con el fin de que tomen las medidas pertinentes.	Registro fotográfico	Cumple
Suministrar elementos de control auditivo al personal de la obra.	Registro fotográfico	Cumple
Prohibir a los vehículos que en la obra accionen las bocinas.	Registro fotográfico	Cumple

6.2.2 Prevención De La Contaminación De Cuerpos De Agua Y Redes De Servicios Públicos

Acciones de manejo	Método de verificación	Estado
En caso de derrame de mezcla de concreto, ésta se deberá recoger y disponer de manera inmediata,	Registro fotográfico	N/A

siguiendo los protocolos establecidos		
Se prohíben los vertimientos de aceites, pinturas y demás materiales o productos químicos a la red de alcantarillado o su disposición sobre el suelo.	Registro fotográfico	N/A
Se prohíbe el lavado de vehículos y el descargue de mezclas de concreto en las estructuras de alcantarillado, lo mismo que el vertimiento de cualquier sustancia perjudicial que se genere en la obra.	Registro fotográfico	N/A
Utilizar concreto mezclado en planta, se recomienda extremar las medidas de precaución en el transporte de la mezcla a los frentes de trabajo, con el fin de evitar vertimientos accidentales	Registro fotográfico	N/A

6.2.3 Disposición De Residuos Sólidos

Acciones de manejo	Método de verificación	Estado
Realizar la clasificación y separación adecuada de los residuos sólidos.	Registro fotográfico	Cumple
Punto ecológico	Registro fotográfico	Cumple
Capacitar y sensibilizar a todo el personal de la obra, sobre la gestión integral de los residuos.	Registro fotográfico y listados de asistencia	No Cumple
Empresas gestoras encargadas de la recolección periódica, transporte y disposición final de los residuos no aprovechables.	Registro fotográfico y Certificado de empresa recolectora	No Cumple
Realizar una limpieza general de la zona donde se realicen las obras con el objeto de recoger todos los residuos presentes en el área.	Registro fotográfico	Cumple
Realizar el manejo adecuado de los residuos especiales y/o peligrosos.	Registro fotográfico	No Cumple

Separar los residuos de construcción y demolición RCD como escombros, sobrantes de concreto, morteros, cordones, tuberías de los demás residuos.	Registro fotográfico	Cumple
El manejo, transporte y disposición final de escombros y materiales de construcción, deberá seguir los criterios establecidos por las autoridades competentes	Registro fotográfico	Cumple

6.2.4 Manejo De Movilidad Y Señalización

Las áreas destinadas para el acopio temporal de los materiales de obra y para los residuos están debidamente señalizadas con cinta de demarcación
y con soportes tubulares.
Cuando se programa el ingreso de vehículos para cargue o descargue de material o para recolección de residuos, se realiza el control del tráfico tratando de no generar traumatismos para los transeúntes.

6.2.5 Uso Y Almacenamiento Adecuado De Materiales De Construcción

Acciones de manejo	Método de verificación	Estado
Los materiales deben provenir de fuentes legales, es decir, deben contar con permisos ambientales y mineros, aspectos que deberán ser certificados por los proveedores	Certificados de la empresa	No cumple
Demarcar los sitios de almacenamiento con la señalización establecida.	Registro fotográfico	cumple
Utilizar formaletas de madera sólo para la fundición de obras de concreto.	Registro fotográfico	N/A
En el caso de derrames de mezcla de concreto, es necesario recogerla y disponerla de manera inmediata.	Registro fotográfico	N/A
No hacer la mezcla directamente sobre el suelo o sobre las zonas duras existentes.	Registro fotográfico	N/A

6.2.6 Protección Del Suelo

Acciones de manejo	Método de verificación	Estado
No realizar vertimientos de residuos líquidos a las calles, parques, zonas verdes, separadores, canales, entre otros.	Registro fotográfico	Cumple
En caso de derrames o vertimientos al suelo, realizar su recolección inmediatamente y reportar el evento. Dependiendo de las características del material o producto derramado, en caso de que sea contaminante o peligroso, establecer el plan de intervención y recuperación del suelo.	Registro fotográfico	Cumple

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El cumplimiento de las medidas de mitigación propuestas garantizará la ejecución ambientalmente responsable del proyecto, minimizando los impactos negativos y promoviendo un entorno sostenible.
De acuerdo con la revisión al informe ambiental del mes informado, el contratista deberá tener en cuenta las observaciones y recomendaciones entregadas por la interventoría en el presente documento para poder realizar la trazabilidad correspondiente:

- Se recomienda involucrar a todos los actores del proyecto en la implementación de estas medidas
- Realizar capacitaciones sobre buenas prácticas ambientales.
- Se debe tener en cuenta las Notas realizadas sobre el cumplimiento de las actividades para el cumplimiento de las obligaciones dispuestas por Corpoamazonia en cada uno de los actos administrativos que se tienen para el contrato de obra.
- Se recomienda realizar un cronograma de actividades para el desarrollo de

todas las acciones de manejo para poder realizar un efectivo seguimiento y control de los componentes.

- Dentro de la documentación de procedencia de materiales se deben presentar los requisitos y documentos mínimos exigidos por la normatividad ambiental vigente, teniendo en cuenta el tipo de material comprado para el proyecto.
- Se recomienda al profesional ambiental de obra entregar documentación de legalidad de todos los servicios adquiridos para el desarrollo de la obra, dándole cumplimiento a la compra de madera, agua utilizada, mantenimiento de unidades sanitarias, entrega y disposición de residuos sólidos.

De esta manera la interventoría solicita de manera oportuna al contratista de obra se realice el envío de los requisitos legales de los proveedores de materiales, los permisos ambientales que haya lugar, así como la documentación que permita verificar la legalidad de los materiales de las empresas con las que los han contratado (madera, agua, disposición final de RCD, material de rio, triturado y/o concreto premezclado); y/o informar el estado en el que se encuentra el cumplimiento de esta obligación para tener conocimiento y poder realizar un correcto seguimiento y control a las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato de obra.

Javier Villota Rosero
TP:52238-431006
Profesional Ambiental de Interventoría

INFORME No. 02

INFORME SEGUIMIENTO MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Contrato de obra N°CO1.PCCNTR.6947019: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO".

ELABORÓ:

ERIKA DANIELA ARIAS REVELO

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PERIODO COMPRENDIDO: 14 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2024 Y DEL 14 AL 31 DE ENERO

MOCOA PUTUMAYO

2025

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán - Mocoa - Putumayo

Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN. 3
2. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA 3
3. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL 4
4. EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES. 4
5. ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 4
6. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 5
7. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5

7.1. INSPECCION DEL ESTADO Y USO ADECUADO DE LOS EPP 5

8. CAPACITACIONES Y CHALAS PREOPERACIONALES ENSEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 6

8.1. INDUCCIONES CONCIENTIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO. 7

9. PAUSAS ACTIVAS 8
10. CONFORMACIÓN DE LOS COMITES. 9
11. TRABAJO EN ALTURAS. 9
12. AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL 9
13. SEÑALIZACIÓN COMPLEMENTARIA 9
14. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES. 11

1. INTRODUCCIÓN.

El presente documento es el informe N°01 de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se relaciona las actividades de SST, del contrato Contrato de obra N°CO1.PCCNTR.6947019: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO". Dentro de las actividades realizadas en obra durante el periodo ejecutado se realiza por medio de inspecciones de seguridad correspondientes a la interventoría, de esta manera se determinan las condiciones laborales teniendo en cuenta el riesgo al cual labora el personal. Dentro de las actividades de inspección de SST, se hace la verificación documental y operativa con el fin de verificar la garantía de un trabajo seguro.

El cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido un compromiso para el contratista COINCO primando siempre la promoción y prevención de accidentes y enfermedades laborales mejorando las condiciones de trabajo con el proceso PHVA, Planear, Hacer, Verificar y Actuar, haciendo evaluación y corrección para tener como resultado un plan de mejora activo.

Realizar controles de factores de riesgo en las condiciones de trabajo evidenciadas permite implementar de manera adecuada un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde a las actividades que el contratista programe, realizando diferentes actividades que permiten incrementar la seguridad la seguridad física y la salud mental de los colaboradores afianzando su desarrollo laboral dentro de la programación de las actividades de obra.

A continuación, se presenta información general del contrato de obra, así como también se especifican las actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a la normatividad (Decreto 1443 de 2014, Decreto 1072 de 2015, Resolución 312 de 2019), en la ejecución de las actividades en relación a la inspección y seguimiento diario.

2. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

En la siguiente tabla se relaciona al personal que ingresó a dar inicio en las actividades del presente contrato.

	Personal Administrativo						
NOMBRE	**CARGO**	**C.C**	**INGRESO**	**EGRESO**	**EPS**	**F. P**	**ARL**
Marlon Arteaga	director Obra	1.085.249.647			SANITAS	PORVENIR	SURA
Luis Alberto Muñoz	Residente	1.124.313.123	28/11/2024		EMSSANAR	PORVENIR	SURA
Mayerli Carolina Aránzazu	Residente SST	1.124.862.736	28/11/204		COLPENSIONES	NUEVA EPS	SURA
	Personal Operativo						
NOMBRE	**CARGO**	**C.C**	**INGRESO**		**EPS**	**F. P**	**ARL**
Yeison García	Maestro	23419583	28/11/2024		COOSALUD		SURA
Jorge Luis Polanco	oficial	24466859	28/11/2024		COOSALUD		SURA
José Yoel Valero	oficial	29958308		20/12/2024	COOSALUD		SURA
Juan Camilo Acosta	Aux de obra	1007553784	26/11/2024	26/12/2024			SURA
Moisés Rafael Pérez	Aux de obra	4970647	27/11/2024		SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	SURA

Silvio Meneses	Aux de obra	18182206	02/12/2024			PORVENIR	SURA
Alexis Gutiérrez Carreño	oficial	85439632	10/12/2024	27/12/2024	MALLAMAS	PORVENIR	SURA
Víctor Manuel Granada	Aux de obra	1005098706	26/11/2024		NUEVA EPS	PORVENIR	SURA
Norberto Ramón Pelayo 17 dias	oficial	5331907	14/01/2025				
Raul Guillermo Diaz Morales	Oficial	5447111	14/01/2025				
Jhoefry Jose Bustamante	ayudante	5626299	14/01/2025		NUEVA EPS	PORVENIR	
Hugo Ernesto Vega	Oficial	108522889	23/01/2025		SANITAS	PORVENIR	SURA
	Personal Electricista						
NOMBRE	**CARGO**	**C.C**	**INGRESO**		**EPS**	**F. P**	**ARL**
David Santiago Cupacan	Electricista	1080041379	28/11/2024	26/12/2024	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA
Johnny Chaña - Eléctrico	Electricista	1233188189	28/11/2024		NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA

3. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Se anexan para el periodo del informe la consolidación del cumplimiento de pago de planillas de parte del contratista, la cual es revisada previamente.

Ver anexo 2. Planillas de Pago de Seguridad Social.

4. EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES.

El contratista realiza evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso para tres nuevos colaboradores operativos que ingresaron en este periodo al presente contrato, de igual manera se reportan 4 retiros en el mes de diciembre 2024,

Ver anexo 3. Exámenes Ocupacionales de Ingreso.

5. ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Durante el transcurso de los periodos en operación de la obra se observó que el personal es dotado de todos los elementos necesarios para realizar las actividades requeridas, se realizó de parte de la interventoría la inspección de los EPP entregados y en caso de cambios realizar la respectiva reposición, de igual manera se observó el adecuado uso de elementos de seguridad.

Anexo 4: Entrega de elementos de protección personal



Ilustración 1. entrega de EPP

6. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

Durante este periodo no se identificaron accidentes o incidentes dentro del grupo que comprende el personal del presente contrato de igual manera se evidencia el control y verificación de las condiciones inseguras a las que se enfrentan.

7. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se verificó que durante este mes que se continuara realizando las actividades de sensibilización y cultura de auto cuidado donde el componente SST realiza charlas de manera eventual antes de iniciar la jornada laboral en donde se busca informar sobre los riesgos inherentes en sus labores diarias, La Interventoría SST recomienda continuar realizando esta actividad que refuerza los conocimientos y cuidados individuales y grupales dentro de las actividades de obra programadas. Se verificó el uso adecuado de los EPP y la dotación. **Ver anexo 5: Inspecciones de seguridad y Anexo 6: documentos de vehículo tipo Volqueta.**





Ilustración 2. Inspección de Seguridad

7.1. INSPECCION DEL ESTADO Y USO ADECUADO DE LOS EPP

Se verificó que el componente SST continúa dando cumplimiento en la entrega de elementos de protección personal contra lluvias como es el traje impermeable al personal que estaba

pendiente, de esta manera se subsana los compromisos con el personal y se contrarresta la posibilidad de enfrentar accidentes o enfermedades laborales. *Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Titulo IV, Capitulo II De Los Equipos Y Elementos De Protección, Artículo 176 a 201*).

Se continúa dando cumplimiento a las normas del SG-SST realizando entrega de reposición de elementos de protección personal se sugiere al contratista continuar realizando inspección de EPP además de su adecuado uso preventivo.



Ilustración 3. Inspección del uso adecuado de los EPP.

8. CAPACITACIONES Y CHALAS PREOPERACIONALES ENSEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La realización de capacitaciones del personal es de vital importancia ya que de esta manera se previenen accidentes y enfermedades laborales, que se pueden dar paso por las actividades y procesos del proyecto teniendo en cuenta los estándares establecidos por el SG-SST. *Decreto 1072, artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en seguridad y salud en el trabajo – SST. El empleador o contratante debe definir los requisitos de conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo necesarios para sus trabajadores.*

- Comité de convivencia laboral. ¿qué es? Funciones y obligaciones
- ¿Qué es COPASST? ¿Funciones y obligaciones?
- Lesiones Osteomusculares.
- Recomendaciones de SST, recomendaciones generales de obra – Calistenia
- Posturas prolongadas Ergonomía
- 10 factores humanos que causan accidentes.
- Improvisación
- Movimiento repetitivo – mala postura
- Carga suspendida e izaje
- Barandas y protecciones
- Línea de fuego

- Tableros Eléctricos
- Proyección de Partículas
- Calistenia – ARL
- ¿Que son las paradas de emergencia?
- Actividad mental – Proactividad
- Primeros auxilios básicos
- Act. Manzana, naranja y pera (escucha, atención, ordenes)
- Calistenia – Inspección herramienta menor
- Cambios rotativos – Calistenia
- Riesgo eléctrico
- ¿Qué es el ODI?
- Exposición al ruido
- Abuso de consumo de bebidas energéticas



Ilustración 4. Charlas y Capacitaciones

Ver anexo 6. Charlas preoperacionales

8.1. INDUCCIONES CONCIENTIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO.

En coordinación del componente SST se realizó inducción de personal nuevo que prestó su servicio durante este periodo, la interventoría verificó que los estándares y normas de seguridad terminaran con éxito se observó la realización de notificación de riesgos laborales, con el propósito de brindar una efectiva orientación de los riesgos, su clasificación, las funciones que desempeñará los fines y objetivos de la empresa, su estructura y demás temas relacionados con el Sistema de Gestión, de igual manera se realiza evaluaciones del conocimiento adquirido en esta actividad de vital importancia para la realización de actividades.

Ver anexo7: Inducciones a personal Nuevo





Ilustración 5. Inducción general al personal

9. PAUSAS ACTIVAS

Se realiza actividades de pausas activas, dinámicas y calentamiento o calistenia, antes, durante y al finalizar la jornada laboral estas actividades fortalecen a los trabajadores debido que por medio de ellas se puede recuperar energías, fortalecer el desempeño laboral y aumentar la eficiencia en el desarrollo de las actividades propuestas en el día a día para continuar con el proyecto, estas actividades ayudan a minimizar las enfermedades osteomusculares y reducir el estrés laboral.

Mediante seguimiento diario a las pausas activas se evidencia el cumplimiento, con la práctica de estiramientos y calentamiento muscular previo al inicio labores y mediante breves descansos durante la jornada laboral que sirven para recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo esto en cumplimiento a la normatividad legal vigente colombiana.





Ilustración 6. Pausas activas preoperacionales.

10.CONFORMACIÓN DE LOS COMITES.

Teniendo en cuenta el inicio de obra no ha sido posible conformar los comités ya que la totalidad del personal aún se encuentra siendo mínimo, más sin embargo se hace la recomendación al contratista SST de hacer la elección de los comités lo más pronto posible.

11. TRABAJO EN ALTURAS.

Para dar cumplimiento al presente contrato están programadas actividades en las cuales se realizarán trabajos de alto riesgo en alturas, hasta el momento no se han dado inicio a dichas actividades, es por eso que de parte de la interventoría se vienen realizando sugerencias para la preparación del proceso de inicio de estas.

12. AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL

Se verificó la documentación de COINCO y el cumplimiento de sus obligaciones legales y que realice las respectivas afiliaciones y aportes al Sistema General de seguridad Social - SGSS de los empleados vinculados al proyecto. Profesional SST diligencia formato de control de personal en el que se detalla los datos del trabajador, fechas de ingreso y egreso, se relaciona ARL, EPS, AFP, a las cuales se encuentra afiliados.

Ver Anexo 1 – Certificaciones de afiliación y anexo 2 - planillas de pago de seguridad social

De la misma manera, el personal activo de interventoría cuenta con afiliación al sistema General de Seguridad Social-SGSS (EPS, ARL, AFP y caja de compensación familiar) y mensualmente se hace verificación de los respectivos aportes, dando cumplimiento a la normatividad correspondiente.

Ver anexo 8. Planilla de Seguridad Social de Interventoría.

13.SEÑALIZACIÓN COMPLEMENTARIA

La señalización reglamentaria ha sido permanente para la regulación de velocidad. Interventoría recomienda realizar seguimiento a esta, garantizando su funcionalidad y visibilidad.









Ilustración 7. señalización

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán - Mocoa - Putumayo


14. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

Durante la ejecución de la obra se pudo observar la colaboración y compromiso de parte del componente SST y la alta dirección con un avance positivo de mejora continua en los procesos de atención, cuidado y prevención dirigida al bienestar de los trabajadores, colaboradores y demás personal perteneciente al proyecto, de la misma manera se observó el cuidado preventivo a los equipos, maquinarias, herramientas e instalaciones, de esta manera el contratista COINCO da cumplimiento al SG-SST en su Decreto 1072 de 2015 como regulador de seguridad y salud en el trabajo de igual manera se vio el cumplimiento en la aplicación del protocolo de bioseguridad.

La interventoría realizó de manera continua el acompañamiento en los procesos y actividades programados por el contratista de igual manera se realizó sugerencias y recomendaciones con el fin de mejorar las condiciones de trabajo, se realizó identificación de riesgos y peligros presentes en obra logrando de la mano del componente SST mitigarlos implementando de manera adecuada el plan de emergencia.

CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.6947019

OBJETO:
REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA

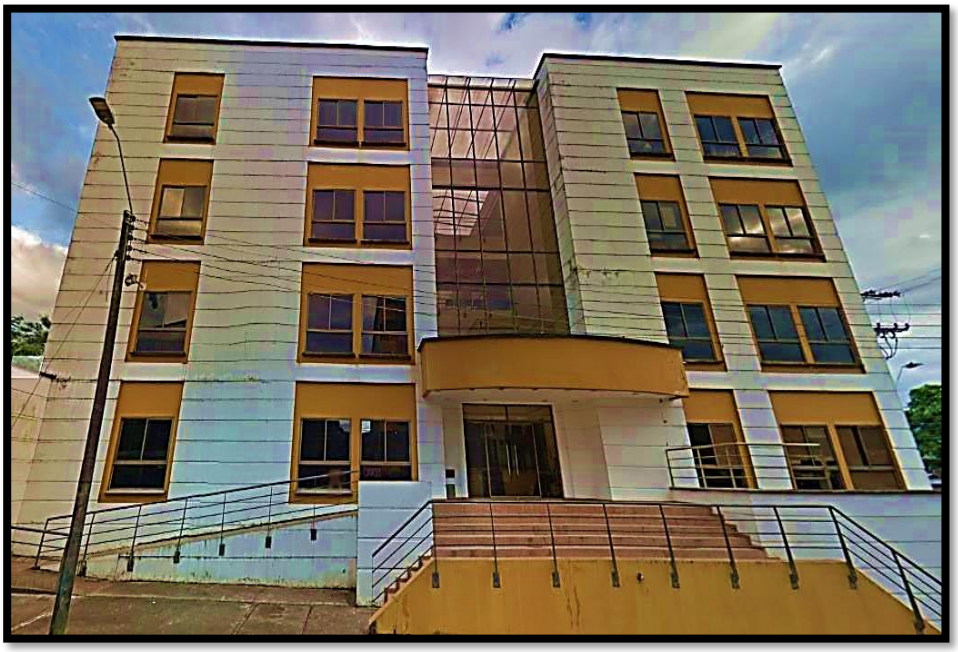

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:
ING. ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

14 DICIEMBRE -23 DICIEMBRE 2024 Y 13 DE ENERO – 31 ENERO 2025

MOCOA – PUTUMAYO

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galan – Mocoa – Putumayo

INTRODUCCION

Las políticas ambientales y las normas legales establecidas en Colombia, determinan claramente la compatibilidad que debe existir entre la ejecución de los proyectos de infraestructura civil que se desarrollan y la conservación del Ambiente basados en criterios de Desarrollo Sostenible, razón por lo cual las entidades contratistas, elaboran un Plan De Manejo Ambiental (PMA), dónde se identifican, evalúan, valoran los posibles impactos y alteraciones al ambiente que se pueden generar durante la ejecución de éste tipo de proyectos para así establecer las medidas requeridas para prevenir, controlar, mitigar o compensar éstos impactos.

Mediante el presente informe ambiental tiene como objetivo evaluar y mitigar los impactos ambientales asociados con la ejecución de las obras de mantenimiento correctivo y preventivo en el Palacio de Justicia. Este documento se elabora con el fin de presentar un trabajo detallado durante el periodo comprendido entre 14 diciembre al 23 diciembre del año 2024 y desde el 13 de enero al 31 de enero del 2025 del componente ambiental que hace parte del Proyecto denominado; REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA.

La interventoría desde la parte ambiental hace la supervisión y control de todas las actividades ejecutadas por el contratista de obra para mitigar los impactos ambientales generados por la construcción del proyecto antes en mención, es claro que toda obra genera un impacto al ambiente, una de las herramientas fundamentales para la verificación de este, se lo realiza mediante la revisión del Plan De Manejo Ambiental (PMA), herramienta con la cual se tendrá un control de las afectaciones realizadas al entorno, teniendo como medio, el registro de seguimiento ambiental, que nos ayudara a la verificación de información, documentos, soportes que permitan evaluar el cumplimiento del contratista y de esa manera tomar las acciones necesarias que garanticen el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el componente ambiental, por parte de interventoría se realizara la respectiva revisión y aprobación del PMA, los informes de avance de cumplimiento de acuerdo al cronograma presentado y a lo exigido en los pliegos de condiciones del mismo.

1. PROBLEMÁTICA

La infraestructura física del Palacio de Justicia es fundamental para garantizar la adecuada prestación de los servicios judiciales, ofreciendo un entorno seguro, funcional y digno tanto para los ciudadanos como para los servidores públicos. Sin embargo, con el paso del tiempo y debido al uso continuo de las instalaciones, surgen diversas problemáticas que comprometen la operatividad, seguridad y conservación del edificio, lo que hace necesaria la implementación de un contrato para realizar obras de mantenimiento correctivo y preventivo.

Entre los principales problemas que justifican este contrato se encuentra el deterioro de elementos estructurales, causado por factores como el desgaste natural, la exposición a condiciones climáticas adversas y el uso intensivo de los espacios. Este deterioro se manifiesta en grietas, filtraciones, corrosión de materiales metálicos y debilitamiento de techos, paredes y pisos. Asimismo, los sistemas eléctricos, hidráulicos y de ventilación pueden presentar fallas debido a su antigüedad o falta de mantenimiento, generando riesgos para los usuarios y posibles interrupciones en el servicio.

Además, estas deficiencias afectan la imagen institucional, ya que un edificio en mal estado transmite una percepción de descuido y falta de compromiso con la justicia. Por otra parte, la falta de cumplimiento con normativas de seguridad, accesibilidad y sostenibilidad puede derivar en sanciones legales y en un impacto negativo sobre el entorno ambiental.

En este contexto, el contrato se plantea como una solución al deterioro actual que vive la infraestructura física del palacio de justicia del municipio de Mocoa, departamento del Putumayo, para prevenir daños mayores y garantizar la sostenibilidad de la infraestructura a largo plazo, preservando así su funcionalidad y su rol como símbolo del sistema de justicia.

2. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.1 Descripción del proyecto

El desarrollo de las actividades como reparación de techos, paredes y pisos, mantenimiento de sistemas eléctricos e hidráulicos, pintura y acabados y otros trabajos correctivos y preventivos necesarios del contrato de la obra nos lleva a solucionar el inconveniente, que radica en el actual deterioro que se encuentra la infraestructura física del palacio de justicia municipio de Mocoa Departamento del Putumayo, dado que no cuenta con instalaciones apropiadas, generando incumpliendo con la normatividad y regulaciones vigentes en materia de seguridad, salud ocupacional y accesibilidad, como también, la preservación de la imagen institucional, un edificio bien mantenido y restaurado refleja la imagen de la institución y su compromiso con la justicia y el servicio a la comunidad.

Para el efecto, el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Distrito Pasto, presentó el proyecto "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA"; que fue viabilizado y aprobado, para financiar su ejecución.

2.2 Localización del proyecto

La ejecución de las actividades contractuales se encuentra localizadas en el Departamento del Putumayo ubicado al suroeste del país, en la región Amazónica.

En el municipio de Mocoa que se encuentra localizado está ubicado en la parte norte del Departamento del Putumayo, específicamente en el palacio de justicia, Calle 7 No 6 - 42, Barrio Centro.



Ilustración 1: *Localización General del Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo.*
***Fuente**: www.googlemaps.com*

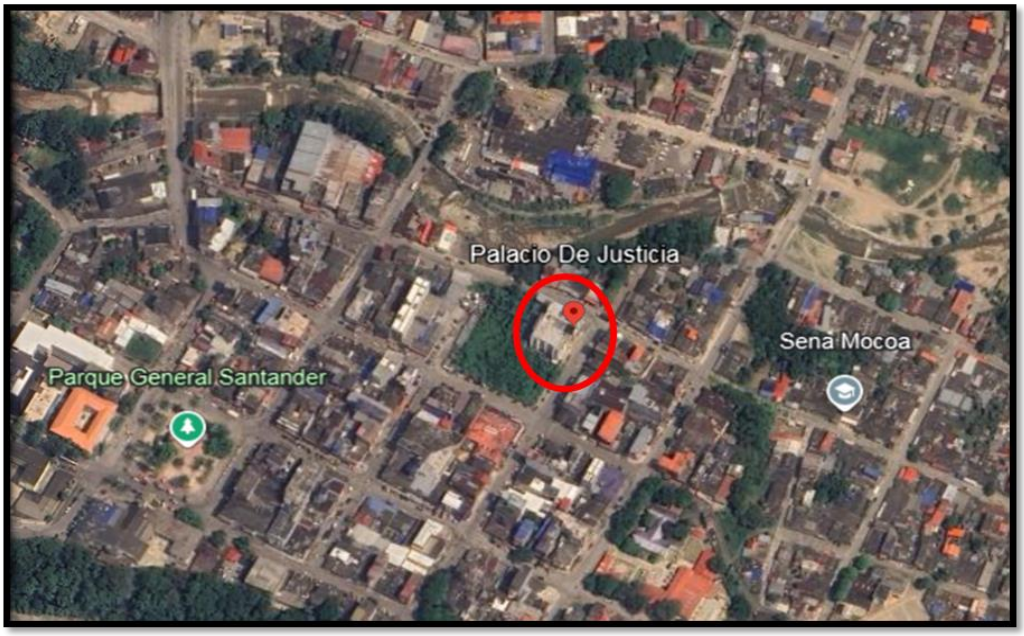


***Ilustración 2**: Localización especifica del área a intervenir en el municipio de Mocoa, Putumayo.*
***Fuente**: www.earth.google.com*

3. REVISIÓN PRELIMINAR DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

De acuerdo a las funciones de la interventoría sobre el componente ambiental, es encargada de la recepción, revisión y seguimiento del PMA, la documentación e informes de cumplimiento ambiental, y todo aquello en el que se involucre este componente, todo esto se debe hacer de acuerdo al cronograma y pliegos de obra, y según los requerimientos de la autoridad ambiental Corpoamazonia como de la supervisión del proyecto que está a cargo. Si la documentación mencionada anteriormente tiene comentarios, observaciones o inconsistencias, el responsable en este caso el profesional ambiental deberá ajustar y subsanarlas dentro del término previsto para su entrega. Con base a lo anterior interventoría hace revisión del Plan de manejo Ambiental, presentado por el contratista de obra mediante oficio RM-001 de 8 noviembre 2024. Una vez realizada la revisión respectiva del PMA, se evidencian que el documento contiene 36 folios dentro de los cuales se encuentran los requisitos, lineamientos ambientales y las tres fases del proyecto como Fase 1 caracterización y diagnóstico, fase 2 ejecución de la obra y fase 3 cierre del proyecto.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES INFORMADO POR INTERVENTORÍA

De acuerdo con la actividad establecida en el contrato de obra CONTRATO N°. CO1.PCCNTR.6947019 DEL 29 DE OCTUBRE 2024, para el presente periodo informado de ejecución del contrato, se realizó verificación seguimiento a las siguientes actividades:

- Programar y coordinar con el Contratista de obra ambiental, las actividades de seguimiento del PMA y la ejecución del contrato e informar previo a su realización.
- Cumplir con la entrega del informe mensual requeridos en los cuales se presente el estado de ejecución, avance del contrato además de las conclusiones y recomendaciones, de acuerdo con la metodología, los formatos y listas de chequeo para tal fin.
- Verificación de la legalidad ambiental de los materiales adquiridos por el contratista de obra, en aras de velar por su calidad, oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas correspondientes; Igualmente se solicitará de manera oportuna la

certificación y/o acreditación de la calidad y legalidad de los materiales al Contratista de obra.

- Verificación del cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad ambiental vigente.
- Control y seguimiento diario de todas las actividades que está ejecutando el contratista de obra, quedando éstas plasmadas en la Bitácora de obra.
- Toma registro fotográfico del estado de avance de la obra en cada visita realizada.
- Elaboración del informe mensual de interventoría.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto 1: Acopio de los materiales</td><td>Foto 2: Acopio de escombros</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>Foto 3: Manejo de escombros</td><td>Foto 4: Cargue de escombros para disposición final</td></tr>
</table>

	
Foto 5: *Cerramiento del área a intervenir*	***Foto 6:*** *Señalización de áreas de acopio*

5. DESARROLLO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

De acuerdo con el avance en la ejecución técnica de las obras correspondientes al periodo informado, se relaciona el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental establecidas en las fichas de manejo ambiental, prestándole particular atención a las medidas formuladas para mitigar los impactos ambientales negativos que la actividad puede causar sobre el ambiente y la comunidad.

A continuación, se presentan los componentes contemplados dentro del Plan de Manejo Ambiental, el cual se va a desarrollar durante la ejecución de las obras del CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.6947019 DEL 29 DE OCTUBRE 2024 cuyo objeto es "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA".

5.1 Componente Biótico

Dado que el presente programa trata de actividades de "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA", no se ve la necesidad de utilización o intervención de áreas circundantes en las que pueda resultar vegetación, fauna y/o floras afectadas.

5.2 Componente Físico

5.2.1 Control De Emisiones Atmosféricas

La contaminación atmosférica generada durante el desarrollo de un programa procede de tres fuentes principales: emisiones difusas de material particulado, gases de combustión y ruido generado por la operación de maquinaria y demolición de estructuras.
El adecuado control a estas fuentes minimiza los efectos adversos al medio ambiente y disminuye los efectos negativos que éstos pueden ocasionar sobre la salud humana. Así mismo, el control de los niveles de ruido por debajo de los límites permisibles permite reducir los problemas de salud ocupacional que estas actividades puedan generar, así como atenuar las incomodidades producidas a la comunidad.

PLAN DE MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS		
IMPACTOS ASOCIADOS	**MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL**	**SEGUIMIENTO Y MONITOREO**
Aumento de las concentraciones de material particulado, humos, gases y ruido en la atmósfera del Palacio de Justicia y alrededores. Afectación a la salud de los trabajadores y de la comunidad cercana al proyecto. Afectación a la calidad del aire en la zona.	**Emisiones atmosféricas (material particulado y gases)** Cuando se requiera realizar algún tipo de demolición, debido a la magnitud de las actividades, el frente de obra debe estar protegido para el control del material particulado con cerramiento perimetral. Mantener control sobre los materiales de construcción que se encuentren en el frente de obra, mantenerlos debidamente cubiertos y protegidos del aire y el agua. Controlar las actividades de construcción que generan gran cantidad de polvo, regando las áreas de	Verificación de la cobertura y humedecimiento de las zonas de acopio de material sobrante y de insumos de la construcción. Inspección de seguridad para vehículos de carga.

	trabajo con agua por lo menos 2 veces al día; realizar esta misma operación a los materiales que se encuentren almacenados temporalmente en el frente de obra (que lo permitan) y que sean susceptibles de generar material particulado. □ Conservar con una humedad suficiente los materiales generados en excavaciones y demoliciones, para evitar que se levante material particulado y cubrirlos, mientras se utilizan, con material plástico o cualquier otro material para impedir las emisiones de partículas al aire □ Inspeccionar que los vehículos que cargan y descargan materiales dentro de las obras estén acondicionados con carpas y lonas para cubrir los materiales. Verificar que cuenten con certificados vigentes de revisión tecno mecánica y de gases. □ Solicitar el apagado de los vehículos mientras se encuentren estacionados en el lugar de la obra.	
	Ruido □ Cuando se requiera usar equipos muy sonoros, a más de 80 decibeles se debe trabajar solo en jornada diurna y por períodos cortos	

	de tiempo siguiendo los parámetros legales aplicables al área donde se desarrolla la obra. □ Programar ciclos de trabajo de máximo 2 horas de ruido continuo, cuando el ruido continuo supere el nivel de ruido del ambiente se debe contar con 32 horas de descanso después de las horas de operación o utilizar equipos insonorizados. □ Advertir previamente a la comunidad sobre la utilización de equipos sonoros, con el fin de que tomen las medidas pertinentes. □ Suministrar elementos de control auditivo al personal de la obra. □ Cuando se requiera realizar trabajos que generen ruido durante las horas de la noche es necesario tramitar permiso de ruido nocturno con la autoridad competente. □ Prohibir a los vehículos que en la obra accionen las bocinas, salvo la alarma de reversa.	

5.2.2 Prevención De La Contaminación De Cuerpos De Agua Y Redes De Servicios Públicos.

El agua resultante de las obras de construcción tiene un alto contenido de partículas minerales suspendidas y en ocasiones puede estar mezclada con restos de cemento, concreto u otras sustancias. Estos materiales provocan

taponamientos en los conductos en alcantarillas, impiden un tratamiento efectivo en las plantas de tratamiento y generan contaminación en los cuerpos de agua que actúan como sus receptores.

PLAN DE MANEJO DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS		
IMPACTOS ASOCIADOS	**MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL**	**SEGUIMIENTO Y MONITOREO**
Alteración de las características del agua. Contaminación de redes de alcantarillado	No realizar vertimientos de residuos líquidos a las calles, calzadas, canales y cuerpos de agua. No eliminar el material sobrante con agua ni dirigirlo a los canales de desagüe. En caso de derrame de mezcla de concreto, ésta se deberá recoger y disponer de manera inmediata, siguiendo los protocolos establecidos. Se prohíben los vertimientos de aceites, pinturas y demás materiales o productos químicos a la red de alcantarillado o su disposición sobre el suelo. Se prohíbe el lavado de vehículos y el descargue de mezclas de concreto en las estructuras de alcantarillado, lo mismo que el vertimiento de cualquier sustancia perjudicial que se genere en la obra. En caso de utilizar concreto mezclado en planta, se recomienda extremar	Informe de clasificación de cuerpos hídricos y manejo de aguas. Inspecciones de seguridad en las actividades laborales. Control de vertimientos provenientes de obra. Manejo de aguas residuales con empresas autorizadas por autoridades ambientales

	las medidas de precaución en el transporte de la mezcla a los frentes de trabajo, con el fin de evitar vertimientos accidentales.	

5.2.3 Disposición De Residuos Sólidos

Una adecuada clasificación de los residuos sólidos permitirá recuperar, reciclar o reutilizar algunos de los materiales, minimizando así la cantidad de desechos no aprovechados. De esta forma, se reducen costos de disposición final, se optimiza el uso de los materiales y se logra un menor impacto ambiental.

Debido al impacto y a las características de los diferentes elementos resultantes de las obras, se elabora el Plan de Gestión Integral de Residuos PGIR.

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS		
IMPACTOS ASOCIADOS	**MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL**	**SEGUIMIENTO Y MONITOREO**
Modificación de las características del suelo y/o del agua. Afectación de la calidad el aire en la zona. Generación y aporte de sólidos en las redes de alcantarillado. Deterioro del paisaje. Generación de focos de contaminación. Inconformidades por parte de la comunidad aledaña. Afectación a la salud de los trabajadores y de la comunidad cercana al proyecto.	**Residuos no peligrosos:** Realizar la clasificación y separación adecuada de los residuos sólidos. El almacenamiento de los residuos debe hacerse en recipientes tipo caneca plástica con tapa. Los recipientes deben estar rotulados con el nombre de acuerdo con el tipo de residuos. Las etiquetas de los recipientes deben contener información clara y entendible para todos, además de ser resistentes al agua o a otros agentes. Las canecas deben ubicarse en sitios estratégicos o puntos ecológicos. Capacitar y sensibilizar a todo el personal de la obra, sobre la gestión integral de los residuos.	Inspección de seguridad para centros de acopio. Tabla de identificación de residuos sólidos. Certificados y licencias ambientales de los gestores de transporte, tratamiento y disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos. Actas y/o certificados de disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos.

	Los recipientes no deben tener sobrecarga de residuos. Identificar a las empresas gestoras encargadas de la recolección periódica, transporte y disposición final de los residuos no aprovechables. Identificar empresas o asociaciones de recicladores y realizar la entrega de residuos aprovechables. Al finalizar la jornada, se debe realizar una limpieza general de la zona donde se realicen las obras con el objeto de recoger todos los residuos presentes en el área.	
	Residuos Especiales y/o Peligrosos Realizar el manejo adecuado de los residuos especiales y/o peligrosos. Para los residuos peligrosos se deben seguir todos los lineamientos establecidos en la normatividad ambiental vigente para su etiquetado, rotulado, almacenamiento y transporte. Separar los residuos de construcción y demolición RCD como escombros, sobrantes de concreto, morteros, cordones, tuberías, etc., de los demás residuos. Los lugares o zonas de almacenamiento temporal del material reciclable de construcción y demolición deben estar provistos de canales	

	perimetrales estructuras para el control de sedimentos. □ Los RCD no pueden obstaculizar el tráfico peatonal y vehicular, deben estar apilados, bien protegidos de agentes externos y ubicados en zonas seguras. □ Se prohíbe: o depositar RCD en zonas verdes, humedales o cerca de cuerpos de agua, o quemar residuos o desechos peligrosos a cielo abierto, □ ingresar residuos o desechos peligrosos en rellenos sanitarios, sino existen celdas de seguridad dentro de éste, autorizadas para la disposición final de este tipo de residuos, la disposición o enterramiento de residuos o desechos peligrosos en sitios no autorizados para esta finalidad por la autoridad ambiental competente, □ El abandono de residuos o desechos peligrosos en vías, suelos, humedales, parques, cuerpos de agua o en cualquier otro sitio. □ Contratar la disposición de los residuos especiales y/o peligrosos con gestores autorizados. □ El manejo, transporte y disposición final de	

	escombros y materiales de construcción, deberá seguir los criterios establecidos por las autoridades competentes.	

5.2.4 Manejo De Movilidad Y Señalización

Las zonas diseñadas para el almacenamiento temporal de los materiales de trabajo y para los trabajos de los desechos deben mantenerse correctamente identificados con cinta de demarcación y con soportes.
Cuando se programe la entrada de vehículos para la descarga o carga de material o la recolección de desechos, es necesario llevar a cabo el control del tráfico con el fin de evitar cualquier incidente de tráfico y crear traumas para los peatones.
Señalar los caminos temporales de paso para peatones y/o vehículos de los cuales es necesario realizar un registro fotográfico e incluirlo en los reportes de administración mensuales.

5.2.5 Uso Y Almacenamiento Adecuado De Materiales De Construcción

Establecer un sistema de manejo adecuado para el transporte, cargue, descargue y manipulación de los materiales de construcción (arenas, grava, triturados, recebos, ladrillos, triturados de arcilla y otros) se evitan pérdidas del mismo y por lo tanto se generan múltiples ventajas de orden financiero, logístico y ambiental. Al mismo tiempo, se reduce la cantidad de escombros y residuos generados, y el aporte de sedimentos y otros contaminantes a las redes de servicios públicos y fuentes de agua.

PLAN DE MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					
IMPACTOS ASOCIADOS Contaminación o alteración de las características del agua, el suelo o el aire. Ocupación del espacio público.					
MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL Almacenamiento de Materiales de Construcción.					
Material	**Alm. en Cubierto**	**Alm. en áreas seguras**	**Alm. sobre estibas**	**Alm. Ligados**	**Requerimientos especiales**

Arena y grava	X				Cubrir con lona grava
Cemento	X		X		Evitar que se humedezcan
Ladrillos, adobes, tejas y adoquine			X	X	almacenar en los embalajes originales hasta el momento de uso, lejos del tráfico de vehículos
Metales	X	X			
Prefabricados				X	
Baldosas	X	X			Envolver con plástico para prevenir que se rayen
Tubería			X	X	Usar separadores es para prevenir que se rueden.
Madera	X	X			Proteger de roturas causadas por mal manejo.
Pinturas		X			Proteger del robo

Material impermeabilizante	X	X			Almacenar Envuelto en Plástico.
Aceites y combustibles		X	X		Almacenar en tanques o toneles cerrados según las cantidades.

Manejo de los materiales:

 Todos los materiales deben provenir de fuentes legales, es decir, deben contar con permisos ambientales y mineros, aspectos que deberán ser certificados por los proveedores.

 Garantizar que el transporte de los materiales se realice en volquetas con cajón totalmente cubierto para impedir el derrame o dispersión de los materiales y de material particulado en el recorrido.

 La cubierta debe ser de material resistente como lona y estar sujeta firmemente a las paredes exteriores del contenedor.

 Evitar el escurrimiento del material húmedo durante el transporte. Para ello, asegurarse que el contenedor del vehículo esté construido con una estructura continua que en su contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios.

Adecuar los horarios y las vías para la circulación de vehículos de carga a los establecidos por la autoridad local.

 Demarcar los sitios de almacenamiento con la señalización establecida.

 Se sugiere el uso de carretillas planas para el traslado del material, para evitar fisuras y daños en el material.

 Cuando se requiera realizar mezclas de concreto en el sitio de la obra, hacerlo sobre una plataforma metálica o sobre un geotextil de un calibre que garantice que no haya contacto con el suelo, de tal forma que el lugar permanezca en óptimas condiciones. No hacer la mezcla directamente sobre el suelo o sobre las zonas duras existentes.

 Utilizar formaletas de madera sólo para la fundición de obras de concreto. Se exceptúan los casos en que se requieren formas especiales.

 En el caso de derrames de mezcla de concreto, es necesario recogerla y disponerla de manera inmediata.

 Siempre y cuando sea posible (por calidad), mantener húmedo el material de

playa que sea necesario (material de recebo), tal como en la construcción de pisos, andenes, etc.
SEGUIMIENTO Y MONITOREO Mapa de identificación de puntos de almacenamientos de materiales de construcción. Inspección de seguridad para centros de acopio.

5.2.6 Protección Del Suelo

En la ejecución de proyectos de obra civil, el suelo puede resultar uno de los recursos más afectado debido la necesidad de su uso para disposición o almacenamiento de materiales de construcción y/o residuos los cuales, debido a un mal manejo o eventos no deseados pueden generar derrames o vertimientos directos lo que conlleva a su contaminación y afectación.

Es por esto qué se deben tomar medidas preventivas para la protección de este recurso y, en caso de alguna afectación producto de las actividades del proyecto, para su rehabilitación o restitución con el fin de que el suelo afectado vuelva a sus condiciones iniciales o mejores.

PLAN DE PROTECCIÓN DEL SUELO		
IMPACTOS ASOCIADOS	**MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL**	**SEGUIMIENTO Y MONITOREO**
□ Modificación de las características del suelo. □ Deterioro del paisaje. □ Generación de focos de contaminación. □ Inconformidades por parte de la comunidad aledaña. □ Afectación a la salud de los trabajadores y de la comunidad cercana al proyecto.	□ No realizar vertimientos de residuos líquidos a las calles, parques, zonas verdes, separadores, canales, entre otros. □ Realizar el manejo adecuado de los residuos, aprovechables y no aprovechables, no peligrosos, peligrosos y especiales. □ Identificar empresas o asociaciones de recicladores y realizar la entrega de residuos aprovechables.	□Plan de intervención y recuperación de suelos. Inspección de seguridad para centros de acopio.

	Identificar gestores de residuos peligrosos y especiales, así como programas pos consumo, cercanos al lugar de la obra para la gestión adecuada de estos residuos. □ Al finalizar la jornada, se debe realizar una limpieza general de la zona donde se realicen las obras con el objeto de recoger todos los residuos presentes en el área. □ En caso de derrames o vertimientos al suelo, realizar su recolección inmediatamente y reportar el evento. Dependiendo de las características del material o producto derramado, en caso de que sea contaminante o peligroso, establecer el plan de intervención y recuperación del suelo.	

6. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

6.1 Componente Biótico

No hay la necesidad de utilización o intervención de áreas circundantes en las que pueda resultar vegetación, fauna y/o floras afectadas.

6.2 Componente Físico

6.2.1 Control De Emisiones Atmosféricas

Acciones de manejo	Método de verificación	Estado
Cuando se realice demolición, debe estar protegido con cerramiento perimetral para el control del material particulado.	Registro fotográfico	Cumple
Los materiales de construcción mantenerlos debidamente cubiertos y protegidos del aire y el agua.	Registro fotográfico	Cumple
los materiales generados en demoliciones, cubrirlos con material plástico o cualquier otro material para impedir las emisiones de partículas al aire.	Registro fotográfico	Cumple
Inspeccionar los vehículos que cargan y descargan materiales estén con carpas y lonas para cubrir los materiales. Verificar que cuenten con certificados vigentes de revisión tecno mecánica y de gases.	Registro fotográfico y actas de inspecciones	No Cumple
Advertir a la comunidad sobre la utilización de equipos sonoros, con el fin de que tomen las medidas pertinentes.	Registro fotográfico	Cumple
Suministrar elementos de control auditivo al personal de la obra.	Registro fotográfico	Cumple
Prohibir a los vehículos que en la obra accionen las bocinas.	Registro fotográfico	Cumple

6.2.2 Prevención De La Contaminación De Cuerpos De Agua Y Redes De Servicios Públicos

Acciones de manejo	Método de verificación	Estado
En caso de derrame de mezcla de concreto, ésta se deberá recoger y disponer de manera inmediata,	Registro fotográfico	N/A

siguiendo los protocolos establecidos		
Se prohíben los vertimientos de aceites, pinturas y demás materiales o productos químicos a la red de alcantarillado o su disposición sobre el suelo.	Registro fotográfico	N/A
Se prohíbe el lavado de vehículos y el descargue de mezclas de concreto en las estructuras de alcantarillado, lo mismo que el vertimiento de cualquier sustancia perjudicial que se genere en la obra.	Registro fotográfico	N/A
Utilizar concreto mezclado en planta, se recomienda extremar las medidas de precaución en el transporte de la mezcla a los frentes de trabajo, con el fin de evitar vertimientos accidentales	Registro fotográfico	N/A

6.2.3 Disposición De Residuos Sólidos

Acciones de manejo	Método de verificación	Estado
Realizar la clasificación y separación adecuada de los residuos sólidos.	Registro fotográfico	Cumple
Punto ecológico	Registro fotográfico	Cumple
Capacitar y sensibilizar a todo el personal de la obra, sobre la gestión integral de los residuos.	Registro fotográfico y listados de asistencia	No Cumple
Empresas gestoras encargadas de la recolección periódica, transporte y disposición final de los residuos no aprovechables.	Registro fotográfico y Certificado de empresa recolectora	No Cumple
Realizar una limpieza general de la zona donde se realicen las obras con el objeto de recoger todos los residuos presentes en el área.	Registro fotográfico	Cumple
Realizar el manejo adecuado de los residuos especiales y/o peligrosos.	Registro fotográfico	No Cumple

Separar los residuos de construcción y demolición RCD como escombros, sobrantes de concreto, morteros, cordones, tuberías de los demás residuos.	Registro fotográfico	Cumple
El manejo, transporte y disposición final de escombros y materiales de construcción, deberá seguir los criterios establecidos por las autoridades competentes	Registro fotográfico	Cumple

6.2.4 Manejo De Movilidad Y Señalización

Las áreas destinadas para el acopio temporal de los materiales de obra y para los residuos están debidamente señalizadas con cinta de demarcación
y con soportes tubulares.
Cuando se programa el ingreso de vehículos para cargue o descargue de material o para recolección de residuos, se realiza el control del tráfico tratando de no generar traumatismos para los transeúntes.

6.2.5 Uso Y Almacenamiento Adecuado De Materiales De Construcción

Acciones de manejo	Método de verificación	Estado
Los materiales deben provenir de fuentes legales, es decir, deben contar con permisos ambientales y mineros, aspectos que deberán ser certificados por los proveedores	Certificados de la empresa	No cumple
Demarcar los sitios de almacenamiento con la señalización establecida.	Registro fotográfico	cumple
Utilizar formaletas de madera sólo para la fundición de obras de concreto.	Registro fotográfico	N/A
En el caso de derrames de mezcla de concreto, es necesario recogerla y disponerla de manera inmediata.	Registro fotográfico	N/A
No hacer la mezcla directamente sobre el suelo o sobre las zonas duras existentes.	Registro fotográfico	N/A

6.2.6 Protección Del Suelo

Acciones de manejo	Método de verificación	Estado
No realizar vertimientos de residuos líquidos a las calles, parques, zonas verdes, separadores, canales, entre otros.	Registro fotográfico	Cumple
En caso de derrames o vertimientos al suelo, realizar su recolección inmediatamente y reportar el evento. Dependiendo de las características del material o producto derramado, en caso de que sea contaminante o peligroso, establecer el plan de intervención y recuperación del suelo.	Registro fotográfico	Cumple

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El cumplimiento de las medidas de mitigación propuestas garantizará la ejecución ambientalmente responsable del proyecto, minimizando los impactos negativos y promoviendo un entorno sostenible.
De acuerdo con la revisión al informe ambiental del mes informado, el contratista deberá tener en cuenta las observaciones y recomendaciones entregadas por la interventoría en el presente documento para poder realizar la trazabilidad correspondiente:

- Se recomienda involucrar a todos los actores del proyecto en la implementación de estas medidas
- Realizar capacitaciones sobre buenas prácticas ambientales.
- Se debe tener en cuenta las Notas realizadas sobre el cumplimiento de las actividades para el cumplimiento de las obligaciones dispuestas por Corpoamazonia en cada uno de los actos administrativos que se tienen para el contrato de obra.
- Se recomienda realizar un cronograma de actividades para el desarrollo de

todas las acciones de manejo para poder realizar un efectivo seguimiento y control de los componentes.

- Dentro de la documentación de procedencia de materiales se deben presentar los requisitos y documentos mínimos exigidos por la normatividad ambiental vigente, teniendo en cuenta el tipo de material comprado para el proyecto.
- Se recomienda al profesional ambiental de obra entregar documentación de legalidad de todos los servicios adquiridos para el desarrollo de la obra, dándole cumplimiento a la compra de madera, agua utilizada, mantenimiento de unidades sanitarias, entrega y disposición de residuos sólidos.

De esta manera la interventoría solicita de manera oportuna al contratista de obra se realice el envío de los requisitos legales de los proveedores de materiales, los permisos ambientales que haya lugar, así como la documentación que permita verificar la legalidad de los materiales de las empresas con las que los han contratado (madera, agua, disposición final de RCD, material de rio, triturado y/o concreto premezclado); y/o informar el estado en el que se encuentra el cumplimiento de esta obligación para tener conocimiento y poder realizar un correcto seguimiento y control a las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato de obra.

Javier Villota Rosero
TP:52238-431006
Profesional Ambiental de Interventoría
