INFORME INTERVENTORÍA N°03



INTERVENTOR:
ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.

Entre los suscritos **LUIS HUMBERTO PAZ TIMANÁ** en nombre y representación de la **NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO** quien se denominará el Contratante, por una parte; y por otra parte el **ING. ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO** identificado con cedula de ciudadanía No 9.731.335 de Armenia-Quindío, quien se denominará el Contratista, celebraron el día 01 de noviembre de 2024 el Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.6973355 cuyo objeto es **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO".**

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 5
2 DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO 6
3 INFORMACION GENERAL 8
3.1 Información general del contrato de interventoría 8
3.2 Información general del contrato de obra 8
4 ASPECTOS TÉCNICOS DE LA OBRA 9
4.1 Aspecto de diseño 9
5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 13
6 SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA 14
6.1 Avance de los contratos de obra e interventoría 14
6.1.1 Contrato de obra 14
6.1.2 Contrato de interventoría. 16
7. AVANCE EN TIEMPO DE LOS CONTRATOS 17
7.1 Para el contrato de obra: 17
7.2 Para el contrato de interventoría: 17
8. PROGRAMACIÓN DE OBRA 18
9. ACTIVIDADES Y CANTIDADES INICIALES 22
10. ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS EN EL MES 28
11. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA 35
11.1 CAPÍTULO 1 PRELIMINARES 35
12. PMA: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 47
13. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 48
13.1 Actas de inicio 48
13.2 Socialización del proyecto: 48
13.3 Comités de obra: 49
14. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL 49
14.1 Clausula 8 Forma de pago contrato de obra 49
14.2 Clausula 8 Forma de pago contrato de interventoría 50
15. PERSONAL Y EQUIPO UTILIZADO EN OBRA 51
16. CONTROL DE CALIDAD 51
16.1 Metodología de medición y cuantificación de obra ejecutada 51
17. CONTROL DE PÓLIZAS Y RESERVAS PRESUPUÉSTALES 52
17.1 Pólizas contratista de obra 52
17.2 Pólizas contratista de interventoría. 53
18. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 54
19. ACTIVIDADES RELEVANTES 55
20. ESTADO DEL TIEMPO 55
21. INCONVENIENTES ENCONTRADOS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA 56
22. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 56
23. ANEXOS 59

LISTA DE TABLAS

TABLA 1. *INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.* 8
TABLA 2. *INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.* 9
TABLA 3. *AVANCE TÉCNICO AL CONTRATO DE OBRA.* 15
TABLA 4. *AVANCE TÉCNICO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.* 17
TABLA 5. *AVANCE EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA.* 17
TABLA 6. *AVANCE EN TIEMPO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.* 18
TABLA 7. *PROGRAMACIÓN AL CONTRATO DE OBRA.* 22
TABLA 8. *CANTIDADES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA.* 28
TABLA 9. *CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA.* 35
TABLA 10. PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ANEXO 0 52
TABLA 11. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0 . 53
TABLA 12. PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES. ANEXO 0 53

LISTA DE IMÁGENES

IMAGEN 1: *LOCALIZACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.* 7
IMAGEN 2:LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL ÁREA A INTERVENIR EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 7
IMAGEN 3: PLANOS ESTRUCTURALES 9
IMAGEN 4: PLANOS PLANTA PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA. 10
IMAGEN 5: *PLANO PERFIL PALACIO DE JUSTICIA MOCOA.* 10
IMAGEN 6: PROTECCIÓN ARQUITECTÓNICOS. 11
IMAGEN 7: *PLANO DE FACHADA PRINCIPAL.* 11
IMAGEN 8: MODELO. 12
IMAGEN 9 PLANO POR PLANTA EN CADA PISO 12
IMAGEN 10: DESMONTE DE CIELO RASO. 36
IMAGEN 11: DESMONTE DE TASAS SANITARIAS, ORINALES Y LAVAMANOS. 36
IMAGEN 12: DESMONTE DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. 37
IMAGEN 13: DESMONTE DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. 37
IMAGEN 14: DESMONTE DE LUMINARIAS. 38
IMAGEN 15: DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PARED. 39
IMAGEN 16: DEMOLICIÓN REPELLO DE PISOS. 39
IMAGEN 17: DEMOLICIÓN REPELLO DE PARED. 40
IMAGEN 18: CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO. 40
IMAGEN 19: SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO. 41
IMAGEN 20: CARTERA EN LAMINA DE FIBROCEMENTO. 43
IMAGEN 21: RELLENO CON MORTERO 1:4. 43
IMAGEN 22: ESTUCO PLÁSTICO PARA MUROS Y RESANES. 44
IMAGEN 23: PINTURA VINILO TIPO 1. 45
IMAGEN 24: PINTURA VINILO TIPO 1. 45
IMAGEN 25: PINTURA EN FRIO BASE SOLVENTE 46
IMAGEN 26: PINTURA EN FRIO BASE SOLVENTE. 46
IMAGEN 27: BRIGADA DE ASEO. 47
IMAGEN 28: *REGISTRO FOTOGRÁFICO – SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO* 49

LISTA DE GRAFICOS

GRÁFICO 1: *PROGRAMADO VS EJECUTADO CONTRATO DE OBRA MES 3* 16

INTRODUCCIÓN

La Nación - Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Distrito Pasto en nombre y representación de **LUIS HUMBERTO PAZ TIMANÁ**, busca solucionar el deterioro actual que vive la infraestructura física del palacio de justicia de mocoa no permite prestar una atencion de manera integral, organizada, coordinada y de cumplimiento en infraestructura de calidad, que satisfaga las necesidades de sus usuarios y personal del palacio de justicia. Por tal razón,contrató con el **ING. ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO**, la realización de la interventoria del contrato **N° CO1.PCCNTR.6973355,** cuyo objeto es: **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO".**Este proyecto comprende actividades preliminares, instalaciones hidrosanitarias,red electrica, muros, repellos, enchapes, estucos, pintura,carpinteria,cubierta y cielos rasos,aparatos sanitarios,varios y aseo, con el fin de garantizar la seguridad de los servidores judiciales, usuarios y visitantes, asegurando un entorno libre de riesgos, eficiencia en la administración de justicia, un espacio físico adecuado y funcional facilita la labor de los servidores judiciales, permitiendo unaatención más eficiente y oportuna a los usuarios.

Por lo tanto, el presente informe contiene toda la informacion necesaria para que la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Distrito Pasto pueda verificar el cumplimiento de estas obligaciones, tanto en lo relativo a la ejecucion fisica como la ejecucion financiera, soportada con datos obtenidos en campo. En los anexos a este informe, se registran todos los controles realizados al proyecto de acuerdo a las especificaciones técnicas.

También se presenta un resumen de las actividades ejecutadas, los problemas presentados, las acciones correctivas tomadas y la manera como se superaron, junto a registro fotográfico de los trabajos. Para finalizar se formulan las conclusiones y recomendaciones, para el periodo comprendido en este informe entre el 1 de febrero hasta el 28 de febrero del 2025.

2 DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO

2.1. Descripción del Proyecto

El desarrollo de las actividades del contrato de la obra nos lleva a solucionar el inconveniente, que radica en el actual deterioro que se encuentra la infraestructura física del palacio de justicia municipio de Mocoa Departamento del Putumayo, dado que no cuenta con instalaciones apropiadas, generando incumpliendo con la normatividad y regulaciones vigentes en materia de seguridad, salud ocupacional y accesibilidad, como también, la preservación de la imagen institucional, un edificio bien mantenido y restaurado refleja la imagen de la institución y su compromiso con la justicia y el servicio a la comunidad.

Para el efecto la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Distrito Pasto, presentó el proyecto **"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA";** que fue viabilizado y aprobado, para financiar su ejecución. Los estudios y diseños del proyecto fueron aportados por la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Distrito Pasto, siendo beneficiario directo palacio de justicia del municipio de Mocoa departamento del Putumayo.

2.2. Localización del proyecto

La ejecución de las actividades contractuales se encuentra localizadas en el Municipio de Mocoa que se encuentra localizado está ubicado en la parte norte del Departamento del Putumayo, específicamente en el palacio de justicia, Calle 7 No 6 - 42, Barrio Centro.



Imagen 1: *Localización General del Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo.*
Fuente: *www.googlemaps.com*

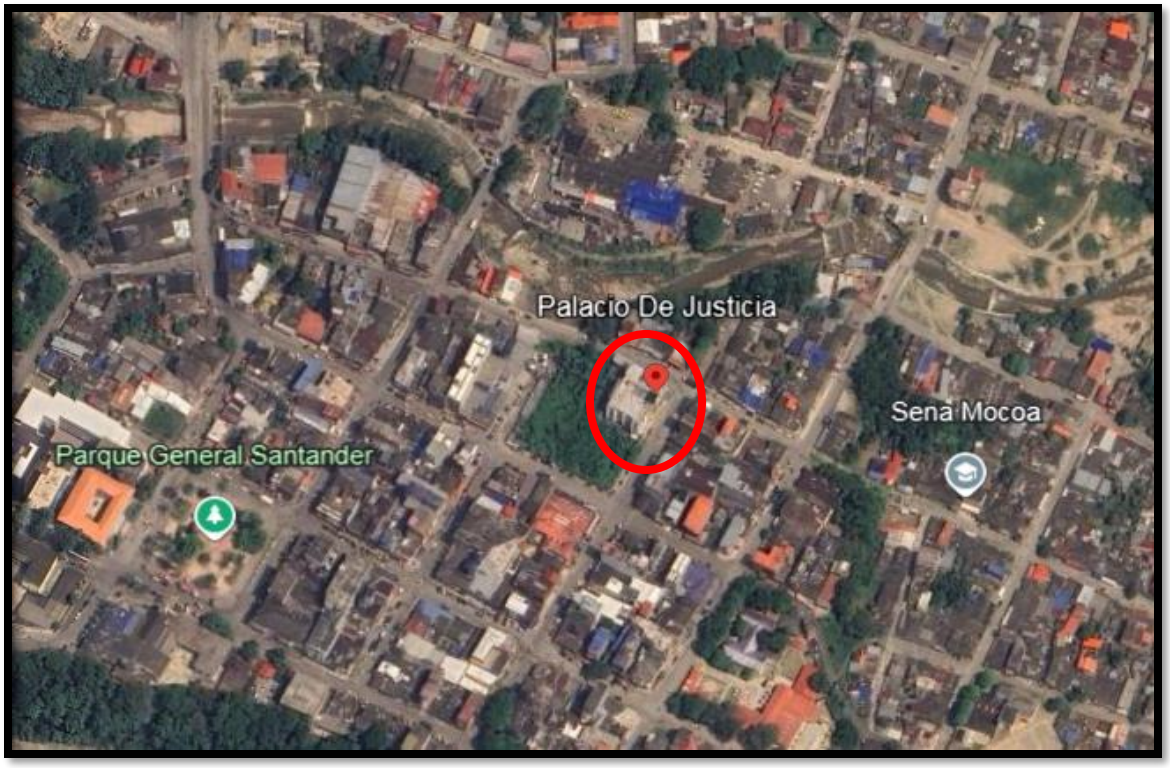


Imagen 2:*Localización especifica del área a intervenir en el municipio de Mocoa departamento del Putumayo.*
Fuente: *www.earth.google.com*

3 INFORMACION GENERAL

3.1 Información general del contrato de interventoría

CONTRATO No	01.PCCNTR.6973355 DEL 01/11/2024
OBJETO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
FECHA DEL CONTRATO	01 DE NOVIEMBRE DEL 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUARETA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO
VALOR INICIAL	TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($33.336.660.00) M/CTE
ADICION N°1	VEINTISEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS DIESCISIETE PESOS ($ 26.113.717.00) M/CTE.
VALOR INICIAL + ADICION N°1.	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($ 59.450.377.00) M/CTE.
FECHA DE INICIACIÓN	14 DE NOVIEMBRE DEL 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	31 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE REINICIO	13 DE ENERO DEL 2025
FECHA DE TERMINACION N°2	21 DE ENERO DEL 2025
PRORROGA N°1	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACION N°3	21 DE MARZO DEL 2024

***TABLA 1**. Información general del contrato de interventoría.*
***Fuente:** Elaboración Propia.*

3.2 Información general del contrato de obra

CONTRATO No	O1.PCCNTR.6947019 DEL 29 DE OCTUBRE 2024
OBJETO	"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S
FECHA DEL CONTRATO	29 DE OCTUBRE DEL 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (2) MESES
VALOR INICIAL	NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($955.501.990.00) M/CTE
FECHA DE INICIACIÓN	14 DE NOVIEMBRE DEL 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	13 DE ENERO DEL 2025
FECHA SUSPENSION N°1	31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE REINICIO	13 DE ENERO 2025

FECHA TERMINACION N°2	21 DE ENERO 2025
PRORROGA N°1	DOS (2) MESES
FECHA TERMINACION N°3	21 DE MARZO 2025

TABLA 2. *Información general del contrato de obra.*
Fuente: *Elaboración Propia.*

4 ASPECTOS TÉCNICOS DE LA OBRA

4.1 Aspecto de diseño

El proyecto consiste en realizar el mantenimiento de las áreas del palacio de justicia del municipio de Mocoa, departamento del putumayo.

El contratista de obra efectuó una revisión detallada de los estudios y diseños suministrados por la entidad una vez revisada la información técnica del proyecto, el contratista de obra encontró algunas inconsistencias en los planos arquitectónicos, eléctricos y sanitarios.

La interventoría reviso detenidamente las observaciones presentadas por el contratista de obra donde efectivamente se evidencias inconsistencias que se tienen en consideración en comité con supervisión.

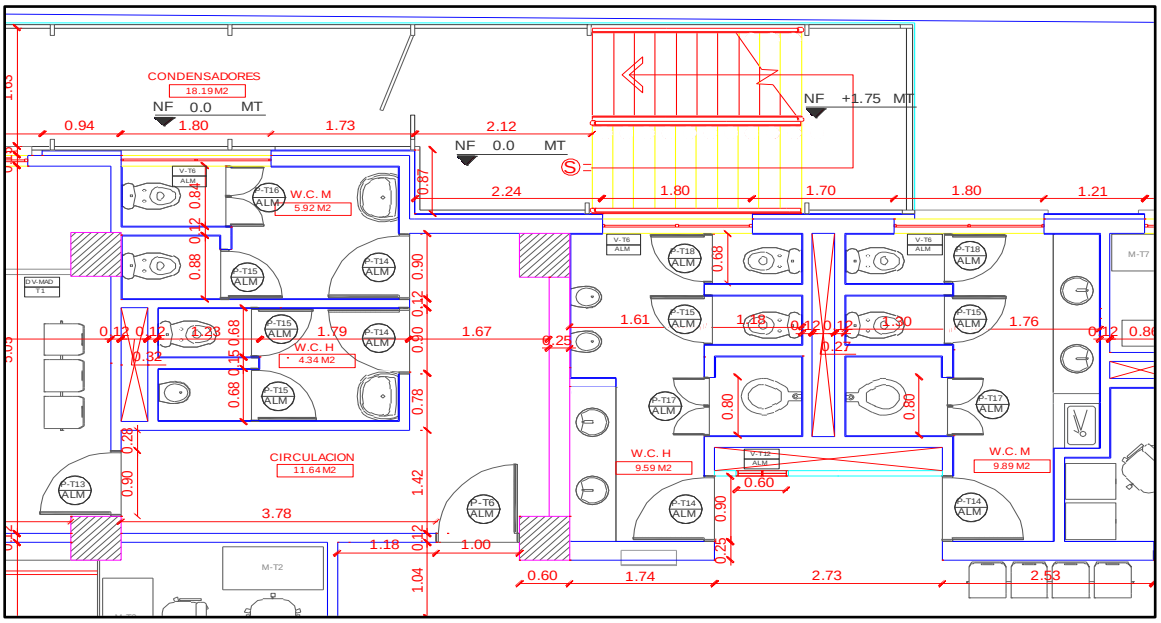


Imagen 3: *Planos estructurales*
Fuente: *Documentos otorgados por la entidad.*

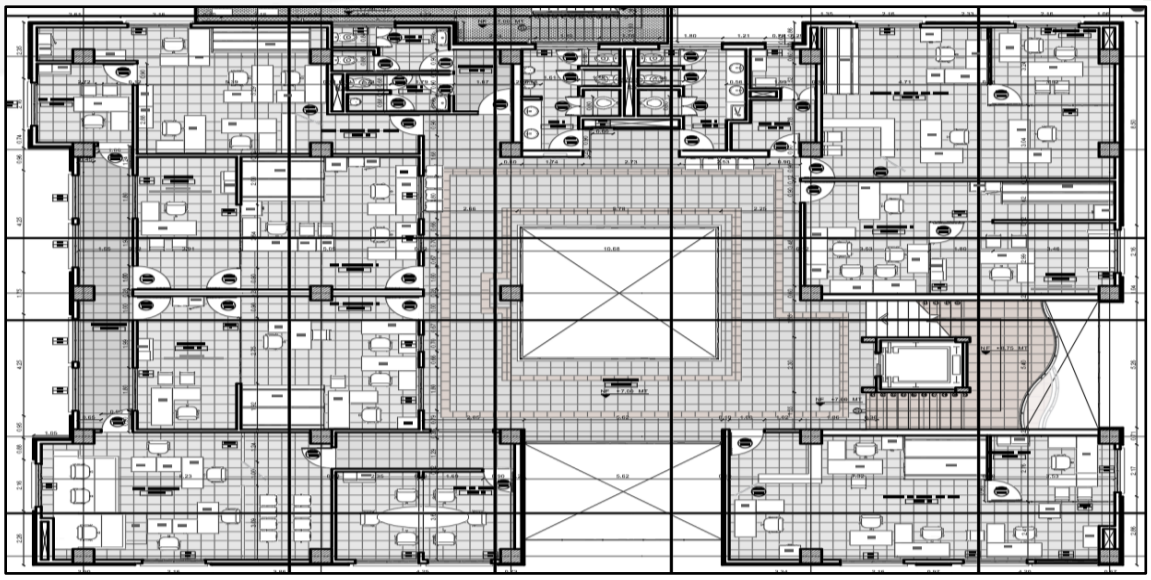


Imagen 4: Planos planta palacio de justicia de Mocoa.
Fuente: *Documentos otorgados por la entidad.*

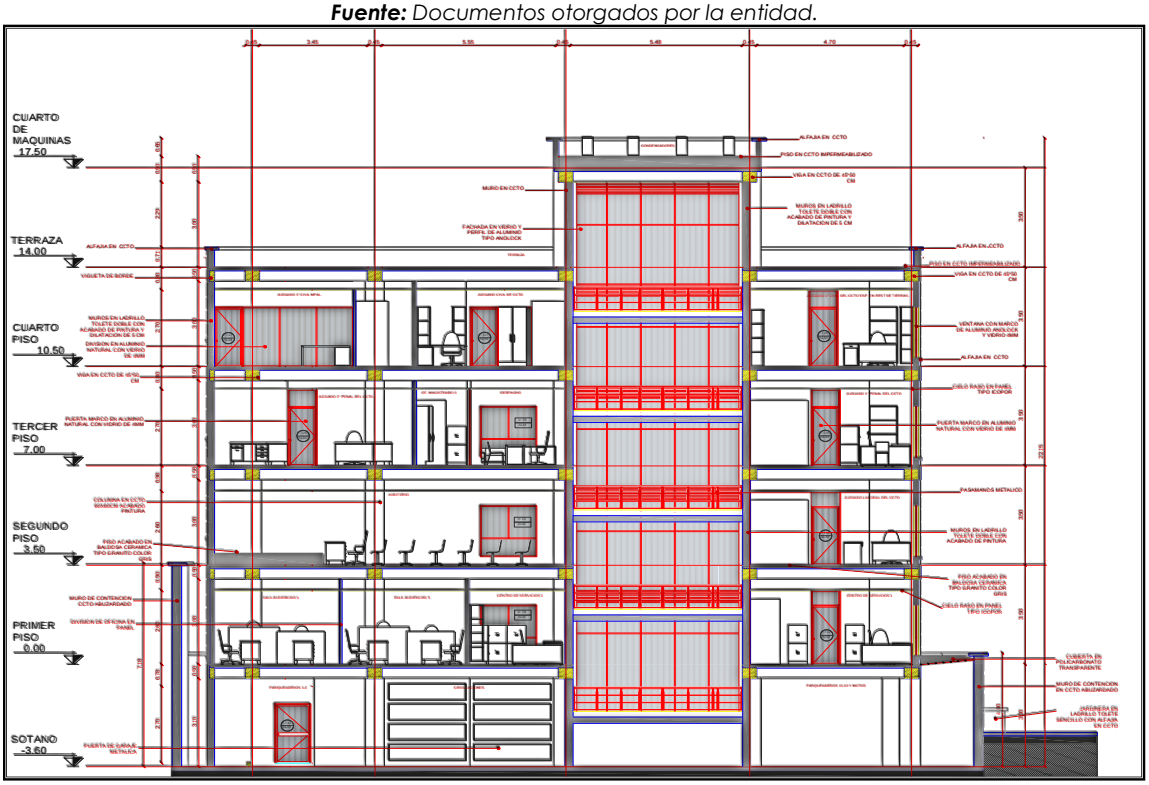


Imagen 5: *Plano perfil palacio de justicia Mocoa.*
Fuente: *Documentos otorgados por la entidad.*

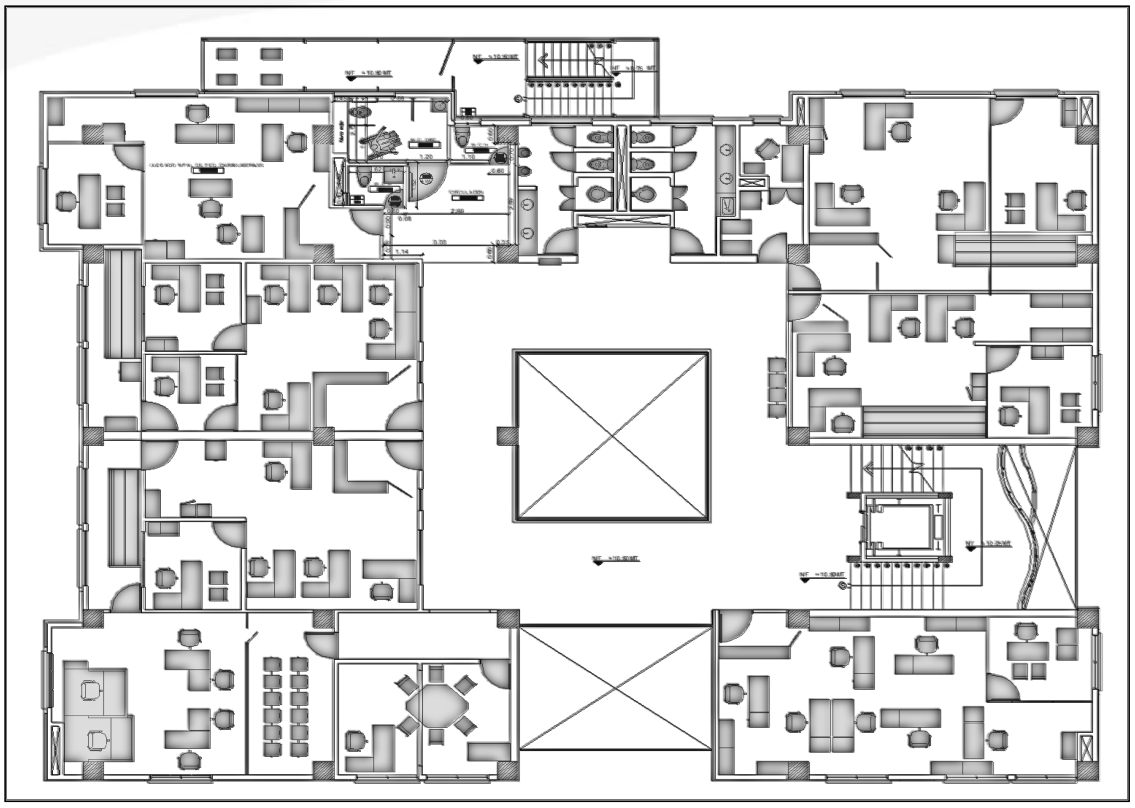


Imagen 6: Protección arquitectónicos.
Fuente: Documentos otorgados por la entidad.

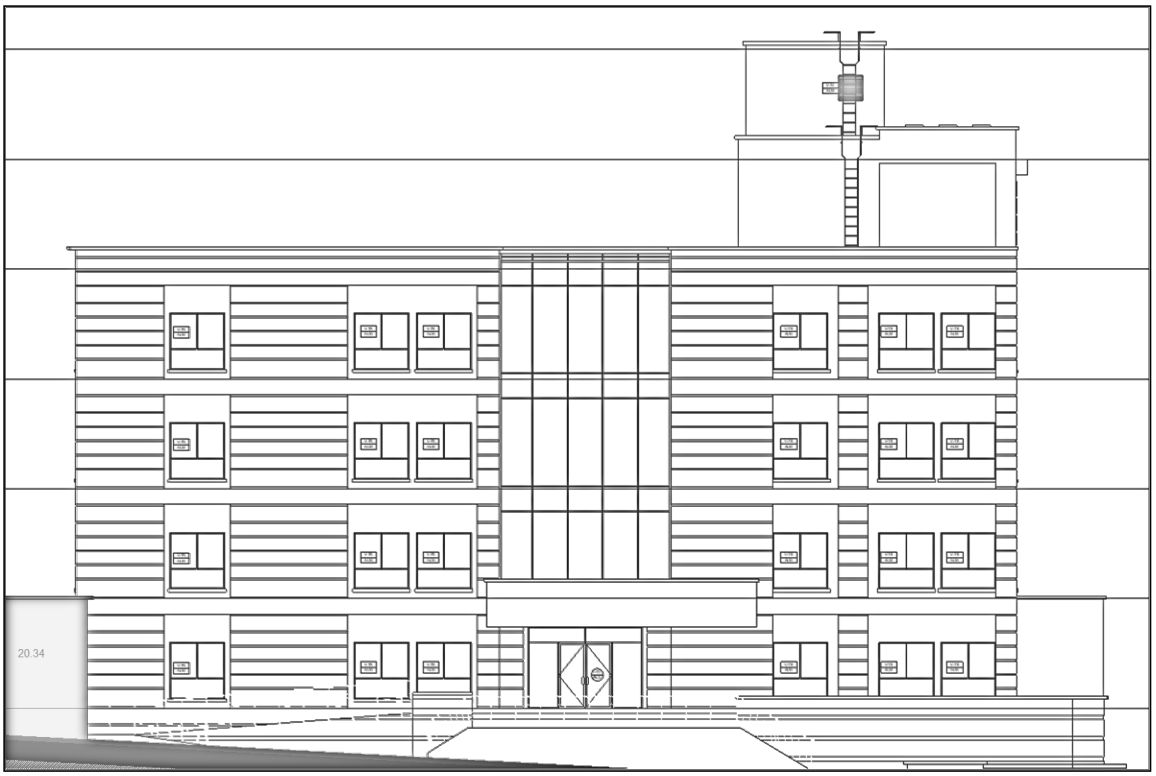


Imagen 7: *Plano de fachada principal.*
Fuente: *Documentos otorgados por la entidad.*



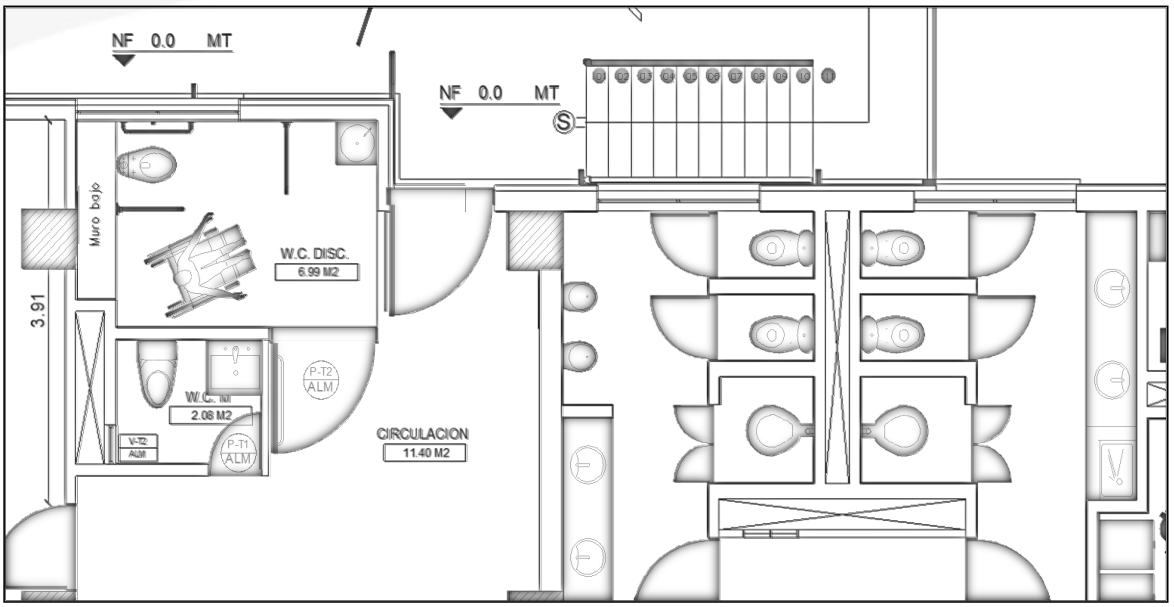


Imagen 8: *Modelo.*
Fuente: *Documentos otorgados por la entidad.*


PRIMER PISO

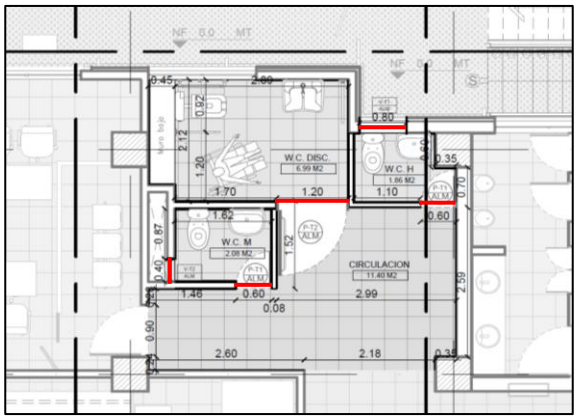

SEGUNDO PISO

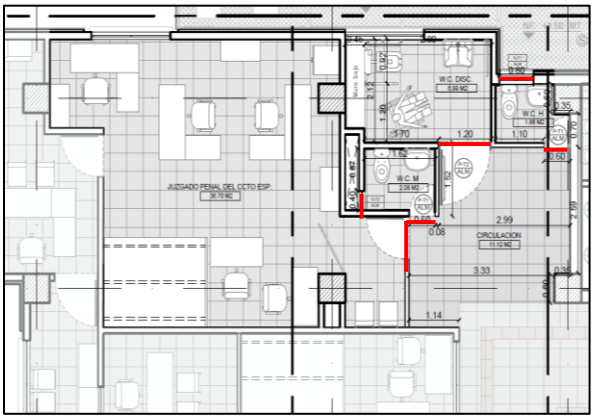

TERCER PISO

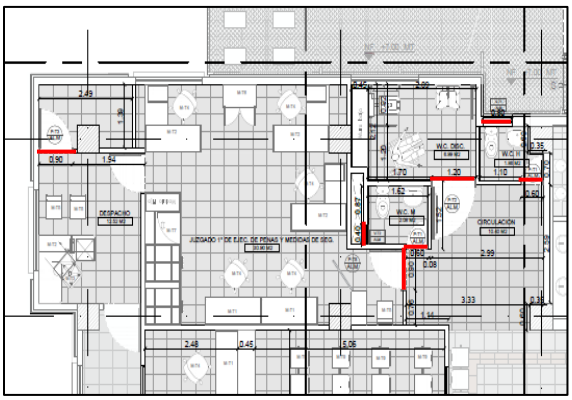

CUARTO PISO

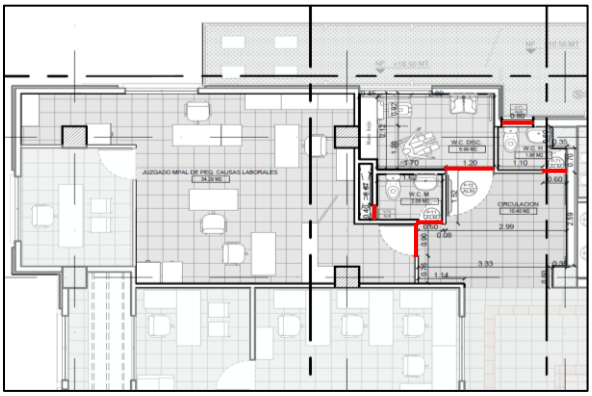


Imagen 9 *Plano por planta en cada piso*
Fuente: Documentos otorgados por la entidad

5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

Se desarrolló revisión y aprobación de la documentación requerida para el avance del contrato de obra según las obligaciones contractuales tales como equipo mínimo requerido, análisis de precios unitarios, cronograma, plan de manejo ambiental (PMA), plan de seguridad y salud en el trabajo (SST), etc.Se viene desarrollando un plan de trabajo según la propuesta presentada inicialmente por la interventoría, haciendo énfasis en el estricto seguimiento al desarrollo del contrato de obra, garantizando la calidad de los trabajos efectuados.

Se ha verificado el seguimiento técnico mediante la supervisión, inspección y control de calidad de los trabajos de obra, informes y documentos que se generan del proyecto garantizando el correcto cumplimiento de las obligaciones técnicas contractuales.
Durante el periodo comprendido entre el día 1 de febrero al 28 de febrero del 2025, se realizaron las siguientes actividades principales:

- ✓ Socialización del proyecto.
- ✓ Firma acta de inicio de obra y de interventoría.
- ✓ Control técnico a las actividades ejecutadas de acuerdo a las especificaciones y normas técnicas.
- ✓ Control administrativo, realizando las actas, oficios y documentación pertinente a la ejecución del contrato para su buen desarrollo.
- ✓ Ejecución del informe mensual N.03
- ✓ Seguimiento y control a los procesos constructivos entregados por el contratista.
- ✓ Verificación de afiliaciones y pagos a seguridad social y riesgos profesionales.
- ✓ Solicitudes de certificados de calidad de los materiales utilizados en obra.
- ✓ Comunicación permanente con la entidad contratante para informar del avance y actividades adelantadas referentes al proyecto.
- ✓ Reuniones con el contratista, antes y durante la suscripción del acta de inicio, para definir las directrices a seguir durante la ejecución del proyecto.
- ✓ Control técnico, económico y financiero del proyecto en desarrollo.

- ✓ Revisión de estudios, diseños, planos y memorias de cálculo del proyecto, se emiten observaciones a los mismos.
- ✓ Suscripción de documentos contractuales.
- ✓ Revisión y localización de sitios de obra.
- ✓ Solicitud al contratista, de toda la documentación pertinente.
- ✓ Control de dotación del personal en obra.
- ✓ Seguimiento y control al programa de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST), y al Plan manejo ambiental (PMA) durante la ejecución del proyecto.
- ✓ Solicitar al contratista los informes mensuales de los diferentes planes de seguimiento y control.
- ✓ Las demás inherentes a sus obligaciones.

6 SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA

6.1 Avance de los contratos de obra e interventoría

6.1.1 Contrato de obra

Se resalta de forma relevante, que, a la fecha de ejecución con respecto a la programación de obra inicial, se evidencian avances significativos para la obra; las actividades desarrolladas en el marco del contrato de obra No, CO1.PCCNTR.6947019 del 29 de octubre 2024 corresponden a ***Capítulo 1 actividades preliminares, subcapítulo 1.2 desmontes y retiros,*** ítem 1.2.3 Desmonte de cielo raso en fibra mineral y/o panel yeso y/o fibrocemento, incluye estructura soporte, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta. ítem 1.2.4 Desmonte de Tasas sanitarias, orinales y lavamanos, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta. ítem 1.2.5 Desmonte de instalaciones hidrosanitarias, incluye tuberías y accesorios, regatas y sellos provisionales, cargue a volqueta. ítem 1.2.6 Rasqueteo, cepillo y limpieza manual de superficies, con el fin de retirar impurezas y capas de pintura existentes. ítem 1.2.7 Retiro de luminarias ubicadas en cielos rasos y pared, incluye trasiego a punto de acopio. ***subcapítulo 1.3 demoliciones***, ítem 1.3.2 Demolición de enchape de pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta. ítem 1.3.4 Demolición repello de piso, incluye picado Eprom = 0.03m, incluye trasiego y cargue a volqueta. ítem 1.3.5 Demolición repello de pared, muros mampostería eprom= 0.02m, incluye trasiegos y cargue a volqueta. ítem 1.3.6 Cargue, transporte y retiro del material sobrante proveniente de las obras de mantenimiento, hasta el botadero. ***Capítulo 4 Muros*** ítem 4.1

Suministro e instalación de muro doble cara en lámina de fibrocemento 8mm. Estructura base 6. incluye estuco y dos manos de pintura. ítem 4.2 Carteras en lámina de fibrocemento 8mm dos caras, en marco ventana y puertas. ***Capítulo 5 Repellos,*** ítem 5.1 Repello de piso y pared con mortero 1:4 espesor 2cm. Incluye aditivo impermeabilizante. ***Capítulo 7 estucos,*** ítem 7.2 Estuco plástico para muros y resanes incluye juntas, filos y dilataciones. ***Capítulo 8 pintura*** ítem 8.1 Pintura de muros en mampostería 3 manos, vinilo tipo 1, lavable. ítem 8.3 Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial ancho 10cm, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, para pavimento rígido. ítem 8.4 Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial, números con circunferencias de 66 y 40cm para carros y motos. imprimación en negro y pintura tráfico vehicular, incluye micro esferas, para pavimento rígido. ítem 8.5 Aplicación de pintura en frio base solvente para flechas de ingreso y salida, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, sobre pavimento rígido. ***Capítulo 13 VARIOS Y ASEO GENERAL*** ítem 13.1 Brigada de aseo.

De acuerdo con la evaluación del periodo No 03 de ejecución, la obra presenta un porcentaje ejecutado acumulado del 27.93% que corresponde a una inversión de $260.045.112,00 un porcentaje programado acumulado de 69.38% que corresponde a una inversión de $ 662.898.411.00 con respecto del valor contratado.

DESCRIPCIÓN OBRA	VALOR
Valor Inicial costo de la obra:	$ 955.501.961
Valor programado para el periodo No. 3:	$ 449.424.468
Porcentaje programado para el periodo No. 3:	47,04%
Valor ejecutado periodo No. 03 (1/02/2025-28/02/2025):	$ 20.565.307
Porcentaje ejecutado periodo No. 03 (1/02/2025-28/02/2025):	2,86%
Valor programado acumulado:	$ 662.898.411
Porcentaje programado acumulado:	69,38%
Valor ejecutado acumulado:	$ 260.045.112
Porcentaje de ejecución acumulado:	27,93%
Déficit (-) / Superávit (+) de avance en obra:	41.45 %

TABLA 3. *Avance técnico al contrato de Obra.*
Fuente: *Elaboración Propia.*

PROGRAMADO VS EJECUTADO OBRA

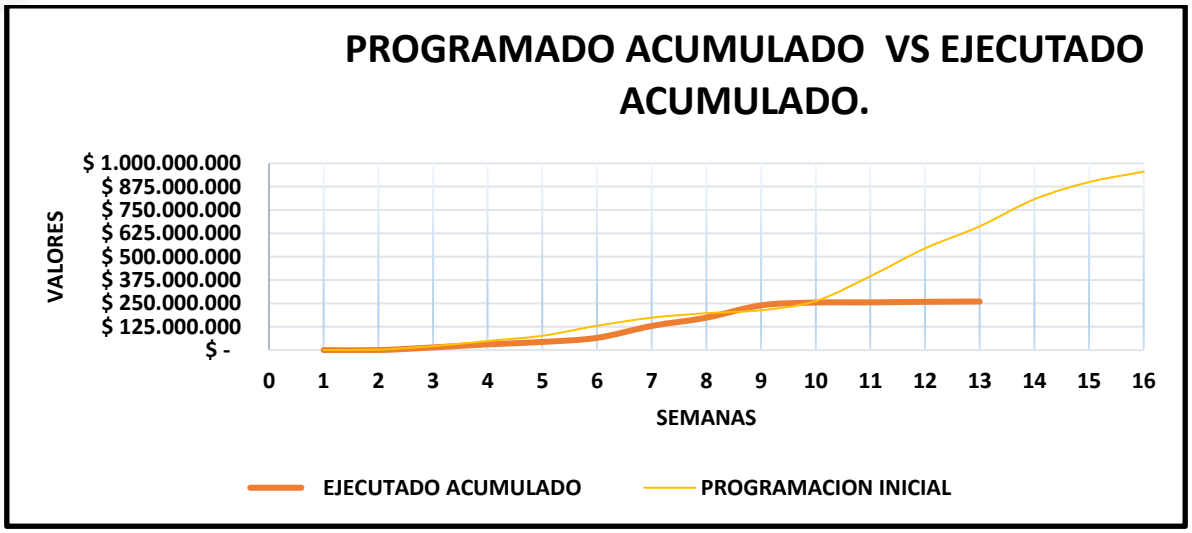


Gráfico 1: *Programado vs ejecutado contrato de obra Mes 3*
Fuente: *Elaboración Propia.*

6.1.2 Contrato de interventoría.

La Interventoría ha cumplido sus funciones desde la suscripción del acta de inicio, verificando que las actividades pactadas por el contratista de obra se cumplan a cabalidad de acuerdo con las especificaciones técnicas, normatividad vigente y acatando recomendaciones por parte de Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Distrito Pasto.

Básicamente durante el periodo comprendido entre la firma del contrato y la presente fecha, se realizaron las actividades técnicas de revisión general del proyecto, estimación de cantidades de obra, revisión de documentos contractuales, acompañamiento en la revisión de los diseños, y el seguimiento y control a la ejecución de la obra, entre otros, a fin de garantizar todas las herramientas e insumos que permitan el normal y adecuado desarrollo del proyecto.

De acuerdo con la evaluación del periodo de ejecución desde el 1 de febrero al 28 de febrero del 2025, la interventoría presenta un porcentaje ejecutado del 83,81% que corresponde a una inversión de $ 49.825.360,96 respecto del valor contratado.

GENERAL INTERVENTORIA	
DESCRIPCIÓN	**VALOR**
Valor Inicial Costo de la Interventoría:	$ 33.336.660,00
Valor adición N°1	$ 26.113.717.00
Valor Inicial + Valor adición N°1	$ 59.450.377.00
Porcentaje de ejecución presente mes:	83,81%
Valor ejecutado periodo No. 03 ((1/02/2025-28/02/2025):	$ 48.825.360,96
Porcentaje de ejecución acumulado:	83,81%
Valor ejecutado acumulado:	$ 48.825.360,96

TABLA 4. *Avance técnico al contrato de Interventoría.*
Fuente: *Elaboración Propia.*

7. AVANCE EN TIEMPO DE LOS CONTRATOS

7.1 Para el contrato de obra:

El tiempo acumulado de labores es de treinta (30) días respecto del plazo total pactado de dos (2) meses iniciales y prorroga de dos (2) meses de ejecución, contados desde el día 1 de febrero al 28 de febrero del 2025 que corresponden al 83.81% de avance en tiempo con respecto al plazo del contrato.

Plazo inicial	Dos (2) meses
Prorroga N°1	Dos (2) meses
Avance en tiempo	88 días
Porcentaje de avance en tiempo	83,81%

TABLA 5. *Avance en tiempo al contrato de Obra.*
Fuente: *Elaboración Propia.*

7.2 Para el contrato de interventoría:

El tiempo acumulado de labores es de cuarenta y cinco (45) días respecto del plazo total pactado de cuarenta y cinco (45) días de ejecución, y prorroga de dos (2) meses de ejecución, contados desde el día 1 de febrero al 28 de febrero del 2025 que corresponden al 83,81% de avance en tiempo con respecto al plazo del contrato.

Plazo inicial	Cuarenta y cinco (45) días
Prorroga N°1	Dos (2) meses
Avance en tiempo	88 días
Porcentaje de avance en tiempo	83,81%

TABLA 6. *Avance en tiempo al contrato de Interventoría.*
Fuente: *Elaboración Propia.*

8. PROGRAMACIÓN DE OBRA

El control de la programación y el presupuesto del contrato se realizó con base en el cronograma y el flujo de caja presentado por el contratista, del que se extrae los capítulos principales y los diversos ítems del proyecto, para efectuar el seguimiento y control de las actividades proyectadas vs las actividades ejecutadas, con el fin de evitar que se genere un incumplimiento de los plazos iniciales y el valor presupuestado de la construcción. A continuación, se presentan los datos iniciales proyectados para la ejecución de la obra:

REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA.			
CRONOGRAMA			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**INICIO**	**FINAL**
1	**PRELIMINARES**		
1.1	**INICIALES**		
1.1.1	Localización y replanteo arquitectónico, incluye planos récord	14/11/2024	17/11/2024
1.1.2	Instalación y desinstalación de muro una cara drywall, provisional para cerrar las obras, incluye puerta con marco para ingreso de trabajadores	14/11/2024	15/12/2024
1.1.3	Señalización de obra en lona de 60x40cm impresión full color, incluye marco y anclaje	28/11/2024	04/12/2024
1.2	**DESMONTES Y RETIROS**		
1.2.1	Desmonte de marcos y puertas, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	21/11/2024	15/12/2024
1.2.2	Desmonte de marco, ventana y vidrio, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	21/11/2024	15/12/2024
1.2.3	Desmonte de cielo raso en fibra mineral y/o panel yeso y/o fibrocemento, incluye estructura soporte, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	21/11/2024	15/12/2024
1.2.4	Desmonte de Tasas sanitarias, orinales y lavamanos, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	21/11/2024	15/12/2024
1.2.5	Desmonte de instalaciones hidrosanitarias, incluye tuberías y accesorios, regatas y sellos provisionales, cargue a volqueta	21/11/2024	15/12/2024
1.2.6	Rasqueteo, cepillo y limpieza manual de superficies, con el fin de retirar impurezas y capas de pintura existentes.	28/11/2024	15/12/2024
1.2.7	Retiro de luminarias ubicadas en cielos rasos y pared, incluye trasiego a punto de acopio	21/11/2024	15/12/2024
1.2.8	Retiro de redes eléctricas en piso, techo y pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	21/11/2024	15/12/2024
1.3	**DEMOLICIONES**		
1.3.1	Demolición muro E ≤ 15CM en mampostería maciza o hueca, incluye cortes con pulidora, trasiegos y cargue a volqueta.	21/11/2024	15/12/2024

1.3.2	Demolición de enchape de pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	21/11/2024	15/12/2024
1.3.3	Demolición de enchapes de piso, incluye trasiego y cargue a volqueta	21/11/2024	15/12/2024
1.3.4	Demolición repello de piso, incluye picado Eprom = 0.03m, incluye trasiego y cargue a volqueta	21/11/2024	15/12/2024
1.3.5	Demolición repello de pared, muros mampostería eprom= 0.02m, incluye trasiegos y cargue a volqueta	21/11/2024	15/12/2024
1.3.6	Cargue, transporte y retiro del material sobrante proveniente de las obras de mantenimiento, hasta el botadero.	28/11/2024	18/12/2024
1.3.7	Demolición de mesones en concreto, recubierto con granito incluye salpicadero	21/11/2024	15/12/2024
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**		
2.1	**RED SUMINISTRO AGUA POTABLE**		
2.1.1	Instalaciones PVC 1/2" RDE 13.5	02/12/2024	18/12/2024
2.1.2	Instalaciones PVC 3/4" RDE 21	02/12/2024	18/12/2024
2.1.3	Instalaciones PVC RDE 21 1"	02/12/2024	18/12/2024
2.1.4	Instalaciones PVC RDE 21 2"	02/12/2024	18/12/2024
2.1.5	Punto hidráulico PVC 1/2"	02/12/2024	18/12/2024
2.1.6	Punto hidráulico PVC 3/4"	02/12/2024	18/12/2024
2.1.7	Punto hidráulico PVC 1/2" incluye válvula control paso 1/2" y tapa PVC Blanca 15x15cm	02/12/2024	18/12/2024
2.2	**RED SANITARIA, PLUVIAL, VENTILACION**		
2.2.1	Instalaciones sanitarias PVC 2"	02/12/2024	18/12/2024
2.2.2	Instalaciones sanitarias PVC 4"	02/12/2024	18/12/2024
2.2.3	Instalaciones ventilación PVC 2"	02/12/2024	18/12/2024
2.2.4	Instalaciones ventilación PVC 3"	02/12/2024	18/12/2024
2.2.5	Punto sanitario 4" WC	02/12/2024	18/12/2024
2.2.6	Punto sanitario 2"	02/12/2024	18/12/2024
2.2.7	Suministro e instalación de rejilla de piso en acero inoxidable cuadrada de 10cm salida a tubería 2"	02/12/2024	18/12/2024
2.2.8	Suministro e instalación de tubería de conexión de desagües de aires acondicionados	02/12/2024	18/12/2024
3	**RED ELECTRICA**		
3.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
3.1.1	S.I.P. Salida toma doble GFCI 1F/20AMP en tubería PVC SCH40 1/2", caja galvanizada y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	09/12/2024	18/12/2024
3.1.2	S.I.P. Salida sensor de movimiento tipo interruptor 360° 1F/15AMP En muro, Tubería PVC SCH40 D:1/2", Cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	09/12/2024	18/12/2024
3.1.3	S.I.P Luminaria de sobreponer 400x120 para uso interior, fabricada en lámina de acero COLD ROLLED, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate y difusor lamina acrílico opalizado L11. Producto para instalación de sobreponer, en temperatura de color 5000K flujo lumínico de 4400Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 28.56W.	09/12/2024	18/12/2024

3.1.4	S.I.P. Luminaria tipo bala 72x83 para incrustar, Producto tipo DOWNLIGHT de uso interior fabricado en aluminio inyectado, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate en temperatura de color 6500K flujo lumínico de 550Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 6.00W.	09/12/2024	18/12/2024
3.1.5	S.I.P Luminaria tipo bala GS 15W 5000K	09/12/2024	18/12/2024
3.1.6	S.I.P Letrero lumínico de emergencia SALIDA 90E 300X185X45 2.6W 120-277V SOBREPONER	09/12/2024	18/12/2024
3.1.7	S.I.P Luminaria de emergencia 185X50X108 SOBREPONER 2-BL 2W	09/12/2024	18/12/2024
3.1.8	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP en techo, Tubería D:1/2" SCH40, Caja octogonal y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	09/12/2024	18/12/2024
3.1.9	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP emergencia, Tubería D:1/2 EMT, Caja RADWELL 5800 y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, incluye fijación, Libre de halogenuros, incluye aparato	09/12/2024	18/12/2024
3.1.10	S.I.A. Tablero de circuitos para baños, incluye 6 protecciones de 20A	09/12/2024	18/12/2024
4	**MUROS**		
4.1	Suministro e instalación de muro doble cara en lámina de fibrocemento 8mm. Estructura base 6. incluye estuco y dos manos de pintura	16/12/2024	29/12/2024
4.2	Carteras en lámina de fibrocemento 8mm dos caras, en marco ventana y puertas	16/12/2024	29/12/2024
5	**REPELLOS**		
5.1	Repello de piso y pared con mortero 1:4 espesor 2cm. Incluye aditivo impermeabilizante.	16/12/2024	29/12/2024
5.2	Impermeabilización de losa de entrepiso y muros laterales de terraza, con recubrimiento impermeabilizante acrílico de alto desempeño con tecnología DFX y fibras para impermeabilizar cubiertas	16/12/2024	29/12/2024
6	**ENCHAPES**		
6.1	**PISOS**		
6.1.1	Enchape cerámica de piso estructurado 20.6x92.6cm, uso comercial moderado	16/12/2024	29/12/2024
6.1.2	Enchape cerámica de piso 60x60cm color gris, uso exteriores tráfico comercial	16/12/2024	29/12/2024
6.1.3	Acabado para uniones entre muro y losa de piso en media caña con mortero 1-4 H: 0,07m	23/12/2024	29/12/2024
6.2	**PARED**		
6.2.1	Enchape cerámica de pared color marfil caras diferenciadas 30.1x75.3cm	16/12/2024	29/12/2024
6.2.2	Guarda canto flecha 8 milímetros cromo aluminio mate	23/12/2024	29/12/2024
6.2.3	Suministro e instalación de espejo E= 3mm flotante biselado en sus cuatro lados sobre soporte metálico	26/12/2024	29/12/2024
6.2.4	Mesón en granito artificial verde uva tuba incluye solapa inferior en aglomerado ancho 50cm con melamina, ancho de mesón 0.60m	19/12/2024	29/12/2024
7	**ESTUCOS**		

7.1	Estuco acrílico para exteriores, incluye juntas, filos y dilataciones	02/12/2024	25/12/2024
7.2	Estuco plástico para muros y resanes incluye juntas, filos y dilataciones	02/12/2024	25/12/2024
8	**PINTURA**		
8.1	Pintura de muros en mampostería 3 manos, vinilo tipo 1, lavable	09/12/2024	31/12/2024
8.2	Pintura para exteriores (3 manos) para paredes.	09/12/2024	31/12/2024
8.3	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial ancho 10cm, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, para pavimento rígido	12/12/2024	25/12/2024
8.4	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial, números con circunferencias de 66 y 40cm para carros y motos. imprimación en negro y pintura tráfico vehicular, incluye micro esferas, para pavimento rígido	12/12/2024	25/12/2024
8.5	Aplicación de pintura en frio base solvente para flechas de ingreso y salida, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, sobre pavimento rígido	12/12/2024	25/12/2024
9	**CARPINTERIAS**		
9.1	Suministro e instalación de puerta de dos hojas batientes elaborada en tubular aluminio estriado ANOLOC, incluye chapa pomo de alcoba metálica pasador y argolla para candado. Medidas de cada hoja 0.9mx2.10m (ver plano A-022, P-T3)	19/12/2024	25/12/2024
9.2	Sellado de juntas entre muros y marcos de ventanería con sellador de juntas de poliuretano.	19/12/2024	25/12/2024
10	**CUBIERTAS Y CIELO RASO**		
10.2	Limpieza, lavado, cambio de amarras y ganchos, aplicación de sellante en amarras de policarbonato alveolar	09/12/2024	22/12/2024
10.3	Suministro e instalación de cielo raso desmontable, láminas de fibra mineral 0,60m x 0,60m, incluye estructura	09/12/2024	22/12/2024
11	**APARATOS SANITARIOS Y DOTACION BAÑOS**		
11.1	Kit Taza sanitaria entrada superior con fluxómetro con sensor, blanco institucional (Incluye Taza Sanitaria para Fluxómetro, asiento sanitario, sensor, sistema conexión entrada superior)	19/12/2024	31/12/2024
11.2	Taza sanitaria alongado, blanco institucional ultra ahorradora (Sanitario con push)	19/12/2024	31/12/2024
11.3	Barra de seguridad Fija Recta en acero inoxidable (baño para personas con movilidad reducida), incluye anclajes	19/12/2024	31/12/2024
11.4	Barra de seguridad abatible (baño para personas con movilidad reducida) incluye anclajes	19/12/2024	31/12/2024
11.5	Lavamanos blanco institucional, para personas con movilidad reducida, incluye anclajes	19/12/2024	31/12/2024
11.6	Lavamanos blanco institucional, para incrustar en mesones	19/12/2024	31/12/2024
11.7	Suministro e instalación de brazo de soporte para lavamanos	19/12/2024	31/12/2024
11.8	Suministro e instalación de grifería para lavamanos y desagüe tipo botella sencillo incluye acople	19/12/2024	31/12/2024

11.9	Construcción lava traperos 70x50x50cm, enchapado.	19/12/2024	31/12/2024
11.10	Kit Orinal arrecife o similar para fluxómetro	19/12/2024	31/12/2024
11.11	Dispensador De Papel Higiénico Acero Inoxidable Diámetro De 26 Cm	19/12/2024	31/12/2024
11.12	Papelera metálica en acero inoxidable según especificaciones	19/12/2024	31/12/2024
11.13	Dispensador de jabón para empotrar en pared, en acero inoxidable, 1.2Litros	19/12/2024	31/12/2024
11.14	Suministro e instalación de divisiones sanitarias a piso en acero inoxidable AISI SAE 304 para baños de uso institucional. Batería completa con tres (3) cubículos para unidades sanitarias. Incluye tornillería y accesorios.	19/12/2024	31/12/2024
11.15	Dispensador De Toallas De Papel En Z Acero Inoxidable De 27x27x10 Cm	19/12/2024	31/12/2024
12	**SEÑALIZACIÓN**		
12.1	Suministro e instalación de placa de señalización de 0,65 x 0,50 m con planimetría salidas de emergencia, en acrílico de 2.4 con impresión full color y regletas en MDF para su instalación.	26/12/2024	31/12/2024
12.2	Suministro e instalación Franjas Guías longitudinales de ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	26/12/2024	31/12/2024
12.3	Suministro e instalación de Punto alerta ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	26/12/2024	31/12/2024
12.4	Suministro e Instalación de Loseta alerta en policarbonato, 20 x 20 cm., Altura total: 5mm, Peso 150 gr, incluye anclaje	26/12/2024	31/12/2024
12.5	Suministro e instalación de letreros luminosos informativos en parqueadero doble cara, ubicado en sótano 1.50x0.40m	26/12/2024	31/12/2024
12.6	Suministro e instalación de letras en acero inoxidable de la frase: PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA y Escudo de la Rama judicial diámetro 50cm, tamaño de letra 30cm cada una, según diseño	26/12/2024	31/12/2024
13	**VARIOS Y ASEO GENERAL**		
13.1	Brigada de aseo	30/12/2024	31/12/2024

TABLA 7. *Programación al contrato de obra.*
Fuente: *Elaboración Propia.*

9. ACTIVIDADES Y CANTIDADES INICIALES

Las actividades para realizarse en condiciones iniciales en la etapa de ejecución se especifican en la siguiente tabla:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1.1	**INICIALES**				
1.1.1	Localización y replanteo arquitectónico, incluye planos récord	M2	332,00	4.020	1.334.640
1.1.2	Instalación y desinstalación de muro una cara drywall, provisional para cerrar las obras, incluye puerta con marco para ingreso de trabajadores	M2	53,00	80.367	4.259.451

1.1.3	Señalización de obra en lona de 60x40cm impresión full color, incluye marco y anclaje	UND	9,00	63.143	568.287
				Sub Total	**6.162.378**
1.2	**DESMONTES Y RETIROS**				
1.2.1	Desmonte de marcos y puertas, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	57,00	27.472	1.565.904
1.2.2	Desmonte de marco, ventana y vidrio, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	1,00	28.472	28.472
1.2.3	Desmonte de cielo raso en fibra mineral y/o panel yeso y/o fibrocemento, incluye estructura soporte, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	M2	250,00	30.983	7.745.750
1.2.4	Desmonte de Tasas sanitarias, orinales y lavamanos, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	UND	48,00	55.750	2.676.000
1.2.5	Desmonte de instalaciones hidrosanitarias, incluye tuberías y accesorios, regatas y sellos provisionales, cargue a volqueta	UND	72,00	60.060	4.324.320
1.2.6	Rasqueteo, cepillo y limpieza manual de superficies, con el fin de retirar impurezas y capas de pintura existentes.	M2	1017,00	5.059	5.145.003
1.2.7	Retiro de luminarias ubicadas en cielos rasos y pared, incluye trasiego a punto de acopio	UND	46,00	22.534	1.036.564
1.2.8	Retiro de redes eléctricas en piso, techo y pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	GL	1,00	2.323.710	2.323.710
				Sub Total	**24.845.723**
1.3	**DEMOLICIONES**				
1.3.1	Demolición muro E ≤ 15CM en mampostería maciza o hueca, incluye cortes con pulidora, trasiegos y cargue a volqueta.	M2	220,00	18.665	4.106.300
1.3.2	Demolición de enchape de pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	704,36	15.356	10.816.214
1.3.3	Demolición de enchapes de piso, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	283,00	14.544	4.115.952
1.3.4	Demolición repello de piso, incluye picado Eprom = 0.03m, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	835,00	13.482	11.257.470
1.3.5	Demolición repello de pared, muros mampostería eprom= 0.02m, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	291,80	15.728,53	4.589.649
1.3.6	Cargue, transporte y retiro del material sobrante proveniente de las obras de mantenimiento, hasta el botadero.	M3	234,00	41.793	9.779.562
1.3.7	Demolición de mesones en concreto, recubierto con granito incluye salpicadero	M2	11,00	39.245	431.695
				Sub Total	**45.096.842**
				TOTAL PRELIMINARES	**76.104.943**
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
2.1	**RED SUMINISTRO AGUA POTABLE**				
2.1.1	Instalaciones PVC 1/2" RDE 13.5	ML	95,00	7.881	748.695
2.1.2	Instalaciones PVC 3/4" RDE 21	ML	28,00	11.381	318.668
2.1.3	Instalaciones PVC RDE 21 1"	ML	50,21	12.524	628.830
2.1.4	Instalaciones PVC RDE 21 2"	ML	6,00	28.037	168.222
2.1.5	Punto hidráulico PVC 1/2"	UND	60,00	25.150	1.509.000
2.1.6	Punto hidráulico PVC 3/4"	UND	8,00	27.387	219.096

2.1.7	Punto hidráulico PVC 1/2" incluye válvula control paso 1/2" y tapa PVC Blanca 15x15cm	UND	18,00	62.356	1.122.408
				Sub Total	**4.714.919**
2.2	**RED SANITARIA, PLUVIAL, VENTILACION**				
2.2.1	Instalaciones sanitarias PVC 2"	ML	58,00	26.100	1.513.800
2.2.2	Instalaciones sanitarias PVC 4"	ML	119,00	43.702	5.200.538
2.2.3	Instalaciones ventilación PVC 2"	ML	183,00	21.009	3.844.647
2.2.4	Instalaciones ventilación PVC 3"	ML	35,00	32.923	1.152.305
2.2.5	Punto sanitario 4" WC	UND	32,00	47.820	1.530.240
2.2.6	Punto sanitario 2"	UND	44,00	35.262	1.551.528
2.2.7	Suministro e instalación de rejilla de piso en acero inoxidable cuadrada de 10cm salida a tubería 2"	UND	24,00	50.333	1.207.992
2.2.8	Suministro e instalación de tubería de conexión de desagües de aires acondicionados	ML	36,00	21.009	756.324
				Sub Total	**16.757.374**
				TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	**21.472.293**
3	**RED ELECTRICA**				
3.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
3.1.1	S.I.P. Salida toma doble GFCI 1F/20AMP en tubería PVC SCH40 1/2", caja galvanizada y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	16,00	178.052	2.848.832
3.1.2	S.I.P. Salida sensor de movimiento tipo interruptor 360° 1F/15AMP En muro, Tubería PVC SCH40 D:1/2", Cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	32,00	144.299	4.617.568
3.1.3	S.I.P Luminaria de sobreponer 400x120 para uso interior, fabricada en lámina de acero COLD ROLLED, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate y difusor lamina acrílico opalizado L11. Producto para instalación de sobreponer, en temperatura de color 5000K flujo lumínico de 4400Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 28.56W.	UND	4,00	441.238	1.764.952
3.1.4	S.I.P. Luminaria tipo bala 72x83 para incrustar, Producto tipo DOWNLIGHT de uso interior fabricado en aluminio inyectado, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate en temperatura de color 6500K flujo lumínico de 550Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 6.00W.	UND	40,00	67.839	2.713.560
3.1.5	S.I.P Luminaria tipo bala GS 15W 5000K	UND	12,00	150.791	1.809.492
3.1.6	S.I.P Letrero lumínico de emergencia SALIDA 90E 300X185X45 2.6W 120-277V SOBREPONER	UND	20,00	111.758	2.235.160
3.1.7	S.I.P Luminaria de emergencia 185X50X108 SOBREPONER 2-BL 2W	UND	40,00	117.027	4.681.080
3.1.8	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP en techo, Tubería D:1/2" SCH40, Caja octogonal y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	66,00	127.969	8.445.954
3.1.9	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP emergencia, Tubería D:1/2 EMT, Caja RADWELL 5800 y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T,	UND	45,00	185.338	8.340.210

	incluye fijación, Libre de halogenuros, incluye aparato				
3.1.10	S.I.A. Tablero de circuitos para baños, incluye 6 protecciones de 20A	UND	4,00	860.000	3.440.000
				Sub Total	**40.896.808**
				TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS	**40.896.808**
4	**MUROS**				
4.1	Suministro e instalación de muro doble cara en lámina de fibrocemento 8mm. Estructura base 6. incluye estuco y dos manos de pintura	M2	84,00	178.468	14.991.312
4.2	Carteras en lámina de fibrocemento 8mm dos caras, en marco ventana y puertas	ML	163,80	71.565	11.722.347
				Sub Total	**26.713.659**
				TOTAL MAMPOSTERIA	**26.713.659**
5	**REPELLOS**				
5.1	Repello de piso y pared con mortero 1:4 espesor 2cm. Incluye aditivo impermeabilizante.	M2	1374,87	46.194	63.510.837
5.2	Impermeabilización de losa de entrepiso y muros laterales de terraza, con recubrimiento impermeabilizante acrílico de alto desempeño con tecnología DFX y fibras para impermeabilizar cubiertas	M2	660,00	53.308	35.183.280
				Sub Total	**98.694.117**
				TOTAL REPELLOS	**98.694.117**
6	**ENCHAPES**				
6.1	**PISOS**				
6.1.1	Enchape cerámica de piso estructurado 20.6x92.6cm, uso comercial moderado	M2	258,00	137.958	35.593.164
6.1.2	Enchape cerámica de piso 60x60cm color gris, uso exteriores tráfico comercial	M2	88,00	104.329	9.180.952
6.1.3	Acabado para uniones entre muro y losa de piso en media caña con mortero 1-4 H: 0,07m	ML	85,00	28.430	2.416.550
				Sub Total	**7.190.666**
6.2	**PARED**				
6.2.1	Enchape cerámica de pared color marfil caras diferenciadas 30.1x75.3cm	M2	457,00	118.370	54.095.090
6.2.2	Guarda canto flecha 8 milímetros cromo aluminio mate	ML	31,00	13.512	418.872
6.2.3	Suministro e instalación de espejo E= 3mm flotante biselado en sus cuatro lados sobre soporte metálico	M2	20,00	376.443	7.528.860
6.2.4	Mesón en granito artificial verde uva tuba incluye solapa inferior en aglomerado ancho 50cm con melamina, ancho de mesón 0.60m	ML	17,00	1.193.000	20.281.000
				Sub Total	**2.323.822**
				TOTAL ENCHAPES	**129.514.488**
7	**ESTUCOS**				
7.1	Estuco acrílico para exteriores, incluye juntas, filos y dilataciones	M2	320,00	22.628	7.240.960

7.2	Estuco plástico para muros y resanes incluye juntas, filos y dilataciones	M2	973,00	17.313	16.845.549
				Sub Total	**24.086.509**
				TOTAL ESTUCOS	**24.086.509**
8	**PINTURA**				
8.1	Pintura de muros en mampostería 3 manos, vinilo tipo 1, lavable	M2	5137,00	13.301	68.327.237
8.2	Pintura para exteriores (3 manos) para paredes.	M2	1280,00	28.775	36.832.000
8.3	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial ancho 10cm, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, para pavimento rígido	ML	173,52	15.000	2.602.800
8.4	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial, números con circunferencias de 66 y 40cm para carros y motos. imprimación en negro y pintura tráfico vehicular, incluye micro esferas, para pavimento rígido	UND	42,00	32.000	1.344.000
8.5	Aplicación de pintura en frio base solvente para flechas de ingreso y salida, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, sobre pavimento rígido	M2	27,00	62.000	1.674.000
				Sub Total	**110.780.037**
				TOTAL PINTURA	**110.780.037**
9	**CARPINTERIAS**				
9.1	Suministro e instalación de puerta de dos hojas batientes elaborada en tubular aluminio estriado ANOLOC, incluye chapa pomo de alcoba metálica pasador y argolla para candado. Medidas de cada hoja 0.9mx2.10m (ver plano A-022, P-T3)	UND	1,00	2.469.971	2.469.971
9.2	Sellado de juntas entre muros y marcos de ventanería con sellador de juntas de poliuretano.	ML	367,00	11.494	4.218.298
				Sub Total	**6.688.269**
				TOTAL CARPINTERIAS	**6.688.269**
10	**CUBIERTAS Y CIELO RASO**				
10.2	Limpieza, lavado, cambio de amarras y ganchos, aplicación de sellante en amarras de policarbonato alveolar	M2	33,00	34.060	1.123.980
10.3	Suministro e instalación de cielo raso desmontable, láminas de fibra mineral 0,60m x 0,60m, incluye estructura	M2	220,00	92.868	20.430.960
				Sub Total	**21.554.940**
				TOTAL CUBIERTAS Y CIELO RASO	**21.554.940**
11	**APARATOS SANITARIOS Y DOTACION BAÑOS**				
11.1	Kit Taza sanitaria entrada superior con fluxómetro con sensor, blanco institucional (Incluye Taza Sanitaria para Fluxómetro, asiento sanitario, sensor, sistema conexión entrada superior)	UND	4	3.931.160	15.724.640
11.2	Taza sanitaria alongado, blanco institucional ultra ahorradora (Sanitario con push)	UND	28	1.278.084	35.786.352
11.3	Barra de seguridad Fija Recta en acero inoxidable (baño para personas con movilidad reducida), incluye anclajes	UND	4	482.550	1.930.200
11.4	Barra de seguridad abatible (baño para personas con movilidad reducida) incluye anclajes	UND	4	667.550	2.670.200

11.5	Lavamanos blanco institucional, para personas con movilidad reducida, incluye anclajes	UND	4	575.674	2.302.696
11.6	Lavamanos blanco institucional, para incrustar en mesones	UND	20	341.287	6.825.740
11.7	Suministro e instalación de brazo de soporte para lavamanos	JUEGO	4	300.000	1.200.000
11.8	Suministro e instalación de grifería para lavamanos y desagüe tipo botella sencillo incluye acople	UND	24	64.635	1.551.240
11.9	Construcción lava traperos 70x50x50cm, enchapado.	UND	4	647.450	2.589.800
11.10	Kit Orinal arrecife o similar para fluxómetro	UND	8	1.336.000	10.688.000
11.11	Dispensador De Papel Higiénico Acero Inoxidable Diámetro De 26 Cm	UND	16	163.813	2.621.008
11.12	Papelera metálica en acero inoxidable según especificaciones	UND	32	551.813	17.658.016
11.13	Dispensador de jabón para empotrar en pared, en acero inoxidable, 1.2Litros	UND	16	263.643	4.218.288
11.14	Suministro e instalación de divisiones sanitarias a piso en acero inoxidable AISI SAE 304 para baños de uso institucional. Batería completa con tres (3) cubículos para unidades sanitarias. Incluye tornillería y accesorios.	UND	8,00	8.760.190	70.081.520
11.15	Dispensador De Toallas De Papel En Z Acero Inoxidable De 27x27x10 Cm	UND	16,00	193.813	3.101.008
				Sub Total	**178.948.708**
				TOTAL APARATOS SANITARIOS	**178.948.708**
12	**SEÑALIZACIÓN**				
12.1	Suministro e instalación de placa de señalización de 0,65 x 0,50 m con planimetría salidas de emergencia, en acrílico de 2.4 con impresión full color y regletas en MDF para su instalación.	UND	5,00	238.429	1.192.145
12.2	Suministro e instalación Franjas Guías longitudinales de ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	600,00	11.158	6.694.800
12.3	Suministro e instalación de Punto alerta ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	2100,00	5.886	12.360.600
12.4	Suministro e Instalación de Loseta alerta en policarbonato, 20 x 20 cm., Altura total: 5mm, Peso 150 gr, incluye anclaje	UND	15,00	45.015	675.225
12.5	Suministro e instalación de letreros luminosos informativos en parqueadero doble cara, ubicado en sótano 1.50x0.40m	UND	3,00	600.000	1.800.000
12.6	Suministro e instalación de letras en acero inoxidable de la frase: PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA y Escudo de la Rama judicial diámetro 50cm, tamaño de letra 30cm cada una, según diseño	UND	1,00	6.000.000	6.000.000
				Sub Total	**28.722.770**
				TOTAL SEÑALIZACIÓN	**28.722.770**
13	**VARIOS Y ASEO GENERAL**				
13.1	Brigada de aseo	PERSONA /MES	6,00	2.397.504	14.385.024
				Sub Total	**14.385.024**
				TOTAL VARIOS Y ASEO	**14.385.024**
				TOTAL COSTO DIRECTO:	778.562.565

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

ADMINISTRACIÓN (18.73%)	145.824.768
IMPREVISTOS (3%)	23.356.877
UTILIDAD (5%)	38.928.128
IVA (19%)	7.396.344
TOTAL, PRESUPUESTO:	**994.068.682**

TABLA 8. *Cantidades iniciales del contrato de obra.*
Fuente: *Elaboración Propia.*

10. ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS EN EL MES

En este periodo se registró un avance por debajo de lo programado inicialmente de actividades físicas, por lo tanto, se informa de un avance acumulado ejecutado del 2,86% que corresponde a una inversión de $20.565.307,00 un porcentaje programado acumulado de 27.93% que corresponde a una inversión de $ 260.045.112 con respecto del valor contratado.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT EJECUTADAS	VR TOTAL EJECUTADAS
1	**PRELIMINARES**						
1.1	**INICIALES**						
1.1.1	Localización y replanteo arquitectónico, incluye planos récord	M2	332,00	4.020	1.334.640	0,00	
1.1.2	Instalación y desinstalación de muro una cara drywall, provisional para cerrar las obras, incluye puerta con marco para ingreso de trabajadores	M2	53,00	80.367	4.259.451	0,00	
1.1.3	Señalización de obra en lona de 60x40cm impresión full color, incluye marco y anclaje	UND	9,00	63.143	568.287	0,00	
				Sub Total	**6.162.378**		**0.00**
1.2	**DESMONTES Y RETIROS**						
1.2.1	Desmonte de marcos y puertas, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	57,00	27.472	1.565.904	0,00	
1.2.2	Desmonte de marco, ventana y vidrio, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	1,00	28.472	28.472	0,00	
1.2.3	Desmonte de cielo raso en fibra mineral y/o panel yeso y/o fibrocemento, incluye estructura soporte, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	M2	250,00	30.983	7.745.750	250,00	7.445.250
1.2.4	Desmonte de Tasas sanitarias, orinales y lavamanos, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	UND	48,00	55.750	2.676.000	48,00	2.572.176

1.2.5	Desmonte de instalaciones hidrosanitarias, incluye tuberías y accesorios, regatas y sellos provisionales, cargue a volqueta	UND	72,00	60.060	4.324.320	70,00	4.041.100
1.2.6	Rasqueteo, cepillo y limpieza manual de superficies, con el fin de retirar impurezas y capas de pintura existentes.	M2	1017,00	5.059	5.145.003	1.017,	4.945.671
1.2.7	Retiro de luminarias ubicadas en cielos rasos y pared, incluye trasiego a punto de acopio	UND	46,00	22.534	1.036.564	46,00	996.360
1.2.8	Retiro de redes eléctricas en piso, techo y pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	GL	1,00	2.323.710	2.323.710	0,00	
				Sub Total	**24.845.723**		**23.713.804**
1.3	**DEMOLICIONES**						
1.3.1	Demolición muro E ≤ 15CM en mampostería maciza o hueca, incluye cortes con pulidora, trasiegos y cargue a volqueta.	M2	220,00	18.665	4.106.300	0,00	
1.3.2	Demolición de enchape de pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	704,36	15.356	10.816.214	648,12	9.566.251
1.3.3	Demolición de enchapes de piso, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	283,00	14.544	4.115.952	0,00	
1.3.4	Demolición repello de piso, incluye picado Eprom = 0.03m, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	835,00	13.482	11.257.470	208.00	2.695.472
1.3.5	Demolición repello de pared, muros mampostería eprom= 0.02m, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	291,80	15.728,53	4.589.649	291,00	4.399.629
1.3.6	Cargue, transporte y retiro del material sobrante proveniente de las obras de mantenimiento, hasta el botadero.	M3	234,00	41.793	9.779.562	204,00	8.194.884
1.3.7	Demolición de mesones en concreto, recubierto con granito incluye salpicadero	M2	11,00	39.245	431.695	0,00	
				Sub Total	**45.096.842**		**30.406.594**
				TOTAL PRELIMINARES	**76.104.943**		**57.135.049**
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**						
2.1	**RED SUMINISTRO AGUA POTABLE**						
2.1.1	Instalaciones PVC 1/2" RDE 13.5	ML	95,00	7.881	748.695		
2.1.2	Instalaciones PVC 3/4" RDE 21	ML	28,00	11.381	318.668		
2.1.3	Instalaciones PVC RDE 21 1"	ML	50,21	12.524	628.830		
2.1.4	Instalaciones PVC RDE 21 2"	ML	6,00	28.037	168.222		
2.1.5	Punto hidráulico PVC 1/2"	UND	60,00	25.150	1.509.000		
2.1.6	Punto hidráulico PVC 3/4"	UND	8,00	27.387	219.096		
2.1.7	Punto hidráulico PVC 1/2" incluye válvula control paso 1/2" y tapa PVC Blanca 15x15cm	UND	18,00	62.356	1.122.408		
				Sub Total	**4.714.919**		**0.00**
2.2	**RED SANITARIA, PLUVIAL, VENTILACION**						
2.2.1	Instalaciones sanitarias PVC 2"	ML	58,00	26.100	1.513.800		

2.2.2	Instalaciones sanitarias PVC 4"	ML	119,00	43.702	5.200.538		
2.2.3	Instalaciones ventilación PVC 2"	ML	183,00	21.009	3.844.647		
2.2.4	Instalaciones ventilación PVC 3"	ML	35,00	32.923	1.152.305		
2.2.5	Punto sanitario 4" WC	UND	32,00	47.820	1.530.240		
2.2.6	Punto sanitario 2"	UND	44,00	35.262	1.551.528		
2.2.7	Suministro e instalación de rejilla de piso en acero inoxidable cuadrada de 10cm salida a tubería 2"	UND	24,00	50.333	1.207.992		
2.2.8	Suministro e instalación de tubería de conexión de desagües de aires acondicionados	ML	36,00	21.009	756.324		
				Sub Total	**16.757.374**		**0.00**
				TOTAL, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	**21.472.293**		**0.00**
3	**RED ELECTRICA**						
3.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						
3.1.1	S.I.P. Salida toma doble GFCI 1F/20AMP en tubería PVC SCH40 1/2", caja galvanizada y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	16,00	178.052	2.848.832		
3.1.2	S.I.P. Salida sensor de movimiento tipo interruptor 360° 1F/15AMP En muro, Tubería PVC SCH40 D:1/2", Cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	32,00	144.299	4.617.568		
3.1.3	S.I.P Luminaria de sobreponer 400x120 para uso interior, fabricada en lámina de acero COLD ROLLED, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate y difusor lamina acrílico opalizado L11. Producto para instalación de sobreponer, en temperatura de color 5000K flujo lumínico de 4400Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 28.56W.	UND	4,00	441.238	1.764.952		
3.1.4	S.I.P. Luminaria tipo bala 72x83 para incrustar, Producto tipo DOWNLIGHT de uso interior fabricado en aluminio inyectado, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate en temperatura de color 6500K flujo lumínico de 550Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 6.00W.	UND	40,00	67.839	2.713.560		
3.1.5	S.I.P Luminaria tipo bala GS 15W 5000K	UND	12,00	150.791	1.809.492		
3.1.6	S.I.P Letrero lumínico de emergencia SALIDA 90E 300X185X45 2.6W 120-277V SOBREPONER	UND	20,00	111.758	2.235.160		

3.1.7	S.I.P Luminaria de emergencia 185X50X108 SOBREPONER 2-BL 2W	UND	40,00	117.027	4.681.080		
3.1.8	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP en techo, Tubería D:1/2" SCH40, Caja octogonal y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	66,00	127.969	8.445.954		
3.1.9	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP emergencia, Tubería D:1/2 EMT, Caja RADWELL 5800 y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, incluye fijación, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	45,00	185.338	8.340.210		
3.1.10	S.I.A. Tablero de circuitos para baños, incluye 6 protecciones de 20A	UND	4,00	860.000	3.440.000		
				Sub Total	**40.896.808**		
				TOTAL, INSTALACIONES ELECTRICAS	**40.896.808**		
4	**MUROS**						
4.1	Suministro e instalación de muro doble cara en lámina de fibrocemento 8mm. Estructura base 6. incluye estuco y dos manos de pintura	M2	84,00	178.468	14.991.312	84.00	14.409.612
4.2	Carteras en lámina de fibrocemento 8mm dos caras, en marco ventana y puertas	ML	163,80	71.565	11.722.347	73.00	5.021.524
				Sub Total	**26.713.659**		**19.431.136**
				TOTAL, MAMPOSTERIA	**26.713.659**		**19.431.136**
5	**REPELLOS**						
5.1	Repello de piso y pared con mortero 1:4 espesor 2cm. Incluye aditivo impermeabilizante.	M2	1374,87	46.194	63.510.837	474.00	21.046.548
5.2	Impermeabilización de losa de entrepiso y muros laterales de terraza, con recubrimiento impermeabilizante acrílico de alto desempeño con tecnología DFX y fibras para impermeabilizar cubiertas	M2	660,00	53.308	35.183.280		
				Sub Total	**98.694.117**		**21.046.548**
				TOTAL, REPELLOS	**98.694.117**		**21.046.548**
6	**ENCHAPES**						
6.1	**PISOS**						
6.1.1	Enchape cerámica de piso estructurado 20.6x92.6cm, uso comercial moderado	M2	258,00	137.958	35.593.164		
6.1.2	Enchape cerámica de piso 60x60cm color gris, uso exteriores tráfico comercial	M2	88,00	104.329	9.180.952		
6.1.3	Acabado para uniones entre muro y losa de piso en media caña con mortero 1-4 H: 0,07m	ML	85,00	28.430	2.416.550		
				Sub Total	**7.190.666**		
6.2	**PARED**						

6.2.1	Enchape cerámica de pared color marfil caras diferenciadas 30.1x75.3cm	M2	457,00	118.370	54.095.090		
6.2.2	Guarda canto flecha 8 milímetros cromo aluminio mate	ML	31,00	13.512	418.872		
6.2.3	Suministro e instalación de espejo E= 3mm flotante biselado en sus cuatro lados sobre soporte metálico	M2	20,00	376.443	7.528.860		
6.2.4	Mesón en granito artificial verde uva tuba incluye solapa inferior en aglomerado ancho 50cm con melamina, ancho de mesón 0.60m	ML	17,00	1.193.000	20.281.000		
				Sub Total	**2.323.822**		
				TOTAL, ENCHAPES	**129.514.488**		
7	**ESTUCOS**						
7.1	Estuco acrílico para exteriores, incluye juntas, filos y dilataciones	M2	320,00	22.628	7.240.960		
7.2	Estuco plástico para muros y resanes incluye juntas, filos y dilataciones	M2	973,00	17.313	16.845.549	973.00	16.191.693
				Sub Total	**24.086.509**		**16.191.693**
				TOTAL, ESTUCOS	**24.086.509**		**16.191.693**
8	**PINTURA**						
8.1	Pintura de muros en mampostería 3 manos, vinilo tipo 1, lavable	M2	5137,00	13.301	68.327.237	5137.0	65.676.545
8.2	Pintura para exteriores (3 manos) para paredes.	M2	1280,00	28.775	36.832.000		
8.3	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial ancho 10cm, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, para pavimento rígido	ML	173,52	15.000	2.602.800	85.00	7.225
8.4	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial, números con circunferencias de 66 y 40cm para carros y motos. imprimación en negro y pintura tráfico vehicular, incluye micro esferas, para pavimento rígido	UND	42,00	32.000	1.344.000	25.00	625
8.5	Aplicación de pintura en frio base solvente para flechas de ingreso y salida, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, sobre pavimento rígido	M2	27,00	62.000	1.674.000	12.00	144
				Sub Total	**110.780.037**		**65.684.539**
				TOTAL, PINTURA	**110.780.037**		**65.684.539**
9	**CARPINTERIAS**						
9.1	Suministro e instalación de puerta de dos hojas batientes elaborada en tubular aluminio estriado ANOLOC, incluye chapa pomo de alcoba metálica pasador y argolla para candado. Medidas de	UND	1,00	2.469.971	2.469.971		

	cada hoja 0.9mx2.10m (ver plano A-022, P-T3)						
9.2	Sellado de juntas entre muros y marcos de ventanería con sellador de juntas de poliuretano.	ML	367,00	11.494	4.218.298		
				Sub Total	**6.688.269**		
				TOTAL, CARPINTERIAS	**6.688.269**		
10	**CUBIERTAS Y CIELO RASO**						
10.2	Limpieza, lavado, cambio de amarras y ganchos, aplicación de sellante en amarras de policarbonato alveolar	M2	33,00	34.060	1.123.980		
10.3	Suministro e instalación de cielo raso desmontable, láminas de fibra mineral 0,60m x 0,60m, incluye estructura	M2	220,00	92.868	20.430.960		
				Sub Total	**21.554.940**		
				TOTAL, CUBIERTAS Y CIELO RASO	**21.554.940**		
11	**APARATOS SANITARIOS Y DOTACION BAÑOS**						
11.1	Kit Taza sanitaria entrada superior con fluxómetro con sensor, blanco institucional (Incluye Taza Sanitaria para Fluxómetro, asiento sanitario, sensor, sistema conexión entrada superior)	UND	4	3.931.160	15.724.640		
11.2	Taza sanitaria alongado, blanco institucional ultra ahorradora (Sanitario con push)	UND	28	1.278.084	35.786.352		
11.3	Barra de seguridad Fija Recta en acero inoxidable (baño para personas con movilidad reducida), incluye anclajes	UND	4	482.550	1.930.200		
11.4	Barra de seguridad abatible (baño para personas con movilidad reducida) incluye anclajes	UND	4	667.550	2.670.200		
11.5	Lavamanos blanco institucional, para personas con movilidad reducida, incluye anclajes	UND	4	575.674	2.302.696		
11.6	Lavamanos blanco institucional, para incrustar en mesones	UND	20	341.287	6.825.740		
11.7	Suministro e instalación de brazo de soporte para lavamanos	JUEGO	4	300.000	1.200.000		
11.8	Suministro e instalación de grifería para lavamanos y desagüe tipo botella sencillo incluye acople	UND	24	64.635	1.551.240		
11.9	Construcción lava traperos 70x50x50cm, enchapado.	UND	4	647.450	2.589.800		
11.10	Kit Orinal arrecife o similar para fluxómetro	UND	8	1.336.000	10.688.000		
11.11	Dispensador De Papel Higiénico Acero Inoxidable Diámetro De 26 Cm	UND	16	163.813	2.621.008		

11.12	Papelera metálica en acero inoxidable según especificaciones	UND	32	551.813	17.658.016		
11.13	Dispensador de jabón para empotrar en pared, en acero inoxidable, 1.2Litros	UND	16	263.643	4.218.288		
11.14	Suministro e instalación de divisiones sanitarias a piso en acero inoxidable AISI SAE 304 para baños de uso institucional. Batería completa con tres (3) cubículos para unidades sanitarias. Incluye tornillería y accesorios.	UND	8,00	8.760.190	70.081.520		
11.15	Dispensador De Toallas De Papel En Z Acero Inoxidable De 27x27x10 Cm	UND	16,00	193.813	3.101.008		
				Sub Total	**178.948.708**		
				TOTAL, APARATOS SANITARIOS	**178.948.708**		
12	**SEÑALIZACIÓN**						
12.1	Suministro e instalación de placa de señalización de 0,65 x 0,50 m con planimetría salidas de emergencia, en acrílico de 2.4 con impresión full color y regletas en MDF para su instalación.	UND	5,00	238.429	1.192.145		
12.2	Suministro e instalación Franjas Guías longitudinales de ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	600,00	11.158	6.694.800		
12.3	Suministro e instalación de Punto alerta ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	2100,00	5.886	12.360.600		
12.4	Suministro e Instalación de Loseta alerta en policarbonato, 20 x 20 cm., Altura total: 5mm, Peso 150 gr, incluye anclaje	UND	15,00	45.015	675.225		
12.5	Suministro e instalación de letreros luminosos informativos en parqueadero doble cara, ubicado en sótano 1.50x0.40m	UND	3,00	600.000	1.800.000		
12.6	Suministro e instalación de letras en acero inoxidable de la frase: PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA y Escudo de la Rama judicial diámetro 50cm, tamaño de letra 30cm cada una, según diseño	UND	1,00	6.000.000	6.000.000		
				Sub Total	**28.722.770**		
				TOTAL, SEÑALIZACIÓN	**28.722.770**		
13	**VARIOS Y ASEO GENERAL**						
13.1	Brigada de aseo	PERSONA/MES	6,00	2.397.504	14.385.024	2	11.522.405
				Sub Total	**14.385.024**		
				TOTAL, VARIOS Y ASEO	**14.385.024**		**11.522.405**
				TOTAL, COSTO DIRECTO:	778.562.565		203.639.417
				ADMINISTRACIÓN (18.73%)	145.824.768		38.147.282
				IMPREVISTOS (3%)	23.356.877		6.110.083

UTILIDAD (5%)	38.928.128		10.183.471
IVA (19%)	7.396.344		1.934.859
TOTAL, PRESUPUESTO:	**994.068.682**		**$260.045.112**

TABLA 9. *Cantidades ejecutadas del contrato de obra.*
Fuente: *Elaboración Propia.*

11. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Previo al inicio de la ejecución de las labores de obra, se realizó el día 14 de noviembre del 2024 la suscripción del acta de inicio de la interventoría y obra en la ciudad de Pasto departamento de Nariño.

Por otra parte 12 de noviembre del 2023 se realizó socialización del proyecto del Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.6947019 del 29 de octubre 2024, contando con la presencia de la el señor Eduardo Manrique Pinzón, representante legal de COINCO S.A.S en calidad de Contratista de obra, el señor Allan Edward Sánchez Quiceno en calidad de Interventor, el señor Luis Humberto Paz Timaná, en calidad de Director Ejecutivo de Administración Judicial Pasto y Diana María Vivanco Burbano profesional de la Dirección Seccional Pasto, en calidad de líder del Proyecto, en las instalaciones del palacio de justicia, con el objetivo de informar a los asistentes sobre el objeto y generalidades del proyecto como la parte contractual.

Las obras se vienen ejecutando se efectúan de acuerdo con las especificaciones técnicas indicadas en el proyecto y a los diseños y planos suministrados por la entidad. A continuación, se resume las actividades que se llevaron a cabo entre el 1 de febrero al 28 de febrero del 2025.

11.1 CAPÍTULO 1 PRELIMINARES

ítem 1.2.3 Desmonte de cielo raso en fibra mineral y/o panel yeso y/o fibrocemento, incluye estructura soporte, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta:
se realizó al desmonte de todos los elementos que constituyen el cielo raso como son las láminas, perfiles y demás accesorios que lo constituyen, incluyendo el retiro de los escombros o residuos generados.

	
Foto 1: Desmonte de cielo raso.	***Foto 2: Desmonte de cielo raso.***

Imagen 10: *Desmonte de cielo raso.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 1.2.4 Desmonte de Tasas sanitarias, orinales y lavamanos, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta:

se realizó al retiro de aparatos sanitarios incluyendo accesorios, tanques de agua y tuberías de conexión y desagüe. Debe tenerse en cuenta el conjunto de operaciones para soltar las conexiones de agua. Habiendo cerrado el registro de agua para no contar con paso de esta hacia los aparatos sanitarios se retira el ACOFLEX sanitario o manguera que permite el paso de agua. Sellar la salida hidráulica con tapones PVC con diámetro correspondientes según le requiera. (1/2" normalmente) Desmontar accesorios tanque y tuberías de desagüe. Sellar con un tapón de inspección la salida sanitaria o desagüe.

	
Foto 1: Desmonte de tasas sanitarias, orinales y lavamanos.	***Foto 2: Desmonte tasas sanitarias, orinales y lavamanos.***

Imagen 11: *Desmonte de tasas sanitarias, orinales y lavamanos.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 1.2.5 Desmonte de instalaciones hidrosanitarias, incluye tuberías y accesorios, regatas y sellos provisionales, cargue a volqueta:

se realizó desmonte y desarmado de redes existentes y serán retiradas adecuadamente. Protección de las redes en uso, tales como hidrosanitarias, pluviales de ventilación y aguas lluvias. La protección consiste, en evitar los golpes y daños a las redes en uso, para que las mismas sigan funcionando, posterior a la construcción de la nueva cubierta. Acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Se deben tomar todas las precauciones necesarias, para evitar daños en las instalaciones hidrosanitarias y redes contra incendios funcionales, que no se van a retirar. Los materiales objeto de retiro que se encuentren en buen estado, serán de propiedad de la rama judicial y serán acopiados en el punto que la entidad defina.



Foto 1: Desmonte de instalaciones hidrosanitarias.



Foto 2: Desmonte de instalaciones hidrosanitarias.

Imagen 12: *Desmonte de instalaciones hidrosanitarias.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 1.2.6 Rasqueteo, cepillo y limpieza manual de superficies, con el fin de retirar impurezas y capas de pintura existentes:

se realizó retiro y remoción de estuco y pintura en mal estado o afectados por la humedad de manera manual.



Foto 1: Desmonte de instalaciones hidrosanitarias.



Foto 2: Desmonte de instalaciones hidrosanitarias.

Imagen 13: *Desmonte de instalaciones hidrosanitarias.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 1.2.7 Retiro de luminarias ubicadas en cielos rasos y pared, incluye trasiego a punto de acopio:

Se identifica las luminarias a retirar, con interventoría y previa revisión de su correcto funcionamiento. Reconocer el tablero de circuitos. Retirar el aparato eléctrico sea cuadrado, rectangular o redondo. Desconectar el cableado que alimenta la luminaria. Cerrar los cables expuestos con cinta aislante o terminales electros de manera suficiente, que impida el contacto del cobre con cualquier elemento. Acopiar las lámparas en un lugar seguro, que impida el contacto con materiales o personas que puedan generar daños a la lámpara. Una vez se haga el montaje del nuevo cielo raso, establecer la nueva instalación de los paneles según su ubicación. Instalar las luminarias de manera técnica.

	
Foto 1: Desmonte de luminarias.	***Foto 2: Desmonte de luminarias.***

Imagen 14: *Desmonte de luminarias.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 1.3.2 Demolición de enchape de pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta:

se realiza remoción y retiro de enchapes ubicados en pared de baños, sin daño a las estructuras que cubren, cuidando los elementos estructurales, elementos no estructurales, puertas, ventanas y todos los elementos que integran la educación, que puedan ser afectados con el retiro de este material de recubrimiento.

	
Foto 1: Demolicion enchape de pared.	***Foto 2: Demolicion enchape de pared.***

Imagen 15: *Demolición enchape de pared.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 1.3.4 Demolición repello de piso, incluye picado Eprom = 0.03m, incluye trasiego y cargue a volqueta:

se realiza demolición y retiro de morteros, refriéndose a pañetes o repellos, que se encuentran adheridos a los diferentes elementos que integran la edificación y que se han visto afectados por las condiciones climáticas, nivel freáticos y condensación de aire, así como el retiro de materiales cerámicos. En esta actividad el contratista debe garantizar la recolección y el retiro de materiales que resulten de esta actividad.

	
Foto 1: Demolicion repello de pisos.	***Foto 2: Demolicion repello de pisos.***

Imagen 16: *Demolición repello de pisos.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 1.3.5 Demolición repello de pared, incluye picado Eprom = 0.03m, incluye trasiego y cargue a volqueta:

se realiza demolición y retiro de morteros, refriéndose a pañetes o repellos, que se encuentran adheridos a los diferentes elementos que integran la edificación y que se han visto afectados por las condiciones climáticas, nivel freáticos y condensación de aire, así como el retiro de materiales cerámicos.

En esta actividad el contratista debe garantizar la recolección y el retiro de materiales que resulten de esta actividad.



Foto 1: Demolicion repello de pared.



Foto 2: Demolicion repello de pared.

Imagen 17: *Demolición repello de pared.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 1.3.6 Cargue, transporte y retiro del material sobrante proveniente de las obras de mantenimiento, hasta el botadero:

se realiza Cargue, transporte y retiro de los materiales sobrantes de las obras de mantenimiento de la infraestructura física, hacia el botadero oficial. Medido en sitio.



Foto 1: Cargue, transporte y retiro.



Foto 2: Cargue, transporte y retiro.

Imagen 18: *Cargue, transporte y retiro.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 4.1 Suministro e instalación de muro doble cara en lámina de fibrocemento 8mm. Estructura base 6. incluye estuco y dos manos de pintura:

Consultar planos arquitectónicos y de detalle. Se marca la posición exacta donde se colocarán los perfiles y elementos de soporte según lo indique el fabricante. Se fijan los perfiles a la estructura dependiendo de donde quede ubicado el muro, mediante clavo de impacto o clavo de acero con chazo.

Si es necesario se deberá rigidizar la estructura mediante platinas u otros elementos. Consultar recomendaciones del fabricante. Debe preverse el pase de las tuberías hidráulicas, sanitarias y eléctricas a través de los perfiles y láminas; para ello debe procurarse la disposición de los perfiles en el mismo sentido, con el fin de que los orificios de estos perfiles coincidan, y faciliten la colocación de estas instalaciones. Previamente a la instalación de las placas se debe marcar la ubicación de los tornillos sobre las mismas, estos deben ubicarse con una separación máxima de 30cm entre sí en los bordes de las placas según recomendaciones del fabricante. Se procede a medir y a cortar las placas, para ser instaladas y fijadas. El corte de las placas podrá realizarse por medios mecánicos, lo usual es realizarlo con cortadora manual. Las placas se fijan a la perfilería por medio de tornillos autoperforantes. Los tornillos auto- perforantes deberán quedar espaciados en la placa máximo 30cm. Se aconseja para la correcta fijación de los tornillos utilizar un atornillador eléctrico (nunca un taladro), pues el atornillador obtiene las revoluciones adecuadas para una óptima fijación, y además posee un dispositivo de tope que permite regular la profundidad exacta a la cual el tornillo debe penetrar en la placa. La cabeza del tornillo no debe sobresalir de la superficie de la placa; debe quedar ligeramente hundido para el posterior resane con mastique de dichos puntos. Para lograr este procedimiento se deberá avellanar unos 2mm la placa superboard con broca de tungsteno de 5/16" ó 3/8". Los bordes de las placas en las juntas deben quedar al mismo nivel. Cuando se fijen dos placas al mismo perfil, sus bordes deben coincidir con el eje del perfil. Una vez instaladas y fijadas las placas se procede a sellar las juntas mediante la aplicación de mastique o similar y posterior colocación de la cinta. Cubrir los tornillos y juntas con masilla en capar delgadas con llana y finalmente corregir las imperfecciones con lija. Para el acabado final liso para la instalación de enchapes y/o pintura sea el caso, Verificar acabado final para aceptación.



Foto 1: Suministro e instalacion de muro.



Foto 2: Suministro e instalacion de muro.

Imagen 19: Suministro e instalacion de muro.
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 4.2 Carteras en lámina de fibrocemento 8mm dos caras, en marco ventana y puertas:

Consultar planos arquitectónicos y de detalle. Se marca la posición exacta donde se colocarán los perfiles y elementos de soporte según lo indique el fabricante. Se fijan los perfiles a la estructura dependiendo de donde quede ubicado el muro, mediante clavo de impacto o clavo de acero con chazo. Si es necesario se deberá rigidizar la estructura mediante platinas u otros elementos. Consultar recomendaciones del fabricante. Debe preverse el pase de las tuberías hidráulicas, sanitarias y eléctricas a través de los perfiles y láminas; para ello debe procurarse la disposición de los perfiles en el mismo sentido, con el fin de que los orificios de estos perfiles coincidan, y faciliten la colocación de estas instalaciones. Previamente a la instalación de las placas se debe marcar la ubicación de los tornillos sobre las mismas, estos deben ubicarse con una separación máxima de 30cm entre sí en los bordes de las placas según recomendaciones del fabricante. Se procede a medir y a cortar las placas, para ser instaladas y fijadas. El corte de las placas podrá realizarse por medios mecánicos, lo usual es realizarlo con cortadora manual. Las placas se fijan a la perfilería por medio de tornillos autoperforantes. Los tornillos auto- perforantes deberán quedar espaciados en la placa máximo 30cm. Se aconseja para la correcta fijación de los tornillos utilizar un atornillador eléctrico (nunca un taladro), pues el atornillador obtiene las revoluciones adecuadas para una óptima fijación, y además posee un dispositivo de tope que permite regular la profundidad exacta a la cual el tornillo debe penetrar en la placa. La cabeza del tornillo no debe sobresalir de la superficie de la placa; debe quedar ligeramente hundido para el posterior resane con mastique de dichos puntos. Para lograr este procedimiento se deberá avellanar unos 2mm la placa superboard con broca de tungsteno de 5/16" ó 3/8". Los bordes de las placas en las juntas deben quedar al mismo nivel. Cuando se fijen dos placas al mismo perfil, sus bordes deben coincidir con el eje del perfil. Una vez instaladas y fijadas las placas se procede a sellar las juntas mediante la aplicación de mastique o similar y posterior colocación de la cinta. Cubrir los tornillos y juntas con masilla en capar delgadas con llana y finalmente corregir las imperfecciones con lija. Para el acabado final liso para la instalación de enchapes y/o pintura sea el caso, Verificar acabado final para aceptación.

	
Foto 1: cartera en lamina de fibrocemento.	***Foto 2: cartera en lamina de fibrocemento.***

Imagen 20: **cartera en lamina de fibrocemento.**
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 5.1 Repello de piso y pared con mortero 1:4 espesor 2cm. Incluye aditivo impermeabilizante:

Se realizo la aplicación del acabado liso sobre las superficie con una o varias capas de mezcla de arena lavada fina y cemento, llamada mortero en proporción 1:4 incluye aditivo impermeabilizante y cuyo fin es emparejar la superficie de tal manera que las pendientes y niveles permitan drenar las aguas lluvias que recoge esta placa; y la aplicación del aditivo impermeabilizante le brinda mayor resistencia y estabilidad al área de piso a intervenir, así como a los muros que se van a enchapar. Este proceso también es llamado revoque o repello impermeabilizado, el cual incluye materiales, equipo y retiro de residuos generados, de acuerdo las áreas definidas por la entidad. En este ítem se incluye el retiro de capas de repello existente que impidan que el área a repellar no este nivelada o con protuberancias que afecten la nivelación del piso, así como la adecuación de la superficie, con tal rugosidad que permita la adherencia con la losa existente. El mortero debe quedar con un acabado rustico, antideslizante, pero a la vista homogéneo.

	
Foto 1: Relleno con mortero 1:4.	***Foto 2: Relleno con mortero 1:4.***

Imagen 21: *Relleno con mortero 1:4.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 7.2 Estuco plástico para muros y resanes incluye juntas, filos y dilataciones:

Esta actividad se refiere al suministro, transporte y aplicación de estuco sobre muros internos y empañetados, una vez seco el pañete se aplica estuco o en este caso en muros que ya cuentan con este tipo de recubrimiento y que requieren un retoque por el paso del tiempo o por situaciones ocasionadas por la humedad, este estuco se aplica para sellar todas las juntas o grietas e imperfecciones, incluye filos; finalmente se pule la superficie con una lija dejando la superficie lista para las capas de pintura.

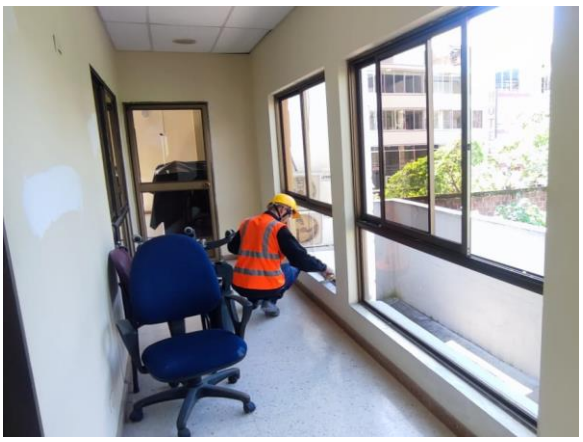
	
Foto 1: Estuco platico para muros y resanes.	***Foto 2: Estuco plastico para muros y resanes.***

Imagen 22: *Estuco plástico para muros y resanes.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 8.1 Pintura de muros en mampostería 3 manos, vinilo tipo 1, lavable:

Esta actividad se refiere a la aplicación de pintura en muros interiores directamente sobre revoque para las áreas especificadas en el proyecto, se aplicarán pinturas con base en agua tipo emulsión con resina de polinivil-acetato modificada con acrílica, que cumpla con los requisitos exigidos por la Norma NTC1335, para el Tipo 1, entre otros: viscosidad a 25 grados centígrados de 77 a 95 U.Krebs; finura de dispersión 4 U.Hegman mínimo; resistencia a la abrasión húmeda 700 ciclos mínimo

	
Foto 1: Pintura vinilo tipo 1.	***Foto 2: pintura vinilo tipo 1.***

Imagen 23: *Pintura vinilo tipo 1.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 8.3 Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial ancho 10cm, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, para pavimento rígido:

Aplicación de pintura con resinas acrílicas puras a base de solvente, con alta resistencia a la abrasión severa y a gran variedad de contaminantes; de alta retención de las esferas de vidrio, durable y rápido secamiento. Contenido de plomo en base seca máximo 0.06%. debe cumplir con los requerimientos normas NTC 1360; INEN 1042-1.

	
Foto 1: Pintura en frio base solvente.	***Foto 2: Pintura en frio base solvente.***

Imagen 24: *Pintura vinilo tipo 1.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 8.4 Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial, números con circunferencias de 66 y 40cm para carros y motos. imprimación en negro y pintura tráfico vehicular, incluye micro esferas, para pavimento rígido:

Aplicación de pintura con resinas acrílicas puras a base de solvente, con alta resistencia a la abrasión severa y a gran variedad de contaminantes; de alta retención de las esferas de vidrio, durable y rápido secamiento. Contenido de plomo en base seca máximo 0.06%. debe cumplir con los requerimientos normas NTC 1360; INEN 1042-1.

	
Foto 1: Pintura en frio base solvente.	***Foto 2: pintura en frio base solvente.***

Imagen 25: *Pintura en frio base solvente .*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 8.5 Aplicación de pintura en frio base solvente para flechas de ingreso y salida, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, sobre pavimento rígido:

Aplicación de pintura con resinas acrílicas puras a base de solvente, con alta resistencia a la abrasión severa y a gran variedad de contaminantes; de alta retención de las esferas de vidrio, durable y rápido secamiento. Contenido de plomo en base seca máximo 0.06%. debe cumplir con los requerimientos normas NTC 1360; INEN 1042-1.

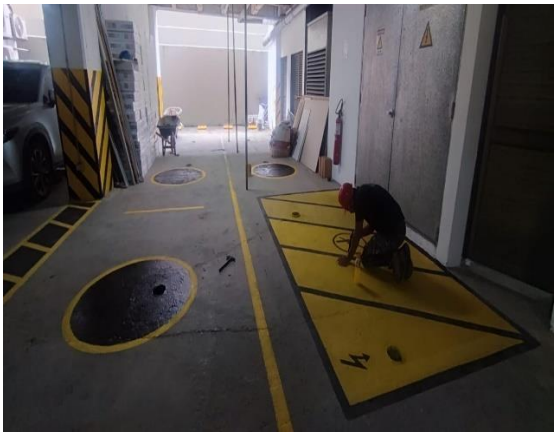
	
Foto 1: Pintura en frio base solvente.	***Foto 2: pintura en frio base solvente.***

Imagen 26: *Pintura en frio base solvente.*
Fuente: *Elaboración propia.*

ítem 13.5 Brigada de aseo:

Es dedicada únicamente a las labores de orden y limpieza del área general de la obra, limpieza de las vías aledañas, a las sesiones de humectación, al mantenimiento de la señalización y para realizar las diferentes actividades mencionadas en el PMA. La brigada deberá contar con un personal mínimo de dos (2) trabajadores mensuales, los cuales contarán con los elementos necesarios para sus respectivas labores que se realizarán a diario (herramienta menor por cada trabajador (pica, pala, carretilla tipo boggie con llanta de neumático, martillos, señalización, bolsas plásticas, escobas, elementos de aseo y demás requeridos para el cumplimiento de sus funciones), el pago se realizará aceptado a satisfacción por el Interventor.

	
Foto 1: Brigada de aseo.	***Foto 2:*** *Brigada de aseo.*

Imagen 27: *Brigada de aseo.*
Fuente: *Elaboración propia.*

12. PMA: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Para la Interventoría es primordial realizar el seguimiento y control al cumplimiento de la normatividad ambiental y a los programas contractualmente estipulados en el proyecto para este caso en específico el PMA plan de manejo ambiental donde es prioridad minimizar el impacto ambiental que la ejecución del proyecto pueda ocasionar sobre la comunidad particular y el medio ambiente.

En este orden de ideas, el contratista, entiende que la ejecución de cualquier proyecto, de obra o actividad - POA interactúa con el ambiente a través de las actividades a ejecutarse lo cual, se define como elemento, de las actividades, productos o servicios de la organización que pueden interactuar con el medio ambiente; ejemplo de estos incluyen: emisión,

consumo o reutilización de materiales pétreos o la generación de ruido. Por este motivo realiza el análisis de impactos, inicialmente identifican las actividades que interactúan con el medio ambiente y que pueden generar un efecto ya sea, positivo o negativo; posteriormente se caracteriza el ambiente receptor del impacto en componentes y elementos; y finalmente se identifican y evalúan los impactos potenciales asociados a la realización de las diferentes actividades del proyecto. Para la evaluación de impactos tomó como base la metodología propuesta por CONESA (1997), con algunas adaptaciones a la condición del entorno y a las condiciones particulares del proyecto.

13. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante este período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

13.1 Actas de inicio

El día 14 de noviembre del 2024, se reunieron en San Juan de Pasto, el representante legal de Constructora De Infraestructura Colombiana COINCO S.A.S Contratista de obra, el Interventor de obra, director ejecutivo de Administración Judicial Pasto y la supervisora con el fin de suscribir acta de inicio para la ejecución del contrato de obra. (Ver ***Anexo*** acta de inicio de obra).

El día 14 de noviembre del 2024, se reunieron en San Juan de Pasto, el Interventor de obra, director ejecutivo de Administración Judicial Pasto y la supervisora del contrato, con el fin de dejar constancia del inicio de las labores del contrato de interventoría. (Ver ***Anexo*** acta de inicio de interventoría).

13.2 Socialización del proyecto:

El día 12 de noviembre del 2024, se desarrolló socialización del Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.6947019 del 12 de noviembre 2024 en las instalaciones del palacio de justicia de Mocoa dirigida por el Contratista de obra y el contratista de Interventoría, se procedió a proporcionar la información del proyecto, su alcance, recibir inquietudes y concluir con

acuerdos para el libre y normal desarrollo de la obra. (Ver **Anexo** acta de socialización).

Registro fotográfico – Socialización del proyecto.



Foto 1: *socialización del proyecto*

Imagen 28: *Registro fotográfico – socialización del proyecto*
Fuente: *Elaboración Propia.*

13.3 Comités de obra:

El día 22 de noviembre del 2024, de manera virtual se desarrolló comité técnico N°1 entre contratista de obra, el contratista de interventoría, Supervisora; donde los temas a tratar posible incumplimiento a las obligaciones contractuales (Ver **Anexo** acta de comité técnico).

14. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

14.1 Clausula 8 Forma de pago contrato de obra

Pagos parciales: El 90% del valor del contrato se pagará mediante pagos parciales por cantidades de obras ejecutadas por el contratista, previa presentación de: a) Informe de ejecución, con sus respectivos anexos, b) Factura de venta electrónica o su equivalente, c) certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato y d) Planilla de pago a aportes de seguridad social en salud (Salud, Pensión, Riesgos Laborales) aportes parafiscales en el caso que tenga personal a cargo. No obstante, lo anterior, si a criterio de la supervisión se requiere de otro requisito, el mismo deberá ser cumplido por el contratista.

Pago final: Equivalente hasta el 10% del total de contrato, al finalizar la ejecución del contrato, previa presentación de: a) Informe de ejecución, con sus respectivos anexos, b) Factura de venta electrónica o su equivalente, c) Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato y d) Planilla de pago a aportes de seguridad social en salud (Salud, pensión, riesgos laborales) aportes parafiscales en el caso que tenga personal a cargo y e) Suscripción del acta de liquidación. No obstante, lo anterior, si a criterio de la supervisión se requiere otro requisito, el mismo deberá ser cumplido por el contratista.

14.2 Clausula 8 Forma de pago contrato de interventoría

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, realizará el pago de forma mensual durante el periodo contratado, una vez se verifique el cumplimiento cabal de las obligaciones a cargo del contratista, previa presentación de los siguientes documentos: a) La factura o cuenta de cobro según corresponda. b) Certificación emitida por el supervisor del contrato de haberse cumplido con el objeto contractual. c) Certificación expedida por el Revisor Fiscal, por el Representante Legal o contratista persona natural según corresponda, de conformidad con el Art. 50 de la ley 789 de 2002, que acredite estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones) y Parafiscales (ICBF, Cajas de Compensación Familiar y Sena, cuando a ello hubiere lugar), allegando la planilla de pago por estos conceptos. PARÁGRAFO 1: El pago se realizará dentro de los 45 días siguientes a la radicación de la factura y/o cuenta de cobro, conforme los recursos que la Dirección General del Tesoro-Ministerio de Hacienda y Crédito Público sitúe a la Entidad. En caso de no cumplir con los requisitos de pago, se aplicará lo establecido en el artículo 11 de la ley 2024 de 2020. PARÁGRAFO 2: En caso de estar obligado a facturar electrónicamente, el contratista deberá presentar factura conforme a la financiación de cada rubro y PCI que corresponda, acatando las directrices de la DIAN y SIIF Nación. PARÁGRAFO 3: La Entidad descontará de cada pago el valor correspondiente a los impuestos, tasas, contribuciones o retenciones que apliquen, según los parámetros legalmente establecidos y conforme a los lineamientos del SIIF Nación.

15. PERSONAL Y EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

La Interventoría mediante el control diario de Obra relaciona la cantidad de equipos utilizados por el Contratista durante el presente periodo y el personal en cada uno de los frentes de obra, dicha información se anexa.

El contratista de obra ha cumplido con los requisitos de ley en lo referente a la Afiliación a EPS, ARL Y PENSIONES del personal de obra. El contratista en obra cuenta con personal discriminado así: Un (01) Ing. director de obra, Un (01) Ing. Residente de obra, Un (1) profesional en salud y seguridad industrial, Un (01) Maestros, dos (02) oficial, dos (2) eléctricos, seis (6) ayudantes de obra, Equipo de obra, Una (01) Pulidora, Un (01) Taladro, volqueta y herramienta menor.

16. CONTROL DE CALIDAD

Durante el desarrollo de todas las actividades se ha comprobado el respectivo proceso de calidad de acuerdo con el tipo de proyecto a realizar riéndose a la norma técnica colombianas ICONTEC NTC 382, NTC 1339, NTC539, normas american SOCIETY FOR TESTING materiales ASTM, ensayos para concretos NSR 2010 y Resolución número 5194 del 2010.

Durante el presente periodo el contratista de interventoría verifico que se realicen los ensayos correspondientes y entrega de certificados de calidad de los materiales utilizados para la construcción con el fin de validar el cumplimiento del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas y de esta forma comprobar, aceptar o rechazarlos una vez obtenidos los resultados del laboratorio.

Adicionalmente se solicitó los respectivos certificados de calidad y especificaciones técnicas de los materiales a utilizar dando cumplimiento a las especificaciones técnicas (Ver **Anexos** control de calidad).

16.1 Metodología de medición y cuantificación de obra ejecutada

El proceso de medición y cuantificación de la obra ejecutada se realizó a través de la toma continua de medidas convencionales por medio de cinta métrica, cubicación convencional y cuantificación numérica, que luego fueron comparadas con las carteras topográficas de campo.

17. CONTROL DE PÓLIZAS Y RESERVAS PRESUPUÉSTALES

17.1 Pólizas contratista de obra

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

ANEXO 0: Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal.

COMPAÑÍA ASEGURADORA	PÓLIZA No.	AMPARO Y PORCENTAJE	FECHA DE INICIO DEL AMPARO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101454743	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/10/2024	29/06/2025	191.100.398,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101454743	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	29/12/2024	29/12/2029	191.100.398,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101454743	ESTABLILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	29/10/2024	29/12/2027	191.100.398,00

TABLA 10. *Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal Anexo 0*
Fuente: *Elaboración propia.*

La póliza de seguro de garantía única de cumplimiento en favor de las entidades estatales, está debidamente aprobada. Cabe añadir que la póliza se encuentra vigente; **se anexa póliza.**

Aclaración por parte de la seguradora desde la fecha de finalización del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo.

ANEXO 0: Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual

COMPAÑÍA ASEGURADORA	PÓLIZA No.	AMPARO Y PORCENTAJE	FECHA DE INICIO DEL AMPARO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-40-101242689	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	29/10/2024	29/12/2024	260.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-40-101242689	CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	29/10/2024	29/12/2024	260.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-40-101242689	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29/10/2024	29/12/2024	260.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-40-101242689	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL.	29/10/2024	29/12/2024	260.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-40-101242689	GASTOS MEDICOS	29/10/2024	29/12/2024	260.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-40-101242689	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.	29/10/2024	29/12/2024	260.000.000,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA	PÓLIZA No.	AMPARO Y PORCENTAJE	FECHA DE INICIO DEL AMPARO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-40-101242689	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.	29/10/2024	29/12/2024	260.000.000,00

TABLA 11. *Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual Anexo 0*
Fuente: *Elaboración propia.*

17.2 Pólizas contratista de interventoría.

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

ANEXO 0: Póliza de seguro de cumplimiento entidades estatales.

COMPAÑÍA ASEGURADORA	PÓLIZA No.	AMPARO Y PORCENTAJE	FECHA DE INICIO DEL AMPARO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101239016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/11/2024	01/07/2025	6.667.332,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15-44-101285819	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	01/11/2024	31/12/2027	6.667.332,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15-44-101285819	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2024	31/12/2029	6.667.332,00

TABLA 12. *Póliza de seguro de cumplimiento entidades estatales. Anexo 0*
Fuente: *Elaboración propia.*

Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO
NIT 860.009.578-6
Oficina Bogotá
Cod. Suc 11
Fecha de Emisión 01 noviembre del 2024.

La póliza de seguro de garantía única de cumplimiento en favor de las entidades estatales, está debidamente aprobada. Cabe añadir que la póliza se encuentra vigente; **se anexa póliza.**

ANEXO 1: Póliza de seguro de cumplimiento entidades estatales.

COMPAÑÍA ASEGURADORA	PÓLIZA No.	AMPARO Y PORCENTAJE	FECHA DE INICIO DEL AMPARO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101239016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/11/2024	01/07/2025	6.667.332,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15-44-101285819	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	01/11/2024	31/12/2027	6.667.332,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA	PÓLIZA No.	AMPARO Y PORCENTAJE	FECHA DE INICIO DEL AMPARO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO
		SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES			
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15-44-101285819	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2024	31/12/2029	6.667.332,00

TABLA 13. *Póliza de seguro de cumplimiento entidades estatales. Anexo 0*
Fuente: *Elaboración propia.*

Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO
NIT 860.009.578-6
Oficina Bogotá
Cod. Suc 11
Fecha de Emisión 01 noviembre del 2024.

La póliza de seguro de garantía única de cumplimiento en favor de las entidades estatales, está debidamente aprobada. Cabe añadir que la póliza se encuentra vigente; **se anexa póliza.**

ANEXO 2: Póliza de seguro de cumplimiento entidades estatales.

COMPAÑÍA ASEGURADORA	PÓLIZA No.	AMPARO Y PORCENTAJE	FECHA DE INICIO DEL AMPARO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101239016	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/11/2024	03/08/2025	6.667.332,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101239016	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	01/11/2024	03/02/2028	6.667.332,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101239016	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2024	31/12/2029	6.667.332,00

TABLA 14. *Póliza de seguro de cumplimiento entidades estatales. Anexo 2*
Fuente: *Elaboración propia.*

Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO
NIT 860.009.578-6
Oficina Bogotá
Cod. Suc 11
Fecha de Emisión 29 ENERO del 2025.

La póliza de seguro de garantía única de cumplimiento en favor de las entidades estatales, está debidamente aprobada. Cabe añadir que la póliza se encuentra vigente; **se anexa póliza.**

18. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cumpliendo con los requerimientos dados por la Interventoría, el personal empleado por el contratista debe cumplir con los requisitos de la ley 100, (Afiliación a ARP, EPS, Pensión, Caja de compensación, Sena e ICBF),para este periodo el contratista de obra realizó la entrega de afiliaciones y los soportes de los pagos de seguridad social y parafiscal, correspondiente a los meses laborados, por otra parte, el contratista de obra entrego al personal la dotación y los elementos de seguridad necesarios para la ejecución de este tipo de trabajos. Al respecto, **Ver Anexo** de los pagos de seguridad social y parafiscales.

19. ACTIVIDADES RELEVANTES

Durante el presente mes se ha trabajado en las siguientes actividades.

- Verificación de equipos y personal aprobados por la interventoría
- Elaboración de informe mensual.
- Elaboración de formatos, tiempo, personal y equipo.
- Revisión de cantidades ejecutadas durante el mes.
- Seguimiento fotográfico de las obras
- Revisión de la bitácora
- Seguimiento y control de afiliaciones al personal.
- Todo lo anterior en concordancia con las especificaciones técnicas, documentos contractuales y normativa legal.

20. ESTADO DEL TIEMPO

Para el periodo del 1 de febrero hasta el 28 de febrero 2025, el estado del tiempo se comporta con estado variable como se presenta ver anexo estado del clima.

21. INCONVENIENTES ENCONTRADOS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA

Durante el mes se presentaron algunos inconvenientes que afectaron al desarrollo normal de las actividades, El plazo de 48 días calendario es insuficiente para la adecuada ejecución de las obras, dadas las particularidades técnicas y logísticas del proyecto. Las especificaciones técnicas del enchape cerámico para pisos y paredes requieren materiales que no se encuentran en stock en los proveedores locales. Esto ha obligado a realizar pedidos especiales con tiempos de entrega estimados a partir de los primeros días de febrero de 2025. Durante el periodo de diciembre de 2024 y enero de 2025, se registraron lluvias constantes y prolongadas que afectaron las actividades en fachadas y exteriores. Estos eventos fueron debidamente documentados en el libro de bitácora. Restricciones operativas en el Palacio de Justicia. La ejecución de actividades internas debe coordinarse con el personal de las instalaciones para habilitar espacios, lo que ha limitado el avance del proyecto. Igualmente, Las reuniones y audiencias programadas en el Palacio han requerido la suspensión completa de actividades, conforme a solicitudes expresas de la coordinación del edificio. Este tipo de interrupciones continuarán ocurriendo, afectando el desarrollo normal del proyecto.

22. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Con corte al primer mes de labores, se registra un porcentaje programado acumulado del 69,38% que representa una inversión del orden de $ 662.898.411, además el porcentaje ejecutado acumulado es del 27,93% que representa una ejecución del orden de $ 260.045.112,00; situación que expone y evidencia un avance porcentual con un déficit de 41,45% que representa una ejecución del orden de -$ 396.055.574. Por lo que se sugiere al contratista de obra contemplar las medidas necesarias para cumplir con la programación inicialmente propuesta.

- El contratista de obra, a la fecha no presenta los informes mensuales en el plazo estipulado para tal fin, correspondiente a los cinco (05)

primeros días de cada mes, situación que viene presentando inconvenientes a la interventoría en el normal desarrollo de sus labores de seguimiento y control, por lo que se coloca en conocimiento de la supervisión y del contratista de obra, en aras de que se corrija oportunamente, so pena de incurrir en incumplimiento por la no entrega de informes en los tiempos programados y con la calidad requerida.

- Durante el periodo comprendido desde el 1 de febrero al 28 de febrero del 2025, no se realizó intervenciones que generen impactos o afectaciones ambientales, de igual forma se efectúa un manejo adecuado de los residuos propios generados por las actividades realizadas dentro del proyecto. Se recalcó al contratista de manera verbal, se mantenga un constante aseo y acopio de material sobrante que no genere daño al medio ambiente, el mínimo impacto urbano y mayores condiciones de seguridad industrial. Fue función primordial de la interventoría asegurar que se minimice el impacto ambiental que el proyecto pueda ocasionar sobre las instalaciones y en el entorno donde se desarrollarán las actividades constructivas, es decir, sobre el medioambiente.

- La interventoría en cumplimiento de sus obligaciones de vigilancia, control y seguimiento durante la ejecución del contrato de obra recomendó al contratista realizar la señalización correspondiente a las áreas de trabajo.

- Respecto del seguimiento al Plan de Salud y seguridad en el Trabajo, se informa que los mismos se vienen desarrollando por parte del personal SST de la firma contratista y se cumplen a cabalidad, se anexan al presente informe de interventoría No. 03 el informe mensual SST con sus soportes.

- La interventoría recomendó y vigiló que el contratista de obra cumpla con las especificaciones del contrato como el suministro de los elementos de protección personal, seguridad industrial, dotación de implementos de seguridad, señalización y aseo de los sitios de obra, velando de esta manera porque se cumplan todas las normativas vigentes sobre seguridad industrial, y exigiendo al contratista el cumplimiento de las mismas con el personal a su cargo durante el desarrollo de la obra.

- Se realiza diligenciamiento del libro de Bitácora en conjunto con el contratista.
- Se llevó un registro fotográfico, con el fin de evidenciar visualmente la evolución del proyecto.
- A la fecha el contrato de obra e interventoría se encuentran vigentes y en ejecución.



ING. ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO
Contratista de Interventoría

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

23. ANEXOS

- Anexo 1 Pólizas contratista de obra.
- Anexo 2 Informes semanales.
- Anexo 3 Copia de actas de comité técnico.
- Anexo 4 Control diario de equipo contratista de obra.
- Anexo 5 Control diario del personal contratista de obra
- Anexo 6 Estado general del tiempo
- Anexo 7 Aportes de seguridad social y parafiscales contratistas de obra.
- Anexo 8 Pólizas contratista de interventoría.
- Anexo 9 Control diario del equipo de interventoría.
- Anexo 10 Control diario del personal de interventoría.
- Anexo 11 Aportes de seguridad social y parafiscales contratistas de interventoría.
- Anexo 12 Bitácora de obra.
- Anexo 13 Informe seguridad y salud en el trabajo.
- Anexo 14 Informe ambiental.

ANEXO 1 PÓLIZAS CONTRATISTA DE OBRA.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

ANEXO 2 INFORMES SEMANALES.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

INFORME SEMANAL DE OBRA N° 10

PÁGINA	1	DE	1

SECRETARIA EJECUTORA: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO

FECHA: 9 / 2 / 2025

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.6947019

Semana Número: 10 Del: 3/02/2025 Al: 9/02/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 67 Días Corresponde al : 63,81% del Plazo total del Contrato

Supervisor Técnico de Contrato ING. DIANA VIVANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO"

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,13%	27,47%
Valor básico de la Obra programada:	$ 48.999.474	$ 262.473.416

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,91%	26,98%
Valor básico de Obra Ejecutada:	$ 18.206.179	$ 254.597.353

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.
Contrato No.	CO1.PCCNTR.6947019
Valor Inicial:	$ 955.501.990,00
Plazo Inicial:	2 MESES
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	14 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Fecha de Suspensión 1	23 de diciembre de 2024
Fecha de Reinicio 1	14 de enero de 2025
Fecha de Terminación 2	22 de enero de 2024
Tiempo de Adición 1	2 MESES
Fecha de Terminación Con Adición en Tiempo 1	22 de marzo de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
Contrato No.	O1.PCCNTR.6973355 DEL 01/11/2024
Valor Actualizado:	$ 33.336.660,00
Plazo Inicial:	45 cuarenta y cinco dias calendario
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	14 de noviembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Continuar resane de paredes en piso 1, 2, 3 Y 4 en todas las áreas internas.
Continuar pintura para interiores en piso 1, 2, 3 Y 4 en áreas internas

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar resanes y remates de pinturas en los 4 pisos en áreas interiores y corredores
Continuar con la instalación de todos los temas eléctricos

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Fecha de inicio 14 de noviembre de 2024
Fecha de terminación inicial 31 de diciembre de 2024
Fecha de suspensión No.1 23 de diciembre de 2024
Fecha de reinicio No. 1 14 de enero de 2025
Fecha de terminación No.2 22 de enero de 2025
Tiempo de adición No. 1 dos meses
Fecha de terminación según adición en tiempo No.1 22 de marzo de 2025

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO	Firma: Nombre: MARLON FERNANDO ARTEAGA P. Matrícula 52202-338602 NRÑ	Firma: Nombre: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO Matrícula 63202094726 QND



Fotografía: 1


Continuar resane de paredes en piso 1, 2, 3 Y 4 en todas las áreas internas.


Pinturas
Pinturas
Pinturas



Fotografía: 3

Continuar resane de paredes en piso 1, 2, 3 Y 4 en todas las áreas internas.

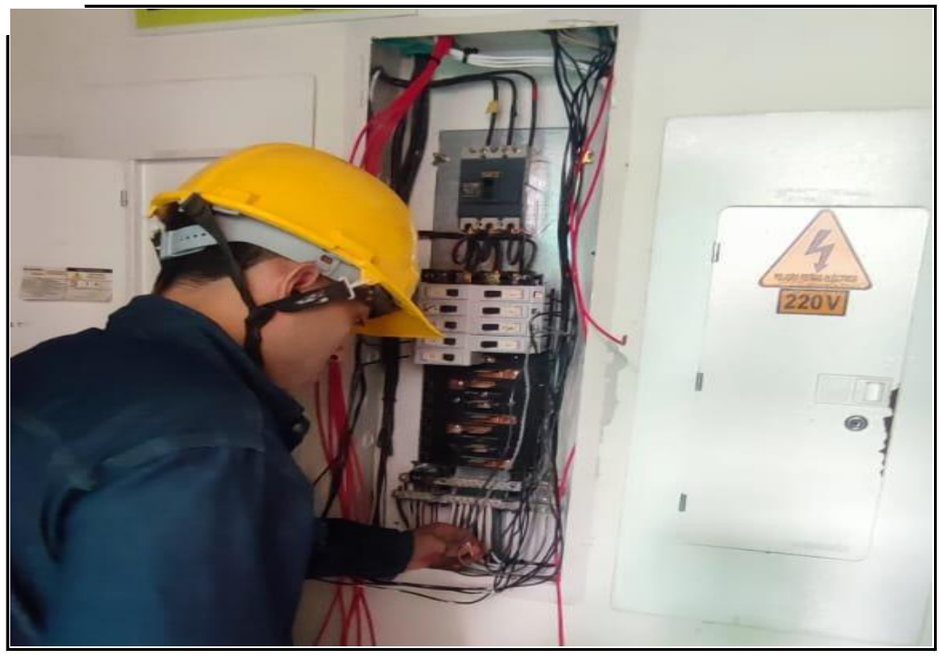

Fotografía: 4

Continuar con la instalación de todos los temas eléctricos

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO		
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**CONTRATO DE OBRA No.**	CO1.PCCNTR.6947019
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.
	INTERVENTOR:	ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO

OBJETO "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO"

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	SEMANA 10		ACUMULADO		% EJECUTADO SEMANA 10
						CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	
1	**PRELIMINARES**									
1.1	**INICIALES**									
1.1.1	Localización y replanteo arquitectónico, incluye planos récord	M2	332,00	3.864	1.282.848	-	-	199,00	768.936	0,00%
1.1.2	Instalación y desinstalación de muro una cara drywall, provisional para cerrar las obras, incluye puerta con marco para ingreso de trabajadores	M2	53,00	77.249	4.094.197	-	-	22,00	1.699.478	0,00%
1.1.3	Señalización de obra en lona de 60x40cm impresión full color, incluye marco y anclaje	UND	9,00	60.693	546.237		-	9,00	546.237	
				Sub Total	**5.923.282**		**-**		**3.014.651**	**0,00%**
1.2	**DESMONTES Y RETIROS**									
1.2.1	Desmonte de marcos y puertas, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	57,00	26.406	1.505.142	-	-	55,00	1.452.330	0,00%
1.2.2	Desmonte de marco, ventana y vidrio, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	1,00	27.367	27.367	-	-	1,00	27.367	0,00%
1.2.3	Desmonte de cielo raso en fibra mineral y/o panel yeso y/o fibrocemento, incluye estructura soporte, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	M2	250,00	29.781	7.445.250	51,00	1.518.831	250,00	7.445.250	20,40%
1.2.4	Desmonte de Tasas sanitarias, orinales y lavamanos, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	UND	48,00	53.587	2.572.176	-	-	48,00	2.572.176	
1.2.5	Desmonte de instalaciones hidrosanitarias, incluye tuberías y accesorios, regatas y sellos provisionales, cargue a volqueta	UND	72,00	57.730	4.156.560	-	-	63,00	3.636.990	0,00%
1.2.6	Rasqueteo, cepillo y limpieza manual de superficies, con el fin de retirar impurezas y capas de pintura existentes.	M2	1017,00	4.863	4.945.671	-	-	1.017,00	4.945.671	0,00%
1.2.7	Retiro de luminarias ubicadas en cielos rasos y pared, incluye trasiego a punto de acopio	UND	46,00	21.660	996.360	-	-	46,00	996.360	0,00%
1.2.8	Retiro de redes eléctricas en piso, techo y pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	GL	1,00	2.233.550	2.233.550	-	-	1,00	2.233.550	
				Sub Total	**23.882.076**		**1.518.831**		**23.309.694**	**6,36%**
1.3	**DEMOLICIONES**									
1.3.1	Demolición muro E ≤ 15CM en mampostería maciza o hueca, incluye cortes con pulidora, trasiegos y cargue a volqueta.	M2	220,00	17.941	3.947.020	-	-	184,00	3.301.144	0,00%
1.3.2	Demolición de enchape de pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	704,40	14.760	10.396.413	-	-	648,12	9.566.251	0,00%
1.3.3	Demolición de enchapes de piso, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	283,00	13.980	3.956.340		-	142,00	1.985.160	
1.3.4	Demolición repello de piso, incluye picado Eprom = 0.03m, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	835,00	12.959	10.820.765		-	178,00	2.306.702	
1.3.5	Demolición repello de pared, muros mampostería eprom= 0.02m, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	291,80	15.119	4.411.785	160,00	2.419.040	291,00	4.399.629	
1.3.6	Cargue, transporte y retiro del material sobrante proveniente de las obras de mantenimiento, hasta el botadero.	M3	234,00	40.171	9.400.014	18,00	723.078	180,00	7.230.780	7,69%
1.3.7	Demolición de mesones en concreto, recubierto con granito incluye salpicadero	M2	11,00	37.722	414.942	-	-	7,00	264.054	0,00%
				Sub Total	**43.347.279**		**3.142.118**		**29.053.720**	**7,25%**
		TOTAL PRELIMINARES			**73.152.637**		**4.660.949**		**55.378.065**	**6,37%**
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**									
2.1	**RED SUMINISTRO AGUA POTABLE**									
2.1.1	Instalaciones PVC 1/2" RDE 13.5	ML	95,00	7.575	719.625	-	-	95,00	719.625	0,00%
2.1.2	Instalaciones PVC 3/4" RDE 21	ML	28,00	10.939	306.292		-	28,00	306.292	
2.1.3	Instalaciones PVC RDE 21 1"	ML	50,21	12.038	604.428	-	-	50,20	604.308	0,00%
2.1.4	Instalaciones PVC RDE 21 2"	ML	6,00	26.949	161.694	-	-	6,00	161.694	0,00%
2.1.5	Punto hidráulico PVC 1/2"	UND	60,00	24.174	1.450.440		-	60,00	1.450.440	
2.1.6	Punto hidráulico PVC 3/4"	UND	8,00	26.324	210.592	-	-		-	
2.1.7	Punto hidráulico PVC 1/2" incluye válvula control paso 1/2" y tapa PVC Blanca 15x15cm	UND	18,00	59.937	1.078.866	-	-		-	
				Sub Total	**4.531.937**		**-**		**3.242.359**	**0,00%**
2.2	**RED SANITARIA, PLUVIAL, VENTILACION**									
2.2.1	Instalaciones sanitarias PVC 2"	ML	58,00	25.087	1.455.046	-	-	58,00	1.455.046	0,00%
2.2.2	Instalaciones sanitarias PVC 4"	ML	119,00	42.006	4.998.714	-	-	72,00	3.024.432	0,00%
2.2.3	Instalaciones ventilación PVC 2"	ML	183,00	20.194	3.695.502	-	-	24,00	484.656	0,00%
2.2.4	Instalaciones ventilación PVC 3"	ML	35,00	31.646	1.107.610		-		-	
2.2.5	Punto sanitario 4" WC	UND	32,00	45.965	1.470.880		-	32,00	1.470.880	
2.2.6	Punto sanitario 2"	UND	44,00	33.894	1.491.336		-	36,00	1.220.184	
2.2.7	Suministro e instalación de rejilla de piso en acero inoxidable cuadrada de 10cm salida a tubería 2"	UND	24,00	48.380	1.161.120	-	-	24,00	1.161.120	0,00%
2.2.8	Suministro e instalación de tubería de conexión de desagües de aires acondicionados	ML	36,00	20.194	726.984		-		-	
				Sub Total	**16.107.192**		**-**		**8.816.318**	**0,00%**
		TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**20.639.129**		**-**		**12.058.677**	**0,00%**
3	**RED ELECTRICA**									
3.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**									
3.1.1	S.I.P. Salida toma doble GFCI 1F/20AMP en tubería PVC SCH40 1/2", caja galvanizada y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	16,00	171.144	2.738.304		-		-	
3.1.2	S.I.P. Salida sensor de movimiento tipo interruptor 360° 1F/15AMP En muro, Tubería PVC SCH40 D:1/2", Cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	32,00	138.700	4.438.400		-		-	
3.1.3	S.I.P Luminaria de sobreponer 400x120 para uso interior, fabricada en lámina de acero COLD ROLLED, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate y difusor lamina acrílico opalizado L11. Producto para instalación de sobreponer, en temperatura de color 5000K flujo lumínico de 4400Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 28.56W	UND	4,00	424.118	1.696.472		-		-	

3.1.4	S.I.P. Luminaria tipo bala 72x83 para incrustar, Producto tipo DOWNLIGHT de uso interior fabricado en aluminio inyectado, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate en temperatura de color 6500K flujo lumínico de 550Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 6.00W.	UND	40,00	65.207	2.608.280		-		-	
3.1.5	S.I.P Luminaria tipo bala GS 15W 5000K	Und	12,00	144.940	1.739.280		-		-	
3.1.6	S.I.P Letrero lumínico de emergencia SALIDA 90E 300X185X45 2.6W 120-277V SOBREPONER	UND	20,00	107.422	2.148.440		-		-	
3.1.7	S.I.P Luminaria de emergencia 185X50X108 SOBREPONER 2-BL 2W	UND	40,00	112.486	4.499.440		-		-	
3.1.8	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP en techo, Tubería D:1/2" SCH40, Caja octogonal y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	66,00	123.004	8.118.264		-		-	
3.1.9	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP emergencia, Tubería D:1/2 EMT, Caja RADWELL 5800 y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, incluye fijación, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	45,00	178.147	8.016.615		-		-	
3.1.10	S.I.A. Tablero de circuitos para baños, incluye 6 protecciones de 20A	UND	4,00	826.632	3.306.528		-		-	
				Sub Total	**39.310.023**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS			**39.310.023**		**-**		**-**	**0,00%**
4	**MUROS**									
4.1	Suministro e instalación de muro doble cara en lámina de fibrocemento 8mm. Estructura base 6. incluye estuco y dos manos de pintura	M2	84,00	171.543	14.409.612	17,00	2.916.231	84,00	14.409.612	20,24%
4.2	Carteras en lámina de fibrocemento 8mm dos caras, en marco ventana y puertas	ML	163,80	68.788	11.267.474	10,00	687.880	66,00	4.540.008	6,11%
				Sub Total	**25.677.086**		**3.604.111**		**18.949.620**	**14,04%**
		TOTAL MAMPOSTERIA			**25.677.086**		**3.604.111**		**18.949.620**	**14,04%**
5	**REPELLOS**									
5.1	Repello de piso y pared con mortero 1:4 espesor 2cm. Incluye aditivo impermeabilizante.	M2	1374,872	44.402	61.047.067	52,00	2.308.904	442,00	19.625.684	3,78%
5.2	Impermeabilización de losa de entrepiso y muros laterales de terraza, con recubrimiento impermeabilizante acrílico de alto desempeño con tecnología DFX y fibras para impermeabilizar cubiertas	M2	660,00	51.240	33.818.400		-		-	
				Sub Total	**94.865.467**		**2.308.904**		**19.625.684**	**2,43%**
		TOTAL REPELLOS			**94.865.467**		**2.308.904**		**19.625.684**	**2,43%**
6	**ENCHAPES**									
6.1	**PISOS**									
6.1.1	Enchape cerámica de piso estructurado 20.6x92.6cm, uso comercial moderado	M2	258,00	132.605	34.212.090		-		-	
6.1.2	Enchape cerámica de piso 60x60cm color gris, uso exteriores tráfico comercial	M2	88,00	100.281	8.824.728		-		-	
6.1.3	Acabado para uniones entre muro y losa de piso en media caña con mortero 1-4 H: 0,07m	ML	85,00	27.327	2.322.795		-		-	
				Sub Total	**45.359.613**		**-**		**-**	
6.2	**PARED**									
6.2.1	Enchape cerámica de pared color marfil caras diferenciadas 30.1x75.3cm	M2	457,00	113.777	51.996.089		-		-	
6.2.2	Guarda canto flecha 8 milímetros cromo aluminio mate	ML	31,00	12.988	402.628		-		-	
6.2.3	Suministro e instalación de espejo E= 3mm flotante biselado en sus cuatro lados sobre soporte metálico	M2	20,00	361.837	7.236.740		-		-	
6.2.4	Mesón en granito artificial verde uva tuba incluye solapa inferior en aglomerado ancho 50cm con melamina, ancho de mesón 0.60m	ML	17,00	1.146.712	19.494.104		-		-	
				Sub Total	**79.129.561**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL ENCHAPES			**124.489.174**		**-**		**-**	**0,00%**
7	**ESTUCOS**									
7.1	Estuco acrílico para exteriores, incluye juntas, filos y dilataciones	M2	320,00	21.750	6.960.000		-		-	
7.2	Estuco plástico para muros y resanes incluye juntas, filos y dilataciones	M2	973,00	16.641	16.191.693	-	-	973,00	16.191.693	
				Sub Total	**23.151.693**		**-**		**16.191.693**	**0,00%**
		TOTAL ESTUCOS			**23.151.693**		**-**		**16.191.693**	**0,00%**
8	**PINTURA**									
8.1	Pintura de muros en mampostería 3 manos, vinilo tipo 1, lavable	M2	5137,00	12.785	65.676.545	108,00	1.380.780	5.137,00	65.676.545	2,10%
8.2	Pintura para exteriores (3 manos) para paredes.	M2	1280,00	27.659	35.403.520		-		-	
8.3	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial ancho 10cm, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, para pavimento rígido	ML	173,52	14.418	2.501.811		-		-	
8.4	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial, números con circunferencias de 66 y 40cm para carros y motos. imprimación en negro y pintura tráfico vehicular, incluye micro esferas, para pavimento rígido	UND	42,00	30.758	1.291.836		-		-	
8.5	Aplicación de pintura en frio base solvente para flechas de ingreso y salida, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, sobre pavimento rígido	M2	27,00	59.594	1.609.038		-		-	
				Sub Total	**106.482.750**		**1.380.780**		**65.676.545**	**1,30%**
		TOTAL PINTURA			**106.482.750**		**1.380.780**		**65.676.545**	**1,30%**
9	**CARPINTERIAS**									
9.1	Suministro e instalación de puerta de dos hojas batientes elaborada en tubular aluminio estriado ANOLOC, incluye chapa pomo de alcoba metálica pasador y argolla para candado. Medidas de cada hoja 0.9mx2.10m (ver plano A-022, P-T3)	UND	1,00	2.374.136	2.374.136		-		-	
9.2	Sellado de juntas entre muros y marcos de ventanería con sellador de juntas de poliuretano.	ML	367,00	11.048	4.054.616		-		-	
				Sub Total	**6.428.752**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL CARPINTERIAS			**6.428.752**		**-**		**-**	**0,00%**
10	**CUBIERTAS Y CIELO RASO**									
10.2	Limpieza, lavado, cambio de amarras y ganchos, aplicación de sellante en amarras de policarbonato alveolar	M2	33,00	32.738	1.080.354		-		-	
10.3	Suministro e instalación de cielo raso desmontable, láminas de fibra mineral 0,60m x 0,60m, incluye estructura	M2	220,00	89.265	19.638.300		-		-	
				Sub Total	**20.718.654**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL CUBIERTAS Y CIELO RASO			**20.718.654**		**-**		**-**	**0,00%**
11	**APARATOS SANITARIOS Y DOTACION BAÑOS**									

11.1	Kit Taza sanitaria entrada superior con fluxómetro con sensor, blanco institucional (Incluye Taza Sanitaria para Fluxómetro, asiento sanitario, sensor, sistema conexión entrada superior)	UND	4	3.778.631	15.114.524		-		-	
11.2	Taza sanitaria alongado, blanco institucional ultra ahorradora (Sanitario con push)	UND	28	1.228.494	34.397.832		-		-	
11.3	Barra de seguridad Fija Recta en acero inoxidable (baño para personas con movilidad reducida), incluye anclajes	UND	4	463.827	1.855.308		-		-	
11.4	Barra de seguridad abatible (baño para personas con movilidad reducida) incluye anclajes	UND	4	641.649	2.566.596		-		-	
11.5	Lavamanos blanco institucional, para personas con movilidad reducida, incluye anclajes	UND	4	553.338	2.213.352		-		-	
11.6	Lavamanos blanco institucional, para incrustar en mesones	UND	20	328.045	6.560.900		-		-	
11.7	Suministro e instalación de brazo de soporte para lavamanos	JUEGO	4	288.360	1.153.440		-		-	
11.8	Suministro e instalación de grifería para lavamanos y desagüe tipo botella sencillo incluye acople	UND	24	62.127	1.491.048		-		-	
11.9	Construcción lava traperos 70x50x50cm, enchapado.	UND	4	622.329	2.489.316		-		-	
11.10	Kit Orinal arrecife o similar para fluxómetro	UND	8	1.284.163	10.273.304		-		-	
11.11	Dispensador De Papel Higiénico Acero Inoxidable Diámetro De 26 Cm	UND	16	157.457	2.519.312		-		-	
11.12	Papelera metálica en acero inoxidable según especificaciones	UND	32	530.403	16.972.896		-		-	
11.13	Dispensador de jabón para empotrar en pared, en acero inoxidable, 1.2Litros	UND	16	253.414	4.054.624		-		-	
11.14	Suministro e instalación de divisiones sanitarias a piso en acero inoxidable AISI SAE 304 para baños de uso institucional. Batería completa con tres (3) cubículos para unidades sanitarias. Incluye tornillería y accesorios.	UND	8,00	8.420.295	67.362.360		-		-	
11.15	Dispensador De Toallas De Papel En Z Acero Inoxidable De 27x27x10 Cm	UND	16,00	186.293	2.980.688		-		-	
				Sub Total	**172.005.500**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL APARATOS SANITARIOS			**172.005.500**		**-**		**-**	**0,00%**
12	**SEÑALIZACIÓN**									
12.1	Suministro e instalación de placa de señalización de 0,65 x 0,50 m con planimetría salidas de emergencia, en acrílico de 2.4 con impresión full color y regletas en MDF para su instalación.	UND	5,00	229.178	1.145.890		-		-	
12.2	Suministro e instalación Franjas Guías longitudinales de ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	600,00	10.725	6.435.000		-		-	
12.3	Suministro e instalación de Punto alerta ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	2100,00	5.658	11.881.800		-		-	
12.4	Suministro e Instalación de Loseta alerta en policarbonato, 20 x 20 cm., Altura total: 5mm, Peso 150 gr, incluye anclaje	UND	15,00	43.268	649.020		-		-	
12.5	Suministro e instalación de letreros luminosos informativos en parqueadero doble cara, ubicado en sótano 1.50x0.40m	UND	3,00	576.720	1.730.160		-		-	
12.6	Suministro e instalación de letras en acero inoxidable de la frase: PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA y Escudo de la Rama judicial diámetro 50cm, tamaño de letra 30cm cada una, según diseño	UND	1,00	5.767.200	5.767.200		-		-	
				Sub Total	**27.609.070**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL SEÑALIZACIÓN			**27.609.070**		**-**		**-**	**0,00%**
13	**VARIOS Y ASEO GENERAL**									
13.1	Brigada de aseo	PERSONA/ MES	6,00	2.304.481	13.826.886	1,00	2.304.481	5,00	11.522.405	16,67%
				Sub Total	**13.826.886**		**2.304.481**		**11.522.405**	**16,67%**
		TOTAL VARIOS Y ASEO			**13.826.886**		**2.304.481**		**11.522.405**	**16,67%**

TOTAL COSTO DIRECTO:	748.356.821		14.259.225		199.402.689	**1,91%**
ADMINISTRACIÓN (18.73%)	140.167.233		2.670.753		37.348.124	
IMPREVISTOS (3%)	22.450.705		427.777		5.982.081	
UTILIDAD (5%)	37.417.841		712.961		9.970.134	
IVA (19%)	7.109.390		135.463		1.894.325	
TOTAL PRESUPUESTO:	**955.501.990**		**18.206.179**		**254.597.353**	**1,91%**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO
INFORME SEMANAL DE OBRA N° 10

I. INFORMACIÓN GENERAL

N° CONTRATO Y FECHA: CO1.PCCNTR.6947019 del 29 de octubre de 2024 — TRAMO (S): N.A. — FECHA: 9/02/2025

ENTIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO — SEMANA No.: 10 del 3/02/2025 al 9/02/2025

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. DIANA VIVANCO — ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO

OBJETO: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO" — FECHA DE INICIO: 14/11/2024

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA
INTEGRANTES: REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO MANRIQUE

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.6947019 del 29 de octubre de 2024 — VALOR INICIAL: $ 955.501.990,00
PLAZO INICIAL: 45 dias — ADICIONES: $ 0,00
PLAZO ADICIONAL: 60 días
PLAZO ACUMULADO: 105 días — VALOR ACUMULADO: $ 955.501.990,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
INTEGRANTES:

CONTRATO No.: O1.PCCNTR.6973355 — VALOR INICIAL: $ 33.336.660,00
PLAZO INICIAL: 45 cuarenta y cinco días — ADICIONES: $ 0,00
PLAZO ACUMULADO: — VALOR ACUMULADO: $ 33.336.660,00

II. AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS OBRA:

ESTUDIOS Y DISEÑOS:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ -
OBRA:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 0,00
TOTAL OBRA + EST Y DISEÑOS:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 0,00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 0,00


INTERVENTORÍA:
COSTOS EJECUTADOS ACUMULADOS:
COSTOS PROGRAMADOS ACUMULADOS:

ESTUDIOS Y DISEÑOS SEMANAL:
PROGRAMADA: $ -
EJECUTADA: $ -
OBRA SEMANAL:
PROGRAMADA: $ 0,00
EJECUTADA: $ 0,00
TOTAL OBRA + E Y D SEMANAL:
PROGRAMADA: $ 0,00
EJECUTADA: $ 0,00

III. AVANCE FÍSICO

EJECUTADO ACUMULADO PROYECTO

DESCRIPCIÓN	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	TOTAL
Iniciales			10,04%	10,04%	10,04%	9,22%		6,52%	5,03%					50,89%
Desmonte y Retiros			14,42%	16,74%	12,74%	9,49%		11,16%	20,69%	6,36%				91,60%
Demoliciones			13,12%	12,12%	7,74%	4,65%	11,85%	4,68%	11,18%	7,25%				72,59%
Estucos Interiores				11,30%	13,30%	9,51%	33,83%							67,94%
Red Suministro Agua Potable						29,80%	29,80%		11,94%					71,54%
Red Sanitaria, Pluvial, Ventilación						16,32%	18,00%		20,42%					54,74%
Repellos						4,12%	4,12%	4,17%	5,85%	2,43%				20,69%
Pinturas							26,92%	19,86%	11,48%	1,30%				59,56%
Varios y Aseo General								33,3%	33,33%	16,67%				83,30%
Muros									59,76%	14,04%				73,80%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
AVANCE OBRA COSTOS DIRECTOS														0,00%
AVANCE OBRA TOTAL														0,00%

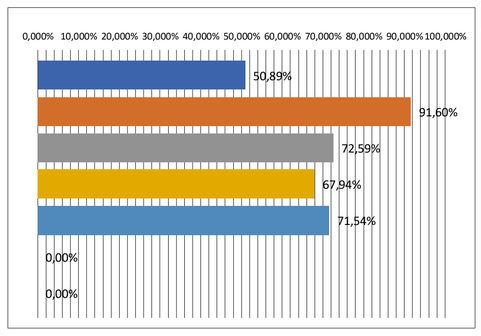

MAQUINARIA Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	MES 1	TOTAL
HERRAMIENTA MENOR		
TALADRO PERCUTOR		

S 1: $ 0,00 — S 2: $ 0,00 — S 3: $ 14.250.052,00 — S 4: $ 16.506.584,00 — S 5: $ 12.860.904,00 — S 6: $ 21.932.972,00
S 7: $ 63.571.724,00 — S 8: $ 44.417.781,00 — S 9: $ 65.939.566,00 — S 10: $ 18.206.179,00 — S 11: — S 12: — S 13:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO
UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO
UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO
UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

BOTADEROS	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONE: La escombrera Palermo, se encuentra ubicada en la verada Caliyaco, ubicada en zona rural del municiipio de Mocoa Putumayo, Gestor de disposición final de RCD, autorizado mediante resolución 00003 de 08/07/2019 código de Inscripción DPT-3389-25-07-2019 / km 1:200 Vía a Villagarzón.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 13
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 13
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0,0
SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 0,0

OBSERVACIONES: El personal mano de obra no calificada es en su totalidad es de la vereda brisas del Mocoa. La selección de las hojas de vida se realizo de la documentación entregada por la JAC quienes realizaron la convocatoria y certificaron que las persona sean del sector.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ADMINISTRATIVAS, LEGALES, FINANCIERAS

FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA E INTERVENTORIA, AFILIACION DEL PERSONAL A LAS ENTIDADES ASEGURADORAS Y DE SALUD.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO
INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N° 10

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO" — TRAMO (S): N.A. — FECHA: 9/02/2025

SECRETARIA EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO — RAMA JUDICIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 10 del 3/02/2025 al 9/02/2025

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

TÉCNICAS

Continuar resane de paredes en piso 1, 2, 3 Y 4 en todas las áreas internas.
Continuar pintura para interiores en piso 1, 2, 3 Y 4 en áreas internas

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

AMBIENTAL Y SST

El componente de seguridad y salud en el trabajo realizo el seguimiento punto a punto del plan de manejo básico de seguridad y salud en el trabajo en el cual se encontró lo siguiente :
Se realizan charlas preoperacionales, entrega en epps, demarcación de zonas con cinta peligro.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar resanes y remates de pinturas en los 4 pisos en áreas interiores y corredores
Continuar con la instalación de todos los temas eléctricos

NOTA:

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES

Fecha de reinicio No. 1 14 de enero de 2025
Fecha de terminación No.2 22 de enero de 2025
Tiempo de adición No. 1 dos meses
Fecha de terminación según adición en tiempo No.1 22 de marzo de 2025

OBSERVACIONES:	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA:	FIRMA:
	NOMBRE: MARLON FERNANDO ARTEAGA POTOSI	NOMBRE: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
	N° MAT: 52202-333602 NRÑ	No. MAT: 63202094726 QND

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

INFORME SEMANAL DE OBRA N° 11

PÁGINA	1	DE	1

SECRETARIA EJECUTORA: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO

FECHA: 16 / 2 / 2025

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.6947019

Semana Número: 11 Del: 10/02/2025 Al: 16/02/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 74 Días Corresponde al : 70,48% del Plazo total del Contrato

Supervisor Técnico de Contrato ING. DIANA VIVANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO"

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	13,95%	41,42%
Valor básico de la Obra programada:	$ 133.258.018	$ 395.731.434

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,25%	27,23%
Valor básico de Obra Ejecutada:	$ 2.429.643	$ 255.557.847

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.
Contrato No.	CO1.PCCNTR.6947019
Valor Inicial:	$ 955.501.990,00
Plazo Inicial:	2 MESES
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	14 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Fecha de Suspensión 1	23 de diciembre de 2024
Fecha de Reinicio 1	14 de enero de 2025
Fecha de Terminación 2	22 de enero de 2024
Tiempo de Adición 1	2 MESES
Fecha de Terminación Con Adición en Tiempo 1	22 de marzo de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
Contrato No.	O1.PCCNTR.6973355 DEL 01/11/2024
Valor Actualizado:	$ 33.336.660,00
Plazo Inicial:	45 cuarenta y cinco dias calendario
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	14 de noviembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Continuar resane de paredes en piso 1, 2, 3 Y 4 en todas las áreas internas.
Demoliciones en unidades sanitarias piso 3
Continuar pintura para interiores en piso 1, 2, 3 Y 4 en áreas internas


ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar resanes y remates de pinturas en los 4 pisos en áreas interiores y corredores
Continuar con la instalación de todos los temas eléctricos

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Fecha de inicio 14 de noviembre de 2024
Fecha de terminación inicial 31 de diciembre de 2024
Fecha de suspensión No.1 23 de diciembre de 2024
Fecha de reinicio No. 1 14 de enero de 2025
Fecha de terminación No.2 22 de enero de 2025
Tiempo de adición No. 1 dos meses
Fecha de terminación según adición en tiempo No.1 22 de marzo de 2025

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO	Firma: Nombre: MARLON FERNANDO ARTEAGA P. Matrícula 52202-333602 NRÑ	Firma: Nombre: Matrícula

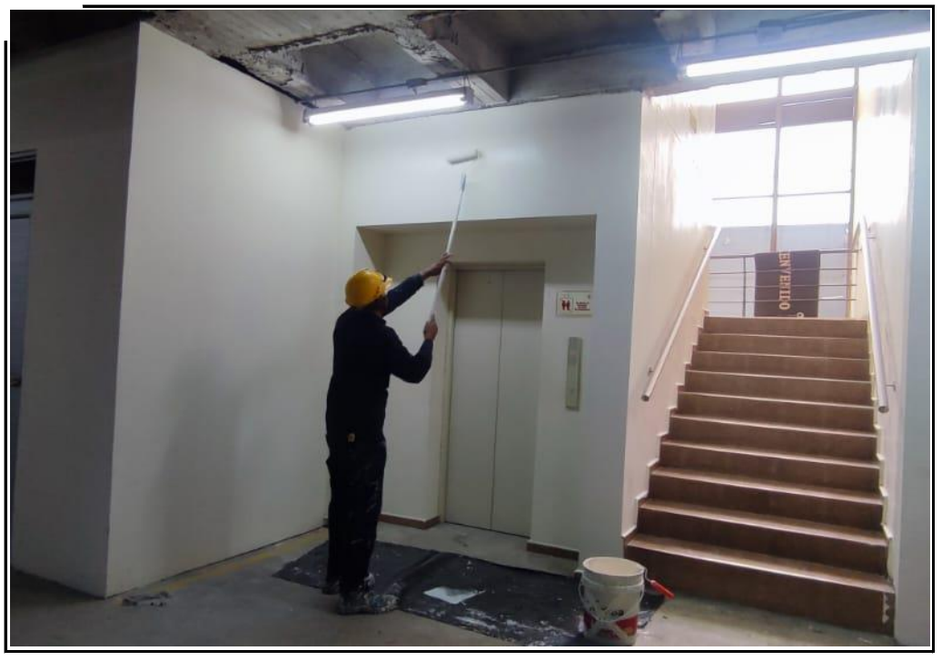

Fotografía: 1

Continuar resane de paredes en piso 1, 2, 3 Y 4 en todas las áreas internas.



Fotografía: 2

Continuar pintura para interiores en piso 1, 2, 3 Y 4 en áreas internas



Fotografía: 3

Continuar resane de paredes en piso 1, 2, 3 Y 4 en todas las áreas internas.



Fotografía: 4

Continuar con la instalación de todos los temas eléctricos



Fotografía: 5

Demoliciones en unidades sanitarias piso 3



Fotografía: 6

Continuar pintura para interiores en piso 1, 2, 3 Y 4 en áreas internas

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO		
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**CONTRATO DE OBRA No.**	CO1.PCCNTR.6947019
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.
	INTERVENTOR:	ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO

OBJETO "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO"

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	SEMANA 11		ACUMULADO		% EJECUTADO SEMANA 11
						CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	
1	**PRELIMINARES**									
1.1	**INICIALES**									
1.1.1	Localización y replanteo arquitectónico, incluye planos récord	M2	332,00	3.864	1.282.848	-	-	199,00	768.936	0,00%
1.1.2	Instalación y desinstalación de muro una cara drywall, provisional para cerrar las obras, incluye puerta con marco para ingreso de trabajadores	M2	53,00	77.249	4.094.197	-	-	22,00	1.699.478	0,00%
1.1.3	Señalización de obra en lona de 60x40cm impresión full color, incluye marco y anclaje	UND	9,00	60.693	546.237		-	9,00	546.237	
				Sub Total	**5.923.282**		**-**		**3.014.651**	**0,00%**
1.2	**DESMONTES Y RETIROS**									
1.2.1	Desmonte de marcos y puertas, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	57,00	26.406	1.505.142	-	-	55,00	1.452.330	0,00%
1.2.2	Desmonte de marco, ventana y vidrio, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	1,00	27.367	27.367	-	-	1,00	27.367	0,00%
1.2.3	Desmonte de cielo raso en fibra mineral y/o panel yeso y/o fibrocemento, incluye estructura soporte, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	M2	250,00	29.781	7.445.250	-	-	250,00	7.445.250	0,00%
1.2.4	Desmonte de Tasas sanitarias, orinales y lavamanos, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	UND	48,00	53.587	2.572.176	-	-	48,00	2.572.176	
1.2.5	Desmonte de instalaciones hidrosanitarias, incluye tuberías y accesorios, regatas y sellos provisionales, cargue a volqueta	UND	72,00	57.730	4.156.560	-	-	63,00	3.636.990	0,00%
1.2.6	Rasqueteo, cepillo y limpieza manual de superficies, con el fin de retirar impurezas y capas de pintura existentes.	M2	1017,00	4.863	4.945.671	-	-	1.017,00	4.945.671	0,00%
1.2.7	Retiro de luminarias ubicadas en cielos rasos y pared, incluye trasiego a punto de acopio	UND	46,00	21.660	996.360	-	-	46,00	996.360	0,00%
1.2.8	Retiro de redes eléctricas en piso, techo y pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	GL	1,00	2.233.550	2.233.550	-	-	1,00	2.233.550	
				Sub Total	**23.882.076**		**-**		**23.309.694**	**0,00%**
1.3	**DEMOLICIONES**									
1.3.1	Demolición muro E ≤ 15CM en mampostería maciza o hueca, incluye cortes con pulidora, trasiegos y cargue a volqueta.	M2	220,00	17.941	3.947.020	-	-	184,00	3.301.144	0,00%
1.3.2	Demolición de enchape de pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	704,40	14.760	10.396.413	-	-	648,12	9.566.251	0,00%
1.3.3	Demolición de enchapes de piso, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	283,00	13.980	3.956.340		-	142,00	1.985.160	
1.3.4	Demolición repello de piso, incluye picado Eprom = 0.03m, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	835,00	12.959	10.820.765		-	178,00	2.306.702	
1.3.5	Demolición repello de pared, muros mampostería eprom= 0.02m, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	291,80	15.119	4.411.785	-	-	291,00	4.399.629	
1.3.6	Cargue, transporte y retiro del material sobrante proveniente de las obras de mantenimiento, hasta el botadero.	M3	234,00	40.171	9.400.014	12,00	482.052	192,00	7.712.832	5,13%
1.3.7	Demolición de mesones en concreto, recubierto con granito incluye salpicadero	M2	11,00	37.722	414.942	-	-	7,00	264.054	0,00%
				Sub Total	**43.347.279**		**482.052**		**29.535.772**	**1,11%**
		TOTAL PRELIMINARES			**73.152.637**		**482.052**		**55.860.117**	**0,66%**
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**									
2.1	**RED SUMINISTRO AGUA POTABLE**									
2.1.1	Instalaciones PVC 1/2" RDE 13.5	ML	95,00	7.575	719.625	-	-	95,00	719.625	0,00%
2.1.2	Instalaciones PVC 3/4" RDE 21	ML	28,00	10.939	306.292		-	28,00	306.292	
2.1.3	Instalaciones PVC RDE 21 1"	ML	50,21	12.038	604.428	-	-	50,20	604.308	0,00%
2.1.4	Instalaciones PVC RDE 21 2"	ML	6,00	26.949	161.694	-	-	6,00	161.694	0,00%
2.1.5	Punto hidráulico PVC 1/2"	UND	60,00	24.174	1.450.440		-	60,00	1.450.440	
2.1.6	Punto hidráulico PVC 3/4"	UND	8,00	26.324	210.592	-	-		-	
2.1.7	Punto hidráulico PVC 1/2" incluye válvula control paso 1/2" y tapa PVC Blanca 15x15cm	UND	18,00	59.937	1.078.866	-	-		-	
				Sub Total	**4.531.937**		**-**		**3.242.359**	**0,00%**
2.2	**RED SANITARIA, PLUVIAL, VENTILACION**									
2.2.1	Instalaciones sanitarias PVC 2"	ML	58,00	25.087	1.455.046	-	-	58,00	1.455.046	0,00%
2.2.2	Instalaciones sanitarias PVC 4"	ML	119,00	42.006	4.998.714	-	-	72,00	3.024.432	0,00%
2.2.3	Instalaciones ventilación PVC 2"	ML	183,00	20.194	3.695.502	-	-	24,00	484.656	0,00%
2.2.4	Instalaciones ventilación PVC 3"	ML	35,00	31.646	1.107.610		-		-	
2.2.5	Punto sanitario 4" WC	UND	32,00	45.965	1.470.880		-	32,00	1.470.880	
2.2.6	Punto sanitario 2"	UND	44,00	33.894	1.491.336		-	36,00	1.220.184	
2.2.7	Suministro e instalación de rejilla de piso en acero inoxidable cuadrada de 10cm salida a tubería 2"	UND	24,00	48.380	1.161.120	-	-	24,00	1.161.120	0,00%
2.2.8	Suministro e instalación de tubería de conexión de desagües de aires acondicionados	ML	36,00	20.194	726.984		-		-	
				Sub Total	**16.107.192**		**-**		**8.816.318**	**0,00%**
		TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**20.639.129**		**-**		**12.058.677**	**0,00%**
3	**RED ELECTRICA**									
3.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**									
3.1.1	S.I.P. Salida toma doble GFCI 1F/20AMP en tubería PVC SCH40 1/2", caja galvanizada y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	16,00	171.144	2.738.304		-		-	
3.1.2	S.I.P. Salida sensor de movimiento tipo interruptor 360° 1F/15AMP En muro, Tubería PVC SCH40 D:1/2", Cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	32,00	138.700	4.438.400		-		-	
3.1.3	S.I.P Luminaria de sobreponer 400x120 para uso interior, fabricada en lámina de acero COLD ROLLED, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate y difusor lamina acrílico opalizado L11. Producto para instalación de sobreponer, en temperatura de color 5000K flujo lumínico de 4400Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 28.56W	UND	4,00	424.118	1.696.472		-		-	

3.1.4	S.I.P. Luminaria tipo bala 72x83 para incrustar, Producto tipo DOWNLIGHT de uso interior fabricado en aluminio inyectado, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate en temperatura de color 6500K flujo lumínico de 550Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 6.00W.	UND	40,00	65.207	2.608.280		-		-	
3.1.5	S.I.P Luminaria tipo bala GS 15W 5000K	Und	12,00	144.940	1.739.280		-		-	
3.1.6	S.I.P Letrero lumínico de emergencia SALIDA 90E 300X185X45 2.6W 120-277V SOBREPONER	UND	20,00	107.422	2.148.440		-		-	
3.1.7	S.I.P Luminaria de emergencia 185X50X108 SOBREPONER 2-BL 2W	UND	40,00	112.486	4.499.440		-		-	
3.1.8	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP en techo, Tubería D:1/2" SCH40, Caja octogonal y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	66,00	123.004	8.118.264		-		-	
3.1.9	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP emergencia, Tubería D:1/2 EMT, Caja RADWELL 5800 y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, incluye fijación, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	45,00	178.147	8.016.615		-		-	
3.1.10	S.I.A. Tablero de circuitos para baños, incluye 6 protecciones de 20A	UND	4,00	826.632	3.306.528		-		-	
				Sub Total	**39.310.023**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS			**39.310.023**		**-**		**-**	**0,00%**
4	**MUROS**									
4.1	Suministro e instalación de muro doble cara en lámina de fibrocemento 8mm. Estructura base 6. incluye estuco y dos manos de pintura	M2	84,00	171.543	14.409.612	-	-	84,00	14.409.612	0,00%
4.2	Carteras en lámina de fibrocemento 8mm dos caras, en marco ventana y puertas	ML	163,80	68.788	11.267.474	-	-	66,00	4.540.008	0,00%
				Sub Total	**25.677.086**		**-**		**18.949.620**	**0,00%**
		TOTAL MAMPOSTERIA			**25.677.086**		**-**		**18.949.620**	**0,00%**
5	**REPELLOS**									
5.1	Repello de piso y pared con mortero 1:4 espesor 2cm. Incluye aditivo impermeabilizante.	M2	1374,872	44.402	61.047.067	32,00	1.420.864	474,00	21.046.548	2,33%
5.2	Impermeabilización de losa de entrepiso y muros laterales de terraza, con recubrimiento impermeabilizante acrílico de alto desempeño con tecnología DFX y fibras para impermeabilizar cubiertas	M2	660,00	51.240	33.818.400		-		-	
				Sub Total	**94.865.467**		**1.420.864**		**21.046.548**	**1,50%**
		TOTAL REPELLOS			**94.865.467**		**1.420.864**		**21.046.548**	**1,50%**
6	**ENCHAPES**									
6.1	**PISOS**									
6.1.1	Enchape cerámica de piso estructurado 20.6x92.6cm, uso comercial moderado	M2	258,00	132.605	34.212.090		-		-	
6.1.2	Enchape cerámica de piso 60x60cm color gris, uso exteriores tráfico comercial	M2	88,00	100.281	8.824.728		-		-	
6.1.3	Acabado para uniones entre muro y losa de piso en media caña con mortero 1-4 H: 0,07m	ML	85,00	27.327	2.322.795		-		-	
				Sub Total	**45.359.613**		**-**		**-**	
6.2	**PARED**									
6.2.1	Enchape cerámica de pared color marfil caras diferenciadas 30.1x75.3cm	M2	457,00	113.777	51.996.089		-		-	
6.2.2	Guarda canto flecha 8 milímetros cromo aluminio mate	ML	31,00	12.988	402.628		-		-	
6.2.3	Suministro e instalación de espejo E= 3mm flotante biselado en sus cuatro lados sobre soporte metálico	M2	20,00	361.837	7.236.740		-		-	
6.2.4	Mesón en granito artificial verde uva tuba incluye solapa inferior en aglomerado ancho 50cm con melamina, ancho de mesón 0.60m	ML	17,00	1.146.712	19.494.104		-		-	
				Sub Total	**79.129.561**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL ENCHAPES			**124.489.174**		**-**		**-**	**0,00%**
7	**ESTUCOS**									
7.1	Estuco acrílico para exteriores, incluye juntas, filos y dilataciones	M2	320,00	21.750	6.960.000		-		-	
7.2	Estuco plástico para muros y resanes incluye juntas, filos y dilataciones	M2	973,00	16.641	16.191.693	-	-	973,00	16.191.693	
				Sub Total	**23.151.693**		**-**		**16.191.693**	**0,00%**
		TOTAL ESTUCOS			**23.151.693**		**-**		**16.191.693**	**0,00%**
8	**PINTURA**									
8.1	Pintura de muros en mampostería 3 manos, vinilo tipo 1, lavable	M2	5137,00	12.785	65.676.545	-	-	5.047,00	64.525.895	0,00%
8.2	Pintura para exteriores (3 manos) para paredes.	M2	1280,00	27.659	35.403.520		-		-	
8.3	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial ancho 10cm, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, para pavimento rígido	ML	173,52	14.418	2.501.811		-		-	
8.4	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial, números con circunferencias de 66 y 40cm para carros y motos. imprimación en negro y pintura tráfico vehicular, incluye micro esferas, para pavimento rígido	UND	42,00	30.758	1.291.836		-		-	
8.5	Aplicación de pintura en frio base solvente para flechas de ingreso y salida, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, sobre pavimento rígido	M2	27,00	59.594	1.609.038		-		-	
				Sub Total	**106.482.750**		**-**		**64.525.895**	**0,00%**
		TOTAL PINTURA			**106.482.750**		**-**		**64.525.895**	**0,00%**
9	**CARPINTERIAS**									
9.1	Suministro e instalación de puerta de dos hojas batientes elaborada en tubular aluminio estriado ANOLOC, incluye chapa pomo de alcoba metálica pasador y argolla para candado. Medidas de cada hoja 0.9mx2.10m (ver plano A-022, P-T3)	UND	1,00	2.374.136	2.374.136		-		-	
9.2	Sellado de juntas entre muros y marcos de ventanería con sellador de juntas de poliuretano.	ML	367,00	11.048	4.054.616		-		-	
				Sub Total	**6.428.752**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL CARPINTERIAS			**6.428.752**		**-**		**-**	**0,00%**
10	**CUBIERTAS Y CIELO RASO**									
10.2	Limpieza, lavado, cambio de amarras y ganchos, aplicación de sellante en amarras de policarbonato alveolar	M2	33,00	32.738	1.080.354		-		-	
10.3	Suministro e instalación de cielo raso desmontable, láminas de fibra mineral 0,60m x 0,60m, incluye estructura	M2	220,00	89.265	19.638.300		-		-	
				Sub Total	**20.718.654**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL CUBIERTAS Y CIELO RASO			**20.718.654**		**-**		**-**	**0,00%**
11	**APARATOS SANITARIOS Y DOTACION BAÑOS**									

11.1	Kit Taza sanitaria entrada superior con fluxómetro con sensor, blanco institucional (Incluye Taza Sanitaria para Fluxómetro, asiento sanitario, sensor, sistema conexión entrada superior)	UND	4	3.778.631	15.114.524		-		-	
11.2	Taza sanitaria alongado, blanco institucional ultra ahorradora (Sanitario con push)	UND	28	1.228.494	34.397.832		-		-	
11.3	Barra de seguridad Fija Recta en acero inoxidable (baño para personas con movilidad reducida), incluye anclajes	UND	4	463.827	1.855.308		-		-	
11.4	Barra de seguridad abatible (baño para personas con movilidad reducida) incluye anclajes	UND	4	641.649	2.566.596		-		-	
11.5	Lavamanos blanco institucional, para personas con movilidad reducida, incluye anclajes	UND	4	553.338	2.213.352		-		-	
11.6	Lavamanos blanco institucional, para incrustar en mesones	UND	20	328.045	6.560.900		-		-	
11.7	Suministro e instalación de brazo de soporte para lavamanos	JUEGO	4	288.360	1.153.440		-		-	
11.8	Suministro e instalación de grifería para lavamanos y desagüe tipo botella sencillo incluye acople	UND	24	62.127	1.491.048		-		-	
11.9	Construcción lava traperos 70x50x50cm, enchapado.	UND	4	622.329	2.489.316		-		-	
11.10	Kit Orinal arrecife o similar para fluxómetro	UND	8	1.284.163	10.273.304		-		-	
11.11	Dispensador De Papel Higiénico Acero Inoxidable Diámetro De 26 Cm	UND	16	157.457	2.519.312		-		-	
11.12	Papelera metálica en acero inoxidable según especificaciones	UND	32	530.403	16.972.896		-		-	
11.13	Dispensador de jabón para empotrar en pared, en acero inoxidable, 1.2Litros	UND	16	253.414	4.054.624		-		-	
11.14	Suministro e instalación de divisiones sanitarias a piso en acero inoxidable AISI SAE 304 para baños de uso institucional. Batería completa con tres (3) cubículos para unidades sanitarias. Incluye tornillería y accesorios.	UND	8,00	8.420.295	67.362.360		-		-	
11.15	Dispensador De Toallas De Papel En Z Acero Inoxidable De 27x27x10 Cm	UND	16,00	186.293	2.980.688		-		-	
				Sub Total	**172.005.500**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL APARATOS SANITARIOS			**172.005.500**		**-**		**-**	**0,00%**
12	**SEÑALIZACIÓN**									
12.1	Suministro e instalación de placa de señalización de 0,65 x 0,50 m con planimetría salidas de emergencia, en acrílico de 2.4 con impresión full color y regletas en MDF para su instalación.	UND	5,00	229.178	1.145.890		-		-	
12.2	Suministro e instalación Franjas Guías longitudinales de ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	600,00	10.725	6.435.000		-		-	
12.3	Suministro e instalación de Punto alerta ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	2100,00	5.658	11.881.800		-		-	
12.4	Suministro e Instalación de Loseta alerta en policarbonato, 20 x 20 cm., Altura total: 5mm, Peso 150 gr, incluye anclaje	UND	15,00	43.268	649.020		-		-	
12.5	Suministro e instalación de letreros luminosos informativos en parqueadero doble cara, ubicado en sótano 1.50x0.40m	UND	3,00	576.720	1.730.160		-		-	
12.6	Suministro e instalación de letras en acero inoxidable de la frase: PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA y Escudo de la Rama judicial diámetro 50cm, tamaño de letra 30cm cada una, según diseño	UND	1,00	5.767.200	5.767.200		-		-	
				Sub Total	**27.609.070**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL SEÑALIZACIÓN			**27.609.070**		**-**		**-**	**0,00%**
13	**VARIOS Y ASEO GENERAL**									
13.1	Brigada de aseo	PERSONA/ MES	6,00	2.304.481	13.826.886	-	-	5,00	11.522.405	0,00%
				Sub Total	**13.826.886**		**-**		**11.522.405**	**0,00%**
		TOTAL VARIOS Y ASEO			**13.826.886**		**-**		**11.522.405**	**0,00%**

TOTAL COSTO DIRECTO:	748.356.821		1.902.916		200.154.955	**0,25%**
ADMINISTRACIÓN (18.73%)	140.167.233		356.416		37.489.023	
IMPREVISTOS (3%)	22.450.705		57.087		6.004.649	
UTILIDAD (5%)	37.417.841		95.146		10.007.748	
IVA (19%)	7.109.390		18.078		1.901.472	
TOTAL PRESUPUESTO:	**955.501.990**		**2.429.643**		**255.557.847**	**0,25%**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO
INFORME SEMANAL DE OBRA N° 11

PÁGINA	1	DE	2

I. INFORMACIÓN GENERAL

N° CONTRATO Y FECHA: CO1.PCCNTR.6947019 del 29 de octubre de 2024 — TRAMO (S): N.A. — FECHA: 16/02/2025

ENTIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO — SEMANA No.: 11 del 10/02/2025 al 16/02/2025

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. DIANA VIVANCO — ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO

OBJETO: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO" — FECHA DE INICIO: 14/11/2024

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA
INTEGRANTES: REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO MANRIQUE

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.6947019 del 29 de octubre de 2024
PLAZO INICIAL: 45 dias
PLAZO ADICIONAL: 60 días
PLAZO ACUMULADO: 105 días
VALOR INICIAL: $ 955.501.990,00
ADICIONES: $ 0,00
VALOR ACUMULADO: $ 955.501.990,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
INTEGRANTES:

CONTRATO No.: O1.PCCNTR.6973355
PLAZO INICIAL: 45 cuarenta y cinco días
PLAZO ACUMULADO:
VALOR INICIAL: $ 33.336.660,00
ADICIONES: $ 0,00
VALOR ACUMULADO: $ 33.336.660,00

II. AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS OBRA:

ESTUDIOS Y DISEÑOS:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ -
OBRA:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 0,00
TOTAL OBRA + EST Y DISEÑOS:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 0,00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 0,00


INTERVENTORÍA:
COSTOS EJECUTADOS ACUMULADOS:
COSTOS PROGRAMADOS ACUMULADOS:

ESTUDIOS Y DISEÑOS SEMANAL:
PROGRAMADA: $ -
EJECUTADA: $ -
OBRA SEMANAL:
PROGRAMADA: $ 0,00
EJECUTADA: $ 0,00
TOTAL OBRA + E Y D SEMANAL:
PROGRAMADA: $ 0,00
EJECUTADA: $ 0,00

III. AVANCE FÍSICO

EJECUTADO ACUMULADO PROYECTO

DESCRIPCIÓN	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	TOTAL
Iniciales			10,04%	10,04%	10,04%	9,22%		6,52%	5,03%					50,89%
Desmonte y Retiros			6,42%	16,74%	12,74%	9,49%		11,16%	20,69%	6,36%				83,60%
Demoliciones			13,12%	12,12%	7,74%	4,65%	11,85%	4,68%	11,18%	7,25%	1,11%			73,70%
Estucos Interiores				2,30%	13,30%	9,51%	33,83%							58,94%
Red Suministro Agua Potable						29,80%	29,80%		11,94%					71,54%
Red Sanitaria, Pluvial, Ventilación						16,32%	18,00%		20,42%					54,74%
Repellos						4,12%	4,12%	4,17%	5,85%	2,43%	1,50%			22,19%
Pinturas							26,92%	19,86%	11,48%	1,30%				59,56%
Varios y Aseo General								33,3%	33,33%	16,67%				83,30%
Muros									59,76%	14,04%				73,80%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
AVANCE OBRA COSTOS DIRECTOS														0,00%
AVANCE OBRA TOTAL														0,00%

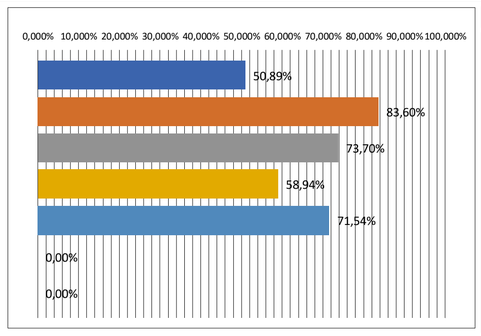

MAQUINARIA Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	MES 1	TOTAL
HERRAMIENTA MENOR		
TALADRO PERCUTOR		

S 1: $ 0,00 — S 2: $ 0,00 — S 3: $ 14.250.052,00 — S 4: $ 16.506.584,00 — S 5: $ 12.860.904,00 — S 6: $ 21.932.972,00
S 7: $ 63.571.724,00 — S 8: $ 44.417.781,00 — S 9: $ 65.939.566,00 — S 10: $ 18.206.179,00 — S 11: $ 2.429.643,00 — S 12: — S 13: —

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

	SI	NO	N/A
BOTADEROS	X		
LICENCIA AMBIENTAL:			
APROVECHAMIENTO FORESTAL:			
CONCESIÓN DE AGUAS:			
OCUPACIÓN DE CAUCES:			
VERTIMIENTOS:			
EMISIONES:			

OBSERVACIONE: La escombrera Palermo, se encuentra ubicada en la verada Caliyaco, ubicada en zona rural del municiipio de Mocoa Putumayo, Gestor de disposición final de RCD, autorizado mediante resolución 00003 de 08/07/2019 código de Inscripción DPT-3389-25-07-2019 / km 1:200 Vía a Villagarzón.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 10
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0,0
SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 0,0

OBSERVACIONES: El personal mano de obra no calificada es en su totalidad es de la vereda brisas del Mocoa. La selección de las hojas de vida se realizo de la documentación entregada por la JAC quienes realizaron la convocatoria y certificaron que las persona sean del sector.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ADMINISTRATIVAS, LEGALES, FINANCIERAS

FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA E INTERVENTORIA, AFILIACION DEL PERSONAL A LAS ENTIDADES ASEGURADORAS Y DE SALUD.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO
INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N° 11

PÁGINA	2	DE	2

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO" — TRAMO (S): N.A. — FECHA: 16/02/2025

SECRETARIA EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO — RAMA JUDICIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 11 del 10/02/2025 al 16/02/2025

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

TÉCNICAS

Continuar resane de paredes en piso 1, 2, 3 Y 4 en todas las áreas internas.
Demoliciones en unidades sanitarias piso 3
Continuar pintura para interiores en piso 1, 2, 3 Y 4 en áreas internas

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

AMBIENTAL Y SST

El componente de seguridad y salud en el trabajo realizo el seguimiento punto a punto del plan de manejo básico de seguridad y salud en el trabajo en el cual se encontró lo siguiente :
Se realizan charlas preoperacionales, entrega en epps, demarcación de zonas con cinta peligro.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar resanes y remates de pinturas en los 4 pisos en áreas interiores y corredores
Continuar con la instalación de todos los temas eléctricos

NOTA:

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES

Fecha de reinicio No. 1 14 de enero de 2025
Fecha de terminación No.2 22 de enero de 2025
Tiempo de adición No. 1 dos meses
Fecha de terminación según adición en tiempo No.1 22 de marzo de 2025

OBSERVACIONES:	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA:	FIRMA:
	NOMBRE: MARLON FERNANDO ARTEAGA POTOSI	NOMBRE: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
	N° MAT: 52202-333602 NRÑ	No. MAT: 63202094726 QND

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

INFORME SEMANAL DE OBRA N° 12

PÁGINA	1	DE	1

SECRETARIA EJECUTORA: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO

FECHA: 23 / 2 / 2025

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.6947019

Semana Número: 12 Del: 17/02/2025 Al: 23/02/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 81 Días Corresponde al : 77,14% del Plazo total del Contrato

Supervisor Técnico de Contrato ING. DIANA VIVANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO"

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	15,60%	57,02%
Valor básico de la Obra programada:	$ 149.082.486	$ 544.813.920

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,15%	27,38%
Valor básico de Obra Ejecutada:	$ 1.438.510	$ 258.465.506

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.
Contrato No.	CO1.PCCNTR.6947019
Valor Inicial:	$ 955.501.990,00
Plazo Inicial:	2 MESES
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	14 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Fecha de Suspensión 1	23 de diciembre de 2024
Fecha de Reinicio 1	14 de enero de 2025
Fecha de Terminación 2	22 de enero de 2024
Tiempo de Adición 1	2 MESES
Fecha de Terminación Con Adición en Tiempo 1	22 de marzo de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
Contrato No.	O1.PCCNTR.6973355 DEL 01/11/2024
Valor Actualizado:	$ 33.336.660,00
Plazo Inicial:	45 cuarenta y cinco dias calendario
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	14 de noviembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Continuar resane de paredes en piso 1, 2, 3 Y 4 en todas las áreas internas.
Pintura en sótano
Continuar pintura para interiores en piso 1, 2, 3 Y 4 en áreas internas

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar resanes y remates de pinturas en los 4 pisos en áreas interiores y corredores
Continuar con la instalación de todos los temas eléctricos

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Fecha de inicio 14 de noviembre de 2024
Fecha de terminación inicial 31 de diciembre de 2024
Fecha de suspensión No.1 23 de diciembre de 2024
Fecha de reinicio No. 1 14 de enero de 2025
Fecha de terminación No.2 22 de enero de 2025
Tiempo de adición No. 1 dos meses
Fecha de terminación según adición en tiempo No.1 22 de marzo de 2025

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO	Firma: Nombre: MARLON FERNANDO ARTEAGA P. Matrícula 52202-333602 NRÑ	Firma: Nombre: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO Matrícula 63202094726 QND




Fotografía: 1

Continuar resane de paredes en piso 1, 2, 3 Y 4 en todas las áreas internas.




Fotografía: 2

Continuar pintura para interiores en piso 1, 2, 3 Y 4 en áreas internas

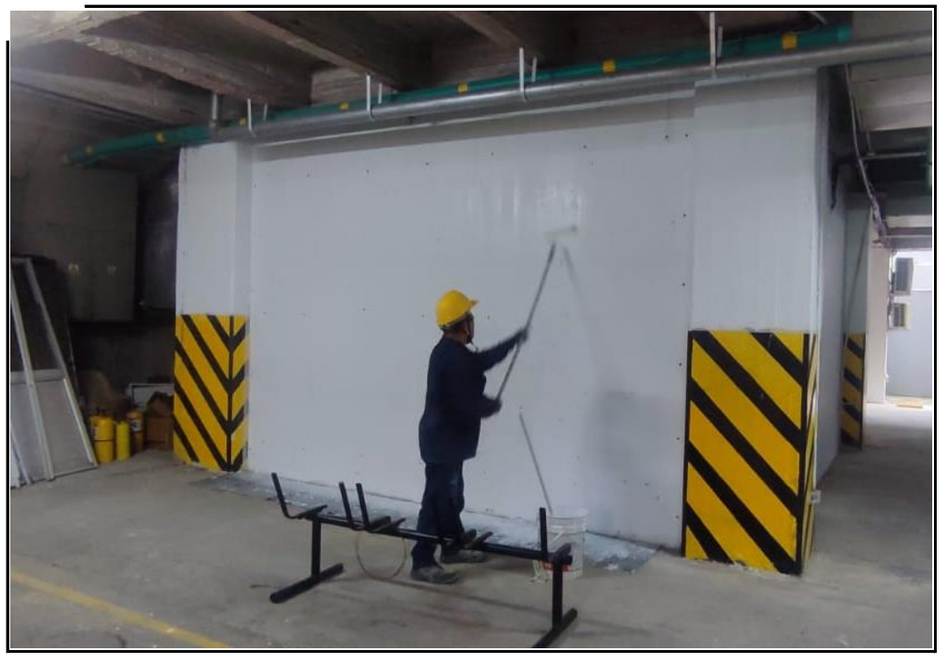

Fotografía: 3

Pintura en sótano

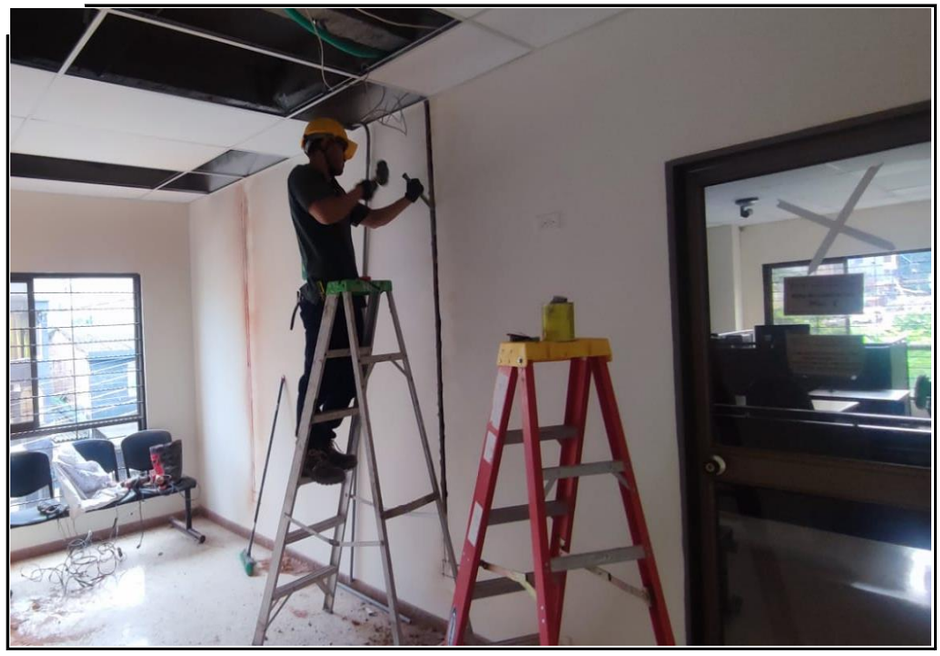

Fotografía: 4

Continuar con la instalación de todos los temas eléctricos



Fotografía: 5

Pintura en sótano



Fotografía: 6

Pintura en sótano

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No.	CO1.PCCNTR.6947019
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.
INTERVENTOR:	ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO

OBJETO "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO"

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	SEMANA 12		ACUMULADO		% EJECUTADO SEMANA 12
						CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	
1	**PRELIMINARES**									
1.1	**INICIALES**									
1.1.1	Localización y replanteo arquitectónico, incluye planos récord	M2	332,00	3.864	1.282.848	-	-	199,00	768.936	0,00%
1.1.2	Instalación y desinstalación de muro una cara drywall, provisional para cerrar las obras, incluye puerta con marco para ingreso de trabajadores	M2	53,00	77.249	4.094.197	-	-	22,00	1.699.478	0,00%
1.1.3	Señalización de obra en lona de 60x40cm impresión full color, incluye marco y anclaje	UND	9,00	60.693	546.237		-	9,00	546.237	
				Sub Total	**5.923.282**		**-**		**3.014.651**	**0,00%**
1.2	**DESMONTES Y RETIROS**									
1.2.1	Desmonte de marcos y puertas, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	57,00	26.406	1.505.142	-	-	55,00	1.452.330	0,00%
1.2.2	Desmonte de marco, ventana y vidrio, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	1,00	27.367	27.367	-	-	1,00	27.367	0,00%
1.2.3	Desmonte de cielo raso en fibra mineral y/o panel yeso y/o fibrocemento, incluye estructura soporte, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	M2	250,00	29.781	7.445.250	-	-	250,00	7.445.250	0,00%
1.2.4	Desmonte de Tasas sanitarias, orinales y lavamanos, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	UND	48,00	53.587	2.572.176	-	-	48,00	2.572.176	
1.2.5	Desmonte de instalaciones hidrosanitarias, incluye tuberías y accesorios, regatas y sellos provisionales, cargue a volqueta	UND	72,00	57.730	4.156.560	7,00	404.110	70,00	4.041.100	9,72%
1.2.6	Rasqueteo, cepillo y limpieza manual de superficies, con el fin de retirar impurezas y capas de pintura existentes.	M2	1017,00	4.863	4.945.671	-	-	1.017,00	4.945.671	0,00%
1.2.7	Retiro de luminarias ubicadas en cielos rasos y pared, incluye trasiego a punto de acopio	UND	46,00	21.660	996.360	-	-	46,00	996.360	0,00%
1.2.8	Retiro de redes eléctricas en piso, techo y pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	GL	1,00	2.233.550	2.233.550	-	-	1,00	2.233.550	
				Sub Total	**23.882.076**		**404.110**		**23.713.804**	**1,69%**
1.3	**DEMOLICIONES**									
1.3.1	Demolición muro E ≤ 15CM en mampostería maciza o hueca, incluye cortes con pulidora, trasiegos y cargue a volqueta.	M2	220,00	17.941	3.947.020	-	-	184,00	3.301.144	0,00%
1.3.2	Demolición de enchape de pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	704,40	14.760	10.396.413	-	-	648,12	9.566.251	0,00%
1.3.3	Demolición de enchapes de piso, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	283,00	13.980	3.956.340		-	142,00	1.985.160	
1.3.4	Demolición repello de piso, incluye picado Eprom = 0.03m, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	835,00	12.959	10.820.765		-	178,00	2.306.702	
1.3.5	Demolición repello de pared, muros mampostería eprom= 0.02m, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	291,80	15.119	4.411.785	-	-	291,00	4.399.629	
1.3.6	Cargue, transporte y retiro del material sobrante proveniente de las obras de mantenimiento, hasta el botadero.	M3	234,00	40.171	9.400.014	6,00	241.026	198,00	7.953.858	2,56%
1.3.7	Demolición de mesones en concreto, recubierto con granito incluye salpicadero	M2	11,00	37.722	414.942	-	-	7,00	264.054	0,00%
				Sub Total	**43.347.279**		**241.026**		**29.776.798**	**0,56%**
		TOTAL PRELIMINARES			**73.152.637**		**645.136**		**56.505.253**	**0,88%**
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**									
2.1	**RED SUMINISTRO AGUA POTABLE**									
2.1.1	Instalaciones PVC 1/2" RDE 13.5	ML	95,00	7.575	719.625	-	-	95,00	719.625	0,00%
2.1.2	Instalaciones PVC 3/4" RDE 21	ML	28,00	10.939	306.292		-	28,00	306.292	
2.1.3	Instalaciones PVC RDE 21 1"	ML	50,21	12.038	604.428	-	-	50,20	604.308	0,00%
2.1.4	Instalaciones PVC RDE 21 2"	ML	6,00	26.949	161.694	-	-	6,00	161.694	0,00%
2.1.5	Punto hidráulico PVC 1/2"	UND	60,00	24.174	1.450.440		-	60,00	1.450.440	
2.1.6	Punto hidráulico PVC 3/4"	UND	8,00	26.324	210.592	-	-		-	
2.1.7	Punto hidráulico PVC 1/2" incluye válvula control paso 1/2" y tapa PVC Blanca 15x15cm	UND	18,00	59.937	1.078.866	-	-		-	
				Sub Total	**4.531.937**		**-**		**3.242.359**	**0,00%**
2.2	**RED SANITARIA, PLUVIAL, VENTILACION**									
2.2.1	Instalaciones sanitarias PVC 2"	ML	58,00	25.087	1.455.046	-	-	58,00	1.455.046	0,00%
2.2.2	Instalaciones sanitarias PVC 4"	ML	119,00	42.006	4.998.714	-	-	72,00	3.024.432	0,00%
2.2.3	Instalaciones ventilación PVC 2"	ML	183,00	20.194	3.695.502	-	-	24,00	484.656	0,00%
2.2.4	Instalaciones ventilación PVC 3"	ML	35,00	31.646	1.107.610		-		-	
2.2.5	Punto sanitario 4" WC	UND	32,00	45.965	1.470.880		-	32,00	1.470.880	
2.2.6	Punto sanitario 2"	UND	44,00	33.894	1.491.336		-	36,00	1.220.184	
2.2.7	Suministro e instalación de rejilla de piso en acero inoxidable cuadrada de 10cm salida a tubería 2"	UND	24,00	48.380	1.161.120	-	-	24,00	1.161.120	0,00%
2.2.8	Suministro e instalación de tubería de conexión de desagües de aires acondicionados	ML	36,00	20.194	726.984		-		-	
				Sub Total	**16.107.192**		**-**		**8.816.318**	**0,00%**
		TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**20.639.129**		**-**		**12.058.677**	**0,00%**
3	**RED ELECTRICA**									
3.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**									
3.1.1	S.I.P. Salida toma doble GFCI 1F/20AMP en tubería PVC SCH40 1/2", caja galvanizada y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	16,00	171.144	2.738.304		-		-	
3.1.2	S.I.P. Salida sensor de movimiento tipo interruptor 360° 1F/15AMP En muro, Tubería PVC SCH40 D:1/2", Cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	32,00	138.700	4.438.400		-		-	
3.1.3	S.I.P Luminaria de sobreponer 400x120 para uso interior, fabricada en lámina de acero COLD ROLLED, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate y difusor lamina acrílico opalizado L11. Producto para instalación de sobreponer, en temperatura de color 5000K flujo lumínico de 4400Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 28.56W	UND	4,00	424.118	1.696.472		-		-	

3.1.4	S.I.P. Luminaria tipo bala 72x83 para incrustar, Producto tipo DOWNLIGHT de uso interior fabricado en aluminio inyectado, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate en temperatura de color 6500K flujo lumínico de 550Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 6.00W.	UND	40,00	65.207	2.608.280		-		-	
3.1.5	S.I.P Luminaria tipo bala GS 15W 5000K	Und	12,00	144.940	1.739.280		-		-	
3.1.6	S.I.P Letrero lumínico de emergencia SALIDA 90E 300X185X45 2.6W 120-277V SOBREPONER	UND	20,00	107.422	2.148.440		-		-	
3.1.7	S.I.P Luminaria de emergencia 185X50X108 SOBREPONER 2-BL 2W	UND	40,00	112.486	4.499.440		-		-	
3.1.8	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP en techo, Tubería D:1/2" SCH40, Caja octogonal y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	66,00	123.004	8.118.264		-		-	
3.1.9	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP emergencia, Tubería D:1/2 EMT, Caja RADWELL 5800 y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, incluye fijación, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	45,00	178.147	8.016.615		-		-	
3.1.10	S.I.A. Tablero de circuitos para baños, incluye 6 protecciones de 20A	UND	4,00	826.632	3.306.528		-		-	
				Sub Total	**39.310.023**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS			**39.310.023**		**-**		**-**	**0,00%**
4	**MUROS**									
4.1	Suministro e instalación de muro doble cara en lámina de fibrocemento 8mm. Estructura base 6. incluye estuco y dos manos de pintura	M2	84,00	171.543	14.409.612	-	-	84,00	14.409.612	0,00%
4.2	Carteras en lámina de fibrocemento 8mm dos caras, en marco ventana y puertas	ML	163,80	68.788	11.267.474	7,00	481.516	73,00	5.021.524	4,27%
				Sub Total	**25.677.086**		**481.516**		**19.431.136**	**1,88%**
		TOTAL MAMPOSTERIA			**25.677.086**		**481.516**		**19.431.136**	**1,88%**
5	**REPELLOS**									
5.1	Repello de piso y pared con mortero 1:4 espesor 2cm. Incluye aditivo impermeabilizante.	M2	1374,872	44.402	61.047.067	-	-	474,00	21.046.548	0,00%
5.2	Impermeabilización de losa de entrepiso y muros laterales de terraza, con recubrimiento impermeabilizante acrílico de alto desempeño con tecnología DFX y fibras para impermeabilizar cubiertas	M2	660,00	51.240	33.818.400		-		-	
				Sub Total	**94.865.467**		**-**		**21.046.548**	**0,00%**
		TOTAL REPELLOS			**94.865.467**		**-**		**21.046.548**	**0,00%**
6	**ENCHAPES**									
6.1	**PISOS**									
6.1.1	Enchape cerámica de piso estructurado 20.6x92.6cm, uso comercial moderado	M2	258,00	132.605	34.212.090		-		-	
6.1.2	Enchape cerámica de piso 60x60cm color gris, uso exteriores tráfico comercial	M2	88,00	100.281	8.824.728		-		-	
6.1.3	Acabado para uniones entre muro y losa de piso en media caña con mortero 1-4 H: 0,07m	ML	85,00	27.327	2.322.795		-		-	
				Sub Total	**45.359.613**		**-**		**-**	
6.2	**PARED**									
6.2.1	Enchape cerámica de pared color marfil caras diferenciadas 30.1x75.3cm	M2	457,00	113.777	51.996.089		-		-	
6.2.2	Guarda canto flecha 8 milímetros cromo aluminio mate	ML	31,00	12.988	402.628		-		-	
6.2.3	Suministro e instalación de espejo E= 3mm flotante biselado en sus cuatro lados sobre soporte metálico	M2	20,00	361.837	7.236.740		-		-	
6.2.4	Mesón en granito artificial verde uva tuba incluye solapa inferior en aglomerado ancho 50cm con melamina, ancho de mesón 0.60m	ML	17,00	1.146.712	19.494.104		-		-	
				Sub Total	**79.129.561**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL ENCHAPES			**124.489.174**		**-**		**-**	**0,00%**
7	**ESTUCOS**									
7.1	Estuco acrílico para exteriores, incluye juntas, filos y dilataciones	M2	320,00	21.750	6.960.000		-		-	
7.2	Estuco plástico para muros y resanes incluye juntas, filos y dilataciones	M2	973,00	16.641	16.191.693	-	-	973,00	16.191.693	
				Sub Total	**23.151.693**		**-**		**16.191.693**	**0,00%**
		TOTAL ESTUCOS			**23.151.693**		**-**		**16.191.693**	**0,00%**
8	**PINTURA**									
8.1	Pintura de muros en mampostería 3 manos, vinilo tipo 1, lavable	M2	5137,00	12.785	65.676.545	-	-	5.137,00	65.676.545	0,00%
8.2	Pintura para exteriores (3 manos) para paredes.	M2	1280,00	27.659	35.403.520		-		-	
8.3	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial ancho 10cm, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, para pavimento rígido	ML	173,52	14.418	2.501.811		-		-	
8.4	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial, números con circunferencias de 66 y 40cm para carros y motos. imprimación en negro y pintura tráfico vehicular, incluye micro esferas, para pavimento rígido	UND	42,00	30.758	1.291.836		-		-	
8.5	Aplicación de pintura en frio base solvente para flechas de ingreso y salida, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, sobre pavimento rígido	M2	27,00	59.594	1.609.038		-		-	
				Sub Total	**106.482.750**		**-**		**65.676.545**	**0,00%**
		TOTAL PINTURA			**106.482.750**		**-**		**65.676.545**	**0,00%**
9	**CARPINTERIAS**									
9.1	Suministro e instalación de puerta de dos hojas batientes elaborada en tubular aluminio estriado ANOLOC, incluye chapa pomo de alcoba metálica pasador y argolla para candado. Medidas de cada hoja 0.9mx2.10m (ver plano A-022, P-T3)	UND	1,00	2.374.136	2.374.136		-		-	
9.2	Sellado de juntas entre muros y marcos de ventanería con sellador de juntas de poliuretano.	ML	367,00	11.048	4.054.616		-		-	
				Sub Total	**6.428.752**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL CARPINTERIAS			**6.428.752**		**-**		**-**	**0,00%**
10	**CUBIERTAS Y CIELO RASO**									
10.2	Limpieza, lavado, cambio de amarras y ganchos, aplicación de sellante en amarras de policarbonato alveolar	M2	33,00	32.738	1.080.354		-		-	
10.3	Suministro e instalación de cielo raso desmontable, láminas de fibra mineral 0,60m x 0,60m, incluye estructura	M2	220,00	89.265	19.638.300		-		-	
				Sub Total	**20.718.654**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL CUBIERTAS Y CIELO RASO			**20.718.654**		**-**		**-**	**0,00%**
11	**APARATOS SANITARIOS Y DOTACION BAÑOS**									

11.1	Kit Taza sanitaria entrada superior con fluxómetro con sensor, blanco institucional (Incluye Taza Sanitaria para Fluxómetro, asiento sanitario, sensor, sistema conexión entrada superior)	UND	4	3.778.631	15.114.524		-		-	
11.2	Taza sanitaria alongado, blanco institucional ultra ahorradora (Sanitario con push)	UND	28	1.228.494	34.397.832		-		-	
11.3	Barra de seguridad Fija Recta en acero inoxidable (baño para personas con movilidad reducida), incluye anclajes	UND	4	463.827	1.855.308		-		-	
11.4	Barra de seguridad abatible (baño para personas con movilidad reducida) incluye anclajes	UND	4	641.649	2.566.596		-		-	
11.5	Lavamanos blanco institucional, para personas con movilidad reducida, incluye anclajes	UND	4	553.338	2.213.352		-		-	
11.6	Lavamanos blanco institucional, para incrustar en mesones	UND	20	328.045	6.560.900		-		-	
11.7	Suministro e instalación de brazo de soporte para lavamanos	JUEGO	4	288.360	1.153.440		-		-	
11.8	Suministro e instalación de grifería para lavamanos y desagüe tipo botella sencillo incluye acople	UND	24	62.127	1.491.048		-		-	
11.9	Construcción lava traperos 70x50x50cm, enchapado.	UND	4	622.329	2.489.316		-		-	
11.10	Kit Orinal arrecife o similar para fluxómetro	UND	8	1.284.163	10.273.304		-		-	
11.11	Dispensador De Papel Higiénico Acero Inoxidable Diámetro De 26 Cm	UND	16	157.457	2.519.312		-		-	
11.12	Papelera metálica en acero inoxidable según especificaciones	UND	32	530.403	16.972.896		-		-	
11.13	Dispensador de jabón para empotrar en pared, en acero inoxidable, 1.2Litros	UND	16	253.414	4.054.624		-		-	
11.14	Suministro e instalación de divisiones sanitarias a piso en acero inoxidable AISI SAE 304 para baños de uso institucional. Batería completa con tres (3) cubículos para unidades sanitarias. Incluye tornillería y accesorios.	UND	8,00	8.420.295	67.362.360		-		-	
11.15	Dispensador De Toallas De Papel En Z Acero Inoxidable De 27x27x10 Cm	UND	16,00	186.293	2.980.688		-		-	
				Sub Total	**172.005.500**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL APARATOS SANITARIOS			**172.005.500**		**-**		**-**	**0,00%**
12	**SEÑALIZACIÓN**									
12.1	Suministro e instalación de placa de señalización de 0,65 x 0,50 m con planimetría salidas de emergencia, en acrílico de 2.4 con impresión full color y regletas en MDF para su instalación.	UND	5,00	229.178	1.145.890		-		-	
12.2	Suministro e instalación Franjas Guías longitudinales de ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	600,00	10.725	6.435.000		-		-	
12.3	Suministro e instalación de Punto alerta ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	2100,00	5.658	11.881.800		-		-	
12.4	Suministro e Instalación de Loseta alerta en policarbonato, 20 x 20 cm., Altura total: 5mm, Peso 150 gr, incluye anclaje	UND	15,00	43.268	649.020		-		-	
12.5	Suministro e instalación de letreros luminosos informativos en parqueadero doble cara, ubicado en sótano 1.50x0.40m	UND	3,00	576.720	1.730.160		-		-	
12.6	Suministro e instalación de letras en acero inoxidable de la frase: PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA y Escudo de la Rama judicial diámetro 50cm, tamaño de letra 30cm cada una, según diseño	UND	1,00	5.767.200	5.767.200		-		-	
				Sub Total	**27.609.070**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL SEÑALIZACIÓN			**27.609.070**		**-**		**-**	**0,00%**
13	**VARIOS Y ASEO GENERAL**									
13.1	Brigada de aseo	PERSONA/ MES	6,00	2.304.481	13.826.886	-	-	5,00	11.522.405	0,00%
				Sub Total	**13.826.886**		**-**		**11.522.405**	**0,00%**
		TOTAL VARIOS Y ASEO			**13.826.886**		**-**		**11.522.405**	**0,00%**

TOTAL COSTO DIRECTO:	748.356.821		1.126.652		202.432.257	**0,15%**
ADMINISTRACIÓN (18.73%)	140.167.233		211.022		37.915.562	
IMPREVISTOS (3%)	22.450.705		33.800		6.072.968	
UTILIDAD (5%)	37.417.841		56.333		10.121.613	
IVA (19%)	7.109.390		10.703		1.923.106	
TOTAL PRESUPUESTO:	**955.501.990**		**1.438.510**		**258.465.506**	**0,15%**

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO
INFORME SEMANAL DE OBRA N° 12

PÁGINA 1 DE 2

I. INFORMACIÓN GENERAL

N° CONTRATO Y FECHA: CO1.PCCNTR.6947019 del 29 de octubre de 2024 — TRAMO (S): N.A. — FECHA: 23/02/2025

ENTIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO — SEMANA No.: 12 del 17/02/2025 al 23/02/2025

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. DIANA VIVANCO — ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO

OBJETO: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO" — FECHA DE INICIO: 14/11/2024

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA
INTEGRANTES: REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO MANRIQUE

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.6947019 del 29 de octubre de 2024 — VALOR INICIAL: $ 955.501.990,00
PLAZO INICIAL: 45 dias — ADICIONES: $ 0,00
PLAZO ADICIONAL: 60 días
PLAZO ACUMULADO: 105 días — VALOR ACUMULADO: $ 955.501.990,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
INTEGRANTES:

CONTRATO No.: O1.PCCNTR.6973355 — VALOR INICIAL: $ 33.336.660,00
PLAZO INICIAL: 45 cuarenta y cinco días — ADICIONES: $ 0,00
PLAZO ACUMULADO: — VALOR ACUMULADO: $ 33.336.660,00

II. AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS OBRA:

ESTUDIOS Y DISEÑOS:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ -
OBRA:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 0,00
TOTAL OBRA + EST Y DISEÑOS:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 0,00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 0,00


INTERVENTORÍA:
COSTOS EJECUTADOS ACUMULADOS:
COSTOS PROGRAMADOS ACUMULADOS:

ESTUDIOS Y DISEÑOS SEMANAL:
PROGRAMADA: $ -
EJECUTADA: $ -
OBRA SEMANAL:
PROGRAMADA: $ 0,00
EJECUTADA: $ 0,00
TOTAL OBRA + E Y D SEMANAL:
PROGRAMADA: $ 0,00
EJECUTADA: $ 0,00

III. AVANCE FÍSICO

EJECUTADO ACUMULADO PROYECTO

DESCRIPCIÓN	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	TOTAL
Iniciales			10,04%	10,04%	10,04%	9,22%		6,52%	5,03%					50,89%
Desmonte y Retiros			6,42%	16,74%	12,74%	9,49%		11,16%	20,69%	6,36%		1,69%		83,60%
Demoliciones			13,12%	12,12%	7,74%	4,65%	11,85%	4,68%	11,18%	7,25%	1,11%	0,56%		73,70%
Estucos Interiores				2,30%	13,30%	9,51%	33,83%							58,94%
Red Suministro Agua Potable						29,80%	29,80%		11,94%					71,54%
Red Sanitaria, Pluvial, Ventilación						16,32%	18,00%		20,42%					54,74%
Repellos						4,12%	4,12%	4,17%	5,85%	2,43%	1,50%			22,19%
Pinturas							26,92%	19,86%	11,48%	1,30%				59,56%
Varios y Aseo General								33,3%	33,33%	16,67%				83,30%
Muros									59,76%	14,04%		1,88%		73,80%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
AVANCE OBRA COSTOS DIRECTOS														0,00%
AVANCE OBRA TOTAL														0,00%

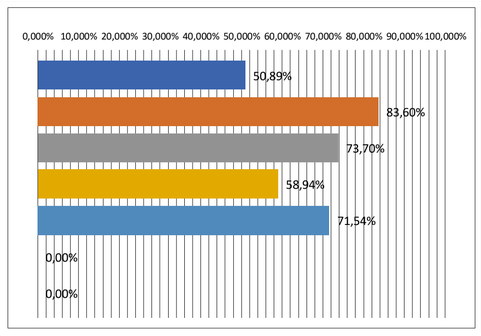

MAQUINARIA Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	MES 1	TOTAL
HERRAMIENTA MENOR		
TALADRO PERCUTOR		

S 1 $ 0,00 — S 2 $ 0,00 — S 3 $ 14.250.052,00 — S 4 $ 16.506.584,00 — S 5 $ 12.860.904,00 — S 6 $ 21.932.972,00
S 7 $ 63.571.724,00 — S 8 $ 44.417.781,00 — S 9 $ 65.939.566,00 — S 10 $ 18.206.179,00 — S 11 $ 2.429.643,00 — S 12 $ 1.438.510,00 — S 13

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO
UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO
UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO
UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

BOTADEROS	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONE: La escombrera Palermo, se encuentra ubicada en la verada Caliyaco, ubicada en zona rural del municiipio de Mocoa Putumayo, Gestor de disposición final de RCD, autorizado mediante resolución 00003 de 08/07/2019 código de Inscripción DPT-3389-25-07-2019 / km 1:200 Vía a Villagarzón.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 10
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0,0
SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 0,0

OBSERVACIONES: El personal mano de obra no calificada es en su totalidad es de la vereda brisas del Mocoa. La selección de las hojas de vida se realizo de la documentación entregada por la JAC quienes realizaron la convocatoria y certificaron que las persona sean del sector.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ADMINISTRATIVAS, LEGALES, FINANCIERAS

FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA E INTERVENTORIA, AFILIACION DEL PERSONAL A LAS ENTIDADES ASEGURADORAS Y DE SALUD.

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO
INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N° 12

PÁGINA 2 DE 2

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO" — TRAMO (S): N.A. — FECHA: 23/02/2025

SECRETARIA EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO — RAMA JUDICIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 12 del 17/02/2025 al 23/02/2025

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

TÉCNICAS

Continuar resane de paredes en piso 1, 2, 3 Y 4 en todas las áreas internas.
Pintura en sótano
Continuar pintura para interiores en piso 1, 2, 3 Y 4 en áreas internas

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

AMBIENTAL Y SST

El componente de seguridad y salud en el trabajo realizo el seguimiento punto a punto del plan de manejo básico de seguridad y salud en el trabajo en el cual se encontró lo siguiente :
Se realizan charlas preoperacionales, entrega en epps, demarcación de zonas con cinta peligro.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar resanes y remates de pinturas en los 4 pisos en áreas interiores y corredores
Continuar con la instalación de todos los temas eléctricos

NOTA:

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES

Fecha de reinicio No. 1 14 de enero de 2025
Fecha de terminación No.2 22 de enero de 2025
Tiempo de adición No. 1 dos meses
Fecha de terminación según adición en tiempo No.1 22 de marzo de 2025

OBSERVACIONES:	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA:	FIRMA:
	NOMBRE: MARLON FERNANDO ARTEAGA POTOSI	NOMBRE: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
	N° MAT: 52202-333602 NRÑ	No. MAT: 52202094726 QND

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

INFORME SEMANAL DE OBRA N° 13

PÁGINA	1	DE	1

SECRETARIA EJECUTORA: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO

FECHA: 2 / 3 / 2025

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.6947019

Semana Número: 13 Del: 24/02/2025 Al: 2/03/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 88 Días Corresponde al : 83,81% del Plazo total del Contrato

Supervisor Técnico de Contrato ING. DIANA VIVANCO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO"

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	12,36%	69,38%
Valor básico de la Obra programada:	$ 118.084.491	$ 662.898.411

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,55%	27,93%
Valor básico de Obra Ejecutada:	$ 5.250.272	$ 260.045.112

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.
Contrato No.	CO1.PCCNTR.6947019
Valor Inicial:	$ 955.501.990,00
Plazo Inicial:	2 MESES
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	14 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Fecha de Suspensión 1	23 de diciembre de 2024
Fecha de Reinicio 1	14 de enero de 2025
Fecha de Terminación 2	22 de enero de 2024
Tiempo de Adición 1	2 MESES
Fecha de Terminación Con Adición en Tiempo 1	22 de marzo de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
Contrato No.	O1.PCCNTR.6973355 DEL 01/11/2024
Valor Actualizado:	$ 33.336.660,00
Plazo Inicial:	45 cuarenta y cinco dias calendario
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	14 de noviembre de 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Continuar resane de paredes en piso 1, 2, 3 Y 4 en todas las áreas internas.
Pintura en sótano


ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar resanes y remates de pintura a nivel de sótano
Continuar resanes y remates de pinturas en los 4 pisos en áreas interiores y corredores

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Fecha de inicio 14 de noviembre de 2024
Fecha de terminación inicial 31 de diciembre de 2024
Fecha de suspensión No.1 23 de diciembre de 2024
Fecha de reinicio No. 1 14 de enero de 2025
Fecha de terminación No.2 22 de enero de 2025
Tiempo de adición No. 1 dos meses
Fecha de terminación según adición en tiempo No.1 22 de marzo de 2025

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO	Firma: Nombre: MARLON FERNANDO ARTEAGA P. Matrícula 52202-353602 NRÑ	Firma: Nombre: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO Matrícula 63202094726 QND

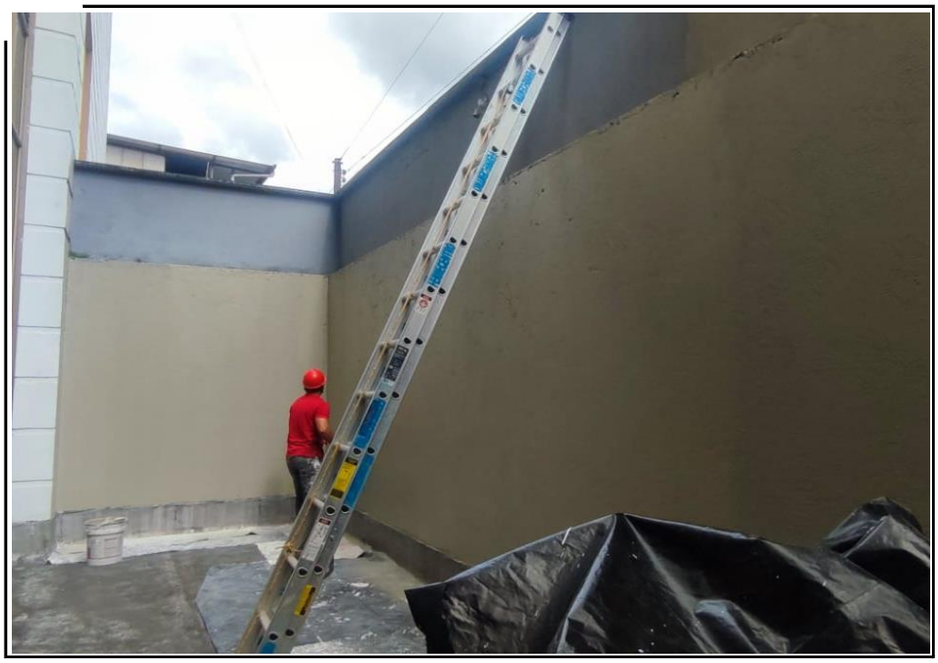


Fotografía: 1

Pintura en sótano




Fotografía: 2

Pintura en sótano

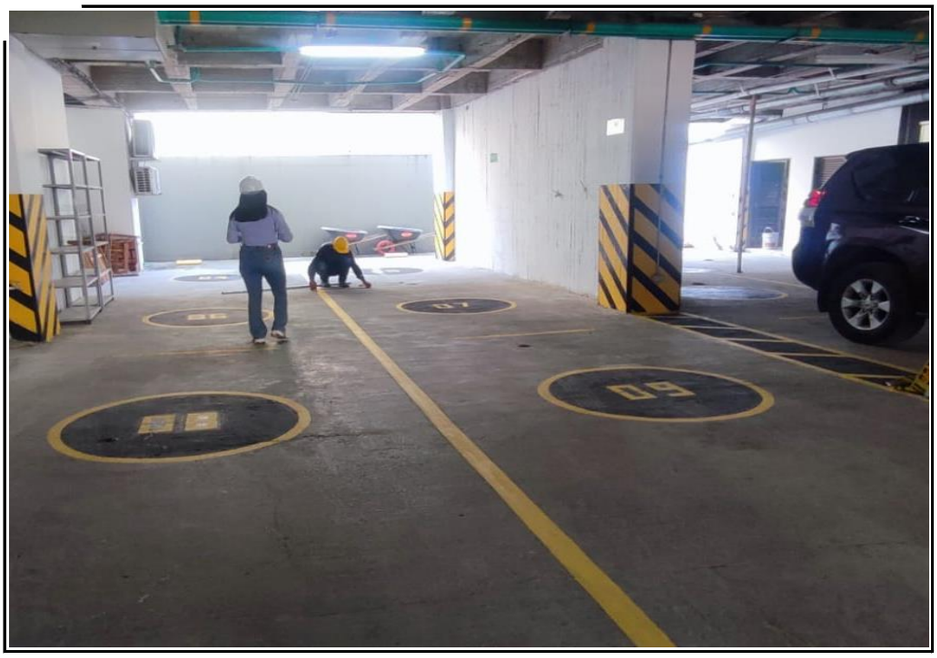

Fotografía: 3

Pintura en sótano

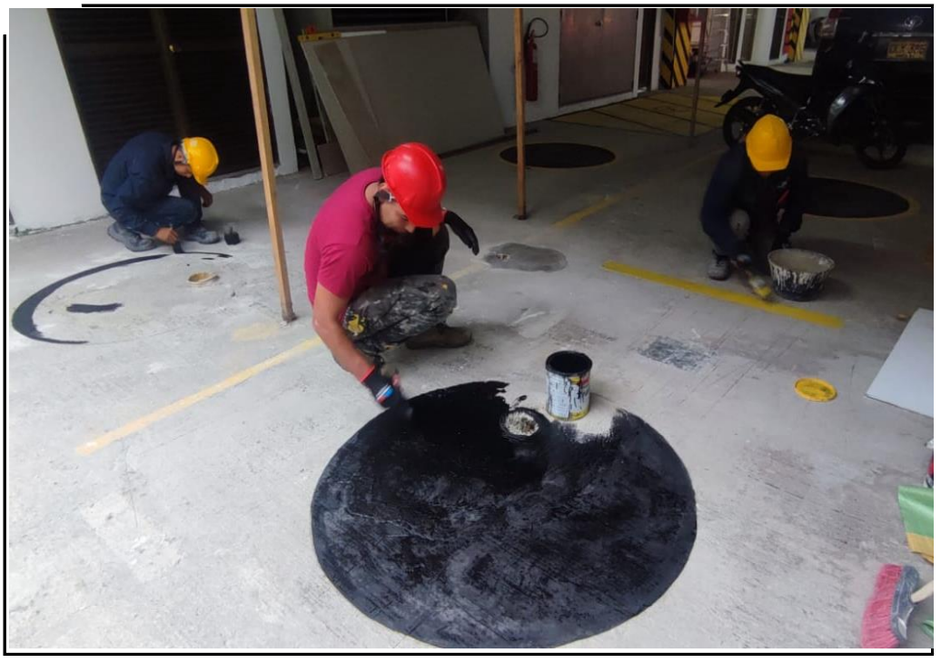

Fotografía: 4

Pintura en sótano



Fotografía: 5

Continuar resane de paredes en piso 1, 2, 3 Y 4 en todas las áreas internas.



Fotografía: 6

Continuar resane de paredes en piso 1, 2, 3 Y 4 en todas las áreas internas.

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No.	CO1.PCCNTR.6947019
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.
INTERVENTOR:	ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO

OBJETO "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO"

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	SEMANA 13		ACUMULADO		% EJECUTADO SEMANA 13
						CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	
1	**PRELIMINARES**									
1.1	**INICIALES**									
1.1.1	Localización y replanteo arquitectónico, incluye planos récord	M2	332,00	3.864	1.282.848	-	-	199,00	768.936	0,00%
1.1.2	Instalación y desinstalación de muro una cara drywall, provisional para cerrar las obras, incluye puerta con marco para ingreso de trabajadores	M2	53,00	77.249	4.094.197	-	-	22,00	1.699.478	0,00%
1.1.3	Señalización de obra en lona de 60x40cm impresión full color, incluye marco y anclaje	UND	9,00	60.693	546.237		-	9,00	546.237	
				Sub Total	**5.923.282**		**-**		**3.014.651**	**0,00%**
1.2	**DESMONTES Y RETIROS**									
1.2.1	Desmonte de marcos y puertas, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	57,00	26.406	1.505.142	-	-	55,00	1.452.330	0,00%
1.2.2	Desmonte de marco, ventana y vidrio, incluye traslado a punto de acopio dentro del palacio de justicia.	UND	1,00	27.367	27.367	-	-	1,00	27.367	0,00%
1.2.3	Desmonte de cielo raso en fibra mineral y/o panel yeso y/o fibrocemento, incluye estructura soporte, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	M2	250,00	29.781	7.445.250	-	-	250,00	7.445.250	0,00%
1.2.4	Desmonte de Tasas sanitarias, orinales y lavamanos, incluye trasiegos internos y cargue a volqueta	UND	48,00	53.587	2.572.176	-	-	48,00	2.572.176	
1.2.5	Desmonte de instalaciones hidrosanitarias, incluye tuberías y accesorios, regatas y sellos provisionales, cargue a volqueta	UND	72,00	57.730	4.156.560	-	-	70,00	4.041.100	0,00%
1.2.6	Rasqueteo, cepillo y limpieza manual de superficies, con el fin de retirar impurezas y capas de pintura existentes.	M2	1017,00	4.863	4.945.671	-	-	1.017,00	4.945.671	0,00%
1.2.7	Retiro de luminarias ubicadas en cielos rasos y pared, incluye trasiego a punto de acopio	UND	46,00	21.660	996.360	8,00	173.280	46,00	996.360	17,39%
1.2.8	Retiro de redes eléctricas en piso, techo y pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	GL	1,00	2.233.550	2.233.550	-	-	1,00	2.233.550	
				Sub Total	**23.882.076**		**173.280**		**23.713.804**	**0,73%**
1.3	**DEMOLICIONES**									
1.3.1	Demolición muro E ≤ 15CM en mampostería maciza o hueca, incluye cortes con pulidora, trasiegos y cargue a volqueta.	M2	220,00	17.941	3.947.020	-	-	184,00	3.301.144	0,00%
1.3.2	Demolición de enchape de pared, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	704,40	14.760	10.396.413	-	-	648,12	9.566.251	0,00%
1.3.3	Demolición de enchapes de piso, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	283,00	13.980	3.956.340		-	142,00	1.985.160	
1.3.4	Demolición repello de piso, incluye picado Eprom = 0.03m, incluye trasiego y cargue a volqueta	M2	835,00	12.959	10.820.765	30,00	388.770	208,00	2.695.472	
1.3.5	Demolición repello de pared, muros mampostería eprom= 0.02m, incluye trasiegos y cargue a volqueta	M2	291,80	15.119	4.411.785	-	-	291,00	4.399.629	
1.3.6	Cargue, transporte y retiro del material sobrante proveniente de las obras de mantenimiento, hasta el botadero.	M3	234,00	40.171	9.400.014	6,00	241.026	204,00	8.194.884	2,56%
1.3.7	Demolición de mesones en concreto, recubierto con granito incluye salpicadero	M2	11,00	37.722	414.942	-	-	7,00	264.054	0,00%
				Sub Total	**43.347.279**		**629.796**		**30.406.594**	**1,45%**
		TOTAL PRELIMINARES			**73.152.637**		**803.076**		**57.135.049**	**1,10%**
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**									
2.1	**RED SUMINISTRO AGUA POTABLE**									
2.1.1	Instalaciones PVC 1/2" RDE 13.5	ML	95,00	7.575	719.625	-	-	95,00	719.625	0,00%
2.1.2	Instalaciones PVC 3/4" RDE 21	ML	28,00	10.939	306.292		-	28,00	306.292	
2.1.3	Instalaciones PVC RDE 21 1"	ML	50,21	12.038	604.428	-	-	50,20	604.308	0,00%
2.1.4	Instalaciones PVC RDE 21 2"	ML	6,00	26.949	161.694	-	-	6,00	161.694	0,00%
2.1.5	Punto hidráulico PVC 1/2"	UND	60,00	24.174	1.450.440		-	60,00	1.450.440	
2.1.6	Punto hidráulico PVC 3/4"	UND	8,00	26.324	210.592	-	-		-	
2.1.7	Punto hidráulico PVC 1/2" incluye válvula control paso 1/2" y tapa PVC Blanca 15x15cm	UND	18,00	59.937	1.078.866	10,00	599.370	10,00	599.370	
				Sub Total	**4.531.937**		**599.370**		**3.841.729**	**13,23%**
2.2	**RED SANITARIA, PLUVIAL, VENTILACION**									
2.2.1	Instalaciones sanitarias PVC 2"	ML	58,00	25.087	1.455.046	-	-	58,00	1.455.046	0,00%
2.2.2	Instalaciones sanitarias PVC 4"	ML	119,00	42.006	4.998.714	-	-	72,00	3.024.432	0,00%
2.2.3	Instalaciones ventilación PVC 2"	ML	183,00	20.194	3.695.502	-	-	24,00	484.656	0,00%
2.2.4	Instalaciones ventilación PVC 3"	ML	35,00	31.646	1.107.610		-		-	
2.2.5	Punto sanitario 4" WC	UND	32,00	45.965	1.470.880		-	32,00	1.470.880	
2.2.6	Punto sanitario 2"	UND	44,00	33.894	1.491.336		-	36,00	1.220.184	
2.2.7	Suministro e instalación de rejilla de piso en acero inoxidable cuadrada de 10cm salida a tubería 2"	UND	24,00	48.380	1.161.120	-	-	24,00	1.161.120	0,00%
2.2.8	Suministro e instalación de tubería de conexión de desagües de aires acondicionados	ML	36,00	20.194	726.984		-		-	
				Sub Total	**16.107.192**		**-**		**8.816.318**	**0,00%**
		TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**20.639.129**		**599.370**		**12.658.047**	**2,90%**
3	**RED ELECTRICA**									
3.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**									
3.1.1	S.I.P. Salida toma doble GFCI 1F/20AMP en tubería PVC SCH40 1/2", caja galvanizada y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	16,00	171.144	2.738.304		-		-	
3.1.2	S.I.P. Salida sensor de movimiento tipo interruptor 360° 1F/15AMP En muro, Tubería PVC SCH40 D:1/2", Cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	32,00	138.700	4.438.400		-		-	
3.1.3	S.I.P Luminaria de sobreponer 400x120 para uso interior, fabricada en lámina de acero COLD ROLLED, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate y difusor lamina acrílico opalizado L11. Producto para instalación de sobreponer, en temperatura de color 5000K flujo lumínico de 4400Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 28.56W	UND	4,00	424.118	1.696.472		-		-	

3.1.4	S.I.P. Luminaria tipo bala 72x83 para incrustar, Producto tipo DOWNLIGHT de uso interior fabricado en aluminio inyectado, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate en temperatura de color 6500K flujo lumínico de 550Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 6.00W.	UND	40,00	65.207	2.608.280		-		-	
3.1.5	S.I.P Luminaria tipo bala GS 15W 5000K	Und	12,00	144.940	1.739.280		-		-	
3.1.6	S.I.P Letrero lumínico de emergencia SALIDA 90E 300X185X45 2.6W 120-277V SOBREPONER	UND	20,00	107.422	2.148.440		-		-	
3.1.7	S.I.P Luminaria de emergencia 185X50X108 SOBREPONER 2-BL 2W	UND	40,00	112.486	4.499.440		-		-	
3.1.8	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP en techo, Tubería D:1/2" SCH40, Caja octogonal y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	66,00	123.004	8.118.264		-		-	
3.1.9	S.I.P. Salida eléctrica de iluminación 1F/15AMP emergencia, Tubería D:1/2 EMT, Caja RADWELL 5800 y cable HFFR-LS 75° 2No.12+1No.12T, incluye fijación, Libre de halogenuros, incluye aparato	UND	45,00	178.147	8.016.615		-		-	
3.1.10	S.I.A. Tablero de circuitos para baños, incluye 6 protecciones de 20A	UND	4,00	826.632	3.306.528		-		-	
				Sub Total	**39.310.023**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS			**39.310.023**		**-**		**-**	**0,00%**
4	**MUROS**									
4.1	Suministro e instalación de muro doble cara en lámina de fibrocemento 8mm. Estructura base 6. incluye estuco y dos manos de pintura	M2	84,00	171.543	14.409.612	-	-	84,00	14.409.612	0,00%
4.2	Carteras en lámina de fibrocemento 8mm dos caras, en marco ventana y puertas	ML	163,80	68.788	11.267.474	-	-	73,00	5.021.524	0,00%
				Sub Total	**25.677.086**		**-**		**19.431.136**	**0,00%**
		TOTAL MAMPOSTERIA			**25.677.086**		**-**		**19.431.136**	**0,00%**
5	**REPELLOS**									
5.1	Repello de piso y pared con mortero 1:4 espesor 2cm. Incluye aditivo impermeabilizante.	M2	1374,872	44.402	61.047.067	-	-	474,00	21.046.548	0,00%
5.2	Impermeabilización de losa de entrepiso y muros laterales de terraza, con recubrimiento impermeabilizante acrílico de alto desempeño con tecnología DFX y fibras para impermeabilizar cubiertas	M2	660,00	51.240	33.818.400		-		-	
				Sub Total	**94.865.467**		**-**		**21.046.548**	**0,00%**
		TOTAL REPELLOS			**94.865.467**		**-**		**21.046.548**	**0,00%**
6	**ENCHAPES**									
6.1	**PISOS**									
6.1.1	Enchape cerámica de piso estructurado 20.6x92.6cm, uso comercial moderado	M2	258,00	132.605	34.212.090		-		-	
6.1.2	Enchape cerámica de piso 60x60cm color gris, uso exteriores tráfico comercial	M2	88,00	100.281	8.824.728		-		-	
6.1.3	Acabado para uniones entre muro y losa de piso en media caña con mortero 1-4 H: 0,07m	ML	85,00	27.327	2.322.795		-		-	
				Sub Total	**45.359.613**		**-**		**-**	
6.2	**PARED**									
6.2.1	Enchape cerámica de pared color marfil caras diferenciadas 30.1x75.3cm	M2	457,00	113.777	51.996.089		-		-	
6.2.2	Guarda canto flecha 8 milímetros cromo aluminio mate	ML	31,00	12.988	402.628		-		-	
6.2.3	Suministro e instalación de espejo E= 3mm flotante biselado en sus cuatro lados sobre soporte metálico	M2	20,00	361.837	7.236.740		-		-	
6.2.4	Mesón en granito artificial verde uva tuba incluye solapa inferior en aglomerado ancho 50cm con melamina, ancho de mesón 0.60m	ML	17,00	1.146.712	19.494.104		-		-	
				Sub Total	**79.129.561**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL ENCHAPES			**124.489.174**		**-**		**-**	**0,00%**
7	**ESTUCOS**									
7.1	Estuco acrílico para exteriores, incluye juntas, filos y dilataciones	M2	320,00	21.750	6.960.000		-		-	
7.2	Estuco plástico para muros y resanes incluye juntas, filos y dilataciones	M2	973,00	16.641	16.191.693	-	-	973,00	16.191.693	
				Sub Total	**23.151.693**		**-**		**16.191.693**	**0,00%**
		TOTAL ESTUCOS			**23.151.693**		**-**		**16.191.693**	**0,00%**
8	**PINTURA**									
8.1	Pintura de muros en mampostería 3 manos, vinilo tipo 1, lavable	M2	5137,00	12.785	65.676.545	-	-	5.137,00	65.676.545	0,00%
8.2	Pintura para exteriores (3 manos) para paredes.	M2	1280,00	27.659	35.403.520		-		-	
8.3	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial ancho 10cm, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, para pavimento rígido	ML	173,52	14.418	2.501.811	85,00	1.225.530	85,00	7.225	
8.4	Aplicación de pintura en frio base solvente para Demarcación vial, números con circunferencias de 66 y 40cm para carros y motos. imprimación en negro y pintura tráfico vehicular, incluye micro esferas, para pavimento rígido	UND	42,00	30.758	1.291.836	25,00	768.950	25,00	625	
8.5	Aplicación de pintura en frio base solvente para flechas de ingreso y salida, imprimación en negro y pintura tráfico vehicular incluye micro esferas, sobre pavimento rígido	M2	27,00	59.594	1.609.038	12,00	715.128	12,00	144	
				Sub Total	**106.482.750**		**2.709.608**		**65.684.539**	**2,54%**
		TOTAL PINTURA			**106.482.750**		**2.709.608**		**65.684.539**	**2,54%**
9	**CARPINTERIAS**									
9.1	Suministro e instalación de puerta de dos hojas batientes elaborada en tubular aluminio estriado ANOLOC, incluye chapa pomo de alcoba metálica pasador y argolla para candado. Medidas de cada hoja 0.9mx2.10m (ver plano A-022, P-T3)	UND	1,00	2.374.136	2.374.136		-		-	
9.2	Sellado de juntas entre muros y marcos de ventanería con sellador de juntas de poliuretano.	ML	367,00	11.048	4.054.616		-		-	
				Sub Total	**6.428.752**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL CARPINTERIAS			**6.428.752**		**-**		**-**	**0,00%**
10	**CUBIERTAS Y CIELO RASO**									
10.2	Limpieza, lavado, cambio de amarras y ganchos, aplicación de sellante en amarras de policarbonato alveolar	M2	33,00	32.738	1.080.354		-		-	
10.3	Suministro e instalación de cielo raso desmontable, láminas de fibra mineral 0,60m x 0,60m, incluye estructura	M2	220,00	89.265	19.638.300		-		-	
				Sub Total	**20.718.654**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL CUBIERTAS Y CIELO RASO			**20.718.654**		**-**		**-**	**0,00%**
11	**APARATOS SANITARIOS Y DOTACION BAÑOS**									

11.1	Kit Taza sanitaria entrada superior con fluxómetro con sensor, blanco institucional (Incluye Taza Sanitaria para Fluxómetro, asiento sanitario, sensor, sistema conexión entrada superior)	UND	4	3.778.631	15.114.524		-		-	
11.2	Taza sanitaria alongado, blanco institucional ultra ahorradora (Sanitario con push)	UND	28	1.228.494	34.397.832		-		-	
11.3	Barra de seguridad Fija Recta en acero inoxidable (baño para personas con movilidad reducida), incluye anclajes	UND	4	463.827	1.855.308		-		-	
11.4	Barra de seguridad abatible (baño para personas con movilidad reducida) incluye anclajes	UND	4	641.649	2.566.596		-		-	
11.5	Lavamanos blanco institucional, para personas con movilidad reducida, incluye anclajes	UND	4	553.338	2.213.352		-		-	
11.6	Lavamanos blanco institucional, para incrustar en mesones	UND	20	328.045	6.560.900		-		-	
11.7	Suministro e instalación de brazo de soporte para lavamanos	JUEGO	4	288.360	1.153.440		-		-	
11.8	Suministro e instalación de grifería para lavamanos y desagüe tipo botella sencillo incluye acople	UND	24	62.127	1.491.048		-		-	
11.9	Construcción lava traperos 70x50x50cm, enchapado.	UND	4	622.329	2.489.316		-		-	
11.10	Kit Orinal arrecife o similar para fluxómetro	UND	8	1.284.163	10.273.304		-		-	
11.11	Dispensador De Papel Higiénico Acero Inoxidable Diámetro De 26 Cm	UND	16	157.457	2.519.312		-		-	
11.12	Papelera metálica en acero inoxidable según especificaciones	UND	32	530.403	16.972.896		-		-	
11.13	Dispensador de jabón para empotrar en pared, en acero inoxidable, 1.2Litros	UND	16	253.414	4.054.624		-		-	
11.14	Suministro e instalación de divisiones sanitarias a piso en acero inoxidable AISI SAE 304 para baños de uso institucional. Batería completa con tres (3) cubículos para unidades sanitarias. Incluye tornillería y accesorios.	UND	8,00	8.420.295	67.362.360		-		-	
11.15	Dispensador De Toallas De Papel En Z Acero Inoxidable De 27x27x10 Cm	UND	16,00	186.293	2.980.688		-		-	
				Sub Total	**172.005.500**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL APARATOS SANITARIOS			**172.005.500**		**-**		**-**	**0,00%**
12	**SEÑALIZACIÓN**									
12.1	Suministro e instalación de placa de señalización de 0,65 x 0,50 m con planimetría salidas de emergencia, en acrílico de 2.4 con impresión full color y regletas en MDF para su instalación.	UND	5,00	229.178	1.145.890		-		-	
12.2	Suministro e instalación Franjas Guías longitudinales de ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	600,00	10.725	6.435.000		-		-	
12.3	Suministro e instalación de Punto alerta ABS con adhesivo. Señalización especial PDV	UND	2100,00	5.658	11.881.800		-		-	
12.4	Suministro e Instalación de Loseta alerta en policarbonato, 20 x 20 cm., Altura total: 5mm, Peso 150 gr, incluye anclaje	UND	15,00	43.268	649.020		-		-	
12.5	Suministro e instalación de letreros luminosos informativos en parqueadero doble cara, ubicado en sótano 1.50x0.40m	UND	3,00	576.720	1.730.160		-		-	
12.6	Suministro e instalación de letras en acero inoxidable de la frase: PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA y Escudo de la Rama judicial diámetro 50cm, tamaño de letra 30cm cada una, según diseño	UND	1,00	5.767.200	5.767.200		-		-	
				Sub Total	**27.609.070**		**-**		**-**	**0,00%**
		TOTAL SEÑALIZACIÓN			**27.609.070**		**-**		**-**	**0,00%**
13	**VARIOS Y ASEO GENERAL**									
13.1	Brigada de aseo	PERSONA/ MES	6,00	2.304.481	13.826.886	-	-	5,00	11.522.405	0,00%
				Sub Total	**13.826.886**		**-**		**11.522.405**	**0,00%**
		TOTAL VARIOS Y ASEO			**13.826.886**		**-**		**11.522.405**	**0,00%**

TOTAL COSTO DIRECTO:	748.356.821		4.112.054		203.669.417	**0,55%**
ADMINISTRACIÓN (18.73%)	140.167.233		770.188		38.147.282	
IMPREVISTOS (3%)	22.450.705		123.362		6.110.083	
UTILIDAD (5%)	37.417.841		205.603		10.183.471	
IVA (19%)	7.109.390		39.065		1.934.859	
TOTAL PRESUPUESTO:	**955.501.990**		**5.250.272**		**260.045.112**	**0,55%**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO
INFORME SEMANAL DE OBRA N° 13

I. INFORMACIÓN GENERAL

N° CONTRATO Y FECHA: CO1.PCCNTR.6947019 del 29 de octubre de 2024 — TRAMO (S): N.A. — FECHA: 2/03/2025

ENTIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO — SEMANA No.: 13 del 24/02/2025 al 2/03/2025

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. DIANA VIVANCO — ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO

OBJETO: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO" — FECHA DE INICIO: 14/11/2024

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA		
INTEGRANTES:	REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO MANRIQUE		
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6947019 del 29 de octubre de 2024	VALOR INICIAL:	$ 955.501.990,00
PLAZO INICIAL:	45 días	ADICIONES:	$ 0,00
PLAZO ADICIONAL:	60 días		
PLAZO ACUMULADO:	105 días	VALOR ACUMULADO:	$ 955.501.990,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	O1.PCCNTR.6973355	VALOR INICIAL:	$ 33.336.660,00
PLAZO INICIAL:	45 cuarenta y cinco días	ADICIONES:	$ 0,00
PLAZO ACUMULADO:		VALOR ACUMULADO:	$ 33.336.660,00

II. AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS OBRA:

ESTUDIOS Y DISEÑOS:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ -
OBRA:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 0,00
TOTAL OBRA + EST Y DISEÑOS:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 0,00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 0,00


INTERVENTORÍA:
COSTOS EJECUTADOS ACUMULADOS:
COSTOS PROGRAMADOS ACUMULADOS:

ESTUDIOS Y DISEÑOS SEMANAL:
PROGRAMADA: $ -
EJECUTADA: $ -
OBRA SEMANAL:
PROGRAMADA: $ 0,00
EJECUTADA: $ 0,00
TOTAL OBRA + E Y D SEMANAL:
PROGRAMADA: $ 0,00
EJECUTADA: $ 0,00

III. AVANCE FÍSICO

EJECUTADO ACUMULADO PROYECTO

DESCRIPCIÓN	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	TOTAL
Iniciales			10,04%	10,04%	10,04%	9,22%		6,52%	5,03%						50,89%
Desmonte y Retiros			6,42%	8,74%	12,74%	9,49%		11,16%	20,69%	6,36%		1,69%	0,7%		77,99%
Demoliciones			13,12%	12,12%	7,74%	4,65%	11,85%	4,68%	11,18%	7,25%	1,11%	0,56%	1,5%		69,61%
Estucos Interiores				2,30%	13,30%	9,51%	33,83%								58,94%
Red Suministro Agua Potable						29,80%	29,80%		11,94%				13,2%		84,74%
Red Sanitaria, Pluvial, Ventilación						16,32%	18,00%		20,42%						54,74%
Repellos						4,12%	4,12%	4,17%	5,85%	2,43%	1,50%				22,19%
Pinturas							26,92%	19,86%	11,48%	1,30%			2,5%		62,06%
Varios y Aseo General								33,3%	33,33%	16,67%					83,30%
Muros									59,76%	14,04%		1,88%			73,80%
															0,00%
															0,00%
															0,00%
AVANCE OBRA COSTOS DIRECTOS															0,00%
AVANCE OBRA TOTAL															0,00%

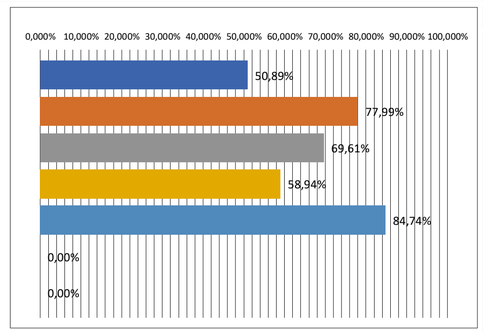

MAQUINARIA Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	MES 1	TOTAL
HERRAMIENTA MENOR		
TALADRO PERCUTOR		

S 1 $ 0,00 — S 2 $ 0,00 — S 3 $ 14.250.052,00 — S 4 $ 16.506.584,00 — S 5 $ 12.860.904,00 — S 6 $ 21.932.972,00

S 7 $ 63.571.724,00 — S 8 $ 44.417.781,00 — S 9 $ 65.939.566,00 — S 10 $ 18.206.179,00 — S 11 $ 2.429.643,00 — S 12 $ 1.438.510,00 — S 13 $ 5.250.272,00

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

BOTADEROS	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONE: La escombrera Palermo, se encuentra ubicada en la verada Caliyaco, ubicada en zona rural del municiipio de Mocoa Putumayo, Gestor de disposición final de RCD, autorizado mediante resolución 00003 de 08/07/2019 código de Inscripción DPT-3389-25-07-2019 / km 1:200 Vía a Villagarzón.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 10
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0,0
SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 0,0

OBSERVACIONES: El personal mano de obra no calificada es en su totalidad es de la vereda brisas del Mocoa. La selección de las hojas de vida se realizo de la documentación entregada por la JAC quienes realizaron la convocatoria y certificaron que las persona sean del sector.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ADMINISTRATIVAS, LEGALES, FINANCIERAS

FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA E INTERVENTORIA, AFILIACION DEL PERSONAL A LAS ENTIDADES ASEGURADORAS Y DE SALUD.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO
INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N° 13

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO" — TRAMO (S): N.A. — FECHA: 2/03/2025

SECRETARIA EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO — RAMA JUDICIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 13 del 24/02/2025 al 2/03/2025

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

TÉCNICAS

Continuar resane de paredes en piso 1, 2, 3 Y 4 en todas las áreas internas.
Pintura en sótano

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

AMBIENTAL Y SST

El componente de seguridad y salud en el trabajo realizo el seguimiento punto a punto del plan de manejo básico de seguridad y salud en el trabajo en el cual se encontró lo siguiente :
Se realizan charlas preoperacionales, entrega en epps, demarcación de zonas con cinta peligro.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar resanes y remates de pinturas en los 4 pisos en áreas interiores y corredores
Continuar resanes y remates de pintura a nivel de sótano

NOTA:

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES

Fecha de reinicio No. 1 14 de enero de 2025
Fecha de terminación No.2 22 de enero de 2025
Tiempo de adición No. 1 dos meses
Fecha de terminación según adición en tiempo No.1 22 de marzo de 2025

OBSERVACIONES:	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA:	FIRMA:
	NOMBRE: MARLON FERNANDO ARTEAGA POTOSI	NOMBRE: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
	N° MAT: 52202-333602 NRÑ	No. MAT: 63202094726 QND

ANEXO 3 COPIA DE ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No. : CO1.PCCNTR.6973355 de 1 de noviembre de 2024

MODALIDAD DE SELECCIÓN : Proceso de Mínima cuantía

PROCESO DE CONTRATACIÓN No: : MC029_2024

OBJETO : Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental al contrato de obra para el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura física del Palacio de Justicia de Mocoa – Putumayo.

LOCALIZACIÓN : Mocoa - Putumayo

FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNI : 06/11/2024

CONTRATISTA : ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.731.335

LIDER DEL PROYECTO : Diana María Vivanco Burbano

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	$33.336.660,00
VALOR ADICIÓN 1	N.A.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$33.336.660,00
FECHA DE INICIO	14/11/2024
PLAZO INICIAL	Dos (2) meses
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	23/12/2024
SUSPENSIÓN 1	Veintiún (21) días calendario
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	03/02/2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL	12%

Diana María Vivanco Burbano, en calidad de supervisora del contrato, deja constancia de la justificación de la prórroga y adición del contrato.

El contratista expresa las razones de la prórroga:

"Como es de su conocimiento el ingeniero ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO, el señor Luis Humberto Paz Timaná en nombre y representación de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO, le asignó la vigilancia, el control y seguimiento al contratista de obra durante la ejecución de su contrato, encaminadas a cumplir las especificaciones técnicas, actividades administrativas, requerimientos socio- ambientales, legales y presupuestales, entre otros. Teniendo en cuenta, que para efectuar un adecuado control y seguimiento al contrato de obra No CO1.PCCNTR.6947019, el contrato de interventoría en sus obligaciones generales establece: Realizar el Seguimiento integral al proyecto "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO". Así mismo, considera en sus obligaciones específicas que la interventoría deberá "Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista"; Por tanto, la interventoría en cumplimiento de sus obligaciones, solicita ampliar el plazo del contrato de interventoría N°CO1.PCCNTR.6973355 que tiene por fecha de terminación actual de 3 de febrero del 2025, teniendo en cuenta que el contrato de obra vence el 21 de marzo de 2025 la interventoría considera oportuno continuar con las labores propias de seguimiento y control del contrato objeto de vigilancia, en aras de garantizar la normal ejecución de la obra."

La supervisora del contrato realizó el análisis de lo expuesto por el contratista de interventoría y observa que, se requiere la prórroga al contrato con adición de recursos siendo indispensable el acompañamiento y seguimiento por parte de interventoría en la culminación de las actividades contratadas para la ejecución del contrato de obra MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO; por lo anterior, se considera necesario prorrogar el contrato de interventoría en los mismos términos que el contrato de obra CO1.PCCNTR.6947019.

En atención y cumplimiento a la ley 1474 de 2011 articulo 85. "*Continuidad de la interventoría. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993*".

En este orden de ideas la supervisora recomienda al señor Director Seccional, realizar la correspondiente prórroga del Contrato a partir del 4 de febrero de 2025 hasta el día 21 de marzo de 2025, en igualdad de condiciones que el contrato de obra CO1.PCCNTR.6947019 y la adición de recursos por un valor de VEINTISEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS DIESCISIETE PESOS M/CTE ($ 26.113.717,00), por concepto de los costos calculados por la adición del plazo del contrato.

1. CLAUSULAS OBJETO DE MODIFICACIÓN.

La relativa al valor del contrato: Se adicionará en la suma de: VEINTISEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS DIESCISIETE PESOS M/CTE (**$ 26.113.717,00**), por lo cual el valor final del contrato será de: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL TRECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE **($ 59.450.377,00)**

La relativa al plazo del contrato: El contrato No. CO1.PCCNTR.6973355 se prorrogará por 47 días calendario. Con fecha de finalización del veintiuno (21) de marzo de 2025.

La relativa a las garantías del contrato: Las pólizas del contrato se adicionarán en el monto de dinero y tiempo que trata la presente adición.

2. SOPORTE TÉCNICO Y ECONÓMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

La viabilidad presupuestal de la adición del contrato se adecua al presupuesto de la Rama Judicial y se encuentra respaldada por el certificado de disponibilidad presupuestal No. 8825 del 29 de enero de 2025, de la Unidad Ejecutora 02 de la vigencia 2024.

3. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO	**$ 33.336.660,00**
VR. ADICION	**$ 26.113.717,00**
VALOR TOTAL	**$ 59.450.377,00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los treinta (30) días del mes de enero de 2025.

Anexo solicitud de prórroga.

DIANA MARIA VIVANCO BURBANO
Supervisora del contrato
P. Universitario - Dirección Seccional Pasto

ANEXO 4
CONTROL DIARIO DE EQUIPO CONTRATISTA DE OBRA.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia ANEXO PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA	CÓDIGO	FT-SID-007	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	1 DE 2	

FECHA 28 2 2025

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO

INTERVENTOR ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

MES FEBRERO **CONTRATO No.** No. CO1.PCCNTR.6973355 **MUNICIPIO** MOCOA, PUTUMAYO

CONTRATISTA CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S

DIA / PROFESIONAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
HERRAMIENTA MENOR	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			
PULIDORA	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			
TALADRO	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			

Firma

Nombre: Allan Edward Sanchez Quiceno
Director de Interventoría
Matricula No.: 63202-094726 QND

ANEXO 5
CONTROL DIARIO DEL PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia ANEXO PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA	CÓDIGO	FT-SID-007	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	1 DE 2	

FECHA 28 2 2025

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO

INTERVENTOR ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

MES FEBRERO **CONTRATO No.** No. CO1.PCCNTR.6973355 **MUNICIPIO** MOCOA, PUTUMAYO

CONTRATISTA CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S

DIA / PROFESIONAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
HERRAMIENTA MENOR	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			
PULIDORA	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			
TALADRO	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			

Firma

Nombre: Allan Edward Sanchez Quiceno
Director de Interventoría
Matricula No.: 63202-094726 QND

ANEXO 6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

ANEXO 7 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	CÓDIGO	FT-SID-007	
		VERSIÓN	1	
		FECHA	DE	
	ANEXO ESTADO GENERAL DEL TIEMPO			

FECHA	28	2	2025

OBJETO: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO**

INTERVENTOR: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

MES: FEBRERO

CONTRATO No: **No. CO1.PCCNTR.6973355**

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
Clase de tiempo																															
Seco	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			
Lluvias moderadas			X		X	X		X		X		X	X		X		X		X	X		X		X	X		X				
Lluvias intensas	X			X			X				X			X				X			X					X		X			

Firma

Nombre: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

Residente de Interventoría

ANEXO 8
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CONTRATISTAS DE OBRA.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901887481	4	SAJ ALTURAS TSA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	TRASVERSAL 70D BIS 68-75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3209872640	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1347452667	9483264952	E	2025/03/19	2025/03/19	BANCOLOMBIA	0	$809,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (5 Afiliados)						$2,609,750	$418,000			$2,609,750	$104,500			$2,609,750	$104,500			$2,609,750	$182,000		$0	$0
Centro de Trabajo: MOCOA (5 Afiliados)						$2,609,750	$418,000			$2,609,750	$104,500			$2,609,750	$104,500			$2,609,750	$182,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$2,609,750	$418,000			$2,609,750	$104,500			$2,609,750	$104,500			$2,609,750	$182,000		$0	$0
1	PT	5626299	BUSTAMANTE JHOEFRY	230301	11	$521,950	$83,600	EPS037	11	$521,950	$20,900	CCF21	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
2	CC	18126897	CHICUNQUE JESUS	25-14	11	$521,950	$83,600	ESSC18	11	$521,950	$20,900	CCF21	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
3	CC	18130265	ESQUIBEL WINDEN	230301	11	$521,950	$83,600	EPSIC3	11	$521,950	$20,900	CCF21	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
4	PT	5331907	PELAYO NORBERTO	230301	11	$521,950	$83,600	ESSC24	11	$521,950	$20,900	CCF21	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
5	CC	1085252889	VEGA HUGO	230301	11	$521,950	$83,600	ESSC24	11	$521,950	$20,900	CCF21	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			$2,609,750	$418,000			$2,609,750	$104,500			$2,609,750	$104,500			$2,609,750	$182,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901887481	4	SAJ ALTURAS TSA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	TRASVERSAL 70D BIS 68-75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3209872640	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1347452667	9483264952	E	2025/03/19	2025/03/19	BANCOLOMBIA	0	$809,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$418,000	$0	$0	$418,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$83,600	$0	$0	$83,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$334,400	$0	$0	$334,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$182,000	$0	$0	$182,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$182,000	$0	$0	$182,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$104,500	$0	$0	$104,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	5	$104,500	$0	$0	$104,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$104,500	$0	$0	$104,500
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$20,900	$0	$0	$20,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$41,800	$0	$0	$41,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$20,900	$0	$0	$20,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$20,900	$0	$0	$20,900
TOTAL				5	$809,000	$0	$0	$809,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901887481	4	SAJ ALTURAS TSA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	TRASVERSAL 70D BIS 68-75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3209872640	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1347430888	9483264599	E	2025/03/19	2025/03/19	BANCOLOMBIA	0	$1,132,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (7 Afiliados)						$3,653,650	$585,200			$3,653,650	$146,300			$3,653,650	$146,300			$3,653,650	$254,800		$0	$0
Centro de Trabajo: MOCOA (7 Afiliados)						$3,653,650	$585,200			$3,653,650	$146,300			$3,653,650	$146,300			$3,653,650	$254,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)						$3,653,650	$585,200			$3,653,650	$146,300			$3,653,650	$146,300			$3,653,650	$254,800		$0	$0
1	CC	1233188189	CHAÑA JOHNNY	230201	11	$521,950	$83,600	EPS037	11	$521,950	$20,900	CCF21	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
2	PT	5447111	DIAZ RAUL	230301	11	$521,950	$83,600	EPS002	11	$521,950	$20,900	CCF21	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
3	PT	5022647	GARCIA YEISON	25-14	11	$521,950	$83,600	ESSC24	11	$521,950	$20,900	CCF21	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
4	CC	1005098706	GRANADA VICTOR	230301	11	$521,950	$83,600	EPS041	11	$521,950	$20,900	CCF21	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
5	CC	18182206	MENESES SILVIO	230301	11	$521,950	$83,600	EPSIC5	11	$521,950	$20,900	CCF21	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
6	PT	4970647	PEREZ MOISES	230201	11	$521,950	$83,600	EPS002	11	$521,950	$20,900	CCF21	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
7	PT	4668946	POLANCO JORGE	230301	11	$521,950	$83,600	ESSC24	11	$521,950	$20,900	CCF21	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
Total			**Afiliados(7)**			$3,653,650	$585,200			$3,653,650	$146,300			$3,653,650	$146,300			$3,653,650	$254,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901887481	4	SAJ ALTURAS TSA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	TRASVERSAL 70D BIS 68-75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3209872640	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1347430888	9483264599	E	2025/03/19	2025/03/19	BANCOLOMBIA	0	$1,132,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$585,200	$0	$0	$585,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$83,600	$0	$0	$83,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$334,400	$0	$0	$334,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$167,200	$0	$0	$167,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$254,800	$0	$0	$254,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$254,800	$0	$0	$254,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$146,300	$0	$0	$146,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	7	$146,300	$0	$0	$146,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$146,300	$0	$0	$146,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$41,800	$0	$0	$41,800
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$20,900	$0	$0	$20,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$20,900	$0	$0	$20,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$20,900	$0	$0	$20,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$41,800	$0	$0	$41,800
TOTAL				7	$1,132,600	$0	$0	$1,132,600

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1124862736	MAYERLY CAROLINA ARANZAZU SARASTY	vereda san antonio	3223821876	maranzazusa1314@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		PUTUMAYO	MOCOA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	25/03/2025	84246783	$409.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	178.000	0		0		0	14	1.600	0	179.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	14	2.000	0	229.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	14	0	0	0
ICBF				
0	14	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	179.600
Pensión	1	227.800	229.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	405.800	409.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1124862736	MAYERLY CAROLINA ARANZAZU SARASTY		vereda san antonio	3223821876	maranzazusa1314@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			PUTUMAYO	MOCOA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	25/03/2025	84246783	$409.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1124862736	ARANZAZU SARASTY MAYERLY CAROLINA	3	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1124313123		MUÑOZ BECERRA LUIS ALFREDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	B villa del Norte cll 27n9 84	MOCOA-PUTUMAYO	4204224	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1362638408	9483357146	I	2025/03/07	2025/03/26	BANCOLOMBIA	19	$459,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1124313123	MUÑOZ BECERRA LUIS ALFREDO	X	X																230301	30	$1,600,000	$274,600	ESSC18	30	$1,600,000	$180,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$454,600
Total	**Afiliados(1)**																						$1,600,000	$274,600			$1,600,000	$180,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$454,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1124313123		MUÑOZ BECERRA LUIS ALFREDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	B villa del Norte cll 27n9 84	MOCOA-PUTUMAYO	4204224	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1362638408	9483357146	I	2025/03/07	2025/03/26	BANCOLOMBIA	19	$459,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$274,600	$2,800	$0	$277,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$274,600	$2,800	$0	$277,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$180,000	$2,200	$0	$182,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$180,000	$2,200	$0	$182,200
TOTAL				1	$454,600	$5,000	$0	$459,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901886968	4	GRUPO EMPRESARIAL INGENIAR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 14 18A BRR FATIMA	PASTO-NARIÑO	3007420183	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1348000098	9483276114	E	2025/03/17	2025/03/19	BANCOLOMBIA	2	$2,385,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	18331867	BUSTAMANTE JHOEFRY	X																	230301	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF35	20	$949,000	$38,000	14-4	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
2	CC	1233188189	CHAÑA JOHNNY	X																	230201	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF35	20	$949,000	$38,000	14-4	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
3	CE	5447111	DIAZ RAUL	X																	230301	20	$949,000	$151,900	EPS002	20	$949,000	$38,000	CCF35	20	$949,000	$38,000	14-4	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
4	CC	23419583	GARCIA YEISON	X																	25-14	20	$949,000	$151,900	EPS042	20	$949,000	$38,000	CCF35	20	$949,000	$38,000	14-4	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
5	CC	1005098706	GRANADA VICTOR	X	X																230301	7	$332,150	$53,200	EPS041	7	$332,150	$13,300	CCF35	7	$332,150	$13,300	14-4	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0	Si	$103,000
6	CC	18182206	MENESES SILVIO	X																	230301	20	$949,000	$151,900	EPSIC5	20	$949,000	$38,000	CCF35	20	$949,000	$38,000	14-4	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
7	CE	1970647	PEREZ MOISES	X	X																230301	7	$332,150	$53,200	EPS002	7	$332,150	$13,300	CCF35	7	$332,150	$13,300	14-4	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0	Si	$103,000
8	CE	5331907	PEYALO NORBERTO	X																	230301	20	$949,000	$151,900	EPS042	20	$949,000	$38,000	CCF35	20	$949,000	$38,000	14-4	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
9	CE	4668946	POLANCO JORGE	X	X																230301	8	$379,600	$60,800	EPS002	8	$379,600	$15,200	CCF35	8	$379,600	$15,200	14-4	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0	Si	$117,700
10	CC	1085252889	VEGA HUGO	X																	230301	20	$949,000	$151,900	ESSC24	20	$949,000	$38,000	CCF35	20	$949,000	$38,000	14-4	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
Total	**Afiliados(10)**																						$7,686,900	$1,230,500			$7,686,900	$307,800			$7,686,900	$307,800			$7,686,900	$535,600		$0	$0		$2,381,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901886968	4	GRUPO EMPRESARIAL INGENIAR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 14 18A BRR FATIMA	PASTO-NARIÑO	3007420183	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1348000098	9483276114	E	2025/03/17	2025/03/19	BANCOLOMBIA	2	$2,385,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,230,500	$1,600	$0	$1,232,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$151,900	$200	$0	$152,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$926,700	$1,200	$0	$927,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$151,900	$200	$0	$152,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$535,600	$700	$0	$536,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	10	$535,600	$700	$0	$536,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$307,800	$400	$0	$308,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	10	$307,800	$400	$0	$308,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	$307,800	$600	$0	$308,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$76,000	$100	$0	$76,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$38,000	$100	$0	$38,100
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$38,000	$100	$0	$38,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$76,000	$100	$0	$76,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$13,300	$100	$0	$13,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$66,500	$100	$0	$66,600
TOTAL				**10**	**$2,381,700**	**$3,300**	**$0**	**$2,385,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085249647		ARTEAGA POTOSI MARLON FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 5 CASA 18 LAS BRISAS	PASTO-NARIÑO	7360636	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1350141791	9482287293	I	2025/03/12	2025/03/20	NEQUI	8	$687,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1085249647	ARTEAGA MARLON																		230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$684,000
Total	**Afiliados(1)**																						$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$684,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085249647		ARTEAGA POTOSI MARLON FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 5 CASA 18 LAS BRISAS	PASTO-NARIÑO	7360636	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1350141791	9482287293	I	2025/03/12	2025/03/20	NEQUI	8	$687,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,000	$2,000	$0	$386,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$384,000	$2,000	$0	$386,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$1,600	$0	$301,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$300,000	$1,600	$0	$301,600
TOTAL				**1**	**$684,000**	**$3,600**	**$0**	**$687,600**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900628905-1	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO	CR 7 109 28	6013003019	administrativo@coincosas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	MOCOA PUTUMAY	020	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	Y	18/03/2025	84555731	$399.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	396.400				396.400	14	3.500	399.900			3.964	399.900	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	14	0	0	0
ICBF				
0	14	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	396.400	399.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	396.400	399.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900628905-1	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO		CR 7 109 28	6013003019	administrativo@coincosas.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	MOCOA PUTUMAY	020	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	Y	18/03/2025	84555731	$399.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1085249647	ARTEAGA POTOSI MARLON FERNANDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1124313123	MUÑOZ BECERRA LUIS ALFREDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1124862736	ARANZAZU SARASTY MAYERLY CAROLINA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	87574554	FAJARDO BARCO NORBERTO DAVID	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901886968	4	GRUPO EMPRESARIAL INGENIAR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 14 18A BRR FATIMA	PASTO-NARIÑO	3007420183	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1348000098	9483276114	E	2025/03/17	2025/03/19	BANCOLOMBIA	2	$2,385,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	18331867	BUSTAMANTE JHOEFRY	X																	230301	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF35	20	$949,000	$38,000	14-4	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
2	CC	1233188189	CHAÑA JOHNNY	X																	230201	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF35	20	$949,000	$38,000	14-4	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
3	CE	5447111	DIAZ RAUL	X																	230301	20	$949,000	$151,900	EPS002	20	$949,000	$38,000	CCF35	20	$949,000	$38,000	14-4	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
4	CC	23419583	GARCIA YEISON	X																	25-14	20	$949,000	$151,900	EPS042	20	$949,000	$38,000	CCF35	20	$949,000	$38,000	14-4	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
5	CC	1005098706	GRANADA VICTOR	X	X																230301	7	$332,150	$53,200	EPS041	7	$332,150	$13,300	CCF35	7	$332,150	$13,300	14-4	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0	Si	$103,000
6	CC	18182206	MENESES SILVIO	X																	230301	20	$949,000	$151,900	EPSIC5	20	$949,000	$38,000	CCF35	20	$949,000	$38,000	14-4	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
7	CE	1970647	PEREZ MOISES	X	X																230301	7	$332,150	$53,200	EPS002	7	$332,150	$13,300	CCF35	7	$332,150	$13,300	14-4	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0	Si	$103,000
8	CE	5331907	PEYALO NORBERTO	X																	230301	20	$949,000	$151,900	EPS042	20	$949,000	$38,000	CCF35	20	$949,000	$38,000	14-4	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
9	CE	4668946	POLANCO JORGE	X	X																230301	8	$379,600	$60,800	EPS002	8	$379,600	$15,200	CCF35	8	$379,600	$15,200	14-4	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0	Si	$117,700
10	CC	1085252889	VEGA HUGO	X																	230301	20	$949,000	$151,900	ESSC24	20	$949,000	$38,000	CCF35	20	$949,000	$38,000	14-4	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
Total	**Afiliados(10)**																						$7,686,900	$1,230,500			$7,686,900	$307,800			$7,686,900	$307,800			$7,686,900	$535,600		$0	$0		$2,381,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901886968	4	GRUPO EMPRESARIAL INGENIAR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 14 18A BRR FATIMA	PASTO-NARIÑO	3007420183	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1348000098	9483276114	E	2025/03/17	2025/03/19	BANCOLOMBIA	2	$2,385,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,230,500	$1,600	$0	$1,232,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$151,900	$200	$0	$152,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$926,700	$1,200	$0	$927,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$151,900	$200	$0	$152,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$535,600	$700	$0	$536,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	10	$535,600	$700	$0	$536,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$307,800	$400	$0	$308,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	10	$307,800	$400	$0	$308,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	$307,800	$600	$0	$308,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$76,000	$100	$0	$76,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$38,000	$100	$0	$38,100
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$38,000	$100	$0	$38,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$76,000	$100	$0	$76,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$13,300	$100	$0	$13,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$66,500	$100	$0	$66,600
TOTAL				**10**	**$2,381,700**	**$3,300**	**$0**	**$2,385,000**

AXA COLPATRIA

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
860.002.183 – 9

CERTIFICA

*La empresa **GRUPO EMPRESARIAL INGENIAR SAS** identificada con NIT. **901886968 – 4** y afiliación **9027525** se encuentra afiliada a la ARL AXA COLPATRIA, desde el **11/02/2025** y que los trabajadores que se relacionan se encuentran afiliados bajo este empleador para la cobertura de riesgos por accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales.*

IDENT EMPLEADO	TIPO DE ID	NOMBRES Y APELLIDOS				FECHA DE INGRESO	TASA RIESGO
18182296	CC	SILVIO	ALBERTO	MENESES	CAJAS	11/02/2025	6,960%
1005098706	CC	VICTOR	MANUEL	GRANADA	TABA	11/02/2025	6,960%
23419583	CC	YEISON	JOSE	GARCIA	MENDOZA	11/02/2025	6,960%
1970647	CC	MOISES	RAFAEL	PEREZ	ROJAS	11/02/2025	6,960%
1233188189	CC	JHONNY	FABIAN	CHAÑA	MADROÑERO	11/02/2025	6,960%
4668946	CC	JORGE	LUIS	POLANCO	CHRINOS	11/02/2025	6,960%
1085252889	CC	HUGO	ERNESTO	VEGA	URBANO	11/02/2025	6,960%
5331907	CC	NORBERTO	RAMON	PELAYO		11/02/2025	6,960%
18331867	CC	JHOEFRY	JOSE	BUSTAMANTE	CHAVEZ	11/02/2025	6,960%
5447111	CC	RAUL	GUILLERMO	DIAZ	MORALES	11/02/2025	6,960%

La presente se expide a solicitud del interesado, a los 10 días del mes de febrero de 2025.

Emisión y Novedades
ARL AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

AXA COLPATRIA

Líder S&A OP. No monetarias

Elaboró:ZLRS

ANEXO 9
PÓLIZAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**BOGOTA**	**11**	**11-44-101239016**	**3**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	**02**	**2025**	**01**	**11**	**2024**	**00:00**	**31**	**12**	**2029**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	SANCHEZ QUICENO, ALLAN EDWARD		**CC: 9.731.335**
DIRECCIÓN: BR EL DORADO CRA 9A 15B 20	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELÉFONO:	3185311222

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO		**NIT: 800.165.872-6**
DIRECCIÓN: CALLE 19 NO. 23-00 PISO 2	CIUDAD: PASTO, NARIÑO	TELÉFONO	7292851

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6973355, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA - PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**01/11/2024**	**03/08/2025**	**$11,890,075.40**	**$6,667,332.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**01/11/2024**	**03/02/2028**	**$11,890,075.40**	**$6,667,332.00**
CALIDAD DEL SERVICIO	**31/12/2024**	**31/12/2029**	**$11,890,075.40**	**$6,667,332.00**

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS Y SE INCREMENTAN LOS VALORES ASEGURADOS DE LA POLIZA SEGUN CONCEPTO DE VIABILIDAD JURIDICA DE ADICION Y PRORROGA CONTRATO CO1.PCCNTR.6973355, DE FECHA 31/01/2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SE ACTUALIZA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****111,044.00	$ *******8,000.00	$ ******22,618.00	$ **********141,662.00	$ *******35,670,226.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASINPETROL LIMITADA ASESORES DE SEG	83052	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101239016

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101239016	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	02	2025	01	11	2024	00:00	31	12	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	SANCHEZ QUICENO, ALLAN EDWARD		**CC: 9.731.335**
DIRECCIÓN: BR EL DORADO CRA 9A 15B 20	**CIUDAD:** MOCOA, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	3185311222

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO		**NIT: 800.165.872-6**
DIRECCIÓN: CALLE 19 NO. 23-00 PISO 2	**CIUDAD:** PASTO, NARIÑO	**TELÉFONO:**	7292851

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101239016

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**BOGOTA**	**11**	**11-44-101239016**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	**02**	**2025**	**01**	**11**	**2024**	**00:00**	**21**	**03**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
SANCHEZ QUICENO, ALLAN EDWARD	**CC: 9.731.335**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
BR EL DORADO CRA 9A 15B 20	MOCOA, PUTUMAYO	3185311222

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO	**NIT: 800.165.872-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 19 NO. 23-00 PISO 2	PASTO, NARIÑO	7292851

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6973355, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA - PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**01/11/2024**	**21/09/2025**	**$11,890,075.40**	**$11,890,075.40**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**01/11/2024**	**21/03/2028**	**$11,890,075.40**	**$11,890,075.40**
CALIDAD DEL SERVICIO	**31/12/2024**	**31/12/2029**	**$11,890,075.40**	**$11,890,075.40**

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS Y SE INCREMENTAN LOS VALORES ASEGURADOS DE LA POLIZA SEGUN CONCEPTO DE VIABILIDAD JURIDICA DE ADICION Y PRORROGA CONTRATO CO1.PCCNTR.6973355, DE FECHA 31/01/2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SE ACTUALIZA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******8,788.00	$ *******4,000.00	$ *******2,429.00	$ **********15,218.00	$ *******35,670,226.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASINPETROL LIMITADA ASESORES DE SEG	83052	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101239016

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101239016	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	02	2025	01	11	2024	00:00	21	03	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	SANCHEZ QUICENO, ALLAN EDWARD		**CC: 9.731.335**
DIRECCIÓN: BR EL DORADO CRA 9A 15B 20	**CIUDAD:** MOCOA, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	3185311222

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO		**NIT: 800.165.872-6**
DIRECCIÓN: CALLE 19 NO. 23-00 PISO 2	**CIUDAD:** PASTO, NARIÑO	**TELÉFONO:**	7292851

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101239016

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 10
CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE INTERVENTORÍA.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia **ANEXO EQUIPO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	FT-SID-007	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	1 DE 2	

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO

FECHA: 28 / 2 / 2025

OBJETO

INTERVENTOR ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

FEBRERO **CONTRATO No.** CO1.PCCNTR.6973355 **MUNICIPIO** MOCOA

CONTRATISTA ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

DIA / MAQUINA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
COMPUTADORES	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			
HERRAMIENTA MENOR	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			

CONVENCIONES
ACTIVO = **A**
REPARACION = **R**
INACTIVO = **I**

Firma
Nombre: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
Matricula No.: 63202-094726 QND

ANEXO 11
CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANEXO PERSONAL DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PAGINA	1	DE	2

OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO

FECHA: 28 / 2 / 2025

INTERVENTOR ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MES FEBRERO **CONTRATO No.** No. CO1.PCCNTR.6973355 **MUNICIPIO** MOCOA-PUTUMAYO

CONTRATISTA ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

DIA / PROFESIONAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
DIRECTOR DE INTERVENTORIA			X			X		X			X		X	X	X		X	X		X				X		X				
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			
PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD INDUSTRIAL	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			
PROFESIONAL AMBIENTAL	X				X	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X			

Firma

Nombre: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

Matricula No.: 63202-094726 QND

ANEXO 12 APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CONTRATISTAS DE INTERVENTORÍA.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	28	2	2025

ANEXO CONTROL DE APORTES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE LA INTERVENTORÍA

SEGÚN RELACIÓN DE NÓMINA DEL FORMULARIO N° 3 MES

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	SUELDO MENSUAL (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL-SEPTIEMBRE ARP	EPS	PENSIÓN	TOTAL MES	TOTAL ACUMULADO
1	ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO	9.731.335	$ 3.000.000,00	$ 208.800	$ 255.000	$ 360.000		
2	FHANOR BRAVO GARCIA	1.124.856.458	$ 2.500.000,00	$ 174.000	$ 212.500	$ 300.000		
3	Erika Daniela Arias Revelo	1.124.857.971	$ 1.300.000,00	$ 90.480	$ 110.500	$ 156.000		
4	JAVIER ARTURO VILLOTA ROSERO	1.123.304.080	$ 2.000.000,00	$ 139.200	$ 170.000	$ 240.000		
TOTA	**TOTAL NÓMINA**		**$ 8.800.000**	**$ 612.480**	**$ 748.000**	**$ 1.056.000**	**$ 2.416.480**	**$ 2.416.480**
2. APORTES PARAFISCALES				**CAJA**	**SENA**	**ICBF**		
BASE APORTES PROYECTO			**$ 8.800.000**	**4%**	**2%**	**3%**		
TOTAL APORTES MENSUALES PAGADOS POR PARAFISCALES				$ 352.000	$ 176.000	$ 264.000	**$ 792.000**	**$ 792.000**
TOTAL PAGOS SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES							**$ 3.208.480**	**$ 3.208.480**

Firma

Nombre: ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

Matricula No.: 63202-094726 QND

ANEXO 13
BITÁCORA DE OBRA.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

Sábado 1 de febrero de 2025
Personal: 1 maestro, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 electrico.
Director y residente de obra, Hsq obra.
Clima: Ora nublado completamente.
Actividades:
Se continua con resane de muros y resane de Pinturas Piso 3 y Piso 4.
Se continua con trabajos electricos, instalación de tuberias y cableado para los nuevos circuitos.
no se permiten demoliciones de muro en baños por el ruido generado a solicitud de la coordinación del Palacio de justicia.

Residente obra.

Residente Inter.

Domingo 2 de febrero de 2025
Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 3ayudantes, 1 eléctrico; Director, Residente y Hsq de obra.
clima: lluvias moderadas mañana y tarde.
Actividades:
Se continua con resane de muros y resane de Pintura en los pisos tres y cuatro.
Se continua con el cableado de los circuitos electricos en las unidades sanitarias de Piso dos.

Residente obra

Residente Inter

lunes 3 de febrero de 2025
Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes, 1 eléctrico, Director Residente, Hsy de obra.
Clima: mañana soleada, tarde sombreada.
Actividades.

Se da continuidad con resane de muros, retoque de pintura en los Pisos 3 y 4.
Se continua con trabajos eelectricos en la unidad sanitaria de Piso dos.
No es Posible realizar demoliciones por tema de ruido coordinación pide silencio por interrupción en audiencias.

Se radica oficio CI-023, citación a comite tecnico

RESIDENTE OBRA

Residente inter

martes 4 de febrero de 2025
Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes, 1 eléctrico, Director, Residente, Hsy de Obra.
clima: Dia. mayormente nublado
Actividades:

Se continua con actividades de resane de muros, humedades, grietas, fisuras, en los Pisos tres y cuatro.
Se continua con trabajos electricos en la unidad sanitaria de piso dos.
Se realiza pintura filos de Puertos y ventanas en corredores.

RESIDENTE OBRA.

Residente Inter.

Powered by CamScanner

miercoles 5 de febrero de 2025
Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes, 1 eléctrico, Director, Residente y Hsq de Obra.
clima: Día soleado.
Actividades:

Se realiza resane de paredes, para corregir humedades, en los pisos tres y cuatro.
continua trabajos electricos, cableado e instalación de tuberías en batería sanitaria dos.
se sacan detalles de filos y puertas, en corredores piso 2.

Se envia oficio CI-025, Incumplimiento de obligaciones y compromisos del comité

Residente OBRA.

Residente Inter.

Jueves 6 de febrero de 2025
Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes, 1 eléctrico, Director Residente y Hsq de Obra.
Clima: lluvias moderadas todo el día.
Actividades:

Se realiza pintura y detalles a nivel de sótano
así mismo se trabaja con actividades eléctricas en el baño de segundo piso.
Se resanan filos a nivel de corredor en el piso dos, se paran actividades por temas de ruido por (1 hora) 3:00 pm - 4:00pm.

Residente OBRA

Residente Inte.

Viernes 7 de febrero de 2025
Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes, 1 eléctrico
Director, Residente y Hsq de obra.
clima: mañana nublada, tarde lluvias moderadas.
Actividades.

Se continua pintando en nivel de sótano, así mismo resanando Humedades, sacando filos a nivel de piso dos y tres.
Se continua con trabajos electricos, en zona de baños de discapacitados a nivel de P.so dos.
Por temas de ruido, y por solicitud de la coordinación del palacio de justicia, se suspenden actividades por dos horas desde las 2:00 Pm.

Residente obra

Residente Inter.

Sábado 8 de febrero de 2025
Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes, 1 eléctrico
Directa, Residente y Hsq de obra.
clima: mañana soleada, tarde nublada.
Actividades:

Se realiza limpieza general, así mismo continuan con trabajos de pintura, a nivel de sótano y piso dos, se continua con trabajos eléctricos en baterias, a nivel de Piso dos.

Residente obra

Residente Inter.

Powered by CamScanner

Domingo 9 de febrero de 2025
Personal: 1 maestro, 3 ayudantes, 3 oficiales, 1 eléctrico.
Director, Residente y Hsg Obra.
clima: lluvias moderadas.
Actividades:

Se desarrollan actividades de pintura a nivel de sótano, demarcación para el parqueadero.

RESIDENTE OBRA

Residente Inter.

Lunes 10 de febrero de 2025
Personal: 1 maestro, 3 ayudantes, 3 oficiales, 1 eléctrico.
Director, Residente, y Hsg. de Obra.
clima: lluvias moderadas en la mañana, tarde soleada.
Actividades:

Se realizan actividade de pintura en primer piso zona acceso principal.
Se realiza actividades de pintura a nivel de sótano en zona de cuartos técnicos.
Se realizan actividades de electricidad a nivel de piso dos.

Se envia oficio C1-026 incumplimiento de obligaciones contractuales.

RESIDENTE OBRA

Residente Inter.

martes 11 de febrero de 2025
Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes, 1 eléctrico
Director, Residente y tlsg. de obra.
clima: Dia nublado.
Actividades:

Se continuan actividades de Pintura a nivel de sótano, se Pintan cuartos tecnicos, cuarto de bombas, se continua sacando detalles en zona escaleras. se continua con actividades eléctricas a nivel de Piso tres.

Oficio C1-027 reiteración del incumplimiento de obligaciones contractuales.

US Alfredo Muñoz
Residente OBRA

Residente Inter.

miercoles 12 de febrero de 2025
Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes, 1 eléctrico.
Director, Residente y tlsg de Obra.
clima: Dia nublado.
Actividades:

Se continua con actividades de pintura a nivel de sótano, retoques y se sacan humedades, se realizan demoliciones de muros en Piso tres, en zona de Personas con movilidad reducida, se realizan actividade eléctricas en baterias Piso 3.
(Se Paran demoliciones de Piso 3 2 horas 3:00 pm - 4:00 pm.

US Alfredo Muñoz
Residente OBRA

Residente Inter.

Powered by CamScanner

Jueves 13 de febrero de 2025
Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes, 1 eléctrico.
Director, Residente y Hsq de Obra.
clima: Dra soleado.
Actividades:

Se continuan actividades de demoliciones en zona de discapacitados en piso tres, y (tres) dos.
se continuan trabajos eléctricos a nivel de piso tres en baterias sanitarias.
Se retoca pintura y se sacan humedades y dilataciones en zona de escaleras.
Se paran demoliciones por audiencias. 8:00 Am a 10:30 Pm (2.5 horas).

US Alberca Minas
Residente obra

Residente Inter.

Viernes 14 de febrero de 2025
Personal: 3 oficiales, 3 ayudantes, 1 maestro, 1 electrico
Director, Residente y Hsq Obra.
clima: lluvias moderadas en la mañana, soleado en la tarde.
Actividades:

Se continuan actividades de demolicion en baños discapacitados en piso tres.
Se continua resanes a nivel o zona de escaleras cercanas al ascensor.
Se continuan actividade electricas en baños de piso 3.
Se paran actividades de demolición por 2 horas en la tarde (3:00 a 5 pm) por ruido a solicitud de la coordinación del Palacio de justicia.
el coordinador del Palacio pide prestado 2 obreros toda la mañana.

US Alberca Minas
Residente obra

Residente Inter.

Powered by CamScanner

Sábado 15 de febrero de 2025
Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes, 1 eléctrico.
Director, Residentes Hsg de Obra.
clima: Lluvias Intensas.
Actividades:

Se continua con desalojo de escombros de la demolición de muros en piso tres.
Se continua con resanes de pintura, filos en comedores de piso tres.
Se continua con actividades eléctricas en batería en piso tres.

Residente OBRA
Residente Inter.

Domingo 16 de febrero de 2025
Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes, 1 eléctrico.
Director, Residente y Hsg de Obra.
clima: Ora nublado.
Actividades:

Se aprovecha que el perforadero a nivel de sótano esté libre para continuar con demarcación vial sobre el piso.

Residente OBRA
Residente inter.

Powered by CamScanner

lunes 17 de febrero de 2025
Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes, 1 eléctrico.
Director, Residente y Hsg. Obra.
clima: lluvias moderadas.
Actividades:

Se realiza Ajuste de tubería sanitaria y de ventilación a nivel de piso 3.
Se continua con resanes de muros en muros zona de baños de personas con movilidad reducida en piso uno.
Se continuan trabajos eléctricos en baterías zona de piso tres.
Se paran actividades por temas de ruido 2 horas por solicitud de coordinador del Palacio de justicia.

Ing Alfredo Muñoz
Residente OBRA

Residente Inter.

martes 18 de febrero de 2025
Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes, 1 electricos.
Director Residente y Hsg de Obra.
clima: Dia soleado. en la mañana, tarde lluvias moderadas.
Actividades:

Se continua con actividades electricas en batería sanitaria piso 3, se instala tubería y se instala cableado.
Se retira material de demolición desde piso tres hasta sótano.
Se realiza cargue de escombros para desalojar y limpiar el sótano y zona de acopio.

Ing Alfredo Muñoz
Residente OBRA

Residente Inter.

Powered by CamScanner

miercoles 19 de febrero de 2025
Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 2 ayudantes. 1 electrico.
Director, Residente y Hsq de Obra.
clima: Dia soleado. en la mañana y tarde lluvias moderadas
Actividades:

Se realiza pintura, resane y filos zona de escaleras, en la parte posterior del ascensor, se continuan trabajos eléctricos en bateria sanitaria de Piso 3, se ejecutan algunas actividades de demolición de piso en baterias de piso tres, se suspenden actividades de demolición por temas de ruido, a solicitud de la coordinación del palacion (se para de 10:00 am - 12 pm).

Residente OBRA

Residente Inter.

jueves 20 de febrero de 2025
Personal: 1 maestro, 2 oficiales, 2 ayudantes, Director, Residente.
y Hsq de Obra.
clima: lluvias Intensas en la mañana, moderadas en la tarde.
Actividades:

Se realizan resanes de humedades en archivo en el sótano, se estructura divisiones para instalación de láminas de superboard en piso cuatro, se sacan filos en ventanas y puertas en corredores de piso cuatro.

RESIDENTE OBRA

Residente Inter.

Powered by CamScanner

Viernes 21 de febrero de 2025
Personal: 1 maestro, 2 oficiales, 2 ayudantes Director, Residente y Hsq de Obra.
clima: lluvias Intensas.
Actividades:

Se realiza resane de humedades en zona de archivo a nivel de sótano, se trabaja con la instación de muros en super board en baterías Piso cuarto zona de baño con movilidad reducida. se desaloja material de escombro desde Piso tres

Residente OBRA Residente Inter.

Sábado 22 de febrero de 2025
Personal: 1 maestro, 2 oficiales, 2 ayudantes, Director, Residente y Hsq de Obra.
Clima: lluvias moderadas.
Actividades:

Se continua con trabajos de resane en archivo a nivel de sótano, se retira cielo raso dañado y se organizan viga canal en lamina.

Residente OBRA Residente Inter.

Powered by CamScanner

Domingo 23 de febrero de 2025
Personal: 1 maestro, 2 oficiales, 2 ayudantes, Director, Residente y Hsq de Obra.
clima: Ora nublado.
Actividades:

Se continua con la pintura de demarcación de señalización horizontal a nivel de sótano aprovechando que se encuentra libre el parqueadero.

Residente Obra

Residente Inter.

Lunes 24 de febrero de 2025
Personal: 1 maestro, 2 oficiales, 2 ayudantes, Director, Residente y Hsq Obra.
clima: mañana nublada, tarde lluvias intensas.
Actividades:

Se retoca pintura a nivel de sótano, así mismo se reparan goteras en archivo a nivel de sótano.
Se retira cielo raso batería sanitaria en piso tres.

Se envia oficio P1-029 de asunto. incumplimiento de obligaciones contractuales.

Residente Obra

Residente Inter.

Powered by CamScanner

martes 25 de febrero de 2025
Personal: 1 maestro, 2 oficiales, 2 ayudantes, Director, Residente y Hsg Obra.
clima: lluvias intensas
Actividades:

Se realizan retiro de pintura levantada, humedades en fachada zona exterior a nivel de sótano.
se realiza retoques de pintura en corredores de nivel uno.

Se radica Oficio CI-030, Citación a comite tecnico.

Residente OBRA

Residente de Inter.

miercoles 26 de febrero de 2025
Personal: 1 maestro, 2oficiales, 2 ayudantes, Director Residente y Hsg Obra.
clima: lluvias intensas.
Actividades:

Se realiza retiro de pintura en fachada a una altura de primer nivel desde los anderes de la calle.
Se realizan algunas reparaciones y retoques de pintura a nivel de sótano.

Residente OBRA

Residente Inter

Jueves 27 de febrero de 2025
Personal: 1 maestro, 2 oficiales, 2 ayudantes, Director, Residente y Hsq de Obra.
clima: Dia soleado.
Actividades:

Se realiza resanes en nivel de sótano, en cuarto de máquinas y pared externa de tanque de almacenamiento en cuarto de archivo.
Se retoca pintura de demarcación horizontal.

Residente obra.

Residente de Inter.

Viernes 28 de febrero de 2025
Personal: 1 maestro, 2 oficiales, 2 ayudantes, Director Residente y Hsq de Obra.
clima: mañana nublada, tarde lluvias Intensas.
Actividades:

Se retoca pintura a nivel de sótano, demarcación horizontal, segunda mano y tercer mano en algunas zonas.
Se realiza demolición piso tres, zona baterias y se realza desalojo.

Residente obra

Residente de Inter.

Powered by CamScanner

ANEXO 14
INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

INFORME No. 03

INFORME SEGUIMIENTO MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Contrato de obra N°CO1.PCCNTR.6947019: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO".

ELABORÓ:

ERIKA DANIELA ARIAS REVELO

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PERIODO COMPRENDIDO: PERIODO DE 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

MOCOA PUTUMAYO

2025

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán - Mocoa - Putumayo

Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN. 3
2. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA 3
3. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL 4
4. EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES. 4
5. ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 4
6. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 5
7. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5
8. INPECCIÓN EN TRABAJOS EN ALTURAS 6
9. INSPECCION DEL ESTADO Y USO ADECUADO DE LOS EPP 6
10. CAPACITACIONES Y CHALAS PREOPERACIONALES ENSEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .. 7
11. INDUCCIONES CONCIENTIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO. 8
12. PAUSAS ACTIVAS 8
13. AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL 9
14. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES. 10

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán - Mocoa - Putumayo

INTRODUCCIÓN.

El presente documento es el informe N°01 de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se relaciona las actividades de SST, del contrato Contrato de obra N°CO1.PCCNTR.6947019: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA – PUTUMAYO". Dentro de las actividades realizadas en obra durante el periodo ejecutado se realiza por medio de inspecciones de seguridad correspondientes a la interventoría, de esta manera se determinan las condiciones laborales teniendo en cuenta el riesgo al cual labora el personal. Dentro de las actividades de inspección de SST, se hace la verificación documental y operativa con el fin de verificar la garantía de un trabajo seguro.

El cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido un compromiso para el contratista COINCO primando siempre la promoción y prevención de accidentes y enfermedades laborales mejorando las condiciones de trabajo con el proceso PHVA, Planear, Hacer, Verificar y Actuar, haciendo evaluación y corrección para tener como resultado un plan de mejora activo.

Realizar controles de factores de riesgo en las condiciones de trabajo evidenciadas permite implementar de manera adecuada un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde a las actividades que el contratista programe, realizando diferentes actividades que permiten incrementar la seguridad la seguridad física y la salud mental de los colaboradores afianzando su desarrollo laboral dentro de la programación de las actividades de obra.

A continuación, se presenta información general del contrato de obra, así como también se especifican las actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a la normatividad (Decreto 1443 de 2014, Decreto 1072 de 2015, Resolución 312 de 2019), en la ejecución de las actividades en relación a la inspección y seguimiento diario.

1. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

En la siguiente tabla se relaciona al personal que ingresó a dar inicio en las actividades del presente contrato.

	Personal Administrativo						
NOMBRE	**CARGO**	**C.C**	**INGRESO**	**EGRESO**	**EPS**	**F. P**	**ARL**
Marlon Arteaga	director Obra	1.085.249.647	11/02/2025		SANITAS	PORVENIR	MI PLANILLA
Luis Alberto Muñoz	Residente	1.124.313.123	11/02/2025		EMSSANAR	PORVENIR	MI PLANILLA
Mayerli Carolina Aránzazu	Residente SST	1.124.862.736	11/02/2025		COLPENSIONES	NUEVA EPS	MI PLANILLA
	Personal Operativo						
NOMBRE	**CARGO**	**C.C**	**INGRESO**	**EGRESO**	**EPS**	**F. P**	**ARL**
Yeison García	Maestro	23419583	11/02/2025		COOSALUD		AXA COLPATRIA

Jorge Luis Polanco	oficial	24466859	11/02/2025		COOSALUD		AXA COLPATRIA
Moisés Rafael Pérez	Aux de obra	4970647	11/02/2025		SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	AXA COLPATRIA
Silvio Meneses	Aux de obra	18182206	11/02/2025			PORVENIR	AXA COLPATRIA
Víctor Manuel Granada	Aux de obra	1005098706	11/02/2025		NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA
Norberto Ramón Pelayo 17 dias	oficial	5331907	11/02/2025				AXA COLPATRIA
Raul Guillermo Diaz Morales	Oficial	5447111	11/02/2025				AXA COLPATRIA
Jhoefry Jose Bustamante	ayudante	5626299	11/02/2025		NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA
Hugo Ernesto Vega	Oficial	108522889	11/02/2025		SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA
	PERSONAL ELECTRICISTA						
NOMBRE	**CARGO**	**C.C**	**INGRESO**		**EPS**	**F. P**	**ARL**
Johnny Chaña - Eléctrico	Electricista	1233188189	11/02/2025		NUEVA EPS	PROTECCIÓN	AXA COLPATRIA

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Se anexan para el periodo del informe la consolidación del cumplimiento de pago de planillas de parte del contratista, la cual es revisada previamente.

Ver anexo 1. Planillas de Pago de Seguridad Social y nueva afiliación a ARL

3. EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES.

En este periodo no se registraron ingresos por lo tanto el contratista no reporta la realización de exámenes de ingreso.

4. ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Durante el transcurso de los periodos en operación de la obra se observó que el personal es dotado de todos los elementos necesarios para realizar las actividades requeridas, se realizó de parte de la interventoría la inspección de los EPP entregados y en caso de cambios realizar la respectiva reposición, de igual manera se observó el adecuado uso de elementos de seguridad.

Anexo 2: Entrega de elementos de protección personal





Ilustración 1. entrega de EPP

5. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

Durante este periodo no se identificaron accidentes o incidentes dentro del grupo que comprende el personal del presente contrato de igual manera se evidencia el control y verificación de las condiciones inseguras a las que se enfrentan.

6. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se verificó que durante este mes que se continuara realizando las actividades de sensibilización y cultura de auto cuidado donde el componente SST realiza charlas de manera eventual antes de iniciar la jornada laboral en donde se busca informar sobre los riesgos inherentes en sus labores diarias, La Interventoría SST recomienda continuar realizando esta actividad que refuerza los conocimientos y cuidados individuales y grupales dentro de las actividades de obra programadas. Se verificó el uso adecuado de los EPP y la dotación. **Ver anexo 3: Inspecciones de seguridad 4: documentos de vehículo tipo Volqueta.**





Ilustración 2. Inspección de Seguridad

7. INPECCIÓN EN TRABAJOS EN ALTURAS

En este periodo se realizaron actividades de alturas en el las cuales realizaron trabajos de pinturas en los muros de sótano, para estas actividades se emplearon equipos especiales para la seguridad de los trabajadores, se realizaron las inspecciones de los arnés y eslingas de seguridad, además se utilizaron andamios certificados el cual consta de 4 cuerpos, todos debidamente inspeccionados antes de la actividad, la empresa proveedora de estos equipos entregó la certificación.

Estas actividades fueron realizadas por dos trabajadores autorizados para realizar trabajos en alturas por medios del curso

Anexo 5: Permisos de trabajos en alturas e inspecciones de elementos de protección contra Caídas.



Ilustración 3. trabajos en alturas, actividad de pintura

8. INSPECCION DEL ESTADO Y USO ADECUADO DE LOS EPP

Se verificó que el componente SST continúa dando cumplimiento en la entrega de elementos de protección personal contra lluvias como es el traje impermeable al personal que estaba pendiente, de esta manera se subsana los compromisos con el personal y se contrarresta la posibilidad de enfrentar accidentes o enfermedades laborales. *Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Titulo IV, Capitulo II De Los Equipos Y Elementos De Protección, Artículo 176 a 201*).

Se continúa dando cumplimiento a las normas del SG-SST realizando entrega de reposición de elementos de protección personal se sugiere al contratista continuar realizando inspección de EPP además de su adecuado uso preventivo.



Ilustración 4. Inspección del uso adecuado de los EPP.

9. CAPACITACIONES Y CHALAS PREOPERACIONALES ENSEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La realización de capacitaciones del personal es de vital importancia ya que de esta manera se previenen accidentes y enfermedades laborales, que se pueden dar paso por las actividades y procesos del proyecto teniendo en cuenta los estándares establecidos por el SG-SST. *Decreto 1072, artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en seguridad y salud en el trabajo – SST. El empleador o contratante debe definir los requisitos de conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo necesarios para sus trabajadores.*

Anexo 6: Asistencia a charlas

- Seguridad contra incendios
- Herramientas portátiles y manuales
- Reposición de las protecciones
- Calistenia-Recomendaciones
- Plataformas y superficies planas
- Fatiga y somnolencia
- Martillos y herramientas de impacto
- Tableros eléctricos - calistenia
- Recomendaciones para uso de escaleras portátiles
- Actividad dinámica – Calistenia
- Perjuicio del ruido
- Como prevenir el estrés por calor
- Porque tenemos un programa de seguridad
- Los accidentes son casuales
- Los "casi accidentes" son advertencias

- Calistenia e inspecciones
- Objetos que caen – peligros elevados
- Cadena de hábitos – Calistenia
- Todos los accidentes deben ser investigados
- Pasillos libres de materiales – Calistenia
- Peligros inherentes a las ascensiones
- Almacenamiento y manejo de herramientas de mano
- Actividad en grupo reacción a estímulo
- Recomendaciones Calistenia





Ilustración 5. Charlas y Capacitaciones

10.INDUCCIONES CONCIENTIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO.

La interventoría verificó que los estándares y normas de seguridad terminaran con éxito se observó la realización de notificación de riesgos laborales, con el propósito de brindar una efectiva orientación de los riesgos, su clasificación, las funciones que desempeñará los fines y objetivos de la empresa, su estructura y demás temas relacionados con el Sistema de Gestión, de igual manera se realiza evaluaciones del conocimiento adquirido en esta actividad de vital importancia para la realización de actividades.

Anexo 7: inducción y evaluación

11. PAUSAS ACTIVAS

Se continua realizando actividades de pausas activas, dinámicas y calentamiento o calistenia, antes, durante y al finalizar la jornada laboral estas actividades fortalecen a los trabajadores debido que por medio de ellas se puede recuperar energías, fortalecer el desempeño laboral y aumentar la eficiencia en el desarrollo de las actividades propuestas en el día a día para continuar con el proyecto, estas actividades ayudan a minimizar las enfermedades osteomusculares y reducir el estrés laboral.

Mediante seguimiento diario a las pausas activas se evidencia el cumplimiento, con la práctica de estiramientos y calentamiento muscular previo al inicio labores y mediante breves descansos durante la jornada laboral que sirven para recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo esto en cumplimiento a la normatividad legal vigente colombiana.



Ilustración 6. Pausas activas preoperacionales.

12. AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL

Se verificó la documentación de COINCO y el cumplimiento de sus obligaciones legales y que realice las respectivas afiliaciones y aportes al Sistema General de seguridad Social - SGSS de los empleados vinculados al proyecto. Profesional SST diligencia formato de control de personal en el que se detalla los datos del trabajador, fechas de ingreso y egreso, se relaciona ARL, EPS, AFP, a las cuales se encuentra afiliados.

Anexo 1 - planillas de pago de seguridad social

De la misma manera, el personal activo de interventoría cuenta con afiliación al sistema General de Seguridad Social-SGSS (EPS, ARL, AFP y caja de compensación familiar) y mensualmente se hace verificación de los respectivos aportes, dando cumplimiento a la normatividad correspondiente.

Ver anexo 1. Planilla de Seguridad Social de Interventoría.

13. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

Durante la ejecución de la obra se pudo observar la colaboración y compromiso de parte del componente SST y la alta dirección con un avance positivo de mejora continua en los procesos de atención, cuidado y prevención dirigida al bienestar de los trabajadores, colaboradores y demás personal perteneciente al proyecto, de la misma manera se observó el cuidado preventivo a los equipos, maquinarias, herramientas e instalaciones, de esta manera el contratista COINCO da cumplimiento al SG-SST en su Decreto 1072 de 2015 como regulador de seguridad y salud en el trabajo de igual manera se vio el cumplimiento en la aplicación del protocolo de bioseguridad.

La interventoría realizó de manera continua el acompañamiento en los procesos y actividades programados por el contratista de igual manera se realizó sugerencias y recomendaciones con el fin de mejorar las condiciones de trabajo, se realizó identificación de riesgos y peligros presentes en obra logrando de la mano del componente SST mitigarlos implementando de manera adecuada el plan de emergencia.

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901887481	4	SAJ ALTURAS TSA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	TRASVERSAL 70D BIS 68-75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3209872640	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1347452667	9483264952	E	2025/03/19	2025/03/19	BANCOLOMBIA	0	$809,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (5 Afiliados)						$2,609,750	$418,000			$2,609,750	$104,500			$2,609,750	$104,500			$2,609,750	$182,000		$0	$0
Centro de Trabajo: MOCOA (5 Afiliados)						$2,609,750	$418,000			$2,609,750	$104,500			$2,609,750	$104,500			$2,609,750	$182,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$2,609,750	$418,000			$2,609,750	$104,500			$2,609,750	$104,500			$2,609,750	$182,000		$0	$0
1	PT	5626299	BUSTAMANTE JHOEFRY	230301	11	$521,950	$83,600	EPS037	11	$521,950	$20,900	CCF21	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
2	CC	18126897	CHICUNQUE JESUS	25-14	11	$521,950	$83,600	ESSC18	11	$521,950	$20,900	CCF21	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
3	CC	18130265	ESQUIBEL WINDEN	230301	11	$521,950	$83,600	EPSIC3	11	$521,950	$20,900	CCF21	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
4	PT	5331907	PELAYO NORBERTO	230301	11	$521,950	$83,600	ESSC24	11	$521,950	$20,900	CCF21	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
5	CC	1085252889	VEGA HUGO	230301	11	$521,950	$83,600	ESSC24	11	$521,950	$20,900	CCF21	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			$2,609,750	$418,000			$2,609,750	$104,500			$2,609,750	$104,500			$2,609,750	$182,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901887481	4	SAJ ALTURAS TSA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	TRASVERSAL 70D BIS 68-75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3209872640	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1347452667	9483264952	E	2025/03/19	2025/03/19	BANCOLOMBIA	0	$809,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$418,000	$0	$0	$418,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$83,600	$0	$0	$83,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$334,400	$0	$0	$334,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$182,000	$0	$0	$182,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$182,000	$0	$0	$182,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$104,500	$0	$0	$104,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	5	$104,500	$0	$0	$104,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$104,500	$0	$0	$104,500
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$20,900	$0	$0	$20,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$41,800	$0	$0	$41,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$20,900	$0	$0	$20,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$20,900	$0	$0	$20,900
TOTAL				5	$809,000	$0	$0	$809,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901887481	4	SAJ ALTURAS TSA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	TRASVERSAL 70D BIS 68-75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3209872640	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1347430888	9483264599	E	2025/03/19	2025/03/19	BANCOLOMBIA	0	$1,132,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (7 Afiliados)						$3,653,650	$585,200			$3,653,650	$146,300			$3,653,650	$146,300			$3,653,650	$254,800		$0	$0
Centro de Trabajo: MOCOA (7 Afiliados)						$3,653,650	$585,200			$3,653,650	$146,300			$3,653,650	$146,300			$3,653,650	$254,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)						$3,653,650	$585,200			$3,653,650	$146,300			$3,653,650	$146,300			$3,653,650	$254,800		$0	$0
1	CC	1233188189	CHAÑA JOHNNY	230201	11	$521,950	$83,600	EPS037	11	$521,950	$20,900	CCF21	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
2	PT	5447111	DIAZ RAUL	230301	11	$521,950	$83,600	EPS002	11	$521,950	$20,900	CCF21	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
3	PT	5022647	GARCIA YEISON	25-14	11	$521,950	$83,600	ESSC24	11	$521,950	$20,900	CCF21	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
4	CC	1005098706	GRANADA VICTOR	230301	11	$521,950	$83,600	EPS041	11	$521,950	$20,900	CCF21	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
5	CC	18182206	MENESES SILVIO	230301	11	$521,950	$83,600	EPSIC5	11	$521,950	$20,900	CCF21	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
6	PT	4970647	PEREZ MOISES	230201	11	$521,950	$83,600	EPS002	11	$521,950	$20,900	CCF21	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
7	PT	4668946	POLANCO JORGE	230301	11	$521,950	$83,600	ESSC24	11	$521,950	$20,900	CCF21	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
Total			**Afiliados(7)**			$3,653,650	$585,200			$3,653,650	$146,300			$3,653,650	$146,300			$3,653,650	$254,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901887481	4	SAJ ALTURAS TSA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	TRASVERSAL 70D BIS 68-75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3209872640	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1347430888	9483264599	E	2025/03/19	2025/03/19	BANCOLOMBIA	0	$1,132,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$585,200	$0	$0	$585,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$83,600	$0	$0	$83,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$334,400	$0	$0	$334,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$167,200	$0	$0	$167,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$254,800	$0	$0	$254,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$254,800	$0	$0	$254,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$146,300	$0	$0	$146,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	7	$146,300	$0	$0	$146,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$146,300	$0	$0	$146,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$41,800	$0	$0	$41,800
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$20,900	$0	$0	$20,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$20,900	$0	$0	$20,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$20,900	$0	$0	$20,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$41,800	$0	$0	$41,800
TOTAL				7	$1,132,600	$0	$0	$1,132,600

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1124862736	MAYERLY CAROLINA ARANZAZU SARASTY	vereda san antonio	3223821876	maranzazusa1314@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		PUTUMAYO	MOCOA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	25/03/2025	84246783	$409.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	178.000	0		0		0	14	1.600	0	179.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	14	2.000	0	229.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	14	0	0	0
ICBF				
0	14	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	179.600
Pensión	1	227.800	229.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	405.800	409.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1124862736	MAYERLY CAROLINA ARANZAZU SARASTY		vereda san antonio	3223821876	maranzazusa1314@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			PUTUMAYO	MOCOA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	25/03/2025	84246783	$409.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1124862736	ARANZAZU SARASTY MAYERLY CAROLINA	3	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1124313123		MUÑOZ BECERRA LUIS ALFREDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	B villa del Norte cll 27n9 84	MOCOA-PUTUMAYO	4204224	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1362638408	9483357146	I	2025/03/07	2025/03/26	BANCOLOMBIA	19	$459,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1124313123	MUÑOZ BECERRA LUIS ALFREDO	X	X																230301	30	$1,600,000	$274,600	ESSC18	30	$1,600,000	$180,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$454,600
Total	**Afiliados(1)**																						$1,600,000	$274,600			$1,600,000	$180,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$454,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1124313123		MUÑOZ BECERRA LUIS ALFREDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	B villa del Norte cll 27n9 84	MOCOA-PUTUMAYO	4204224	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1362638408	9483357146	I	2025/03/07	2025/03/26	BANCOLOMBIA	19	$459,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$274,600	$2,800	$0	$277,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$274,600	$2,800	$0	$277,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$180,000	$2,200	$0	$182,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$180,000	$2,200	$0	$182,200
TOTAL				1	$454,600	$5,000	$0	$459,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901886968	4	GRUPO EMPRESARIAL INGENIAR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 14 18A BRR FATIMA	PASTO-NARIÑO	3007420183	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1348000098	9483276114	E	2025/03/17	2025/03/19	BANCOLOMBIA	2	$2,385,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	18331867	BUSTAMANTE JHOEFRY	X																	230301	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF35	20	$949,000	$38,000	14-4	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
2	CC	1233188189	CHAÑA JOHNNY	X																	230201	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF35	20	$949,000	$38,000	14-4	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
3	CE	5447111	DIAZ RAUL	X																	230301	20	$949,000	$151,900	EPS002	20	$949,000	$38,000	CCF35	20	$949,000	$38,000	14-4	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
4	CC	23419583	GARCIA YEISON	X																	25-14	20	$949,000	$151,900	EPS042	20	$949,000	$38,000	CCF35	20	$949,000	$38,000	14-4	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
5	CC	1005098706	GRANADA VICTOR	X	X																230301	7	$332,150	$53,200	EPS041	7	$332,150	$13,300	CCF35	7	$332,150	$13,300	14-4	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0	Si	$103,000
6	CC	18182206	MENESES SILVIO	X																	230301	20	$949,000	$151,900	EPSIC5	20	$949,000	$38,000	CCF35	20	$949,000	$38,000	14-4	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
7	CE	1970647	PEREZ MOISES	X	X																230301	7	$332,150	$53,200	EPS002	7	$332,150	$13,300	CCF35	7	$332,150	$13,300	14-4	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0	Si	$103,000
8	CE	5331907	PEYALO NORBERTO	X																	230301	20	$949,000	$151,900	EPS042	20	$949,000	$38,000	CCF35	20	$949,000	$38,000	14-4	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
9	CE	4668946	POLANCO JORGE	X	X																230301	8	$379,600	$60,800	EPS002	8	$379,600	$15,200	CCF35	8	$379,600	$15,200	14-4	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0	Si	$117,700
10	CC	1085252889	VEGA HUGO	X																	230301	20	$949,000	$151,900	ESSC24	20	$949,000	$38,000	CCF35	20	$949,000	$38,000	14-4	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
Total	**Afiliados(10)**																						$7,686,900	$1,230,500			$7,686,900	$307,800			$7,686,900	$307,800			$7,686,900	$535,600		$0	$0		$2,381,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901886968	4	GRUPO EMPRESARIAL INGENIAR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 14 18A BRR FATIMA	PASTO-NARIÑO	3007420183	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1348000098	9483276114	E	2025/03/17	2025/03/19	BANCOLOMBIA	2	$2,385,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,230,500	$1,600	$0	$1,232,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$151,900	$200	$0	$152,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$926,700	$1,200	$0	$927,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$151,900	$200	$0	$152,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$535,600	$700	$0	$536,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	10	$535,600	$700	$0	$536,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$307,800	$400	$0	$308,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	10	$307,800	$400	$0	$308,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	$307,800	$600	$0	$308,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$76,000	$100	$0	$76,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$38,000	$100	$0	$38,100
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$38,000	$100	$0	$38,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$76,000	$100	$0	$76,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$13,300	$100	$0	$13,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$66,500	$100	$0	$66,600
TOTAL				**10**	**$2,381,700**	**$3,300**	**$0**	**$2,385,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085249647		ARTEAGA POTOSI MARLON FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 5 CASA 18 LAS BRISAS	PASTO-NARIÑO	7360636	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1350141791	9482287293	I	2025/03/12	2025/03/20	NEQUI	8	$687,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1085249647	ARTEAGA MARLON																		230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$684,000
Total	**Afiliados(1)**																						$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$684,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085249647		ARTEAGA POTOSI MARLON FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 5 CASA 18 LAS BRISAS	PASTO-NARIÑO	7360636	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1350141791	9482287293	I	2025/03/12	2025/03/20	NEQUI	8	$687,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,000	$2,000	$0	$386,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$384,000	$2,000	$0	$386,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$1,600	$0	$301,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$300,000	$1,600	$0	$301,600
TOTAL				**1**	**$684,000**	**$3,600**	**$0**	**$687,600**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900628905-1	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO	CR 7 109 28	6013003019	administrativo@coincosas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	MOCOA PUTUMAY	020	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	Y	18/03/2025	84555731	$399.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	396.400				396.400	14	3.500	399.900			3.964	399.900	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	14	0	0	0
ICBF				
0	14	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	396.400	399.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	396.400	399.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900628905-1	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO		CR 7 109 28	6013003019	administrativo@coincosas.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	MOCOA PUTUMAY	020	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	Y	18/03/2025	84555731	$399.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1085249647	ARTEAGA POTOSI MARLON FERNANDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1124313123	MUÑOZ BECERRA LUIS ALFREDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1124862736	ARANZAZU SARASTY MAYERLY CAROLINA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	87574554	FAJARDO BARCO NORBERTO DAVID	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901886968	4	GRUPO EMPRESARIAL INGENIAR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 14 18A BRR FATIMA	PASTO-NARIÑO	3007420183	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1348000098	9483276114	E	2025/03/17	2025/03/19	BANCOLOMBIA	2	$2,385,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	18331867	BUSTAMANTE JHOEFRY	X																	230301	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF35	20	$949,000	$38,000	14-4	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
2	CC	1233188189	CHAÑA JOHNNY	X																	230201	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF35	20	$949,000	$38,000	14-4	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
3	CE	5447111	DIAZ RAUL	X																	230301	20	$949,000	$151,900	EPS002	20	$949,000	$38,000	CCF35	20	$949,000	$38,000	14-4	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
4	CC	23419583	GARCIA YEISON	X																	25-14	20	$949,000	$151,900	EPS042	20	$949,000	$38,000	CCF35	20	$949,000	$38,000	14-4	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
5	CC	1005098706	GRANADA VICTOR	X	X																230301	7	$332,150	$53,200	EPS041	7	$332,150	$13,300	CCF35	7	$332,150	$13,300	14-4	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0	Si	$103,000
6	CC	18182206	MENESES SILVIO	X																	230301	20	$949,000	$151,900	EPSIC5	20	$949,000	$38,000	CCF35	20	$949,000	$38,000	14-4	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
7	CE	1970647	PEREZ MOISES	X	X																230301	7	$332,150	$53,200	EPS002	7	$332,150	$13,300	CCF35	7	$332,150	$13,300	14-4	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0	Si	$103,000
8	CE	5331907	PEYALO NORBERTO	X																	230301	20	$949,000	$151,900	EPS042	20	$949,000	$38,000	CCF35	20	$949,000	$38,000	14-4	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
9	CE	4668946	POLANCO JORGE	X	X																230301	8	$379,600	$60,800	EPS002	8	$379,600	$15,200	CCF35	8	$379,600	$15,200	14-4	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0	Si	$117,700
10	CC	1085252889	VEGA HUGO	X																	230301	20	$949,000	$151,900	ESSC24	20	$949,000	$38,000	CCF35	20	$949,000	$38,000	14-4	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
Total	**Afiliados(10)**																						$7,686,900	$1,230,500			$7,686,900	$307,800			$7,686,900	$307,800			$7,686,900	$535,600		$0	$0		$2,381,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901886968	4	GRUPO EMPRESARIAL INGENIAR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 14 18A BRR FATIMA	PASTO-NARIÑO	3007420183	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1348000098	9483276114	E	2025/03/17	2025/03/19	BANCOLOMBIA	2	$2,385,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,230,500	$1,600	$0	$1,232,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$151,900	$200	$0	$152,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$926,700	$1,200	$0	$927,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$151,900	$200	$0	$152,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$535,600	$700	$0	$536,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	10	$535,600	$700	$0	$536,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$307,800	$400	$0	$308,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	10	$307,800	$400	$0	$308,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	$307,800	$600	$0	$308,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$76,000	$100	$0	$76,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$38,000	$100	$0	$38,100
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$38,000	$100	$0	$38,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$76,000	$100	$0	$76,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$13,300	$100	$0	$13,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$66,500	$100	$0	$66,600
TOTAL				**10**	**$2,381,700**	**$3,300**	**$0**	**$2,385,000**

AXA COLPATRIA

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
860.002.183 – 9

CERTIFICA

*La empresa **GRUPO EMPRESARIAL INGENIAR SAS** identificada con NIT. **901886968 – 4** y afiliación **9027525** se encuentra afiliada a la ARL AXA COLPATRIA, desde el **11/02/2025** y que los trabajadores que se relacionan se encuentran afiliados bajo este empleador para la cobertura de riesgos por accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales.*

IDENT EMPLEADO	TIPO DE ID	NOMBRES Y APELLIDOS				FECHA DE INGRESO	TASA RIESGO
18182296	CC	SILVIO	ALBERTO	MENESES	CAJAS	11/02/2025	6,960%
1005098706	CC	VICTOR	MANUEL	GRANADA	TABA	11/02/2025	6,960%
23419583	CC	YEISON	JOSE	GARCIA	MENDOZA	11/02/2025	6,960%
1970647	CC	MOISES	RAFAEL	PEREZ	ROJAS	11/02/2025	6,960%
1233188189	CC	JHONNY	FABIAN	CHAÑA	MADROÑERO	11/02/2025	6,960%
4668946	CC	JORGE	LUIS	POLANCO	CHRINOS	11/02/2025	6,960%
1085252889	CC	HUGO	ERNESTO	VEGA	URBANO	11/02/2025	6,960%
5331907	CC	NORBERTO	RAMON	PELAYO		11/02/2025	6,960%
18331867	CC	JHOEFRY	JOSE	BUSTAMANTE	CHAVEZ	11/02/2025	6,960%
5447111	CC	RAUL	GUILLERMO	DIAZ	MORALES	11/02/2025	6,960%

La presente se expide a solicitud del interesado, a los 10 días del mes de febrero de 2025.

Emisión y Novedades
ARL AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

AXA COLPATRIA

Líder S&A OP. No monetarias

Elaboró:ZLRS

COINCO CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FOR-COIN-061 FECHA 2025 VERSION 02 Página 1 de 1

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal suministrados por COINCO, con el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes y aplicables, las cuales contribuyen a mi bienestar mental, físico y social.

"El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad: LEY 9 DE 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal" RESOLUCIÓN 2400 de 1979: Son obligaciones de los trabajadores: Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.

Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12): Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal. Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST

El presente compromiso quedará archivado en el Área SST para los fines pertinentes."

FECHA	CEDULA	NOMBRE COMPLETO	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						I	R	FIRMA
			Gafas de seguridad	Tapa oídos de inserción	Guantes vaqueta	Guantes nitrilo	Tapabocas	Chaleco reflectivo			
7/02/25	23419583	Yeison Garcia				1	1	1		X	
	1970647	Moises Perez									
	4668946	Jorge Polanco									
	1005098706	Victor Granada				1		1		X	
10/02/25	18182206	Silvio Meneses				1	2	1		X	
7/02/25	5447111	Raul Diaz				1	2	1		X	
20/02/25	1088252889	Hugo Vega				1	2	1		X	
20/02/25	18331867	Jhoefry Bustamante				1	2	1		X	
20/02/25	5331907	Norberto Pelayo				1	2	1		X	
27/03/25	1233188789	Johnny F. Olaña R.									

Powered by CamScanner

COINCO CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FOR-COIN-061 FECHA 2025 VERSION 02 Página 1 de 1

ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Eslinga Cable de Seguridad con amortiguador	1	8/02/25	
2	Arnes de Posicionamiento Toolcraft	1	8/02/25	
3				
4				
5				
6				
7				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA			
NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	FIRMA
Mayerli C Aranzales	1124862736	Coordinador Alturas	Mayerli C Aranzales

Powered by CamScanner

COINCO CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FOR-COIN-061 FECHA 2025 VERSION 02 Página 1 de 1

ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	eslinga	1	20/02/25	
2	Arnes	1	20/02/25	
3				
4				
5				
6				
7				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA			
NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	FIRMA
Yeison Garcia	PPT	Maestro.	

Powered by CamScanner

COINCO CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FOR-COIN-061 FECHA 2025 VERSION 02 Página 1 de 1

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal suministrados por COINCO, con el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes y aplicables, las cuales contribuyen a mi bienestar mental, físico y social.

"El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad: LEY 9 DE 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal" RESOLUCIÓN 2400 de 1979: Son obligaciones de los trabajadores: Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.

Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12): Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal. Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST

El presente compromiso quedará archivado en el Área SST para los fines pertinentes."

FECHA	CEDULA	NOMBRE COMPLETO	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						I	R	FIRMA
			Gafas de seguridad	Tapa oídos de inserción	Guantes vaqueta	Guantes nitrilo	Tapabocas	Chaleco reflectivo		/	
24/02/25	23419583	Yeison Garcia			1	1	2	1		x	
24/02/25	1970647	Moises Perez	1		1	1	2	1		x	
24/02/25	4668946	Jorge Polanco	1		1	1	2	1		x	
24/02/25	1005098706	Victor Granada	1		1	1	2	1		x	Victor C. T.
24/02/25	18182206	Silvio Meneses	1		1	1	2	1		x	
24/02/25	5447111	Raul Diaz	1	1	1	1	2	1		x	
24/02/25	1088252889	Hugo Vega	1	1	1	1	2	1		x	Hugo E.
24/02/25	18331867	Jhoefry Bustamante	1	1	1	1	2	1		x	Bustamante Jhoefry
24/02/25	5331907	Norberto Pelayo	1	1	1	1	2	1		x	Norberto...
	1233466184	Johnny F. Ohara M.									

SAOS ALTURAS SAS
NIT 901.725.447-9

Licencia SST Res. No. 6291 de 12/08/2023 SDB
Avalado por la resolución 4272 de 2021 del Ministerio de trabajo
Certificación N° 08SE2024220000000022392
Código de acreditación BUREAU VERITAS N° C023.00960, bajo el esquema 6, según ISO/IEC 17067 versión 2013

CONSECUTIVO

TSA - 15353

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

OTORGADO A:

RAUL GUILLERMO DIAZ MORALES

IDENTIFICADO CON PPT. N° 5447111

CURSÓ Y APROBÓ EL PROGRAMA DE:

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE (8) HORAS

Curso realizado en Bogotá el 10 febrero 2025, se expide en Bogotá el 10 febrero 2025

KAREN RODRIGUEZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

DIDIER ALEXANDER RUIZ MOSCOSO
RES No.6354 10/07/2020

EMPRESA: SAJ ALTURAS TSA SAS
REP. Francisco Javier Cruz Sánchez
NIT: 901887481-4
ARL: SURA

La autenticidad de este documento se puede verificar llamando a la línea 3244281598
http://www.saosalturasas.com.co - saosalturasas@gmail.com

SAOS ALTURAS S.A.S.

CURSO:
TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

NOMBRE:
RAUL GUILLERMO DIAZ MORALES

IDENTIFICACIÓN
PPT. N° 5447111

EXPEDICIÓN
10 de febrero de 2025

CONSECUTIVO
TSA-15353

NOTA: ESTE CARNÉ NO SIRVE COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN, ES UNA FIEL COPIA DEL CERTIFICADO DE ALTURA Y PARA SU AUTENTICIDAD PUEDE DAR VERIFICADO LLAMANDO A NUESTRA LÍNEA 3244281598 O EN NUESTRA PAGINA WEB WWW.SAOSALTURASAS.COM.CO

KAREN RODRIGUEZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

www.saosalturasas.com.co

SAOS ALTURAS SAS
NIT 901.725.447-9

Licencia SST Res. No. 6291 de 12/08/2023 SDB
Avalado por la resolución 4272 de 2021 del Ministerio de trabajo
Certificación N° 08SE2024220000000022392
Código de acreditación BUREAU VERITAS N° C023.00960, bajo el esquema 6, según ISO/IEC 17067 versión 2013

CONSECUTIVO

TSA - 11045

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

OTORGADO A:

YEISON JOSE GARCIA MENDOZA

IDENTIFICADO CON PPT. N° 5022647

CURSÓ Y APROBÓ EL PROGRAMA DE:

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO

CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE (32) HORAS

Curso realizado en Bogotá del 12 diciembre 2024 al 15 diciembre 2024, se expide en Bogotá el 15 diciembre 2024

KAREN RODRIGUEZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

DIANA CAROLINA MEJIA CARDOZO
LIC. SST No. 17-007-0647-19 17/05/2019

EMPRESA: SAJ ALTURAS TSA SAS
REP. Francisco Javier Cruz Sánchez
NIT: 901887481-4
ARL: SURA

La autenticidad de este documento se puede verificar llamando a la línea 3244281598
http://www.saosalturasas.com.co - saosalturasas@gmail.com

SAOS ALTURAS S.A.S.

CURSO:
TRABAJO EN ALTURAS NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO

NOMBRE:
YEISON JOSE GARCIA MENDOZA

IDENTIFICACIÓN
PPT. N° 5022647

EXPEDICIÓN
15 de diciembre de 2024

CONSECUTIVO
TSA-11045

NOTA: ESTE CARNÉ NO SIRVE COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN, ES UNA FIEL COPIA DEL CERTIFICADO DE ALTURA Y PARA SU AUTENTICIDAD PUEDE DAR VERIFICADO LLAMANDO A NUESTRA LÍNEA 3244281598 O EN NUESTRA PAGINA WEB WWW.SAOSALTURASAS.COM.CO

KAREN RODRIGUEZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

www.saosalturasas.com.co

COINCO	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	FT-COIN-062

ÁREA A INSPECCIONAR	Operativa	CARGO	Ayudantes – Oficiales	AREA	Operativa
NOMBRE DEL INSPECTOR	Mayerli Carolina Aranzazu Sarasty			CARGO	Profesional SST
FECHA INSPECCIÓN	D	M	A	03	03	25

* Califique con B: Bueno, M: Malo, o R: Regular el Uso (U) dado y la Condición (C) en que se encuentra cada uno de los Elementos de Protección Personal de cada trabajador.

Nombre y Apellido	Cédula	Cargo	CONDICION	ELEMENTO										Observaciones
				Casco	Gafas de Seguridad	Tapaoidos de Insercion	Tapabocas	Guantes de vaqueta	Guantes de nitrilo	armes	Barbuquejo	Botas de seguridad	
Jorge Polanco	4668446	Oficial	C	B	M	B	M	B	M	N/A	B	B	Cambios Pq desgaste, Reposición
			U	B	B	B	B	B	B	N/A	B	B	Por mal estado.
Moises Perez	1470647	Ayudante	C	B	M	B	M	B	M	N/A	B	B	Reposicion
			U	B	B	B	B	B	B	N/A	B	B	Reposicion
Raul Diaz	5447111	Oficial	C	B	M	B	M	B	M	N/A	B	B	"
			U	B	B	B	B	B	B	N/A	B	B	"
Jerson Garcia	5022647	Maestro	C	B	M	B	M	B	M	N/A	B	B	"
			U	B	B	B	B	B	B	N/A	B	B	"
			C										
			U										
			C										
			U										
			C										
			U										
			C										
			U										
			C										
			U										
			C										
			U										
			C										
			U										
			C										
			U										

Mayerli C Aranzazu S.
FIRMA PROFESIONAL SST

FIRMA RESIDENTE

Powered by CamScanner

COINCO	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	FT-COIN-062

ÁREA A INSPECCIONAR	Operativa Pulacio	CARGO	Ayudante - electricista	ÁREA	Operativa
NOMBRE DEL INSPECTOR	Mayerli Carolina Aranzazu Sarasty			CARGO	Profesional SST

FECHA INSPECCIÓN	D	M	A
	22	02	25.

* Califique con B: Bueno, M: Malo, o R: Regular el Uso (U) dado y la Condición (C) en que se encuentra cada uno de los Elementos de Protección Personal de cada trabajador.

Nombre y Apellido	Cédula	Cargo	CONDICION	ELEMENTO: Casco	Gafas de Seguridad	Tapaoidos de Insercion	Tapabocas	Guantes de vaqueta	Guantes de nitrilo	arnes	Barbuquejo	Botas de seguridad	Observaciones
Silvio Meneses	78182 20C	Ayudante obra	C	R	M	B	M	B	B	X	B	B	Reposicion por daño
			U	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Reposicion constante.
Johnny f. Chaverra M.	1238188159	Electricista	C	B	R	B	M	NA	B	NA	B	B	Reposición
			U	B	B	B	B	NA	B	NA	B	B	
			C										
			U										
			C										
			U										
			C										
			U										
			C										
			U										
			C										
			U										
			C										
			U										
			C										
			U										
			C										
			U										
			C										
			U										
			C										
			U										

Mayerli C Aranzazu S.
FIRMA PROFESIONAL SST

FIRMA RESIDENTE

Powered by CamScanner

COINCO CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: COIN-SSTA-F-22
		V1
	FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA, TALADRO	FECHA: 18/09/2023

INSPECCIONADO	NOMBRE	Yesid	CARGO	Maestro	
REPORTADO	NOMBRE	Nayeth	CARGO	Prof. Residente SST.	
SEMANA DEL 1 AL 5 DE 02 DEL 25.			HORA DE INCIO	7:00 Am	HORA FINAL 5:00 Pm
TALADRO No	PULIDORA No.	1			
MARCA					

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DEL TALADRO O PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE LAS BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo

Nombre del Operador	Yesid Cortés	YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO					
Manifiesto que me enuentro libre de bebidas alcohólicas y/o sustancia psicoactivas	FIRMA DIARIA DEL OPER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FIRMA DIARIA DEL SUPERVISOR HSEQ							

FUERA DE SERVICIO SI NO

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

COINCO CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: COIN-SSTA-F-22
		V1
	FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA, TALADRO	FECHA: 18/09/2023

INSPECCIONADO	NOMBRE: Yeraldi	CARGO: Prof. Residente SST	
REPORTADO	NOMBRE:	CARGO:	
SEMANA DEL 10 AL 15 DE 02 DEL 25		HORA DE INCIO 7:30 am	HORA FINAL 5:00 Pm
TALADRO No	PULIDORA No 1		
MARCA			

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DEL TALADRO O PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE LAS BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

-

Nombre del Operador Yeison Garcia	YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO						
Manifiesto que me enuentro libre de bebidas alcohólicas y/o sustancia psicoactivas. FIRMA DIARIA DEL OPER	Yeison Garcia	Yeison Garcia	Yeison Garcia	Yeison Garcia	Yeison Garcia	Yeison Garcia	Yeison Garcia
FIRMA DIARIA DEL SUPERVISOR HSEQ			FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X				

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: COIN-SSTA-F-21
COINCO		V1
	FORMATO PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES	Fecha: 18/09/2023

Obra: Mantenimiento Palacio Justicia. LUGAR DE UBICACION: Mocoa.

INSPECCIONADO POR: Yeison Garcia. Reportado a: Marelli C Aranalu.

SEMANA DE INSPECCION: DEL 1 AL 25 DE Feb DE 2023.

No	ASPECTO A REVISAR	CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Hombre solo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Llaves de boca fija	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Llaves de copa	0	—												—	
4	Llaves Espancivas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Palas	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Cortatubo	0	—												—	
7	Lave de tubo	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Alicates de estria	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	Alicates de pala	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Martillo	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	Serrucho	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Llana metalica	7	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	Llana de madera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	Boquilleras	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	Niveles de mano	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	Nineles de manguera	0	—												—	
17	Metros	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	Barras	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	Plomadas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	Cegueta s	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
21	Macetas	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
22	Otro: Sicel.	6.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
23																
	LA HERRAMIENTA SE PUEDE UTILIZAR?		X		X		X		X		X		X		X	
	FIRMA DEL OPERADOR:		Yeison		Yeison		Yeison		Yeison		Yeison		Yeison		Yeison	
	FIRMA DEL SUPERVISOR DE HSEQ O COORDINADOR DE MAQUINARIA:		Marelli		Marelli		Marelli		Marelli		Marelli		Marelli		Yeison	

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** entre el OPERADOR y el Supervisor de HSEQ o el Coordinador de Maquinaria y Equipo.

Yeison Garcia	Marelli C Aranalu.
FIRMA DEL OPERARIO	FIRMA DEL SUPERVISOR DE HSEQ O COODINADOR DE OBRA

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA LA HERRAMIENTA PARA OPERAR:**

LA HERRAMIENTA FUE:		SI	NO	FECHA
→ SEPARADO Y ALMACENADO POR EL OPERADOR:				
→ REVISADO POR EL MECANICO EN EL CAMPO:				
→ SEPARADO Y REMITIDO AL ALMACÉN :				
FIRMA DEL OPERADOR QUE REPORTA LA FALLA		FIRMA DEL SUPERVISOR DE HSEQ		

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: COIN-SSTA-F-21
COINTER		V1
	FORMATO PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES	Fecha: 18/09/2023

Obra: Mantenimiento Palacio Justicia | **LUGAR DE UBICACION:** Nocoa

INSPECCIONADO POR: Nelson Garcia | **Reportado a:** Marcelo C Aranzazu S.

SEMANA DE INSPECCION: DEL 4 AL 15 DE 02 DE 2025.

No	ASPECTO A REVISAR	CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Hombre solo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Llaves de boca fija	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Llaves de copa	0	—		—		—		—		—		—		—	
4	Llaves Espancivas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Palas	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Cortatubo	0	—		—		—		—		—		—		—	
7	Lave de tubo	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Alicates de estria	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	Alicates de pala	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Martillo	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	Serrucho	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Llana metalica	7	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	Llana de madera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	Boquilleras	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	Niveles de mano	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	Nineles de manguera	0	—		—		—		—		—		—		—	
17	Metros	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	Barras	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	Plomadas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	Ceguetas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
21	Macetas	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
22	Otro: Sinol.	6	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
23																
	LA HERRAMIENTA SE PUEDE UTILIZAR?		X		X		X		X		X		X			✓
	FIRMA DEL OPERADOR:		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	FIRMA DEL SUPERVISOR DE HSEQ O COORDINADOR DE MAQUINARIA:		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** entre el OPERADOR y el Supervisor de HSEQ o el Coordinador de Maquinaria y Equipo.

✓ FIRMA DEL OPERARIO	FIRMA DEL SUPERVISOR DE HSEQ O COODINADOR DE OBRA.

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA LA HERRAMIENTA PARA OPERAR:**

LA HERRAMIENTA FUE:		SI	NO	FECHA
→ SEPARADO Y ALMACENADO POR EL OPERADOR:				
→ REVISADO POR EL MECANICO EN EL CAMPO:				
→ SEPARADO Y REMITIDO AL ALMACÉN :				

FIRMA DEL OPERADOR QUE REPORTA LA FALLA	FIRMA DEL SUPERVISOR DE HSEQ

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: COIN-SSTA-F-21
COINTER		V1
	FORMATO PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES	Fecha: 18/09/2023

Obra: Mantenimiento Cobro Jerárquico | LUGAR DE UBICACION: Nocoa.

INSPECCIONADO POR: Yeison García | Reportado a: Valeria C Aranibar S.

SEMANA DE INSPECCION: DEL 16 AL 22 DE Febrero DE 2025.

No	ASPECTO A REVISAR	CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Hombre solo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Llaves de boca fija	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Llaves de copa	0	—		—		—		—		—		—		—	
4	Llaves Espancivas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Palas	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Cortatubo	0	—		—		—		—		—		—		—	
7	Lave de tubo	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Alicates de estria	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	Alicates de pala	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Martillo	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	Serrucho	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Llana metalica	7	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	Llana de madera	2.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	Boquilleras	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	Niveles de mano	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	Nineles de manguera	0	—		—		—		—		—		—		—	
17	Metros	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	Barras	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	Plomadas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	Ceguetas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
21	Macetas	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
22	Otro: Nivel.	6	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
23																
	LA HERRAMIENTA SE PUEDE UTILIZAR?		X		X		X		X		X		X			
	FIRMA DEL OPERADOR:		Yeison García		Yeison García		Yeison García		Yeison García		Yeison García		Yeison García		Yeison García	
	FIRMA DEL SUPERVISOR DE HSEQ O COORDINADOR DE MAQUINARIA:		Valeria		Valeria		Valeria		Valeria		Valeria		Valeria		Valeria	

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** entre el OPERADOR y el Supervisor de HSEQ o el Coordinador de Maquinaria y Equipo.

x Yeison García	Valeria C Aranibar S.
FIRMA DEL OPERARIO	FIRMA DEL SUPERVISOR DE HSEQ O COODINADOR DE OBRA.

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA LA HERRAMIENTA PARA OPERAR:**

LA HERRAMIENTA FUE:		SI	NO	FECHA
→ SEPARADO Y ALMACENADO POR EL OPERADOR:				
→ REVISADO POR EL MECANICO EN EL CAMPO:				
→ SEPARADO Y REMITIDO AL ALMACÉN :				

FIRMA DEL OPERADOR QUE REPORTA LA FALLA	FIRMA DEL SUPERVISOR DE HSEQ

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: COIN-SSTA-F-21
		V1
	FORMATO PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES	Fecha: 18/09/2023

Obra: Mantenimiento Federico Echeverri | LUGAR DE UBICACION: Maroa.

INSPECCIONADO POR: Yeison Garcia | Reportado a: Marlon Catalina Aranda.

SEMANA DE INSPECCION: DEL 23 AL 2ª DE Feb DE 2025

No	ASPECTO A REVISAR	CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Hombre solo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Llaves de boca fija	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Llaves de copa	0	—		—		—		—		—		—			
4	Llaves Espancivas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Palas	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Cortatubo	0	—		—		—		—		—		—			
7	Lave de tubo	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Alicates de estria	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	Alicates de pala	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Martillo	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	Serrucho	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Llana metalica	7	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	Llana de madera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	Boquilleras	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	Niveles de mano	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	Nineles de manguera	0	—		—		—		—		—		—			
17	Metros	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	Barras	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	Plomadas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	Ceguetas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
21	Macetas	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
22	Otro: Sincel	6	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
23																
	LA HERRAMIENTA SE PUEDE UTILIZAR?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA DEL OPERADOR:		Yeison		Yeison		Yeison		Yeison		Yeison		Yeison		Yeison	
	FIRMA DEL SUPERVISOR DE HSEQ O COORDINADOR DE MAQUINARIA:		Marlon		Marlon		Marlon		Marlon		Marlon		Marlon			

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** entre el OPERADOR y el Supervisor de HSEQ o el Coordinador de Maquinaria y Equipo.

	Marlon C Aranda S.
FIRMA DEL OPERARIO	FIRMA DEL SUPERVISOR DE HSEQ O COODINADOR DE OBRA.
Yeison Garcia	

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA LA HERRAMIENTA PARA OPERAR:**

LA HERRAMIENTA FUE:		SI	NO	FECHA
→ SEPARADO Y ALMACENADO POR EL OPERADOR:				
→ REVISADO POR EL MECANICO EN EL CAMPO:				
→ SEPARADO Y REMITIDO AL ALMACÉN :				

FIRMA DEL OPERADOR QUE REPORTA LA FALLA	FIRMA DEL SUPERVISOR DE HSEQ

Powered by CamScanner

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00:00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2024	2	20	2024	2	21	2025	2	20

NO. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/KATIOS	MODELO
3214509600	VSD184	VEHICULOS DE CARGA	PUBLICO	6194	1975

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	DODGE	
	LÍNEA VEHÍCULO: D 600	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
FE6101339D	4873843	48738430000000000	8

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CHAMORRO BENAVIDES, MARILEYO TARQUIN	3203126559	CC	16207936	CALI

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1306	26	57790432	3214509600	YUMBO

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
332	$919.000,00	$477.800,00	$2.100,00

TOTAL A PAGAR

$1.398.900,00

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El clausulado que aplica a esta póliza puede ser consultado y descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

CLAUSULA: Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expide se modificará, iniciando a partir del día siguiente de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Consulte información sobre la Defensoría del Consumidor Financiero aquí https://www.axacolpatria.co/documents/42201273/76141280/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf

...ñor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
...ecuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier moment...
...ecuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
...té atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económic... la detención ...vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las victim... del accidente.
...quiera su SOAT en lugares autorizados.

...so de accidente de tránsito:
...guien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar d... ...ccidente ...re que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
...ún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de trán... (artículo 195 ...o Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
...s gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestador... ...e servicios de

...esentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

...eas data

Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031706840

PLACA: VSD184
MARCA: DODGE
LÍNEA: D 600
MODELO: 1975
CILINDRADA CC: 6.194
COLOR: AZUL
SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: CAMION
TIPO CARROCERÍA: VOLCO
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD Kg/PSJ: 8000
NÚMERO DE MOTOR: FE6-101339D
REG: N
VIN: ******
NÚMERO DE SERIE: 4873843
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 4873843
REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): SOLARTE MORA LEONARDO JESUS
IDENTIFICACIÓN: C.C. 18125268



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 0
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
I/E: I
FECHA IMPORT.
PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******
FECHA MATRÍCULA: 04/04/1975
FECHA EXP. LIC. TTO.: 02/05/2024
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOYTTE MCPAL ORITO
LT0200780446 7



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 1124849409

NOMBRE

FIDEL ALEJANDRO MORENO GOMEZ

FECHA DE NACIMIENTO

12-09-2004

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICIÓN

14-08-2024

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTOyTTE MOCOA



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	31-01-2033	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	31-01-2026	PUBLICO

MUVA S.A.S. LC-01-2024

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC12000018218

COINCO	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: COIN-SSTA-F-26
		V1
	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	FECHA: 18-09-2023

GENERALIDADES					
FECHA DE APERTURA	15/02/2023		FECHA DE CIERRE	22/02/23.	
LUGAR/SITIO EXACTO	Sotano Palacio Justicia				
ALTURA APROXIMADA DE TRABAJO (metros)		4	N° PERSONAS CERTIFICADAS A REALIZAR TRABAJO EN ALTURAS:		2
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR: Se realiza trabajo de pintura de interiores. de muros cerramiento Palacio Justicia desde sotano.					

TIPO DE ACCESO (MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACCESO A USAR EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO)			
ESCALERA PORTATIL DE EXTENSIÓN:		MANLIFT:	
ESCALERA PORTATIL TIPO TIJERA:		ACCESO POR CUERDAS:	
ESCALERA FIJA:		OTROS:	
ANDAMIOS:	X		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS MÍNIMOS QUE DEBERÁN SER UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES DURANTE LA LABOR (MARQUE CON X)					
CASCO TIPO II CON BARBUQUEJO 3 PUNTOS	X	ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO DE DOBLE RAMAL O EN Y		SILLA PARA TRABAJO EN SUSPENSIÓN	
GAFAS DE SEGURIDAD	X	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	X	TALON DOBLE PIERNA	
PROTECCION AUDITIVA		MOSQUETON DE CIERRE AUTOMATICO		FRENO PARA LÍNEA VIDA FIJA	
PROTECCIÓN RESPIRATORIA		ANCLAJE PORTATIL		KIT DE RESCATE ALTURA	
BOTAS ANTIDESLIZANTES		LINEA DE VIDA PORTATIL HORIZONTAL		OVEROL TYVEK	
GUANTES ANTIDESLIZANTES		LINEA DE VIDA PORTATIL VERTICAL		ANCLAJE PORTATIL / TIE OFF	
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO (MULTIPROPÓSITO O DIELÉCTRICO O KEVLAR (SOLDADORES) SEGÚN APLIQUE	X	ZIG ZAG / DESCENDEDORES		CINTA SALVARRAMAS	
MOSQUETONES		BLOQUEADORES		FRENO ANTICAIDAS PARA CUERDAS	

ESCRIBA LAS HERRAMIENTA A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD
Rodillo, brochas, cunetes de pintura, espatula y lijas.

PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO (Marque con una X)

ESPACIO PARA SER VALIDADO POR EL COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS EN SITIO

REQUERIMIENTO	SI	NO	N/A
Personal con pago de seguridad social y ARL vigentes.	X		
Personal con certificado de aptitud médico para trabajo en alturas vigente (menor a un año).	X		
Personal con curso para trabajo seguro en alturas vigente (menor a un año).	X		
El personal desarrollo prueba de alcohol en aliento expirado.			X
Los EPP y equipos de protección contra caídas utilizar fueron seleccionados por el contratista, inspeccionados previamente y se encuentran en buen estado.	X		
El enganche de la eslinga al arnés es de ajuste rápido y cuenta con sus respectivos seguros.	X		
Se verificaron los puntos de anclaje a ser utilizados por cada trabajador durante la tarea.	X		

Powered by CamScanner

El lugar donde realizará la tarea tiene instalada linea de vida o una estructura donde el trabajador puede asegurarse, es decir que garantice una resistencia minima de 5000 lb.			X
Los andamios se encuentran completos, en buen estado y certificados.	X		
Se ha identificado presencia de lineas eléctricas cercanas.	X		
Se tienen en cuenta medidas de trabajo seguras para adelantar labores en cercanias a lineas y/o equipos eléctricos energizados.	X		
En caso de trabajar en espacios confinados o trabajos en caliente (trabajos donde se emite chispas o fuego) se han adoptado las medidas de seguridad correspondientes y se cuenta con certificados de apoyo para cada especialidad.			X
El trabajo en alturas minimo lo van a realizar dos trabajadores o ejecutores. Nombre del AYUDANTE DE SEGURIDAD		X	
Los trabajadores realizan el análisis de trabajo seguro y lo socializan con todo el grupo de trabajo antes de iniciar la labor.	X		
Se cuenta con el procedimiento para realizar la actividad y ha sido divulgado al personal.	X		
Se cuenta con el plan de rescate claro y entendible.		X	
Se ha instalado señalización preventiva que delimite el área de trabajo (cinta, conos, señales tubulares o poli sombras).	X		

FIRMA DEL PERSONAL PARTICIPANTE

Como trabajador he socializado el análisis de peligros por actividad, comprendo las precauciones que deben ser tomadas y me comprometo a desarrollar el trabajo cumpliendo las medidas de seguridad establecidas, procurando el autocuidado, cumpliendo procedimientos y evitando actos inseguros, así como reportar cualquier daño de equipos o incidentes y/o accidentes presentado.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Raul Diaz	5447111	Oficial	Raul

AUTORIZADO POR

RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN	FIRMA
COORDINADOR SST-MA	Como coordinador de trabajo en alturas confirmo que he revisado e identificado en sitio, las condiciones de riesgo presentes para el desarrollo del presente trabajo, he divulgado a los trabajadores y he propuesto medidas de prevención para controlar los factores de riesgo.	Yaneth Aranda
JEFE DE BRIGADA DE EMERGENCIA	Como responsable de activar el plan de emergencia, he revisado e identificado el sitio, las condicones de riesgos para del desarrollo del presente trabajo, se tien listo los equipos de primeros auxilios y brigadista en caso de realizar rescate de acuerdo al procedimiento a realizar	
RESIDENTE DE OBRA/ INSPECTOR DE OBRA	Como supervisor y ejecutor confirmo que el grupo de trabajo es el adecuado para realizar la labor, conocen los peligros y riesgos a los cuales van a estar expuestos, se les ha explicado las medidas de control y se han implementado las mismas en pro de evitar la ocurrencia de eventos no deseados. Las herramientas han sido inspecciones y se cuentan con los elementos de protección personal requeridos para la labor.	

OBSERVACIONES Se realiza la actividad con auxiliante de obra en paso, mientras el trabajador asignado realiza las actividades.

Powered by CamScanner

COINCO

INSPECCION DIARIA DE EQUIPOS DE ALTURAS

Código: COIN-FOR-099
Fecha: Nov 2021
Versión: 02

PROYECTO: C01-PCENTR.6941019 AREA: Operativa

IDENTIFICACION DEL EQUIPOS SERIE Y /O MARCA: TC2654 Andamio Para Reacondicionamiento.

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Se realizan trabajos de Pintura con el apoyo de andamio (2 secciones) de 2x2. alcanzando una altura de 4 metros. Uso de Rodillo, brocha, etc.

CONDICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO EN SEGURO EN ALTURAS

FECHA — DESDE: 18/02/2023 HASTA: 22/02/23.

CUMPLE = C, NO CUMPLE = NC, NO APLICA = N/A

Marque con una X según corresponda

EVALUAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	
ARNES																						
TEJIDO O CORREA																						
Se evidencia la etiqueta (Informacion del Equipo)				X			X			X			X			X						
Fibras externas cortadas, desgastadas				X			X			X			X			X						
Cortes o rotura del tejido o costuras				X			X			X			X			X						
Fisura				X			X			X			X			X						
Estiramiento excesivo (elongación de la nata)				X			X			X			X			X						
Deterioro general				X			X			X			X			X						
Decoloración del material				X			X			X			X			X						
Presencia de moho				X			X			X			X			X						
COSTURAS																						
Cortaduras				X			X			X			X			X						
Deshilachamiento				X			X			X			X			X						
Hilos faltantes				X			X			X			X			X						
ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																						
Deformaciones (dobladuras, etc)				X			X			X			X			X						
Picaduras, grietas				X			X			X			X			X						
Presenta desgaste				X			X			X			X			X						
Corrosión u oxidación				X			X			X			X			X						

EVALUAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	
ACCESORIOS																						
TIE OFF (ADAPTADOR PORTATIL)																						
Se evidencia la etiqueta (Informacion del Equipo)			X															X				
Fibras externas cortadas, desgastadas			X															X				
Cortes o rotura del tejido o costuras			X															X				
Estiramiento excesivo			X															X				
Piezas faltantes			X															X				
Presencia de moho			X															X				

EVALUAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	
MOSQUETONES Y GANCHOS																						
Deformaciones (dobladuras, etc)						X												X				
Ajuste excesivo de mosquetones						X												X				
Grietas o picaduras						X												X				
Estado de pasadores						X												X				
Gatillo						X												X				
Deterioro general						X												X				
Corrosión						X												X				
Presencia de moho						X												X				

EVALUAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	
ESLINGAS																						
Se evidencia la etiqueta (Informacion del Equipo)				X			X			X			X			X						
Fibras externas cortadas, desgastadas				X			X			X			X			X						
Cortes o rotura del tejido o costuras				X			X			X			X			X						
Estiramiento excesivo				X			X			X			X			X						
Deformaciones (dobladuras, etc)				X			X			X			X			X						
Corrosión en partes metálicas				X			X			X			X			X						

EVALUAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	
LINEA DE VIDA																						
Deformaciones (dobladuras, etc)						X			X			X			X			X				
Picaduras, grietas						X			X			X			X			X				
Presenta desgaste						X			X			X			X			X				
Fibras externas cortadas, desgastadas						X			X			X			X			X				
Cortes o rotura del tejido o costuras						X			X			X			X			X				
Estiramiento excesivo						X			X			X			X			X				
Contacto con bordes contundentes						X			X			X			X			X				

EVALUAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	

Powered by CamScanner

COINCO	INSPECCION DIARIA DE EQUIPOS DE ALTURAS	Código: COIN–FOR-099 Fecha: Nov 2021 Versión: 02

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	EVALUAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	
SILLA	Se evidencia la etiqueta (Informacion del Equipo)						✓			✓			✓			✓			✓				
	Fibras externas cortadas, desgastadas						✓			✓			✓			✓			✓				
	Cortes o rotura del tejido o costuras						✓			✓			✓			✓			✓				
	Estiramiento excesivo						✓			✓			✓			✓			✓				
	Deformaciones (dobladuras, etc)						✓			✓			✓			✓			✓				
	Corrosión en partes metálicas						✓			✓			✓			✓			✓				
	Contacto con bordes contundentes						✓			✓			✓			✓			✓				
ARRESTADOR DE CAIDAS	Deformaciones (dobladuras, etc)																						
	Ajuste excesivo de mosquetones																						
	Grietas o picaduras																						
	Freno																						
	Deterioro general																						
	Corrosión																						
	Presencia de moho																						

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA						
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Raul Diaz	Oficial		Raul	Raul	Raul	Raul	Raul	

FIRMA INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA						
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Hayeli Camargo	Pot. Residente SST		Hayeli	Hayeli	Hayeli	Hayeli	Hayeli	

FIRMA DEL RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CLIENTE

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA						
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Hayeli Camargo	Prof. Residente SST.		Hayeli	Hayeli	Hayeli	Hayeli	Hayeli	

Powered by CamScanner

COINCO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Codigo	
CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS	FT-HSEQ-021	
	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES	Version: 1	Fecha: 01/06/2022

TEMA: Seguridad contra incendio (chequeo) DURACION:7 min

PROYECTO: CO1.PCCNTR.6947019 CUADRILLA: 1 FECHA: 01/02/25.

CAPACITADOR: Mayerli Carolina Aranzazu FIRMA: Mayerli C. Aranzazu Sarasty

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Silvio Meneses	18182206	Ayudante	
2	Victor Granada	1005098706	Ayudante	VICTOR G.T.
3	Yeison Garcia	23419583	Maestro	yeison
4	Moises Perez	1970647	Ayudante	moises
5	Johnny Chaña	1233188189	Electrico	
6	Jorge Polanco	4668946	Oficial	
7	Hugo Ernesto Vega	1085252889	Ayudante.	Hugo E. Vega
8	Norberto Pelayo	5331907	Oficial	Norberto...
9	Jhoetry Bustamante	18331867	Ayudante	Bustamante Jhoetry
10	Raul Diaz	5447111	Oficial	Raul
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Powered by CamScanner

COINCO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Codigo	
	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS	FT-HSEQ-021	
	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES	Version	Fecha
		1	01/06/2022

TEMA: Herramientas Rutokks y manuales DURACION:7 min

PROYECTO: CO1.PCCNTR.6947019 CUADRILLA: 1 FECHA: 03/02/23

CAPACITADOR: Mayerli Carolina Aranzazu FIRMA: Mayerli C Aranzazu.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Silvio Meneses	18182206	Ayudante	Silvio Meneses
2	Victor Granada	1005098706	Ayudante	Victor G. T.
3	Yeison Garcia	23419583	Maestro	yeison
4	Moises Perez	1970647	Ayudante	moises
5	Johnny Chaña	1233188189	Electrico	
6	Jorge Polanco	4668946	Oficial	
7	Hugo Acosta Vega	1085252889	Ayudante	Hugo E. Vega.
8	Norberto Pelayo	5331907	Oficial	
9	Jhoeny Bustamante	1833187	Ayudante	Bustamante Jhoeny
10	Raul Diaz	5447171	Oficial	Raul
11	Norberto pelayo	5331907	oficial	Roberto
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Powered by CamScanner

COINCO CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Codigo	
	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS	FT-HSEQ-021	
	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES	Version	Fecha
		1	01/06/2022

TEMA: Retiración de los Protectores DURACION:7 min

PROYECTO: CO1.PCCNTR.6947019 CUADRILLA: 1 FECHA: 04/02/23

CAPACITADOR: Mayerli Carolina Aranzazu FIRMA: Mayerli Aranzazu S.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Silvio Meneses	18182206	Ayudante	
2	Victor Granada	1005098706	Ayudante	Victor G.T.
3	Yeison Garcia	23419583	Maestro	
4	Moises Perez	1970647	Ayudante	Moises
5	Johnny Chaña	1233188189	Electrico	
6	Jorge Polanco	4668946	Oficial	
7	Hugo Ernesto Vega	1085252889	Ayudante	
8	Norberto Pelayo	5331907	Oficial	Norberto pelayo
9	Jhoefry Bustamante	18331867	Ayudante	Bustamante Jhoefry
10	Raul Diaz	5447111	Oficial	Raul
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Powered by CamScanner

COINCO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Codigo	
	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS	FT-HSEQ-021	
	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES	Version: 1	Fecha: 01/06/2022

TEMA: Calistenia - Recomendaciones. DURACION:7 min

PROYECTO: CO1.PCCNTR.6947019 CUADRILLA: 1 FECHA: 05/02/23

CAPACITADOR: Mayerli Carolina Aranzazu FIRMA: Mayerli C Aranzazu C

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Silvio Meneses	18182206	Ayudante	
2	Victor Granada	1005098706	Ayudante	VICTOR G.T.
3	Yeison Garcia	23419583	Maestro	yeison
4	Moises Perez	1970647	Ayudante	moises
5	Johnny Chaña	1233188189	Electrico	
6	Jorge Polanco	4668946	Oficial	
7	Hugo Ernesto vega	1065252859	Ayudante	
8	Norberto Pelayo	5337907	Oficial	
9	Jhoefry Bustamante	1065337867	Ayudante	Bustamante Jhoefry
10	Raul Diaz	5447777	Oficial	Raul
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Powered by CamScanner

COINCO CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Codigo	
	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS	FT-HSEQ-021	
	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES	Version	Fecha
		1	01/06/2022

TEMA: Plataformas y superficies obras. **DURACION:7 min**

PROYECTO: CO1.PCCNTR.6947019 **CUADRILLA:** 1 **FECHA:** 6 de Febrero 2025.

CAPACITADOR: Mayerli Carolina Aranzazu **FIRMA:** Mayerli C Aranzazu.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Silvio Meneses	18182206	Ayudante	
2	Victor Granada	1005098706	Ayudante	Victor G.T.
3	Yeison Garcia	23419583	Maestro	
4	Moises Perez	1970647	Ayudante	Moises
5	Johnny Chaña	1233188189	Electrico	
6	Jorge Polanco	4668946	Oficial	
7	Hugo Ernesto Vega	1085252889	Ayudante	Hugo E. Vega.
8	Norberto Pelayo	5331907	Oficial	Norberto Pelayo
9	Jhoefry Bustamante	18331867	Ayudante	Bustamante Jhoefry.
10	Raul Diaz	5447111	Oficial	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Powered by CamScanner

COINCO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Codigo	
	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS	FT-HSEQ-021	
	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES	Version	Fecha
		1	01/06/2022

TEMA: Fatiga y sonnolencia. **DURACION:7 min**

PROYECTO: CO1.PCCNTR.6947019 **CUADRILLA:** 1 **FECHA:** 07/02/25.

CAPACITADOR: Mayerli Carolina Aranzazu **FIRMA:** Mayerli C Aranzazu L.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Silvio Meneses	18182206	Ayudante	
2	Victor Granada	1005098706	Ayudante	
3	Yeison Garcia	23419583	Maestro	
4	Moises Perez	1970647	Ayudante	
5	Johnny Chaña	1233188189	Electrico	
6	Jorge Polanco	4668946	Oficial	
7	Hugo Ernesto Vega	1085252889	Ayudante	
8	Norberto Pelayo	5331907	Oficial	
9	Jhoefry Bustamante	18331867	Ayudante	
10	Raul Diaz	5447111	Oficial	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Powered by CamScanner

COINCO CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Codigo	
	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS	FT-HSEQ-021	
	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES	Version	Fecha
		1	01/06/2022

TEMA: Martillos y herramientas de impacto **DURACION:7 min**

PROYECTO: CO1.PCCNTR.6947019 **CUADRILLA: 1** **FECHA:** 08/02/25

CAPACITADOR: Mayerli Carolina Aranzazu **FIRMA:** Mayerli C Aranzazu S

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Silvio Meneses	18182206	Ayudante	Silvio
2	Victor Granada	1005098706	Ayudante	Victor G.P.
3	Yeison Garcia	23419583	Maestro	yeison
4	Moises Perez	1970647	Ayudante	Moises
5	Johnny Chaña	1233188189	Electrico	
6	Jorge Polanco	4668946	Oficial	
7	Hugo Ernesto Vega	1055252889	Ayudante	Hugo E. Vega.
8	Noberto Pelayo	5331902	Oficial	Noberto Pelayo
9	Jhoeby Bustamante	78317867	Ayudante	Bustamante Jhoeby
10	Raul Diaz.	5447711	Oficial	Raul
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Powered by CamScanner

COINCO CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Codigo	
	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS	FT-HSEQ-021	
	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES	Version	Fecha
		1	01/06/2022

TEMA: Tablero Electrico - Calistenia **DURACION:7 min**

PROYECTO: CO1.PCCNTR.6947019 **CUADRILLA:** 1 **FECHA:** 10/02/25.

CAPACITADOR: Mayerli Carolina Aranzazu **FIRMA:** Mayerli Cardona Aranzazu

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Silvio Meneses	18182206	Ayudante	
2	Victor Granada	1005098706	Ayudante	
3	Yeison Garcia	23419583	Maestro	
4	Moises Perez	1970647	Ayudante	
5	Johnny Chaña	1233188189	Electrico	
6	Jorge Polanco	4668946	Oficial	
7	Hugo Ernesto Vega	1085252889	Ayudante	
8	Norberto Pelayo	5331907	Oficial	
9	Jhoefry Bustamante	18331867	Ayudante	
10	Raul Diaz	5447111	Oficial	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Powered by CamScanner

COINCO CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Codigo	
	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS	FT-HSEQ-021	
	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES	Version: 1	Fecha: 01/06/2022

TEMA: Recomendaciones para uso de escaleras portatiles. **DURACION:7 min**

PROYECTO: CO1.PCCNTR.6947019 **CUADRILLA: 1** **FECHA:** 11/02/23

CAPACITADOR: Mayerli Carolina Aranzazu **FIRMA:** Mayerli C Aranzazu S.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Silvio Meneses	18182206	Ayudante	
2	Victor Granada	1005098706	Ayudante	Victor G. T.
3	Yeison Garcia	23419583	Maestro	yeison
4	Moises Perez	1970647	Ayudante	moises
5	Johnny Chaña	1233188189	Electrico	
6	Jorge Polanco	4668946	Oficial	
7	Hugo Ernesto Vega	1085252889	Ayudante	Hugo E. Vega
8	Norberto Pelayo	5331907	Oficial	Norberto
9	Jhoefry Bustamante	18331867	Ayudante	Bustamante Jhoefry
10	Raul Diaz	5447111	Oficial	Raul
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Powered by CamScanner

COINCO CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Codigo	
	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS	FT-HSEQ-021	
	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES	Version	Fecha
		1	01/06/2022

TEMA: Actividad Dinamica - Calistenia **DURACION:7 min**

PROYECTO: CO1.PCCNTR.6947019 **CUADRILLA: 1** **FECHA:** 12/02/25

CAPACITADOR: Mayerli Carolina Aranzazu **FIRMA:** Mayerli C Aranzazu.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Silvio Meneses	18182206	Ayudante	
2	Victor Granada	1005098706	Ayudante	
3	Yeison Garcia	23419583	Maestro	
4	Moises Perez	1970647	Ayudante	
5	Johnny Chaña	1233188189	Electrico	
6	Jorge Polanco	4668946	Oficial	
7	Hugo Ernesto Vega	1085252889	Ayudante.	
8	Norberto Pelayo	53 37907	oficial	Norberto Pelayo
9	Jhoeby Bustamante	75337567	Ayudante.	Bustamante Jhoeby.
10	Raul Diaz.	5947777	oficial	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Powered by CamScanner

COINCO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Codigo	
CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS	FT-HSEQ-021	
	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES	Version	Fecha
		1	01/06/2022

TEMA: Peligros de las Acciones Rutinas **DURACION:7 min**

PROYECTO: CO1.PCCNTR.6947019 **CUADRILLA: 1** **FECHA:** 13/02/25

CAPACITADOR: Mayerli Carolina Aranzazu **FIRMA:** Mayerli C Aranzazu S.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Silvio Meneses	18182206	Ayudante	
2	Victor Granada	1005098706	Ayudante	
3	Yeison Garcia	23419583	Maestro	
4	Moises Perez	1970647	Ayudante	
5	Johnny Chaña	1233188189	Electrico	
6	Jorge Polanco	4668946	Oficial	
7	Hugo Ernesto Vega	1085252889	Ayudante	
8	Norberto Pelayo	5331907	Oficial	Norberto Pelayo
9	Jhoefry Bustamante	18331867	Ayudante	Bustamante Jhoefry
10	Raul Diaz	5447111	Oficial	Raul
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Powered by CamScanner

COINCO CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Codigo	
	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS	FT-HSEQ-021	
	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES	Version	Fecha
		1	01/06/2022

TEMA: Como Prevenir el estres Por calor. DURACION:7 min

PROYECTO: CO1.PCCNTR.6947019 CUADRILLA: 1 FECHA: 14/02/25

CAPACITADOR: Mayerli Carolina Aranzazu FIRMA: Mayerli C Aranzazu

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Silvio Meneses	18182206	Ayudante	
2	Victor Granada	1005098706	Ayudante	
3	Yeison Garcia	23419583	Maestro	
4	Moises Perez	1970647	Ayudante	
5	Johnny Chaña	1233188189	Electrico	
6	Jorge Polanco	4668946	Oficial	
7	Hugo Ernesto Vaya	708525258	Ayudante	
8	Norberto Pelayo	533.1907	oficial	
9	Jhoshy Bustamante	1833187	Ayudante	Bustamante Jhoshy
10	Raul Diaz.	5447111	oficial	
11	Norberto pelayo	533.1907	Oficial	norberto.....
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Powered by CamScanner

COINCO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Codigo	
	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS	FT-HSEQ-021	
	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES	Version: 1	Fecha: 01/06/2022

TEMA: Para" tenemos un programa de seguridad DURACION:7 min

PROYECTO: CO1.PCCNTR.6947019 CUADRILLA: 1 FECHA: 15/02/23

CAPACITADOR: Mayerli Carolina Aranzazu FIRMA: Mayerli C Aranzazu

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Silvio Meneses	18182206	Ayudante	
2	Victor Granada	1005098706	Ayudante	
3	Yeison Garcia	23419583	Maestro	
4	Moises Perez	1970647	Ayudante	
5	Johnny Chaña	1233188189	Electrico	
6	Jorge Polanco	4668946	Oficial	
7	Hugo Ernesto Vega	1085252889	Ayudante	
8	Norberto Pelayo	5331907	Oficial	Norberto
9	Jhoefry Bustamante	18331867	Ayudante	Bustamante Jhoefry
10	Raul Diaz	5447111	Oficial	Raul
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Powered by CamScanner

COINCO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Codigo	
CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS	FT-HSEQ-021	
	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES	Version: 1	Fecha: 01/06/2022

TEMA: Los accidentes no son casuales DURACION:7 min

PROYECTO: CO1.PCCNTR.6947019 CUADRILLA: 1 FECHA: 17/02/23

CAPACITADOR: Mayerli Carolina Aranzazu FIRMA: Mayerli C Aranzazu

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Silvio Meneses	18182206	Ayudante	
2	Victor Granada	1005098706	Ayudante	
3	Yeison Garcia	23419583	Maestro	
4	Moises Perez	1970647	Ayudante	
5	Johnny Chaña	1233188189	Electrico	
6	Jorge Polanco	4668946	Oficial	
7	Hugo Ernesto Vega	1085252889	Ayudante	
8	Norberto Pelayo	5331907	Oficial	Norberto
9	Jhoefry Bustamante	18331867	Ayudante	Bustamante Jhoefry
10	Raul Diaz	5447111	Oficial	Raul
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Powered by CamScanner

COINCO CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Codigo	
	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS	FT-HSEQ-021	
	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES	Version	Fecha
		1	01/06/2022

TEMA: los "casi-accidentes" son advertencia! **DURACION:7 min**

PROYECTO: CO1.PCCNTR.6947019 **CUADRILLA: 1** **FECHA:** 18/02/23

CAPACITADOR: Mayerli Carolina Aranzazu **FIRMA:** Mayerli C Aranzazu J.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Silvio Meneses	18182206	Ayudante	
2	Raul Diaz	5447111	Oficial	
3	Yeison Garcia	23419583	Maestro	
4	Hugo Ernesto Vega	1085252889	Ayudante	
5	Johnny Chaña	1233188189	Electrico	
6	Norberto Pelayo	5331907	Oficial	
7	Jhoefry Bustamante	5626299	Ayudante	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Powered by CamScanner

COINCO CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Codigo	
	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS	FT-HSEQ-021	
	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES	Version	Fecha
		1	01/06/2022

TEMA: Calistenia - Inspecciones. **DURACION:7 min**

PROYECTO: CO1.PCCNTR.6947019 **CUADRILLA: 1** **FECHA:** 14/02/25

CAPACITADOR: Mayerli Carolina Aranzazu **FIRMA:** Mayerli C Aranzazu.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Silvio Meneses	18182206	Ayudante	
2	Raul Diaz	5447111	Oficial	
3	Yeison Garcia	23419583	Maestro	
4	Hugo Ernesto Vega	1085252889	Ayudante	
5	Johnny Chaña	1233188189	Electrico	
6	Norberto Pelayo	5331907	Oficial	
7	Jhoefry Bustamante	5626299	Ayudante	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Powered by CamScanner

COINCO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Codigo	
	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS	FT-HSEQ-021	
	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES	Version: 1	Fecha: 01/06/2022

TEMA: Objetos que caen - Peligros elevados DURACION:7 min

PROYECTO: CO1.PCCNTR.6947019 CUADRILLA: 1 FECHA: 20/02/25

CAPACITADOR: Mayerli Carolina Aranzazu FIRMA: Mayerli C Aranzazu

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Silvio Meneses	18182206	Ayudante	
2	Raul Diaz	5447111	Oficial	
3	Yeison Garcia	23419583	Maestro	
4	Hugo Ernesto Vega	1085252889	Ayudante	
5	Johnny Chaña	1233188189	Electrico	
6	Norberto Pelayo	5331907	Oficial	
7	Jhoefry Bustamante	5626299	Ayudante	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Powered by CamScanner

COINCO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Codigo	
	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS	FT-HSEQ-021	
	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES	Version	Fecha
		1	01/06/2022

TEMA: Cadena de hábitos - Calistenia. DURACION:7 min

PROYECTO: CO1.PCCNTR.6947019 CUADRILLA: 1 FECHA: 21/02/23

CAPACITADOR: Mayerli Carolina Aranzazu FIRMA: Mayerli C Aranzazu S.

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Silvio Meneses	18182206	Ayudante	
2	Raul Diaz	5447111	Oficial	
3	Yeison Garcia	23419583	Maestro	
4	Hugo Ernesto Vega	1085252889	Ayudante	
5	Johnny Chaña	1233188189	Electrico	
6	Norberto Pelayo	5331907	Oficial	
7	Jhoefry Bustamante	5626299	Ayudante	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Powered by CamScanner

COINCO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Codigo	
CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS	FT-HSEQ-021	
	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES	Version	Fecha
		1	01/06/2022

TEMA: Todos los accidentes deben ser investigados **DURACION:7 min**

PROYECTO: CO1.PCCNTR.6947019 **CUADRILLA: 1** **FECHA:** 22/02/23

CAPACITADOR: Mayerli Carolina Aranzazu **FIRMA:** Mayerli C. Aranzazu S.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Silvio Meneses	18182206	Ayudante	
2	Raul Diaz	5447111	Oficial	
3	Yeison Garcia	23419583	Maestro	
4	Hugo Ernesto Vega	1085252889	Ayudante	
5	Johnny Chaña	1233188189	Electrico	
6	Norberto Pelayo	5331907	Oficial	
7	Jhoefry Bustamante	5626299	Ayudante	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Powered by CamScanner

COINCO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Codigo	
CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS	FT-HSEQ-021	
	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES	Version: 1	Fecha: 01/06/2022

TEMA: Pasillos liderer del natural-aler calistenia DURACION:7 min

PROYECTO: CO1.PCCNTR.6947019 CUADRILLA: 1 FECHA: 24/02/23

CAPACITADOR: Mayerli Carolina Aranzazu FIRMA: Mayerli C Aranzazu

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Silvio Meneses	18182206	Ayudante	
2	Raul Diaz	5447111	Oficial	
3	Yeison Garcia	23419583	Maestro	
4	Hugo Ernesto Vega	1085252889	Ayudante	
5	Johnny Chaña	1233188189	Electrico	
6	Norberto Pelayo	5331907	Oficial	
7	Jhoefry Bustamante	5626299	Ayudante	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Powered by CamScanner

COINCO CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Codigo	
	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS	FT-HSEQ-021	
	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES	Version	Fecha
		1	01/06/2022

TEMA: Peligros inherentes a las ausencias. **DURACION:7 min**

PROYECTO: CO1.PCCNTR.6947019 **CUADRILLA: 1** **FECHA:** 25/02/25

CAPACITADOR: Mayerli Carolina Aranzazu **FIRMA:** Mayerli C Aranzazu.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Silvio Meneses	18182206	Ayudante	
2	Raul Diaz	5447111	Oficial	
3	Yeison Garcia	23419583	Maestro	
4	Hugo Ernesto Vega	1085252889	Ayudante	
5	Johnny Chaña	1233188189	Electrico	
6	Norberto Pelayo	5331907	Oficial	
7	Jhoefry Bustamante	5626299	Ayudante	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Powered by CamScanner

COINCO CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Codigo	
	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS	FT-HSEQ-021	
	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES	Version	Fecha
		1	01/06/2022

TEMA: Almacenamiento y manejo de herramientas de mano. **DURACION:7 min**

PROYECTO: CO1.PCCNTR.6947019 **CUADRILLA:** 1 **FECHA:** 26/02/25

CAPACITADOR: Mayerli Carolina Aranzazu **FIRMA:** Mayerli C Aranzazu S.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Silvio Meneses	18182206	Ayudante	
2	Raul Diaz	5447111	Oficial	
3	Yeison Garcia	23419583	Maestro	
4	Hugo Ernesto Vega	1085252889	Ayudante	Hugo E. Vega
5	Johnny Chaña	1233188189	Electrico	
6	Norberto Pelayo	5331907	Oficial	Norberto
7	Jhoefry Bustamante	5626299	Ayudante	Bustamante Jhoefry
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Powered by CamScanner

COINCO CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Codigo	
	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS	FT-HSEQ-021	
	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES	Version	Fecha
		1	01/06/2022

TEMA: Actividad Reactiva a estrucks **DURACION:7 min**

PROYECTO: CO1.PCCNTR.6947019 **CUADRILLA: 1** **FECHA:** 27/02/25.

CAPACITADOR: Mayerli Carolina Aranzazu **FIRMA:** Mayerli C Aranzazu.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Silvio Meneses	18182206	Ayudante	
2	Raul Diaz	5447111	Oficial	
3	Yeison Garcia	23419583	Maestro	
4	Hugo Ernesto Vega	1085252889	Ayudante	
5	Johnny Chaña	1233188189	Electrico	
6	Norberto Pelayo	5331907	Oficial	Norberto
7	Jhoefry Bustamante	5626299	Ayudante	Bustamante Jhoefry
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Powered by CamScanner

COINCO CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Codigo	
	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS	FT-HSEQ-021	
	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES	Version	Fecha
		1	01/06/2022

TEMA: Recomendaciones Act Pintura - Calistenia DURACION:7 min

PROYECTO: CO1.PCCNTR.6947019 CUADRILLA: 1 FECHA: 28/02/25.

CAPACITADOR: Mayerli Carolina Aranzazu FIRMA: Mayerli C Aranzazu. S.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Silvio Meneses	18182206	Ayudante	
2	Raul Diaz	5447111	Oficial	
3	Yeison Garcia	23419583	Maestro	
4	Hugo Ernesto Vega	1085252889	Ayudante	
5	Johnny Chaña	1233188189	Electrico	
6	Norberto Pelayo	5331907	Oficial	
7	Jhoefry Bustamante	5626299	Ayudante	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Powered by CamScanner

COINCO CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Codigo	
	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS	FT-001	
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version	Fecha
		1	01/06/2022

INDUCCIÓN

PROYECTO: CO1.PCCNTR.6947019 **FECHA:** 18/02/25

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Silvio Meneses	18182206	Ayudante	
2	Raul Diaz	5447111	Oficial	Raul
3	Yeison Garcia	23419583	Maestro	yeison
4	Jhoefry Bustamante	18331867	Ayudante	Bustamante Jhoefry
5	Johnny Chaña	1233188189	Electrico	
6	Norberto Pelayo	5331907	Oficial	Norberto Pelayo
7	Hugo Ernesto Vega	1085252889	Ayudante	Hugo E. Vega
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Powered by CamScanner

COINCO	EVALUACION INDUCCION Y/O REINDUCCION SGSST 13/13	Fecha Vigencia 12/10/2024

NOMBRE: Raul Diaz CEDULA: 5447111

CARGO ACTUAL: Oficial FECHA: 10-02-2025

1 Mencione Tres (3) objetivos para el cumplimiento de la Politica de SST de la empresa:

a. Capacitacion y entrenamiento

b. Cumplir las normas SST

c. Cumplimiento de labores de Pagos de la SS

2. Porque es importante la Gestión del Riesgo de seguridad y salud en el trabajo (SST) en la empresa?

Prevencion y salud bienestar de los trabajadores

3. Mencione cuatro recomendaciones de seguridad en obra

a. EPP

b. Inspeccionar las Herramientas antes de su uso

c. Usar gafas guantes a la Hora de utilizar Herramientas pesadas

d. utilizar Arnes a la hora de usar andamios

4. **Marque Falso ( ) ó Verdadero (X) segun corresponda**

Un Acto o Comportamiento inseguro, se refieren a todas la acciones y decisiones humanas, que pueden causar una situación insegura o incidente, con consecuencias para el trabajador, la producción, el medio ambiente y otras personas. También incluye la falta de acciones para informar o corregir condiciones inseguras

5. **Marque Falso ( ) ó Verdadero (X) segun corresponda**

Es accidente Laboral, todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. También, es aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo

6. **Encierra en un circulo cual o cuales de las siguientes respuestas son funciones del COPASST:**

A. Participar en Actividades de Promoción, divulgación e informaciónsobre medicina, higiene y seguridad ocupacional

B. Actual como instrumento de vigilancia para el cumplimiento del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

C. Realizar inspecciones de seguridad

(D) Todas las anteriores

7. **Escriba con sus propias palabras**

a. ¿ Que es un accidente laboral ?

Imprudencia al utilizar las Hemamientas en un mal uso

b. ¿ Que se debe hacer en caso de accidente laboral?

Se debe informar al jefe Superior sobre el accidente ocurrido

c. ¿ Cual es el objetivo del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo?

Cumplir las normas de Seguridad y capacitacion y Entrenamiento

Powered by CamScanner

8. Marque con una X la respuesta correcta:

¿Como se debe realizar una correcta Manipulación Manual de Cargas?

a. Levantarla solo, cuando es mayor a 25 Kg

b. Realizar un sobre esfuerzo.

(c) Solicitar ayuda a un compañero cuando la carga es mayor a 25 Kg y la dimension no sea proporcional a mi masa corporal.

d. Ninguna de las anteriores.

9. Identifique cuatro (4) Factores de Riesgos y describa minimo dos peligros de dicho riesgo, según la Guia tecnica Colombiana GTC45

a. Físico movimientos Repetitivos en uso de Pintura x otros utencilios

b. Químicos uso de pinturas y otros utencilios

c. Público Riesgos dentro de las instalaciones

d. ergonomicos Cargas de cajas levantamiento pesos no adecuados

10. Todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo son una Modalidad de Discriminación Laboral?

Falso ( ) Verdadero (X)

11. Identifique minimo 3 riesgos a los que esta exuesto según su cargo y actividades a desarrollar?

Caida de alturas en usos de andamios
intoxicacion por Inhalaciones
uso inadecuados de las Herramientas

12. ¿ Porque es importante el uso de los EPP (Elementos de Proteccion Personal) y mencione cuales debe usar en su labor según el riesgo al cual se encuentra expuesto?

arnes y eslinga pra Prevenir un accidente en alturas

13. ¿Conoce las funciones del cargo que se va a desempeñar? Nombre algunas

Estucar Pintar lijar en dry wall empuntar

Nombre del Responsable de la Evaluación [illegible] Nombre del Trabajador Rayl Diaz
Firma del Responsable de la Evaluacion [illegible] Firma del Trabajador [illegible]
C.C: [illegible] C.C: 5447111

Powered by CamScanner

CONCO	EVALUACION INDUCCION Y/O REINDUCCION SGSST	Fecha Vigencia 12/10/2024

NOMBRE: Bustamante Jhoafry CEDULA: 18331867

CARGO ACTUAL: Ayudante FECHA: 18/02/25

1 Mencione Tres (3) objetivos para el cumplimiento de la Politica de SST de la empresa:

a. Capacitacion y Entrenamiento √

b. Cumplir normas √

c. Cumplimiento SST y de Pagos SS √

2. Porque es importante la Gestión del Riesgo de seguridad y salud en el trabajo (SST) en la empresa?

Para la prevencion de la salud del trabajador √

3. Mencione cuatro recomendaciones de seguridad en obra

a. EPP √

b. Verificar los equipos √

c. Colocar bien los Arnes. √

d. Tener las Areas despejadas y limpias √

4. **Marque Falso ( ) ó Verdadero (X) segun corresponda**

Un Acto o Comportamiento inseguro, se refieren a todas la acciones y decisiones humanas, que pueden causar una situación insegura o incidente, con consecuencias para el trabajador, la producción, el medio ambiente y otras personas. También incluye la falta de acciones para informar o corregir condiciones inseguras

5. **Marque Falso ( ) ó Verdadero (X) segun corresponda** √

Es accidente Laboral, todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. También, es aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo

6. **Encierra en un circulo cual o cuales de las siguientes respuestas son funciones del COPASST:**

A. Participar en Actividades de Promoción, divulgación e informaciónsobre medicina, higiene y seguridad ocupacional

B. Actual como instrumento de vigilancia para el cumplimiento del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

C. Realizar inspecciones de seguridad

(D) Todas las anteriores √

7. **Escriba con sus propias palabras**

a. ¿ Que es un accidente laboral ?

Imprudencia y Descuido √

b. ¿ Que se debe hacer en caso de accidente laboral?

Se debe informar a mi superior √

c. ¿ Cual es el objetivo del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo?

Cumplimientos de todo lo que se refiere √
a los trabajadores. √

Powered by CamScanner

8. **Marque con una X la respuesta correcta:**

¿Como se debe realizar una correcta Manipulación Manual de Cargas?

a. Levantarla solo, cuando es mayor a 25 Kg

b. Realizar un sobre esfuerzo.

c. Solicitar ayuda a un compañero cuando la carga es mayor a 25 Kg y la dimension no sea proporcional a mi masa corporal. ✓

d. Ninguna de las anteriores.

9. **Identifique cuatro (4) Factores de Riesgos y describa minimo dos peligros de dicho riesgo, según la Guia tecnica Colombiana GTC45**

a. Fisico Movimientos Repetitivos. ✓

b. Quimico uso de Pintura, Pegantes, Tiner. ✓

c. Publico Riesgos en las instalaciones. ✓

d. Ergonomico cargos de Cajas Posturas prolongados ✓

10. **Todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo son una Modalidad de Discriminación Laboral?**

Falso ( ) Verdadero (✱)

11. **Identifique minimo 3 riesgos a los que esta exuesto según su cargo y actividades a desarrollar?**

Riesgo de inhalacion de Polvo ✓

El manejo de herramienta ✓

las escalaras poner los cuidados ✓

12. **¿ Porque es importante el uso de los EPP (Elementos de Proteccion Personal) y mencione cuales debe usar en su labor según el riesgo al cual se encuentra expuesto?**

Casco para evitar cualquier golpe guantes para no maltratar ✓ las manos.

13. **¿Conoce las funciones del cargo que se va a desempeñar? Nombre algunas**

Cargar escombros pone cinta pintor. ✓

Nombre del Responsable de la Evaluación Nayeli Chacon Nombre del Trabajador Bustamante Jhoeffy

Firma del Responsable de la Evaluacion Nayeli Chacon Firma del Trabajador Bustamante Jhoeffy

C.C: 1102827776 C.C: 1083318607

Powered by CamScanner

COINCO	EVALUACION INDUCCION Y/O REINDUCCION SGSST	Fecha Vigencia 12/10/2024

NOMBRE: Norberto pelayo CEDULA: 5331907

CARGO ACTUAL: oficial FECHA: 18 de febrero 2025

1 Mencione Tres (3) objetivos para el cumplimiento de la Politica de SST de la empresa:

a. capacitacion y entrenamiento

b. cumplir con las norma y recomendaciones

c. cumplimiento en los de seguridad social

2. Porque es importante la Gestión del Riesgo de seguridad y salud en el trabajo (SST) en la empresa?

Asi se evita un accidentes

3. Mencione cuatro recomendaciones de seguridad en obra

a. Usar el casco

b. Guantes

c. gafas

d. Mantener el area de trabajo ordenada y limpia.

4. **Marque Falso ( ) ó Verdadero (X) segun corresponda**

Un Acto o Comportamiento inseguro, se refieren a todas la acciones y decisiones humanas, que pueden causar una situación insegura o incidente, con consecuencias para el trabajador, la producción, el medio ambiente y otras personas. También incluye la falta de acciones para informar o corregir condiciones inseguras

5. **Marque Falso ( ) ó Verdadero (X) segun corresponda**

Es accidente Laboral, todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. También, es aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo

6. **Encierra en un circulo cual o cuales de las siguientes respuestas son funciones del COPASST:**

A. Participar en Actividades de Promoción, divulgación e informaciónsobre medicina, higiene y seguridad ocupacional

B. Actual como instrumento de vigilancia para el cumplimiento del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

C. Realizar inspecciones de seguridad

D. Todas las anteriores ✓

7. **Escriba con sus propias palabras**

a. ¿ Que es un accidente laboral ?

una mala manipulacion de cualquier herramientas.

b. ¿ Que se debe hacer en caso de accidente laboral?

notificar a nuestro superior.

c. ¿ Cual es el objetivo del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo?

Proteger a nuestro trabajadores

Powered by CamScanner

8. Marque con una X la respuesta correcta:

¿Como se debe realizar una correcta Manipulación Manual de Cargas?

a. Levantarla solo, cuando es mayor a 25 Kg

b. Realizar un sobre esfuerzo.

c. Solicitar ayuda a un compañero cuando la carga es mayor a 25 Kg y la dimension no sea proporcional a mi masa corporal. ✓

d. Ninguna de las anteriores.

9. Identifique cuatro (4) Factores de Riesgos y describa minimo dos peligros de dicho riesgo, según la Guia tecnica Colombiana GTC45

a. Fisico : Ejemplo Movimiento repetitivo

b. Quimico : uso de Pintura

c. Publico : antentado terrorismo

d.

10. Todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo son una Modalidad de Discriminación Laboral?

Falso ( ) Verdadero (X)

11. Identifique minimo 3 riesgos a los que esta exuesto según su cargo y actividades a desarrollar?

Mal uso de la soldera
Mala proyeccion de material
una distracion

12. ¿ Porque es importante el uso de los EPP (Elementos de Proteccion Personal) y mencione cuales debe usar en su labor según el riesgo al cual se encuentra expuesto?

Casco, los guantes, gafas para evitar un accidentes.

13. ¿Conoce las funciones del cargo que se va a desempeñar? Nombre algunas

Pintor, retar los escombros de todos un poco.

Nombre del Responsable de la Evaluación Jaider. Chaparro
Firma del Responsable de la Evaluacion Jaider Chaparro.
C.C: 1149627736

Nombre del Trabajador Norberto Palaco
Firma del Trabajador norberto.
C.C: 5331907

Powered by CamScanner

CCINCO	EVALUACION INDUCCION Y/O REINDUCCION SGSST	Fecha Vigencia 12/10/2024

NOMBRE: Hugo E. Ucros CEDULA: 1.085.252.885

CARGO ACTUAL: Ayudante. FECHA: 18/02-2025

1 Mencione Tres (3) objetivos para el cumplimiento de la Politica de SST de la empresa:

a. Casco Capacitacion Entrenamiento

b. Guantes Cumplimiento normas y recomendaciones

c. Cumplimiento Pagos de Seguridad Social

2. Porque es Importante la Gestión del Riesgo de seguridad y salud en el trabajo (SST) en la empresa?

Es importante Para Prevenir cualquier clase de accidente.

3. **Mencione cuatro recomendaciones de seguridad en obra**

a. Usar Guantes

b. Usar Casco

c. Revisar minuciosamente los implementos de trabajo

d. Usar las botas.

4. **Marque Falso ( ) ó Verdadero (✓) segun corresponda**

Un Acto o Comportamiento inseguro, se refieren a todas la acciones y decisiones humanas, que pueden causar una situación insegura o incidente, con consecuencias para el trabajador, la producción, el medio ambiente y otras personas. También incluye la falta de acciones para informar o corregir condiciones inseguras

5. **Marque Falso ( ) ó Verdadero (✓) segun corresponda**

Es accidente Laboral, todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. También, es aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo

6. **Encierra en un circulo cual o cuales de las siguientes respuestas son funciones del COPASST:**

A. Participar en Actividades de Promoción, divulgación e informaciónsobre medicina, higiene y seguridad ocupacional

B. Actual como instrumento de vigilancia para el cumplimiento del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

C. Realizar inspecciones de seguridad

D. Todas las anteriores ✓

7. **Escriba con sus propias palabras**

a. ¿ Que es un accidente laboral ?

Es cuando Por cualquier motivo se lastima cumpliendo cualquier labor.

b. ¿ Que se debe hacer en caso de accidente laboral?

Informar oportunamente y tomar las medidas Pertinentes

c. ¿ Cual es el objetivo del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo?

Proteger adecuadamente al trabajador.

Powered by CamScanner

8. Marque con una X la respuesta correcta:

¿Como se debe realizar una correcta Manipulación Manual de Cargas?

a. Levantarla solo, cuando es mayor a 25 Kg

b. Realizar un sobre esfuerzo.

c. Solicitar ayuda a un compañero cuando la carga es mayor a 25 Kg y la dimension no sea proporcional a mi masa corporal. ✓

d. Ninguna de las anteriores.

9. Identifique cuatro (4) Factores de Riesgos y describa minimo dos peligros de dicho riesgo, según la Guia tecnica Colombiana GTC45

a. Ergonomico Por una mala Postura al levantar algun Peso

b. Fisico cuando hay Movimientos Repetitivos

c. Quimico Por uso de Pegantes Pinturas

d. Publico Por un acto terrorista

10. Todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo son una Modalidad de Discriminación Laboral?

Falso ( ) Verdadero (✓)

11. Identifique minimo 3 riesgos a los que esta exuesto según su cargo y actividades a desarrollar?

Que le caigan Escombros

Que se le resuale la Escalera

Que se corte Por manipular algun elemeto Filoso.

12. ¿ Porque es importante el uso de los EPP (Elementos de Proteccion Personal) y mencione cuales debe usar en su labor según el riesgo al cual se encuentra expuesto?

Prevenir accidentes laborales, usar casco Para evitar golpes, las botas Para evitar cualquier descarga electrica.

13. ¿Conoce las funciones del cargo que se va a desempeñar? Nombre algunas

SI las conozco, Cargar Escombros y ayudar a Pintar y ligar.

Nombre del Responsable de la Evaluación Valeth (illegible) Nombre del Trabajador Diego E. Vega

Firma del Responsable de la Evaluacion Valeth (illegible) Firma del Trabajador Diego E. Vega

C.C: 1143952736 C.C: 1.085.252.886

Powered by CamScanner

ANEXO 15
INFORME AMBIENTAL.

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galán – Mocoa – Putumayo

CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.6947019

OBJETO:
REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA



CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:
ING. ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

01 FEBRERO -28 FEBRERO 2025

MOCOA – PUTUMAYO

Soluciones Integrales de Ingeniería
Allan Edward Sánchez Quiceno
3185311222
Barrio Luis Carlos Galan – Mocoa – Putumayo

INTRODUCCION

Las políticas ambientales y las normas legales establecidas en Colombia, determinan claramente la compatibilidad que debe existir entre la ejecución de los proyectos de infraestructura civil que se desarrollan y la conservación del Ambiente basados en criterios de Desarrollo Sostenible, razón por lo cual las entidades contratistas, elaboran un Plan De Manejo Ambiental (PMA), dónde se identifican, evalúan, valoran los posibles impactos y alteraciones al ambiente que se pueden generar durante la ejecución de éste tipo de proyectos para así establecer las medidas requeridas para prevenir, controlar, mitigar o compensar éstos impactos.

Mediante el presente informe ambiental tiene como objetivo evaluar y mitigar los impactos ambientales asociados con la ejecución de las obras de mantenimiento correctivo y preventivo en el Palacio de Justicia. Este documento se elabora con el fin de presentar un trabajo detallado durante el periodo comprendido entre 14 noviembre al 13 diciembre del año 2024 del componente ambiental que hace parte del Proyecto denominado; REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA.

La interventoría desde la parte ambiental hace la supervisión y control de todas las actividades ejecutadas por el contratista de obra para mitigar los impactos ambientales generados por la construcción del proyecto antes en mención, es claro que toda obra genera un impacto al ambiente, una de las herramientas fundamentales para la verificación de este, se lo realiza mediante la revisión del Plan De Manejo Ambiental (PMA), herramienta con la cual se tendrá un control de las afectaciones realizadas al entorno, teniendo como medio, el registro de seguimiento ambiental, que nos ayudara a la verificación de información, documentos, soportes que permitan evaluar el cumplimiento del contratista y de esa manera tomar las acciones necesarias que garanticen el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el componente ambiental, por parte de interventoría se realizara la respectiva revisión y aprobación del PMA, los informes de avance de cumplimiento de acuerdo al cronograma presentado y a lo exigido en los pliegos de condiciones del mismo.

1. PROBLEMÁTICA

La infraestructura física del Palacio de Justicia es fundamental para garantizar la adecuada prestación de los servicios judiciales, ofreciendo un entorno seguro, funcional y digno tanto para los ciudadanos como para los servidores públicos. Sin embargo, con el paso del tiempo y debido al uso continuo de las instalaciones, surgen diversas problemáticas que comprometen la operatividad, seguridad y conservación del edificio, lo que hace necesaria la implementación de un contrato para realizar obras de mantenimiento correctivo y preventivo.

Entre los principales problemas que justifican este contrato se encuentra el deterioro de elementos estructurales, causado por factores como el desgaste natural, la exposición a condiciones climáticas adversas y el uso intensivo de los espacios. Este deterioro se manifiesta en grietas, filtraciones, corrosión de materiales metálicos y debilitamiento de techos, paredes y pisos. Asimismo, los sistemas eléctricos, hidráulicos y de ventilación pueden presentar fallas debido a su antigüedad o falta de mantenimiento, generando riesgos para los usuarios y posibles interrupciones en el servicio.

Además, estas deficiencias afectan la imagen institucional, ya que un edificio en mal estado transmite una percepción de descuido y falta de compromiso con la justicia. Por otra parte, la falta de cumplimiento con normativas de seguridad, accesibilidad y sostenibilidad puede derivar en sanciones legales y en un impacto negativo sobre el entorno ambiental.

En este contexto, el contrato se plantea como una solución al deterioro actual que vive la infraestructura física del palacio de justicia del municipio de Mocoa, departamento del Putumayo, para prevenir daños mayores y garantizar la sostenibilidad de la infraestructura a largo plazo, preservando así su funcionalidad y su rol como símbolo del sistema de justicia.

2. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.1 Descripción del proyecto

El desarrollo de las actividades como reparación de techos, paredes y pisos, mantenimiento de sistemas eléctricos e hidráulicos, pintura y acabados y otros trabajos correctivos y preventivos necesarios del contrato de la obra nos lleva a solucionar el inconveniente, que radica en el actual deterioro que se encuentra la infraestructura física del palacio de justicia municipio de Mocoa Departamento del Putumayo, dado que no cuenta con instalaciones apropiadas, generando incumpliendo con la normatividad y regulaciones vigentes en materia de seguridad, salud ocupacional y accesibilidad, como también, la preservación de la imagen institucional, un edificio bien mantenido y restaurado refleja la imagen de la institución y su compromiso con la justicia y el servicio a la comunidad.

Para el efecto, el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Distrito Pasto, presentó el proyecto "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA"; que fue viabilizado y aprobado, para financiar su ejecución.

2.2 Localización del proyecto

La ejecución de las actividades contractuales se encuentra localizadas en el Departamento del Putumayo ubicado al suroeste del país, en la región Amazónica.

En el municipio de Mocoa que se encuentra localizado está ubicado en la parte norte del Departamento del Putumayo, específicamente en el palacio de justicia, Calle 7 No 6 - 42, Barrio Centro.



Ilustración 1: *Localización General del Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo.*
***Fuente**: www.googlemaps.com*

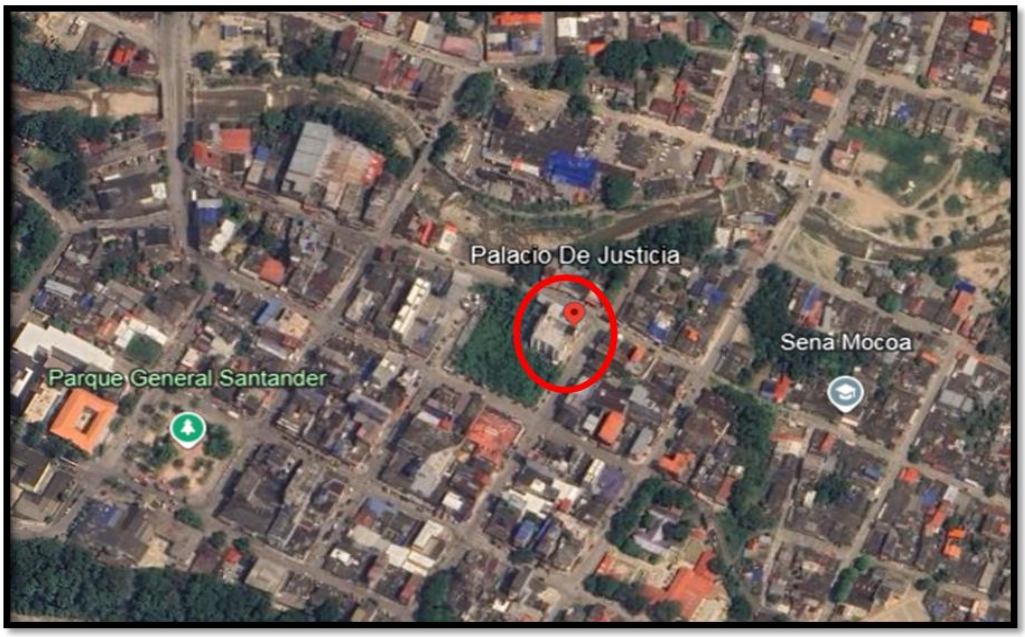


***Ilustración 2**: Localización especifica del área a intervenir en el municipio de Mocoa, Putumayo.*
***Fuente**: www.earth.google.com*

3. REVISIÓN PRELIMINAR DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

De acuerdo a las funciones de la interventoría sobre el componente ambiental, es encargada de la recepción, revisión y seguimiento del PMA, la documentación e informes de cumplimiento ambiental, y todo aquello en el que se involucre este componente, todo esto se debe hacer de acuerdo al cronograma y pliegos de obra, y según los requerimientos de la autoridad ambiental Corpoamazonia como de la supervisión del proyecto que está a cargo. Si la documentación mencionada anteriormente tiene comentarios, observaciones o inconsistencias, el responsable en este caso el profesional ambiental deberá ajustar y subsanarlas dentro del término previsto para su entrega. Con base a lo anterior interventoría hace revisión del Plan de manejo Ambiental, presentado por el contratista de obra mediante oficio RM-001 de 8 noviembre 2024. Una vez realizada la revisión respectiva del PMA, se evidencian que el documento contiene 36 folios dentro de los cuales se encuentran los requisitos, lineamientos ambientales y las tres fases del proyecto como Fase 1 caracterización y diagnóstico, fase 2 ejecución de la obra y fase 3 cierre del proyecto.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES INFORMADO POR INTERVENTORÍA

De acuerdo con la actividad establecida en el contrato de obra CONTRATO N°. CO1.PCCNTR.6947019 DEL 29 DE OCTUBRE 2024, para el presente periodo informado de ejecución del contrato, se realizó verificación seguimiento a las siguientes actividades:

- Programar y coordinar con el Contratista de obra ambiental, las actividades de seguimiento del PMA y la ejecución del contrato e informar previo a su realización.
- Cumplir con la entrega del informe mensual requeridos en los cuales se presente el estado de ejecución, avance del contrato además de las conclusiones y recomendaciones, de acuerdo con la metodología, los formatos y listas de chequeo para tal fin.
- Verificación de la legalidad ambiental de los materiales adquiridos por el contratista de obra, en aras de velar por su calidad, oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas correspondientes; Igualmente se solicitará de manera oportuna la

certificación y/o acreditación de la calidad y legalidad de los materiales al Contratista de obra.

- Verificación del cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad ambiental vigente.
- Control y seguimiento diario de todas las actividades que está ejecutando el contratista de obra, quedando éstas plasmadas en la Bitácora de obra.
- Toma registro fotográfico del estado de avance de la obra en cada visita realizada.
- Elaboración del informe mensual de interventoría.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto 1: señalización de áreas a intervenir</td><td>Foto 2: Acopio de materiales</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto 3: Acopio de escombros</td><td>Foto 4: Cargue de escombros para disposición final</td></tr>
</table>

	
Foto 5: *Vehículo de cargan materiales con carpas*	***Foto 6:*** *Capacitación ambiental*

5. DESARROLLO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

De acuerdo con el avance en la ejecución técnica de las obras correspondientes al periodo informado, se relaciona el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental establecidas en las fichas de manejo ambiental, prestándole particular atención a las medidas formuladas para mitigar los impactos ambientales negativos que la actividad puede causar sobre el ambiente y la comunidad.

A continuación, se presentan los componentes contemplados dentro del Plan de Manejo Ambiental, el cual se va a desarrollar durante la ejecución de las obras del CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.6947019 DEL 29 DE OCTUBRE 2024 cuyo objeto es "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA".

5.1 Componente Biótico

Dado que el presente programa trata de actividades de "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA", no se ve la necesidad de utilización o intervención de áreas circundantes en las que pueda resultar vegetación, fauna y/o floras afectadas.

5.2 Componente Físico

5.2.1 Control De Emisiones Atmosféricas

La contaminación atmosférica generada durante el desarrollo de un programa procede de tres fuentes principales: emisiones difusas de material particulado, gases de combustión y ruido generado por la operación de maquinaria y demolición de estructuras.

El adecuado control a estas fuentes minimiza los efectos adversos al medio ambiente y disminuye los efectos negativos que éstos pueden ocasionar sobre la salud humana. Así mismo, el control de los niveles de ruido por debajo de los límites permisibles permite reducir los problemas de salud ocupacional que estas actividades puedan generar, así como atenuar las incomodidades producidas a la comunidad.

PLAN DE MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS		
IMPACTOS ASOCIADOS	**MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL**	**SEGUIMIENTO Y MONITOREO**
Aumento de las concentraciones de material particulado, humos, gases y ruido en la atmósfera del Palacio de Justicia y alrededores. Afectación a la salud de los trabajadores y de la comunidad cercana al proyecto. Afectación a la calidad del aire en la zona.	**Emisiones atmosféricas (material particulado y gases)** Cuando se requiera realizar algún tipo de demolición, debido a la magnitud de las actividades, el frente de obra debe estar protegido para el control del material particulado con cerramiento perimetral. Mantener control sobre los materiales de construcción que se encuentren en el frente de obra, mantenerlos debidamente cubiertos y protegidos del aire y el agua. Controlar las actividades de construcción que generan gran cantidad de polvo, regando las áreas de	Verificación de la cobertura y humedecimiento de las zonas de acopio de material sobrante y de insumos de la construcción. Inspección de seguridad para vehículos de carga.

	trabajo con agua por lo menos 2 veces al día; realizar esta misma operación a los materiales que se encuentren almacenados temporalmente en el frente de obra (que lo permitan) y que sean susceptibles de generar material particulado. □ Conservar con una humedad suficiente los materiales generados en excavaciones y demoliciones, para evitar que se levante material particulado y cubrirlos, mientras se utilizan, con material plástico o cualquier otro material para impedir las emisiones de partículas al aire □ Inspeccionar que los vehículos que cargan y descargan materiales dentro de las obras estén acondicionados con carpas y lonas para cubrir los materiales. Verificar que cuenten con certificados vigentes de revisión tecno mecánica y de gases. □ Solicitar el apagado de los vehículos mientras se encuentren estacionados en el lugar de la obra.	
	Ruido □ Cuando se requiera usar equipos muy sonoros, a más de 80 decibeles se debe trabajar solo en jornada diurna y por períodos cortos	

	de tiempo siguiendo los parámetros legales aplicables al área donde se desarrolla la obra. □ Programar ciclos de trabajo de máximo 2 horas de ruido continuo, cuando el ruido continuo supere el nivel de ruido del ambiente se debe contar con 32 horas de descanso después de las horas de operación o utilizar equipos insonorizados. □ Advertir previamente a la comunidad sobre la utilización de equipos sonoros, con el fin de que tomen las medidas pertinentes. □ Suministrar elementos de control auditivo al personal de la obra. □ Cuando se requiera realizar trabajos que generen ruido durante las horas de la noche es necesario tramitar permiso de ruido nocturno con la autoridad competente. □ Prohibir a los vehículos que en la obra accionen las bocinas, salvo la alarma de reversa.	

5.2.2 Prevención De La Contaminación De Cuerpos De Agua Y Redes De Servicios Públicos.

El agua resultante de las obras de construcción tiene un alto contenido de partículas minerales suspendidas y en ocasiones puede estar mezclada con restos de cemento, concreto u otras sustancias. Estos materiales provocan

taponamientos en los conductos en alcantarillas, impiden un tratamiento efectivo en las plantas de tratamiento y generan contaminación en los cuerpos de agua que actúan como sus receptores.

PLAN DE MANEJO DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS		
IMPACTOS ASOCIADOS	**MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL**	**SEGUIMIENTO Y MONITOREO**
Alteración de las características del agua. Contaminación de redes de alcantarillado	No realizar vertimientos de residuos líquidos a las calles, calzadas, canales y cuerpos de agua. No eliminar el material sobrante con agua ni dirigirlo a los canales de desagüe. En caso de derrame de mezcla de concreto, ésta se deberá recoger y disponer de manera inmediata, siguiendo los protocolos establecidos. Se prohíben los vertimientos de aceites, pinturas y demás materiales o productos químicos a la red de alcantarillado o su disposición sobre el suelo. Se prohíbe el lavado de vehículos y el descargue de mezclas de concreto en las estructuras de alcantarillado, lo mismo que el vertimiento de cualquier sustancia perjudicial que se genere en la obra. En caso de utilizar concreto mezclado en planta, se recomienda extremar	Informe de clasificación de cuerpos hídricos y manejo de aguas. Inspecciones de seguridad en las actividades laborales. Control de vertimientos provenientes de obra. Manejo de aguas residuales con empresas autorizadas por autoridades ambientales

	las medidas de precaución en el transporte de la mezcla a los frentes de trabajo, con el fin de evitar vertimientos accidentales.	

5.2.3 Disposición De Residuos Sólidos

Una adecuada clasificación de los residuos sólidos permitirá recuperar, reciclar o reutilizar algunos de los materiales, minimizando así la cantidad de desechos no aprovechados. De esta forma, se reducen costos de disposición final, se optimiza el uso de los materiales y se logra un menor impacto ambiental.

Debido al impacto y a las características de los diferentes elementos resultantes de las obras, se elabora el Plan de Gestión Integral de Residuos PGIR.

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS		
IMPACTOS ASOCIADOS	**MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL**	**SEGUIMIENTO Y MONITOREO**
Modificación de las características del suelo y/o del agua. Afectación de la calidad el aire en la zona. Generación y aporte de sólidos en las redes de alcantarillado. Deterioro del paisaje. Generación de focos de contaminación. Inconformidades por parte de la comunidad aledaña. Afectación a la salud de los trabajadores y de la comunidad cercana al proyecto.	**Residuos no peligrosos:** Realizar la clasificación y separación adecuada de los residuos sólidos. El almacenamiento de los residuos debe hacerse en recipientes tipo caneca plástica con tapa. Los recipientes deben estar rotulados con el nombre de acuerdo con el tipo de residuos. Las etiquetas de los recipientes deben contener información clara y entendible para todos, además de ser resistentes al agua o a otros agentes. Las canecas deben ubicarse en sitios estratégicos o puntos ecológicos. Capacitar y sensibilizar a todo el personal de la obra, sobre la gestión integral de los residuos.	Inspección de seguridad para centros de acopio. Tabla de identificación de residuos sólidos. Certificados y licencias ambientales de los gestores de transporte, tratamiento y disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos. Actas y/o certificados de disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos.

	Los recipientes no deben tener sobrecarga de residuos. Identificar a las empresas gestoras encargadas de la recolección periódica, transporte y disposición final de los residuos no aprovechables. Identificar empresas o asociaciones de recicladores y realizar la entrega de residuos aprovechables. Al finalizar la jornada, se debe realizar una limpieza general de la zona donde se realicen las obras con el objeto de recoger todos los residuos presentes en el área.	
	Residuos Especiales y/o Peligrosos Realizar el manejo adecuado de los residuos especiales y/o peligrosos. Para los residuos peligrosos se deben seguir todos los lineamientos establecidos en la normatividad ambiental vigente para su etiquetado, rotulado, almacenamiento y transporte. Separar los residuos de construcción y demolición RCD como escombros, sobrantes de concreto, morteros, cordones, tuberías, etc., de los demás residuos. Los lugares o zonas de almacenamiento temporal del material reciclable de construcción y demolición deben estar provistos de canales	

	perimetrales estructuras para el control de sedimentos. □ Los RCD no pueden obstaculizar el tráfico peatonal y vehicular, deben estar apilados, bien protegidos de agentes externos y ubicados en zonas seguras. □ Se prohíbe: o depositar RCD en zonas verdes, humedales o cerca de cuerpos de agua, o quemar residuos o desechos peligrosos a cielo abierto, □ ingresar residuos o desechos peligrosos en rellenos sanitarios, sino existen celdas de seguridad dentro de éste, autorizadas para la disposición final de este tipo de residuos, la disposición o enterramiento de residuos o desechos peligrosos en sitios no autorizados para esta finalidad por la autoridad ambiental competente, □ El abandono de residuos o desechos peligrosos en vías, suelos, humedales, parques, cuerpos de agua o en cualquier otro sitio. □ Contratar la disposición de los residuos especiales y/o peligrosos con gestores autorizados. □ El manejo, transporte y disposición final de	

	escombros y materiales de construcción, deberá seguir los criterios establecidos por las autoridades competentes.	

5.2.4 Manejo De Movilidad Y Señalización

Las zonas diseñadas para el almacenamiento temporal de los materiales de trabajo y para los trabajos de los desechos deben mantenerse correctamente identificados con cinta de demarcación y con soportes.
Cuando se programe la entrada de vehículos para la descarga o carga de material o la recolección de desechos, es necesario llevar a cabo el control del tráfico con el fin de evitar cualquier incidente de tráfico y crear traumas para los peatones.
Señalar los caminos temporales de paso para peatones y/o vehículos de los cuales es necesario realizar un registro fotográfico e incluirlo en los reportes de administración mensuales.

5.2.5 Uso Y Almacenamiento Adecuado De Materiales De Construcción

Establecer un sistema de manejo adecuado para el transporte, cargue, descargue y manipulación de los materiales de construcción (arenas, grava, triturados, recebos, ladrillos, triturados de arcilla y otros) se evitan pérdidas del mismo y por lo tanto se generan múltiples ventajas de orden financiero, logístico y ambiental. Al mismo tiempo, se reduce la cantidad de escombros y residuos generados, y el aporte de sedimentos y otros contaminantes a las redes de servicios públicos y fuentes de agua.

PLAN DE MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					
IMPACTOS ASOCIADOS Contaminación o alteración de las características del agua, el suelo o el aire. Ocupación del espacio público.					
MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL Almacenamiento de Materiales de Construcción.					
Material	**Alm. en Cubierto**	**Alm. en áreas seguras**	**Alm. sobre estibas**	**Alm. Ligados**	**Requerimientos especiales**

Arena y grava	X				Cubrir con lona grava
Cemento	X		X		Evitar que se humedezcan
Ladrillos, adobes, tejas y adoquine			X	X	almacenar en los embalajes originales hasta el momento de uso, lejos del tráfico de vehículos
Metales	X	X			
Prefabricados				X	
Baldosas	X	X			Envolver con plástico para prevenir que se rayen
Tubería			X	X	Usar separadores es para prevenir que se rueden.
Madera	X	X			Proteger de roturas causadas por mal manejo.
Pinturas		X			Proteger del robo

Material impermeabilizante	X	X			Almacenar Envuelto en Plástico.
Aceites y combustibles		X	X		Almacenar en tanques o toneles cerrados según las cantidades.

Manejo de los materiales:

 Todos los materiales deben provenir de fuentes legales, es decir, deben contar con permisos ambientales y mineros, aspectos que deberán ser certificados por los proveedores.

 Garantizar que el transporte de los materiales se realice en volquetas con cajón totalmente cubierto para impedir el derrame o dispersión de los materiales y de material particulado en el recorrido.

 La cubierta debe ser de material resistente como lona y estar sujeta firmemente a las paredes exteriores del contenedor.

 Evitar el escurrimiento del material húmedo durante el transporte. Para ello, asegurarse que el contenedor del vehículo esté construido con una estructura continua que en su contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios.

Adecuar los horarios y las vías para la circulación de vehículos de carga a los establecidos por la autoridad local.

 Demarcar los sitios de almacenamiento con la señalización establecida.

 Se sugiere el uso de carretillas planas para el traslado del material, para evitar fisuras y daños en el material.

 Cuando se requiera realizar mezclas de concreto en el sitio de la obra, hacerlo sobre una plataforma metálica o sobre un geotextil de un calibre que garantice que no haya contacto con el suelo, de tal forma que el lugar permanezca en óptimas condiciones. No hacer la mezcla directamente sobre el suelo o sobre las zonas duras existentes.

 Utilizar formaletas de madera sólo para la fundición de obras de concreto. Se exceptúan los casos en que se requieren formas especiales.

 En el caso de derrames de mezcla de concreto, es necesario recogerla y disponerla de manera inmediata.

 Siempre y cuando sea posible (por calidad), mantener húmedo el material de

playa que sea necesario (material de recebo), tal como en la construcción de pisos, andenes, etc.
SEGUIMIENTO Y MONITOREO Mapa de identificación de puntos de almacenamientos de materiales de construcción. Inspección de seguridad para centros de acopio.

5.2.6 Protección Del Suelo

En la ejecución de proyectos de obra civil, el suelo puede resultar uno de los recursos más afectado debido la necesidad de su uso para disposición o almacenamiento de materiales de construcción y/o residuos los cuales, debido a un mal manejo o eventos no deseados pueden generar derrames o vertimientos directos lo que conlleva a su contaminación y afectación.

Es por esto qué se deben tomar medidas preventivas para la protección de este recurso y, en caso de alguna afectación producto de las actividades del proyecto, para su rehabilitación o restitución con el fin de que el suelo afectado vuelva a sus condiciones iniciales o mejores.

PLAN DE PROTECCIÓN DEL SUELO		
IMPACTOS ASOCIADOS	**MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL**	**SEGUIMIENTO Y MONITOREO**
□ Modificación de las características del suelo. □ Deterioro del paisaje. □ Generación de focos de contaminación. □ Inconformidades por parte de la comunidad aledaña. □ Afectación a la salud de los trabajadores y de la comunidad cercana al proyecto.	□ No realizar vertimientos de residuos líquidos a las calles, parques, zonas verdes, separadores, canales, entre otros. □ Realizar el manejo adecuado de los residuos, aprovechables y no aprovechables, no peligrosos, peligrosos y especiales. □ Identificar empresas o asociaciones de recicladores y realizar la entrega de residuos aprovechables.	□Plan de intervención y recuperación de suelos. Inspección de seguridad para centros de acopio.

	Identificar gestores de residuos peligrosos y especiales, así como programas pos consumo, cercanos al lugar de la obra para la gestión adecuada de estos residuos. □ Al finalizar la jornada, se debe realizar una limpieza general de la zona donde se realicen las obras con el objeto de recoger todos los residuos presentes en el área. □ En caso de derrames o vertimientos al suelo, realizar su recolección inmediatamente y reportar el evento. Dependiendo de las características del material o producto derramado, en caso de que sea contaminante o peligroso, establecer el plan de intervención y recuperación del suelo.	

6. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

6.1 Componente Biótico

No hay la necesidad de utilización o intervención de áreas circundantes en las que pueda resultar vegetación, fauna y/o floras afectadas.

6.2 Componente Físico

6.2.1 Control De Emisiones Atmosféricas

Acciones de manejo	Método de verificación	Estado
Cuando se realice demolición, debe estar protegido con cerramiento perimetral para el control del material particulado.	Registro fotográfico	Cumple
Los materiales de construcción mantenerlos debidamente cubiertos y protegidos del aire y el agua.	Registro fotográfico	Cumple
los materiales generados en demoliciones, cubrirlos con material plástico o cualquier otro material para impedir las emisiones de partículas al aire.	Registro fotográfico	Cumple
Inspeccionar los vehículos que cargan y descargan materiales estén con carpas y lonas para cubrir los materiales. Verificar que cuenten con certificados vigentes de revisión tecno mecánica y de gases.	Registro fotográfico y actas de inspecciones	Cumple
Advertir a la comunidad sobre la utilización de equipos sonoros, con el fin de que tomen las medidas pertinentes.	Registro fotográfico	Cumple
Suministrar elementos de control auditivo al personal de la obra.	Registro fotográfico	Cumple
Prohibir a los vehículos que en la obra accionen las bocinas.	Registro fotográfico	Cumple

6.2.2 Prevención De La Contaminación De Cuerpos De Agua Y Redes De Servicios Públicos

Acciones de manejo	Método de verificación	Estado
En caso de derrame de mezcla de concreto, ésta se deberá recoger y disponer de manera inmediata,	Registro fotográfico	N/A

siguiendo los protocolos establecidos		
Se prohíben los vertimientos de aceites, pinturas y demás materiales o productos químicos a la red de alcantarillado o su disposición sobre el suelo.	Registro fotográfico	N/A
Se prohíbe el lavado de vehículos y el descargue de mezclas de concreto en las estructuras de alcantarillado, lo mismo que el vertimiento de cualquier sustancia perjudicial que se genere en la obra.	Registro fotográfico	N/A
Utilizar concreto mezclado en planta, se recomienda extremar las medidas de precaución en el transporte de la mezcla a los frentes de trabajo, con el fin de evitar vertimientos accidentales	Registro fotográfico	N/A

6.2.3 Disposición De Residuos Sólidos

Acciones de manejo	Método de verificación	Estado
Realizar la clasificación y separación adecuada de los residuos sólidos.	Registro fotográfico	Cumple
Punto ecológico	Registro fotográfico	Cumple
Capacitar y sensibilizar a todo el personal de la obra, sobre la gestión integral de los residuos.	Registro fotográfico y listados de asistencia	Cumple
Empresas gestoras encargadas de la recolección periódica, transporte y disposición final de los residuos no aprovechables.	Registro fotográfico y Certificado de empresa recolectora	No Cumple
Realizar una limpieza general de la zona donde se realicen las obras con el objeto de recoger todos los residuos presentes en el área.	Registro fotográfico	Cumple
Realizar el manejo adecuado de los residuos especiales y/o peligrosos.	Registro fotográfico	No Cumple

Separar los residuos de construcción y demolición RCD como escombros, sobrantes de concreto, morteros, cordones, tuberías de los demás residuos.	Registro fotográfico	Cumple
El manejo, transporte y disposición final de escombros y materiales de construcción, deberá seguir los criterios establecidos por las autoridades competentes	Registro fotográfico	Cumple

6.2.4 Manejo De Movilidad Y Señalización

Las áreas destinadas para el acopio temporal de los materiales de obra y para los residuos están debidamente señalizadas con cinta de demarcación
y con soportes tubulares.
Cuando se programa el ingreso de vehículos para cargue o descargue de material o para recolección de residuos, se realiza el control del tráfico tratando de no generar traumatismos para los transeúntes.

6.2.5 Uso Y Almacenamiento Adecuado De Materiales De Construcción

Acciones de manejo	Método de verificación	Estado
Los materiales deben provenir de fuentes legales, es decir, deben contar con permisos ambientales y mineros, aspectos que deberán ser certificados por los proveedores	Certificados de la empresa	cumple
Demarcar los sitios de almacenamiento con la señalización establecida.	Registro fotográfico	cumple
Utilizar formaletas de madera sólo para la fundición de obras de concreto.	Registro fotográfico	N/A
En el caso de derrames de mezcla de concreto, es necesario recogerla y disponerla de manera inmediata.	Registro fotográfico	N/A
No hacer la mezcla directamente sobre el suelo o sobre las zonas duras existentes.	Registro fotográfico	N/A

6.2.6 Protección Del Suelo

Acciones de manejo	Método de verificación	Estado
No realizar vertimientos de residuos líquidos a las calles, parques, zonas verdes, separadores, canales, entre otros.	Registro fotográfico	Cumple
En caso de derrames o vertimientos al suelo, realizar su recolección inmediatamente y reportar el evento. Dependiendo de las características del material o producto derramado, en caso de que sea contaminante o peligroso, establecer el plan de intervención y recuperación del suelo.	Registro fotográfico	Cumple

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El cumplimiento de las medidas de mitigación propuestas garantizará la ejecución ambientalmente responsable del proyecto, minimizando los impactos negativos y promoviendo un entorno sostenible.
De acuerdo con la revisión al informe ambiental del mes informado, el contratista deberá tener en cuenta las observaciones y recomendaciones entregadas por la interventoría en el presente documento para poder realizar la trazabilidad correspondiente:

- Se recomienda involucrar a todos los actores del proyecto en la implementación de estas medidas
- Realizar capacitaciones sobre buenas prácticas ambientales.
- Se debe tener en cuenta las Notas realizadas sobre el cumplimiento de las actividades para el cumplimiento de las obligaciones dispuestas por Corpoamazonia en cada uno de los actos administrativos que se tienen para el contrato de obra.
- Se recomienda realizar un cronograma de actividades para el desarrollo de

todas las acciones de manejo para poder realizar un efectivo seguimiento y control de los componentes.

- Dentro de la documentación de procedencia de materiales se deben presentar los requisitos y documentos mínimos exigidos por la normatividad ambiental vigente, teniendo en cuenta el tipo de material comprado para el proyecto.
- Se recomienda al profesional ambiental de obra entregar documentación de legalidad de todos los servicios adquiridos para el desarrollo de la obra, dándole cumplimiento a la compra de madera, agua utilizada, mantenimiento de unidades sanitarias, entrega y disposición de residuos sólidos.

De esta manera la interventoría solicita de manera oportuna al contratista de obra se realice el envío de los requisitos legales de los proveedores de materiales, los permisos ambientales que haya lugar, así como la documentación que permita verificar la legalidad de los materiales de las empresas con las que los han contratado (madera, agua, disposición final de RCD, material de rio, triturado y/o concreto premezclado); y/o informar el estado en el que se encuentra el cumplimiento de esta obligación para tener conocimiento y poder realizar un correcto seguimiento y control a las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato de obra.

Javier Villota Rosero
TP:52238-431006
Profesional Ambiental de Interventoría
