CONSORCIO MEJORAMIENTO 15378
Nit. 901.763.954-3

C.M.15378 – 395

Bogotá D.C., 20 de mayo de 2025.

Radicado R:2025010249829
Fecha:2025/05/20 11:11:05 AM
Tpo:OFICIO
Responsable:BEATRIZ ELENA OSPINA MON

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Señores:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISI
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Attn.: LUCELLY PENAGOS
Profesional Social

Radicado # 344

REFERENCIA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. **LOTE 3**

CON 15378: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."

ASUNTO: INFORME MENSUAL SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 AL 30 DE ABRIL 2025.

2385111B1465

Cordial saludo,

Adjunto encontrará el Informe Social No. 8 correspondiente al periodo del 2 al 30 de abril de 2025 para su revisión y consideración. Quedamos a la espera de cualquier observación o comentario.

Agradecemos de antemano su tiempo y atención.

Anexos:
Informe mensual social número 8 correspondiente al periodo del 2 al 30 de abril.

Cordialmente,

Diana M. Ortega R.
DIANA MARCELA ÓRTEGA RENGIFO
Directora de Interventoría
CONSORCIO MEJORAMIENTO 15378

Elaboró: Paola Giraldo Mayo – Profesional Social

ARCHIVO SIF
2025 MAY 26 9:38:02

Carrera 80 bis N° 7ª – 15 T 5 oficina 801
Tel: (601)7914082 Cel.: 320-4713676
15378me@gmail.com
Bogotá DC, Colombia

Informe mensual
Gestión social # 8

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 3: ORIENTE. Cruces - Narices San Carlos, Cocorná - El Ramal

Contrato de Interventoría No: 23SS111B1465 de 2023

ENTIDAD CONTRATANTE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PERIODO:
2 al 30 DE ABRIL 2025

Elaborado por:
Paola Andrea Giraldo Mayo
Profesional del área social
Consorcio Mejoramiento 15378

Municipio Cocorná y San Carlos – Antioquia
ABRIL 2025

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 3: ORIENTE. Cruces - Narices San Carlos, Cocorná - El Ramal

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN
No: 4600016585 de 2023

CONSORCIO MEJORAMIENTO 15378
INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
No: 23SS111B1465 de 2023

Firma:	Firma:	Firma:
Paola Giraldo Mayo	Diana M. Ortega R.	Lucelly Penagos Valencia
PAOLA ANDREA GIRALDO MAYO Profesional Social Interventoría	DIANA MARCELA ORTEGA RENGIFO Directora de Interventoría	LUCELLY PENAGOS Apoyo Supervisión Social SIF
Elaboró	Aprobó	Recibe en la SIF

Contenido

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 7
4. ALCANCE 8
5. LOCALIZACIÓN 9
6. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 14
   - 6.1. Programa para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto 15
     - 6.1.1 Tramo Cocorná 15
     - 6.1.2 Tramo San Carlos 19
   - 6.2. Programa para la protección de la infraestructura social y comunitaria 23
     - 6.2.1 Tramo Cocorná 23
     - 6.2.2 Tramo San Carlos 24
   - 6.3. Programa para la Contratación de Mano de Obra. 24
     - 6.3.1 Tramo Cocorná 25
     - 6.3.2 Tramo San Carlos 26
   - 6.4. Programa de Comunicación y Divulgación. 28
     - 6.4.1 Tramo Cocorná 28
     - 6.4.2 Tramo San Carlos 30
   - 6.5. Programa para la atención a la comunidad e interesados en el Proyecto 32
     - 6.5.1 Tramo Cocorná 32
     - 6.5.2 Tramo San Carlos 33

6.6. Programa para la protección del patrimonio arqueológico y cultural 34

6.6.1 Tramo Cocorná 34

6.6.2 Tramo San Carlos 35

6.7. Programa para la sostenibilidad y apropiación comunitaria 36

6.7.1 Tramo Cocorná 36

6.7.2 Tramo San Carlos 37

6.8. Programa para la educación y capacitación al personal vinculado al proyecto 37

6.8.1 Tramo Cocorná 37

6.8.2 Tramo San Carlos 39

7. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 40

7.1.1 Tramo Cocorná 40

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 41

8.1.1 Tramo Cocorná 41

8.1.2 Tramo San Carlos 42

9. Listado de Anexos 44

10. Listado de tablas 44

1. INTRODUCCIÓN

El siguiente informe contiene el balance de la gestión social realizada en el mes de abril del año 2025, de los dos tramos que integran el proyecto Mejoramiento y mantenimiento de las vías del grupo 1 de circuitos estratégicos del departamento de Antioquia. Lote 3: Oriente. Cruces - Narices San Carlos, Cocorná - El Ramal.

Este documento pretende dar cuenta de las actividades del componente social a la luz del desarrollo de la Gestión social establecida por la Gobernación de Antioquia para proyectos de infraestructura y que se encuentra establecida en el anexo técnico como obligación del contratista de la siguiente manera: "El contratista de obra deberá formular un Plan de manejo de gestión social, este plan busca informar, atender y generar espacios de participación de la comunidad que se encuentra aledaña al área de influencia del proyecto, con el fin de resolver inquietudes, solicitudes generadas a partir de la ejecución de las obras que comprenden el proyecto, de acuerdo, a lo contenido en la Guía de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para Proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia, actividades que ya se cuentan contempladas en el presupuesto" (Gobernación de Antioquia, anexo técnico 2023).

En el presente informe se brinda información general del proyecto como contexto, el balance de ejecución de cada uno de los programas integrados en el Plan de Gestión Social, con descripciones de los avances y seguimiento a indicadores de gestión y finalmente las actividades de la Interventoría en el marco del seguimiento y acompañamiento correspondiente en los dos tramos incluidos; San Carlos y Cocorná.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Mediante la Resolución No. 2023060334616 del 06 octubre de 2023 la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia adjudicó el Contrato 4600016585 de 2023, de la Licitación Pública N° LIC-15372, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", Lote 3: Oriente al Consorcio Cocorná 15372, conformado por las empresas Ingetierras de Colombia S.A e IDC Pavimentos S.A.S, mediante el cual se otorgan los tramos:

- SAN CARLOS: Cruces -Narices (60AN20-1-1), Vía de tercer orden, Inicio: K18+840 (Latitud: 06" 15' 10.40" N Longitud: 074° 50' 13.82"W), Fin: K19-'-835 (Latitud: 06° 15' 09.95" N Longitud: 074° 50' 33.15" W) aproximadamente.

- COCORNÁ: Cocorná - El Ramal (Granada) (60AN17-1), Vía de segundo orden, Inicio: K01+205 (Latitud: 06° 03' 53.87" N Longitud: 075° 10' 47.41" W), Fin: K03+205 (Latitud: 06° 04' 17.30" N Longitud: 075° 10,12.67" W) aproximadamente.

El valor del contrato es: cinco mil doscientos cincuenta y tres millones setecientos treinta y tres mil seiscientos noventa y cuatro pesos ($5.253.733.694,00) y cuenta con un plazo de ejecución de 2 meses.

La interventoría del proyecto es llevada a cabo por el Consorcio Mejoramiento 15378, con número de contrato 23SS111B1465 de 2023 celebrado con la Gobernación de Antioquia.

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

De acuerdo a la Resolución 1917 de la Línea Base Red Vial Departamento de Antioquia, del junio 15 de 2018, existe una problemática constante de orden vial que requiere de soluciones óptimas y acciones inmediatas que permitan dar continuidad a la prestación del servicio de todos los usuarios de las vías en las diferentes subregiones en el Departamento.

Con el estado actual de deterioro de las vías, la movilidad entre las subregiones se reduce considerablemente, produciendo consecuencias negativas para los usuarios en todos los campos, económico, social, aumento en gastos de mantenimiento vehicular, tiempos de desplazamiento más largos, además de inseguridad e incomodidad para quienes transitan las vías.

Por lo anterior, con ánimo de mejorar la capa de rodadura y brindar mayor seguridad a las personas que transitan por el corredor vial denominado Cocorná - San Carlos y buscando mejorar un tramo que no presenta problemática geológica y que no requiere de una intervención especial en la vía, se propone un proyecto que beneficia a una población aproximada de 30.000 habitantes entre los municipios de Cocorná y San Carlos, permitiendo así una reducción de tiempos y costos en los desplazamientos, mejorando la economía de la Subregión.

4. ALCANCE

Cocorná

El tramo de mejoramiento Cocorná - El Ramal (60AN17- 1), obedece a una vía de segundo orden, el cual inicia en inicio en el K1+205 (Latitud: 06° 03' 53.87" N Longitud: 075° 10' 47.41"W), y finaliza en el K03+205 (Latitud:06°04 17.30" N Longitud: 075° 10,12.67" W) aproximadamente, así como sus aproximaciones y obras complementarias necesarias para el efectivo funcionamiento del tramo a intervenir. Dicho tramo tiene una longitud aproximada de 2 kilómetros.

San Carlos

El tramo de mejoramiento San Carlos: Cruces – Narices (60AN20-1-1), obedece a una vía de tercer orden, el cual inicia en K18+840 (Latitud: 06° 15' 10.40" N Longitud: 074° 50' 13.82" W), y finaliza en el K19+835 (Latitud: 06° 15' 09.95" N Longitud: 074° 50' 33.15" W) aproximadamente.

Dentro del presente informe de Gestión Social se contemplan actividades que permitirán prevenir, dar respuesta oportuna y/o atender los posibles impactos que se pudieran generar con la ejecución del proyecto y, promoverán la participación de los diversos grupos de interés del área de influencia, en sus diferentes momentos.

5. LOCALIZACIÓN

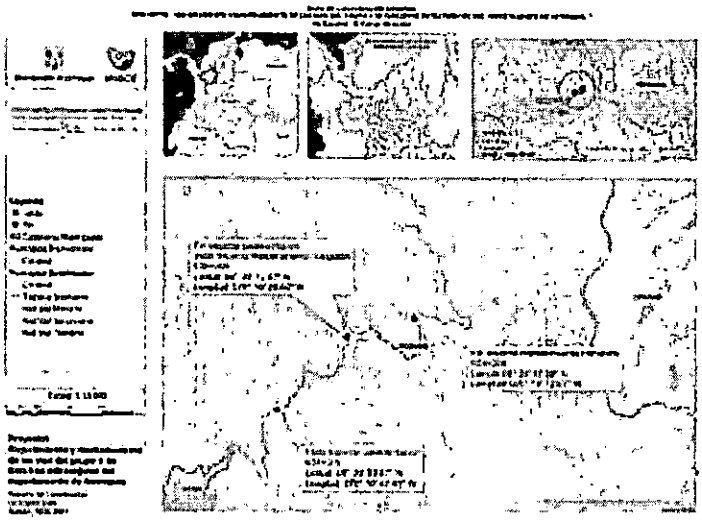


Figura 1.9 Localización de la vía – Cocorná - El Ramal (Granada), (60AN17-1)
Fuente: SIF – Departamento de Antioquia

COCORNÁ: Cocorná - El Ramal (Granada) (60AN17-1), Vía de segundo orden, Inicio: K01+205 (Latitud: 06° 03' 53.87" N Longitud: 075° 10' 47.41" W), Fin: K03+205 (Latitud: 06° 04' 17.30" N Longitud: 075° 10' 12.67" W) aproximadamente.

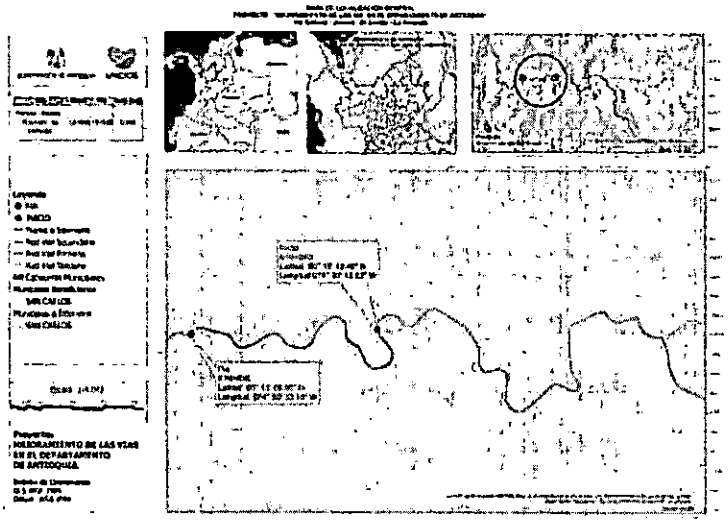


Figura 1.8. Localización de la vía – Cruces – Narices (60AN20-1-1)
Fuente: SIF – Departamento de Antioquia

SAN CARLOS: Cruces -Narices (60AN20-1-1), Vía de tercer orden, Inicio: K18+840 (Latitud: 06" 15' 10.40" N Longitud: 074° 50' 13.82"W), Fin: K19-'-835 (Latitud: 06° 15' 09.95" N Longitud: 074° 50' 33.15" W) aproximadamente.

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

Tabla 1 Información del Contrato de obra

ENTIDAD CONCEDENTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 3: ORIENTE
CONTRATISTA	CONSORCIO COCORNA 15372, NIT 901.762.294-6
CONTRATO Nº	4600016585 DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($5.253.733.694,00) y un A.I.U. de TREINTA DOS PUNTO CERO SEIS POR CIENTO (A.I.U: 32,06 %).
ADICIÓN 1	SEISCIENTOS DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($602.176.279)
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
PRORROGA 1	TREINTA (30) DÍAS, del 25/12/2023 al 24/01/2024
PRORROGA 2	Dos (2) meses del 24/01/2024 al 24/03/2024
PRORROGA 3	TREINTA Y DOS (32) DÍAS CALENDARIO DEL 22/05/2024. AL 23/06/2024
SUSPENSIÓN No 1	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO DIAS CONTADOS A PARTIR DEL 19 DE MARZO DE 2024, HASTA EL 7 DE ABRIL DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUIDAS
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN NO. 1	DIECISÉIS (16) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DEL 8 ABRIL HASTA EL 23 DE ABRIL, AMBAS FECHAS INCLUSIVE
AMPLIACIÓN NO. 2 SUSPENSIÓN NO. 1	OCHO DÍAS (08) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DEL 24 DE ABRIL, HASTA EL 1 DE MAYO DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE
AMPLIACIÓN NO. 3	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DEL 2 DE MAYO, HASTA EL 16 DE MAYO DE 2024, AMBAS FECHAS

SUSPENSIÓN NO. 1	INCLUSIVE
SUSPENSIÓN No 2	DOS (02) MESES A PARTIR DEL 21 DE JUNIO HASTA EL 21 DE AGOSTO DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN NO. 2	UN (01) MES A PARTIR DEL 22 DE AGOSTO, HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE
AMPLIACIÓN NO. 2 SUSPENSIÓN NO. 2	TREINTA (30) DÍAS A PARTIR DEL 23 DE SEPTIEMBRE, HASTA EL 22 DE OCTUBRE DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE
AMPLIACIÓN NO. 3 SUSPENSIÓN NO. 2	TREINTA Y TRES (33) DÍAS A PARTIR DEL 23 DE OCTUBRE, HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE
AMPLIACIÓN NO. 4 SUSPENSIÓN NO. 2	TREINTA Y SIETE (37) DIAS A PARTIR DEL 25 DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
AMPLIACIÓN NO. 5 SUSPENSIÓN NO. 2	DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
AMPLIACIÓN NO. 6 SUSPENSIÓN NO. 2	DEL 1 DE FEBRERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
AMPLIACIÓN NO. 7 SUSPENSIÓN NO. 2	DEL 1 DE MARZO DE 2025, HASTA EL 1 DE ABRIL DE 2025. AMBAS FECHAS INCLUSIVE
REANUDACIÓN 2	2 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	4 DE OCTUBRE DE 2025

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Tabla 2 Información contrato de interventoría.

OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 3.**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO MEJORAMIENTO 15378** NIT 901.763.954-3
CONTRATO Nº	**23SS111B1465 de 2023**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$445.039.517 IVA INCLUIDO.**
FECHA DE INICIO	**03/11/2023**
FECHA DE TERMINACIÓN	**25/12/2023**
PLAZO	**Dos (2.0) meses sin sobrepasar el 25/12/2023**
PLAZO PRORROGA 1	Treinta (30) días del 26/12/2023 al 24/01/2024
PLAZO PRORROGA 2	**Dos (2) meses del 25/01/2024 al 24/03/2024**
PLAZO PRORROGA 3	**Cuarenta y siete (47) días calendario del 22/05/2024 al 08/072024**
SUSPENSIÓN 1	**Del 19/03/2024 al 8/04/2024**
ADICIÓN 1 **SUSPENSIÓN 1**	**Del 8/04/2024 al 24/04/2024**
ADICIÓN 2 **SUSPENSIÓN 1**	**Del 24/04/2024 al 2/05/2024**
ADICIÓN 3 **SUSPENSIÓN 1**	**Del 2/05/2024 al 17/05/2024**
SUSPENSIÓN 2	**Del 21/06/2024 al 22/08/2024**
ADICIÓN 1 **SUSPENSIÓN 2**	**Del 22/08/2024 al 23/09/2024**

ADICIÓN 2 SUSPENSIÓN 2	**Del 23/09/2024 al 23/10/2024**
ADICIÓN 3 SUSPENSIÓN 2	**Del 23/10/2024 al 25/11/2024**
ADICIÓN 4 SUSPENSIÓN 2	**Del 25/11/2024 al 01/01/2025**
ADICIÓN 5 SUSPENSIÓN 2	**Del 01/01/2025 al 01/02/2025**
ADICIÓN 6 SUSPENSIÓN 2	**Del 01/02/2025 al 01/03/2025**
ADICIÓN 7 SUSPENSIÓN 2	**Del 01/03/2025 al 02/04/2025**
FECHA DE TERMINACIÓN	**1/11/2025**

6. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

El plan de gestión social desglosa las actividades que realiza el contratista en cumplimiento de su propósito que es mitigar el impacto causado por el proyecto y acercar a la comunidad de manera participativa, por tanto, el presente informe debería recopilar el avance en la aplicación del mismo, no obstante, el contenido lo que deja en evidencia es que para el periodo reportado, entre el 2 y el 30 de abril del 2025, pese a que el contrato está corriendo, el contratista no inicio labores de obra, así mismo, el plan de gestión social tampoco fue aplicado en el territorio.

En este orden de ideas, en este documento se deja trazabilidad del estado actual de cada uno de los programas, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido del acta de suspensión N° 2 a la cual se le hicieron siete adiciones que comprenden el periodo de tiempo entre el 21 de junio del 2024 hasta el 2 de abril de 2025.

Por parte de la interventoría se remitió oficio CM15378 con asunto "REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL", donde se solicita al

contratista la vinculación del profesional encargado del área y la implementación de las actividades correspondientes para el cumplimiento del Plan de Gestión Social aprobado en el inicio del proyecto.

6.1. Programa para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto

6.1.1 Tramo Cocorná

A continuación se desarrolla el estado actual de las actas de vecindad, entorno y permisos de intervención de predio en cumplimiento del programa correspondiente en el Plan de Gestión Social el cual pretende "implementar medidas de manejo que permitan reconocer el entorno en el cual se desarrolla el proyecto, a través de actividades con las que se pueda identificar el estado actual del área de influencia de la obra, y en caso de generar algún daño, iniciar con el proceso de reparación directa":

- Actas de vecindad:

El número total de predios identificados como línea base para el levantamiento de actas de vecindad es de 48 inmuebles. De estos, 39 corresponden al tramo de mejoramiento y 9, al tramo de mantenimiento. El levantamiento de estas actas contribuirá a prevenir, mitigar y facilitar la atención en caso de posibles reclamaciones que se pudieran generar por las actividades de obra. En su elaboración se diligenció el formato FO-M2-P2-035 y se levantó el respectivo registro fotográfico de cada predio.

A la fecha, continúa pendiente la firma de las actas de vecindad N° 4 (tramo de mejoramiento) y N° 40 (tramo de mantenimiento); después de agotados los acercamientos con las propietarias, el contratista deberá realizar la gestión necesaria para que un líder de la zona firme como testigo, además, avanzar en el cierre de las

actas donde se libere por parte del área civil.

- Actas de Entorno:

Entre los meses de noviembre de 2023 y enero de 2024 fueron levantadas 7 actas de entorno de diferentes tramos de la vía y del ZODME ubicado en el predio El Recreo.

Tabla 3. Actas de entorno levantadas y entregadas Cocorná

Actas de entorno levantadas y entregadas				
N°	**N° de acta de entorno**	**Nov 2023**	**Dic 2023**	**Ene 2024**
1	Acta de entorno n° 1	X		
2	Acta de entorno n° 2	X		
3	Acta de entorno n° 3		X	
4	Acta de entorno n° 4	X		
5	Acta de entorno n° 5		X	
6	Acta de entorno n° 6			X
7	Acta de entorno n° 7			X

- Actas permisos intervención en predios privados:

A lo largo de la ejecución del proyecto se han elaborado 24 actas de "Autorización para intervenir predios privados", esto mediante aplicación del formato requerido FO-M2-P2-039 de la Gobernación de Antioquia.

Por otra parte, aún está pendiente, contactar a los 2 propietarios incluidos dentro de los permisos de intervención elaborados previamente por parte de la Gobernación de Antioquia y, además el contratista debe iniciar con el cierre de los permisos que ya se encuentren liberados por el área técnica.

Tabla 4.Indicadores de gestión programa para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto Tramo Cocorná

Indicador	%	Observaciones
Una base de datos de actas de vecindad construida.	1 1	Se elaboró la base de datos de actas de vecindad, esta se ha ido actualizando de manera permanente, a medida que ha ido avanzando el proceso.
Porcentaje cumplimiento	**100%**	
No. Actas de vecindad de inicio diligenciadas/ No. inmuebles en base de datos identificados por el área técnica en zona de influencia directa x 100	48 48	La línea base para el levantamiento de actas de vecindad es de 48 predios (39 del tramo de mejoramiento y 9 del tramo de mantenimiento). De estos, 46 han sido entregadas y firmadas por la Interventoría; las otras 2, se encuentran pendiente de firma por parte de los propietarios.
Porcentaje cumplimiento	**100%**	
No. Actas de entorno de levantadas / No. Actas de entorno de inicio x 100	7 7	Se levantaron 7 actas de entorno de la vía; 6 de ellas corresponden a partes de los tramos de mejoramiento y mantenimiento y 1, al ZODME ubicado en el predio El Recreo.

Porcentaje cumplimiento	**100%**	
No. actas de permiso de intervención a predios privados levantados y firmados / No. actas de permiso necesarias en el proceso constructivo del proyecto x 100	24 26	A la fecha se han levantado 23 permisos de intervención, 23 de ellos fueron firmados por sus propietarios, 3 de estos fueron incluidos en el recorrido de verificación realizado con la JAC de la vereda San Juan, el 21/02/2024. Se encuentra pendiente, contactar a los 2 propietarios incluidos dentro de los permisos de intervención elaborados previamente por parte de la Gobernación de Antioquia.
Porcentaje de cumplimiento	**85%**	
No. de actas de vecindad cerradas/ No. de actas de vecindad totales que requieren cierre x 100.	0 0	Se inició con el levantamiento de actas de vecindad de cierre
Porcentaje cumplimiento	**N/A**	
No. Actas de entorno cierre / Número de actas de entorno totales que requieren cierre x 100.	0 0	Este indicador se medirá en la etapa de cierre del proyecto.
Porcentaje cumplimiento	**N/A**	
No. de actas de permisos de intervención de predios privados cierre / No. De actas de permisos de	0 0	Este indicador se medirá en la etapa de cierre del proyecto.

intervención de predios privados totales que requieren cierre x 100.		
Porcentaje cumplimiento	**N/A**	

Anexo 1. Base de datos actas de vecindad, actas de entorno y permisos de intervención.

6.1.2 Tramo San Carlos

Para este tramo el contratista ha desarrollado las actividades necesarias para la correcta aplicación del plan de gestión social, tal como se relaciona a continuación.

- Actas de vecindad

A la feche se cuenta con el levantamiento de las actas de vecindad de cierre, se realizó la visita a las 10 viviendas y se obtuvo el cierre de la totalidad de las actas de vecindad. De estas 10, 9 ya están firmadas por la Interventoría.

Se obtuvo el cierre a conformidad de los siguientes propietarios:

Tabla 5. Relación actas de vecindad de cierre Tramo San Carlos

Relación actas de vecindad Tramo San Carlos

N° Acta	Nombre propietario	Fecha de cierre
Acta N°1	Gloria Irene Herrera Daza	
Acta N°2	Leonardo de Jesús Rojas Jiménez	
Acta N°3	Luz Arely Arboleda Zuleta	
Acta N°4	Juan de Jesús Díaz Buitrago	
Acta N°5	Juan de Jesús Jaramillo	
Acta N°6	Sonia Carolina Giraldo Giraldo	
Acta N°7	Rosiris del Carmen Mercado Doria	
Acta N°8	Jesús María Castaño M	
Acta N°9	Javier Arturo Higuita	
Acta N°10	Omar Antonio Urrea Morales	

Desde la Interventoría se realizó el debido acompañamiento al proceso de levantamiento de actas de vecindad para verificar el correcto desarrollo de la actividad y se encuentra pendiente la firma del acta N° 3 por parte de la interventoría, se espera aportarla en el siguiente periodo.

- Actas de Entorno

A la fecha del presente informe no se encuentra pendiente la elaboración de ningún acta de entorno, puesto que se proyectó 1 al inicio del proyecto y ya se encuentra realizada desde el mes de diciembre de 2023, dando por cumplido el 100%de este indicador, sin embargo, está pendiente validar desde el área técnica si está liberado para realizar el cierre de la misma.

Tabla 6. Actas de entorno levantadas y entregadas en dic-2023 tramo san Carlos – Cruces – Narices

Actas de entorno levantadas y entregadas en dic -2023			
N°	**N° de acta de entorno**	**Nov**	**Dic**
1	Acta de entorno n° 1	0	X

- Actas permisos intervención en predios privados

Durante la ejecución del proyecto para el frente San Carlos, se levantó un permiso de intervención en predios privados, el cual a la fecha del presente informe se encuentra abierto, para este caso es necesario que el contratista valide desde el área técnica y aplique el respectivo cierre.

Tabla 7. Indicadores de gestión Programa para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto tramo San Carlos – Cruces – Narices

Indicador	%	Observaciones
Una base de datos de actas de vecindad construida.	1 1	En el mes de enero se elaboró y relaciono la base de datos con la información del total de las actas de vecindad de apertura, en el presente periodo se reporta la base actualizada con las actas de cierre.
Porcentaje cumplimiento	100%	
No. Actas de vecindad de inicio diligenciadas/ No. inmuebles en base de datos identificados por el área técnica en zona de influencia directa x 100	10 10	En este periodo no se debían realizar actas de vecindad.
Porcentaje cumplimiento	100%	
	1	

Indicador	%	Observaciones
No. Actas de entorno de levantadas / No. Actas de entorno de inicio x 100	1	No correspondía la realización de actas de entorno en el mes de junio.
Porcentaje cumplimiento	100%	
No. actas de permiso de intervención a predios privados / No. actas de permiso necesarias en el proceso constructivo del proyecto x 100	1 1	Durante el mes de junio no se realizaron permisos de intervención de predios ni acercamientos con propietarios.
Porcentaje cumplimiento	100%	
No. de actas de vecindad cerradas/ No. de actas de vecindad totales que requieren cierre x 100.	9 10	Se realizó el cierre a satisfacción de 9 actas de vecindad, faltando una por firma de la Interventoría.
Porcentaje cumplimiento	N/A	
No. Actas de entorno cierre / Número de actas de entorno totales que requieren cierre x 100.	N/A N/A	Se realizará el cierre del acta de entorno cuando la obra esté finalizada.
Porcentaje cumplimiento	N/A	
No. de actas de permisos de intervención de predios privados cierre / No. De actas de permisos de intervención de predios privados totales que requieren cierre x 100.	N/A N/A	Se inició con la gestión para el cierre del permiso de intervención
Porcentaje cumplimiento	N/A	

Anexo 1. Base de datos actas de vecindad

6.2. Programa para la protección de la infraestructura social y comunitaria

6.2.1 Tramo Cocorná

Durante el periodo del presente informe el contratista no realizó actividades para el cumplimiento de los objetivos de este programa, no obstante, en el marco de desarrollo de este programa se realizó la reunión de inicio el 15 de noviembre de 2023 y en el informe del mismo periodo fue reportado.

Tabla 8: Indicadores de gestión para la Protección de la Infraestructura Social y Comunitaria tramo Cocorná

Indicador	%	Observaciones
No. de reuniones de inicio ejecutadas /No. de reuniones de inicio programadas x 100	1 1	El día 15/11/2023 se llevó a cabo la reunión de socialización de inicio de obra. Esta información fue reportada en el mes de noviembre.
Porcentaje cumplimiento	**100%**	
No. de reuniones de finalización ejecutadas / No. de reuniones de finalización programadas x 100	0 0	Este indicador se medirá en la etapa de cierre del proyecto.
Porcentaje cumplimiento	**N/A**	

6.2.2 Tramo San Carlos

La Reunión de Inicio de obra se realizó el día 29/11/2023 para el tramo Cruces – Narices (San Carlos) en la sede de la Junta de Acción Comunal del corregimiento El Jordán perteneciente al municipio de San Carlos. En ella se contó con la asistencia de 26 personas de la comunidad, además del personal de la Interventoría y el contratista de obra.

La Reunión de Finalización de obra se tenía proyectada para el mes de junio de 2024, sin embargo, por la suspensión no se llevó a cabo. Teniendo en cuenta que, pese a la reactivación del contrato, el contratista no desarrollo actividades, debe el siguiente periodo asegurar el cumplimiento de esta actividad.

Tabla 9. Indicadores de gestión programa para la Protección de la Infraestructura Social y comunitario tramo – San Carlos – Cruces – Narices

Indicador	%	Observaciones
No. de reuniones de inicio ejecutadas /No. de reuniones de inicio programadas x 100	1 1	El día 29/11/2023 se llevó a cabo la reunión de socialización de inicio de obra.
Porcentaje cumplimiento	100%	
No. de reuniones de finalización ejecutadas / No. de reuniones de finalización programadas x 100	 0	Este indicador se medirá en la etapa de cierre del proyecto.
Porcentaje cumplimiento	N/A	

Anexo 3. Presentación reunión socialización de cierre

6.3. Programa para la Contratación de Mano de Obra.

6.3.1 Tramo Cocorná

1.2.1 Actividades para promover la contratación de mano de obra

Este programa busca establecer mecanismos claros que permitirán beneficiar a la comunidad del área de intervención directa con la contratación de mano de obra requerida para el proyecto, contribuyendo al desarrollo social y económico de la misma.

Durante el periodo del informe actual, el contratista no ejecuto ninguna actividad correspondiente al Plan de Gestión Social, además, respecto a la vinculación del personal para el periodo no se reporta personal vinculado por parte del contratista.

La dificultad presentada durante el periodo, es que, pese al reinicio del contrato, el contratista no ha iniciado con la contratación del personal para dar continuidad al proyecto.

Tabla 10. Personal vinculado al Proyecto tramo Cocorná

ÍTEM	PERSONAL MOC		PERSONAL MONC	
Procedencia	AID	FORÁNEO	AID	FORÁNEO
Total	0	0	0	0
	0		0	

En este programa, no se han presentado dificultades.

Tabla 11. Indicadores de gestión para la contratación mano de obra – Tramo – Cocorná

Indicador	%	Observaciones

No. trabajadores de MONC del AID contratado / No. total de trabajadores vinculados al proyecto x 100.	N/A N/A	
Porcentaje cumplimiento	N/A	
No. de trabajadores del proyecto residentes en el área de influencia / No. total, de empleados del proyecto x 100.	N/A N/A	
Porcentaje cumplimiento	N/A	
No. de Mujeres contratadas del AID / No. total de trabajadores contratados x 100.	N/A N/A	
Porcentaje cumplimiento	N/A	

6.3.2 Tramo San Carlos

Este programa busca establecer mecanismos claros que permitirán beneficiar a la comunidad del área de intervención directa con la contratación de mano de obra requerida para el proyecto, contribuyendo al desarrollo social y económico de la misma.

Durante el periodo del informe al igual que en el otro tramo, el contratista no ejecuto ninguna actividad correspondiente al Plan de Gestión Social, además, respecto a la vinculación del personal para el periodo no se reporta personal vinculado por parte del contratista.

La dificultad evidenciada durante el periodo, es que, pese al reinicio del contrato, el contratista no ha iniciado con la contratación del personal para dar continuidad al proyecto.

Tabla 12. Personal vinculado al Proyecto tramo San Carlos – Cruces – Narices

ITEM	PERSONAL MOC		PERSONAL MONC	
Procedencia	AID	FORÁNEO	AID	FORÁNEO
Total	0	0	0	0
Total personal vinculado al proyecto:			0	

Tabla 13. Indicadores de Gestión para la Contratación de Mano de Obra tramo San Carlos – Cruces – Narices

Indicador	%	Observaciones
No. trabajadores de MONC del AID contratado / No. total de trabajadores vinculados al proyecto x 100.	N/A N/A	
Porcentaje cumplimiento	N/A	
No. de trabajadores del proyecto residentes en el área de influencia / No. total de empleados del proyecto x 100.	N/A N/A	
Porcentaje cumplimiento	N/A	
	N/A	

Indicador	%	Observaciones
No. de Mujeres contratadas del AID / No. total, de trabajadores contratados x 100.	N/A	
Porcentaje cumplimiento	N/A	

6.4. Programa de Comunicación y Divulgación.

6.4.1 Tramo Cocorná

Este programa busca "informar de manera oportuna y veraz a la comunidad del AID, sobre temas relacionados con el proyecto, a través de los mecanismos establecidos para tal fin"

1.2.2 Actividades desarrolladas en el período:

Durante el periodo del presente informe el contratista no desarrollo ninguna actividad tendiente al cumplimiento de los objetivos de este programa, ni la entrega de piezas como volantes, uso de los canales de información para la comunidad como lo son línea telefónica, WhatsApp, cartelera informativa, punto de atención a la comunidad y buzón de sugerencias.

Está pendiente la vinculación del profesional encargado del área para asegurar el

correcto desarrollo del Plan de Gestión Social, lo cual fue requerido por la interventoría mediante oficio CM15378-386 "REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL", el 28 de abril del 2025.

Tabla 14. Indicadores de Gestión programa de Comunicación y Divulgación Tramo Cocorná

Indicador	%	Observaciones
No. vallas informativas instaladas / No. de vallas programadas x 100.	1 1	La valla se instaló al inicio del proyecto, sin embargo, actualmente no se encuentra
Porcentaje cumplimiento	**100%**	
No. de tijeras de obra instaladas / No. de tijeras de obra totales programadas x 100.	0 2	Se encuentra pendiente la instalación de las tijeras de obra. Sin embargo, este material será incluido en el PMT del proyecto.
Porcentaje cumplimiento	**N/A**	
No. de pasacalles instalados / No. de pasacalles totales programadas x 100.	0 2	Se encuentra pendiente la instalación de las tijeras de obra. Sin embargo, este material será incluido en el PMT del proyecto.
Porcentaje cumplimiento	**N/A**	
No. de volantes distribuidos / No. de volantes programados x 100	0 100	No se elaboraron volantes durante el periodo
Porcentaje cumplimiento	0,0%	
No. de pautas radiales implementadas / No. de pautas programadas x 100.	0 20	Para el período no se contrataron pautas radiales.

Porcentaje cumplimiento	0,0%	
No. de carteleras implementadas / No. de carteleras programadas x 100.	0 1	Durante el periodo no se instaló la cartelera informativa
Porcentaje cumplimiento	0,0%	
No. de buzones de sugerencias instalados / No. de buzones de sugerencias programados x 100.	0 2	Durante el periodo no se instalaron los buzones
Porcentaje cumplimiento	0,0%	

6.4.2 Tramo San Carlos

Durante el periodo del presente informe el contratista no desarrollo ninguna actividad tendiente al cumplimiento de los objetivos de este programa, ni la entrega de piezas como volantes, uso de los canales de información para la comunidad como lo son línea telefónica, WhatsApp, cartelera informativa, punto de atención a la comunidad y buzón de sugerencias.

Está pendiente la vinculación del profesional encargado del área para asegurar el correcto desarrollo del Plan de Gestión Social, lo cual fue requerido por la interventoría mediante oficio CM15378-386 "REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL", el 28 de abril del 2025.

Tabla 15. Indicadores de Gestión Programa de Comunicación y Divulgación Tramo San Carlos – Cruces – Narices

Indicador	%	Observaciones
No. vallas informativas instaladas / No. de vallas programadas x 100.	1 1	Se instaló una valla con información del proyecto.
Porcentaje cumplimiento	100%	
No. de tijeras de obra instaladas / No. de tijeras de obra totales programadas x 100.	0 2	Se encuentra pendiente la instalación de las mismas.
Porcentaje cumplimiento	N/A	
No. de pasacalles instalados / No. de pasacalles totales programadas x 100.	0 2	Se encuentra pendiente la instalación de las mismas, las cuales se tenían proyectadas por el PMT, sin embargo no quedaron dentro del presupuesto del mismo.
Porcentaje cumplimiento	N/A	
No. de volantes distribuidos / No. de volantes programados x 100	0 0	En este periodo no se necesitaron volantes
Porcentaje cumplimiento	N/A	
No. de pautas radiales implementadas / No. de pautas programadas x 100.	0 0	En este periodo no se tuvo la necesidad de implementar pautas radiales.
Porcentaje cumplimiento	N/A	
	0	

Indicador	%	Observaciones
No. de carteleras implementadas / No. de carteleras programadas x 100.	1	La cartelera informativa no se encuentra instalada en el Punto de atención a la Comunidad
Porcentaje cumplimiento	0,0	
No. de buzones de sugerencias instalados / No. de buzones de sugerencias programados x 100.	0 2	Los buzones de sugerencias no se encuentran instalados
Porcentaje cumplimiento	0,0	

6.5. Programa para la atención a la comunidad e interesados en el Proyecto

6.5.1 Tramo Cocorná

Para este periodo el contratista no realizó ninguna de las actividades contempladas en el Plan de Gestión Social para la atención de la comunidad, no se tuvo atención a la comunidad ni se disponen los elementos para la participación comunitaria; se espera que el contratista atienda al llamado realizado por la interventoría mediante el oficio CM15378-386 "REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL", el 28 de abril del 2025; donde se detalla la importancia de la aplicación del PGS.

Particularmente de este programa tiene pendiente culminar la aplicación de la consulta de opinión en la comunidad y el comercio pendiente desde el mes de junio de 2024 debido a la suspensión del proyecto, para tabular la información y tabular las respuestas.

Tabla 16. Indicadores de Gestión Programa para la atención a la comunidad e interesados en el proyecto Tramo Cocorná

Indicador	%	Observaciones
No. total de PQRS atendidas en el período / No. total de PQRS recibidas en el período x 100	0 0	En el periodo no se recibieron PQRS
Porcentaje cumplimiento	**N/A**	
No. de encuestas proyectadas / No. de personas encuestadas x 100	0 0	Durante el periodo no se aplicaron encuestas, se tiene pendiente aplicar 15 encuestas más.
Porcentaje cumplimiento	**N/A**	

6.5.2 Tramo San Carlos

Para este periodo el contratista no realizó ninguna de las actividades contempladas en el Plan de Gestión Social para la atención de la comunidad, no se tuvo atención a la comunidad ni se disponen los elementos para la participación comunitaria; se espera que el contratista atienda al llamado realizado por la interventoría mediante el oficio CM15378-386 "REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL", el 28 de abril del 2025; donde se detalla la importancia de la aplicación del PGS.

Tabla 17. Indicadores de Gestión Programa para la Atención a la Comunidad e Interesados en el proyecto tramo San Carlos – Cruces – Narices

Indicador	%	Observaciones
1 Punto de Atención al Ciudadano Instalado / 1 Punto de Atención al Ciudadano requerido durante el desarrollo de las obras.	1 0 0,0	El PAC no estuvo activo durante el periodo
No. total de PQRS atendidas en el período / No. total de PQRS recibidas en el período x 100	0 0	Durante el período no se recibieron PQRS relacionadas con el proyecto.
Porcentaje cumplimiento	100%	
No. de encuestas proyectadas / No. de personas encuestadas x 100	20 20	Antes de la suspensión se llevó a cabo la implementación de las encuestas de satisfacción, se está a la espera de la tabulación de las mismas.
Porcentaje cumplimiento	100%	

6.6. Programa para la protección del patrimonio arqueológico y cultural

6.6.1 Tramo Cocorná

Este programa busca "contribuir al manejo adecuado tendiente a la protección del patrimonio arqueológico, en caso de encontrar un hallazgo fortuito". En el período, no se presentaron hallazgos arqueológicos debido a que no se desarrollaron actividades de obra.

Tabla 18. Indicadores de Gestión Programa para la Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural tramo Cocorná

Indicador	%	Observaciones
No. de trabajadores asistentes a la capacitación / No. total, de trabajadores vinculados al proyecto x 100	0	El 29/01/2024 se realizó una capacitación con el personal sobre "Arqueología Preventiva y Patrimonio Arqueológico", a esta asistieron 29 personas vinculadas al proyecto. La información correspondiente a la misma fue presentada en el informe correspondiente al mes de enero del presente año. A la fecha no se han presentado hallazgos de bienes de interés arqueológicos ni culturales en el proyecto. En las inducciones realizadas a los trabajadores que ingresan a laborar en el período, se manifiesta la importancia de seguir el protocolo en caso de un hallazgo fortuito en el proyecto.
	0	
Porcentaje cumplimiento	**N/A**	

6.6.2 Tramo San Carlos

Para este periodo el contratista no reporta actividades ejecutadas con relación a este programa, sin embargo, cabe mencionar que en la capacitación al personal se hizo nuevamente énfasis en el procedimiento a seguir en caso de presentarse un hallazgo arqueológico en el desarrollo de las labores en las instalaciones de obra.

Desde la interventoría se constata que hasta la fecha no se han registrado hallazgos arqueológicos en el punto de intervención.

Tabla 19. Indicadores de Gestión Programa para la Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural tramo San Carlos – Cruces - Narices

Indicador	%	Observaciones
No. de trabajadores asistentes a la capacitación / No. total, de trabajadores vinculados al proyecto x 100	0 0	A la fecha, no se han presentado hallazgos de bienes de interés arqueológicos ni culturales en el proyecto. Se realizó en el mes de febrero una capacitación a la cual asistieron 35 trabajadores. En el presente mes no se llevó a cabo capacitación.
Porcentaje cumplimiento	N/A	

6.7. Programa para la sostenibilidad y apropiación comunitaria

6.7.1 Tramo Cocorná

Este programa está encaminado a "crear un espacio de participación comunitaria, en el cual se brindará información de los avances de las actividades de obra y a su vez serán abordados los cambios generados en la dinámica del territorio y las proyecciones futuras con la operación del proyecto, con el fin de que los integrantes del comité aporten en la construcción de alternativas para atender las problemáticas identificadas y finalmente se conviertan en multiplicadores de la información".

En el presente periodo no se reportan actividades, debido a que el contratista no inicio con las labores de obra.

Tabla 20. Indicadores de gestión Programa para la Sostenibilidad y Aprobación Comunitaria tramo Cocorná

Indicador	%	Observaciones

No. reuniones ejecutadas con el CPC / No. reuniones contempladas con el CPC x 100	5	Las 5 reuniones con el CPC han sido efectuadas los días 07/12/2023, 18/01/2024, 15/02/2024, 14/03/2024 y 28/05/2024. A estas asistieron 10, 25, 32, 20 y 12 personas, respectivamente.
Porcentaje cumplimiento	**100%**	

6.7.2 Tramo San Carlos

Durante el periodo de abril de 2025, el contratista no realizo ninguna actividad correspondiente al PGS, se está a la espera de que atienda los requerimientos realizados por la interventoría para iniciar con toda la aplicación de los programas y actividades requeridos.

Tabla 21. Indicadores de gestión Programa para la Sostenibilidad y Aprobación Comunitaria tramo San Carlos – Cruces – Narices

Indicador	%	Observaciones
No. reuniones ejecutadas con el CPC / No. reuniones contempladas con el CPC x 100	3 / 3	En el presente periodo no se realizó reunión con el CPC.
Porcentaje cumplimiento	100%	

6.8. Programa para la educación y capacitación al personal vinculado al proyecto

6.8.1 Tramo Cocorná

Este programa tiene como fin "entrenar al personal que labora en el proyecto, en aspectos relacionados con las medidas de manejo social que se deben implementar en el mismo, con el fin de que establezcan relaciones armónicas con las comunidades del área de influencia".

Durante el periodo el contratista no realizo actividades que aporten al cumplimiento del objetivo del programa

El día 24/04/2025 se llevó a cabo comité de seguimiento donde participó el contratista, la Interventoría y la supervisión de la SIF; en el cual se realizaron los requerimientos al contratista desde las diferentes áreas para el inicio de la obra en cumplimiento de los requisitos contractuales, además se realizan sugerencias para la realización de las actividades desde cada componente; puntualmente de la gestión social se le solicita al contratista el ingreso del profesional encargado lo más pronto posible para iniciar con la activación del PGS.

Tabla 22. Indicadores de Gestión Programa para la Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto tramo Cocorná

Indicador	%	Observaciones
No. de capacitaciones desarrolladas / No. de capacitaciones programadas x 100	0 0	No se desarrolló capacitación mensual
Porcentaje cumplimiento	**0,0%**	
No. de trabajadores asistentes a las capacitaciones / No. de trabajadores convocados x 100	0 0	No se desarrolló la actividad

Porcentaje cumplimiento	**N/A**	

6.8.2 Tramo San Carlos

En aras a cumplir el objetivo que es "entrenar al personal que labora en el proyecto, en aspectos relacionados con las medidas de manejo social que se deben implementar en el mismo, con el fin de que establezcan relaciones armónicas con las comunidades del área de influencia" se desarrollan las capacitaciones al personal de obra.

Durante el periodo reportado el contratista no vinculo personal, por tanto, no dio cumplimiento a esta actividad contemplada en el plan de gestión social.

Tabla 23. Indicadores de Gestión Programa para la Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto tramo San Carlos – Cruces – Narices


Indicador	%	Observaciones
No. de capacitaciones desarrolladas / No. de capacitaciones programadas x 100	0 0	Durante el periodo no se desarrolló la actividad
Porcentaje cumplimiento	0,0%	
No. de trabajadores asistentes a las capacitaciones / No. de trabajadores convocados x 100	0 0	Durante el periodo no se desarrolló la actividad
Porcentaje cumplimiento	0.0%	

7. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

Actividades de gestión, seguimiento y control del área social de la interventoría

7.1.1 Tramo Cocorná

Desde el área social de la Interventoría en el proyecto en general durante el mes de abril del 2025, se desarrollo una revisión documental del avance del proyecto y aspectos pendientes por atender por parte del contratista, sin embargo, debido a que no se dio la vinculación del profesional social se envío oficio para solicitar la atención de los lineamientos contractuales, comunicación CM15378-386 con asunto "REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL".
Además, se relaciona a continuación el registro fotográfico que evidencia el punto de atención a la comunidad sin implementación, así como los elementos de información y participación comunitaria.

Punto de atención a la comunidad	Verificación cartelera informativa
	

Anexo 1. Oficio CM15378-386 "REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL".

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1.1 Tramo Cocorná

En general se recomienda que el contratista inicie con la implementación de los programas contenidos en el plan de gestión social y continúe con el cumplimiento de los indicadores

Programa para la Protección de la Infraestructura Social y Comunitaria

- Se debe continuar con el proceso de levantamiento de actas de vecindad de cierre.

Programa para la Contratación de Mano de Obra

- El contratista debe retomar las estrategias que venía planteando para la vinculación de personal de la zona.

Programa de Comunicación y Divulgación

- Se debe mantener el trabajo interdisciplinario de tal manera que se socialicen de manera asertiva los cierres y demás actividades de obra que gèneren impacto a la comunidad.

Programa para la Atención a la Comunidad e Interesados en el Proyecto

- El contratista debe continuar con la aplicación de las encuestas de satisfacción, aún tiene algunas pendientes.

Programa para la Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural

- Se recomienda continuar con las capacitaciones y/o inducciones sobre patrimonio arqueológico y los procesos en caso de posibles hallazgos.

Programa para la Sostenibilidad y Apropiación Comunitaria

- Se recomienda al contratista reprogramar la reunión del CPC lo más pronto posible

Programa para la Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto

- Se recomienda continuar con las capacitaciones al personal hasta finalizar el proyecto.

8.1.2 Tramo San Carlos

Programa para el Reconocimiento del Entorno en el Cual se Desarrollará el Proyecto

- Se recomienda iniciar con los cierres de los permisos de intervención y las actas de entorno.

Programa para la Protección de la Infraestructura Social y Comunitaria

- Se debe tener en cuenta que la interventoría remitió la presentación de la socialización de cierre, que debe ser llevada a cabo una vez se cumplan los requisitos previos.

Programa para la Contratación de Mano de Obra

- Continuar con la implementación de todos los canales establecidos para la divulgación de vacantes y dejar evidencia con el fin de garantizar la oportunidad a la comunidad interesada y cumplir con el objetivo del programa.

Programa de Comunicación y Divulgación

- Se recomienda continuar con la atención a la comunidad haciendo uso de los canales de comunicación activos previamente.

Programa para la Atención a la Comunidad e Interesados en el Proyecto

- Retomar el funcionamiento del PAC acorde a las necesidades de la obra y de la comunidad frente al proyecto y divulgar constantemente los canales de comunicación para que la comunidad los conozca y los utilice.

- Enviar la tabulación y análisis de las encuestas de satisfacción que fueron aplicadas en el mes de mayo de 2024.

Programa para la Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural

- Continuar mencionando en las capacitaciones con el personal de obra, la importancia de la protección al patrimonio y el protocolo a seguir en caso de hallazgos arqueológicos.

Programa para la Sostenibilidad y Apropiación Comunitaria

- Se debe tener en cuenta la implementación del último encuentro con el Comité de Participación Comunitaria, para encuentros posteriores, ya que fue llevado a cabo de manera exitosa.

Programa para la Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto

- Continuar haciendo mención sobre la protección del patrimonio y exponer el protocolo en caso de hallazgo, así mismo recopilar evidencias fotográficas del desarrollo de la actividad en todas sus etapas.

9. Listado de Anexos

9.1. Oficio CM15378-386 "REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL".

10. Listado de tablas

Tabla 1. Actas de entorno levantadas y entregadas Cocorná 16
Tabla 2.Indicadores de gestión programa para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto Tramo Cocorná 17
Tabla 3. Relación actas de vecindad de cierre Tramo San Carlos 19
Tabla 4. Actas de entorno levantadas y entregadas en dic-2023 tramo san Carlos – Cruces – Narices 20
Tabla 5. Indicadores de gestión Programa para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto tramo San Carlos – Cruces – Narices 21
Tabla 6. Indicadores de gestión para la Protección de la Infraestructura Social y Comunitaria tramo Cocorná 23
Tabla 7. Indicadores de gestión programa para la Protección de la Infraestructura Social y comunitario tramo – San Carlos – Cruces – Narices 24
Tabla 8. Personal vinculado al Proyecto tramo Cocorná 25
Tabla 9. Indicadores de gestión para la contratación mano de obra – Tramo – Cocorná 25

Tabla 10. Personal vinculado al Proyecto tramo San Carlos – Cruces – Narices 27
Tabla 11. Indicadores de Gestión para la Contratación de Mano de Obra tramo San Carlos – Cruces – Narices 27
Tabla 12. Indicadores de Gestión programa de Comunicación y Divulgación Tramo Cocorná 29
Tabla 13. Indicadores de Gestión Programa de Comunicación y Divulgación Tramo San Carlos – Cruces – Narices 30
Tabla 14. Indicadores de Gestión Programa para la atención a la comunidad e interesados en el proyecto Tramo Cocorná 33
Tabla 15. Indicadores de Gestión Programa para la Atención a la Comunidad e Interesados en el proyecto tramo San Carlos – Cruces – Narices 33
Tabla 16. Indicadores de Gestión Programa para la Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural tramo Cocorná 34
Tabla 17. Indicadores de Gestión Programa para la Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural tramo San Carlos – Cruces - Narices 35
Tabla 18. Indicadores de gestión Programa para la Sostenibilidad y Aprobación Comunitaria tramo Cocorná 36
Tabla 19. Indicadores de gestión Programa para la Sostenibilidad y Aprobación Comunitaria tramo San Carlos – Cruces – Narices 37
Tabla 20. Indicadores de Gestión Programa para la Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto tramo Cocorná 38
Tabla 21. Indicadores de Gestión Programa para la Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto tramo San Carlos – Cruces – Narices 39

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

INFORME DE APOYO A LA SUPERVISION SOCIAL

Datos Generales

Entidad contratante:	Gobernación de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física.
Objeto del proyecto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 3: ORIENTE. Cruces - Narices San Carlos, Cocorná - El Ramal.
Interventor:	Consorcio Mejoramiento 15378
Contrato de Interventoría No:	23SS111B1465 de 2023
Contratista:	Consorcio Cocorná 15372
Contrato de Obra No:	4600016585 de 2023
Periodo reportado:	Informe # 8 de abril de 2025
Fecha de inicio del contrato	03 de noviembre de 2023
Fecha final del contrato	01 de noviembre de 2025

Programa social	Actividades Sociales
Programa para el Reconocimiento del Entorno	***Tramo Cocorná*:** **Actas de vecindad**: como línea base fueron levantadas 48 actas de vecindad así: 39 para el tramo de mejoramiento y 9 para el tramo de mantenimiento Pendiente firma de la interventoría acta # 4 (tramo mejoramiento) y la # 40 (tramo de mantenimiento). **Actas de entorno**: se han levantado 7 actas de entorno en los diferentes tramos. **Permisos de intervención de predios**: se levantaron 24 permiso, pendiente por contactar 2 propietarios ***Tramo San Carlos*:** **Actas de vecindad**: fueron levantadas 10 actas de vecindad, 9 de ellas firmadas por la interventoría con el respectivo cierre. **Actas de entorno**: Se levantó 1 acta de entorno, pendiente cierre de la misma. **Permisos de intervención de predios**: Se levantó 1 permiso de intervención, pendiente cierre de la mismo.

Programa para la Protección de la Infraestructura Social y Comunitaria	***Tramo Cocorná:*** **Reunión de inicio**: 15 de noviembre de 2023 (56 asistentes) ***Tramo San Carlos:*** **Reunión de inicio**: 29 de noviembre de 2023 (26 asistentes)
Programa Manejo para la Contratación de Mano de Obra	***Para los tramos Cocorná y San Carlos*** durante el presente informe no se reporto personal vinculado dado que están en proceso de reinicio y continuidad del contrato pues este se encontraba suspendido.
Programa de Comunicación y Divulgación	***Para los tramos Cocorná y San Carlos*** no se desarrollaron actividad tendiente al cumplimiento de los objetivos de este programa, ni la entrega de piezas como volantes, uso de los canales de información para la comunidad como lo son línea telefónica, WhatsApp, cartelera informativa, punto de atención a la comunidad y buzón de sugerencias, dado que se encuentra pendiente la vinculación del profesional social del contratista para asegurar el correcto desarrollo del Plan de Gestión Social.
Programa para la Atención a la Comunidad e Interesados del Proyecto	***Para los tramos Cocorná y San Carlos*** no se realizó ninguna de las actividades contempladas en el Plan de Gestión Social para la atención de la comunidad, no se tuvo atención a la comunidad ni se disponen los elementos para la participación comunitaria; se espera que el contratista atienda al llamado realizado por la interventoría mediante el oficio CM15378-386 "REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL", el 28 de abril del 2025; donde se detalla la importancia de la aplicación del PGS.
Programa para la Protección el Patrimonio Arqueológico y Cultural.	***Tramos Cocorna-San Carlos***: A la fecha no se han presentado hallazgos de bienes de interés arqueológicos ni culturales en el proyecto. En las inducciones realizadas a los trabajadores que ingresan a laborar en el período, se manifiesta la importancia de seguir el protocolo en caso de un hallazgo fortuito en el proyecto, estas inducciones se retomaran una vez se vincule nuevamente personal para la obra.
Programa para la Sostenibilidad y Apropiación Comunitaria	***Tramos Cocorná y San Carlos:*** No se reportaron actividades para este programa toda vez que el contratista no había iniciado con las labores de obra.
Programa para la Educación y Capacitación al personal vinculado al Proyecto	***Tramo Cocorná-San Carlos***: El día 24/04/2025 se llevó a cabo comité de seguimiento donde participó el contratista, la Interventoría y la supervisión de la SIF; en el cual se realizaron los requerimientos al contratista desde las diferentes áreas para el inicio de la obra en cumplimiento de los requisitos contractuales, además se realizan sugerencias para la realización de las actividades desde cada

	componente, en especial el ingreso del profesional social para iniciar con la activación del PGS.
Gestión Social Interventoría	***Tramo Cocorná y San Carlos:*** Desde el área social de la Interventoría durante el mes de abril del 2025, se desarrolló una revisión documental del avance del proyecto y aspectos pendientes por atender por parte del contratista, sin embargo, debido a que no se dio la vinculación del profesional social se envió oficio para solicitar la atención de los lineamientos contractuales, comunicación CM15378-386 con asunto "REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL".

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para los tramos Cocorná y San Carlos se reitera la importancia de la vinculación del profesional social por parte del contratista para dar inicio a las actividades del PGS, y continuar con el debido seguimiento por parte de la interventoría a cada una de los programas anteriormente descritos.

Teniendo en cuenta lo anterior, desde el apoyo a la supervisión social, se acepta el informe # 8 correspondiente al mes de abril de 2025, presentado por la Interventoria Consorcio Mejoramiento 15378, el cual se encuentra acorde con la Guía de manejo Social, Ambiental, y de Seguridad y Salud en el trabajo para proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia.

Los soportes de las actividades ejecutadas para cada programa se pueden consultar en medio fisico, los cuales hacen parte de la información entregada por el Consorcio Mejoramiento 15378.

Yuselly Pareja Valencia

Firma apoyo a la supervisión social
Dirección gestión Social, Ambiental y Predial
Secretaria de Infraestructura Física
