INFORME CONTRATISTA					
No. DE CONTRATO	Contrato Prestación de Servicio 153-2025	**PERIODO DEL INFORME**			
		DESDE (dd/mm/año)	**HASTA (dd/mm/año)**		
		01/05/2025	30/05/2025		
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 ESE				
CONTRATISTA	DIANA CAROLINA MUÑOZ ROJAS				
No. DE IDENTIFICACIÓN	31.714.327	**EXPEDIDA EN**	CALI		
SUPERVISOR	LENYTH CATHERIN MONTAÑEZ ANGEL				
CDP No.	215 DE 01/04/2025	**RP No.**	253 DE 15/04/2025		
FORMA DE PAGO	seis (6) cuota	**PAGO No.**	2/6		
VALOR A PAGAR	$ 4.000.000				
PAGO SEGURIDAD SOCIAL					
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$1.600.000	**PERIODO COTIZADO**	Mayo 2025		
EPS	SURAMERICANA	**VALOR PAGADO**	$200.000		
ARL	SURA	**VALOR PAGADO**	$111.400		
AFP	PORVENIR	**VALOR PAGADO**	$256.000		
VALOR TOTAL PLANILLA	$567.400	**PLANILLA No.**	78133341		
ANEXA CERTIFICACION PARA ASIMILARSE A ASALARIADO (Retefuente)		**SI**		**NO**	**X**
OBJETO DEL CONTRATO					
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA CIVIL PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. NOR1ESE-CAU-02- 2023 QUE TIENE COMO OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD PUNTO DE ATENCIÓN TIMBA- CAUCA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD NACIONAL.					
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS					
GENERALES: a) Utilizar todos sus conocimientos e idoneidad en la ejecución del presente contrato, comprometiéndose a realizar las actividades derivadas del contrato con calidad y oportunidad.					

b) Velar por el buen uso de los bienes entregados por el supervisor o el contratante para realizar sus actividades.

c) Toda información o formatos generados por el contratista son propiedad de la E.S.E Norte 1 de buenos aires Cauca.

d) Cumplir con la política de seguridad de la información, con el fin de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información bajo su responsabilidad.

e) Manejar la documentación a su cargo de conformidad con la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, las políticas operativas del Proceso Gestión Documental, las políticas del Sistema de Gestión Documental.

f) Prestar sus servicios en pro de la seguridad de la información y los recursos informáticos del contratante.

g) Actuar con lealtad y buena fe en las diversas etapas contractuales, evitando las dilataciones, trabas y obstáculos que por su causa pudieren presentarse.

h) Informar oportunamente al Supervisor las irregularidades o dificultades que se presenten en el desarrollo de las actividades.

i) Cargar el informe de actividades con sus respectivos soportes a la plataforma SECOP 2

ANEXA SOPORTE.

j) Presentar mensualmente informes sobre el desarrollo de las actividades pactadas

ESPECÍFICAS:

a) Realizar un seguimiento y control permanente de los avances de la interventoría, verificando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.


ASUNTO	FECHA RADICADO	OBSERVACIÓN
Visita de seguimiento MSPS y secretaria de salud departamental	05/05/2025	Informada por llamada telefónica a gerencia. Contratista de obra e interventoría
Visita de Consejo Municipal de Buenos Aires	16/05/2025	Informada por llamada telefónica a gerencia. Contratista de obra e interventoría
Radicación de formato de seguimiento MSPS	26/04/2025	Enviada por correo electrónico de interventoría, supervisión MSPS

OBSERVACIONES DE OBRA:
Para este periodo se el contratista puso en marcha plan de contingencia y se culminaron en bloque 1 su funden alfagias, bloque 2 mampostería segundo nivel, encofrado escaleras, fundición de cámaras,

fundición de contrapiso, instalación de acero vigas no estructurales, Bloque 3 Mampostería de piso de culata y columnetas, instalación de cercha metálica para cubierta, . Bloque 4 fundición de vigas aéreas, vigas de confinamiento, instalación de puntos hidrasanitarios y eléctricos, mampostería de primer nivel, columna esta para alfajías, Bloque 5instalacion de tubería eléctrica. fundición de contrapiso, instalación de acero y fundición de cárcamo Vías Servicio conformación y compactación de subrasante. A pesar del compromiso del contratista para cumplir con el plan de contingencia es importante mencionar que la situación de orden público sobre la zona es continúa generando problemas para la mano de obra y materiales en especial las actividades especializadas. el día 5 de mayo 2025 se realizó visita de seguimiento por parte del MSPS, funcionario de la secretaria de Salud Departamento del Cauca, Gerente ESE NORTE 1, Contratistas, Interventoría supervisión, Para el día 16 de mayo se realizó visita de obra por parte del Consejo Municipal de Buenos Aires con el fin de dar a conocer a la corporación los significativos avances del proyecto. Para este periodo el avance de obra es de 77,15% con un atraso del 3,01% situación que a pesar de los planes de contingencia no se ha superado teniendo en cuenta las situaciones permanentes de orden público entre otras.

Desde la supervisión de la ESE NORTE 1 informa que a la fecha se encuentra cargado en PISIS la información del contrato, para este periodo. Se cargaron las carpetas:

Carpeta 5 Acta parcial N.7
Carpeta 6 Informes e obra Marzo - abril
Carpeta 10 Relación de Rendimientos -Extractos bancarios
Carpeta 11Soporte pago PSE de rendimientos financieros a la cuenta

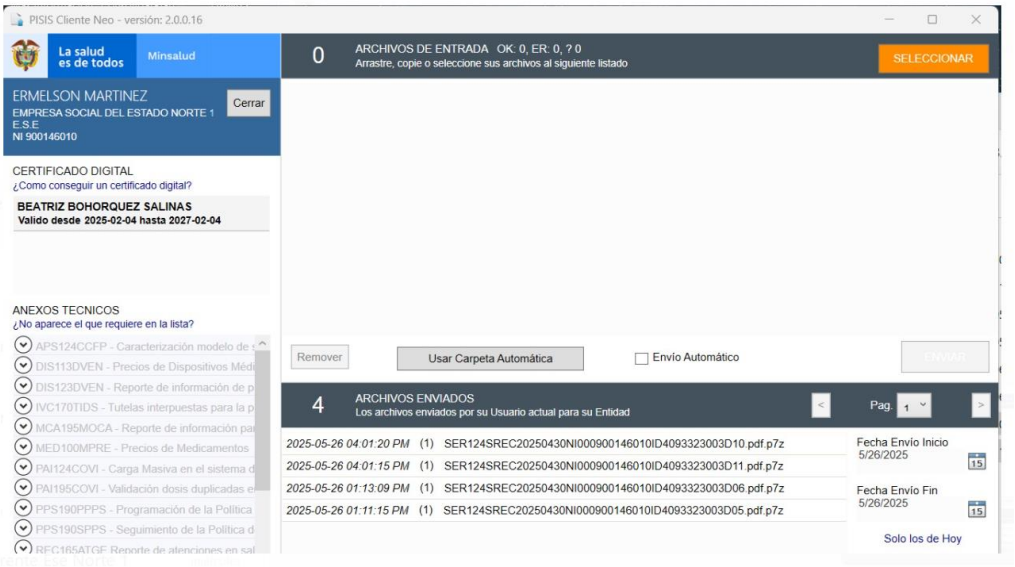

A la fecha del presente informe la ESE NORTE 1 se ha cancelado al contratista de obra CONSORCIO TC-23 hasta el acta 7, no se han radicado actas de obra.

Para el CONSORCIO IHT contratista de interventoría se canceló el acta 6 y 7 el día 14 de mayo.

Se recomienda al contratista de obra consorcio TC-23:

Informar de los cambios o situaciones inmediatamente a la interventoría para que pueda tener información clara y precisa para la supervisión.

Radicar los informes de manera oportuna a la interventoría para lograr radicar a tiempo la información a

plataforma.

Está pendiente la programación de comité de veeduría.

Se solicita el balance de obra para determinar el alcance del proyecto y la Gerente en representación de la ESE NORTE pueda realizar las gestiones necesarias para la consecución de recursos

Se recomienda a la interventoría consorcio IHT:

Solicitar cumplimiento al contratista de la entrega del informe de obra

Radicar de manera paralela las actas de cobro con los cortes de obra

Solicita reportar las situaciones de orden público permanente por correo electrónico

Radicar el balance de obra

PARA ESTE PERIODO LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

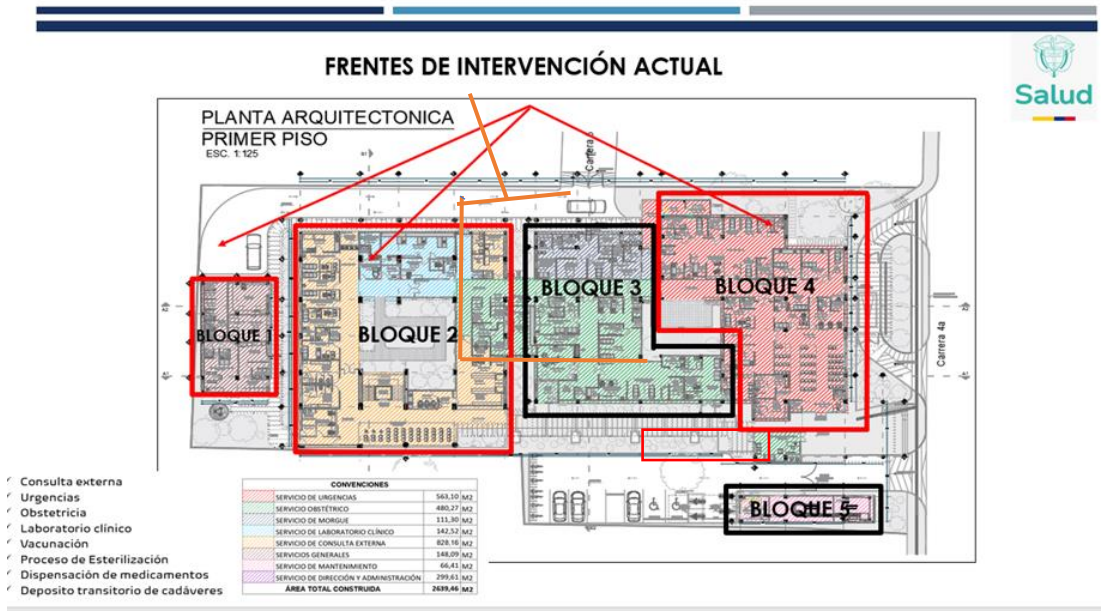


Imagen 1. Avances de obra por Bloque

AVANCE DE OBRA



Imagen 2. Avances de obra



Imagen 3. Avances Bloque 2



Imagen 4. Avances Bloque 3



Imagen 5. Avances Bloque 4



Imagen 6. Avances Bloque 5





Imagen 7. Avances Vías





Imagen 8. Caja eléctricas -Malla tierra subestación





Imagen 9. Fundición de piso concreto





Imagen 10. Instalación de tubería agua lluvias

SITUACION DE ORDEN PUBLICO

Respecto a la situación social actual del territorio, en el mes de mayo continuan la situaciones de orden publico las cuales ocasionan situaciones de miedo, incertidumbre, peligro e inseguridad para conseguir el personal de obra además de dificultades en el suministro de materiales para la obra y atrasos en la programación de actividad

A continuación, se relacionan algunos de los hechos presentados:



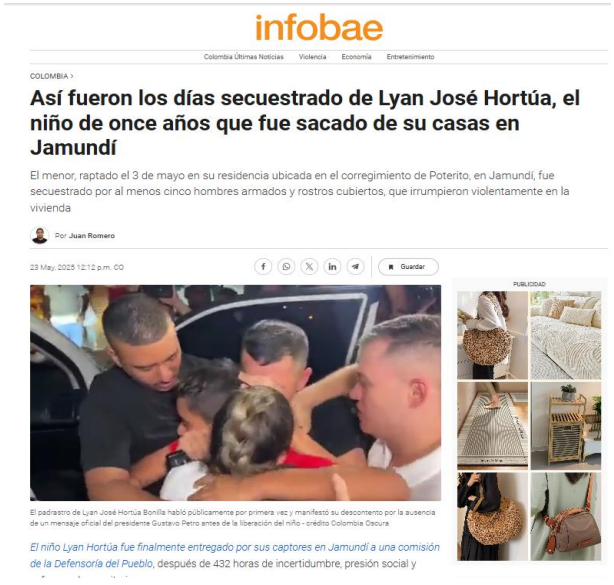



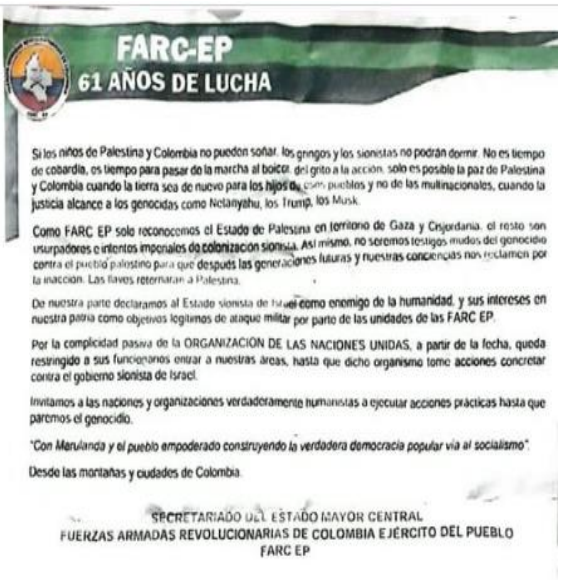


Imagen 8. Situaciones de orden publico

SEGUIMIENTO AL AVANCE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA

Contratante:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1
Contrato N.º:	NOR1ESE-CAU-01-2023
Contratista:	CONSORCIO T-C 23
Plazo Inicial:	16 MESES
Plazo Adicional 1:	6 MESES
Plazo Final:	22 MESES

Fecha de Inicio:	5 DE OCTUBRE DE 2023
Fecha de terminación inicial:	27 DE ENERO DE 2025
Fecha de suspensión 1	4 DE JUNIO DE 2024
Fecha reinicio 1	19 DE JULIO DE 2025
Fecha Terminación modificatorio 1	8 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Valor Inicial:	$ 12.170.175.042,00
Valor Adición 1 Modificatorio 1	$ 21.902.122,00
Valor Total	$ 12.192.077.164,00
Valor Anticipo: 40%	$ 4.868.070.017,00
Forma de Pago	PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE

Avance del Proyecto de obra:

PROGRAMADO MES MAYO: 80.12%
EJECUTADO MES MAYO: 77.11%

a corte del presente informe y los periodos mensuales acumulados de obra ejecutada, se tiene al mes de mediados de un atraso de obra ejecutada acumulada vs programada acumulada del 3.01% en función del valor total del contrato, el cual considera la reciente adición por RETIE y RETILAP por un valor de $21.902.122 para un valor total de $ 12.192.077.164.

En el periodo actual además de la coyuntura social, la cual no cesa y repercute directamente en el corregimiento de Timba y demás zonas aledañas, se han generado atrasos en la programación de actividades en obra debido a las alteraciones de orden público por las mismas festividades y los enfrentamientos ocasionados por grupos al margen de la ley, que han desencadenado en limitaciones y bloqueos al suministro y traslado de materiales a la obra por los corredores viales del territorio. Así mismo es importante mencionar que tras la estigmatización de la zona, donde la inseguridad, vulnerabilidad y riesgo destacan entre la población, ha con llevado a la aminoración en la disponibilidad de mano de obra calificada, pese a la alta demanda que tiene el consorcio para incrementar el personal en obra.

Lo anterior, evidencia la necesidad de incrementar la ejecución en los diferentes frentes de obra y de igual manera el personal de mano de obra tanto calificado como no calificado para dar cumplimiento a la proyección de actividades y trabajar de forma eficiente. Por ende, esta supervisión manifiesta su preocupación por la disponibilidad de personal para el rendimiento adecuado en las actividades propuestas y resalta la importancia de evaluar técnica y financieramente la posibilidad de incorporación de trabajadores de otras zonas del departamento. De igual manera, se le recuerda al contratista que la vinculación de personal y/o subcontratación deberá ser reportado ante esta supervisión.

ESTADO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Año	Concepto	Avance Financiero					Avance en Fisico %		
		Avance Mensual Programado	Acumulado Programado	Avance Ejecutado	Acumulado Ejectado	% Programado	Acumulado Programado	% Ejecutado	Acumulado Total
2023	OCTUBRE	$ 242.156.835,00	$ 242.156.835,00	$ 240.000.000,00	$ 240.000.000,00	1,99%	1,99%	1,97%	1,97%
	NOVIEMBRE	$ 279.531.551,00	$ 521.688.386,00	$ 264.530.254,00	$ 504.530.254,00	2,30%	4,29%	2,17%	4,15%
	DICIEMBRE	$ 365.671.132,00	$ 887.359.518,00	$ 395.469.746,00	$ 900.000.000,00	3,00%	7,29%	3,25%	7,40%
2024	ENERO	$ 672.057.436,00	$ 1.559.416.954,00	$ 462.181.567,00	$ 1.362.181.567,00	5,52%	12,81%	3,80%	11,19%
	FEBRERO	$ 1.014.975.312,00	$ 2.386.378.158,00	$ 266.870.410,00	$ 1.629.052.160,00	8,34%	21,15%	2,19%	13,39%
	MARZO	$ 93.575.767,00	$ 2.479.953.925,00	$ 852.002.494,00	$ 2.481.054.654,00	0,77%	20,38%	7,00%	20,39%
	ABRIL	$ 288.583.278,00	$ 2.768.537.203,00	$ 112.091.702,00	$ 2.593.146.356,00	2,37%	22,75%	0,92%	21,31%
	MAYO	$ 483.232.753,00	$ 3.251.769.956,00	$ 97.590.304,00	$ 2.690.736.660,00	3,97%	26,72%	0,80%	22,11%
	JUNIO		$ 3.251.769.956,00	$ -	$ 2.690.736.660,00	0,00%	26,72%	0,00%	22,11%
	JULIO		$ 3.251.769.956,00	$ -	$ 2.690.736.660,00	0,00%	26,72%	0,00%	22,11%
	AGOSTO	$ 825.228.795,00	$ 4.076.998.751,00	$ 990.208.508,00	$ 3.680.945.168,00	6,78%	33,50%	8,14%	30,25%
	SEPTIEMBRE	$ 369.615.958,00	$ 4.446.614.709,00	$ 1.013.043.550,00	$ 4.693.988.718,00	3,04%	36,54%	8,32%	38,57%
	OCTUBRE	$ 539.626.270,00	$ 4.986.240.979,00	$ 310.387.259,00	$ 5.004.375.977,00	4,43%	40,97%	2,55%	41,12%
	NOVIEMBRE	$ 729.259.241,00	$ 5.715.500.220,00	$ 495.720.265,00	$ 5.500.096.242,00	5,99%	46,96%	4,07%	45,19%
	DICIEMBRE	$ 452.081.486,00	$ 6.167.581.706,00	$ 599.595.489,00	$ 6.099.691.731,00	3,71%	50,68%	4,93%	50,12%
2025	ENERO	$ 774.587.031,00	$ 6.942.168.737,00	$ 603.512.294,00	$ 6.703.204.025,00	6,35%	56,94%	4,95%	55,07%
	FEBRERO	$ 859.541.440,06	$ 7.801.710.177,06	$ 637.645.635,68	$ 7.340.849.660,68	7,05%	63,99%	5,23%	60,30%
	MARZO	$ 849.787.778,51	$ 8.651.497.955,57	$ 930.255.487,38	$ 8.271.105.148,06	6,97%	70,96%	7,63%	67,93%
	ABRIL	$ 570.589.211,28	$ 9.222.087.166,85	$ 571.998.226,97	$ 8.843.103.375,03	4,68%	75,64%	4,70%	72,63%
	MAYO	$ 546.205.056,95	$ 9.768.292.223,80	$ 546.205.056,95	$ 9.389.308.431,98	4,48%	80,12%	4,48%	77,11%

Imagen 9 Avance Financiero de Obra

ESTADO DEL CONTRATO			OBSERVACIÓN
DESCRIPCION	VALOR FACTURADO	% AVANCE	
ACTA PARCIAL 1	$ 1.361.972.959,00	11,17%	PAGADA
ACTA PARCIAL 2	$ 1.119.081.694,00	9,18%	PAGADA
ACTA PARCIAL 3	$ 2.212.934.065,00	18.15%	PAGADA
ACTA PARCIAL 4	$ 685.887.524,00	5.63%	PAGADA
ACTA PARCIAL 5	$ 730.716.448,00	5.99%	PAGADA
ACTA PARCIAL 6	$ 801.568.918,00	6.74%	PAGADA
ACTA PARCIAL 7	$ 426.434.905,00	3.50%	PAGADA
VALOR TOTAL	$ 7.338.596.513,00	60.19%	

ESTADO AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
ANTICIPO	$	4.868.070.017
AMORTIZACION ACTA PARCIAL 1	$	544.789.184
AMORTIZACION ACTA PARCIAL 2	$	447.632.678
AMORTIZACION ACTA PARCIAL 3	$	885.173.626
AMORTIZACION ACTA PARCIAL 4	$	274.355.010
AMORTIZACION ACTA PARCIAL 5	$	292.286.579
AMORTIZACION ACTA PARCIAL 6	$	320.627.567
AMORTIZACION ACTA PARCIAL 7	$	170.573.962
TOTAL, AMORTIZADO	**$**	**2.935.438.606**
SALDO POR AMORTIZAR	**$**	**1.932.631.411**

SEGUIMIENTO AL AVANCE INTERVENTORIA

Contratante:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1
Contrato N.º:	NOR1ESE-CAU-02-2023
Contratista:	CONSORCIO IHT
Plazo Inicial:	16 MESES
Modificatorio No. 1 Plazo Adicional 2:	6 MESES
Plazo Final:	23 MESES
Fecha de Inicio:	05 DE OCTUBRE DE 2023
Fecha de terminación inicial:	26 DE FEBRERO DE 2025
Fecha de suspensión No.1	04 DE JUNIO DE 2024
Fecha reinicio No.1	19 DE JULIO DE 2025
Fecha Terminación modificatorio No.2	08 DE OCTUBRE DE 2025
Modificatorio No. 2	16 de enero de 2024. Cambio de representante legal
Valor Inicial:	$ 626.859.801

Avance Financiero de contrato interventoría NOR1ESE-CAU-01-2023 CONSORCIO IHT.

Forma de pago de Interventoría			
Valor Interventoría		$626.859.801	
Forma de Pago			
Avance Obra Física	70%	$438.801.861	mensual
Cuota mensual 17 cuotas	20%	$125.371.960	$ 7.374.821
Liquidación	10%	$62.685.980,00	

Detalle de forma de pago de interventoría inicial

Forma de pago de Interventoría			
Valor Interventoría		$626.859.801	
Forma de Pago			
Avance Obra Física	70%	$438.801.861	
Cuota mensual 17 cuotas	20%	$125.371.960	
Valor Pagado Mensual a la fecha		$95.872.673	Mensual
Saldo distribuir en los 6 meses		$29.499.287	$ 2.949.929
Liquidación	10%	$62.685.980,00	

Detalle de forma de pago de interventoría Modificatorio No. 2

Es importante precisar que el contrato e interventoria en el mes de enero se realizo una modificación 2 se realiza una prorroga del contrato por 6 meses mas lo cual no genera costos lo cual varia los pagos mensuales asi:

El presente mes de ejecución la interventoría presenta un avance mensual así:

CONTRATO DE INTERVENTORIA NOR1ESE-CAU-02-2023								
Año	Concepto	Avance Financiero						
		Avance Mensual Programado	% ejecutada obra	Avance Ejecutado obra mes	Avance mes interventoría	Acumulado Ejecutado interventoría	% avance interventoría mes	% avance interventoría mes acumulado
2025	MAYO	$2.949.928,70	4.48%	$19.658.323,00	$ 22.608.251,70	$448.982.584,50	3.61%	71.62%

A corte del presente informe se han presentado las siguientes actas parciales, correspondientes a la ejecución del contrato de interventoría:

DESCRIPCIÓN	AVANCE MENSUAL (%)	% AVANCE INTERVENTORIA	ESTADO
ACTA 1	$ 78.601.214,00	12,54%	PAGADA
ACTA 2	$ 55.119.412,00	8,79%	PAGADA
ACTA 3	$ 109.287.748,00	17,43%	PAGADA
ACTA 4	$ 43.814.260,00	6,99%	PAGADA
ACTA 5	$ 28.993.542,00	4,63%	PAGADA
ACTA 6	$ 24.670.782,00	4,63%	PAGADA
ACTA 7	$ 25.899.266,00	4,63%	PAGADA
TOTAL	$ 366.386.224,00	58.45%	

Al presente informe está se pagó acta No. 7 de obra y actas 6 y 7 de interventoría.

b) Identificar y reportar oportunamente cualquier incumplimiento por parte del interventor.

Para este periodo la interventoría no ha entregado informe del mes de mayo.

c) Brindar asesoría técnica a la entidad contratante para la toma de decisiones durante la ejecución del proyecto.

- Para este periodo se realizaron los correspondientes reportes al ministerio de salud y protección social y demás acciones necesarias para el cumplimiento.

d) Realizar reuniones periódicas con el contratista de obra y el inventor para determina el avance de las metas del proyecto, levantando actas de lo concertado.



Imagen 10 Comité de seguimiento de obra 5 mayo 2025 MSPS-Secretaria Salud Departamental Cauca.

e) Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan afectar el normal desarrollo del contrato de obra.

Dentro de esta actividad se realizaron las siguientes actividades:

ASUNTO	FECHA RADICADO	OBSERVACIÓN
Solicitud de entrega de balance de obra	26/05/2025	Enviado por correo electrónico a interventoría
Solicitud de informes mensuales de obra	26/05/2025	Enviado por correo electrónico a interventoría
Radicado MSPS de informe marzo con radicado 2025423001397592	02/05/2025	Enviado por correo electrónico MSPS

- Se solicita al contratista e interventoría la entrega de informes el día 25 de cada mes con el fin de cumplir con las fechas establecida por la secretaria de salud departamental y poder cumplir con el informe de supervisión para el día 28 de cada mes y reportar la información al PISIS por parte del ingeniero de sistemas.
- Se solicita balance de obra a la interventoría con el fin de revisar y radicar ante el

MSPS y secretaria de salud departamento del Cauca.

A la fecha de este informe se encuentran al día toda la información en PISIS y radicación de informes.

f) Asistir a las reuniones programadas por la veeduría ciudadana o por la comunidad en general relacionadas con el contrato de obra y/o interventoría.



Imagen 11 Comité de obra 16 mayo 2025 Consejo Municipal de Buenos Aires

En este periodo no se desarrolla comité de veeduría ciudadana.

g) Notificar a la entidad de cualquier situación que pueda afectar la ejecución normal del contrato de obra y/o interventoría.

A la fecha se reportan la continuidad de situaciones de orden público que han afectado la oportuna entrega de materiales, equipos y renuncia de profesionales del proyecto demás necesarios para el desarrollo normal de la obra, a pesar de ello el contratista plantea planes de contingencia que permitan ir afrontando los atrasos y poder continuar con el proceso.

h) Revisar las planillas de aportes al sistema de seguridad social del personal contratado, para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente.

A la fecha la interventoría no ha reportado Planillas de seguridad social hasta el corte del acta 7.

I) Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual.

Solicitar al administrador de la ESE NORTE 1 realizar las transferencias de rendimientos financieros a la cuenta estimulada por el ministerio para ello, relacionar y reportar a la supervisión para que el Ing. sistema realice el cargue al PISIS.

DOCUMENTOS ANEXOS	**No. FOLIOS, CD'S, DVD'S**
1. Planilla de seguridad social 78133341 2. Recibo de pago de la seguridad social. 3. Cuenta de cobro 4. Documentos del proceso de seguimiento	
Dado en la ciudad de buenos Aires Cauca, a los Treinta (30) días del mes de mayo de 2025	
FIRMA CONTRATISTA 	

SuAporte | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2025-05-27, 06:31:04 AM **Tipo Planilla:** I: Planilla independientes **Número Planilla:** 78133341

Periodo Cotización: mayo de 2025

Periodo Servicio: mayo de 2025

PAGADO 27/05/2025

Datos del Aportante

Razón Social	DIANA CAROLINA MUÑOZ ROJAS		
Documento	CC31714327	**Dirección**	AV. CALLE 77 NORTE #3 N - 35 CIUDADELA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4330701
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	

Detalle de los Pagos por Administradora

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 256.000	$ 0	$ 256.000
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 111.400	$ 0	$ 111.400
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 200.000	$ 0	$ 200.000
Total Pagado				$ 567.400	$ 0	$ 567.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-05-27, 06:27:33 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2025
Empresa	DIANA CAROLINA MUÑOZ ROJAS
CEDULA CIUDADANIA	CC 31714327
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	78133341
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1508923051
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 567.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 256.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 200.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 111.400	$ 0
		SubTotales:		$ 567.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 567.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Documento soporte de costos y gastos en operaciones con no obligados a expedir factura o documento equivalente

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1

NIT. 900,146,010-6

Dirección Calle principal Bueno Aires Cauca

fecha de operación: 30 de mayo de 2025

No. DS 1875

Autorización de numeración Dian No 18764054790644 desde la 1001 hasta la 2000

Vendedor o quien presta el servicio:DIANA CAROLINA MUÑOZ ROJAS	Nit: 31.714.327
Direccion: CORREGIMIENTO DE CHAGRES	Telefono:3116433720

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 153-2025 COMO INGENIERA CIVIL PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. NOR1ESE-CAU-02- 2023 QUE TIENE COMO OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD PUNTO DE ATENCIÓN TIMBA- CAUCA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD NACIONAL. PERIODO 15 AL 30 DE ABRIL 2025	$4.000.000	$4.000.000
		SUBTOTAL	$4.000.000
		RETEFUENTE	
		RETEICA	
		TOTAL	$4.000.000
		Iva implicito Derivados del Petroleo	

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA



DIANA CAROLINA MUÑOZ ROJAS

ELABORADO POR

Gmail construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

2 mensajes

Interventoría Timba <interventoria.timba@gmail.com> 2 de mayo de 2025, 11:22 a.m.
Para: construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

Estimada ingeniera,

Por medio del presente correo me permito remitir el informe de interventoría para el periodo de abril de 2025.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada.

Atentamente:
Interventoría
CONSORCIO IHT

INFORME MENSUAL ABRIL PRELIMINAR.pdf
2474K

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com> 12 de mayo de 2025, 8:00 a.m.
Para: Interventoría Timba <interventoria.timba@gmail.com>

Cordial saludo.

Por favor enviar informe del mes de abril con anexos. Gracias
[Texto citado oculto]

Gmail construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - Confirmación de Radicación IdControl: 788871

1 mensaje

Notificaciones SGDEA <notificaciones_sgdea@minsalud.gov.co> 2 de mayo de 2025, 4:48 p.m.
Para: "construccionhtimba@gmail.com" <construccionhtimba@gmail.com>

Hemos recibido su correo electrónico, le informamos que los datos de su radicado son los siguientes:

Documento con IdControl:
788871

Radicado:
2025423001397592

Detalle:
FWD INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA ABRIL CENTRO SALUD TIMBA CAUCA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD PUNTO DE ATENCIÓN TIMBA- CAUCA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD

Código de verificación:
BSDUE

Fecha Radicado:
02/05/2025

Podrá consultar el estado de su documento dando click Aquí

Este es un correo informativo, al cual no debe enviar ninguna respuesta o información ya que no recibirá respuesta alguna por parte de este correo al no ser oficial ni estar avalado por la entidad para emitir respuestas.

¡Este correo fue generado automáticamente por el sistema SGDEA ControlDoc!

Gmail

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

REQUERIMIENTO ENTREGA BALANCE DE OBRA

1 mensaje

Interventoría Timba <interventoria.timba@gmail.com> 13 de mayo de 2025, 5:10 p.m.
Para: CONSORCIO TC23 <consorciot.c23@gmail.com>
CC: construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

Buenas tardes,

Por medio del presente correo me permito remitir oficio IHT 096 para su conocimiento y respuesta inmediata.

Sin otro particular,
INTERVENTORIA
Consorcio IHT

IHT-096 REQUERIMIENTO BALANCE.pdf
80K

Timba, mayo 13 del 2025

Señores:
ANVAL R.L. Lorny Yargot Sandoval Domínguez
Consorcio TC23 IHT- 096

Referencia: Proyecto "Construcción Del Centro De Salud Punto De AtenciónTimba-Cauca"
Contrato de Interventoría NOR1ESE-CAU-02-2023

Asunto: Requerimiento entrega balance de obra.

Cordial saludo,

Por medio del presente, y en mi calidad de Interventor de la obra *Construcción Del Centro De Salud Punto De Atención Timba-Cauca* del contrato N° *NOR1ESE-CAU-01-2023*, me dirijo a usted con la finalidad de requerir formalmente el cumplimiento a la entrega del balance de obra conforme a los compromisos adquiridos el día 6 de mayo del 2025 en presencia del Ministerio de Salud y Protección Social, ESE Norte 1 e interventoría, ante los cuales, se especificó la entrega para el día 12 de mayo del 2025.

Se le recuerda que es imprescindible contar con el balance de obra para definir el estado actual de la misma garantizando el alcance del objeto contractual, su incumplimiento podría generar afectaciones a la ejecución de obra, situación que no podemos permitir que se prolongue. Por ello, requiero de manera urgente y bajo responsabilidad que, en un plazo máximo de 24 horas hábiles, se remita el consolidado final del balance de obra, así mismo, es importante tener en cuenta que esta interventoría debe realizar el respectivo proceso de revisión a la información presentada y se deberá subsanar cualquier observación emitida en el menor tiempo posible para dar cumplimiento a la fecha de entrega ante el Ministerio de Salud para el día 19 de mayo de 2025.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada.

Atentamente,



Carlos Andrés Pachón Ávila
Representante Legal
Consorcio IHT

Cra 112 No. 44-21 conjunto Palmeras de Brocha
consorcioiht@gmail.com
3232987807

Gmail **construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>**

Fwd: RESPUESTA IHT-096

1 mensaje

Interventoría Timba <interventoria.timba@gmail.com> 15 de mayo de 2025, 3:38 p.m.
Para: construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **CONSORCIO TC23** <consorciot.c23@gmail.com>
Date: mié, 14 may 2025 a las 21:48
Subject: RESPUESTA IHT-096
To: martin morillo <Interventoria.timba@gmail.com>

Arquitecto
CARLOS ANDRÉS PACHÓN ÁVILA
RL. CONSORCIO IHT

Cordial saludo,

En respuesta a su solicitud de entrega del balance de obra, se adjunta por este medio el requerimiento solicitado, con el fin de dar cumplimiento a las actividades planteadas, para el correcto avance del proyecto.

Sin otro particular, gracias por su atención.

BALANCE 14 MAYO 2025.xlsx
1379K

Gmail

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

INFORME MENSUAL ABRIL CON ANEXOS

1 mensaje

Interventoría Timba <interventoria.timba@gmail.com> 20 de mayo de 2025, 2:45 p.m.
Para: construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

Estimada Ingeniera,

Cordial saludo
Por medio del presente correo me permito remitir el informe mensual del mes de abril con sus respectivos anexos.

Sin otro particular,
Atentamente:
Interventoría
Consorcio IHT

INFORME ABRIL CON ANEXOS.pdf

Gmail

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

Extracto Bancarios Obra Timba 2024

1 mensaje

administracion administracion <administracion@esenorte1.gov.co> 26 de mayo de 2025, 2:33 p.m.
Para: construccionhtimba@gmail.com

Extractos Bancarios de 2024, relacionados con los dineros consignados por el Ministerios para la construcción del centro de salud de Timba

DIEGO ERNEY CAMPO SANCHEZ
Coordinador Administrativo
ESE NORTE1

Estractos Bancarios Obra Timba 2024.rar
973K

Gmail

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

Rendimientos Enero a Abril 2025

1 mensaje

administracion administracion <administracion@esenorte1.gov.co> 26 de mayo de 2025, 3:33 p.m.
Para: construccionhtimba@gmail.com

Adjunto remito a usted los soporte correspondientes al reintegro de rendimientos financieros correspondientes al periodo de enero a abril de 2025.

DIEGO ERNEY CAMPO SANCHEZ
Coordinador Administrativo
ESE NORTE1

6 archivos adjuntos

- **3. Extracto Marzo Recursos Obra Timba.pdf**
  142K
- **2. Extracto Febrero Recursos Obra Timba.pdf**
  142K
- **4. Extracto Abril Recursos Obra Timba.pdf**
  142K
- **1. Extracto Enero Recurso Obra Timba.pdf**
  142K
- **Comprobante Pago Ren Fcieros Obra Timba Abril 2025.pdf**
  12K
- **Certificacion Rendimientos Financieros Timba Abril 2025.pdf**
  232K

Gmail

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

Fwd: INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA ABRIL CENTRO SALUD TIMBA CAUCA

1 mensaje

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com> 2 de mayo de 2025, 3:58 p.m.
Para: Correo <correo@minsalud.gov.co>
CC: Didier Iván Golondrino Leon <didiergolondrino.salud@cauca.gov.co>, gerencia gerencia <gerencia@esenorte1.gov.co>

Cordial saludo Adjunto informe abril

---------- Forwarded message ---------
De: **Interventoría Timba** <interventoria.timba@gmail.com>
Date: vie, 2 de may de 2025, 11:22 a. m.
Subject: INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
To: construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

Estimada ingeniera,

Por medio del presente correo me permito remitir el informe de interventoría para el periodo de abril de 2025.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada.

Atentamente:
Interventoría
CONSORCIO IHT

INFORME MENSUAL ABRIL PRELIMINAR.pdf
2474K

Gmail construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

2 mensajes

Interventoría Timba <interventoria.timba@gmail.com> 2 de mayo de 2025, 11:22 a.m.
Para: construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

Estimada ingeniera,

Por medio del presente correo me permito remitir el informe de interventoría para el periodo de abril de 2025.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada.

Atentamente:
Interventoría
CONSORCIO IHT

INFORME MENSUAL ABRIL PRELIMINAR.pdf
2474K

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com> 12 de mayo de 2025, 8:00 a.m.
Para: Interventoría Timba <interventoria.timba@gmail.com>

Cordial saludo.

Por favor enviar informe del mes de abril con anexos. Gracias
[Texto citado oculto]

Gmail

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

DOCUMENTOS CARGUE PISIS CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIMBA

1 mensaje

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com> 20 de mayo de 2025, 2:53 p.m.
Para: "Ing. Rodrigo Gómez G." <sistemas@esenorte1.gov.co>
CC: gerencia gerencia <gerencia@esenorte1.gov.co>

Cordial saludo Ing.

Adjunto la información por favor cargar al pisis las carpetas 5 y 6 . Gracias por su atención.

Atentamente

Carpeta 6 Informe Abril.pdf

Diana Carolina Muñoz Rojas
Supervisor

carpeta 5 parcial 7.pdf
20672K

Gmail construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

Informacion contratista adjudicacion vigencia 2023-2024-2025 ESE NORTE 1

2 mensajes

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com> 21 de mayo de 2025, 3:52 p.m.
Para: asossa@minsalud.gov.co

Cordial saludo.

Adjunto informacion para tramite respectivo

Atentamente

Diana Carolina Muñoz Rojas
Supervisor Ese Norte 1

9 archivos adjuntos

- **OF -03- GER.100 No. 030 Informacion Contratistas contratos vigencia 2024-2025.pdf** 135K
- **Informacion Contratistas Ofertas ganadoras contrato adjudicados 2023.pdf** 196K
- **83800008133_FEB2025_1.pdf** 142K
- **83800008204_ABR2025_2.pdf** 142K
- **83800008206_ABR2025_6.pdf** 142K
- **83800008205_FEB2025_0.pdf** 142K
- **Delegacion Supervisor de proyectos resolucion 1541-2024.pdf** 166K
- **Acuerdo 005 Adicion Res. 1499 y 1541 de 2024.pdf** 348K
- **Acuerdo Adicion Res 1541y1539 Final.pdf** 753K

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com> 23 de mayo de 2025, 2:32 p.m.
Para: contactenos@esenorte1.gov.co

Buenas tardes luisa te envio este correo para tu informacion
[Texto citado oculto]

9 archivos adjuntos

- **OF -03- GER.100 No. 030 Informacion Contratistas contratos vigencia 2024-2025.pdf** 135K
- **Informacion Contratistas Ofertas ganadoras contrato adjudicados 2023.pdf** 196K
- **83800008133_FEB2025_1.pdf** 142K
- **83800008204_ABR2025_2.pdf** 142K
- **83800008206_ABR2025_6.pdf** 142K
- **83800008205_FEB2025_0.pdf** 142K

Delegacion Supervisor de proyectos resolucion 1541-2024.pdf
166K

Acuerdo 005 Adicion Res. 1499 y 1541 de 2024.pdf
348K

Acuerdo Adicion Res 1541y1539 Final.pdf
753K

Gmail

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

Información Cargue Pisis ID 4093323003

1 mensaje

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com> 26 de mayo de 2025, 10:56 a.m.
Para: "Ing. Rodrigo Gómez G." <sistemas@esenorte1.gov.co>

Cordial Saludo Ingeniero

Adjunto documentos por favor para cargue. asi

N5 Carpeta 5 pisis
N6 Carpeta 6 pisis

Gracias

Atentemente

Diana Carolina Muñoz
Supervisor

N5 Acta Parcial.pdf

N6 Informe.pdf

Gmail construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

Informe de Seguimiento Centro de Salud Timba Cauca

1 mensaje

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com> 26 de mayo de 2025, 8:31 p.m.
Para: asossa@minsalud.gov.co
CC: Vivian Anyeli Rivera Corrales <vivian.rivera@cauca.gov.co>, Didier Iván Golondrino Leon <didiergolondrino.salud@cauca.gov.co>, gerencia gerencia <gerencia@esenorte1.gov.co>

Adjunto informe mensual de seguimiento. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Gracias por su atención.

Atentamente

Diana Carolina Muñoz Rojas
Supervisor Ese Norte 1

Formato de Seguimiento Proyecto Timba Cauca Mayo 2025.xlsx
13900K

Gmail

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

Solicitud de Informe de Interventoria Centro Salud Timba Cauca

1 mensaje

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com> 26 de mayo de 2025, 8:37 p.m.
Para: CONSORCIO IHT <consorcioiht@gmail.com>

Cordial saludo.

Adjunto requerimiento del asunto para trámite pertinente.

Gracias por su atención

Atentamente

Diana Carolina Muñoz Rojas
Supervisor Ese Norte 1

Oficio Cumplimiento Informes de Obra.docx.pdf
173K

Gmail

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

Solicitud de Balance de Obra Centro de salud Timba

1 mensaje

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com> 26 de mayo de 2025, 9:01 p.m.
Para: CONSORCIO IHT <consorcioiht@gmail.com>

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el avance de obra y los compromisos adquiridos en comité de seguimiento del MSPS y secretaria de salud departamental solicito comedidamente la entrega prioritaria del balance de la obra para realizar las correspondientes gestiones de recursos que permitan la ejecución a cabalidad del contrato

Gracias por la atención prestada

Atentamente

Diana Carolina Muñoz Rojas
Supervisor Ese Norte 1

Solicitud Balance de Obra.docx.pdf
174K
