GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FEBRERO DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

FEBRERO DEL 2025

OBJETO
CONTRATO NO.4155 DE 2024

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

FEBRERO DEL 2025

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO	ING. STEPHANIE LARA
MOTONIVELADORA # KMTGD033ERA002081	NOLBERTO ORTEGON
RETROEXCAVADORA #38	EDISON ROJAS
VOLQUETA #14	JULIAN GOMEZ
VOLQUETA #41	JUAN DIEGO ROJAS

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

FEBRERO DEL 2025

VIA INTERVENIDA

PLANDAS:

PLANADAS – BELLA VISTA

PLANADAS – LA ESTRELLA

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

FEBRERO DEL 2025

MAQUINARIA EN OPERACIÓN









FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

FEBRERO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE MATERIAL REALIZADAS EN BELLA VISTA

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
10/02/2025	K0+000	K0+400	14 , 41	7	8	56
11/02/2025	K0+400	K0+800	14 , 41	7	8	56
12/02/2025	K0+800	K1+200	14 , 41	7	8	56
13/02/2025	K1+200	K1+600	14 , 41	7	8	56
14/02/2025	K1+600	K2+000	14 , 41	7	8	56
15/02/2025	K2+000	K2+400	14 , 41	7	8	56
16/02/2025	K2+400	K2+800	14 , 41	7	8	56
17/02/2025	K2+800	K3+200	14 , 41	7	8	56
18/02/2025	K3+200	K3+600	14 , 41	7	8	56
19/02/2025	K3+600	K4+000	14 , 41	7	8	56
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						560

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

FEBRERO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN REALIZADAS EN BELLA VISTA

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA
	DE	A			
10/02/2025	K0+000	K0+400	400	5	2.000
11/02/2025	K0+400	K0+800	400	5	2.000
12/02/2025	K0+800	K1+200	400	5	2.000
13/02/2025	K1+200	K1+600	400	5	2.000
14/02/2025	K1+600	K2+000	400	5	2.000
15/02/2025	K2+000	K2+400	400	5	2.000
16/02/2025	K2+400	K2+800	400	5	2.000
17/02/2025	K2+800	K3+200	400	5	2.000
18/02/2025	K3+200	K3+600	400	5	2.000
19/02/2025	K3+600	K4+000	400	5	2.000
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					20.000

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

FEBRERO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE CUNETAS REALIZADAS EN BELLA VISTA

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL
	DE	A			
10/02/2025	K0+000	K0+400	400	1	400
11/02/2025	K0+400	K0+800	400	1	400
12/02/2025	K0+800	K1+200	400	1	400
13/02/2025	K1+200	K1+600	400	1	400
14/02/2025	K1+600	K2+000	400	1	400
15/02/2025	K2+000	K2+400	400	1	400
16/02/2025	K2+400	K2+800	400	1	400
17/02/2025	K2+800	K3+200	400	1	400
18/02/2025	K3+200	K3+600	400	1	400
19/02/2025	K3+600	K4+000	400	1	400
TOTAL CUNETA					4.000

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

FEBRERO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE MATERIAL REALIZADAS EN LA ESTRELLA

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
24/02/2025	K0+000	K0+500	14 , 41	7	8	56
25/02/2025	K0+500	K1+000	14 , 41	7	8	56
26/02/2025	K1+000	K1+500	14 , 41	7	8	56
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						**168**

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

FEBRERO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN REALIZADAS EN LA ESTRELLA

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA
	DE	A			
24/02/2025	K0+000	K0+500	500	5	2.500
25/02/2025	K0+500	K1+000	500	5	2.500
26/02/2025	K1+000	K1+500	500	5	2.500
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					**7.500**

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

FEBRERO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE CUNETAS REALIZADAS EN LA ESTRELLA

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL
	DE	A			
24/02/2025	K0+000	K0+500	500	1	500
25/02/2025	K0+500	K1+000	500	1	500
26/02/2025	K1+000	K1+500	500	1	500
TOTAL CUNETA					1.500

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

FEBRERO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS

TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO	KM
PLANADAS – BELLA VISTA	4
PLANADAS – LA ESTRELLA	1,5
TOTAL MEJORAMIENTO	**5,5**

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

RESGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENDE DE TRABAJO PLANADAS

FEBRERO DE 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE PLANADAS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10 DE FEBRERO DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. VIAS DEL MUNICIPIO 5
5.1 SECTOR 1: 5
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 6
6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 7
7.1 PERSONAL UTILIZADO 7
7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 7
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 8
8.1 ACTIVIDADES EN PLANADAS 8

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Planadas – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto por realizar consta del mantenimiento de 11.9 kilómetros de la red vial entre el cruce de la vereda San Miguel y la vereda La Hacienda en el corregimiento de Gaitania del Municipio de Planadas, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento a cada tramo a intervenir de las veredas San Miguel y la vereda la Unión, logrando así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a estas comunidades.

Adicionalmente se realiza corrección del tramo de vía en la vereda Villanueva. Esta es una obra que representa un gran aporte para el sur del Tolima, teniendo en cuenta que es una red vial que comunica estas veredas con el corregimiento de Gaitania y el casco urbano de Planadas, siendo importante para las comunidades allí presentes, además favorece la capacidad en el transporte para todos los habitantes, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y altamente cafetero.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

El municipio de Planadas, está ubicado al sur occidente del país, al sur oriente del departamento del Tolima, en las estribaciones de la cordillera central de los Andes Colombianos. La localización geográfica del municipio es de 03º11´51" de latitud Norte y 75º38´54" de longitud Oeste. Conformado por el corregimiento de Gaitania y Bilbao. su cabecera municipal está a 235 Kms de Ibagué, la capital del departamento

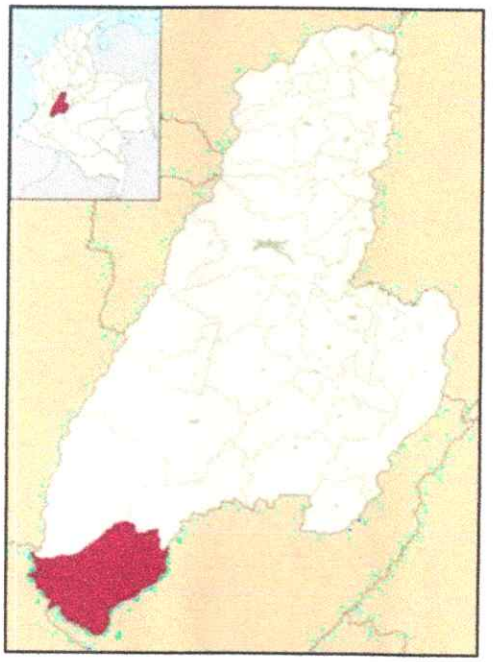


Figura 1. Localización municipio de Planadas.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL

Conformación de la red vía.

5. VIAS DEL MUNICIPIO

5.1 SECTOR 1:

El sector 1, es la zona que comunica el Municipio de Planadas con Bilbao.



6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca y remoción de derrumbes.

Se realizaron las actividades de mantenimiento con la motoniveladora en la vía Planadas – La Estrella y Planadas – Bellavista para realizar la adecuación a la carpeta de rodadura en diferentes puntos del corredor vial. Se realizo mejoramiento y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca en la vereda.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se conformaron 5.5 km de vía y el estado del tiempo y las condiciones climáticas no fueron favorables y se registraron lluvias equivalentes a un total de 24 horas en el mes.

6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, Se han conformado 5.5 kilómetros de vía correspondiente al municipio de Rioblanco:

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
Del 10/02/2025 al 21/02/2025	Planadas – Bella Vista	4
Del 24/02/2025 al 28/02/2025	Planadas – La Estrella	1.5
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS		5.5 KM

7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	STEPHANIE LARA
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	EDISON ROJAS
OPERARIO DE MOTONIVELADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	NOLBERTO ORTEGON
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	JUAN DIEGO ROJAS
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	JULIAN GOMEZ

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:


MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	38	1
MOTONIVELADORA	KMTGD033ERA002081	1
VOLQUETA	14 , 41	2

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN PLANADAS



PLANADAS – BELLA VISTA

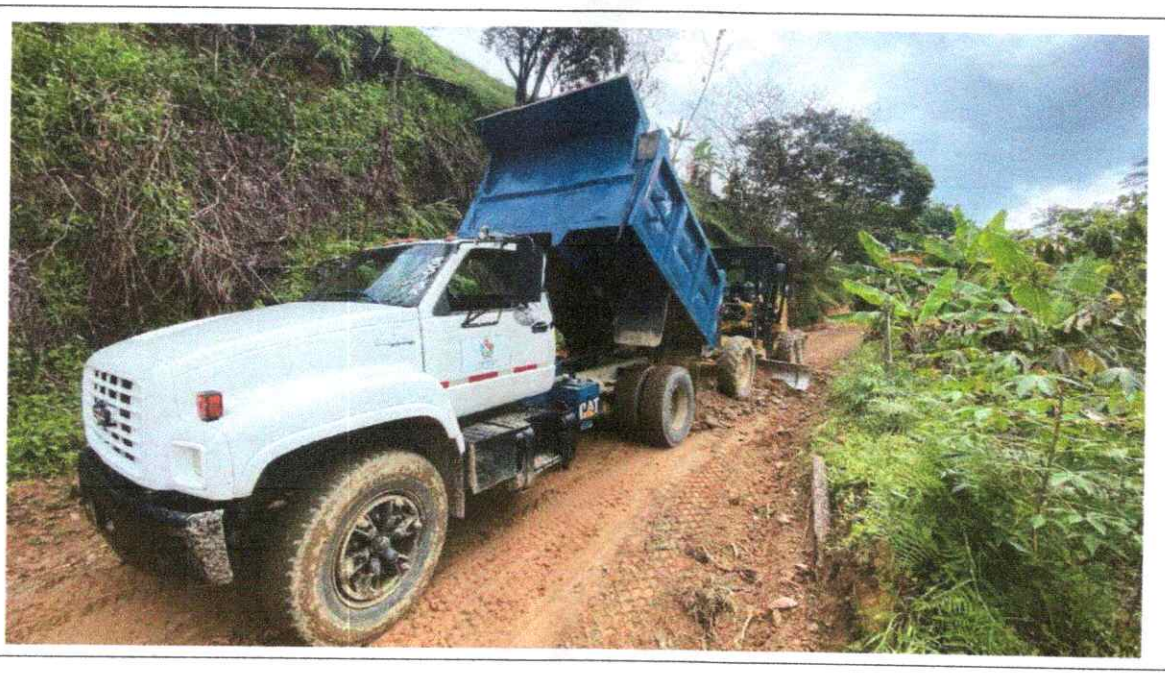

PLANADAS – BELLA VISTA



PLANADAS – BELLA VISTA



PLANADAS – BELLA VISTA



PLANADAS – BELLA VISTA



PLANADAS – BELLA VISTA



PLANADAS – BELLA VISTA



PLANADAS – BELLA VISTA



PLANADAS – BELLA VISTA



PLANADAS – LA BELLA VISTA



PLANADAS – LA BELLA VISTA



PLANADAS – LA BELLA VISTA



PLANADAS – LA BELLA VISTA



PLANADAS – LA BELLA VISTA



PLANADAS – LA BELLA VISTA



PLANADAS – LA BELLA VISTA



PLANADAS – LA BELLA VISTA



PLANADAS – LA BELLA VISTA




PLANADAS – LA BELLA VISTA



PLANADAS – LA BELLA VISTA



PLANADAS – LA BELLA VISTA

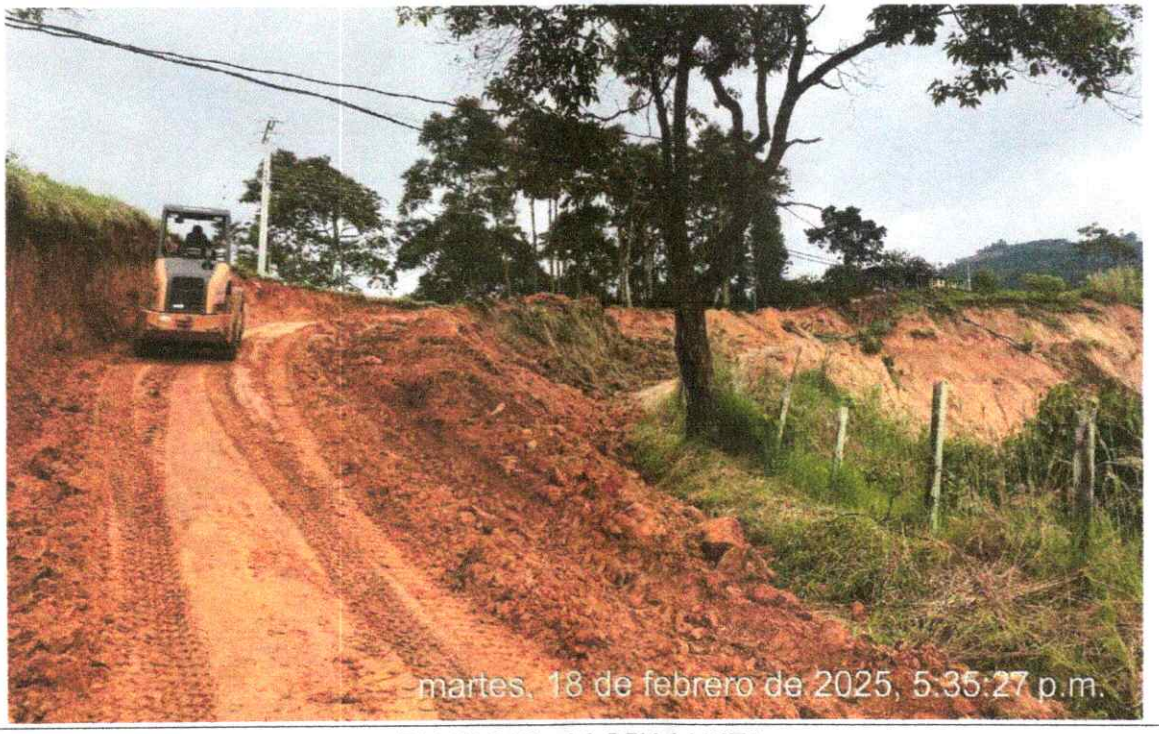

PLANADAS – LA BELLA VISTA



PLANADAS – LA BELLA VISTA



PLANADAS – LA BELLA VISTA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



PLANADAS – LA BELLA VISTA



PLANADAS – LA BELLA VISTA



PLANADAS – LA BELLA VISTA



PLANADAS – LA BELLA VISTA




PLANADAS – LA BELLA VISTA



PLANADAS – LA BELLA VISTA



PLANADAS – LA ESTRELLA

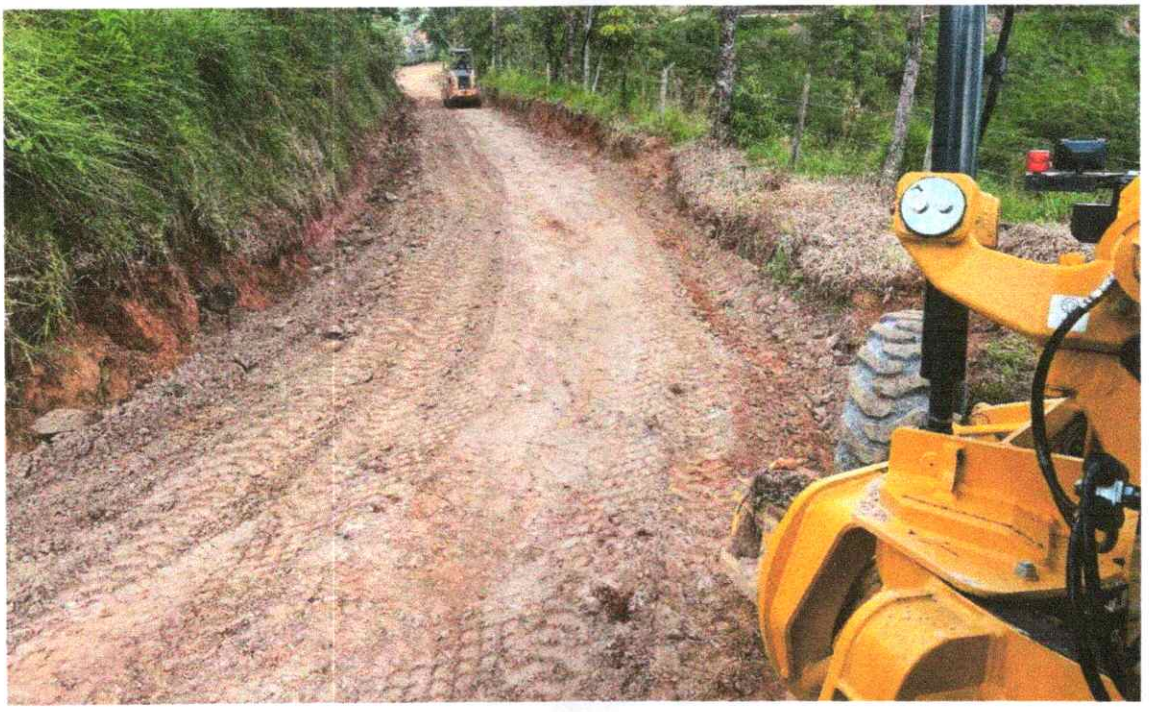

PLANADAS – LA ESTRELLA



PLANADAS – LA ESTRELLA




PLANADAS – LA ESTRELLA



PLANADAS – LA ESTRELLA



PLANADAS – LA ESTRELLA

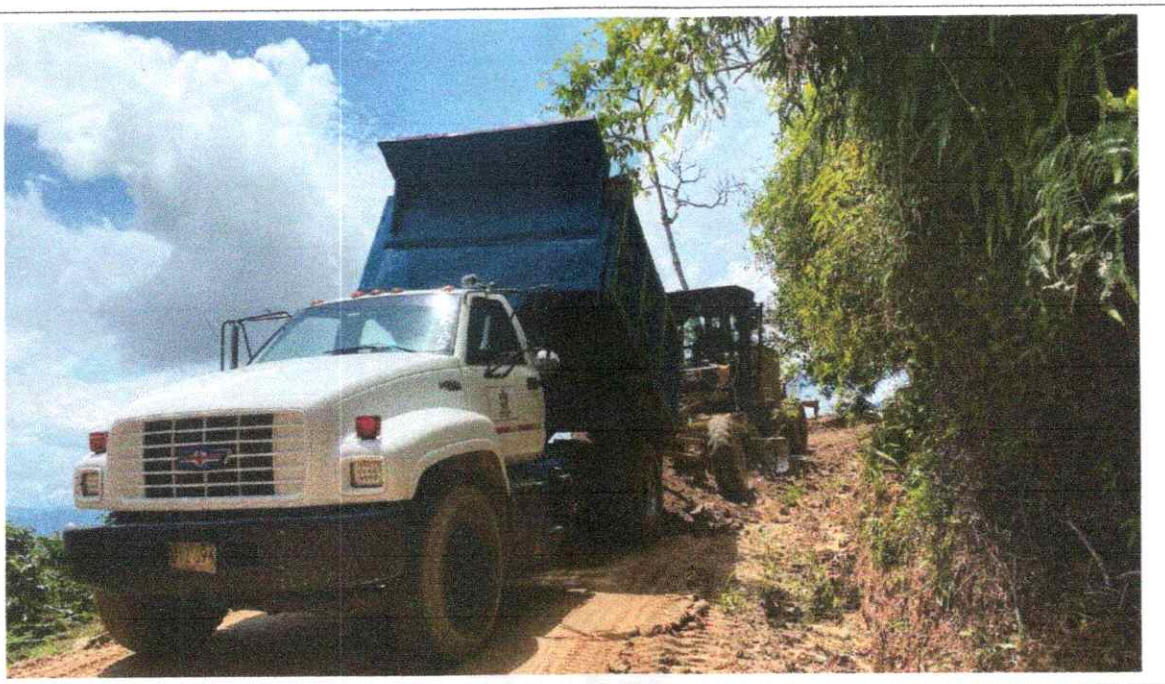


PLANADAS – LA ESTRELLA



PLANADAS – LA ESTRELLA



PLANADAS – LA ESTRELLA

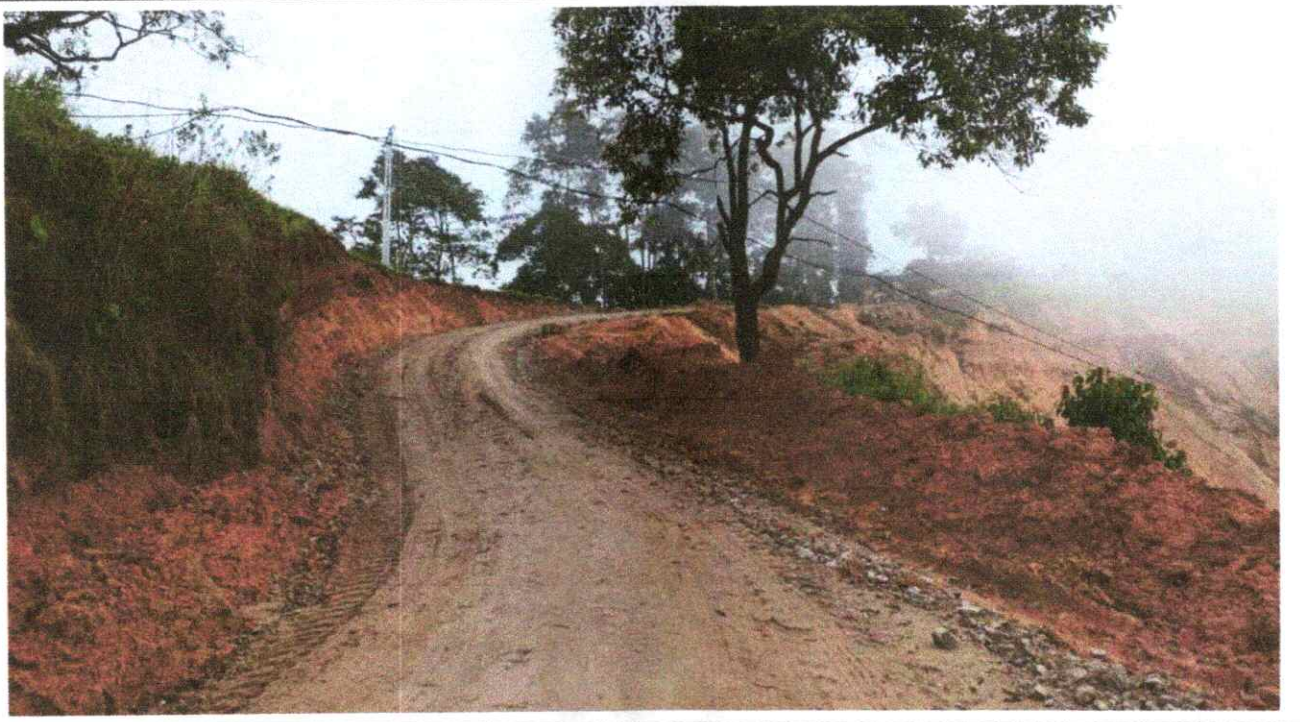

PLANADAS – LA ESTRELLA

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: PLANADAS - BELLA VISTA — **MUNICIPIO: PLANADAS**

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO — **UNIDAD: M3** — **560**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
10/02/2025	K0+000	K0+400	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
11/02/2025	K0+400	K0+800	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
12/02/2025	K0+800	K1+200	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
13/02/2025	K1+200	K1+600	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
14/02/2025	K1+600	K2+000	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
15/02/2025	K2+000	K2+400	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
16/02/2025	K2+400	K2+800	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
17/02/2025	K2+800	K3+200	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
18/02/2025	K3+200	K3+600	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
19/02/2025	K3+600	K4+000	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						**560**	

CARRETERA: PLANADAS - LA ESTRELLA — **MUNICIPIO: PLANADAS**

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO — **UNIDAD: M3** — **168**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
24/02/2025	K0+000	K0+500	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
25/02/2025	K0+500	K1+000	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
26/02/2025	K1+000	K1+500	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						**168**	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO						**728**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024

Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: PLANADAS - BELLA VISTA — **MUNICIPIO: PLANADAS**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					UNIDAD: M2	20.000
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
10/02/2025	K0+000	K0+400	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
11/02/2025	K0+400	K0+800	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
12/02/2025	K0+800	K1+200	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
13/02/2025	K1+200	K1+600	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
14/02/2025	K1+600	K2+000	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
15/02/2025	K2+000	K2+400	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
16/02/2025	K2+400	K2+800	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
17/02/2025	K2+800	K3+200	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
18/02/2025	K3+200	K3+600	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
19/02/2025	K3+600	K4+000	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					20.000	

CARRETERA: PLANADAS - LA ESTRELLA — **MUNICIPIO: PLANADAS**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					UNIDAD: M2	7.500
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
24/02/2025	K0+000	K0+500	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
25/02/2025	K0+500	K1+000	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
26/02/2025	K1+000	K1+500	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					7.500	
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					20.000	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024

Firma:

Nombre: Stephanie Lara H

c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis L

c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: PLANADAS - BELLA VISTA — **MUNICIPIO: PLANADAS**

CONFORMACION DE CUNETAS — **UNIDAD: ML** — **4.000**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
10/02/2025	K0+000	K0+400	400	1	400	Se laboro Normalmente.
11/02/2025	K0+400	K0+800	400	1	400	Se laboro Normalmente.
12/02/2025	K0+800	K1+200	400	1	400	Se laboro Normalmente.
13/02/2025	K1+200	K1+600	400	1	400	Se laboro Normalmente.
14/02/2025	K1+600	K2+000	400	1	400	Se laboro Normalmente.
15/02/2025	K2+000	K2+400	400	1	400	Se laboro Normalmente.
16/02/2025	K2+400	K2+800	400	1	400	Se laboro Normalmente.
17/02/2025	K2+800	K3+200	400	1	400	Se laboro Normalmente.
18/02/2025	K3+200	K3+600	400	1	400	Se laboro Normalmente.
19/02/2025	K3+600	K4+000	400	1	400	Se laboro Normalmente.
TOTAL CUNETA					**4.000**	

CARRETERA: PLANADAS - LA ESTRELLA — **MUNICIPIO: PLANADAS**

CONFORMACION DE CUNETAS — **UNIDAD: ML** — **1.500**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
24/02/2025	K0+000	K0+500	500	1	500	Se laboro Normalmente.
25/02/2025	K0+500	K1+000	500	1	500	Se laboro Normalmente.
26/02/2025	K1+000	K1+500	500	1	500	Se laboro Normalmente.
TOTAL CUNETA					**1.500**	
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					**4.000**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024
Firma: _____
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024
Firma: _____
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENDE DE TRABAJO PLANADAS

FEBRERO DE 2025

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: KMTGD033ERA002081 MARCA: KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: PLANADAS - BELLA VISTA FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 10 DE FEBRERO AL 16 DE FEBRERO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	17		21		28		34		41		47		53	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X		X		X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		21		28		34		41		47		53		59	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: KMTGD033ERA002081 MARCA: KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: PLANADAS - BELLA VISTA FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 17 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	59		65		70		76		76					
		DIA	LUN.		MAR.		MIÉR.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		65		70		76		76		76					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: KMTGD033ERA002081 MARCA: KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: PLANADAS - LA ESTRELLA FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 24 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	76		81		85		90		90					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		81		85		90		90		90					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: RETRO 38 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: PLANADAS - LA ESTRELLA FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 24 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	3917		3922		3928		3932		3932					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		3922		3928		3932		3932		3932					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 **MODELO:** **RETRO 40** **MARCA:** **CAT**

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** **PLANADAS - BELLA VISTA** **FRENTE DE TRABAJO:** **PLANADAS**

PERIODO: 17 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	3902		3907		3913		3917		3917					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		3907		3913		3917		3917		3917					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: RETRO 40 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: PLANADAS - BELLA VISTA FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 10 DE FEBRERO AL 16 DE FEBRERO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	3869		3872		3877		3881		3887		3892		3896	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		3872		3877		3881		3887		3892		3896		3902	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 10 DE FEBRERO AL 16 DE FEBRERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: NGX 920**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	41	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: PLANDAS - BELLA VISTA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1105612425			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		
		18816		18908		19000		19092		19184		19276		19368		
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X		
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X		
	Gato	X		X		X		X		X		X		X		
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL	18908		19000		19092		19184		19276		19368		19460		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 17 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: NGX 920**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	41	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: PLANDAS - BELLA VISTA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1105612425			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**						
		19460		19552		19644		P		P						
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**						
	KILOMETRAJE FINAL	19552		19644		P		P		P						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 24 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025			
CONTRATO	4155 DE 2024	PLACA: NGX 920	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	41	MODELO: 2023	FRENTE DE TRABAJO: PLANDAS - LA ESTRELLA
INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA			LOCALIZACION: PLANADAS
Licencia de conduccion: 1105612425			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00						
		19736		19786		19878		19916		19916						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL	19786		19878		19916		19916		19916						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		Firma Verificación Inspector:
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL – MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN RED VIAL 3 "MARV 3"	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 10 DE FEBRERO AL 16 DE FEBRERO 2025			
CONTRATO	1642 DE 2023	**PLACA: OTI 694**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	14	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: PLANDAS - BELLA VISTA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1083883940			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		
		131664		131720		131776		131832		131888		131944		132000		
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X		
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X		
	Gato	X		X		X		X		X		X		X		
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		
	KILOMETRAJE FINAL	131720		131776		131832		131888		131944		132000		132056		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL – MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN RED VIAL 3 "MARV 3"	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 17 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO 2025

CONTRATO	1642 DE 2023	**PLACA: OTI 694**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	14	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: PLANDAS - BELLA VISTA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1083883940			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**						
		132056		132112		132168		132224		132224						
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**						
	KILOMETRAJE FINAL	132112		132168		132224		132224		132224						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL – MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN RED VIAL 3 "MARV 3"	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 24 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025

CONTRATO	1642 DE 2023	**PLACA: OTI 694**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	14	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: PLANDAS - LA ESTRELLA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1083883940			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**						
		132224		132280		132336		132729		132729						
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**						
	KILOMETRAJE FINAL	132280		132336		132729		132729		132729						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENDE DE TRABAJO PLANADAS

FEBRERO DE 2025

FRENTE PLANADAS								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
3	4-feb-25	10:48:05	101488	**49,131**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
29	8-feb-25	11:58:26	101761	**94,286**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
30	8-feb-25	12:13:11	101763	**30,489**	$ 320.135,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
31	8-feb-25	12:51:38	101776	**64,633**	$ 678.647,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
32	8-feb-25	13:23:01	101782	**40,000**	$ 420.000,00	ESTACION DISTRACOM	Julian Gomez V#14	FRENTE PLANADAS
33	8-feb-25	11:57:56	101759	**24,229**	$ 254.405,00	ESTACION DISTRACOM	Juan Rojas V#41	FRENTE PLANADAS
112	22-feb-25	11:38:13	102607	**30,362**	$ 318.801,00	ESTACION DISTRACOM	Julian Gomez V#14	FRENTE PLANADAS
113	22-feb-25	11:43:52	102609	**94,286**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
114	22-feb-25	11:56:17	102611	**94,286**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
115	22-feb-25	12:07:13	102614	**94,286**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
116	22-feb-25	12:17:58	102615	**26,092**	$ 273.966,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS

TOTAL MES	642,080
MES ANTERIOR	240,000
TOTAL ACPM	882,080

CONSUMO MES	622,080
REMANENTE	260,000

VERSION 1	GOB-M-014
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

MUNICIPIO: PLANADAS VEREDA : PLANADAS COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: PLANADAS - BELLAVISTA , PLANADAS - LA ESTRELLA

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES()		MARTES ()		MIERCOLES ()		JUEVES()		VIERNES()		SABADO(1)		DOMINGO (2)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	KMT2081	JOLBERTO ORTEGON																	0,000
2	RETROEXCAVADORA	38	EDISON ROJAS																	0,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS																	0,000
4	VOLQUETA	14	JULIAN GOMEZ																	0,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (3)		MARTES (4)		MIERCOLES (5)		JUEVES(6)		VIERNES (7)		SABADO(8)		DOMINGO (9)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	KMT2081	JOLBERTO ORTEGON																	0,000
2	RETROEXCAVADORA	38	EDISON ROJAS																	0,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS											24,229						24,229
4	VOLQUETA	14	JULIAN GOMEZ											40						40,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(10)		MARTES(11)		MIERCOLES(12)		JUEVES(13)		VIERNES(14)		SABADO(15)		DOMINGO (16)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	KMT2081	JOLBERTO ORTEGON			40						40								80,000
2	RETROEXCAVADORA	38	EDISON ROJAS			36						36								72,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS			30						30								60,000
4	VOLQUETA	14	JULIAN GOMEZ			30						30								60,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(17)		MARTES(18)		MIERCOLES(19)		JUEVES(20)		VIERNES(21)		SABADO(22)		DOMINGO (23)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	KMT2081	JOLBERTO ORTEGO	40																40,000
2	RETROEXCAVADORA	38	EDISON ROJAS	36																36,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS	30																30,000
4	VOLQUETA	14	JULIAN GOMEZ	30										30,362						60,362
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(24)		MARTES(25)		MIERCOLES (26)		JUEVES(27)		VIERNES(28)		SABADO( )		DOMINGO ( )				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	KMT2081	JOLBERTO ORTEGON			30														30,000
2	RETROEXCAVADORA	38	EDISON ROJAS			29,489														29,489
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS			30														30,000
4	VOLQUETA	14	JULIAN GOMEZ			30														30,000
5																				0,000

622,080

OBSERVACIONES: Viene 240 gl del mes de Febrero.Se traslada 260 gl para el mes de Marzo

VoBo SUPERVISOR (A): _____ VoBo COORDINADOR: _____

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Planadas
FECHA : 04/02/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Planadas la cantidad de 49,131 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 04 de Febrero del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 101488
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/02/04
Vencimiento: 2025/03/06
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: MAQUINAR
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora: 10:48:05
Combustible: DIESEL
Volumen: 49.1310
Precio: $10540
Total: $517841

Panel: MFC501
Dispositivo: HAND283-04
Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Planadas

3.00

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Planadas
FECHA : 08/02/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Planadas la cantidad de 253,637 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 08 de Febrero del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 101761
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/02/08
Vencimiento:	2025/03/10
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	11:58:26
Combustible:	DIESEL
Volumen:	94.2860
Precio:	$10500
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Dispositivo:	HAND283-05
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 101763
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/02/08
Vencimiento:	2025/03/10
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANDAS
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	12:13:11
Combustible:	DIESEL
Volumen:	30.4890
Precio:	$10500
Total:	$320135
Panel:	MFC499
Dispositivo:	HAND283-05
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 101776
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/02/08
Vencimiento:	2025/03/10
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	12:51:38
Combustible:	DIESEL
Volumen:	64.6330
Precio:	$10500
Total:	$678647
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 101782
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/02/08
Vencimiento:	2025/03/10
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OT1694
Kilometros:	131987
Cedula:	800113672
Hora:	13:23:01
Combustible:	DIESEL
Volumen:	40.0000
Precio:	$10500
Total:	$420000
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Carlos Julian Gomez
1083093940

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 101759
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/02/08
Vencimiento: 2025/03/10
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: NGX920
Kilometros: 19094
Cedula: 800113672

Hora: 11:57:56
Combustible: DIESEL
Galones: 24.2290
Precio: $10500
Total: $254405

Panel: MEC500
Dispositivo: HAND283-03
Empleado: BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:
Juan Diego Rojas
1110577268

Nombre:

V #41

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Planadas
FECHA : 22/02/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Planadas la cantidad de 339,312 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 22 de Febrero del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 102607
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/02/22
Vencimiento:	2025/03/24
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OII694
Kilometros:	132486
Cedula:	800113672
Hora:	11:38:13
Combustible:	DIESEL
Volumen:	30.3620
Precio:	$10500
Total:	$318801
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Vol 9x+9
14
Planadas

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 102609
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/02/22
Vencimiento:	2025/03/24
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Hora:	11:43:52
Combustible:	DIESEL
Volumen:	94.2860
Precio:	$10500
Total:	$990000
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Planadas

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 102611
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/02/22
Vencimiento:	2025/03/24
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	11:56:17
Combustible:	DIESEL
Volumen:	94.2860
Precio:	$10500
Total:	$990000
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Planadas

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 102614
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/02/22
Vencimiento:	2025/03/24
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	12:07:13
Combustible:	DIESEL
Volumen:	94.2860
Precio:	$10500
Total:	$990000
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283-05
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Planadas

448

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 102615
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/02/22
Vencimiento: 2025/03/24
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: PLANADAS
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora: 12:17:58
Combustible: DIESEL
Volumen: 26.0920
Precio: $10500
Total: $273966

Panel: MFC501
Dispositivo: HAND283 05
Empleado: DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

458

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE LA COMUNIDAD

FRENDE DE TRABAJO PLANADAS

FEBRERO DE 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-007
CONTRATO 4155 DE 2024

ACTA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO

CONTRATO No. : 4155 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBJETO: ***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.***

MUNICIPIO: Planadas
VEREDA: _____

A los día(s) 01 del mes de febrero de 20 25, se reunieron el Sr (a) _____ como Inspector vial, en representación de **MARV 4** Y el señor (a) _____ en representación de la(s) Comunidad(es) beneficiada(s), con el objeto de informar a los beneficiarios los mantenimientos viales a ejecutar con los aportes asignados por parte de La Gobernación del Tolima.

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron:

Anilgen Cuentas Lugo
Representante de la(s) Comunidad(es).
C.C.No. 38202308

_____
Inspector Contrato 4155 de 2024
MARV 4
C.C.No.

Nombre de la vía Planadas

Fecha: _____

Henry Vasquez	
Robinson Villa Rincon	
Rodrigo villa Rincon	Rodrigo villa.
Elian cuesta Agudelo	
[illegible]	
JORGE PEÑA	JORGE PEÑA
Alexander Lilca oviedo	
Wilson Fernando Florez H.	
Anyi Bibiana escobar quintero	Bibiana Escobar

UNIÓN TEMPORAL MA

GOB-M-007B
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE OBRA A LA COMUNIDAD

CONTRATO No. : 4155 DE NOVIEMBRE DE 2024

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.

MUNICIPIO: Planadas

VEREDA: _____

A los 28 Días del mes de Febrero de 2025, se reunieron _____ como representante (s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal de la(s) Vereda(s) _____ Municipio(s) de _____ y el Sr _____ como Inspector vial designado por **MARV 4,** con el fin de entregar a la comunidad de la(s) vereda(s) antes indicada(s), el mantenimiento vial ejecutado por el Contratista **"MARV 4"** mediante el Contrato No. **4155 DEL 2024.** La intervención realizada fue:

_____
_____
_____
_____
_____

La comunidad a través del (los) presidente(s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal, como representante(s) legal(es), recibe(n) a satisfacción, el mantenimiento de la vía ya descrita(s), comprometiéndose a conservarla(s) en buen estado y realizar su mantenimiento, quedando la empresa MARV 4, exonerada de cualquier tipo de responsabilidad posterior.

En constancia de lo anterior firman:

edilgeneontes luyo

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No. 38202308

_____

Inspector MARV 4
C.C. No.

_____

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No
