HUGO ALBERTO FERNANDEZ

HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL NIT 7225828
Actividad Económica Principal 4321
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta F1 - 27

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764083090052 de 08/11/2024 - 08/11/2026 autoriza F1-21 a F1-100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	16/05/2025 09:45
Fecha de Vencimiento	16/05/2025 09:45
Fecha de Validación	16/05/2025 09:50
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
CC	7225828
Obligación	NO APLICA
Email	hufernandez44@gmail.com
Teléfono	3124827751
Dirección	CR 23 14 60 BRR HELECHOS
Ciudad, Depart.	YOPAL, CASANARE (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
NIT	844004576
Obligación	IVA
Email	e-factura@enerca.com.co
Teléfono	6086344680
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	006	PAGO PARCIAL No 1 ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS 157 DE 2025 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	1	EA	$4,640,000.00		$4,640,000.00	$4,640,000.00

1


Subtotal	$4,640,000.00
Total a Pagar	$4,640,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: cfca7e78f96be9a1e51edb4083b7104764ee2da0863cd695897b14f9f5315570895d304a7fb101cb150218b3df248962

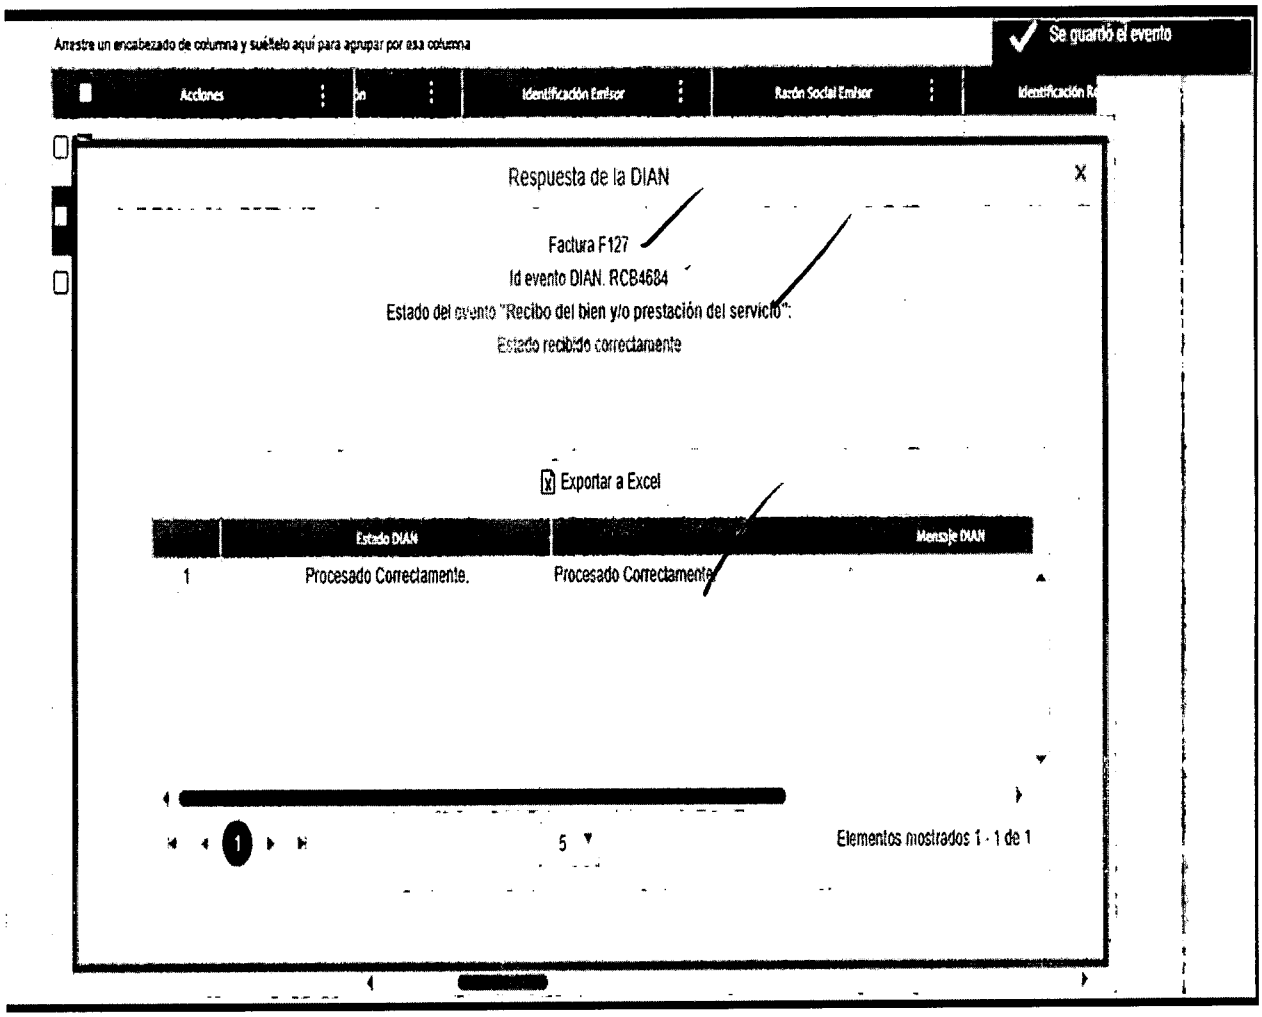
Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna
Se guardó el evento
Acciones
Identificación Emisor
Razón Social Emisor
Respuesta de la DIAN
Factura F127
Id evento DIAN. RCB4684
Estado del evento "Recibo del bien y/o prestación del servicio":
Estado recibido correctamente
Exportar a Excel
Estado DIAN
Mensaje DIAN
1
Procesado Correctamente.
Procesado Correctamente
5
Elementos mostrados 1 - 1 de 1

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 1			ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	Abril 8 a Mayo 7 de 2025		PRESTACION DE SERVICIOS No. 157 DE 2025
CDP N° 7625-77	RP N° 7125-71		
CONTRATISTA	HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL		
SUPERVISOR	LUIS RENE GRANADOS VARGAS		
DEPENDENCIA	GERENCIA DE DISTRIBUCION		
Número de contrato	157 de 2025		
Nombre del contratista	HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL		
NIT o Cédula de ciudadanía	7225828		
Dirección	Cra 23 No 14-60 Yopal	Correo Electrónico Personal	hufernandez44@gmail.com Teléfono: 3124827751
Clase y número de cuenta	Cuenta de: Ahorros	N°: 3552005929	Banco: Scotia Bank Colpatria
Fecha de Suscripción	13 de marzo de 2025		
Fecha de Legalización	7 de abril de 2025		
Fecha de iniciación	8 de abril de 2025		
Fecha prevista de terminación	7 de septiembre de 2025		
Fecha de terminación	7 de septiembre de 2025		
Plazo	Cinco (5) meses		
Objeto del contrato	**REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.**		
Valor	$ 23.200.000		
Adiciones	N.A.		En tiempo N.A.
Suspensiones	N.A.		
Avance del contrato	Financiero %		20,00%
	Tiempo de ejecución		Un (01) mes
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato		**$ 23.200.000**
	Adiciones		$ 0
	Valor total del contrato		**$ 23.200.000**
	Anticipo		N/A
	1er pago		$ 4.640.000
	2do pago		$ 0
	3er pago		$ 0
	Inversión básica realizada		**$ 4.640.000**
	Inversión por ejecutar		**$ 18.560.000**
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA		N/A
	IVA		N/A
	Legaliza anticipo		N/A
	Valor a pagar		**$ 4.640.000**
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTIAS		
	CUMPLIMIENTO		POLIZA N°: BY-100050958
	VIGENCIA DEL : 08/04/2025		HASTA: 13/01/2026
	CALIDAD DEL SERVICIO		POLIZA N°: BY-100050958
	VIGENCIA : Un (1) año contado a partir del acta de terminación		
	NOMBRE ASEGURADORA		Compañía Mundial de Seguros S.A.
PAGO APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA:		9484634814
	VALOR PAGO DE SALUD		$ 219.400
	VALOR PAGO DE PENSIÓN		$ 280.900
	VALOR PAGO DE ARL		$ 9.200

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

Actividad N°1: Conocer en todas sus partes el contenido del contrato de la interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y jurídica; Los pliegos de condiciones y demás documentos del proyecto correspondientes a la interventoría.

Se ha revisado el contenido del contrato de Interventoría con todos su pliego de condiciones y anexos.

Actividad N°2: Apoyar al área de Planeación de la Empresa con la información que se debe reportar al sistema de monitoreo GESPROY, y verificar sea enviada oportunamente.

Se ha reportado al sistema de monitoreo GESPROY la información requerida inicialmente así como el avance a corte del día 30 de abril de 2025

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 1		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	Abril 8 a Mayo 7 de 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 157 DE 2025
CDP N° 7625-77	RP N° 7125-71	
CONTRATISTA	HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL	
SUPERVISOR	LUIS RENE GRANADOS VARGAS	
DEPENDENCIA	GERENCIA DE DISTRIBUCION	

Actividad N°3: Cumplir con todas las actividades establecidas en el procedimiento de supervisiones e Interventorías PR-MAJ-SI-01 del Sistema Integrado de Gestión (SIG) para apoyar al supervisor de la interventoría.
Se cumple con las actividades establecidas en el procedimiento de supervisiones e interventoría.
Actividad N°4: Entregar los informes mensuales en los tiempos establecidos y la información que sea requerida por el supervisor de la OPS y por el supervisor del contrato de interventoría objeto del proyecto, velando por el cumplimiento de las actividades contractuales conforme a la normatividad vigente.
Se ha hecho entrega de el informe mensual dentro de los tiempos establecidos y se ha apoyado con la información requerida por el supervisor para que se lleve a cabo el cumplimiento de las actividades contractuales.
Actividad N°5: Apoyar a la oficina de contratación y jurídica, para registrar todas las actividades de seguimiento y control en el sistema de información que disponga la empresa para tal fin, así mismo desarrollar las gestiones y servicios a que haya lugar con otras áreas internas y/o externas de la Empresa, para garantizar la adecuada ejecución del proyecto relacionada con la interventoría
Se ha realizado el apoyo a la oficina de contratación y jurídica para el seguimiento y control en las plataformas que tiene la empresa para dicho fin.
Actividad N°6: Velar por la aplicación de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional dispuestas en el proceso MMA-SO establecido en SIG.
Se ha revisado la aplicación y cumplimiento de las normas de seguridad Industrial y Salud Ocupacional de acuerdo con el proceso.
Actividad N°7: Apoyar, recomendar, sugerir medidas y emitir conceptos que considere convenientes y necesarios con la ejecución del objeto contractual.
se ha realizado apoyo en los comités realizados y se han emitido conceptos de acuerdo con el objeto de la ejecución del contrato.
Actividad N°8: Apoyar en la revisión las actas contractuales de conformidad con los soportes presentados por el contratista e Interventor durante la ejecución del proyecto.
En este periodo se ha revisado las actas de inicio con el cumplimiento de los requisitos exigidos. No se han tramitado actas de cobro parciales de interventoría.
Actividad N°9: Acopiar la documentación técnica y llevar un estricto control sobre la correspondencia que se produzca; organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato (proyecto)
Se hace acopio de la información técnica y correspondencia generada.
Actividad N°10: Analizar la consistencia de la Información y revisar todas las actas suscritas que se requieran durante el desarrollo del proyecto.
Se ha revisado la información y suscritos las actas de inicio correspondientes
Actividad N°11: Revisar las actas de liquidación (proyectadas por la interventoria) de cada uno de los contratos derivados del proyecto.
Para este periodo no se tienen aún actas de liquidación proyectadas por parte de la interventoría.
Actividad N°12: Desarrollar las actividades establecidas en el Acto de gerencia No. 219 de 12 de septiembre de 2013 por medio del cual se adopta el manual de supervisión e interventoria, actividades señaladas en los capítulos I Numeral 5 y 6 y capitulo II al VIII.
Se han desarrollado las actividades de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría.
Actividad N°13: Apoyar a la supervisión realizando visitas esporádicas al sitio donde se desarrolla el proyecto para verificar la permanencia de la interventoría para el adecuado seguimiento al desarrollo de las obras.
Se ha realizado visita al sitio de las obras en apoyo a la supervisión el día 30 de abril de 2025
Actividad N°14: Asegurar que el interventor adecue la vigencia y/o el valor de las garantías según lo pactado en el contrato.
Se ha revisado que la interventoría adecúe la actualización de las pólizas.
Anexos: 1. Planilla de pago y Recibo de consignación correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de Abril de 2025, en dos (2) folios.
Anexos: 2.

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL FIRMA:
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revisé y por lo tanto autorizo el pago.
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	NOMBRE: LUIS RENE GRANADOS VARGAS FIRMA:

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7225828		FERNANDEZ SANDOVAL HUGO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 23 N 14 60 BRR bello horizonteS	YOPAL-CASANARE	3555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1461598688	9484634814	1	2025/05/08	2025/05/06	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$509,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,900	$0	$0	$280,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,900	$0	$0	$280,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$219,400	$0	$0	$219,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$219,400	$0	$0	$219,400
TOTAL				1	$509,500	$0	$0	$509,500

2025/05/06 10:54 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7225828		FERNANDEZ SANDOVAL HUGO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 23 N 14 60 BRR bello horizonteS	YOPAL-CASANARE	3555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1461598688	9484634814	I	2025/05/08	2025/05/06	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$509,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,755,084	$280,900			$1,755,084	$219,400			$0	$0			$1,755,084	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,755,084	$280,900			$1,755,084	$219,400			$0	$0			$1,755,084	$9,200		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$1,755,084	$280,900			$1,755,084	$219,400			$0	$0			$1,755,084	$9,200		$0	$0
1	CC 7225828	FERNANDEZ HUGO	25-14	30	$1,755,084	$280,900	EPS037	30	$1,755,084	$219,400		0	$0	$0	14 25	30	$1,755,084	$9,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,755,084	$280,900			$1,755,084	$219,400			$0	$0			$1,755,084	$9,200		$0	$0

1056000 296.960 232000 9188

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/05/06 10:54 AM

HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL

PLAN DE PAGOS OPS N°157 DE 2025

FECHA	10	04	2025

OPS No. 157 del 13 de marzo de 2025 **N° REGISTRO SPGR:** 7125

BPIN 2024005850142

CLASE:

PRESTACION DE SERVICIOS	☑	OBRA	☐	OTRO	☐
CONSULTORÍA	☐	SUMINISTRO O COMPRA	☐		

PROGRAMACION DE PAGOS INICIAL. SI ☑ NO ☐

OBJETO DEL OPS : REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR OPS $23.200.000 ANTICIPO N/A

CONTRATISTA: Hugo Alberto Fernández Sandoval NIT 7225828-3 SUPERVISOR LUIS RENE GRANADOS VARGAS

FORMA DE PAGO

El valor total del OPS 157 de 2025 para efectos legales y fiscales es la suma de: VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($23,200,000.00). Los pagos para la presente vigencia se solicita programar de la siguiente manera:

Nota: tener en cuenta la clausula de condiciones de Pago del CONTRATO u OPS.

PAGO N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	22/05/2025	PAGO 1- ACTA PARCIAL No 1	$ 4.640.000
2	24/06/2025	PAGO 2- ACTA PARCIAL No 2	$ 4.640.000
3	22/07/2025	PAGO 3- ACTA PARCIAL No 3	$ 4.640.000
4	22/08/2025	PAGO 4- ACTA PARCIAL No 4	$ 4.640.000
5	22/09/2025	PAGO 5- ACTA PARCIAL No 5	$ 4.640.000
TOTAL OPS 157-2025			**$ 23.200.000**

La presente programación se presenta el dia: 10 de abril de 2025

HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
CONTRATISTA

Luis René Granados Vargas
LÍDER SUPERVISION E INTERVENTORÍA

Scotiabank. COLPATRIA

SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
NIT. 860.034.594-1

CERTIFICA QUE:

La cuenta de ahorros No. 3552005929 , con fecha de apertura 22 de Febrero de 2017 , de la cual es titular:

El (la) señor(a): HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
Identificado(a) con tipo de documento C No. 7.225.828

La cuenta en mención ha sido manejada de acuerdo a las normas establecidas por la entidad.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 18 días del mes de Junio de 2024 .

Cordialmente,

Servicio al Cliente

Scotiabank Colpatria S.A.
www.scotiabankcolpatria.com
Scotiabank COLPATRIA

Scotiabank Colpatria. S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 25009178

FECHA BANCO: 13-MAR-2025

FECHA REG.LIBRO: 20-MAR-2025

TERCERO: 7225828 FERNANDEZ SANDOVAL HUGO ALBERTO

VALOR: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ----------

CONCEPTO: PAGO ESTAMPILLA PROCULTURA CONTRATO N°0157-2025 ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE. CONTRATISTA: HUGO ALBERTO FERNÁNDEZ SANDOVAL

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
MOVIMIENTO CONTABLE

111006002004	232,000.00	
130588001		232,000.00

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141016027901

(415)7707212489984(8020) 000014101602790 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 2 2 5 8 2 8	3	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 2 2 5 8 2 8	1 9 8 8 0 6 2 3

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Duitama 2 3 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
FERNANDEZ	SANDOVAL	HUGO	ALBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal: CR 23 14 60 BRR HELECHOS

42. Correo electrónico: hufernandez44@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 4 8 2 7 7 5 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación		52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código		
4 3 2 1	2 0 0 7 0 4 1 0	4 9 2 3	2 0 2 4 0 1 1 6						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 14 22 42 49 52

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
- 14- Informante de exogena
- 22- Obligado a cumplir deberes formales a
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 49 - No responsable de IVA
- 52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 04 - 15 / 12 : 55: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre FERNANDEZ SANDOVAL HUGO ALBERTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141016027901

(415)7707212489984(8020) 000014101602790 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 2 2 5 8 2 8	3	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional _____ %

83. Nacional público _____ %

84. Nacional privado _____ %

85. Extranjero _____ %

86. Extranjero público _____ %

87. Extranjero privado _____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 7 0 1 0 2		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

TRD		

		Fecha:	30	04	2025
Municipio:	Yopal	**Lugar de visita**	Hato Corozal		
Contrato No.	186 de 2025	**Contratista**	CONSORCIO ILUMINACION COROZAL		
Representante legal	GLORIA SOFIA MARTINEZ	**NIT**	901928930-7		

Objeto: AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Interventor (o Supervisor)	ELECTRICOM INGENIERIA S.A.S.		
Supervisor de interventoría	Hugo Alberto Fernández Sandoval		
Contrato No.	188 de 2025		
Representante legal	WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS	**NIT**	900315789-1

Residente de obra. **Victor Manuel bernal López**

Residente de interventoría **Ricardo León Pulido**

También participaron en la visita:

Participantes

Nombre	Cargo	Proceso/Entidad
Wilson Nossa Granados	Director Interv.	Electricom Ingeniería.
Ricardo León Pulido	Residente Interv.	Electricom Ing.
Hugo Fernández	Apoyo a supervisor	Enerca S.A.

Desarrollo de la visita:

Se realizó visita al Municipio de Hato Corozal con el fin de verificar algunos de los sitios a intervenir donde existen condiciones técnicas adversas como son postes existentes con las redes y luminarias muy alejados de la calzada vehicular, así mismo se tuvo reunión con el secretario de planeación del municipio donde se da a conocer algunas de las peticiones escritas que llegan por parte de la policía y de usuarios sobre fallas en la prestación del servicio.

Observaciones y recomendaciones
Verificar en comité técnico el replanteo que está haciendo el contratista de obra y la simulación del rediseño del alumbrado para ver como se define el planteamiento de la problemática presentada.
Compromisos

Actividades	Responsables	Fecha	¿Cumplió?

Registro fotográfico



Foto 1. Revisión sobre avenida de entrada

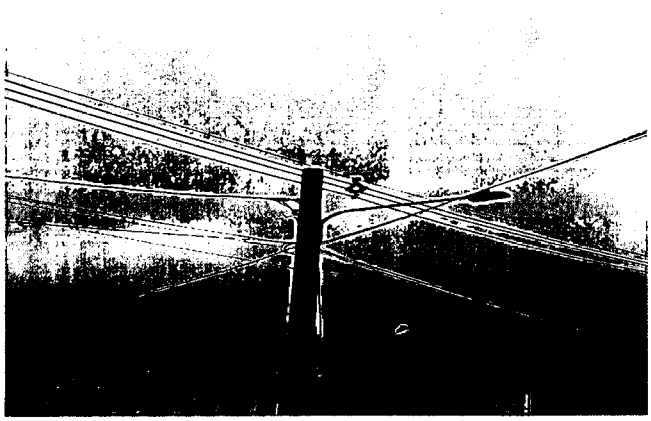


Foto 2. Distancias críticas de la red a la luminaria



Foto 3. Distancias de Poste a vía de 10m



Foto 4. Verificación de anchos de calzadas

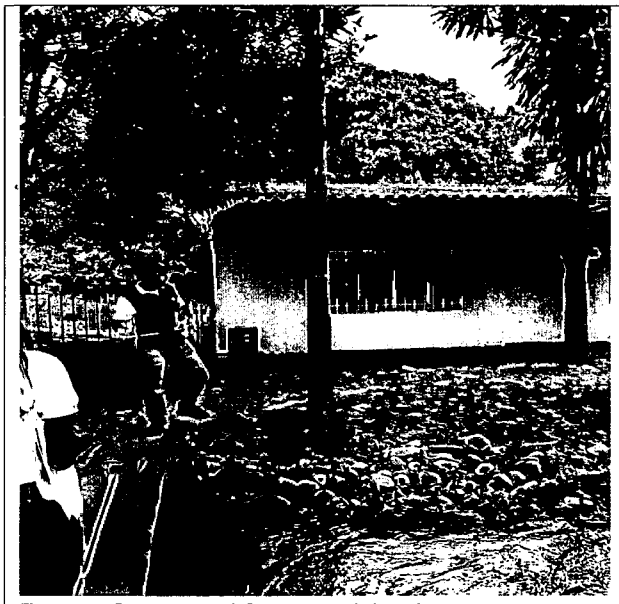


Foto 5. Caño y red frente a viviendas



Foto 6. Inspección en Torres de San Roque



Foto 7. Reunión con Secretario Planeación Hato Corozal



Foto 8. Verificación de puntos en parque

En constancia firman a los _____(___) días del mes _____ de _____

Nombre	Firma
Wilson Nossa Granados	
Ricardo León Pulido Aguirre	
Hugo Fernández S.	

ENERCA S.A E.S.P.

TRD		

Tipo de Reunión			De Seguimiento		
Objetivo: Determinar obra e interventoria el alcance del proyecto, definiendo puntos de intervención y metas a cumplir para dar cumplimiento al objeto del contrato.					
Proceso:	Planeación y Proyectos		de Energía	**ACTA N°**	01
Logistica					
Fecha:	23 de abril de 2025	**Hora:**	10:00 am	**Duración Estimada:**	2 Horas
Ciudad:	Yopal	**Lugar de Reunión:**	ENERCA S.A. ESP		

Agenda de la reunión

- REPLANTEO.
- PUNTOS DE INTERVENCION.
- CUMPLIMIENTO DE METAS.
- CUMPLIMIENTO DE NIVELES DE ILUMINACIÓN.
- TIPOS DE BRAZOS A INSTALAR.
- TIPOS DE LUMINARIA A INSTALAR.
- CALCULOS FOTOMETRICOS.
- CUMPLIMIENTO DE RETILAP.

Requerimientos de la reunión

Traer los siguientes materiales: N/A	**Preparación requerida: N/A**

Participantes

Nombre	Cargo	Proceso/Entidad	Asistió
WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS	R/L INTERVENTORÍA		SI
RICARDO LEON PULIDO	RESIDENTE INTERVENTORIA		SI
LUIS RENE GRANADOS VARGAS	SUPERVISOR		SI
HUGO FERNANDEZ SANDOVAL	APOYO A LA SUPERVISION		SI
GLORIA SOFIA MARTINEZ	R/L CONTRATISTA		SI
VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ	RESIDENTE OBRA		SI

Desarrollo de la Reunión

Durante la reunión del comité llevada a cabo el 23 de abril de 2025 se contó con la participación de la representante legal del Consorcio Iluminación Corozal y de los Ingenieros Víctor Bernal como residente de

ENERCA S.A E.S.P.

obra, el ingeniero Wilson Nossa en representación de la interventoría, el ingeniero Ricardo Pulido como residente de interventoría, el ingeniero Luis Rene Granados como Supervisor y el ingeniero Hugo Fernández como Apoyo a supervisión Todos vinculados al proyecto.

Interventoría realiza la observación de agilizar el replanteo de obra con el fin de iniciar actividades de campo. El contratista manifiesta intervenir la Calle 7 en su tramo principal para dar cumplimiento al objeto del contrato, por lo cual interventoría solicita cantidades de obra para iniciar balance de obra, pues son ítems contractuales.

El contratista entrega las cantidades requeridas de brazos según la distancia de la red a la vía, haciendo énfasis en utilizar diferentes longitudes con el fin de cumplir los niveles requeridos, cabe recalcar que son cantidades preliminares debido a que el replanteo aún no se finaliza.

Interventoría manifiesta la necesidad de realizar los cálculos fotométricos de dicha vía con al menos 2 marcas de luminarias teniendo en cuenta tiempos de entrega, calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas de los ítems contractuales.

Los brazos solicitados por el contratista son:

Item	Longitud (mts)			Cant
1	3	a	4	63 und
2	4	a	5	108 und
3	5	a	6	69 und

Obra solicita intervenir igualmente la calle 10 con 7, vía de acceso al aeropuerto, además de la calle 10 entre 11 y 12 sobre el caño principal y calle 11 entre 3 y 4 en las cuales se requiere del tendido de una nueva red de alumbrado público, la cual se define así:

Ítem	Zona	Longitud (mts)	Cant Luminarias
1	CALLE 10 CON 7	112	4
2	CALLE 10 CON 11 Y 12	73	3
3	CALLE 11 ENTRE 3 Y 4	78	3

Contratista indica que el sector de acceso al aeropuerto no se proyecta realizar tendido de red nueva, solo cambio de posteria.
Interventoría solicita ubicar en plano la ubicación a instalar los brazos de las diferentes longitudes, una vez se realice el replanteo de obra.

Interventoria solicita la intervención a aquellos puntos los cuales tengan derecho de petición solicitados ante la alcaldía. Además, solicita independizar el desmonte de la luminaria de la disposición final en el ítem No. 310

DESMONTE LUMINARIA TECNOLOGIA DE SODIO Y/O LED DE CUALQUIER POTENCIA, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL.

Finalmente se fija como próximo comité de obra el 2 de Mayo en ENERCA para revisar los compromisos adquiridos en el presente comité.

ENERCA S.A E.S.P.

Compromisos			
Actividades	**Responsables**	**Fecha**	**¿Cumplió?**
Iniciar actividades de replanteo	CONSORCIO ILUMINACION COROZAL	02/05/2025	
Realizar los Ítems no previstos que dieren lugar	CONSORCIO ILUMINACION COROZAL	02/05/2025	
Verificar la entrega de informes semanales por parte de interventoría	HUGO FERNANDEZ	25/04/2025	
Gestionar con SGR el porcentaje máximo a superar por parte de las metas según ficha MGA.	LUIS RENE GRANADOS	25/04/2025	

Asistentes	
Nombre	**Firma**
WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS	
LUIS RENE GRANADOS VARGAS	
HUGO FERNANDEZ SANDOVAL	
GLORIA SOFIA MARTINEZ	
VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ	
Ricardo León Polido A.	

ENERCA S.A E.S.P.

TRD		

Tipo de Reunión			De Seguimiento		
Objetivo: Determinar obra e interventoría el alcance del proyecto, definiendo puntos de intervención y metas a cumplir para dar cumplimiento al objeto del contrato.					
Proceso:	Planeación y Proyectos		de Energía	**ACTA N°**	02
Logística					
Fecha:	02 de mayo de 2025	**Hora:**	08:00 am	**Duración Estimada:**	2 Horas
Ciudad:	Yopal		**Lugar de Reunión:**	ENERCA S.A. ESP	

Agenda de la reunión

- REPLANTEO.
- PUNTOS DE INTERVENCION.
- CUMPLIMIENTO DE METAS.
- CUMPLIMIENTO DE NIVELES DE ILUMINACIÓN.
- CUMPLIMIENTO DE RETILAP.

Requerimientos de la reunión

Traer los siguientes materiales: N/A	Preparación requerida: N/A

Participantes

Nombre	Cargo	Proceso/Entidad	Asistió
WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS	R/L INTERVENTORÍA		SI
RICARDO LEON PULIDO	RESIDENTE INTERVENTORIA		SI
LUIS RENE GRANADOS VARGAS	SUPERVISOR		SI
HUGO FERNANDEZ SANDOVAL	APOYO A LA SUPERVISION		SI
GLORIA SOFIA MARTINEZ	R/L CONTRATISTA		SI
VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ	RESIDENTE OBRA		SI
ANTONIO J. ESTEBAN CAMPUZANO	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL		SI

Desarrollo de la Reunión

Durante la reunión del comité, se abordaron los siguientes temas:

Avance del Replanteo

Powered by CamScanner

El contratista solicitó una prórroga de 15 días adicionales para la culminación del replanteo, argumentando solicitudes previas de intervención realizadas por la comunidad en diversos sectores. Interventoría reiteró que el inicio de actividades de campo está sujeto a la agilidad en el replanteo.

Calle 7 – Tramo Principal y Parque
El contratista propone iniciar intervención en la Calle 7, entregando cantidades de brazos requeridos según distancias. Supervisión manifestó su preocupación respecto al tramo del parque sobre esta vía. Interventoría solicita la organización de la ubicación de las luminarias en la doble calzada y la realización de simulaciones fotométricas con al menos dos marcas distintas de luminarias, conforme a los pliegos contractuales.

Discrepancia sobre Intervención en Obra Liquidada
El contratista expresó su negativa a intervenir zonas que fueron intervenidas en un proyecto anterior que no tiene más de un año de haber sido liquidado. Sin embargo, la Interventoría insiste en que, por eficiencia del recurso y beneficio futuro del municipio, se requiere cambiar la ubicación de luminarias.

Se acuerda finalmente:

Trasladar las luminarias antiguas ubicadas después de la Calle 12.

Instalar nuevas luminarias sobre el separador de la doble calzada, entre calles 12 y 13, con el objetivo de optimizar una futura modernización a red 480V.

Calles Propuestas para Intervención y Eliminación de Tramos
El contratista planteó intervenir Calle 10 con 7, Calle 10 entre 11 y 12 (caño principal), y Calle 11 entre 3 y 4. No obstante, la Alcaldía notificó la ejecución de un proyecto paralelo sobre la Calle 10 (caño), financiado con recursos propios, por lo cual se eliminan del presente proyecto las cantidades relacionadas con dicho tramo.

Meta y Sobre ejecución
El contratista manifestó su preocupación por la posibilidad de sobrepasar la meta establecida. La supervisión consultó al departamento correspondiente, el cual indicó que existe un margen del 20% para sobrepaso de metas.

Optimización de Alumbrado Público

Se acordó dejar constancia formal del traslado de luminarias acordado, como requerimiento técnico para la optimización del sistema.

Se solicita la creación de un ítem específico que contemple únicamente el traslado de luminarias.

Nuevas Intervenciones

Contratista notifica tramo adicional de 113 metros lineales para intervención de nueva red detrás de la Alcaldía.

En Torres San Roque se instalará un nuevo poste, con ubicación a definir entre el frente del edificio y el costado hacia el parque.

En estacionamiento de San Roque se optimizará poste uno de por medio y se procederá con desmantelamiento total de luminarias antiguas.

Peticiones Ciudadanas y Socialización

Interventoría solicita tener en cuenta los 40 derechos de petición radicados ante la Alcaldía por parte de la comunidad y la Policía.

Supervisión solicita realizar socialización con la comunidad beneficiaria.

Compromisos

Actividades	Responsables	Fecha	¿Cumplió?
Entregar simulación fotométrica con dos marcas diferentes de luminarias	Consorcio Iluminación Corozal		
Organizar y definir ubicación de luminarias en doble calzada de la Calle 7	Consorcio Iluminación Corozal		

Asistentes

Nombre	Firma
WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS	
LUIS RENE GRANADOS VARGAS	
HUGO FERNANDEZ SANDOVAL	
GLORIA SOFIA MARTINEZ	
Ricardo León Pulido	
Víctor Bernal López (residente obra)	

Cód. 790.39

INFORME DE SUPERVISIÓN


Yopal, mayo de 2025

Elaborado por:

Hugo Alberto Fernández Sandoval
Apoyo a la supervisión OPS 157

Proyecto BPIN 2024005850142

"AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

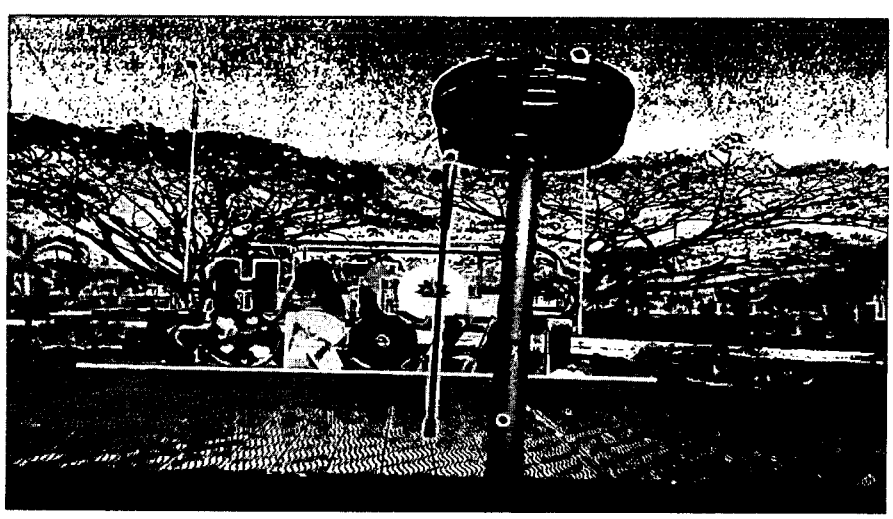

INTRODUCCIÓN

El Departamento de Casanare designó a la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., como ente ejecutor de asignaciones directas del Sistema General de Regalías acepta la ejecución del proyecto de inversión identificado con el BPIN 2024005850142 de objeto "AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE",

El municipio de Hato Corozal, ubicado en el departamento de Casanare, se presenta un deficiente servicio de alumbrado público urbano, lo que tiene un impacto directo en la vida cotidiana de sus habitantes. Este problema se manifiesta en una iluminación inadecuada o insuficiente en diversas zonas, como calles, avenidas, parques y áreas públicas, que deberían estar bien iluminadas para garantizar la seguridad y movilidad de los ciudadanos.

El mal estado de las luminarias, la falta de mantenimiento y la insuficiencia de cobertura del sistema de alumbrado han ocasionado que varias áreas del municipio permanezcan en penumbra durante la noche, aumentando la percepción de inseguridad entre los habitantes. Esta situación crea un ambiente propicio para el incremento de actividades delictivas, como robos, hurtos, y otros actos violentos, ya que la oscuridad facilita las acciones de los delincuentes y dificulta la respuesta inmediata de las autoridades.

Además, la falta de iluminación adecuada restringe la libre circulación de los ciudadanos, quienes se ven obligados a limitar sus desplazamientos nocturnos por temor a ser víctimas de delitos o accidentes. Este factor afecta especialmente a aquellos que necesitan moverse por la noche para trabajar, estudiar o realizar actividades recreativas y sociales. Las calles mal iluminadas generan una sensación de vulnerabilidad, lo que provoca que muchas personas eviten salir de sus casas después de ciertas horas, reduciendo las interacciones sociales y afectando el dinamismo del municipio. El alto impacto que se genera con la ejecución de este proyecto, lo convierte en uno de los proyectos banderas para el gobierno Municipal y Departamental. Con este proyecto la comunidad beneficiada tendrá disponibilidad de un alumbrado público eficiente como servicio público no domiciliario para sus habitantes. Al prestar un servicio eficiente el municipio cumple metas de su plan de desarrollo, mejorando significativamente la calidad de vida de los diferentes hogares y mejora la percepción de seguridad del mismo.

El presente informe refleja el control administrativo realizado por la supervisión al proyecto BPIN 2024005850142 de objeto "AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE ", y verificación de las actuaciones realizadas por la interventoría para el seguimiento, control y acompañamiento a la ejecución del proyecto.

Las actividades de la supervisión realizada a la interventoría, validan el cumplimiento y calidad de las actividades contratadas y llevadas a cabo por el contratista de interventoría para la ejecución del contrato de obra No. 186 de 2025.

CORTE DEL INFORME: del 8 de abril al 7 de mayo de 2025

1. GENERALIDADES

1.1 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO DE OBRA No. 186 DE 2025	
Objeto:	AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
Contrato de Obra No.	186-2025
Entidad Contratante:	ENERCA S.A E.S.P.
Contratista :	CONSORCIO ILUMINACION COROZAL
Representante Legal:	GLORIA SOFIA MARTINEZ
Interventoria:	ELECTRICOM INGENIERIA S.A.S.
Representante Legal:	WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS
Supervision:	LUIS RENE GRANADOS VARGAS Lider de Supervision e Interventoría
Director de obra:	JORGE EDUARDO NOCUA
Residente de obra:	VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ
Valor del Contrato:	$ 3.345.991.817,00
Valor del Anticipo:	$ 1.338.396.727,00
Valor Actualizado del Contrato:	$ 3.345.991.817,00
Plazo inicial:	CUATRO (4) MESES
Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES
Fecha de Iniciación:	08 DE ABRIL DE 2025
Fecha de terminación inicial:	07 DE AGOSTO DE 2025

Fecha de terminación final:	07 DE AGOSTO DE 2025		
Valor ejecutado:	$ 524.132,97		
Porcentaje ejecutado:	0.01574%		
Prorroga No. 1:	N/A	FECHA:	
Suspensiones:	N/A	FECHA:	
Reinicio:	N/A		
Adiciones:	N/A		
Modificación mayores y menores cantidades :	N/A		
Otro sí	N/A	FECHA:	
Pagos Parciales	NA		
Pago parcial No.1:	N/A	Fecha:	
Valor ejecutado Parcial No.1:			
% de ejecucion parcial No.1:			
Valor amortización Anticipo Pago Parcial No. 1			
Valor total pagos Parciales:	$ 0,0		
% de ejecucion total pagos parciales:	0,0%		
Valor total amortización Anticipo	0,0%		
Valor por pagar :	$ 2.007.595.090,00		
% por pagar:	60%		
Saldo por amortizar anticipo	$ 1.338.396.727,00		
% por Amortizar:	100%		

DATOS DE LA EMPRESA	
DIRECCION:	Carrera 29 A N 23-04 Yopal- Casanare
TELEFONOS:	3204181759

CORREO ELECTRONICO:	vimabelo100@hotmail.com

1.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 188 DE 2025	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	
3.1.1 INFORMATION GENERAL DEL CONTRATO	
Entidad Contratante:	ENERCA S.A E.S.P.
Supervisión:	LUIS RENE GRANADOS
	HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
Contratista :	ELECTRICOM INGENIERIA S.A.S.
Representante Legal:	WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS
Director de Interventoria	WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS
Residente Interventoria	RICARDO LEON PULIDO AGUIRRE
Valor del Contrato:	$348.394.515
Valor del Anticipo:	N/A
Plazo inicial:	CUATRO (4) MESES
Plazo Actualizado	CUATRO (4) MESES
Fecha de Iniciación:	08 DE ABRIL DE 2025
Fecha de terminación inicial:	07 DE AGOSTO DE 2025
Fecha de terminación final:	07 DE AGOSTO DE 2025
Prorrogas:	N/A

Ejecución Financiera	$ 87.094.515,00
Suspensiones:	N/A
Reinicio:	N/A
Adiciones:	N/A
Modificaciones:	N/A
Otro si:	N/A
Pagos parciales:	$ 0,0
Valor por pagar	$ 348.394.515,00
% Total por pagar :	100%

DATOS DE LA EMPRESA	
DIRECCION:	Carrera 19 No. 25 – 55 Yopal- Casanare
TELEFONOS:	3144420397-3106258239 (oficina)
CORREO ELECTRONICO:	electricomltda@gmail.com

1.3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°:	157 de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
SUPERVISOR DESIGNADO PARA EL CONTRATO:	ING. LUIS RENE GRANADOS VARGAS

CONTRATISTA:	HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
VALOR DEL CONTRATO:	$23.200.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (5) MESES.
FECHA DE INICIO:	08 ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2025
DATOS DE LA EMPRESA	
DIRECCION:	Carrera 23 No 14-60 Yopal, Casanare
TELEFONO:	3124827751
CORREO ELECTRONICO:	hufernandez44@gmail.com

2. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS GARANTÍAS APROBADAS DEL PROYECTO Y SUS DERIVADOS:

CONTRATO DE OBRA:

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
			DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	65-45-101091868	31/03/2025	30/11/2025	$334.599.181,70	
BUEN MANEJO ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO	65-45-101091868	31/03/2025	30/11/2025	$1.338.396.726,80	
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO	65-45-101091868	31/03/2025	31/07/2028	$334.599.181,70	
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	SEGUROS DEL ESTADO	65-45-101091868			$334.599.181,70	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO	57-45-101002115	24/05/2025	24/05/2029	883.011.539,40	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRA.	SEGUROS DEL ESTADO	65-40-101081242	08/04/2025	08/12/2025	$334.599.182,00	

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
			DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA	625-47-994000002037	20/03/2025	30/11/2025	$34.839.451,50	
ANTICIPO		N/A				
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	ASEGURADORA SOLIDARIA	625-47-994000002037	20/03/2025	30/11/2025	$34.839.451,50	
CALIDAD	ASEGURADORA SOLIDARIA	625-47-994000002037	20/07/2025	20/07/2030	$69.678.903,00	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRA.	ASEGURADORA SOLIDARIA	625-74-99400000748	27/12/2023	13/11/2025	$34.839.451,00	

CONTRATO APOYO A LA SUPERVISIÓN (OPS) :

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
			DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	BY-100050958	08/04/2025	13/01/2026	$2.320.000,00	ACTA DE INICIO ANEXOS 1 Y 2
ANTICIPO	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS MUNDIAL	BY-100050958	UN(1) AÑO CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE TERMINACION		$4.640.000,00	ACTA DE INICIO ANEXOS 1 Y 2
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRA.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

3. INFORMACIÓN FINANCIERO DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR CONTRATO DE OBRA INICIAL	$ 3.345.991.817,00
TOTAL	**$ 3.345.991.817,00**
VALOR CONTRATO INTERVENTORIA CONTRATO INICIAL	$ 348.394.515,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA	**$ 348.394.515,00**
VALOR APOYO SUPERVISIÓN	$23.200.000,00
VALOR TOTAL DE APOYO SUPERVISIÓN	**$23.200.000,00**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 3.717.586.332,00**

3.1 INFORME FINANCIERO CONDICIONES ACTUALIZADAS CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	Valor Actualizado	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS Y/O POR PAGAR
Valor Inicial	$3.345.991.817,00	$3.345.991.817,00	$524.132.97,00	0
Valor actualizado			$524.132.97,00	0
Valor Anticipo (40 %)				$1.338.396.727,00
Valor Parcial	0		0	0
Saldo por pagar				$2.007.595.090,00
Saldo a favor Empresa				
Sumas	$3.345.991.817,00	$3.345.991.817,00	$524.132.97,00	$2.007.595.090,00

3.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS Y/O POR PAGAR
Valor contratado Inicialmente	$348.394.515,00	0	0
Valor Anticipo (0 %)	0	0	0
Valor pago parcial No.1	0	0	0
Saldo por pagar			$348.394.515,00
Sumas	$348.394.515,00		$348.394.515,00

3.3 VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN


CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$23.200.000,00		
VALOR ANTICIPO			
VALOR FACTURADO		-	$ 0
VALOR POR PAGAR			$23.200.000,00
SUMAS IGUALES	**$23.200.000,00**		**$23.200.000,00**

3.4 PORCENTAJE FÍSICO DEL PROYECTO EJECUTADO


GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA																							
AVANCE	**0 a 1**	**5**	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**	**35**	**40**	**45**	**50**	**55**	**60**	**65**	**70**	**75**	**80**	**85**	**90**	**95**	**100**	**TOTAL**
PROGRAMADO																						**0,1667%**
EJECUTADO																						**0,01574 %**


PORCENTAJE EJECUCIÓN OBRA:

Obra física Programada (%):	0,1667%	Obra física Programada ($):	$ 5.578.860,32
Obra física ejecutada (%):	0,01574%	Obra física ejecutada ($):	$ 524.132,97
Obra física por ejecutar (%):	99,9843%	Obra física por ejecutar ($)	$ 3.345.467.684,03
Ejecución Financiera (%):	0,0%		

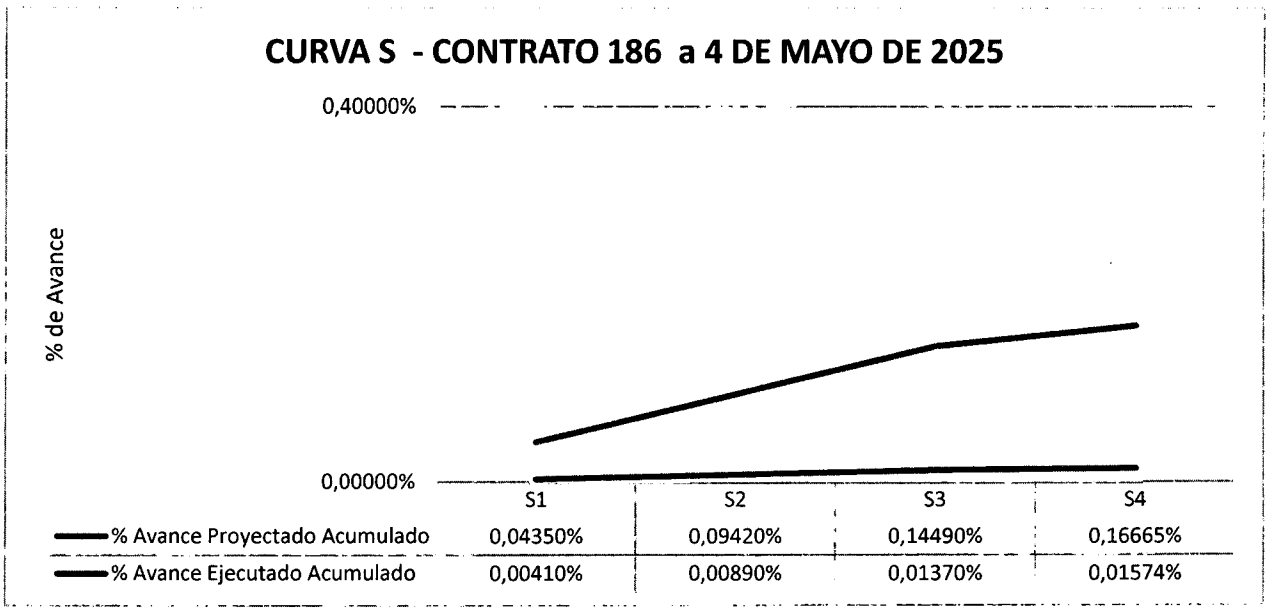

	S1	S2	S3	S4
% Avance Proyectado Acumulado	0,04350%	0,09420%	0,14490%	0,16665%
% Avance Ejecutado Acumulado	0,00410%	0,00890%	0,01370%	0,01574%

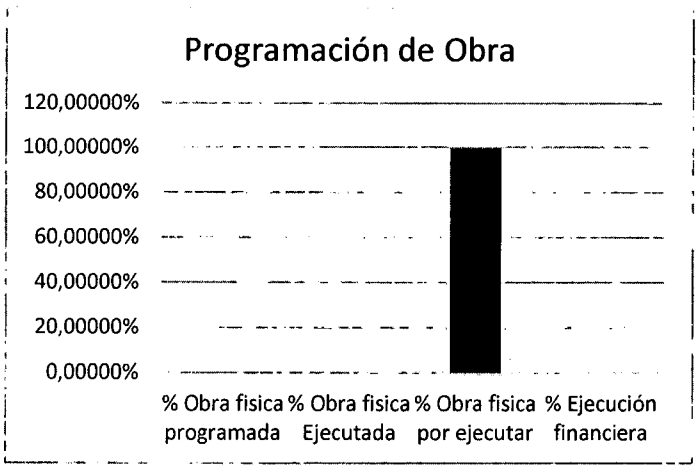

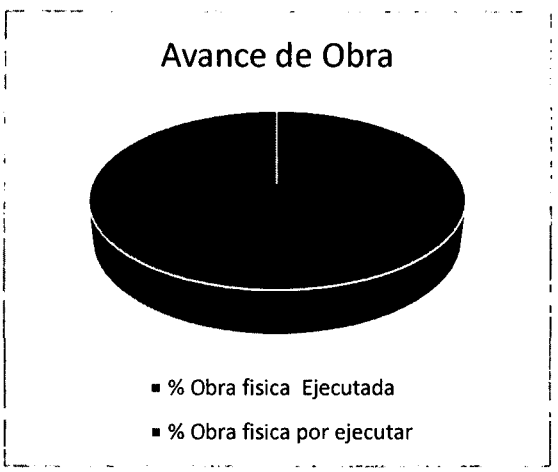

GRÁFICOS PARA EL INFORME GENERAL DE GERENCIA A CORTE DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

METAS E INDICADORES DEL PROYECTO SEGÚN MGA.

METAS FISCAS DEL PROYECTO	**Metros de redes de AP**
PROGRAMADO	840
EJECUTADO	0
(%):	**0,0%**

PORCENTAJE PONDERADA POR COMPONENTES Metas del proyecto																				
COMPONENTE	**0 a 5**	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**	**35**	**40**	**45**	**50**	**55**	**60**	**65**	**70**	**75**	**80**	**85**	**90**	**95**	**100**	**TOTAL**
PAGO DE IMPUESTOS Y PERMISOS																					**0%**
CERTIFICACIÓN RETIE																					**0%**
RED DE BAJA TENSIÓN																					**0.00990%**
CERTIFICACIÓN RETILAP																					**0%**
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO																					**0%**
ALUMBRADO PUBLICO																					**0%**
RED TRENZADA DE BAJA TENSIÓN																					**0%**
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL																					**0%**

PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA INTERVENTORIA:

EJECUCIÓN (%):	**25%**
POR EJECUTAR (%):	75%

PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA APOYO A LA SUPERVISIÓN:

EJECUCIÓN (%):	**20%**
POR EJECUTAR (%):	80%

4. ACTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 ACTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS OBRA

Relación de Actas generadas Contrato de obra 186 de 2025	
Acta No. 1 de Iniciación:	08 DE ABRIL DE 2025


4.2 ACTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS INTERVENTORIA

Relación de Actas generadas Contrato de Consultoria 188 de 2025	
Acta No. 1 de Iniciación:	08 DE ABRIL DE 2025

4.3 ACTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS APOYO A LA SUPERVISIÓN

Relación de Actas generadas Contrato de Prestación de Servicios 157 de 2025	
Acta No. 1 de Iniciación:	08 DE ABRIL DE 2025

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE EJECUCIÓN:

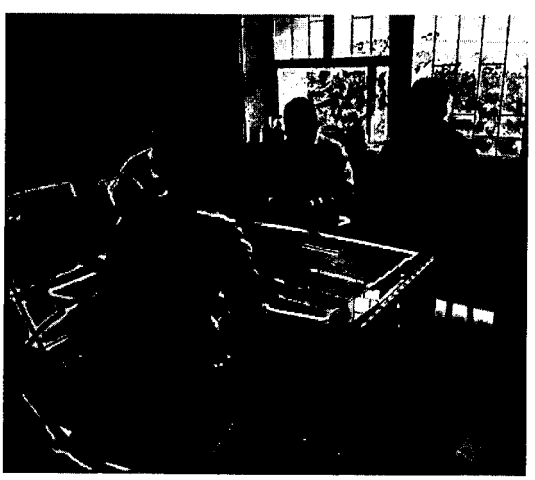	
Revisión de Replanteo en calles y carreras de Hato Corozal	Sitios críticos detectados
	
Reunión y análisis con funcionario de la alcaldía	Comités Técnicos

CONCLUSIONES (RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS, PROPUESTAS)

Las actividades ejecutadas se realizan cumpliendo con las especificaciones técnicas, Normas, y procedimientos establecidos para este proyecto.

Durante este periodo se ha realizado el replanteo y verificación en sitio de los diferentes trabajos a ejecutar y ha implicado la revisión y el rediseño y simulación en el software de alumbrado de acuerdo con el cumplimiento de los parámetros que especifica el RETILAP (Resolución 40150 de 3 de mayo de 2024).

En este periodo se han ejecutado actividades como localización y replanteo, verificación de la mejor luminaria que cumplas las especificaciones técnicas, análisis de alternativas de solución en comités técnicos y socialización del proyecto ante la comunidad de Hato Corozal.

Se recomienda dar inicio a la obra como quedó establecido en la socialización y actualizar el cronograma de trabajo, así como el plan de acción para implementar la aplicación de todos los lineamientos y procedimientos de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional dispuestas en el proceso MMA-SO establecido en SIG, así como lo establecido en el manual de interventoría.

LUIS RENE GRANADOS
Supervisor

Proyectó: Hugo Alberto Fernández Sandoval
Profesional apoyo Supervisión
Contrato 157 de 2025

ENERCA S.A E.S.P.

CONTRATO No.:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.		8	5	2025

INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO SGR CODIGO BPIN: 2024005850142

INTERVENTORIA [ ] APOYO SUPERVISIÓN [X]

Semana Número.	4	Del	08/04/2025	Al.	07/05/2025	Mes No	1

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 1 Meses y 0 Dias (Calendario)

Nombre del Contratista: HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL

Nombre del Interventor: N.A

Nombre del Apoyo a Supervisión: HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL

Nombre del Supervisor: LUIS RENE GRANADOS VARGAS

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE						
CONTRATO No	188 de 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO ILUMINACION COROZAL				
NOMBRE DEL RUBRO	AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2024.00585-0142 00IL-2102-1900-2024-00585-0142	No. C.D.P.	7525	No R.P.	7525
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.345.991.817,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 3.345.991.817,00	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES				
FECHA DE INICIO	08/04/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	07/08/2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
ANTICIPO	ORDEN DE PAGO "COMPROBANTE"	194871525 - 194869925	$ 1.338.396.727	40%
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 1.338.396.727	0,4

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES - AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

CONTRATO No.:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.		8	5	2025

EJECUCIÓN

	MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	0,1667%	0,1667%	OBRA EJECUTADA (%)	0,01574%	0,01574%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ 5.578.860,32	$ 5.578.860,32	VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ 524.132,97	$ 524.132,97

CONTRATO DE CONSULTORIA - INTERVENTORIA

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE						
CONTRATO No	188 de 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	ELECTRICOM INGENIERIA SAS				
NOMBRE DEL RUBRO	AMPLIACION MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0142	No. C.D.P.	7425	No R.P.	7225
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 348.394.515,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N.A.	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N.A.				
FECHA DE INICIO	08/04/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	07/08/2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ -	0

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

CONTRATO No.:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.		8	5	2025

PRESTACIÓN DE SERVICIO - APOYO A LA SUPERVISIÓN

OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.						
CONTRATO/ORDEN No	157 de 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL				
NOMBRE DEL RUBRO	AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE	RUBRO	00AD-2102-1900-2024-00585-0142	No. C.D.P.	7625	No R.P.	7125
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 23.200.000,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	CINCO (5) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INICIO	08/04/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	07/08/2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		

PRORROGAS		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES - AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN		
ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
(Del Consultor o Apoyo a la Supervisión)


Item	Nombre de la actividad contractual	Actividad realizada
1	Conocer en todas sus partes el contenido del contrato de la interventoria técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y juridica; Los pliegos de condiciones y demás documentos del proyecto correspondientes a la interventoria.	Se ha revisado el contenido del contrato de Interventoria con todos su pliego de condiciones y anexos.
2	Apoyar al área de Planeación de la Empresa con la información que se debe reportar al sistema de monitoreo GESPROY, y verificar sea enviada oportunamente.	Se ha reportado al sistema de monitoreo GESPROY la información requerida inicialmente así como el avance a corte del día 30 de abril de 2025
3	Cumplir con todas las actividades establecidas en el procedimiento de supervisiones e Interventorias PR-MAJ-SI-01 del Sistema Integrado de Gestión (SIG) para apoyar al supervisor de la interventoria.	Se cumple con las actividades establecidas en el procedimiento de supervisiones e interventoría
4	Entregar los informes mensuales en los tiempos establecidos y la información que sea requerida por el supervisor de la OPS y por el supervisor del contrato de interventoria objeto del proyecto, velando por el cumplimiento de las actividades contractuales conforme a la normatividad vigente.	Se ha hecho entrega de el informe mensual dentro de los tiempos establecidos y se ha apoyado con la información requerida por el supervisor para que se lleve a cabo el cumplimiento de las actividades contractuales.
5	Apoyar a la oficina de contratación y juridica, para registrar todas las actividades de seguimiento y control en el sistema de información que disponga la empresa para tal fin, así mismo desarrollar las gestiones y servicios a que haya lugar con otras áreas internas y/o externas de la Empresa, para garantizar la adecuada ejecución del proyecto relacionada con la interventoria	Se ha realizado el apoyo a la oficina de contratación y juridica para el seguimiento y control en las plataformas que tiene la empresa para dicho fin.
6	Velar por la aplicación de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional dispuestas en el proceso MMA-SO establecido en SIG.	Se ha revisado la aplicación y cumplimiento de las normas de seguridad Industrial y Salud Ocupacional de acuerdo con el proceso
7	Apoyar, recomendar, sugerir medidas y emitir conceptos que considere convenientes y necesarios con la ejecución del objeto contractual.	se ha realizado apoyo en los comités realizados y se han emitido conceptos de acuerdo con el objeto de la ejecución del contrato

CONTRATO No.:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.		8	5	2025

8	Apoyar en la revisión las actas contractuales de conformidad con los soportes presentados por el contratista e interventor durante la ejecución del proyecto.	En este periodo se ha revisado las actas de inicio con el cumplimiento de los requisitos exigidos. No se han tramitado actas de cobro parciales de interventoría.
9	Acopiar la documentación técnica y llevar un estricto control sobre la correspondencia que se produzca; organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato (proyecto)	Se hace acopio de la información técnica y correspondencia generada.
10	Analizar la consistencia de la información y revisar todas las actas suscritas que se requieran durante el desarrollo del proyecto.	Se ha revisado la información y suscritos las actas de inicio correspondientes
11	Revisar las actas de liquidación (proyectadas por la interventoria) de cada uno de los contratos derivados del proyecto.	Para este periodo no se tienen aún actas de liquidación proyectadas por parte de la interventoría.
12	Desarrollar las actividades establecidas en el Acto de gerencia No. 219 de 12 de septiembre de 2013 por medio del cual se adopta el manual de supervisión e interventoria, actividades señaladas en los capitulos I Numeral 5 y 6 y capitulo II al VIII.	Se han desarrollado las actividades de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría.
13	Apoyar a la supervisión realizando visitas esporádicas al sitio donde se desarrolla el proyecto para verificar la permanencia de la interventoria para el adecuado seguimiento al desarrollo de las obras.	Se ha realizado visita al sitio de las obras en apoyo a la supervisión el dia 30 de abril de 2025
14	Asegurar que el interventor adecue la vigencia y/o el valor de las garantías según lo pactado en el contrato.	Se ha revisado que la interventoría adecúe la actualización de las pólizas.

REGISTRO FOTOGRAFICO



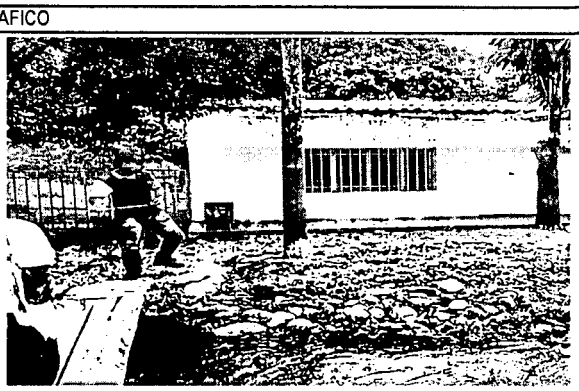





OBRA EJECUTADA A LA FECHA - PROYECTO


CONDICIONES INICIALES						CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE MES			CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	RED DE BAJA TENSION										
101	REPLANTEO EN BAJA TENSION	KM	0,84	$ 616.569,00	$ 517.917,96	0,644	$ 616.569,00	$ 397.070,44	0,644	$ 616.569,00	$ 397.070,44
102	APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLETE DE B T	UND	34,00	$ 89.303,00	$ 3.036.302,00	0,00	$ 89.303,00	$ -	0	$ 89.303,00	$ -
103	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8MTS X 510 KGF	UND	28,00	$ 1.142.131,47	$ 31.979.681,16	0,00	$ 1.142.131,47	$ -	0	$ 1.142.131,47	$ -
104	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8MTS X 1 050 KGF	UND	6,00	$ 1.674.070,00	$ 10.044.420,00	0,00	$ 1.674.070,00	$ -	0	$ 1.674.070,00	$ -

CONTRATO No.:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.		8	5	2025

105	CIMENTACION POSTE EXTRAREFORZADO DE B.T.	UND	4,00	$ 112.539,00	$ 450.156,00	0,00	$ 112.539,00	$ -	0	$ 112.539,00	$ -
SUBTOTAL					$ 46.028.477,12	SUBTOTAL		$ 397.070,44	SUBTOTAL		$ 397.070,44
2	**CIMENTACION POSTE EXTRAREFORZADO DE B.T.**										
201	ESTRUCTURA DE SUSPENSION LA-320 SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	11,00	$ 106.160,58	$ 1.167.766,38	0,00	$ 106.160,58	$ -	0	$ 106.160,58	$ -
202	ESTRUCTURA DE RETENCION SENCILLA LA-321, SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	18,00	$ 124.699,10	$ 2.244.583,80	0,00	$ 124.699,10	$ -	0	$ 124.699,10	$ -
203	ESTRUCTURA DE PASAO CON DERIVACION LA-322 SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	2,00	$ 235.586,11	$ 471.172,22	0,00	$ 235.586,11	$ -	0	$ 235.586,11	$ -
204	SUMINISTRO DE RETENCION DOBLE LA-327, SIN CAHA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	2,00	$ 298.007,70	$ 596.015,40	0,00	$ 298.007,70	$ -	0	$ 298.007,70	$ -
205	RED TRENZADA DE BAJA TENSION 3Ø, 4 H EN CABLE ALUMINIO XLPE (2 X 35 MM2 + 1 X 35 MM2)	M	840,00	$ 23.455,19	$ 19.702.359,60	0,00	$ 23.455,19	$ -	0	$ 23.455,19	$ -
206	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT PUESTA A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE PARA RED DE BAJA TENSIÓN	UND	274,00	$ 559.694,60	$ 153.356.320,40	0,00	$ 559.694,60	$ -	0	$ 559.694,60	$ -
207	ESTRUCTURA LA334 (L3010) DE TRANSICIÓN DE CIRCUITO SECUNDARIO AÉREO DE RED TRENZADA A RED ABIERTA SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	18,00	$ 140.639,48	$ 2.531.510,64	0,00	$ 140.639,48	$ -	0	$ 140.639,48	$ -
208	PERCHA GALVANIZADA DE CINCO (5) PUESTOS, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y VESTIDA	UND	14,00	$ 142.057,77	$ 1.988.808,78	0,00	$ 142.057,77	$ -	0	$ 142.057,77	$ -
SUBTOTAL					$ 182.058.537,22	SUBTOTAL		$ -	SUBTOTAL		$ -
3	**ALUMBRADO PUBLICO**										
301	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 32 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 55W, FLUJO LUMINOSO 8412bLM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7	UND	23,00	$ 2.007.810,05	$ 46.179.631,15		$ 2.007.810,05	$ -	0	$ 2.007.810,05	$ -
302	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 16 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 55W, FLUJO LUMINOSO 7532 LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES	UND	638,00	$ 1.746.413,46	$ 1.114.211.787,48	0,00	$ 1.746.413,46	$ -	0	$ 1.746.413,46	$ -
303	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 16 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 45W, FLUJO LUMINOSO 6347 LM, 4000K IP66, TENSIÓN NOMINAL 120-277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND	143,00	$ 1.746.413,46	$ 249.737.124,78	0,00	$ 1.746.413,46	$ -	0	$ 1.746.413,46	$ -
304	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 16 LEDS 300-1000MA NW,POTENCIA 45W, FLUJO LUMINOSO 6347LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120-277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7	UND	91,00	$ 1.623.797,05	$ 147.765.531,55	0,00	$ 1.623.797,05	$ -	0	$ 1.623.797,05	$ -
305	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 3,00 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	554,00	$ 476.173,35	$ 263.800.035,90	0,00	$ 476.173,35	$ -	0	$ 476.173,35	$ -
306	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 2,00 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	277,00	$ 409.145,61	$ 113.333.333,97	0,00	$ 409.145,61	$ -	0	$ 409.145,61	$ -
307	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 1,00 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALA	UND	64,00	$ 337.287,66	$ 21.586.410,24	0,00	$ 337.287,66	$ -	0	$ 337.287,66	$ -

CONTRATO No.:		157 de 2025							FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:		REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.								8	5	2025
308	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 1.00 M ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACION	UND	1509,00	$ 62.645,60	$ 94.532.210,40	0,00	$ 62.645,60	$ -	0	$ 62.645,60	$ -	
309	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIMETÁLICO DE 1 PERNO PARA LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	UND	1176,00	$ 42.830,60	$ 50.368.785,60	0,00	$ 42.830,60	$ -	0	$ 42.830,60	$ -	
310	DESMONTE LUMINARIA TECNOLOGIADE SODIO Y/O LED DE CUALQUIER POTENCIA. INCLUYE DISPOSICION FINAL	UND	645,00	$ 205.820,90	$ 132.754.480,50	0,00	$ 205.820,90	$ -	0	$ 205.820,90	$ -	
SUBTOTAL					$ 2.234.269.331,57	SUBTOTAL		$ -		SUBTOTAL		$ -
		VALOR COSTO DIRECTO			$ 2.462.356.345,91	VALOR COSTO DIRECTO		$ 397.070,44		VALOR COSTO DIRECTO		$ 397.070,44
		ADMINISTRACION	25,00%		$ 615.589.086,48	ADMON	25,00%	$ 99.267,61		ADMINISTRACION	25,00%	99267,609
		IMPREVISTOS	1,00%		$ 24.623.563,46	IMPREVISTO	2,00%	$ 7.941,41		IMPREVISTOS	2,00%	7941,40872
		UTILIDAD	6,00%		$ 147.741.380,75	UTILIDAD	5,00%	$ 19.853,52		UTILIDAD	5,00%	19853,5218
		CERTIFICACION RETIE			$ 24.623.563,00	CERTIFICACION RETIE				CERTIFICACION RETIE		
		CERTIFICACION RETILAP			$ 44.685.387,00	CERTIFICACION RETILAP				CERTIFICACION RETILAP		
		COSTO DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)			$ 18.490.055,00	COSTO DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				COSTO DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)		
		COSTO IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			$ 7.882.435,50	COSTO IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				COSTO IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		
		AJUSTE AL PESO			$ (0,10)							
		VALOR TOTAL			$ 3.345.991.817,00	VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 524.132,98		VALOR TOTAL ACUMULADO		$ 524.132,98

DIAGRAMA DE PROGRAMACIÓN VRS EJECUCIÓN DE OBRA

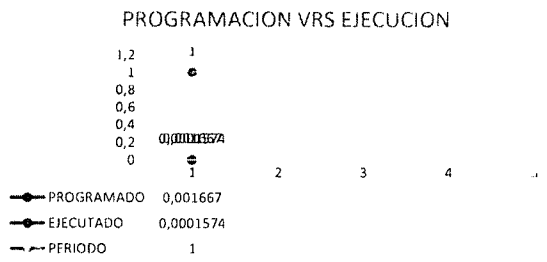

REPORTE DE INDICADORES DE EJECUCION

Proyecto BPIN:

1. EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

El indicador determina la eficiencia de los proyectos en ejecución a partir de la medición del cumplimiento del alcance, de acuerdo con la programación registrada, evaluando al corte de la medición el avance físico ejecutado frente al avance físico programado.

Para los proyectos con cobertura de información igual a cero (0) la eficiencia del proyecto es cero (0).

Cumplimiento de la Programación = Avance físico reportado / Avance físico programado.

Donde,

El avance físico programado corresponde a la sumatoria de las cantidades de las actividades programadas multiplicado por el valor unitario programado de cada actividad, al corte del periodo objeto de medición. El avance físico reportado corresponde a la sumatoria de las cantidades de las actividades ejecutadas multiplicado por el valor unitario programado de cada actividad, al corte del periodo objeto de medición.

	MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	0,1667%	0,1667%	OBRA EJECUTADA (%)	0,01574%	0,01574%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ 5.577.768,36	$ 5.577.768,36	VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	$ 524.132,97	$ 524.132,97

Cumplimiento de la Programación = **0,093968221**

ENERCA S.A E.S.P.

VERSIÓN: 02

CONTRATO No.:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.		8	5	2025

2. EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL COSTO

El indicador determina la eficiencia de los proyectos en ejecución a partir de la medición del cumplimiento en el costo, de acuerdo con la programación registrada, evaluando a la fecha de la medición, el costo ejecutado frente al costo programado.

Si para el periodo de medición, la interventoría no reporta información el indicador tendrá una puntuación igual a cero.

Cumplimiento del Costo = avance físico reportado (valor ganado) / costo actual (ejecutado) del proyecto

Donde,

El avance físico reportado corresponde a la sumatoria de las cantidades de las actividades ejecutadas multiplicado por el valor unitario programado de cada actividad, al corte del periodo objeto de medición. El costo actual del proyecto corresponde a la sumatoria de las cantidades de las actividades ejecutadas multiplicado por el valor unitario ejecutado de cada actividad reportado por la entidad a la fecha de medición.

	MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO
VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	$ 524.132,97	$ 524.132,97	VALOR DE LA OBRA (COSTO ACTUAL)	$ 524.132,97	$ 524.132,97

Cumplimiento del Costo = 1

3. ATRASO EN LA EJECUCIÓN

El indicador determina la eficiencia de los proyectos en ejecución a partir del cumplimiento del plazo reportada por la entidad, verificando si existen desviaciones en tiempo (retrasos) respecto a los programado a la fecha de corte de medición.

Para el cálculo se considera:

- La fecha programada en la cual se tenia previsto alcanzar el avance fisico registrado a la fecha del corte de la medición.
- Plazo transcurrido al corte:

Variación del tiempo = [t1 - fecha programada del avance físico actual] / Plazo transcurrido

Donde,

t1 corresponde a la fecha del corte de la medición.
Fecha programada del avance fisico actual, corresponde a la fecha en la cual se tenia previsto alcanzar el avance fisico reportado al corte.
Plazo transcurrido corresponde al periodo de tiempo entre el inicio del proyecto y la fecha del corte de la medición.

t1 =	30/04/2025
Fecha programada del avance actual =	10/04/2025
Plazo transcurrido =	23
Variación del Tiempo (atraso en Ejecución) =	0,87

Nota: Se deben trabajar en días de acuerdo con la programación reportada en el Gesproy.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Se presenta un atraso del 0,15096%

En constancia se firma por quienes intervinieron.

HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR

EL LÍDER DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍAS DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL,** identificado con cedula de ciudadanía **No.7.225.828 de Duitama y NIT. 7.225.828-3,** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **PRIMER** pago de la Orden de Prestación de Servicios **No.157** de fecha 13 de Marzo de 2025, Proceso **GD-035-2025,** Cuyo objeto es "**REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.**", celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. como contratante.

Que el contratista presentó los documentos necesarios para efectos del pago por parte de la Tesorería de ENERCA S.A. E.S.P., los cuales se encuentran incluidos en la respectiva Carpeta Contractual, que reposa en el archivo de Gestión Documental y que se relacionan a continuación.

- Pago de estampilla pro-cultura **(NC No.25009178 de 13 de marzo de 2025)**
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (N/A)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (N/A)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales **(APLICA)**
- Garantías establecidas en la cláusula Quinta debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
CUMPLIMIENTO	BY-100050958	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
CALIDAD DEL SERVICIO	BY-100050958	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

VALOR OPS INICIAL	$ 23.200.000
VALOR ADICIONADO	
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES
PLAZO ADICIONADO	

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL No.	
	ACTA FINAL	
	OTRO / MENSUAL	X

GESTIÓN V°B°

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	77 7625	$ 23.200.000	71 7125	$ 23.200.000	'00AD-2102-1900-2024-00585-0142 SSF	AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE
OPS ADICIONAL	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
VIGENCIA FUTURA	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
9484634814	ABRIL	$219,400	$280,900	$9,200

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
OTROS NEGOCIOS	OTROS_NEGOCIOS	38901 (SGR)	100%	HATO COROZAL	4.640.000
TOTAL			100%		4.640.000

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($23.200.000).**

FORMA DE PAGO: Pagara el valor de la presente orden de la siguiente forma: 80% mediante pagos parciales, previa certificación de pago por parte del supervisor, informe de actividades con soportes y pagos de aportes a Seguridad Social y un 20% para el último pago una vez terminado el plazo contractual, acta de terminación, informe final con soportes y pagos de aportes de seguridad social, evaluación del supervisor, encuesta de satisfacción y certificación de pago. PARAGRAFO: El valor de los honorarios y base de cotización para seguridad social es de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($4.640.000).**

PERIODO: Durante el tiempo comprendido del 8 de abril al 7 de mayo de 2025.

VALOR A PAGAR: **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($4.640.000).**

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros de Scotia Bank Colpatria No.3552005929.

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes, y se AUTORIZA el respectivo pago.

Así mismo se certifica que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y criterios de seguridad y salud en el trabajo, aplicables de acuerdo al tipo de actividades realizadas.

La presente se expide a los catorce (14) días del mes de mayo de 2025.

GESTROY

LUIS RENÉ GRANADOS VARGAS
LÍDER DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍAS
SUPERVISOR

Proyectó: Luis René Granados Vargas
