Plan de acción revitalización


Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

17 Abril 2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT
BOGOTÁ

OBRAS SDHT BARRIO LOS ALPES– Mejoramiento Integral de Barrios

CRONOGRAMA ACCIONES PROPUESTAS PARA FINALIZAR OBRAS EN INICIADAS EN LA ADMINSITRACIÓN ANTERIOR

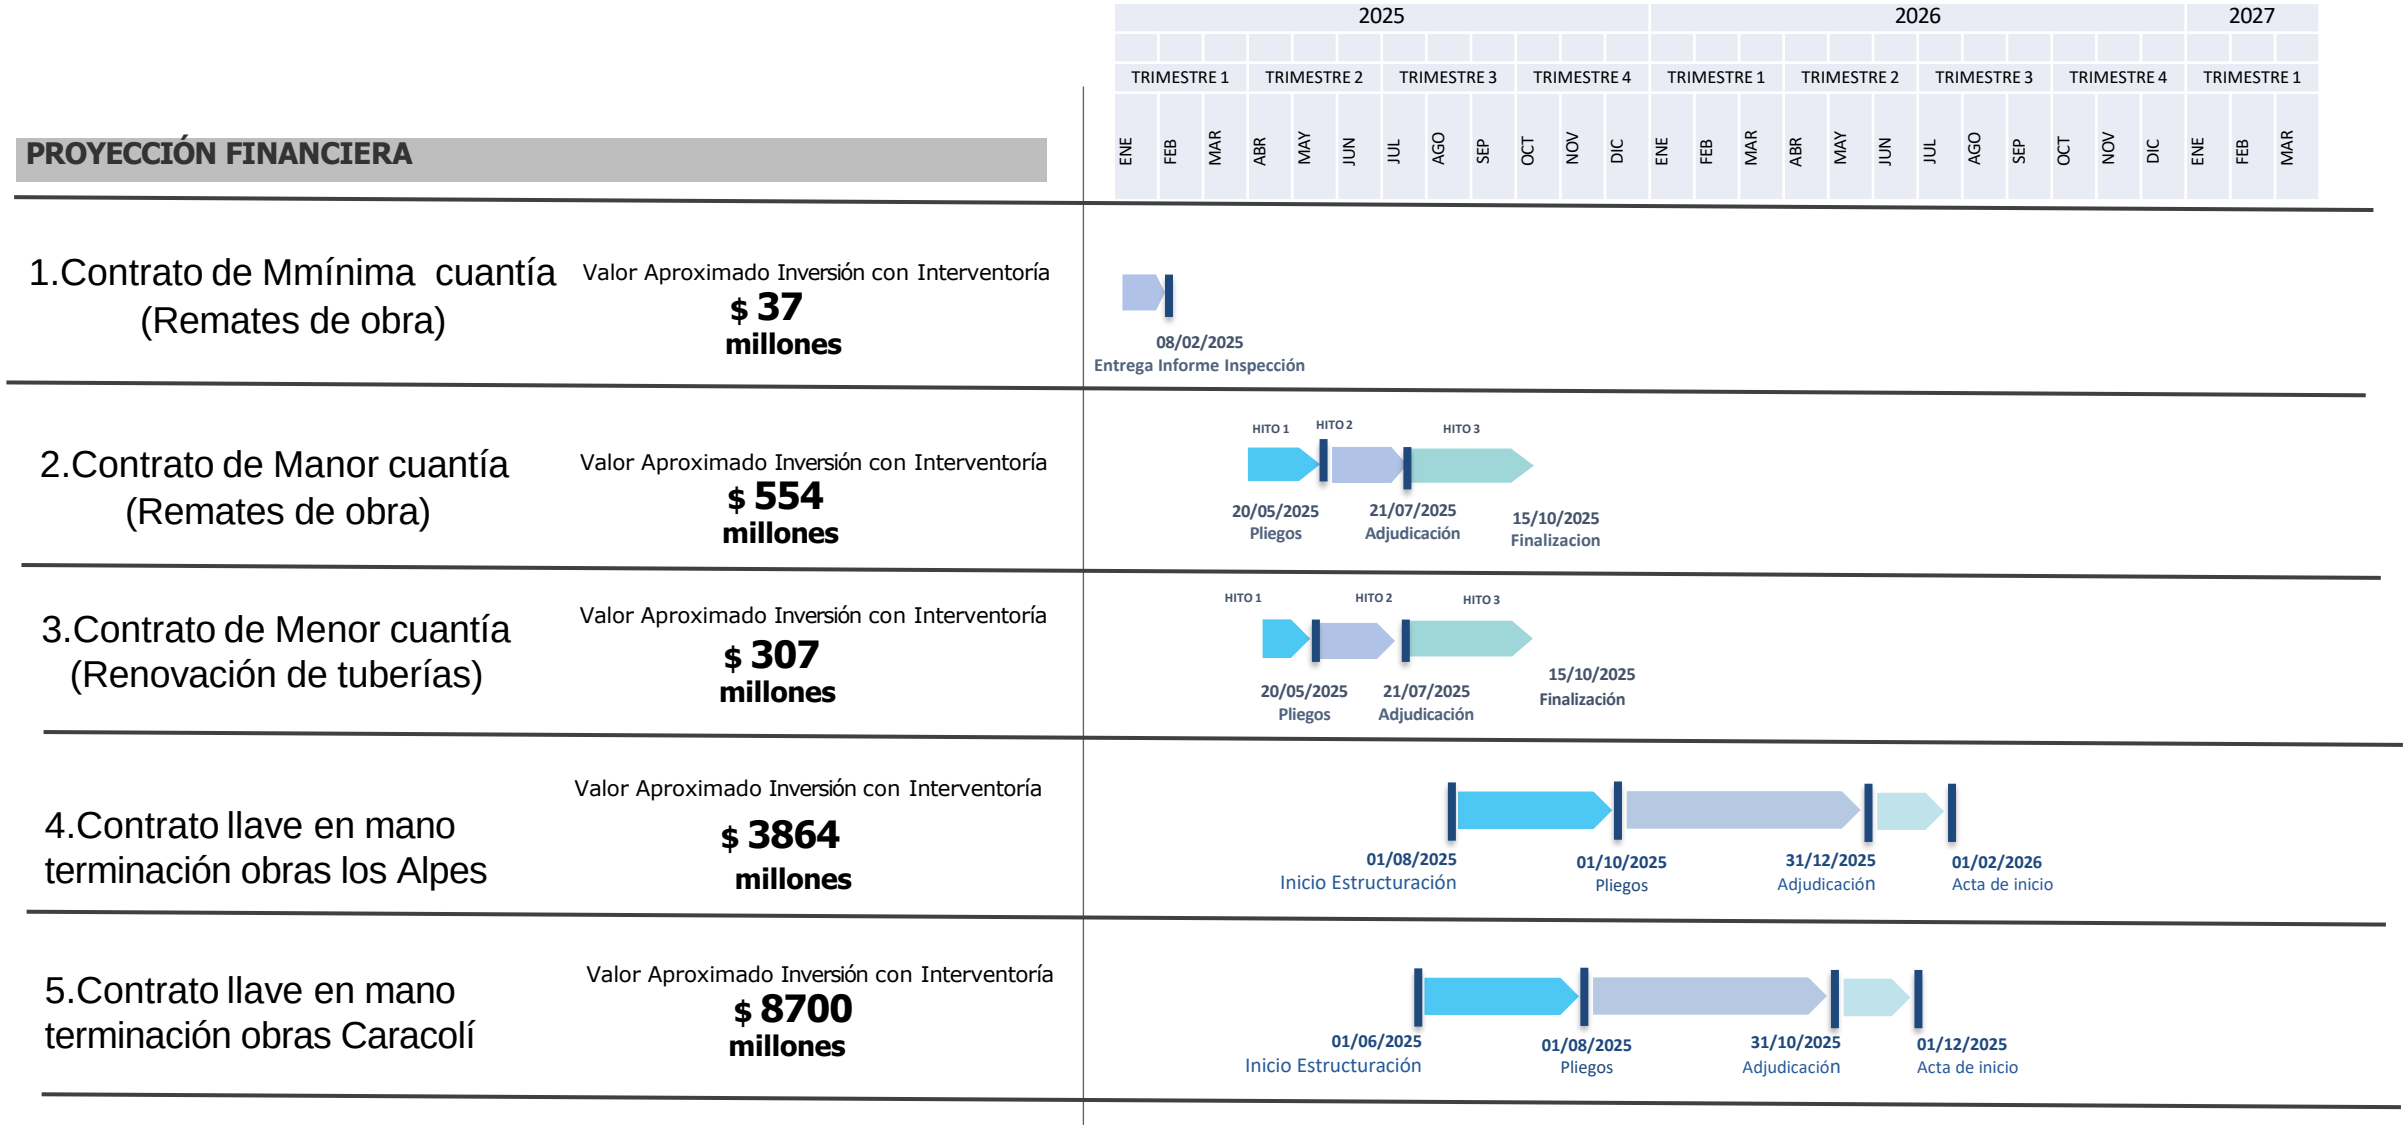

FECHAS SUGERIDAS REVISIÓN PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN SCO

Actividad	Presentación Primera Revisión Documentos SCO	Presentación Ajustes SCO	Radicación Administrativa
1.Contrato de Menor cuantía (Remates de obra) AT y EP	8/05/2025	22/05/2025	2/06/2025
2.Contrato de Menor cuantía (Interventoría Remates de obra) AT y EP	15/05/2025	29/05/2025	5/06/2025
3.Contrato de Menor cuantía (Remates de obra) AT y EP	8/05/2025	22/05/2025	2/05/2025
4.Contrato de Menor cuantía (Interventoría de obra) AT y EP	15/05/2025	29/05/2025	5/06/2025

Plan de Acción cumplimiento Meta Revitalización

Recursos Disponibles Revitalización	**$ 37,606,000,000.00**
Recursos Comprometidos	**$ 37,289,550,415.26**

Meta revitalización :1- OE- Intervenir 18 polígonos de intervención integral de espacio público y revitalización para la promoción de espacios públicos seguros

Intervención en vías y parques en 13 barrios de origen Informal

#	Territorio	Estudios y diseños Relacioandos	Estado Actual	Contrato Adjudicado	Tipo Contrato	Barrios Revitalización	UI (Vías y parques)	Area Intervenida (m2)	Beneficiarios	Valor	Recursos comprometidos por año	Año Adjudicación	Año ejecución
1	Rafael Uribe	1118-2022	En Ejecución	1761-2024	Obra	La Paz	6	2124	2474	$ 1,744,797,453	$ 8,266,025,626.52	2024	2025
2	Ciudad Bolivar	451-2017	Finalizado	1723-2024	Inspección Redes	Los Alpes	0	0	0	$ 37,633,163		2024	2025
3	Suba 1	942-2022	Firma Acta de inicio	1757-2024	Obra	Santa Rita	9	1709	13767	$ 4,059,692,985		2024	2025
4	Suba 2	942-2022	Firma Acta de inicio	1758-2024	Obra	Miramar y Santa Cecilia	10	5252	12094	$ 2,423,902,025		2024	2025
5	Ciudad Bolivar	451-2017	Estructuración	Por definir	Renovación Redes	Los Alpes	0	0	0	$ 307,000,000	$ 18,675,279,444.39	2025	2025
6	Ciudad Bolivar	451-2017	Estructuración	Por definir	Remates de Obra	Los Alpes	8	2027	1707	$ 554,000,000		2025	2025
7	Ciudad Bolivar	469-2022	Estructuración	Por definir	Obra Llave en Mano	Caracoli Llave en Mano	9	4635	9329	$ 8,619,994,141		2025	2025
8	Ciudad Bolivar	451-2017	Estructuración	Por definir	Obra Llave en Mano	Alpes Llave en mano	6	1520	1280	$ 3,865,000,000		2025	2026
9	Bosa	881-2021	Programación	Por definir	Actualización EyD y Obra	El Palmar	8	1596	3915	$ 1,594,170,009		2025	2026
10	Bosa	881-2021	Programación	Por definir	Actualización EyD y Obra	San Jose	10	3453	4699	$ 3,735,115,295		2025	2026
11	Cudad Bolivar	881-2021	Programación	Por definir	Actualización EyD y Obra	Bella Flor	15	2666	3423	$ 3,636,706,070	$ 10,348,245,344.35	2026	2026
12	San Cristobal	942-2022	Programación	Por definir	Actualización EyD y Obra	Los Puentes	15	4759	1357	$ 3,642,197,199		2026	2026
13	Suba	942-2022	Programación	Por definir	Actualización EyD y Obra	Santa Cecilia	2	690	6807	$ 519,090,509		2026	2027
14	Rafael Uribe	1118-2022	Programación	Por definir	Actualización EyD y Obra	El Portal Sector 1	4	848	1363	$ 1,186,457,793		2026	2027
15	Suba	942-2022	Programación	Por definir	Actualización EyD y Obra	Santa Rita	4	1232	6118	$ 1,086,352,328		2026	2027
16	Suba	942-2022	Programación	Por definir	Actualización EyD y Obra	Lisboa	2	1489	1824	$ 277,441,446		2026	2027
TOTALES							**108**	**33999**	**70156**	**$ 37,289,550,415**	**$ 37,289,550,415.26**		

* En color morado se resaltan los contratos requeridos para finalizar las obras inconclusas de la administración anterior(23 CIV's), con las se podrán entregar 9 CIV's en el Barrio Caracolí y 14 segmentos en el barrio los Alpes . (Ambos barrios se encuentran localizados en la Localidad de Ciudad Bolívar)

* Esta intervención permitirá entregar aproximadamente 8000 m2 de vías y espació público que beneficiaran a 12000 ciudadanos y tendrán un valor a aproximado de 14000 millones de pesos.
