INFORME DE INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS Y SUS CORREGIMIENTOS
INFORME N°28 – ABRIL/MAYO 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C.

CONTRATISTA: OPERADOR: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°068 DE 2022

DURACIÓN: 18 MESES DE OPERACIÓN DESDE 06/01/2023 HASTA 06/07/2024

MODIFICATORIO #03 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.068

DURACIÓN: 6 MESES HASTA 31 DE ENERO DICIEMBRE 2024

MODIFICATORIO #05 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.068

DURACIÓN: 6 MESES – DE 14/01/2025 A 14/07/2025

INTERVENTOR: QBM2 INGENIERIA ELECTRICA S.A.
CONTRATO N°SG-CMA-UAC-066-2022

DURACIÓN: 18 MESES A PARTIR DEL 06/01/2023

MODIFICATORIO #01 AL CONTRATO N°SG-CMA-UAC-066-2022

DURACIÓN: 6 MESES HASTA 31 DE DICIEMBRE 20245

MODIFICATORIO #02 AL CONTRATO N°SG-CMA-UAC-066-2022

DURACIÓN: 6 MESES – DE 14/01/2025 A 14/07/2025

AFINIA: CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON DESTINO AL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, N° AMNR – 169-2022 CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.-AFINIA

INDICE

1. ACTIVIDADES GENERALES 5

2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO..... 8

3. SEGUIMIENTO TÉCNICO 9

4. SEGUIMIENTO OPERATIVO 10

5. SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTABLE..... 17

6. SEGUIMIENTO JURIDICO 17

7. CUADROS Y GRAFICOS FINANCIEROS..... 18

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES FINALIZADO ABRIL 2025... 24

A N E X O S 25

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1. AP-DIS-024-2025: Bajas Transferencias al Distrito de los Recaudos del IAP a Cargo de AFINIA. 26
Anexo 2. Solicitud a Afinia Aclaración Incremento Factor Otros de la Tarifa SALP 28
Anexo 3. Acta de Comité #05 - 09/05/2025 29
Anexo 4. Registro fotográfico de seguridad y área de trabajo 35
Anexo 5. Certificado de Aportes y Seguridad Social del Contratista 36
Anexo 6. Solicitud de Modificación de Letras “Cartagena” Perimetral – SS1049697 ... 39
Anexo 7. Solicitud de Modificación de Sector la Bendición de Dios de Arroz Barato – SS1042610 40
Anexo 8. Solicitud de Modificación de Refuerzo Puente Transv. 54 con Caracoles 41
Anexo 9. Solicitud de Modificación de Socorro Calle 15, con Cra. 80 42
Anexo 10. Solicitud de Modificación de Bajos del Puente Calle 29 (Bazurto) 43
Anexo 11. Solicitud de Modificación de Ciudad Bicentenario - Fase 2 44
Anexo 12. Seguimiento de Solicitudes de Modificación abril/mayo 2025 45
Anexo 13. Registro Fotográfico Inspección Nocturna 46
Anexo 14. Registro de Auditoría de la Información de Solicitudes de abril 2025 48
Anexo 15. Registro Fotográfico Intervención Letras “Cartagena”, Av. Perimetral 49
Anexo 16. Registro Fotográfico Intervención Puente Transversal 54 50
Anexo 17. Registro Fotográfico Intervención Urb. Bicentenario 51
Anexo 18. Registro Fotográfico Intervención Corregimiento de la Boquilla 52
Anexo 19. Registro Fotográfico Intervención Portales de Alicante 53
Anexo 20. Relación de Luminarias Instaladas Bicentenario 54
Anexo 21. Relación de Luminarias Instaladas la Boquilla 59
Anexo 22. Relación de Luminarias Instaladas Portales de Alicante 66
Anexo 23. Relación de Luminarias Instaladas Pontezuela – Bayunca 70
Anexo 24. Relación De Luminarias Instaladas Pozón: Etapas I – II Y III 72
Anexo 25. Relación de Luminarias Instaladas Otros Proyectos 73
Anexo 26. Registro de Medición de Iluminación Realizada en Abril 2025 74

Anexo 27. Comunicación AP-EPM-005-2025: Ajuste De UCAP's Ejecutadas – Marzo 2025 78
Anexo 28. Comunicación AP-DIS-021-2025: UCAP's Disponibles Para Ejecución Contrato Vigente. 79
Anexo 29. Factura FV293687 de EPM - Correspondiente al Mes de Marzo 2025 81
Anexo 30. Certificado De QBM2 A EPM. 83
Anexo 31. Indicadores De Gestión De EPM – Marzo 2025 84
Anexo 32. Radicados de Informes Entregados a Distrito**.** 87
Anexo 33. Remisión Acta de Censo de Cargas De AP Corte A Marzo 2025 89
Anexo 34. Trazabilidad de la Energía del Sistema de AP 92
Anexo 35. Seguridad Social De Interventoría - Planilla Integral – SOI 7968559782 95
Anexo 36. Informe De Facturación Y Recaudo Del Impuesto De Alumbrado Público Del Mes De Febrero 2025 – Liquidado Por AFINIA (Operador Local) 97
Anexo 37. Liquidación De Energía – Abril 2025 (Correspondiente Al Mes De Marzo 2025) 98

EJECUCION DEL MES

	1. ACTIVIDADES GENERALES	EJECUTADO EN EL MES
1	**Conocer los términos condiciones del contrato.**	El contratista conoce a la perfección las obligaciones, jurídicas, administrativas, técnicas y financieras asignadas a éste y la ejecución del contrato se hace en cumplimiento irrestricto de éstas, evidenciado con los soportes aportados a Distrito. Los demás documentos relativos al contrato se encuentran publicados en la plataforma SECOP II
2	**Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia de los contratos objeto del servicio de alumbrado público en todos sus componentes de acuerdo con el objeto contractual, tomar las medidas necesarias para mitigarlos.**	Dese la Interventoría se da la advertencia del bajo nivel de transferencia al distrito del impuesto de alumbrado público, mediante la comunicación AP-DIS-024-2025, lo cual pone en riesgo la ejecución de modernización y expansiones: **Anexo 1.** AP-DIS-024-2025: Bajas Transferencias al Distrito de los Recaudos del IAP a Cargo de AFINIA. Ante la revisión del comportamiento de la tarifa de energía del sistema de alumbrado público de la ciudad, se videncia un incremento abrupto en el componente “OTROS”; por lo anterior, se presentó solicitud de aclaración, ya que esta situación incrementa el costo de la energía. **Anexo 2.** Solicitud a Afinia Aclaración incremento Factor Otros de la tarifa SALP
3	**Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo de los contratos, de los cronogramas previstos en el contrato.**	En el quinto comité, realizado el 09/05/2025, se le hizo seguimiento validando la ejecución durante el mes de abril, la atención de los requerimientos solicitados por alcaldía. Se estableció el compromiso de EPM que, en cuestión de un mes, se consumirían las ucap’s restantes dando cumplimiento a los subproyectos inicialmente propuestos de sectores y barrios, dejándolo consignado en el acta de comité. Se cumplió con el ejercicio de liquidación de las ucap’s de marzo 2.025 (735), siendo la

		base para la facturación de EPM, generada el 12/abril25 (**FV293687**). Ver seguimiento operativo del presente informe.
4	**Identificar las necesidades de cambio o ajuste.**	Contractualmente, todas las obligaciones están claras y al momento no hay lugar a modificaciones o ajustes. Se atendieron los requerimientos de consulta técnica y jurídica en relación con la continuidad de la prestación del servicio de alumbrado público para el segundo semestre 2.025.
5	**Manejar la relación con el contratista.**	La relación de Interventoría con EPM se da en buenos términos, en el marco operativo, la liquidación conjunta de las ucap's ejecutadas para soportar de facturación; así como las revisiones y validaciones de las solicitudes de modificación de infraestructura, inspecciones en sitio
6	**Administrar e intentar solucionar las controversias entre las partes.**	No hay controversias.
7	**Organizar y administrar el recibo de bienes, obras, servicios, su cantidad, calidad, especificaciones y demás atributos establecidos en los Documentos del Proceso.**	En el comité de seguimiento del 09/05/2025, servicios públicos, expreso que realizo gestión (comunicación) con el constructor de la Gran Manzana, solicitando reporte de los correctivos identificados en acta de octubre de 2024; para cerrar el ciclo de recepción de la infraestructura de alumbrado público. Al cierre de este informe no se ha recibido retroalimentación.
8	**Revisar si la ejecución del contrato cumple con los términos de este, las necesidades de la Entidad Estatal y actuar en consecuencia de acuerdo con lo establecido en el contrato.**	Se validó la ejecución de las UCAP's en marzo/2025; dejándolo expresado en comunicación AP-EPM-005-2025, del 11 de abril de 2025. Se realizó la supervisión de las intervenciones ejecutadas por EPM, durante el mes de abril/2025. Para más detalle ver las secciones "3. Seguimiento técnico" y "4. Seguimiento operativo" del presente informe
9	**Aprobar, rechazar oportunamente de forma justificada el recibo de bienes y servicios de acuerdo con lo establecido en los documentos del Proceso.**	Al finalizar el periodo actual (14/04 a 14/05), no hay solicitudes recientes de entrega de bienes de alumbrado público construido por terceros.

10	**Informar a la Entidad Estatal de posibles incumplimientos del contratista, elaborar y presentar los soportes correspondientes.**	El desarrollo de las actividades de modernización y reposición, han estado sujeta a los requerimientos particulares, provenientes de la alcaldía. EPM, ha cumplido con la operación y mantenimiento.
11	**Solicitar los informes necesarios para convocar las reuniones requeridas para cumplir con su función.**	Se solicito a EPM la información del Shape (consolidado de ejecuciones de modernización por proyecto) con corte a marzo 2025: Aportado el 08/042025 Con esta información y la tomada por la Interventoría en las inspecciones se verificaron las ucap's liquidadas del mes de marzo/2025
12	**Informar y denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte la moralidad pública, con los soportes correspondientes.**	Desarrollo de actividades contractuales sin afectación de la moralidad pública por parte del operador de EPM durante el mes de marzo 2025
13	**Suscribir las actas generadas durante la ejecución del contrato para documentar las reuniones, acuerdos, controversias entre las partes, así como las actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final.**	Acta de comité realizado el 09/052025, correspondiente a la evaluación de gestión del mes de abril y proyectando mayo 2025. Ucap's ejecutadas y actas soportes de pago a EPM **Anexo 3.** Acta de Comité #05 – 09/05/2025

	2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	EJECUTADO EN EL MES
1	**Revisar que el expediente electrónico y físico del contrato esté completo, sea actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable.**	El expediente contractual (SG-CMA-UAC-066-2022) se encuentra debidamente actualizado. Encontrándose cargado el acta de inicio, la aprobación de la póliza y registro presupuestal. De la misma forma en el expediente contractual de EPM, se encuentra el contrato electrónico suscrito con el respectivo registro presupuestal y póliza aprobada.
2	**Coordinar con el responsable en el Distrito de la revisión aprobación de garantías, la revisión de los soportes de cumplimiento de las obligaciones laborales.**	Revisada la plataforma Secop II, en lo que corresponde al expediente contractual de EPM, se evidencia cargadas las pólizas, así como la aprobación de éstas, del contrato inicial, están faltando las pólizas y aprobación de pólizas del modificatorio No 5. En lo que respecta al expediente electrónico del contrato de interventoría, las pólizas se encuentran cargadas, pero no está cargado el documento de aprobación, tras la celebración del modificatorio No 2 del contrato.
3	**Preparar y entregar los informes previstos que soliciten los organismos de control.**	No se presentaron requerimientos de entes de control en el mes de abril/2025. Pero se cuenta con toda la información que evidencie la gestión y desarrollo de la Interventoría. Se atendió invitación a reunión con Gerencia de Espacio Público el 13/05/2025, con el fin de verificar el alcance del componente de alumbrado público de las próximas intervenciones a desarrollar el distrito en los Parques Flanagan, Reloj Floral, Blas de Lezo, Apolo y Centenario.
4	**Revisar que el Distrito cumpla con los principios de publicidad de los Procesos de Contratación y de los Documentos de los Procesos.**	Se verificó en la Plataforma Secop II el cumplimiento del requisito de publicidad tanto respecto al contrato con EPM como el de interventoría.
5	**Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato.**	El contratista aplicó las medidas de seguridad en vías, delimitación de las zonas de trabajo., Cumplimiento de la seguridad social, aportada el 12/04/2025. Permanentemente, disponen de profesional de HSEQ que hace presencia en los barrios con operativa de modernización, velando que se minimicen los riesgos y accidentes. Esta actividad es constante. **Anexo 4.** Registro fotográfico de seguridad y área de trabajo **Anexo 5.** Certificado de aportes y seguridad social del contratista

	3. SEGUIMIENTO TÉCNICO	EJECUTADO EN EL MES
1	**Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables al servicio de alumbrado público en todos sus componentes de acuerdo con el objeto contractual**	Los materiales utilizados por el contratista son homologados y certificados. Los diseños fotométricos de calles y parques continúan realizándolos, con la normativa técnica RETILAP.
2	**Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumplan las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato, exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.**	EPM, cumple con las condiciones mínimas para garantizar un trabajo seguro tanto en campo como en oficinas. La supervisión de HSEQ en los proyectos es constante. El grupo de ingenieros a cargo es profesional y siempre aportante de soluciones.
3	**Identificar las necesidades de cambio o ajuste revisar el curso de acción con las partes.**	Se identificó y se superó la necesidad reforzar la iluminación de la zona recuperada aledaña al Puente de la Transversal 54 (Los Caracoles), articulada con secretaria general, Umata y Gerencia de Espacio Público.
4	**Estudiar las solicitudes, requerimientos técnicos de los contratistas, dar recomendaciones a la Entidad Estatal sobre el particular.**	Interventoría revisó y avaló solicitudes de modificación de infraestructuras (SMI) aportadas por EPM, el periodo de marzo a abril 2025 **Anexo 6**. Solicitud de Modificación De Letras “Cartagena” Perimetral – SS1049697 **Anexo 7**. Solicitud de Modificación De Sector La Bendición De Dios De Arroz Barato – SS1042610 **Anexo 8**. Solicitud De Modificación de Refuerzo Puente Transv. 54 con caracoles (aprobado) **Anexo 9**. Solicitud De Modificación de Socorro Calle 15, con Cra. 80 (aprobado) **Anexo 10**. Solicitud De Modificación de Bajos del Puente Calle 29 (Bazurto) **Anexo 11**. Solicitud De Modificación de Ciudad Bicentenario - Fase 2 **Anexo 12.** Seguimiento de solicitudes de modificación abril/mayo 2.025
5	**Elaborar la documentación y el soporte necesario frente la necesidad de hacer efectivas las garantías de los contratos objeto de interventoría**	No se presentaron situaciones que conllevaran a la aplicación las garantías.

	4. SEGUIMIENTO OPERATIVO	EJECUTADO EN EL MES
1	**Supervisar la actualización del Sistema de Información Georreferenciado de la infraestructura del servicio de alumbrado público del Distrito.**	El operador de alumbrado público mantiene su sistema ARCGIS actualizado en tiempo real paralelo con el desarrollo de las modernizaciones. El operador EPM, comparte el SHAPE, que es la información base para actualizar el sistema de información georreferenciado.
2	**Auditar la calidad de la información incluida en la base de datos, de acuerdo con la norma NTC ISO 2859 parte 1, "Planes de muestreo determinado por el nivel aceptable de calidad (NAC o AQL) para inspección lote a lote", y verificar que se realice la correspondiente actualización de la base de datos, para todos los procesos de modernización, expansión, cambio de infraestructura, retiro o cambio de luminarias, inclusión de infraestructura nueva, reubicación de luminarias o de infraestructura y en general de todo proceso que afecte el inventario georreferenciado.**	En el periodo de ejecución (14/04 a 13/05), con relación a la modernización, reposición y expansión se verificó la información soporte de las ejecuciones en los siguientes lugares: 1) Obras ejecutadas por EPM, ● Corregimiento de La Boquilla ● Urb. Bicentenario (continuación) ● Urb. Portales de Alicante ● Pendientes de Pozón Etapas I – II – III ● Pendientes en Pontezuela y Bayunca ● Intervenciones en Puente de Transversal 54 – Los Caracoles ● Intervención en La perimetral – Puente Jiménez (Pie de la Popa) 2) Obras pendientes de ejecutar concertadas en comité de seguimiento del 09/05/2025: ● Barrio Sevillana ● Palmas de Salamanca ● San Pedro ● Zonas Normalizadas de Antonio José de Sucre – Henequen – Los Girasoles – Villa Rosa ● Vía Barú ● Ruta 90 (Via al Mar - Cordialidad) ● Isla Grande ● Vía La Boquilla desde Hotel Sonesta hasta Hotel Derust ● Vía Pontezuela -Bayunca Vía al Mar ● Las definidas en programación a presentar de EPM Se efectúo auditoria y se registraron los códigos de las luminarias instaladas en los proyectos terminados. De acuerdo con la NTC-ISO-2859, el tamaño de la muestra es n = 80. Sin embargo, Se

		tomo la totalidad del universo de luminarias instaladas en el mes 14/04 a 13/05 de 2.025.
3	**Monitorear el estado de la infraestructura de alumbrado mediante inspecciones en jornadas diurnas y nocturnas, garantizando el cubrimiento del 100% del área Distrital mensualmente**	Interventoría, realizó recorridos nocturnos verificando eficiencia del sistema, y en especial se visitó las Urbanizaciones Bicentenario, Portales de Alicante, validando el funcionamiento de la nueva infraestructura, se muestra en el anexo a continuación. **Anexo 13.** Registro fotográfico Inspección nocturna Se generan reporte derivados de las inspecciones nocturnas y diurnas. Reportadas directamente a los coordinadores de EPM para su atención inmediata con las cuadrillas nocturnas. Atención oportuna por el operador de alumbrado público EPM. Se continua con el monitoreo, al tiempo que se generan reportes dirigidos al operador EPM, quienes al tiempo cuentan con cuadrillas nocturnas en permanente recorridos para atender las falencias detectadas en especial en la zona turística. Ver siguiente numeral.
4	**Reportar al Operador las deficiencias encontradas en el servicio.**	Tanto supervisores como ingenieros de Interventoría realizaron reportes de fallas de alumbrado público a través de los canales formales de EPM, y visitas a usuarios, generando reportes a través de los canales telefónicos de atención al usuario y otros reportados directamente a los supervisores. Se realizaron reportes de zonas apagadas directamente a los ingenieros del área operativa de EPM para una ágil atención.
5	**Revisar los reportes de quejas y reclamos por alumbrado público, y verificar el cumplimiento de los trabajos solicitados.**	Actividad recurrente de Interventoría por medio de los supervisores, se cuenta con datos de las solicitudes que evidencian la atención prestada por las cuadrillas de EPM. **Anexo 14.** Registro de auditoría de la información de solicitudes de abril 2025
6	**Hacer seguimiento a las Comunicación que surjan de la comunidad, el Distrito, organismos de control, operador del servicio de alumbrado público,**	Se hizo seguimiento a las quejas de usuarios y se valido su atención Ver numeral 6 del seguimiento operativo

	relacionadas con quejas, reclamos y solicitudes de expansión con el objeto de apoyar al Distrito, en la atención de la preparación de las respuestas.	
7	**Apoyar al alcalde o a quien él delegue, en la evaluación de los requerimientos de expansiones del alumbrado público, en la revisión de los diseños de alumbrado público de tales expansiones**	Esta es una tarea constante de la interventoría con el operador EPM, se continúa validando la relación de sectores por modernizar para proyectar cobertura al 100%, ya que constantemente, se van sumando zonas con redes eléctricas normalizadas.
8	**Inspeccionar las obras de expansión, modernización, reposición, repotenciación y remodelación de puntos del sistema de alumbrado público, y verificar su total sujeción al diseño aprobado, al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico, así como a las normas constructivas y de urbanismo adoptadas por el Distrito.**	Atendiendo a la prioridad de la Alcaldía, se inspeccionaron los proyectos ejecutados en el periodo correspondiente a: Alrededores del Jaime Morón, Urb. Bicentenario, Vía Perimetral, Puente Romero Aguirre, Getsemaní. **Anexo 15.** Registro fotográfico Intervención Letras “Cartagena”, Av. Perimetral **Anexo 16.** Registro fotográfico Intervención Puente Transversal 54 **Anexo 17.** Registro fotográfico Intervención Urb. Bicentenario **Anexo 18.** Registro fotográfico Intervención Corregimiento de la Boquilla **Anexo 19.** Registro fotográfico Intervención Portales de Alicante
9	**Llevar el control sobre las expansiones programadas en cuanto a ejecución y su relación con los materiales y equipos utilizados.**	Se revisaron y se determinaron las cantidades ejecutadas por los proyectos que se listan a continuación: **Anexo 20.** Relación de luminarias instaladas Bicentenario **Anexo 21.** Relación de luminarias instaladas La Boquilla **Anexo 22.** Relación de luminarias instaladas Portales de Alicante **Anexo 23.** Relación de luminarias instaladas Pontezuela – Bayunca **Anexo 24.** Relación de luminarias instaladas Pozón: etapas I – II y III **Anexo 25.** Relación de luminarias instaladas Otros Proyectos
10	**Supervisar la actualización de la base de datos del inventario.**	Actividad recurrente de EPM, con cada modernización en barrios. Cada nuevo punto de modernización y expansión queda registrado en el sistema ARCGIS. Y lo comparten a través de la carpeta SHAPE, siendo la anterior versión entregada el pasado 08/04/2025

11	**Verificar la aplicación del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público –RETILAP, en las etapas de asignación de requisitos fotométricos a vías y demás espacios públicos, aprobación de diseños, especificación de equipos, construcción y mantenimiento de los proyectos de alumbrado público, así como de las disposiciones contempladas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).**	Las ejecuciones están acorde a los diseños y se cumple con los niveles de iluminación. Se mantiene la premisa de instalación de luminarias, brazos, cableado y accesorios homologados y certificados, adecuados para las condiciones climáticas tropicales y salinas de Cartagena. Por parte de Interventoría, se verifico los niveles de iluminación de los sectores evaluados, lo cual se aprecia en el siguiente numeral.
12	**Identificar los sectores que presenten deficiencias en el alumbrado público, mediante la realización de la medición de iluminancia o luminancia, según se aplique o sea conveniente. Para la verificación de los niveles de iluminación (iluminancia) o luminancia de proyectos nuevos y del alumbrado existente, usando equipos de medida con certificado de calibración o verificación vigente. Informar del resultado de las mediciones la interventoría al responsable del servicio de alumbrado público del Distrito, de acuerdo con el alcance que señala el reglamento técnico del servicio.**	Interventoría ejecutó medidas de iluminancia la Urbanización Portales de Alicante. Arrojando unos niveles de iluminación conformes a la exigencia normativa RETILAP, acorde al tipo de vía y espacio a evaluar. **Anexo 26.** Registro de medición de iluminación realizada en abril 2025
13	**Apoyar al responsable del servicio de alumbrado público en el Distrito en el trabajo conjunto de revisión de diseños de alumbrado público, lo que hará de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento**	Ídem #7 del Seguimiento operativo. Esta actividad ha sido constante, en la medida que se han presentado las solicitudes de modificación de infraestructuras y expansiones.
14	**Verificar el correcto funcionamiento del sistema de consulta en la Web cuando aplique y la actualización permanente de su información. Será responsabilidad de la Interventoría adecuar sus sistemas de transferencias de datos, información, indicadores y en general, de informes de acuerdo con los formatos y la periodicidad que el Distrito defina para tal efecto.**	El Distrito, mantiene activo su correo institucional para la recepción de solicitudes con las comunidades: alumbradopublico@cartagena.gov.co La Interventoría cuenta con página web: www.qbm2.com A través de la página se pueden recibir solicitudes que son abordadas por los ingenieros del área técnica para darle solución. También se tienen los canales: correspondencia@qbm2.com El informe correspondiente a marzo 2025 de Interventoría fue ingresado en el SECOP II

15	**Analizar el informe de indicadores de calidad del servicio de energía, DES y FES, que el Operador de Red entregue a la Superintendencia de Servicios Públicos, con el fin de establecer el monto de la energía a descontar o compensar por calidad del servicio; así como la energía descontable por no haber sido suministrada a causa de interrupciones programadas o no programadas en los circuitos que no cuentan con contadores o equipos de medida, imputables al Operador de Red**	Se mantiene la observación en relación con la unificación de la información georreferenciada e inventario del alumbrado público con AFINIA para que se pueda determinar exactamente los indicadores
16	**Verificar para el caso de parques y conjuntos o unidades inmobiliarias con cerramiento, el tipo de cesión que tienen tales áreas con el fin de definir si la infraestructura instalada corresponde al servicio de alumbrado público. Para el caso, verificará la información recibida del operador del servicio de alumbrado público sobre tales áreas, así como de las autoridades de planeación Distrital. Una vez depurada la información, la interventoría debe notificar a las autoridades Distritales acerca de los resultados obtenidos. En la realización de esta función la interventoría deberá consultar entre otros, licencias de construcción, planos de urbanismo, inventarios levantados por el operador del sistema de alumbrado público y por el operador de la red, así como inspección a los sitios en definición.**	No hay requerimiento de consultas recientes.
17	**Verificar el cumplimiento de la normatividad distrital, regional y nacional vigente en materia ambiental; respecto del manejo y disposición de equipos y materiales retirados del sistema de alumbrado público por parte del operador.**	Al cierre de este informe EPM, continúa con el pendiente de aportar soportes de la gestión ambiental, para validación de cumplimiento.
18	**Verificar el cumplimiento de los requisitos del Código Nacional de Tránsito y de las disposiciones de tránsito municipal vigentes, así como el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional por parte de los grupos de trabajo del operador de alumbrado público, en especial sobre la adecuada señalización vial de los sitios de trabajo, identificación de vehículos y protección del personal.**	EPM, cuenta con Plan de manejo de tránsito vigente. EPM, trata al máximo de minimizar la ocupación de espacio público sin perturbar la movilidad en los diferentes sectores intervenidos. La señalización en las áreas de trabajo es permanente en todas las áreas intervenidas evidenciado en los registros fotográficos.


19	**Apoyar en el análisis, revisión, evaluación y valoración del costo del servicio de alumbrado público con base en la facturación que emita el Operador del servicio de alumbrado público que por concepto del servicio le presta al Distrito**	Posterior a la revisión de las obras ejecutadas se conciliaron las ucap's liquidadas (735) y se oficializaron mediante comunicación enviada el 11/04/2025 **Anexo 27.** Comunicación AP-EPM-005-2025: Ajuste de ucap's ejecutadas – marzo 2025 **Anexo 28.** Comunicación AP-DIS-021-2025: Ucap's disponibles para ejecución Contrato vigente EPM, presento factura el 22/04/2025, y en ella se validó las ucap's liquidadas por modernización. **Anexo 29.** Factura FV293687 de EPM - Correspondiente al mes de marzo 2025 **Anexo 30.** Certificado de QBM2 a EPM. EPM.
20	**Cumplir con los indicadores de gestión y seguimiento que se establezcan contractualmente, e incluirlos en informes mensuales y en el informe final.**	Los indicadores presentados en este informe corresponden mes de marzo 2025, tomando como base reporte presentado por EPM Ordenes de trabajo atendidas: **461** Tiempo de atención promedio**: 34** horas Eficiencia del sistema del **99.1%** La meta contractual es del 90% lo que señala una buena prestación del servicio **Anexo 31.** Indicadores de gestión de EPM
21	**Elaborar y presentar los informes mensuales sobre la ejecución de las obligaciones. En los informes, someterá a consideración sus observaciones, conclusiones, recomendaciones, correctivos y demás información que considere pertinente para el buen desempeño en la prestación del servicio, las que deberán estar debidamente soportadas. Los informes deben estar complementados con gráficas, cuadros, estadísticas, fotografías, tablas, etc., que permitan su correcta comprensión.**	Informes radicados en el SIGOB el 14/04/2025 AP-DIS-018-2025: Envío Informe de febrero 2025 AP-DIS-019-2025: Envío Informe de supervisión **Anexo 32.** Radicados de informes entregados a Distrito. También cargados en la plataforma SECOPII


22	**Conciliar el aforo y/o inventario de luminarias con el operador o comercializador que suministra la energía para el alumbrado público al Distrito de Cartagena, a fin de mantenerlo actualizado**	La energía conciliada en nivel 1, con corte a marzo 2025 es de **1.872.589** Kwh-m. Se evidencia un crecimiento del **0.4%,** a razón de la inclusión de obras de expansión Valor anterior de energía: **1.865.059** Kwh-m El Inventario vigente pasó de **62.148** luminarias a de **62.513** luminarias. **Anexo 33.** Remisión Acta de Censo de cargas de AP corte a marzo 2025 **Anexo 34.** Trazabilidad de la energía del sistema de AP
23	**Para legalizar la terminación del contrato de Interventoría, se deberá entregar al Distrito los datos y archivos recopilados durante la ejecución de este, debidamente foliados y almacenados, conforme a las disposiciones de manejo de archivos de la Entidad, así como los programas fuente que se hayan desarrollado o implementado para cumplir con sus obligaciones. Debe entregar manuales de Usuario y Técnicos relacionados con el software y mantenimiento que se le debe dar a dichos aplicativos. Dos meses antes de terminar el contrato, debe suministrar al Distrito las especificaciones del software y hardware utilizado, diseños de bases de datos, y toda la información relacionada.**	Los datos, y archivos recopilados se tienen dispuestos por año


	5. SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTABLE	EJECUTADO EN EL MES
1	**Hacer seguimiento de la gestión financiera de los contratos por parte de la Entidad Estatal, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja.**	Al verificar en la plataforma Secop II se evidencia que se encuentra cargado el registro presupuestal, en lo que corresponde a la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja, el seguimiento se encuentra en cabeza del Distrito, frente a esto la interventoría está en la obligación de orientar para hacerlo de la mejor manera, ante lo que el Distrito le requiera, de la misma forma de la revisión hecha en la Plataforma Secop II se encuentra cargada la cuenta presentada por EPM. En lo que corresponde a la cuenta de QBM también se encuentra cargada.
2	**Elaborar informe sobre el trámite administrativo y contable de la facturación de los servicios prestados como trámite previo para que el Distrito emita las órdenes de pago al operador del alumbrado público en todos sus componentes, conforme esté estipulado en el contrato**	Ver anexo 27. Se elaboró el Soporte de facturación Contrato Interadministrativo N°068-2022 del mes de marzo, que respalda el acta de pago.
3	**Documentar los pagos o ajustes que se hagan y controlar el balance presupuestal para efecto de los pagos y de liquidación de estos.**	Adicional se presentó el acta de pago suscritas juntamente con Distrito correspondiente a la factura de marzo 2025
4	**Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato del servicio de alumbrado, entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuar, así como los correspondientes al contrato de interventoría.**	Se dispone de toda la información soporte como evidencia que demuestre la ejecución del actual contrato de interventoría.
	6. SEGUIMIENTO JURIDICO	**EJECUTADO EN EL MES**
1	**El seguimiento jurídico busca la conformidad de la ejecución de los contratos con el texto de estos, la normativa aplicable a estos.**	Participación y asesoría permanente de parte de Interventoría, buscando el desarrollo favorable del contrato.


7. CUADROS Y GRAFICOS FINANCIEROS

Información financiera, concerniente con el reporte de facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público del mes de marzo 2025, aportado por AFINIA En razón a lo dispuesto en el ACUERDO 107 de Dic 14 de 2022, el Operador de Red local (AFINIA) facturaba y recaudaba hasta abril 2023 el IAP de todos los Sujetos Pasivos de dicho acuerdo. A partir de mayo 2023, esa labor pasó a responsabilidad de los Comercializadores diferentes al OR local y/o Autoliquidación de los TERCEROS. Los dineros del IAP de estos sujetos se depositan en la misma cuenta de que dispone Secretaría de Hacienda para el SALP enviándole la información mensual a la Secretaría General-Unidad de Servicios Públicos.

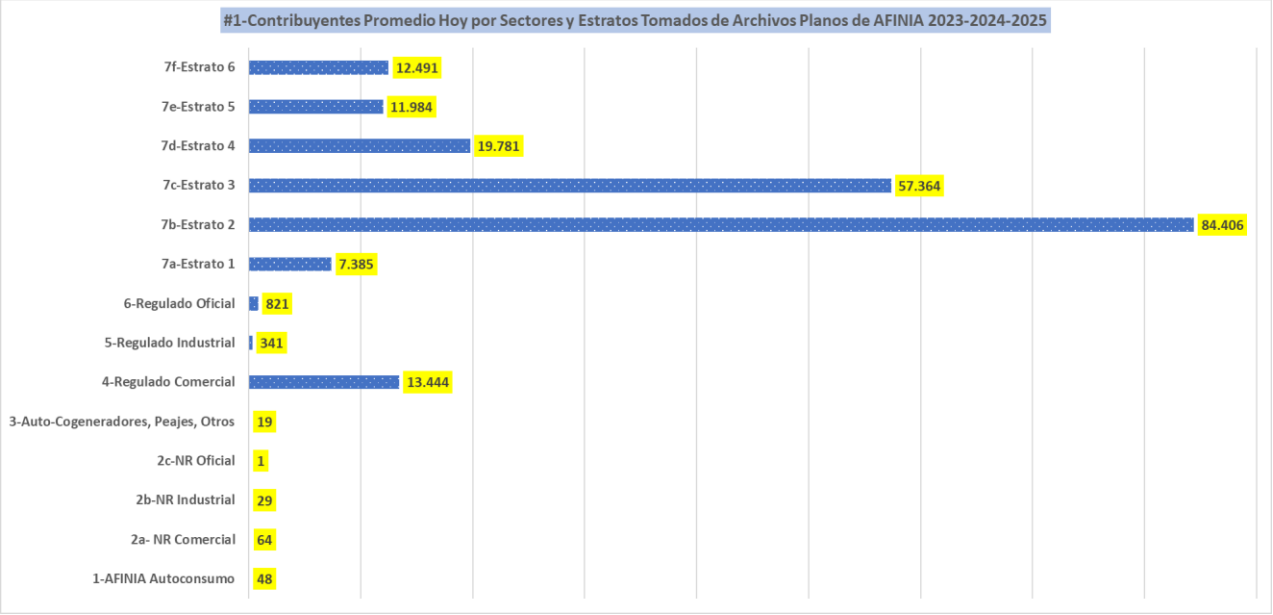


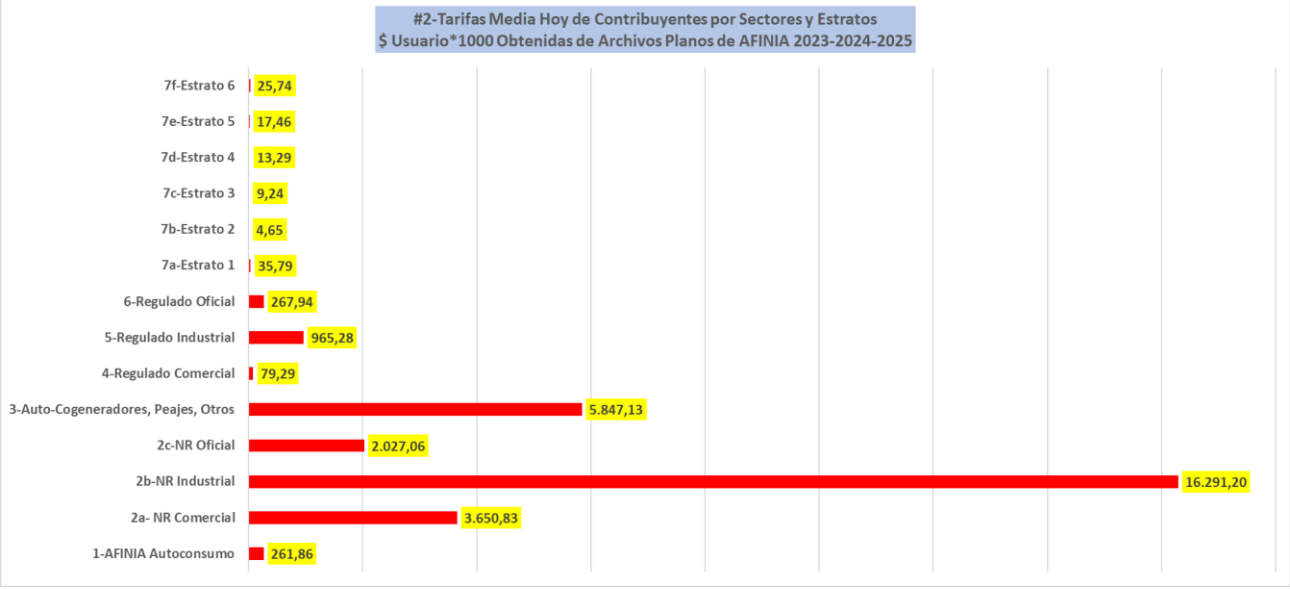


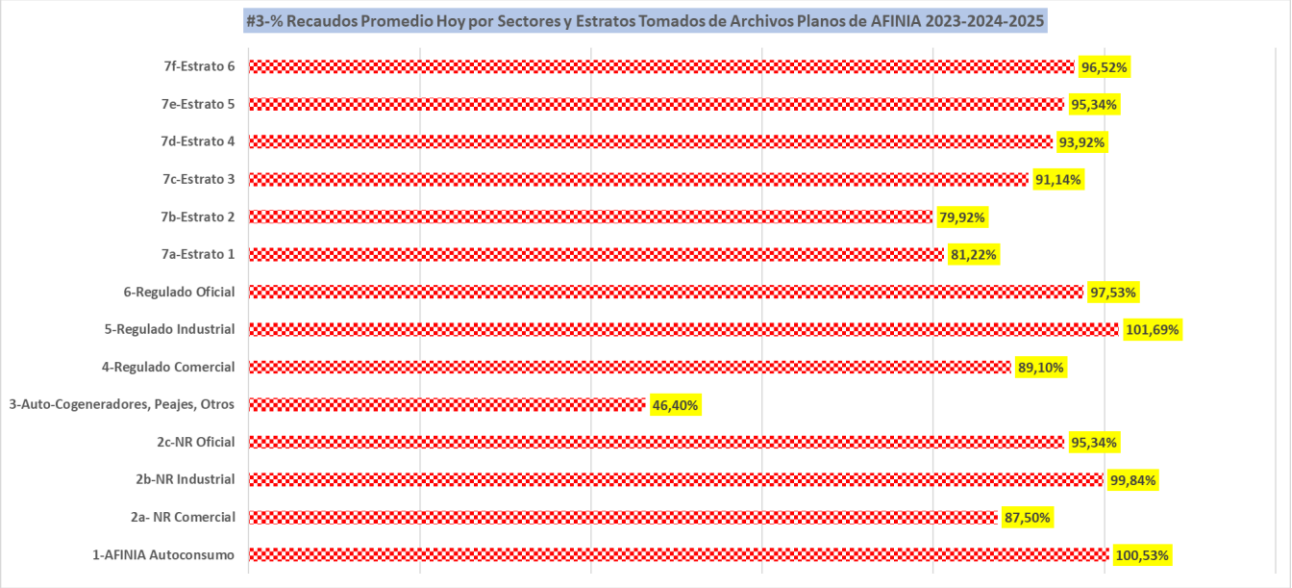

#3-% Recaudos Promedio Hoy por Sectores y Estratos Tomados de Archivos Planos de AFINIA 2023-2024-2025
7f-Estrato 6
96,52%
7e-Estrato 5
95,34%
7d-Estrato 4
93,92%
7c-Estrato 3
91,14%
7b-Estrato 2
79,92%
7a-Estrato 1
81,22%
6-Regulado Oficial
97,53%
5-Regulado Industrial
101,69%
4-Regulado Comercial
89,10%
3-Auto-Cogeneradores, Peajes, Otros
46,40%
2c-NR Oficial
95,34%
2b-NR Industrial
99,84%
2a- NR Comercial
87,50%
1-AFINIA Autoconsumo
100,53%

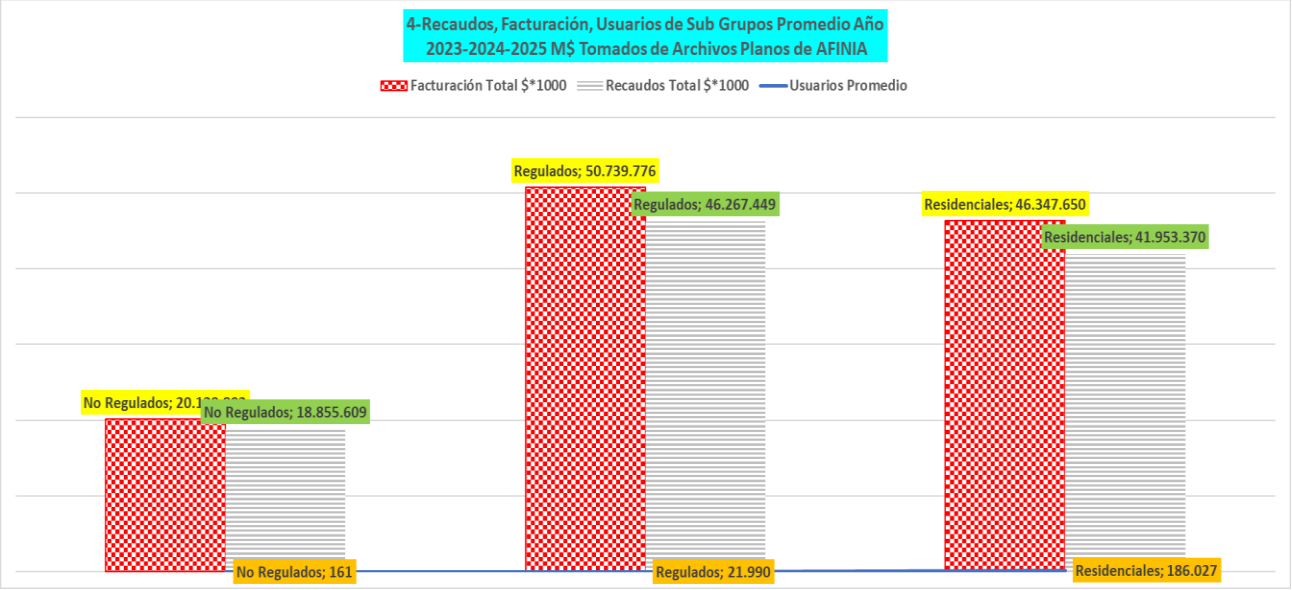

4-Recaudos, Facturación, Usuarios de Sub Grupos Promedio Año 2023-2024-2025 M$ Tomados de Archivos Planos de AFINIA
Facturación Total $*1000
Recaudos Total $*1000
Usuarios Promedio
No Regulados; 18.855.609
No Regulados; 161
Regulados; 50.739.776
Regulados; 46.267.449
Regulados; 21.990
Residenciales; 46.347.650
Residenciales; 41.953.370
Residenciales; 186.027



5-Promedio Facturación y Recaudos Año
2023-2024-2025 M$ Solo AFINIA
Facturación
Recaudos
1
117.227.228
107.076.428

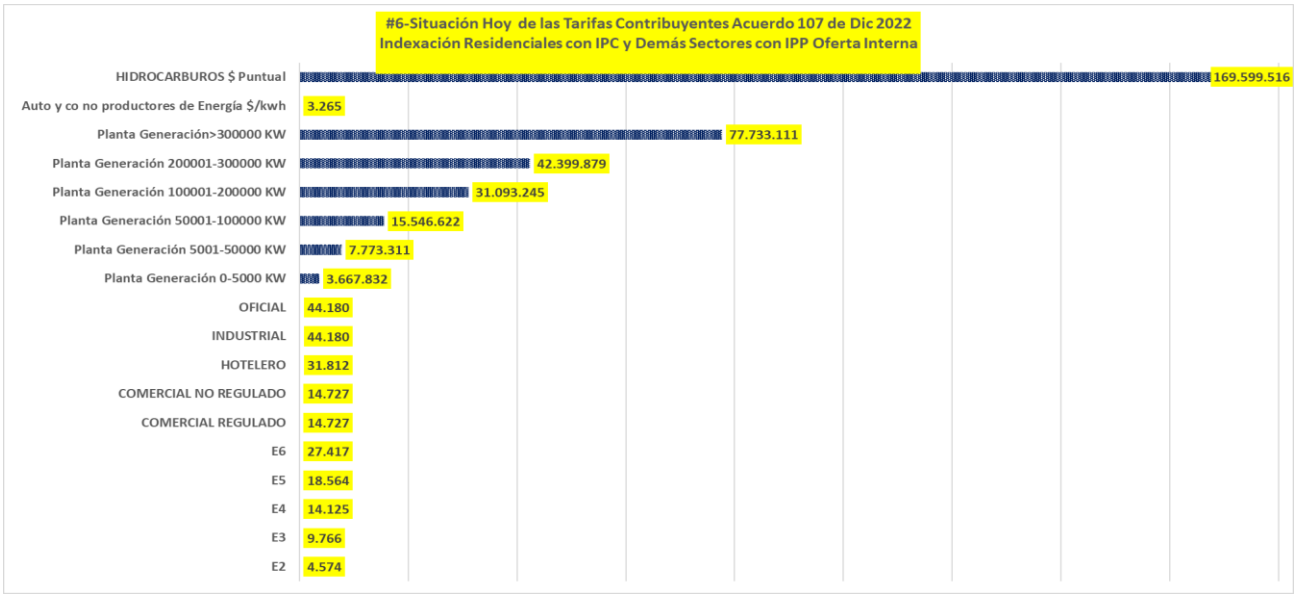
#6-Situación Hoy de las Tarifas Contribuyentes Acuerdo 107 de Dic 2022
Indexación Residenciales con IPC y Demás Sectores con IPP Oferta Interna
HIDROCARBUROS $ Puntual 169.599.516
Auto y co no productores de Energía $/kwh 3.265
Planta Generación>300000 KW 77.733.111
Planta Generación 200001-300000 KW 42.399.879
Planta Generación 100001-200000 KW 31.093.245
Planta Generación 50001-100000 KW 15.546.622
Planta Generación 5001-50000 KW 7.773.311
Planta Generación 0-5000 KW 3.667.832
OFICIAL 44.180
INDUSTRIAL 44.180
HOTELERO 31.812
COMERCIAL NO REGULADO 14.727
COMERCIAL REGULADO 14.727
E6 27.417
E5 18.564
E4 14.125
E3 9.766
E2 4.574

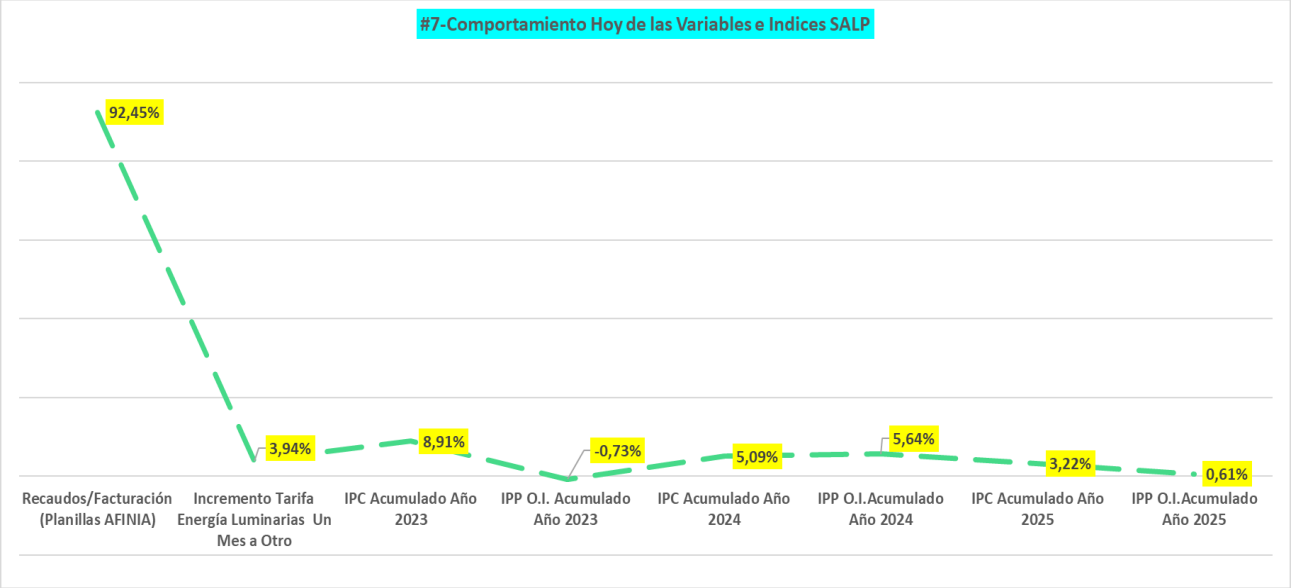
#7-Comportamiento Hoy de las Variables e Indices SALP
92,45%
3,94%
8,91%
-0,73%
5,09%
5,64%
3,22%
0,61%
Recaudos/Facturación (Planillas AFINIA)
Incremento Tarifa Energía Luminarias Un Mes a Otro
IPC Acumulado Año 2023
IPP O.I. Acumulado Año 2023
IPC Acumulado Año 2024
IPP O.I.Acumulado Año 2024
IPC Acumulado Año 2025
IPP O.I.Acumulado Año 2025

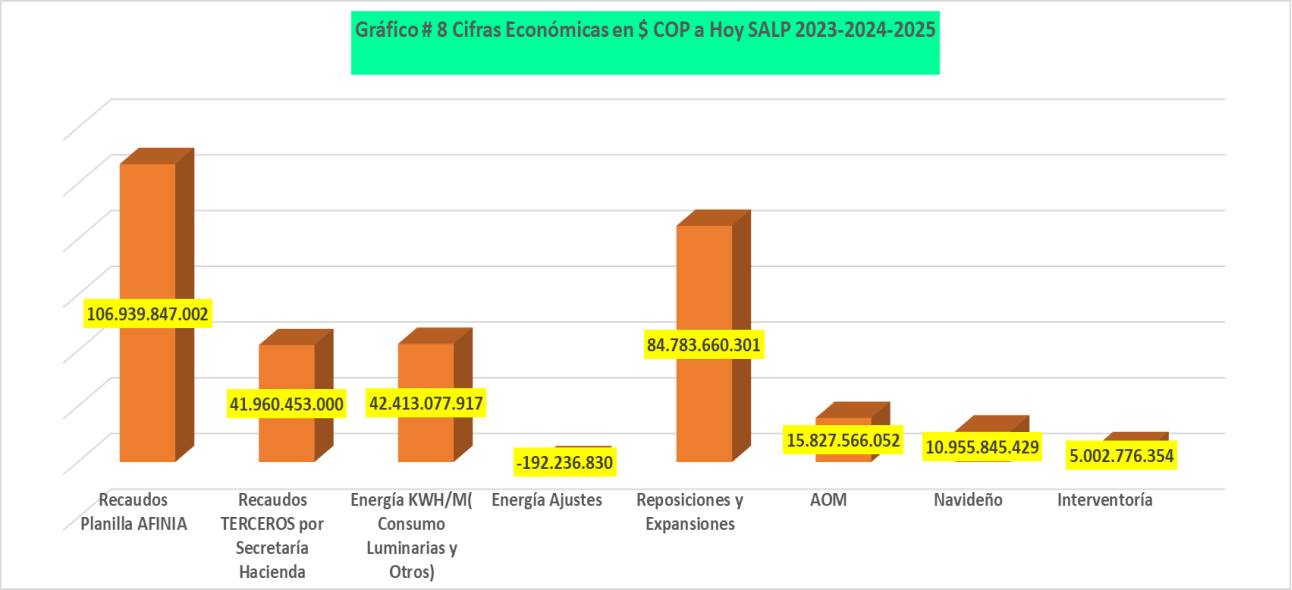
Gráfico # 8 Cifras Económicas en $ COP a Hoy SALP 2023-2024-2025
106.939.847.002
41.960.453.000
42.413.077.917
-192.236.830
84.783.660.301
15.827.566.052
10.955.845.429
5.002.776.354
Recaudos Planilla AFINIA
Recaudos TERCEROS por Secretaría Hacienda
Energía KWH/M(Consumo Luminarias y Otros)
Energía Ajustes
Reposiciones y Expansiones
AOM
Navideño
Interventoría

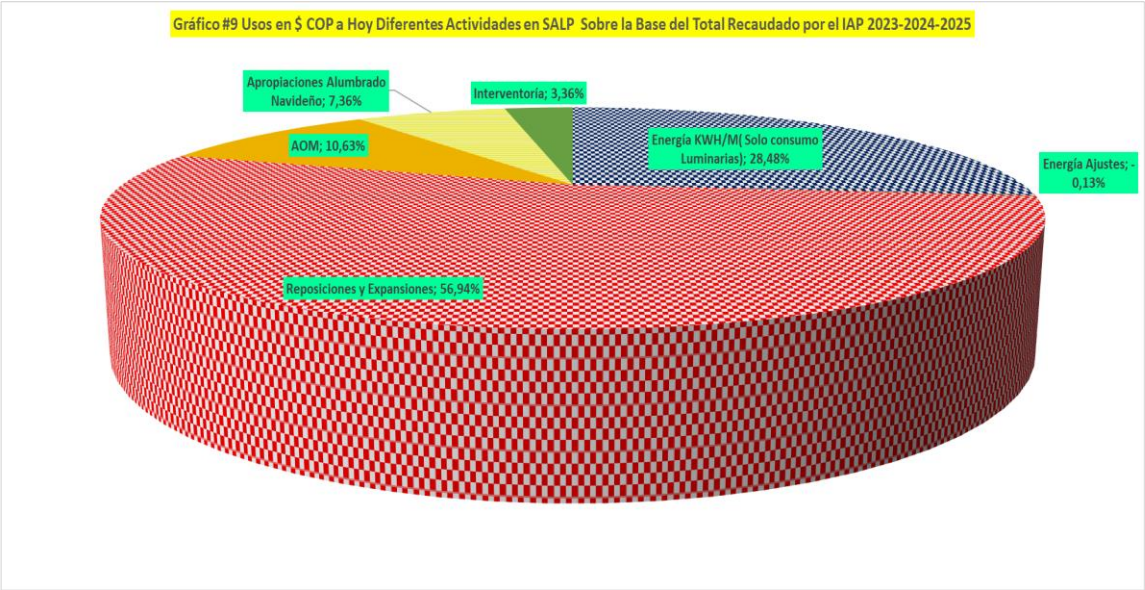

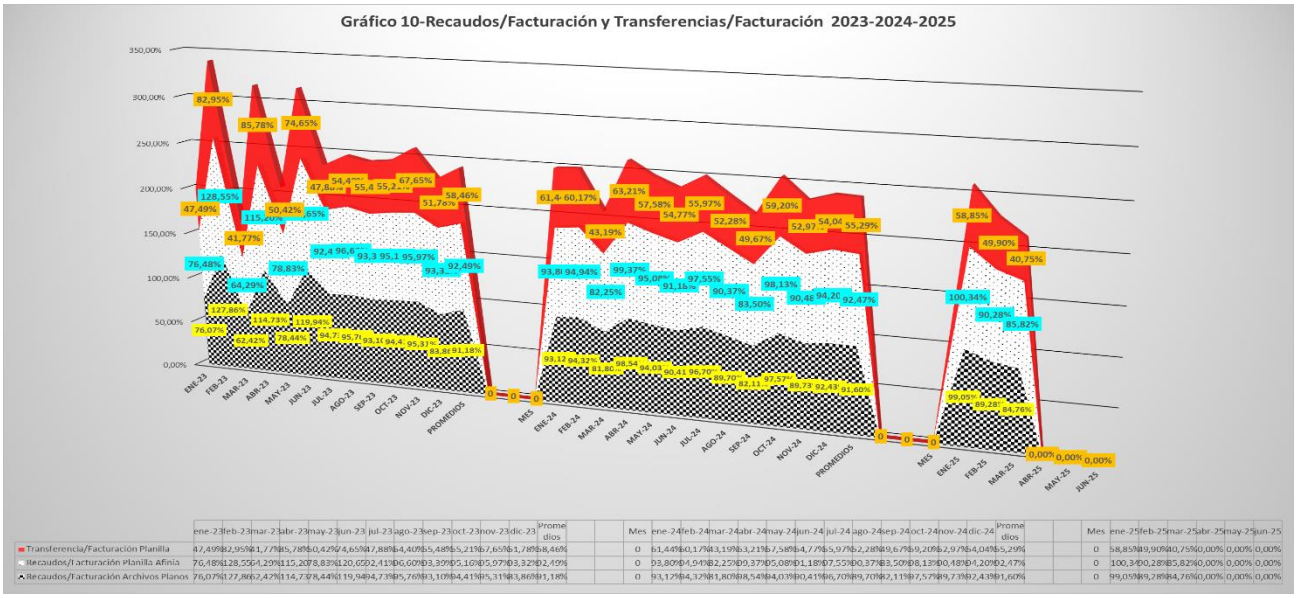

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Promedios		Mes	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Promedios		Mes	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25
Transferencia/Facturación Planilla	47,49%	82,95%	41,77%	85,78%	50,42%	74,65%	47,88%	54,40%	55,48%	55,21%	67,65%	61,78%	58,46%		0	61,44%	60,17%	63,19%	63,21%	57,58%	54,77%	55,97%	52,28%	59,20%	52,97%	54,04%	55,29%		0	58,85%	49,90%	40,75%	0,00%	0,00%	0,00%
Recaudos/Facturación Planilla Afinia	76,48%	128,55%	66,20%	115,20%	78,83%	120,65%	92,41%	96,60%	93,30%	95,10%	95,97%	93,32%	92,49%		0	93,80%	94,94%	82,25%	99,37%	95,08%	91,18%	97,55%	90,37%	98,13%	90,48%	94,20%	92,47%		0	100,34%	90,28%	85,82%	0,00%	0,00%	0,00%
Recaudos/Facturación Archivos Planos	76,07%	127,88%	62,42%	114,73%	78,44%	119,94%	94,73%	95,76%	93,10%	94,41%	95,31%	93,86%	91,18%		0	93,12%	94,32%	81,80%	98,54%	94,88%	90,43%	96,76%	89,70%	97,57%	86,73%	92,43%	91,60%		0	99,05%	89,28%	84,76%	0,00%	0,00%	0,00%

CUADRO 10-DATOS MENSUALES DEL SALP DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS A PARTIR ENERO AÑO 2023 HASTA HOY (El AOM y la Modernización para 2024 se reajustaron con el IPP del DANE Año 2023 de acuerdo al Convenio DISTRITO-EPM 068/2022)															Cuadro 11-Información Adicional de Interés por Nueva Regulación $ COP		
Mes	KWHr Solo Luminarias	KWHr Incluye Luminarias y Escenarios y Otros	Tarifa Energía $/kwh Luminarias	Tarifa Energía $/kwh Escenarios y otros	Incremento Tarifa Energía Luminarias un Mes a Otro %	Costo Energía Luminarias + Estadios y Otros Sin Ajustes $ COP	Tarifas AOM $/kwh Luminarias Metodología CREG	Facturación Efectiva MM $ COP Planilla AFINIA	Recaudo Efectivo MM $ COP Planilla AFINIA	Transferencia al Distrito MM$ $ COP	IPC	IPP Oferta Interna	Modernización Expansiones, EPM Operador $COP	Apropiación Alumbrado Navideño $ COP	Ajustes y/o Descuentos en Energía	Valor Final Consumo Energía SALP	Recaudo Efectivo MM $ COP TERCEROS
ene-23	3.006.004	3.040.305	569,27	759,47		1.737.275.951	155,29	5.725	4.378	2.719	1,7800%	1,8766%	2.748.180.917	469.707.196	-77.940.740	1.659.335.211	
feb-23	2.715.101	2.746.950	572,82	790,93	0,62%	1.580.459.100	171,93	3.278	4.214	2.719	1,6600%	1,1610%	2.748.180.917	469.707.196	-10.087.808	1.570.371.292	
mar-23	3.006.007	3.048.555	604,64	797,80	5,55%	1.851.497.962	155,29	8.183	5.261	3.418	1,0500%	-0,0166%	2.748.180.917	469.707.196	-8.196.385	1.843.301.577	
abr-23	2.909.036	2.945.568	600,10	818,19	-0,75%	1.775.609.431	160,47	6.010	6.923	5.155	0,7800%	-1,0706%	2.748.180.917	469.707.196	-7.964.846	1.767.644.585	
may-23	3.006.004	3.043.722	559,88	826,37	-6,70%	1.714.179.902	155,29	6.007	4.736	3.029	0,4300%	-0,9985%	2.748.180.917	469.707.196	-7.329.126	1.706.850.776	
jun-23	2.909.036	2.942.466	563,46	833,27	0,64%	1.666.984.661	160,47	3.620	4.368	2.703	0,3000%	-1,3861%	2.748.180.917	469.707.196	-1.626.404	1.665.358.257	
jul-23	2.962.464	3.000.301	539,44	810,63	-4,26%	1.628.751.261	157,57	3.655	3.377	1.750	0,5000%	-0,7314%	2.748.180.917	469.707.196	-1.583.945	1.627.167.316	
ago-23	2.699.483	2.748.567	544,84	833,99	1,00%	1.511.731.957	172,92	3.583	3.461	1.949	0,7000%	1,3009%	2.748.180.917	469.707.196	-464.258	1.511.267.699	
sep-23	2.612.403	2.652.781	522,44	842,32	-4,11%	1.398.840.516	178,69	3.686	3.443	2.045	0,5400%	0,7387%	2.748.180.917	469.707.196	-1.182.782	1.397.657.734	
oct-23	2.699.481	2.739.579	527,77	848,12	1,02%	1.458.723.634	172,92	3.648	3.471	2.014	0,2500%	0,2425%	2.748.180.917	469.707.196	1.540.414	1.460.264.048	
nov-23	2.612.401	2.645.981	522,79	917,79	-0,94%	1.396.560.635	178,69	4.934	4.735	3.338	0,4700%	-1,0916%	2.748.180.917	469.707.196	1.208.018	1.397.768.653	
dic-23	2.584.578	2.621.864	544,12	943,47	4,08%	1.441.503.783	180,61	3.712	3.464	1.922	0,4500%	-0,7509%	2.748.180.917	469.707.196	100.524.618	1.542.028.401	3.533
ene-24	2.577.633	2.614.096	549,11	1.053,40	0,92%	1.453.808.630	230,05	3.890	3.649	2.390	0,9200%	0,8139%	3.723.405.820		-194.582.780	1.259.225.850	1.091
feb-24	2.411.335	2.453.592	577,24	1.051,24	5,12%	1.436.350.491	245,92	3.744	3.554	2.253	1,0900%	0,9040%	3.723.405.820		-134.651.440	1.301.699.051	975
mar-24	2.603.570	2.657.993	577,45	1.061,49	0,04%	1.561.196.097	227,76	3.995	3.286	1.726	0,7000%	0,0902%	3.723.405.820		0	1.561.196.097	888
abr-24	2.519.584	2.566.020	628,16	1.086,33	8,78%	1.633.134.565	235,35	4.004	3.979	2.531	0,5900%	0,3096%	3.723.405.820		185.186.702	1.818.321.267	1.039
may-24	2.523.606	2.559.132	597,62	1.106,28	-4,86%	1.547.471.662	234,98	4.127	3.924	2.376	0,4300%	-0,4546%	3.723.405.820		0	1.547.471.662	0
jun-24	2.442.199	2.488.604	583,40	1.118,89	-2,38%	1.476.694.857	242,81	4.057	3.699	2.222	0,3200%	0,9190%	3.723.405.820		0	1.476.694.857	0
jul-24	2.429.979	2.474.461	659,78	1.068,63	13,09%	1.650.785.932	244,03	3.970	3.873	2.222	0,2000%	0,1173%	3.723.405.820	886.559.846	0	1.650.785.932	3.111
ago-24	2.429.980	2.472.251	621,58	1.111,61	-5,79%	1.557.416.799	244,03	4.090	3.696	2.138	0,0000%	-0,8537%	3.723.405.820	886.559.846	0	1.557.416.799	1.488
sep-24	2.351.591	2.399.956	612,38	998,56	-1,48%	1.488.355.418	252,17	4.399	3.673	2.185	0,2400%	0,8442%	3.723.405.820	886.559.846	0	1.488.355.418	2.249
oct-24	2.429.978	2.476.867	612,38	986,73	0,00%	1.534.328.821	244,03	3.941	3.867	2.333	-0,1300%	0,7646%	3.723.405.820	886.559.846	0	1.534.328.821	12.488
nov-24	2.351.593	2.394.286	607,79	1.006,38	-0,75%	1.472.236.710	252,17	3.924	3.551	2.079	0,2700%	1,2794%	3.723.405.820	886.559.846	0	1.472.236.710	2.936
dic-24	2.388.226	2.431.400	622,59	1.041,63	2,43%	1.531.849.552	248,30	3.901	3.675	2.108	0,4600%	0,9078%	3.723.405.820	886.559.846	-35.086.068	1.496.763.484	5.855
ene-25	2.388.225	2.428.614	655,83	991,23	5,34%	1.606.295.964	441,28	3.872	3.885	2.279	0,9400%	0,6991%	2.374.873.152		0	1.606.295.964	2.100
feb-25	2.204.026	2.241.247	681,69	1.013,77	3,94%	1.540.202.562	478,16	3.815	3.444	1.904	1,1400%	-0,0377%	2.374.873.152		0	1.540.202.562	2.120
mar-25	2.388.224	2.436.983	716,95	996,69	5,17%	1.760.831.064	441,28	3.907	3.353	1.592	1,1400%	-0,0485%	2.374.873.152		0	1.760.831.064	2.086
	70.161.747	71.272.141	580,04	946,40		42.413.077.917	204,24	115.678	106.940	65.098	8,91%	5,64%	84.783.660.301	10.955.845.429	-192.236.830	42.220.841.087	41.960
			Media	Media			Media				ACUMULADO						
Recaudos Provenientes de TERCEROS a través de Secretaría Hacienda Acuerdo 107/Dic 14 de 2022 MM$									41.960								

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES FINALIZADO ABRIL 2025

A Distrito:

- Se reitera retomar la gestión de permisos ante la ANI, para proceder con la modernización de la Troncal de Occidente
- Agilizar con secretaria de infraestructura el aval para instalación de las luminarias ornamentales sobre el Puente Román de parte de EPM.
- Actualización del MIDAS, como sistema de información de alumbrado público de la ciudad.

Al Operador de Alumbrado Público:

- Dar cumplimiento con los compromisos definidos en el comité de seguimiento del 09/05/2025
- Disponer de todos los recursos para el desarrollo de las cerca de 5.000 ucap, en el periodo de un mes, tal como lo expresaron en el comité del 09/05/2025
- Continuar con la presentación del proyecto de las Murallas 2da. Etapa: Presupuesto y APU

A N E X O S

Anexo 1. AP-DIS-024-2025: Bajas Transferencias al Distrito de los Recaudos del IAP a Cargo de AFINIA.

Interventorías de Obras Eléctricas, Consultorías,
Asesorías, Auditorías, Outsourcing, Estudios Técnicos- Administrativos-Financieros

AP DIS-022-2025

Cartagena De Indias D.T. y C., 24 de Abril de 2025

Doctora
MARIA PATRICIA PORRAS
Secretaria General
Alcaldía Distrital

Doctora
GINA VELEZ ORTIZ
Jefe Unidad Servicios Públicos
Alcaldía Distrital

Doctor
HAROLDO FORTICH
Secretario de Hacienda
Alcaldía Distrital

Ref.: **Bajas Transferencias al Distrito de los Recaudos del IAP a Cargo de AFINIA.**

Apreciados Doctores:

Analizando las transferencias en dinero que mensualmente debe hacer la empresa AFINIA al Distrito una vez descontada la factura de energía y cualquier ajuste de valores y/o consumos de kwh, todo relacionado con el IAP, observamos que los resultados durante el primer trimestre de 2025 se están alejando de los promedios que vienen obteniéndose desde enero de 2023 como se demuestra a continuación:

Transferencia/ Recaudos al DT y C Año 2023	63.21%
Transferencia/Recaudos al DT y C Año 2024	59.79%
Transferencia/Recaudos al DT y C Mes Enero 2025	58.65%
Transferencia/Recaudos al DT y C Mes Febrero 2025	55.28%
Transferencia/Recaudos al DT y C Mes Marzo 2025 47.	49%

Se concluye que los niveles porcentuales de las transferencias sobre los recaudos del IAP están disminuyendo de una manera preocupante lo que podría poner en riesgo el desarrollo normal de las obras de modernización y expansión del SALP.

Canapote Calle 20 de Julio N° 16-37 Cartagena
Teléfonos: 605-6524715 Celufijo 310-650-2676
Correo Electrónico: presidencia@qbm2.com

Por lo anterior, somos de la opinión de que ustedes soliciten a AFINIA a la mayor brevedad posible las explicaciones de esta situación o que nos autoricen a proceder directamente ante AFINIA a solicitar las explicaciones pertinentes. Es importante que se tenga en cuenta que aquí no estamos refiriéndonos a bajos recaudos del IAP sino de bajos porcentajes del dinero transferido del IAP recaudado.

Cordialmente,

WILLIAM MURRA DIAZGRANADOS
Gerente Representante Legal

Copia: Dr. Víctor Elías Raad Manjares — Asesor de Despacho
Dra. Melisa M. Franco Porras — Abogada Interventoría
Ingenieros Interventoría

Anexo 2. Solicitud a Afinia Aclaración Incremento Factor Otros de la Tarifa SALP

QBM²
INGENIERIA ELÉCTRICA S.A.

Interventorías de Obras Eléctricas, Consultorías,
Asesorías, Auditorías, Outsourcing, Estudios Técnicos- Administrativos-Financieros

AP DIS-023-2025

Cartagena de Indias D.T. y C., 25 de abril de 2025

Doctora
MARIA PATRICIA PORRAS
Secretaria General
Alcaldía Distrital
Cartagena

Doctora
GINA VELEZ ORTIZ
Jefe Unidad Servicios Públicos
Alcaldía Distrital
Cartagena

Ref.: **Solicitud a AFINIA Aclaración Incremento Factor OTROS de la Tarifa SALP**

Apreciadas Doctoras:

Continuando con nuestra revisión y análisis a los resultados financieros y económicos del SALP durante el primer trimestre del año en curso, consideramos que se debe solicitar a AFINIA una aclaración del porqué el factor OTROS (incluye Restricciones y Costos Regulados) de la tarifa cobrada en los últimos meses se ha desbordado y además el factor Restricciones presenta una grandísima diferencia con el aplicado al CU de los otros usuarios del mercado atendido por el mismo Comercializador.

Para el mes de marzo 2025, AFINIA cobró 79,89 $/kwh mientras que el CU de su sistema y aplicado a los usuarios de diferentes sectores fue de 19.05 $/kwh, o sea, una diferencia de mas del 400%.

Durante el primer trimestre de 2025, los factores G, C, D, Pr y T muestran un comportamiento aceptable mientras que OTROS presentan desviaciones significativas: Dic 2024-13.38 $/kwh, Ene 2025-28.79 $/kwh, Feb 2025-46.34 $/kwh, Mar 2025-85.73 $/kwh lo que ha incidido para que la tarifa final del SALP haya pasado en esos 4 meses de 622.59 $/kwh a 716.95 $/kwh.

La interventoría considera muy extraña esta situación y consideramos que AFINIA debe entregar las aclaraciones pertinentes para adelantar ante la CREG una verificación porque nosotros creemos que AFINIA está manejando las tarifas a su antojo.

Cordialmente,

WILLIAM MURRA DIAZGRANADOS
Gerente Representante Legal

Copia: Dr. Víctor Elias Raad Manjarres — Asesor de Despacho
Dra. Melisa M. Franco Porras — Abogada Interventoría
Ingenieros Interventoría.

Canapote Calle 20 de Julio N° 16-37 Cartagena
Teléfonos: 605-6524715 Celufijo 310-650-2676
Correo Electrónico: presidencia@qbm2.com

Anexo 3. Acta de Comité #05 - 09/05/2025

QBM²	**ACTA DE COMITÉ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**	**Versión 4** **Vigente desde: 20/02/2023**

Fecha: 09/05/2025	**Lugar:** Oficinas Servicios Públicos - Manga
Hora de Inicio: 09:00 a.m.	**Hora de Finalización:** 10:30 a.m.
Contrato: No. 068 2022 para Distrito Y CT-2022-127001	**Consecutivo Comité:** 05-2025

Participantes:

Contratista, EPM
- Juan David Pulido – Ejecutivo EPM
- Jorge J Jaramillo – Profesional Operaciones Negocios – Unidad Alum Público
- Cesar A. Cruz Montoya – Profesional Operaciones Negocios – Unidad Alum Público
- José Adrián Rivera Pérez – Profesional Operaciones Negocios – Unidad Alum Público

Interventora, QBM2 Ingeniería Eléctrica S.A.
- Luis Mejía Chávez – director de interventoría
- Luis Martínez Pardo – Responsable de Modernización y expansión.

Distrito, secretaria general (SG) – Servicios Públicos:
- Víctor Elías Raad – Asesor Financiero Externo
- Candelaria Vargas Torres – Asesora Jurídica Externa
- Fabian Gamero Solarte – Ingeniero Asesor Externo
- Valentina Arroyo - Practicante

Invitado: Distrito, Oficina de Espacio Público
- Tannis Puello Miranda – Gerente de Espacio Público

TEMAS TRATADOS:

Comentarios: Se inicia comité con la revisión de los compromisos pendientes del comité #04 (04/04/2025)

1. **Gestión de Ejecución EPM abril 2025.**

EPM presenta informe de ejecución de mantenimiento y modernización con corte a abril/25:
- Eficiencia del sistema de alumbrado público: **98.7%.**
- Solicitudes atendidas: **671** en un tiempo promedio de **46.7** horas.
- El 35.8% de las solicitudes se atendieron en el lapso de las 24 horas.
- El 34.5% de las solicitudes se atendieron en 48 horas, y El 29.7% a 72 horas y más de solución.
- Avance de modernización: **97.65%** del sistema de alumbrado público de la ciudad modernizado. Pendiente por modernizar un **2.4%.** No se evidencia mucho avance ya que las obras ejecutadas en un alto porcentaje han sido por expansión
- Ejecuciones de modernización: Urb. Bicentenario (finalización), Portales de Alicante, Intervención Puente de Transv. 54, La Boquilla
- Otras intervenciones: Plaza de Santo Domingo, Mamonal, pendientes del barrio Pozón, Murallas (canastillas)
- En tele gestión, se terminó la instalación de los puntos pilotos y se invita a una inducción para conocer el funcionamiento de la aplicación.

2. **Avance Compromisos de comité anterior:**
   a) Servicios Públicos, ratifico que los proyectores RGB ubicados en la parte inferior del Puente Romero Aguirre, quedarán permanentes; y adicional, solicitaron presentar alcance ampliado para cubrir la totalidad del puente en la parte inferior
   b) QBM2 solicito presentar informe general en el que se incluya las denuncias de los hurtos de los proyectores de la muralla, con la valoración a través de solicitud de modificación

Página 1 de 6


c) Av. Santander: EPM, arrancó proyecto de reposición de postes en avenida Santander, comenzando con la construcción de las cimentaciones. Se les solicito el concepto por mantenimiento para la intervención del sector comprendido en el tramo de influencia de la muralla
d) EPM, expreso que ya cuenta con la propuesta de la muralla etapa 2. Interventoría solicito compartirla con los análisis de precios unitarios, para su revisión y comentarios.
e) Puente Román: Servicios públicos se comprometió a visitar 12/05/2025 a secretaria de infraestructura para obtener concepto de intervención que permita avanzar a EPM en la instalación de los postes ornamentales y los faroles coloniales. Igualmente se tratará el tema de las intervenciones en parques por terceros y el componente de alumbrado público.
f) EPM, informa que dio disposición final a estructura de Santo Domingo, por instrucción de Servicios Públicos. QBM2, solicito registros de la disposición final del año en curso.
g) EPM, manifiesta que esta trabajando en los SMI requeridas en comité de abril/2025: Zona recuperada Av. Del Lago – Calle 29B, Canal María Conque – Pie de la Popa, Reten Militar Zona Norte. y en esta semana las presentar oficialmente para validación y aprobación.
h) Comunicación enviada al proyecto La Gran Manzana, sin obtener respuesta.
i) Retofil, de parque Naval, EPM manifiesta su ejecución.
j) Puente Barú, continúan en diseño.
k) Isla Grande. Para ejecución de las 40 luminarias solares y puntos adicionales. esta semana
l) Tele gestión: Programada para la próxima semana inducción por parte de EPM con la participación de Interventoría y servicios público. Se oficializará.
m) Mástiles para Villa Olímpica, EPM; manifestó que ya se encuentra el ingeniero civil calculista de las bases y en la próxima semana presentará informe.

3. Requerimientos Varios

n) De parte de QBM2, refuerzo de iluminación en peaje Corredor de carga a la altura de arroz Barato
o) Mantenimiento de las plazas de los Coches y del Pozo: EPM presentará presupuesto
p) Ejecución de parque Vicente Martínez Martelo
q) Ante la proximidad de inicio de intervención por parte del distrito de los Parques Flanagan, Apolo, Centenario, Reloj Floral y Blas de Lezo, se solicitó a Espacio Público claridad en el alcance del componente de alumbrado público de dichos proyectos. Para lo cual se acordó reunión, martes 13 de mayo a las 9:30 en las oficinas de Espacio Público, donde se conocerán las especificaciones alcance.
r) Servicios públicos, hará entrega de requerimientos de parques resultado de las reuniones con las comunidades a EPM para proyección.
s) Rediseño de Troncal de Occidente ajustándolo a la intervención del Intercambiador vial de Ternera que abarca hasta la entrada de San José de Los Campanos (zona de influencia de la vía). Resaltando que se puede ejecutar desde el SAO hasta el inicio del intercambiado

4. Prioridades de ejecución de modernización y expansión mayo 2025:

Se presenta programación que abarca 4.651 ucap's, dejando disponibilidad para requerimientos de última hora prioritarios para el distrito.
EPM, expreso toda su intención y disposición de recursos para ejecutar en el lapso de un mes. A continuación, la proyección de ejecución:

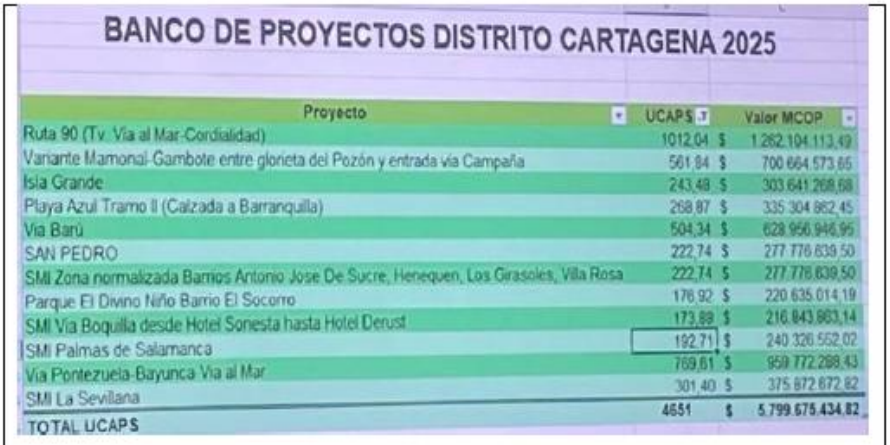

BANCO DE PROYECTOS DISTRITO CARTAGENA 2025

Proyecto	UCAP$	Valor MCOP
Ruta 90 (Tv. Vía al Mar-Cordialidad)	1012,04	$ 1.262.104.113,49
Variante Mamonal-Gambote entre glorieta del Pozón y entrada vía Campaña	561,84	$ 700.664.573,65
Isla Grande	243,48	$ 303.641.268,68
Playa Azul Tramo II (Calzada a Barranquilla)	268,87	$ 335.304.862,45
Vía Barú	504,34	$ 628.956.946,95
SAN PEDRO	222,74	$ 277.776.639,50
SMI Zona normalizada Barrios Antonio Jose De Sucre, Henequen, Los Girasoles, Villa Rosa	222,74	$ 277.776.639,50
Parque El Divino Niño Barrio El Socorro	176,92	$ 220.635.014,19
SMI Vía Boquilla desde Hotel Sonesta hasta Hotel Derust	173,88	$ 216.843.863,14
SMI Palmas de Salamanca	192,71	$ 240.326.552,02
Vía Pontezuela-Bayunca Vía al Mar	769,61	$ 959.772.288,43
SMI La Sevillana	301,40	$ 375.872.872,82
TOTAL UCAP$	4651	$ 5.799.675.434,82

5. **Liquidación ucap's del periodo abril 2025:** Revisión conjunta de QBM2 y EPM, para la determinación de las ucap's a liquidar en el periodo en curso, para soportar facturación de EPM por concepto de modernización.

Compromisos	Fecha	Responsable
1. Presentar SMI de alcance ampliado para cubrir la iluminación de la totalidad del puente en la parte inferior	16/05/2025	EPM
2. Presentar informe general de las denuncias de los hurtos de los proyectores de la muralla, con la valoración a través de solicitud de modificación.	16/05/2025	EPM
3. Gestionar el concepto por mantenimiento para la intervención del sector comprendido en el tramo de influencia de la muralla (reposición de postes)	30/05/2025	EPM y Servicios Públicos
4. Presentar Propuesta definitiva de la Murallas Etapa 2 con análisis de precios unitarios (APU), para su revisión y comentarios.	15/05/2025	EPM
5. Reunión a secretaria de infraestructura para obtención de concepto de intervención en Puente Román	12/05/2025	Servicios Públicos
6. Compartir oficio de disposición de estructura de Santo Domingo entregada a EPM 7. Aportar los registros de la disposición final de residuos generados de la actividad de reposición y modernización de lo que va del año 2025	13/05/2025 15/05/2025	Servicios Públicos EPM
8. Presentar solicitud de modificación de infraestructura (SMI) de: Zona recuperada Av. Del Lago – Calle 29B, Canal María Conque – Pie de la Popa, Reten Militar Zona Norte. Para posterior validación de Interventoría y aprobación de Distrito	16/05/2025	EPM
9. Compartir comunicación a Interventoría, enviada a contratista de La Gran Manzana para validar el	14/05/2025	Servicios Públicos

estado de las correcciones e instalación de infraestructura para su futura recepción.		
10. Puente Barú, Terminar rediseño y enviar oficialmente	20/05/2025	EPM
11. Informar programación de instalación de luminarias solares en Isla Grande	14/05/2025	EPM
12. Presentar diseño civil de las bases y de iluminación en Villa Olímpica con los mástiles.	23/05/2025	EPM
13. Proyectar iluminación de refuerzo en el corredor de carga a la altura de los peajes retirados en Arroz Barato y Ceballos	20/05/2025	EPM
14. Programar Ejecución de parque Vicente Martínez Martelo	30/04/2025	EPM
15. Reunión con Gerencia de Espacio Publico	13/05/2025 09:00 am	EPM – QBM2 – Servicios Públicos – Gerencia de Espacio Público
16. Compartir relación de requerimientos de iluminación de parques recibidos de reuniones con las comunidades	15/05/2025	Servicios Públicos
17. Plantear rediseño de la iluminación de la Troncal de Occidente, previendo la intervención del Intercambiador Vial	16/05/2025	EPM
18. Liquidación de ucap's de abril 2025	14/05/2025	QBM2 y EPM



GESTIÓN DEL EJECUCION MODERNIZACIÓN- CARTAGENA

ALUMBRADO PÚBLICO

Blas de Lezo (Puente)





Portales De Alicante





Boquilla







VARIOS - CARTAGENA

ALUMBRADO PÚBLICO


Instalación De Cadena A Luminaria



Piloto de Telegestión




Registro de asistencia

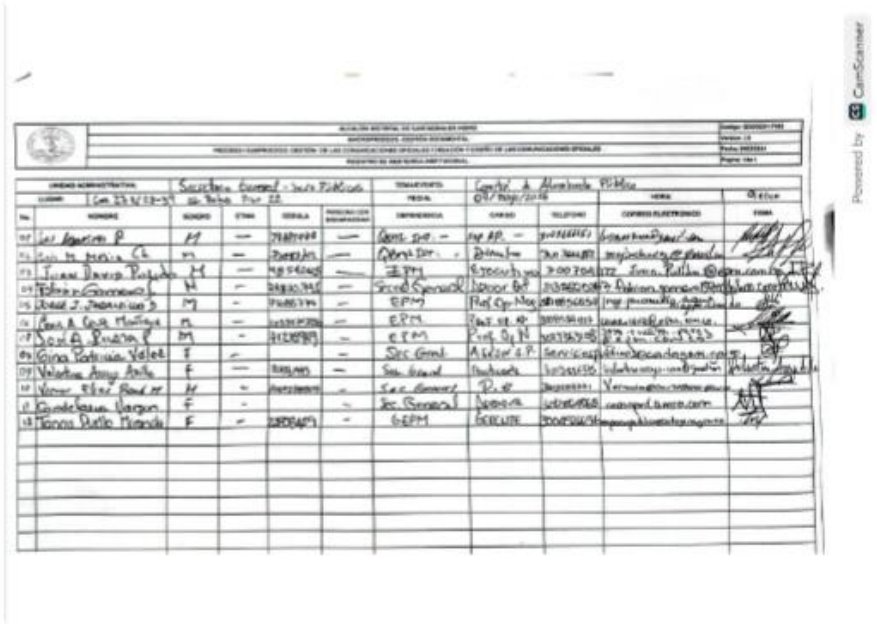


Powered by CamScanner

Anexo 4. Registro fotográfico de seguridad y área de trabajo

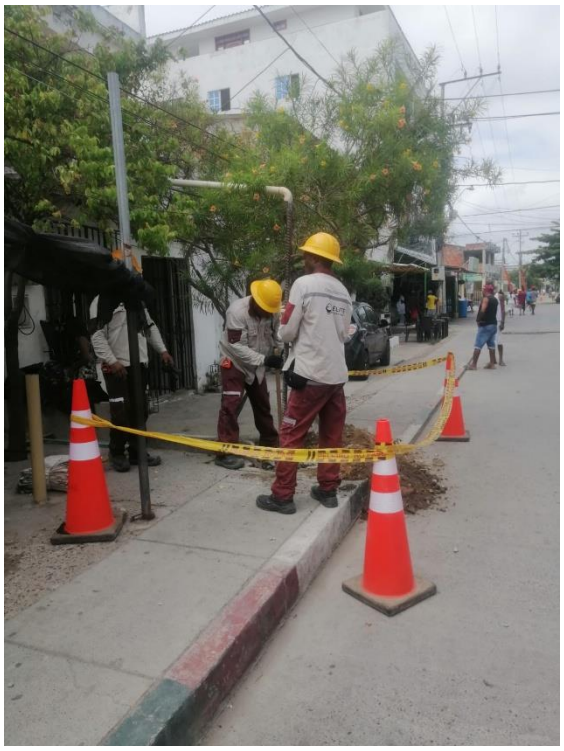



Intervención en La Boquilla 22/04/2025

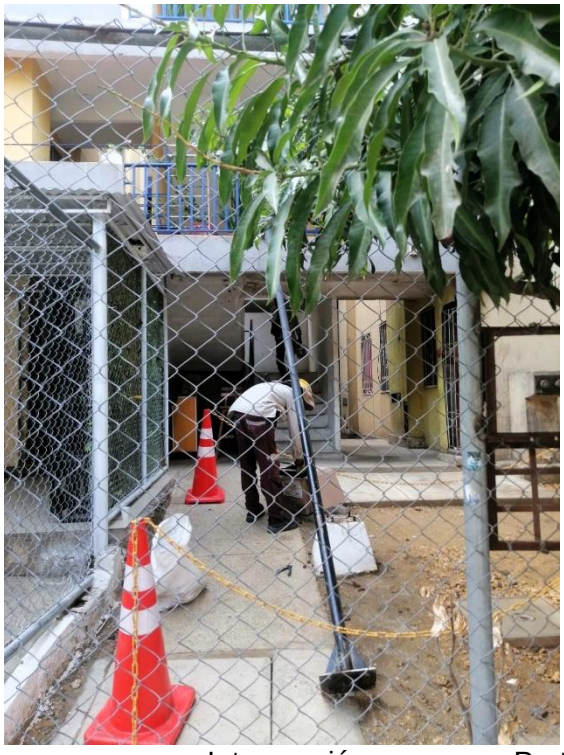



Intervención segura en Portales de Alicante 30/04/2025

Anexo 5. Certificado de Aportes y Seguridad Social del Contratista

EL GERENTE GENERAL

20250130056894

CERTIFICA

Que, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. ha realizado el pago, de los aportes que corresponden para financiar el sistema de Seguridad Social Integral del periodo de febrero de 2025, definido mediante la ley 100 de 1993, los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante planillas unificadas N° 9483312257 de Jubilados, N° 9483312704 de estudiantes de práctica y N° 9483301349 de Activos, pagadas el 21 de marzo de 2025, por intermedio del operador de información Aportes en Línea. Se anexan copias de planillas.

El presente certificado es firmado por el representante legal, dado que Empresas públicas de Medellín E.S.P, por ser una empresa industrial y comercial del Estado, no se encuentra enmarcada dentro de las obligadas por el Código de Comercio para tener Revisor Fiscal.

Este certificado se expide el 26 de marzo de 2025

Atentamente,

JOHN ALBERTO MAYA SALAZAR
Gerente General

JOHN JAIME RODRIGUEZ SOSA
Director Contabilidad y Costos

CAROLINA MARIA URREA ERNOTTE
Líder(e) Unidad Talento Humano
Elaboró: ASTRID VIVIANA TABORDA GAVIRIA

Por ti, estamos ahí

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Carrera 58 N° 42-125
Conmutador: 604 380 8080
Medellín - Colombia
www.epm.com.co

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890904996	1	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	cra 58 42 125	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3828080	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1352581680	94833301349	E	2025/03/25	2025/03/21	BANCOLOMBIA	0	$23,189,931,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				8,114	$12,311,029,600	$0	$0	$12,311,029,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	518	$684,529,100	$0	$0	$684,529,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5,177	$8,352,748,900	$0	$0	$8,352,748,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	685	$757,188,400	$0	$0	$757,188,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1,391	$1,923,924,700	$0	$0	$1,923,924,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	343	$592,638,500	$0	$0	$592,638,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8,277	$1,579,155,800	$0	$0	$1,579,155,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8,277	$1,579,155,800	$0	$0	$1,579,155,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				8,115	$2,891,150,300	$0	$0	$2,891,150,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	8,105	$2,886,809,000	$0	$0	$2,886,809,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	2	$786,600	$0	$0	$786,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$1,131,900	$0	$0	$1,131,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$2,095,100	$0	$0	$2,095,100
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$327,700	$0	$0	$327,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				8,559	$5,134,124,900	$0	$0	$5,134,124,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$3,063,500	$0	$0	$3,063,500
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$243,300	$0	$0	$243,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$4,928,800	$0	$0	$4,928,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	13	$4,379,600	$0	$0	$4,379,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	68	$12,235,200	$0	$0	$12,235,200
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN DEPARTAMENTO MEDICO	EAS016	890,904,996	1	769	$539,031,100	$0	$0	$539,031,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6,245	$3,981,703,700	$0	$0	$3,981,703,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$2,614,900	$0	$0	$2,614,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	17	$9,658,800	$0	$0	$9,658,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$712,000	$0	$0	$712,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	712	$189,740,900	$0	$0	$189,740,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	14	$2,899,500	$0	$0	$2,899,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	287	$121,917,600	$0	$0	$121,917,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	285	$231,050,700	$0	$0	$231,050,700
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	121	$19,830,000	$0	$0	$19,830,000
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	RES011	890,980,040	8	5	$3,762,200	$0	$0	$3,762,200
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	RES008	899,999,063	3	2	$6,175,100	$0	$0	$6,175,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1,270	$764,672,500	$0	$0	$764,672,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1,270	$764,672,500	$0	$0	$764,672,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1,270	$509,798,500	$0	$0	$509,798,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1,270	$509,798,500	$0	$0	$509,798,500
TOTAL				**8559**	**$23,189,931,600**	**$0**	**$0**	**$23,189,931,600**

Página 1 de 1

2025/03/21 11:09 AM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890904996	1	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	A - 200 O MAS COTIZANTES	JUBILADOS	CRA 58 42-125	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3804053	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1352588032	94833122257	P	2025/03/25	2025/03/21	BANCOLOMBIA	0	$320,865,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				15	$1,708,000	$0	$0	$1,708,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$373,900	$0	$0	$373,900
FSP - FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP001	800,159,998	0	14	$1,334,100	$0	$0	$1,334,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$128,900	$0	$0	$128,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	3	$128,900	$0	$0	$128,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				1,666	$319,028,600	$0	$0	$319,028,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$100,700	$0	$0	$100,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$263,200	$0	$0	$263,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	11	$893,800	$0	$0	$893,800
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN DEPARTAMENTO MEDICO	EAS016	890,904,996	1	281	$80,676,600	$0	$0	$80,676,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	718	$146,936,900	$0	$0	$146,936,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$37,400	$0	$0	$37,400
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	10	$2,224,200	$0	$0	$2,224,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	546	$69,284,900	$0	$0	$69,284,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	50	$8,118,900	$0	$0	$8,118,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	35	$7,703,500	$0	$0	$7,703,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	8	$1,350,200	$0	$0	$1,350,200
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	RES011	890,980,040	8	3	$1,438,300	$0	$0	$1,438,300
TOTAL				**1666**	**$320,865,500**	**$0**	**$0**	**$320,865,500**

2025/03/21 10:56 AM

Anexo 6. Solicitud de Modificación de Letras “Cartagena” Perimetral – SS1049697

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público

Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1049697	Fecha de Solicitud Cliente:	marzo 2025
Dirección:	SMI Letras de cartagena Perimetral	RADICADO EPM:	
Solicitante:	Distrito	Teléfono contacto:	

Información visita

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

Imagenes del sitio





Relación de UCAP

Descripción UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria Escenario C1 (212W M)	5,223	Un	1	5,223
Poste 8 PRFV 510 kgf	1,541	Un	1	1,541
Cable 3x14 THHW	0,010	ml	15	0,155
Adecuacion Secundaria	0,117	Un	1	0,117
Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	1	0,039
			Total UCAP	7,075

Concepto de aprobacion de la Interventoria

Vo.bo. Interventoria	Observaciones Interventoria:
Fecha concepto aprobación: 09/04/2025	Validado para liquidación, ya que la intervención ya fue ejecutada, ante la prioridad dada por el distrito.
Nombre: Luis Miguel Mejia Chávez	
Cargo: Director de Interventoria	
Firma:	ATCR

Aprobacion Distrito

Vo.bo. Distrito	Observaciones Distrito:
Fecha aprobación: 10-04-2025	
Nombre: Maria Patricia Porras	
Cargo: Sec General	
Firma:	VR

Ejecutado Ver Anexo xx.

Anexo 7. Solicitud de Modificación de Sector la Bendición de Dios de Arroz Barato – SS1042610

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños Alumbrado Público

Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1042610	Fecha de Solicitud Cliente:	abril 2025
Dirección:	SMI Zona Posterior Casa de La Justicia de Arroz Barato (Sector Bendicion de Dios)-	RADICADO EPM:	
Solicitante:	Comunidad	Teléfono contacto:	

Información visita

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

Imágenes del sitio







Relación de UCAP

Descripción UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria LED M4-1/M4-2 (45W)	1,000	Un	9	9,000
Brazo 1500 mm x 1"	0,287	Un	9	2,583
Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	9	0,355
			Total UCAP	11,938

Concepto de aprobación de la interventoría

Vo.bo. Interventoría	Observaciones Interventoría:
Fecha concepto aprobación: 09/04/2025 Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez Cargo: Director de Interventoría Firma:	Validado para intervención. Teniendo en cuenta quelas redes eléctricas del sector La Bendicion de Dios han sido normalizadas. ATCe

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito	Observaciones Distrito:
Fecha aprobación: 10-01-2025 Nombre: Maria Patricia Pozos Cargo: Sec General Firma:	

Pendiente de ejecutar

Anexo 8. Solicitud de Modificación de Refuerzo Puente Transv. 54 con Caracoles

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público

Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1055224	Fecha de Solicitud Cliente:	7/04/2025
Dirección:	SMI Puente de los Gatos TV 54	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Información visita

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

Imágenes del sitio



Relacion de UCAP

Descripción UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria LED M4-1/M4-2 (45W)	1,000	Un	5	5,000
Brazo 1500 mm x 1"	0,287	Un	5	1,435
Poste 8 PRFV 510 kgf	1,541	Un	3	4,623
Cable 3x14 THHW	0,010	ml	50	0,516
Adecuacion Secundaria	0,117	Un	4	0,468
Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	5	0,197
				12,239

Concepto de aprobación de la Interventoría

Vo.bo. Interventoría Fecha concepto aprobación: 14/04/2025 Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez Cargo: Director de Interventoría Firma:	Observaciones Interventoría: Validado, para liquidación, ya que este fue ejecutado posterior a la recuperación del área dejbo del puente de la Transversal 54 con los Caracoles, a solicitud de alcaldía. ATCR

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito Fecha aprobación: 21-04-2025 Nombre: Maria Patricia Perez Cargo: Sec General Firma:	Observaciones Distrito:

Ejecutado Ver Anexo xx.

Anexo 9. Solicitud de Modificación de Socorro Calle 15, con Cra. 80

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público

Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1043005	Fecha de Solicitud Cliente:	3/04/2025
Dirección:	SMI Calle 15 con cra 70 Barrio El Socorro	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Información visita

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

Imágenes del sitio



Relación de UCAP

Descripción UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria LED M4-1/M4-2 (45W)	1,000	Un	1	1,000
Luminaria LED M2-1/M2-2 (128W)	1,000	Un	1	1,000
Brazo 1500 mm x 1"	0,287	Un	1	0,287
Brazo 1500 mm x 1 1/2"	0,283	Un	1	0,283
Poste 8 PRFV 510 kgf	1,541	Un	1	1,541
Cable 3x14 THHW	0,010	ml	31	0,320
Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	2	0,079
				4,510

Concepto de aprobación de la interventoría

Vo.bo. Interventoría	Observaciones Interventoría:
Fecha concepto aprobación: 14/04/2025	Validado ejecución para refuerzo de iluminación en zona de alto tráfico vehicular
Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez	
Cargo: Director de Interventoría	
Firma:	ATCe

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito	Observaciones Distrito:
Fecha aprobación: 21-04-2025	
Nombre: Hasie Patricia Porras	
Cargo: Sec General	
Firma:	

Pendiente por ejecutar

Anexo 10. Solicitud de Modificación de Bajos del Puente Calle 29 (Bazurto)

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público


Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1049906	Fecha de Solicitud Cliente:	
Dirección:	SMI Bajos del Puente Bazurto	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Información visita

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

Imágenes del sitio

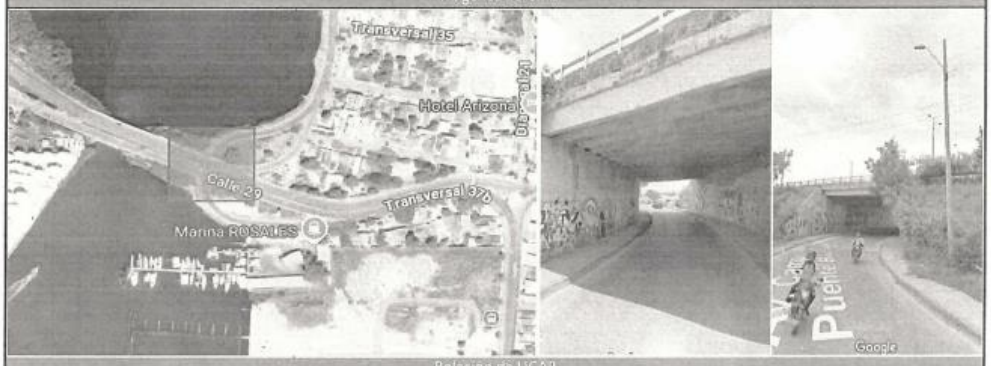

Relación de UCAP

Descripción UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria LED C3 (40W S 4K)	3,884	Un	4	15,538
Cable 3x14 THHW	0,010	ml	80	0,825
Electrodo de puesta a Tierra	0,124	Un	1	0,124
Canalización con 1 ducto	0,082	ml	80	6,560
Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	1	0,039
			Total UCAP	23,087

Concepto de aprobación de la Interventoría

Vo.bo. Interventoría Fecha concepto aprobación: 14/04/2025 Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez Cargo: Director de Interventoría Firma:	Observaciones Interventoría: Validado para intervención, como refuerzo de los bajos del puente,zona de gran afluencia vehicular ATCR

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito Fecha aprobación: 21-04-2025 Nombre: Maria Patricia Pocras Cargo: Sec General Firma:	Observaciones Distrito:

Pendiente por ejecutar

Anexo 11. Solicitud de Modificación de Ciudad Bicentenario - Fase 2

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público

Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1053954	Fecha de Solicitud Cliente:	3/12/2024
Dirección:	Barrio Ciudad Bicentenario Fase II	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Información visita

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

Imágenes del sitio



Relación de UCAP

Descripción UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria LED M4-1/M4-2 (45W)	1,000	Un	144	144,000
Luminaria LED M1-1 (210W)	4,020	Un	20	80,400
Brazo 400 mm x 1"	0,233	Un	4	0,932
Brazo 1500 mm x 1"	0,287	Un	140	40,180
Brazo 1500 mm x 1 1/2"	0,283	Un	20	5,660
Poste 8 PRFV 510 kgf	1,541	Un	140	215,740
Desmonte de poste metalico de 3,5m a 9m	0,878	Un	113	99,214
Cable Triplex No 4	0,016	ml	3150	51,049
Cable 3X6 Al Aislado	0,016	ml	50	0,810
Cable 3x14 THHW	0,010	ml	380	3,920
Canalización con 1 ducto	0,082	ml	50	4,100
Adecuacion Secundaria	0,117	Un	143	16,726
Caja de inspeccion 50x50	0,940	Un	8	7,520
Fotocontrol Larga Vida Individual =ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	164	6,463
Luminaria LED M4-1/M4-2 (45W)	1,000	Un	-12	0,000
Luminaria/Proyector 70W	0,000	Un	131	0,000
Luminaria/Proyector 150W	0,000	Un	4	0,000
Luminaria/Proyector 250W	0,000	Un	22	0,000
				676,715

Concepto de aprobación de la intervención

Vo.bo. Interventoría
Fecha concepto aprobación: 28/04/2025
Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez
Cargo: Director de Interventoria
Firma:

Observaciones Interventoría:
Validado para ejecución, tras el mal estado de los postes metálicos existentes, en el sector; dando cumplimiento a compromiso de comite de seguimiento del 04/04/2025

ATCR

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito
Fecha aprobación: 06-05-2024
Nombre: Maria Patricia Pecras
Cargo: Sec General
Firma:

Observaciones Distrito:

VF


Anexo 12. Seguimiento de Solicitudes de Modificación abril/mayo 2025

SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ABRIL 2025								
Item	**Solicitud de modificación**	**SS**	**Fecha de remisión EPM**	**Fecha de validación QBM2**	**Enviado para aprobación**	**Fecha de Aprobación DTO**	**UCAP**	**Estado de ejecución**
1	Puente de San Jose de los Campanos, Carrera 88	1042607	27/03/2025	1/04/2025	1/04/2025	4/04/2025	8,98	ejecutado
2	Barrio Espinal Calle 31 y Carrera 15	1013732	27/03/2025	1/04/2025	1/04/2025	4/04/2025	9,29	pendiente
3	Diagonal 41C Costado Terminal de Transporte	1013736	27/03/2025	1/04/2025	1/04/2025	4/04/2025	14,59	pendiente
4	Refuerzo de Iluminación letras "CARTAGENA" La Perimetral	1049697	7/04/2025	9/04/2025	9/04/2025	10/04/2025	7.07	ejecutado
5	Sector La Bendición de DIos, Arroz Barato	1042610	7/04/2025	9/04/2025	9/04/2025	10/04/2025	11.94	pendiente
6	Refuerzo Puente Transv. 54 con caracoles	1052224	11/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	21/04/2025	12,24	ejecutado
7	Socorro Calle 15, con Cra. 80	1043005	11/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	21/04/2025	4,51	pendiente
8	Bajos del Puente Calle 29 (Bazurto)	1049906	11/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	21/04/2025	23,087	pendiente
9	Ciudad Bicentenario - Fase 2	1053954	11/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	pendiente	676,72	pendiente

Anexo 13. Registro Fotográfico Inspección Nocturna



Calles de Portales de Alicante – Modernización de la iluminación – La comunidad se siente satisfecha y segura – 08/05/2025

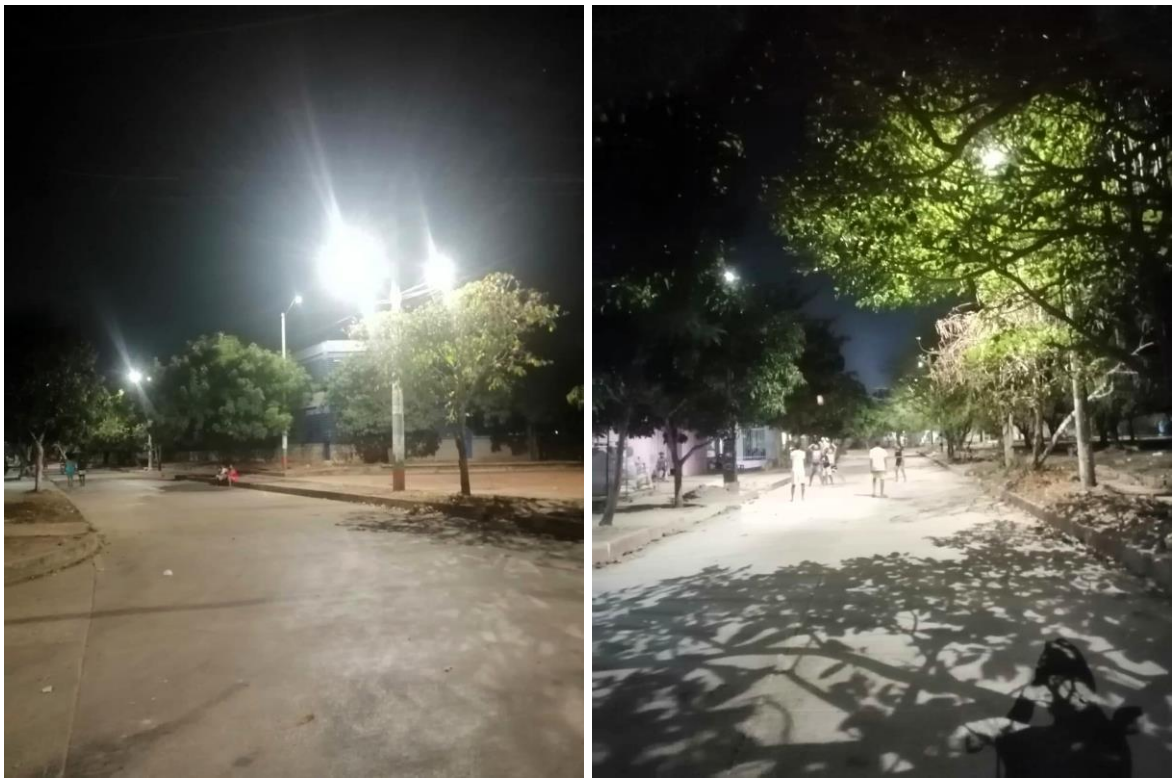

Calles de la Urb. Bicentenario Modernizadas – 15/04/2025

Anexo 14. Registro de Auditoría de la Información de Solicitudes de abril 2025

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO AUDITORIA DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DICIEMBRE 2024	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

Item	Radicado (Canales)	Medio de recepción	# Orden de reporte	Barrio/corregimiento	Dirección	Ususario	Requerimiento de Usuario	Gestión de Revisión Interventoria			Luminarias	Estado	COMENTARIOS
								Detalle	Fecha	Supervisor (QBM2)	Atendidas	Infraestuctura	
1	Telefónico	Whatsapp Ing. DP	Revision nocturna	Torices,	Av. Paseo Bolivar - Entando a La Salle	William Teran	Acceso oscuro	Luminaria apagada - Rotulo 411362		William Teran	1	Buena	Atendido por EPM
2	Telefónico	Whatsapp Ing. DP	Revision nocturna	Portales de Alicante	Conjunto 2	William Teran	zona oscura	2 luminarias apagadas		William Teran	2	Buena	Atendido por EPM
3	Telefónico	Whatsapp Ing. DP	Revision nocturna	Portales de Alicante	Conjunto 3	William Teran	zona oscura	varias luminarias recien instaladas y apagadas		William Teran	Más de 6	Buena	Atendido por EPM
4	Escrito	Whatsapp	Revision Diurna	La Boquilla	frente al colegio ETNOEDUCATIVA La BOQUILLA	William Teran	Luminaria encendida todo el día	Rótulo 524880		William Teran	1	Nueva	Pendiente
5	Telefónico	Whatsapp Ing. DP	Recorrido diurno	Vía Perimetral	Sector La María	William Teran	Cable casi en el suelo		11/04/2025	Ana Teresa Cortina	2	Buena	Atendido por EPM

Anexo 15. Registro Fotográfico Intervención Letras “Cartagena”, Av. Perimetral





Anexo 16. Registro Fotográfico Intervención Puente Transversal 54







Anexo 17. Registro Fotográfico Intervención Urb. Bicentenario



Calles de Urb. Bicentanario - Modernizadas

Anexo 18. Registro Fotográfico Intervención Corregimiento de la Boquilla





Intervención en el corregimiento de la Boquilla

Anexo 19. Registro Fotográfico Intervención Portales de Alicante





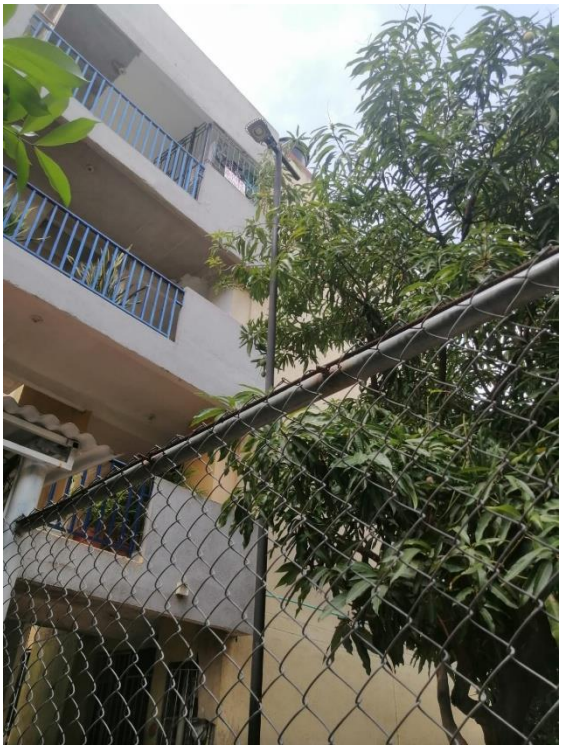

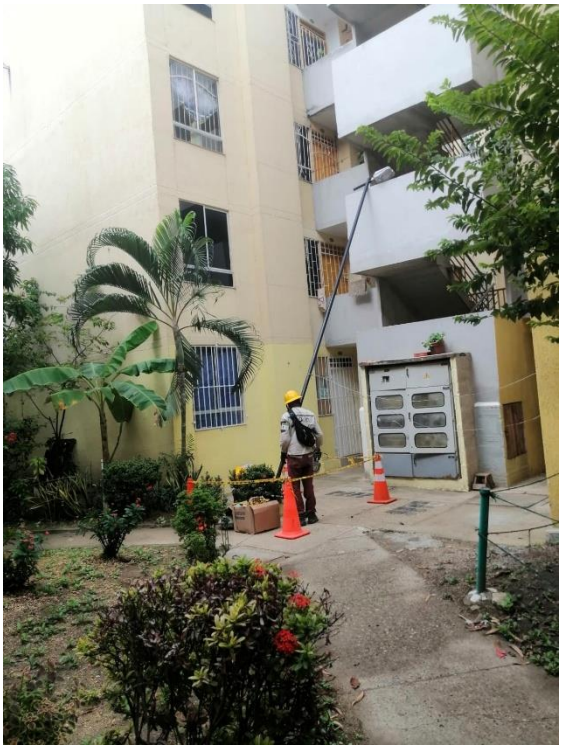

Anexo 20. Relación de Luminarias Instaladas Bicentenario

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO:	Modernización		Reposición		Expansión x		Abril 2025 Barrio Bicentenaio

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
1		Urb. Bicentenario		405384	45	x			x		24/04/2025	n/a	70	SS329489
2		Urb. Bicentenario		407096	45	x			x		8/04/2025	n/a	70	SS329489
3		Urb. Bicentenario		394220	64	x			x		8/04/2025	n/a	150	SS329489
4		Urb. Bicentenario		409451	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
5		Urb. Bicentenario		468608	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
6		Urb. Bicentenario		479230	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
7		Urb. Bicentenario		405233	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
8		Urb. Bicentenario		470887	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
9		Urb. Bicentenario		399927	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
10		Urb. Bicentenario		403077	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
11		Urb. Bicentenario		479074	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
12		Urb. Bicentenario		404924	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
13		Urb. Bicentenario		407485	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
14		Urb. Bicentenario		468055	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
15		Urb. Bicentenario		479925	45	x			x		8/04/2025	n/a	0	SS329489
16		Urb. Bicentenario		479395	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
17		Urb. Bicentenario		501189	45	x			x		8/04/2025	n/a	0	SS329489
18		Urb. Bicentenario		479028	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
19		Urb. Bicentenario		497310	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
20		Urb. Bicentenario		500849	45	x			x		4/04/2025	n/a	0	SS329489
21		Urb. Bicentenario		479054	45	x			x		4/04/2025	n/a	0	SS329489
22		Urb. Bicentenario		478894	45	x			x		4/04/2025	n/a	70	SS329489
23		Urb. Bicentenario		478134	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
24		Urb. Bicentenario		406333	45	x			x		24/04/2025	n/a		SS329489
25		Urb. Bicentenario		479083	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
26		Urb. Bicentenario		500196	45	x			x		24/04/2025	n/a	0	SS329489
27		Urb. Bicentenario		402615	45	x			x		24/04/2025	n/a	0	SS329489
28		Urb. Bicentenario		501550	45	x			x		7/04/2025	n/a	0	SS329489
29		Urb. Bicentenario		497147	45	x			x		24/04/2025	n/a	0	SS329489
30		Urb. Bicentenario		402318	45	x			x		10/04/2025	n/a	0	SS329489
31		Urb. Bicentenario		409285	45	x			x		10/04/2025	n/a	0	SS329489
32		Urb. Bicentenario		466702	45	x			x		10/04/2025	n/a	0	SS329489
33		Urb. Bicentenario		398862	45	x			x		10/04/2025	n/a	0	SS329489
34		Urb. Bicentenario		509395	64	x			x		10/04/2025	n/a	150	SS329489
35		Urb. Bicentenario		509486	64	x			x		10/04/2025	n/a	0	SS329489
36		Urb. Bicentenario		507723	64	x			x		10/04/2025	n/a	0	SS329489
37		Urb. Bicentenario		408200	45	x			x		24/04/2025	n/a	150	SS329489
38		Urb. Bicentenario		397588	45	x			x		24/04/2025	n/a	0	SS329489
39		Urb. Bicentenario		469369	45	x			x		24/04/2025	n/a	0	SS329489
40		Urb. Bicentenario		404850	45	x			x		1/04/2025	n/a	0	SS329489
41		Urb. Bicentenario		496109	45	x			x		24/04/2025	n/a	0	SS329489
42		Urb. Bicentenario		399139	45	x			x		24/04/2025	n/a	0	SS329489
43		Urb. Bicentenario		500773	45	x			x		8/04/2025	n/a	0	SS329489
44		Urb. Bicentenario		471069	45	x			x		9/04/2025	n/a	0	SS329489
45		Urb. Bicentenario		482596	45	x			x		7/04/2025	n/a	0	SS329489
46		Urb. Bicentenario		406841	45	x			x		7/04/2025	n/a	0	SS329489
47		Urb. Bicentenario		479278	45	x			x		4/04/2025	n/a	0	SS329489
48		Urb. Bicentenario		481399	45	x			x		4/04/2025	n/a	0	SS329489
49		Urb. Bicentenario		478113	45	x			x		4/04/2025	n/a	0	SS329489
50		Urb. Bicentenario		399411	45	x			x		1/04/2025	n/a	0	SS329489
51		Urb. Bicentenario		411692	45	x			x		24/04/2025	n/a	0	SS329489
52		Urb. Bicentenario		471573	45	x			x		24/04/2025	n/a	0	SS329489
53		Urb. Bicentenario		403550	45	x			x		24/04/2025	n/a	0	SS329489
54		Urb. Bicentenario		404958	45	x			x		1/04/2025	n/a	0	SS329489
55		Urb. Bicentenario		481383	45	x			x		1/04/2025	n/a	0	SS329489
56		Urb. Bicentenario		399926	45	x			x		24/04/2025	n/a	0	SS329489
57		Urb. Bicentenario		479041	45	x			x		24/04/2025	n/a	0	SS329489
58		Urb. Bicentenario		479356	45	x			x		24/04/2025	n/a	0	SS329489
59		Urb. Bicentenario		495873	45	x			x		24/04/2025	n/a	0	SS329489
60		Urb. Bicentenario		404479	45	x			x		24/04/2025	n/a	0	SS329489
61		Urb. Bicentenario		495652	45	x			x		24/04/2025	n/a	0	SS329489
62		Urb. Bicentenario		470690	45	x			x		24/04/2025	n/a	0	SS329489
63		Urb. Bicentenario		398211	45	x			x		24/04/2025	n/a	0	SS329489
64		Urb. Bicentenario		501908	45	x			x		24/04/2025	n/a	0	SS329489
65		Urb. Bicentenario		500684	45	x			x		24/04/2025	n/a	0	SS329489
66		Urb. Bicentenario		398174	45	x			x		24/04/2025	n/a	0	SS329489
67		Urb. Bicentenario		399851	45	x			x		24/04/2025	n/a	0	SS329489
68		Urb. Bicentenario		469446	45	x			x		11/04/2025	n/a	0	SS329489
69		Urb. Bicentenario		500170	45	x			x		11/04/2025	n/a	0	SS329489
70		Urb. Bicentenario		479670	45	x			x		11/04/2025	n/a	0	SS329489

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO: Modernización | Reposición | Expansión x

Abril 2025 Barrio Bicentenaio

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
71	Urb. Bicentenario			472461	45	x			x		11/04/2025	n/a	0	SS329489
72	Urb. Bicentenario			398029	45	x			x		8/04/2025	n/a	0	SS329489
73	Urb. Bicentenario			509493	64	x			x		11/04/2025	n/a	0	SS329489
74	Urb. Bicentenario			509772	64	x			x		10/04/2025	n/a	0	SS329489
75	Urb. Bicentenario			509399	64	x			x		10/04/2025	n/a	0	SS329489
76	Urb. Bicentenario			509481	64	x			x		10/04/2025	n/a	0	SS329489
77	Urb. Bicentenario			504669	64	x			x		10/04/2025	n/a	0	SS329489
78	Urb. Bicentenario			398352	45	x			x		24/04/2025	n/a	0	SS329489
79	Urb. Bicentenario			496438	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
80	Urb. Bicentenario			479086	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
81	Urb. Bicentenario			410241	45	x			x		1/04/2025	n/a	0	SS329489
82	Urb. Bicentenario			481508	45	x			x		1/04/2025	n/a	0	SS329489
83	Urb. Bicentenario			401134	45	x			x		8/04/2025	n/a	0	SS329489
84	Urb. Bicentenario			478786	45	x			x		10/04/2025	n/a	0	SS329489
85	Urb. Bicentenario			411970	45	x			x		11/04/2025	n/a	0	SS329489
86	Urb. Bicentenario			469203	45	x			x		11/04/2025	n/a	0	SS329489
87	Urb. Bicentenario			469202	45	x			x		24/04/2025	n/a	0	SS329489
88	Urb. Bicentenario			479534	45	x			x		1/04/2025	n/a	0	SS329489
89	Urb. Bicentenario			403877	45	x			x		1/04/2025	n/a	0	SS329489
90	Urb. Bicentenario			481368	45	x			x		1/04/2025	n/a	0	SS329489
91	Urb. Bicentenario			478983	45	x			x		9/04/2025	n/a	0	SS329489
92	Urb. Bicentenario			479266	45	x			x		4/04/2025	n/a	0	SS329489
93	Urb. Bicentenario			479117	45	x			x		4/04/2025	n/a	0	SS329489
94	Urb. Bicentenario			479357	45	x			x		4/04/2025	n/a	0	SS329489
95	Urb. Bicentenario			481950	45	x			x		4/04/2025	n/a	0	SS329489
96	Urb. Bicentenario			401963	45	x			x		1/04/2025	n/a	0	SS329489
97	Urb. Bicentenario			468839	45	x			x		8/04/2025	n/a	0	SS329489
98	Urb. Bicentenario			496926	45	x			x		7/04/2025	n/a	0	SS329489
99	Urb. Bicentenario			399745	45	x			x		7/04/2025	n/a	0	SS329489
100	Urb. Bicentenario			479027	45	x			x		7/04/2025	n/a	0	SS329489
101	Urb. Bicentenario			467734	45	x			x		7/04/2025	n/a	0	SS329489
102	Urb. Bicentenario			412092	45	x			x		7/04/2025	n/a	0	SS329489
103	Urb. Bicentenario			479178	45	x			x		7/04/2025	n/a	0	SS329489
104	Urb. Bicentenario			466870	45	x			x		10/04/2025	n/a	0	SS329489
105	Urb. Bicentenario			409450	45	x			x		11/04/2025	n/a	0	SS329489
106	Urb. Bicentenario			501390	45	x			x		24/04/2025	n/a	0	SS329489
107	Urb. Bicentenario			472367	45	x			x		24/04/2025	n/a	0	SS329489
108	Urb. Bicentenario			481398	45	x			x		9/04/2025	n/a	0	SS329489
109	Urb. Bicentenario			403090	45	x			x		9/04/2025	n/a	70	SS329489
110	Urb. Bicentenario			402245	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
111	Urb. Bicentenario			402821	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
112	Urb. Bicentenario			479175	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
113	Urb. Bicentenario			403541	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
114	Urb. Bicentenario			404011	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
115	Urb. Bicentenario			468972	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
116	Urb. Bicentenario			478683	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
117	Urb. Bicentenario			472625	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
118	Urb. Bicentenario			405669	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
119	Urb. Bicentenario			472066	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
120	Urb. Bicentenario			498891	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
121	Urb. Bicentenario			469297	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
122	Urb. Bicentenario			404700	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
123	Urb. Bicentenario			399632	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
124	Urb. Bicentenario			412068	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
125	Urb. Bicentenario			479176	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
126	Urb. Bicentenario			468173	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
127	Urb. Bicentenario			466867	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
128	Urb. Bicentenario			406511	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
129	Urb. Bicentenario			501539	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
130	Urb. Bicentenario			470894	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
131	Urb. Bicentenario			502047	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
132	Urb. Bicentenario			403753	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
133	Urb. Bicentenario			408457	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
134	Urb. Bicentenario			404410	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
135	Urb. Bicentenario			495758	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
136	Urb. Bicentenario			411231	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
137	Urb. Bicentenario			400926	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
138	Urb. Bicentenario			410835	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
139	Urb. Bicentenario			398008	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
140	Urb. Bicentenario			499798	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
141	Urb. Bicentenario			470869	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
142	Urb. Bicentenario			411636	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
143	Urb. Bicentenario			496246	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
144	Urb. Bicentenario			407307	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
145	Urb. Bicentenario			470616	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO: Modernización | Reposición | Expansión x

Abril 2025 Barrio Bicentenaio

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
146	Urb. Bicentenario			409006	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
147	Urb. Bicentenario			470433	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
148	Urb. Bicentenario			405663	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
149	Urb. Bicentenario			479352	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
150	Urb. Bicentenario			500878	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
151	Urb. Bicentenario			479371	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
152	Urb. Bicentenario			479030	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
153	Urb. Bicentenario			479235	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
154	Urb. Bicentenario			479228	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
155	Urb. Bicentenario			408086	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
156	Urb. Bicentenario			404169	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
157	Urb. Bicentenario			502142	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
158	Urb. Bicentenario			478990	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
159	Urb. Bicentenario			409216	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
160	Urb. Bicentenario			502260	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
161	Urb. Bicentenario			499943	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
162	Urb. Bicentenario			478974	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
163	Urb. Bicentenario			479276	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
164	Urb. Bicentenario			478133	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
165	Urb. Bicentenario			479238	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
166	Urb. Bicentenario			478987	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
167	Urb. Bicentenario			408685	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
168	Urb. Bicentenario			467760	45	x			x		24/04/2025	n/a	70	SS329489
169	Urb. Bicentenario			411353	45	x			x		8/04/2025	n/a	150	SS329489
170	Urb. Bicentenario			470028	45	x			x		8/04/2025	n/a	150	SS329489
171	Urb. Bicentenario			458700	64	x			x		8/04/2025	n/a	150	SS329489
172	Urb. Bicentenario			479494	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
173	Urb. Bicentenario			479532	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
174	Urb. Bicentenario			479533	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
175	Urb. Bicentenario			481384	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
176	Urb. Bicentenario			481381	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
177	Urb. Bicentenario			410841	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
178	Urb. Bicentenario			406927	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
179	Urb. Bicentenario			398455	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
180	Urb. Bicentenario			479221	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
181	Urb. Bicentenario			469434	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
182	Urb. Bicentenario			398331	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
183	Urb. Bicentenario			399282	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
184	Urb. Bicentenario			479220	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
185	Urb. Bicentenario			479564	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
186	Urb. Bicentenario			479491	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
187	Urb. Bicentenario			411821	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
188	Urb. Bicentenario			479219	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
189	Urb. Bicentenario			479566	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
190	Urb. Bicentenario			401914	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
191	Urb. Bicentenario			470793	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
192	Urb. Bicentenario			402357	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
193	Urb. Bicentenario			481372	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
194	Urb. Bicentenario			479942	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
195	Urb. Bicentenario			410215	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
196	Urb. Bicentenario			501756	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
197	Urb. Bicentenario			479222	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
198	Urb. Bicentenario			478986	45	x			x		4/04/2025	n/a	70	SS329489
199	Urb. Bicentenario			479071	45	x			x		4/04/2025	n/a	70	SS329489
200	Urb. Bicentenario			478971	45	x			x		9/04/2025	n/a	70	SS329489
201	Urb. Bicentenario			479111	45	x			x		9/04/2025	n/a	70	SS329489
202	Urb. Bicentenario			402085	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
203	Urb. Bicentenario			478997	45	x			x		4/04/2025	n/a	70	SS329489
204	Urb. Bicentenario			479046	45	x			x		4/04/2025	n/a	70	SS329489
205	Urb. Bicentenario			479265	45	x			x		4/04/2025	n/a	70	SS329489
206	Urb. Bicentenario			479372	45	x			x		28/04/2025	n/a	70	SS329489
207	Urb. Bicentenario			479354	45	x			x		4/04/2025	n/a	70	SS329489
208	Urb. Bicentenario			479075	45	x			x		4/04/2025	n/a	70	SS329489
209	Urb. Bicentenario			479396	45	x			x		4/04/2025	n/a	70	SS329489
210	Urb. Bicentenario			478132	45	x			x		25/04/2025	n/a	70	SS329489
211	Urb. Bicentenario			478973	45	x			x		25/04/2025	n/a	70	SS329489
212	Urb. Bicentenario			479045	45	x			x		4/04/2025	n/a	70	SS329489
213	Urb. Bicentenario			502254	45	x			x		24/04/2025	n/a	0	SS329489
214	Urb. Bicentenario			479077	45	x			x		4/04/2025	n/a	70	SS329489
215	Urb. Bicentenario			479277	45	x			x		4/04/2025	n/a	70	SS329489
216	Urb. Bicentenario			481941	45	x			x		28/04/2025	n/a	70	SS329489
217	Urb. Bicentenario			502167	45	x			x		4/04/2025	n/a	70	SS329489
218	Urb. Bicentenario			399149	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
219	Urb. Bicentenario			479531	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
220	Urb. Bicentenario			479493	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO: Modernización | Reposición | Expansión x | Abril 2025 Barrio Bicentenaio

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
221		Urb. Bicentenario		364223	44	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
222		Urb. Bicentenario		403183	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
223		Urb. Bicentenario		481369	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
224		Urb. Bicentenario		399187	45	x			x		10/04/2025	n/a	70	SS329489
225		Urb. Bicentenario		399262	45	x			x		1/04/2025	n/a	150	SS329489
226		Urb. Bicentenario		401571	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
227		Urb. Bicentenario		406511	45	x			x		9/04/2025	n/a	70	SS329489
228		Urb. Bicentenario		399714	45	x			x		8/04/2025	n/a	70	SS329489
229		Urb. Bicentenario		478112	45	x			x		7/04/2025	n/a	0	SS329489
230		Urb. Bicentenario		479561	45	x			x		7/04/2025	n/a	0	SS329489
231		Urb. Bicentenario		481397	45	x			x		7/04/2025	n/a	0	SS329489
232		Urb. Bicentenario		498010	45	x			x		7/04/2025	n/a	0	SS329489
233		Urb. Bicentenario		411428	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
234		Urb. Bicentenario		470796	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
235		Urb. Bicentenario		479112	45	x			x		4/04/2025	n/a	70	SS329489
236		Urb. Bicentenario		479275	45	x			x		4/04/2025	n/a	70	SS329489
237		Urb. Bicentenario		479116	45	x			x		4/04/2025	n/a	70	SS329489
238		Urb. Bicentenario		479353	45	x			x		4/04/2025	n/a	70	SS329489
239		Urb. Bicentenario		411503	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
240		Urb. Bicentenario		408085	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
241		Urb. Bicentenario		481367	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
242		Urb. Bicentenario		500388	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
243		Urb. Bicentenario		507258	64	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
244		Urb. Bicentenario		502881	64	x			x		8/04/2025	n/a	150	SS329489
245		Urb. Bicentenario		394368	64	x			x		8/04/2025	n/a	150	SS329489
246		Urb. Bicentenario		502872	64	x			x		8/04/2025	n/a	150	SS329489
247		Urb. Bicentenario		407752	45	x			x		8/04/2025	n/a	150	SS329489
248		Urb. Bicentenario		467772	45	x			x		8/04/2025	n/a	150	SS329489
249		Urb. Bicentenario		398599	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
250		Urb. Bicentenario		411568	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
251		Urb. Bicentenario		404189	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
252		Urb. Bicentenario		410466	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
253		Urb. Bicentenario		404044	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
254		Urb. Bicentenario		479029	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
255		Urb. Bicentenario		468609	45	x			x		8/04/2025	n/a	70	SS329489
256		Urb. Bicentenario		471868	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
257		Urb. Bicentenario		469950	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
258		Urb. Bicentenario		469323	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
259		Urb. Bicentenario		401559	45	x			x		1/04/2025	n/a	150	SS329489
260		Urb. Bicentenario		400635	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
261		Urb. Bicentenario		409724	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
262		Urb. Bicentenario		479565	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
263		Urb. Bicentenario		408663	45	x			x		1/04/2025	n/a	150	SS329489
264		Urb. Bicentenario		509487	64	x			x		10/04/2025	n/a	150	SS329489
265		Urb. Bicentenario		479355	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
266		Urb. Bicentenario		469541	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
267		Urb. Bicentenario		398804	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
268		Urb. Bicentenario		479562	45	x			x		4/04/2025	n/a	150	SS329489
269		Urb. Bicentenario		478731	45	x			x		1/04/2025	n/a	250	SS329489
270		Urb. Bicentenario		410057	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
271		Urb. Bicentenario		479085	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
272		Urb. Bicentenario		469257	45	x			x		24/04/2025	n/a	70	SS329489
273		Urb. Bicentenario		398352	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
274		Urb. Bicentenario		398735	45	x			x		4/04/2025	n/a	70	SS329489
275		Urb. Bicentenario		479559	45	x			x		4/04/2025	n/a	70	SS329489
276		Urb. Bicentenario		399442	45	x			x		4/04/2025	n/a	70	SS329489
277		Urb. Bicentenario		481400	45	x			x		4/04/2025	n/a	0	SS329489
278		Urb. Bicentenario		504762	64	x			x		11/04/2025	n/a	70	SS329489
279		Urb. Bicentenario		509519	64	x			x		11/04/2025	n/a	70	SS329489
280		Urb. Bicentenario		432234	44	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
281		Urb. Bicentenario		399171	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
282		Urb. Bicentenario		479043	45	x			x		4/04/2025	n/a	70	SS329489
283		Urb. Bicentenario		481502	45	x			x		4/04/2025	n/a	70	SS329489
284		Urb. Bicentenario		408469	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
285		Urb. Bicentenario		496648	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
286		Urb. Bicentenario		398935	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
287		Urb. Bicentenario		479044	45	x			x		4/04/2025	n/a	70	SS329489
288		Urb. Bicentenario		499273	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
289		Urb. Bicentenario		481370	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
290		Urb. Bicentenario		481371	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
291		Urb. Bicentenario		401886	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
292		Urb. Bicentenario		406837	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
293		Urb. Bicentenario		478111	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
294		Urb. Bicentenario		478527	45	x			x		9/04/2025	n/a	70	SS329489
295		Urb. Bicentenario		479993	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO: Modernización | Reposición | Expansión x

Abril 2025 Barrio Bicentenaio

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
296	Urb. Bicentenario			370384	44	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
297	Urb. Bicentenario			478972	45	x			x		9/04/2025	n/a	70	SS329489
298	Urb. Bicentenario			401874	45	x			x		8/04/2025	n/a	70	SS329489
299	Urb. Bicentenario			400851	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
300	Urb. Bicentenario			479477	45	x			x		8/04/2025	n/a	70	SS329489
301	Urb. Bicentenario			478998	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
302	Urb. Bicentenario			407684	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
303	Urb. Bicentenario			470863	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
304	Urb. Bicentenario			406741	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
305	Urb. Bicentenario			500428	45	x			x		8/04/2025	n/a	70	SS329489
306	Urb. Bicentenario			479563	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
307	Urb. Bicentenario			404565	45	x			x		1/04/2025	n/a	150	SS329489
308	Urb. Bicentenario			498708	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
309	Urb. Bicentenario			440200	44	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
310	Urb. Bicentenario			479084	45	x			x		1/04/2025	n/a	150	SS329489
311	Urb. Bicentenario			398334	45	x			x		1/04/2025	n/a	150	SS329489
312	Urb. Bicentenario			509774	64	x			x		10/04/2025	n/a	150	SS329489
313	Urb. Bicentenario			509489	64	x			x		10/04/2025	n/a	150	SS329489
314	Urb. Bicentenario			403992	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
315	Urb. Bicentenario			481505	45	x			x		1/04/2025	n/a	70	SS329489
316	Urb. Bicentenario			478114	45	x			x		7/04/2025	n/a	70	SS329489
317	Urb. Bicentenario			479560	45	x			x		4/04/2025	n/a	70	SS329489
318	Urb. Bicentenario			450092	64	x			x		11/04/2025	n/a	70	SS329489
319	Urb. Bicentenario			504678	64	x			x		11/04/2025	n/a	70	SS329489
320	Urb. Bicentenario			479358	45	x			x		4/04/2025	n/a	70	SS329489
321	Urb. Bicentenario			479237	45	x			x		4/04/2025	n/a	70	SS329489
322	Urb. Bicentenario			395821	64	x			x		11/04/2025	n/a	70	SS329489
323	Urb. Bicentenario			481951	45	x			x		4/04/2025	n/a		SS329489
324	Urb. Bicentenario			467796	45	x			x		8/04/2025	n/a	70	SS329489

Anexo 21. Relación de Luminarias Instaladas la Boquilla

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO:	Modernización	x	Reposición		Expansión	x	Abril 2025 CORREGIMIENTO DE LA BOQUILLA

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
1	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524949	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199
2	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524835	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199
3	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524896	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199
4	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524773	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199
5	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524783	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199
6	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524950	45	X			X		24/04/2025	n/a	70	SS576199
7	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525072	45	X			X		24/04/2025	n/a	70	SS576199
8	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524836	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199
9	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524952	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199
10	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525069	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199
11	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524827	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199
12	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525071	45	X			X		24/04/2025	n/a	70	SS576199
13	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524951	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199
14	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524833	45	X			X		24/04/2025	n/a	70	SS576199
15	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525070	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199
16	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524957	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
17	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524769	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199
18	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480761	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
19	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480729	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
20	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525074	45	X			X		23/04/2025	n/a	0	SS576199
21	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525137	45	X			X		23/04/2025	n/a	0	SS576199
22	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480726	45	X			X		23/04/2025	n/a	0	SS576199
23	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524851	45	X			X		23/04/2025	n/a	0	SS576199
24	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525073	45	X			X		23/04/2025	n/a	0	SS576199
25	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524882	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
26	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524895	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576199
27	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524954	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
28	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480789	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576199
29	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480681	45	X			X		21/04/2025	n/a	150	SS576199
30	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480811	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576199
31	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525010	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
32	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525120	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
33	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480712	45	X			X		16/04/2025	n/a	70	SS576199
34	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524944	45	X			X		16/04/2025	n/a	70	SS576199
35	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524939	45	X			X		16/04/2025	n/a	0	SS576199
36	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524915	45	X			X		16/04/2025	n/a	70	SS576199
37	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479004	45	X			X		16/04/2025	n/a	70	SS576199
38	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524901	45	X			X		16/04/2025	n/a	70	SS576199
39	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524904	45	X			X		16/04/2025	n/a	70	SS576199
40	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524986	45	X			X		16/04/2025	n/a	0	SS576199
41	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524974	45	X			X		16/04/2025	n/a	0	SS576199
42	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480702	45	X			X		16/04/2025	n/a	0	SS576199
43	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480764	45	X			X		16/04/2025	n/a	70	SS576199
44	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524945	45	X			X		16/04/2025	n/a	0	SS576199
45	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524980	45	X			X		16/04/2025	n/a	0	SS576199
46	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479003	45	X			X		16/04/2025	n/a	0	SS576199
47	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524903	45	X			X		16/04/2025	n/a	0	SS576199
48	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		478117	45	X			X		16/04/2025	n/a	150	SS576199
49	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525150	45	X			X		16/04/2025	n/a	70	SS576199
50	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524985	45	X			X		16/04/2025	n/a	70	SS576199
51	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480724	45	X			X		16/04/2025	n/a	250	SS576199
52	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480649	45	X			X		16/04/2025	n/a	70	SS576199
53	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480652	45	X			X		16/04/2025	n/a	70	SS576199
54	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480737	45	X			X		15/04/2025	n/a	150	SS576199
55	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480793	45	X			X		15/04/2025	n/a	150	SS576199
56	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480686	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
57	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		502036	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
58	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480748	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
59	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		501869	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
60	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		405532	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
61	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		499035	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
62	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		469924	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
63	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		500120	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
64	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		411091	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
65	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		471052	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
66	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		404016	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
67	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479069	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
68	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		401688	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
69	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		404842	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
70	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479461	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO:	Modernización	x	Reposición		Expansión	x	Abril 2025 CORREGIMIENTO DE LA BOQUILLA

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
71	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479459	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
72	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524917	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576199
73	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480680	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199
74	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479488	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
75	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		501340	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
76	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479490	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
77	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		496852	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
78	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479489	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
79	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		411334	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
80	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		409999	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
81	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		481347	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
82	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		481345	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
83	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479146	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
84	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		478728	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
85	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479145	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
86	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		471785	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
87	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479143	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
88	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479089	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
89	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		400211	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
90	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479210	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
91	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		410231	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
92	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		410076	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
93	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		469406	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
94	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		401843	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
95	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479144	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
96	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479153	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
97	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479216	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
98	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479826	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
99	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479088	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
100	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479709	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
101	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		482656	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
102	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		398462	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
103	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479154	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
104	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479121	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
105	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479208	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
106	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479151	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
107	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479215	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
108	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479487	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
109	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		466946	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
110	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479119	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
111	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		469985	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
112	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		399023	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
113	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		478063	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
114	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479152	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
115	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		402444	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
116	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479462	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
117	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		412344	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
118	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		397633	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
119	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479871	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
120	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		482655	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
121	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479217	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
122	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		477967	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
123	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		406751	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
124	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		408651	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
125	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479122	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
126	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479120	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
127	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		464481	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
128	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		470035	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
129	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		498588	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
130	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		497424	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
131	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479316	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
132	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		470068	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
133	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479315	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
134	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479070	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
135	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		482653	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
136	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479067	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
137	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479460	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
138	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		404453	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
139	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		482654	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
140	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		397927	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
141	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479090	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
142	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		407588	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
143	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		406830	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
144	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		411398	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
145	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479218	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO:	Modernización	x	Reposición		Expansión	x	Abril 2025 CORREGIMIENTO DE LA BOQUILLA

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
146	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	479087	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
147	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	479317	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
148	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	479668	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
149	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	481346	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
150	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	479318	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
151	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	502659	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
152	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	479209	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
153	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	479207	45	X			X		14/04/2025	n/a	0	SS576199
154	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480727	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
155	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	481348	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
156	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480731	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
157	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480740	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
158	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	398185	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
159	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480747	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
160	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	398101	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
161	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480714	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
162	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480717	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
163	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480704	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
164	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480722	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
165	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480725	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
166	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480728	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
167	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480654	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
168	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480685	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
169	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480687	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
170	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480688	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
171	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480699	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
172	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480698	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
173	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480700	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
174	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480715	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
175	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480668	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
176	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480651	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
177	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480660	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
178	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480659	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
179	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480710	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
180	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	479062	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
181	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	479059	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
182	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	410563	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
183	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480665	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
184	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	408399	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
185	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480697	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
186	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480675	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
187	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480721	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
188	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480650	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
189	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480657	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
190	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480676	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
191	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480673	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
192	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480674	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
193	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480692	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
194	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	411626	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
195	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	479061	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
196	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480713	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
197	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480716	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
198	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480689	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
199	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480711	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
200	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480708	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
201	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	400437	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
202	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480655	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
203	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480666	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
204	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480691	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
205	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480661	45	X			X		15/04/2025	n/a	0	SS576199
206	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524940	45	X			X		16/04/2025	n/a	0	SS576199
207	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525151	45	X			X		16/04/2025	n/a	0	SS576199
208	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525152	45	X			X		16/04/2025	n/a	0	SS576199
209	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524989	45	X			X		16/04/2025	n/a	0	SS576199
210	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	478116	45	X			X		16/04/2025	n/a	0	SS576199
211	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524918	45	X			X		23/04/2025	n/a	0	SS576199
212	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525051	45	X			X		23/04/2025	n/a	0	SS576199
213	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525032	45	X			X		23/04/2025	n/a	0	SS576199
214	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524902	45	X			X		23/04/2025	n/a	0	SS576199
215	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524992	45	X			X		16/04/2025	n/a	0	SS576199
216	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480703	45	X			X		16/04/2025	n/a	0	SS576199
217	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480696	45	X			X		16/04/2025	n/a	0	SS576199
218	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524979	45	X			X		16/04/2025	n/a	70	SS576199
219	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480738	45	X			X		16/04/2025	n/a	0	SS576199
220	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524983	45	X			X		16/04/2025	n/a	0	SS576199

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO:	Modernización	x	Reposición		Expansión	x	Abril 2025 CORREGIMIENTO DE LA BOQUILLA

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
221	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525165	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576199
222	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524804	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576199
223	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480679	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576199
224	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480730	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576199
225	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480749	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576199
226	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	472526	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576199
227	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525166	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576199
228	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480757	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199
229	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480734	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576199
230	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524886	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576199
231	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524828	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199
232	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524767	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199
233	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524870	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576199
234	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524996	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576199
235	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524878	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576199
236	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524907	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576199
237	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	584883	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199
238	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524795	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199
239	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525168	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199
240	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	478119	45	X			X		16/04/2025	n/a	0	SS576199
241	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	479006	45	X			X		16/04/2025	n/a	0	SS576199
242	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524947	45	X			X		16/04/2025	n/a	0	SS576199
243	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	478120	45	X			X		16/04/2025	n/a	0	SS576199
244	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524943	45	X			X		16/04/2025	n/a	0	SS576199
245	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524987	45	X			X		16/04/2025	n/a	0	SS576199
246	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524913	45	X			X		16/04/2025	n/a	0	SS576199
247	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524975	45	X			X		16/04/2025	n/a	0	SS576199
248	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524973	45	X			X		16/04/2025	n/a	0	SS576199
249	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480735	45	X			X		23/04/2025	n/a	0	SS576199
250	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480733	45	X			X		23/04/2025	n/a	0	SS576199
251	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480695	45	X			X		23/04/2025	n/a	0	SS576199
252	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525036	45	X			X		23/04/2025	n/a	0	SS576199
253	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525077	45	X			X		23/04/2025	n/a	0	SS576199
254	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	470817	45	X			X		23/04/2025	n/a	0	SS576199
255	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525065	45	X			X		23/04/2025	n/a	0	SS576199
256	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525080	45	X			X		23/04/2025	n/a	0	SS576199
257	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525037	45	X			X		23/04/2025	n/a	0	SS576199
258	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525046	45	X			X		23/04/2025	n/a	0	SS576199
259	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525083	45	X			X		23/04/2025	n/a	0	SS576199
260	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525079	45	X			X		23/04/2025	n/a	0	SS576199
261	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480683	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576199
262	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524932	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576199
263	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480779	45	X			X		21/04/2025	n/a	150	SS576199
264	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524892	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576199
265	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	482705	45	X			X		16/04/2025	n/a	0	SS576199
266	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	479174	45	X			X		16/04/2025	n/a	0	SS576199
267	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524946	45	X			X		16/04/2025	n/a	0	SS576199
268	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524914	45	X			X		16/04/2025	n/a	0	SS576199
269	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480007	45	X			X		16/04/2025	n/a	0	SS576199
270	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524758	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199
271	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524798	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576199
272	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524889	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576199
273	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480807	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576199
274	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480774	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199
275	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480808	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576199
276	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524912	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576199
277	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525045	45	X			X		23/04/2025	n/a	0	SS576199
278	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480736	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199
279	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	410772	45	X			X		14/04/2025	n/a	150	SS576199
280	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480677	45	X			X		15/04/2025	n/a	150	SS576199
281	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480667	45	X			X		15/04/2025	n/a	150	SS576199
282	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480719	45	X			X		15/04/2025	n/a	150	SS576199
283	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	468203	45	X			X		15/04/2025	n/a	150	SS576199
284	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	482662	45	X			X		15/04/2025	n/a	150	SS576199
285	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480678	45	X			X		15/04/2025	n/a	150	SS576199
286	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480705	45	X			X		15/04/2025	n/a	150	SS576199
287	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480720	45	X			X		15/04/2025	n/a	70	SS576199
288	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480723	45	X			X		15/04/2025	n/a	150	SS576199
289	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480745	45	X			X		15/04/2025	n/a	150	SS576199
290	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480718	45	X			X		15/04/2025	n/a	150	SS576199
291	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480706	45	X			X		15/04/2025	n/a	150	SS576199
292	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480706	45	X			X		15/04/2025	n/a	150	SS576199
293	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	471051	45	X			X		15/04/2025	n/a	150	SS576199
294	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480664	45	X			X		15/04/2025	n/a	150	SS576199
295	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480653	45	X			X		15/04/2025	n/a	150	SS576199

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO:	Modernización	x	Reposición		Expansión	x	Abril 2025 CORREGIMIENTO DE LA BOQUILLA

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
296	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	469233	45	X			X		15/04/2025	n/a	150	SS576199
297	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480663	45	X			X		15/04/2025	n/a	150	SS576199
298	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	478121	45	X			X		16/04/2025	n/a	70	SS576199
299	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524956	45	X			X		16/04/2025	n/a	70	SS576199
300	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524868	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
301	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524916	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
302	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524799	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
303	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480777	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
304	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525122	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
305	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525138	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
306	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524883	45	X			X		24/04/2025	n/a	70	SS576199
307	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524925	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
308	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524970	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
309	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524908	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
310	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524890	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
311	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525012	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
312	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480775	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
313	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524919	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
314	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480669	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
315	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524888	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
316	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524871	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
317	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480766	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
318	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524968	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
319	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524966	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
320	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525164	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
321	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480709	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
322	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480758	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
323	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524994	45	X			X		29/04/2025	n/a	70	SS576199
324	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524941	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
325	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480671	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
326	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524937	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
327	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525030	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
328	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524894	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
329	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524962	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
330	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525034	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
331	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525033	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
332	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525047	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
333	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525035	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
334	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525031	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
335	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525062	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
336	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524938	45	X			X		16/04/2025	n/a	400	SS576199
337	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524953	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576199
338	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480670	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576199
339	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524910	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
340	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524843	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
341	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524976	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576199
342	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480770	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
343	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525161	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
344	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524959	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
345	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524923	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
346	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524884	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
347	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524897	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576199
348	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480780	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576199
349	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524969	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576199
350	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524834	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199
351	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524776	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199
352	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525040	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199
353	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524774	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199
354	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524929	45	X			X		23/04/2025	n/a	0	SS576199
355	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480767	45	X			X		23/04/2025	n/a	0	SS576199
356	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524794	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199
357	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525038	45	X			X		23/04/2025	n/a	0	SS576199
358	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525029	45	X			X		23/04/2025	n/a	0	SS576199
359	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525140	45	X			X		23/04/2025	n/a	0	SS576199
360	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525124	45	X			X		23/04/2025	n/a	0	SS576199
361	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525053	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199
362	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524771	45	X			X		24/04/2025	n/a	70	SS576199
363	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525075	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
364	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525064	45	X			X		23/04/2025	n/a	0	SS576199
365	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	525063	45	X			X		23/04/2025	n/a	0	SS576199
366	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480732	45	X			X		23/04/2025	n/a	0	SS576199
367	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	480768	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199
368	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524786	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199
369	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524777	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199
370	La Boquilla	Corregimiento	Normalizado	524756	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO:	Modernización	x	Reposición		Expansión	x	Abril 2025 CORREGIMIENTO DE LA BOQUILLA

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
371	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524755	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199
372	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524753	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199
373	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480752	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199
374	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524768	45	X			X		24/04/2025	n/a	0	SS576199
375	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525066	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
376	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525041	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
377	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524787	45	X			X		24/04/2025	n/a	70	SS576199
378	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524788	45	X			X		24/04/2025	n/a	70	SS576199
379	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525056	45	X			X		24/04/2025	n/a	70	SS576199
380	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525054	45	X			X		24/04/2025	n/a	70	SS576199
381	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524780	45	X			X		24/04/2025	n/a	70	SS576199
382	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524981	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
383	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524971	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
384	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524960	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
385	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525139	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
386	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524936	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
387	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480765	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
388	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480755	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
389	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524852	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
390	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524922	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
391	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524893	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
392	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525081	45	X			X		23/04/2025	n/a	250	SS576199
393	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524825	45	X			X		24/04/2025	n/a	70	SS576199
394	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525049	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
395	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525067	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
396	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525061	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
397	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524963	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
398	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525145	45	X			X		24/04/2025	n/a	70	SS576199
399	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524778	45	X			X		24/04/2025	n/a	70	SS576199
400	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524961	45	X			X		24/04/2025	n/a	70	SS576199
401	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525163	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
402	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		478122	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
403	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524934	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
404	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524955	45	X			X		16/04/2025	n/a	70	SS576199
405	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524990	45	X			X		16/04/2025	n/a	70	SS576199
406	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		478118	45	X			X		16/04/2025	n/a	70	SS576199
407	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480008	45	X			X		16/04/2025	n/a	70	SS576199
408	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524982	45	X			X		16/04/2025	n/a	70	SS576199
409	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480682	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
410	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524841	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
411	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524879	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
412	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480790	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
413	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524877	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
414	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480754	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
415	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480778	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
416	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479370	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
417	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524850	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
418	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524927	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
419	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524958	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
420	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524972	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
421	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524849	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
422	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525042	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
423	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480806	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
424	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480805	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
425	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524977	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
426	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		411261	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
427	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524859	45	X			X		23/04/2025	n/a	250	SS576199
428	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524872	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
429	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479367	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
430	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524905	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
431	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524875	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
432	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525117	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
433	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479369	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
434	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524911	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
435	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480810	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
436	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524906	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
437	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525121	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
438	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479434	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
439	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524800	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
440	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480791	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
441	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480776	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
442	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524991	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
443	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480751	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
444	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480763	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
445	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480769	45	X			X		22/04/2025	n/a	250	SS576199

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO:	Modernización	x	Reposición		Expansión	x	Abril 2025 CORREGIMIENTO DE LA BOQUILLA

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
446	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524779	45	X			X		24/04/2025	n/a	70	SS576199
447	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524900	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
448	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524866	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
449	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524995	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
450	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480771	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
451	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524993	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
452	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524935	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
453	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524898	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
454	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524770	45	X			X		24/04/2025	n/a	70	SS576199
455	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525055	45	X			X		24/04/2025	n/a	70	SS576199
456	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524775	45	X			X		24/04/2025	n/a	70	SS576199
457	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524785	45	X			X		24/04/2025	n/a	70	SS576199
458	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525048	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
459	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525052	45	X			X		24/04/2025	n/a	70	SS576199
460	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525050	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
461	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525068	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
462	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525043	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
463	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525149	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
464	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		501014	45	X			X		23/04/2025	n/a	100	SS576199
465	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525078	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
466	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525084	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
467	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525082	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
468	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524964	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
469	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480750	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
470	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480658	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
471	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480809	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
472	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524988	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
473	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		479005	45	X			X		16/04/2025	n/a	70	SS576199
474	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524948	45	X			X		16/04/2025	n/a	250	SS576199
475	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		478115	45	X			X		16/04/2025	n/a	400	SS576199
476	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525011	45	X			X		24/04/2025	n/a	250	SS576199
477	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524978	45	X			X		16/04/2025	n/a	250	SS576199
478	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524826	45	X			X		24/04/2025	n/a	70	SS576199
479	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480762	45	X			X		16/04/2025	n/a	70	SS576199
480	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525119	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
481	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524867	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
482	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524873	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
483	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480773	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
484	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524842	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
485	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480753	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
486	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480792	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
487	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524857	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
488	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480756	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
489	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524874	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
490	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524876	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
491	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480772	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
492	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524928	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
493	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525162	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
494	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524889	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
495	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524880	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
496	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524933	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
497	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524921	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
498	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480759	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
499	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		470203	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576199
500	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525123	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
501	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525044	45	X			X		23/04/2025	n/a	0	SS576199
502	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525076	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
503	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480760	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
504	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480694	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
505	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480672	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
506	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		480812	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
507	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525039	45	X			X		23/04/2025	n/a	70	SS576199
508	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524858	45	X			X		23/04/2025	n/a	250	SS576199
509	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524891	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
510	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525118	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
511	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524865	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
512	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525167	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
513	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		525009	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
514	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524844	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
515	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524942	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199
516	La Boquilla	Corregimiento Normalizado		524869	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576199

Anexo 22. Relación de Luminarias Instaladas Portales de Alicante

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO:	Modernización	x	Reposición		Expansión	x	Abril 2025 PORTALES DE ALICANTE

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
1	Portales de Alicante		Villa Candelaria	480370	45	X				X	26/04/2025	n/a	0	SS769927
2	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524820	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
3	Portales de Alicante		Villa Candelaria	525171	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
4	Portales de Alicante		Villa Candelaria	404275	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
5	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524722	45	X				X	26/04/2025	n/a	150	SS769927
6	Portales de Alicante		Villa Candelaria	398362	45	X				X	28/04/2025	n/a	0	SS769927
7	Portales de Alicante		Villa Candelaria	480411	45	X				X	26/04/2025	n/a	0	SS769927
8	Portales de Alicante		Villa Candelaria	480393	45	X				X	26/04/2025	n/a	0	SS769927
9	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524714	45	X				X	26/04/2025	n/a	0	SS769927
10	Portales de Alicante		Villa Candelaria	469881	45	X				X	28/04/2025	n/a	0	SS769927
11	Portales de Alicante		Villa Candelaria	401989	45	X				X	28/04/2025	n/a	0	SS769927
12	Portales de Alicante		Villa Candelaria	406087	45	X				X	28/04/2025	n/a	0	SS769927
13	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524718	45	X				X	28/04/2025	n/a	0	SS769927
14	Portales de Alicante		Villa Candelaria	480412	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
15	Portales de Alicante		Villa Candelaria	480439	45	X				X	26/04/2025	n/a	0	SS769927
16	Portales de Alicante		Villa Candelaria	480356	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
17	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524793	45	X				X	29/04/2025	n/a	0	SS769927
18	Portales de Alicante		Villa Candelaria	411332	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
19	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524782	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
20	Portales de Alicante		Villa Candelaria	480410	45	X				X	26/04/2025	n/a	0	SS769927
21	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524724	45	X				X	26/04/2025	n/a	0	SS769927
22	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524806	45	X				X	26/04/2025	n/a	0	SS769927
23	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524812	45	X				X	26/04/2025	n/a	0	SS769927
24	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524742	45	X				X	29/04/2025	n/a	0	SS769927
25	Portales de Alicante		Villa Candelaria	412183	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
26	Portales de Alicante		Villa Candelaria	397818	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
27	Portales de Alicante		Villa Candelaria	497386	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
28	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524743	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
29	Portales de Alicante		Villa Candelaria	499932	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
30	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524760	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
31	Portales de Alicante		Villa Candelaria	480656	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
32	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524748	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
33	Portales de Alicante		Villa Candelaria	525116	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
34	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524732	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
35	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524713	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
36	Portales de Alicante		Villa Candelaria	481587	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
37	Portales de Alicante		Villa Candelaria	404773	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
38	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524757	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
39	Portales de Alicante		Villa Candelaria	466858	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
40	Portales de Alicante		Villa Candelaria	470022	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
41	Portales de Alicante		Villa Candelaria	525141	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
42	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524741	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
43	Portales de Alicante		Villa Candelaria	408664	45	X				X	26/04/2025	n/a	0	SS769927
44	Portales de Alicante		Villa Candelaria	525136	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
45	Portales de Alicante		Villa Candelaria	480453	45	X				X	26/04/2025	n/a	0	SS769927
46	Portales de Alicante		Villa Candelaria	480684	45	X				X	26/04/2025	n/a	0	SS769927
47	Portales de Alicante		Villa Candelaria	480480	45	X				X	26/04/2025	n/a	0	SS769927
48	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524816	45	X				X	26/04/2025	n/a	150	SS769927
49	Portales de Alicante		Villa Candelaria	525096	45	X				X	29/04/2025	n/a	250	SS769927
50	Portales de Alicante		Villa Candelaria	520249	210	X				X	29/04/2025	n/a	250	SS769927
51	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524817	45	X				X	26/04/2025	n/a	0	SS769927
52	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524737	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
53	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524720	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
54	Portales de Alicante		Villa Candelaria	525087	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
55	Portales de Alicante		Villa Candelaria	399257	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
56	Portales de Alicante		Villa Candelaria	525146	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
57	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524754	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
58	Portales de Alicante		Villa Candelaria	525135	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
59	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524711	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
60	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524477	210	X				X	28/04/2025	n/a	150	SS769927
61	Portales de Alicante		Villa Candelaria	408515	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
62	Portales de Alicante		Villa Candelaria	401563	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
63	Portales de Alicante		Villa Candelaria	404572	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
64	Portales de Alicante		Villa Candelaria	469210	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
65	Portales de Alicante		Villa Candelaria	470387	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
66	Portales de Alicante		Villa Candelaria	404742	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
67	Portales de Alicante		Villa Candelaria	525169	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
68	Portales de Alicante		Villa Candelaria	469266	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
69	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524805	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
70	Portales de Alicante		Villa Candelaria	525143	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO:	Modernización	x	Reposición		Expansión	x	Abril 2025 PORTALES DE ALICANTE

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
71	Portales de Alicante		Villa Candelaria	407052	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
72	Portales de Alicante		Villa Candelaria	407840	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
73	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524832	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
74	Portales de Alicante		Villa Candelaria	496723	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
75	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524823	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
76	Portales de Alicante		Villa Candelaria	525172	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
77	Portales de Alicante		Villa Candelaria	499432	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
78	Portales de Alicante		Villa Candelaria	525134	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
79	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524705	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
80	Portales de Alicante		Villa Candelaria	499126	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
81	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524734	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
82	Portales de Alicante		Villa Candelaria	499456	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
83	Portales de Alicante		Villa Candelaria	495813	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
84	Portales de Alicante		Villa Candelaria	408630	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
85	Portales de Alicante		Villa Candelaria	499884	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
86	Portales de Alicante		Villa Candelaria	401022	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
87	Portales de Alicante		Villa Candelaria	400346	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
88	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524801	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
89	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524789	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
90	Portales de Alicante		Villa Candelaria	499633	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
91	Portales de Alicante		Villa Candelaria	404358	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
92	Portales de Alicante		Villa Candelaria	498437	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
93	Portales de Alicante		Villa Candelaria	525144	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
94	Portales de Alicante		Villa Candelaria	397785	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
95	Portales de Alicante		Villa Candelaria	502642	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
96	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524813	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
97	Portales de Alicante		Villa Candelaria	410640	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
98	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524716	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
99	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524707	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
100	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524781	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
101	Portales de Alicante		Villa Candelaria	525114	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
102	Portales de Alicante		Villa Candelaria	470531	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
103	Portales de Alicante		Villa Candelaria	478264	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
104	Portales de Alicante		Villa Candelaria	408659	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
105	Portales de Alicante		Villa Candelaria	407197	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
106	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524706	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
107	Portales de Alicante		Villa Candelaria	469312	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
108	Portales de Alicante		Villa Candelaria	468008	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
109	Portales de Alicante		Villa Candelaria	411628	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
110	Portales de Alicante		Villa Candelaria	468228	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
111	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524723	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
112	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524712	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
113	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524746	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
114	Portales de Alicante		Villa Candelaria	407895	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
115	Portales de Alicante		Villa Candelaria	469464	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
116	Portales de Alicante		Villa Candelaria	499139	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
117	Portales de Alicante		Villa Candelaria	470166	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
118	Portales de Alicante		Villa Candelaria	411567	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
119	Portales de Alicante		Villa Candelaria	500967	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
120	Portales de Alicante		Villa Candelaria	470231	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
121	Portales de Alicante		Villa Candelaria	469207	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
122	Portales de Alicante		Villa Candelaria	368779	44	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
123	Portales de Alicante		Villa Candelaria	500884	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
124	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524860	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
125	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524829	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
126	Portales de Alicante		Villa Candelaria	398522	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
127	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524761	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
128	Portales de Alicante		Villa Candelaria	401632	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
129	Portales de Alicante		Villa Candelaria	468770	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
130	Portales de Alicante		Villa Candelaria	408665	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
131	Portales de Alicante		Villa Candelaria	467761	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
132	Portales de Alicante		Villa Candelaria	525142	45	X				X	28/04/2025	n/a	150	SS769927
133	Portales de Alicante		Villa Candelaria	480394	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
134	Portales de Alicante		Villa Candelaria	480440	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
135	Portales de Alicante		Villa Candelaria	480438	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
136	Portales de Alicante		Villa Candelaria	496160	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
137	Portales de Alicante		Villa Candelaria	502075	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
138	Portales de Alicante		Villa Candelaria	525093	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
139	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524814	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
140	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524740	45	X				X	26/04/2025	n/a	150	SS769927
141	Portales de Alicante		Villa Candelaria	480334	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
142	Portales de Alicante		Villa Candelaria	480335	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
143	Portales de Alicante		Villa Candelaria	501402	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
144	Portales de Alicante		Villa Candelaria	467921	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
145	Portales de Alicante		Villa Candelaria	498393	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO:	Modernización	x	Reposición		Expansión	x	Abril 2025 PORTALES DE ALICANTE

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
146	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524729	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
147	Portales de Alicante		Villa Candelaria	521710	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
148	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524717	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
149	Portales de Alicante		Villa Candelaria	479060	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
150	Portales de Alicante		Villa Candelaria	409681	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
151	Portales de Alicante		Villa Candelaria	409925	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
152	Portales de Alicante		Villa Candelaria	501985	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
153	Portales de Alicante		Villa Candelaria	407357	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
154	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524752	45	X				X	26/04/2025	n/a	150	SS769927
155	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524792	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
156	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524735	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
157	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524763	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
158	Portales de Alicante		Villa Candelaria	525113	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
159	Portales de Alicante		Villa Candelaria	481473	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
160	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524762	45	X				X	26/04/2025	n/a	150	SS769927
161	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524715	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
162	Portales de Alicante		Villa Candelaria	470772	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
163	Portales de Alicante		Villa Candelaria	481166	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
164	Portales de Alicante		Villa Candelaria	402469	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
165	Portales de Alicante		Villa Candelaria	480354	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
166	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524733	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
167	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524815	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
168	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524708	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
169	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524739	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
170	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524226	210	X				X	29/04/2025	n/a	250	SS769927
171	Portales de Alicante		Villa Candelaria	399260	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
172	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524924	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
173	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524719	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
174	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524730	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
175	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524830	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
176	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524738	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
177	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524784	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
178	Portales de Alicante		Villa Candelaria	500320	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
179	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524796	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
180	Portales de Alicante		Villa Candelaria	408724	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
181	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524824	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
182	Portales de Alicante		Villa Candelaria	407844	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
183	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524821	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
184	Portales de Alicante		Villa Candelaria	467364	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
185	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524709	45	X				X	26/04/2025	n/a	150	SS769927
186	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524810	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
187	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524727	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
188	Portales de Alicante		Villa Candelaria	480455	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
189	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524822	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
190	Portales de Alicante		Villa Candelaria	409158	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
191	Portales de Alicante		Villa Candelaria	398757	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
192	Portales de Alicante		Villa Candelaria	402534	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
193	Portales de Alicante		Villa Candelaria	468771	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
194	Portales de Alicante		Villa Candelaria	400497	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
195	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524811	45	X				X	29/04/2025	n/a	150	SS769927
196	Portales de Alicante		Villa Candelaria	469929	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
197	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524809	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
198	Portales de Alicante		Villa Candelaria	500740	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
199	Portales de Alicante		Villa Candelaria	479368	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
200	Portales de Alicante		Villa Candelaria	402954	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
201	Portales de Alicante		Villa Candelaria	480437	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
202	Portales de Alicante		Villa Candelaria	402805	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
203	Portales de Alicante		Villa Candelaria	480409	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
204	Portales de Alicante		Villa Candelaria	408281	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
205	Portales de Alicante		Villa Candelaria	404265	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
206	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524744	45	X				X	28/04/2025	n/a	150	SS769927
207	Portales de Alicante		Villa Candelaria	480333	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
208	Portales de Alicante		Villa Candelaria	406279	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
209	Portales de Alicante		Villa Candelaria	525133	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
210	Portales de Alicante		Villa Candelaria	404619	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
211	Portales de Alicante		Villa Candelaria	498844	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
212	Portales de Alicante		Villa Candelaria	411343	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
213	Portales de Alicante		Villa Candelaria	480395	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
214	Portales de Alicante		Villa Candelaria	501722	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
215	Portales de Alicante		Villa Candelaria	499205	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
216	Portales de Alicante		Villa Candelaria	499035	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
217	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524736	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
218	Portales de Alicante		Villa Candelaria	401999	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
219	Portales de Alicante		Villa Candelaria	478351	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
220	Portales de Alicante		Villa Candelaria	412198	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO: Modernización x | Reposición | Expansión x

Abril 2025 PORTALES DE ALICANTE

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
221	Portales de Alicante		Villa Candelaria	482553	45	X				X	26/04/2025	n/a	250	SS769927
222	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524920	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
223	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524831	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
224	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524764	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
225	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524818	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
226	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524766	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
227	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524747	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
228	Portales de Alicante		Villa Candelaria	399726	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
229	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524819	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
230	Portales de Alicante		Villa Candelaria	495885	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
231	Portales de Alicante		Villa Candelaria	500207	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
232	Portales de Alicante		Villa Candelaria	467627	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
233	Portales de Alicante		Villa Candelaria	470261	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
234	Portales de Alicante		Villa Candelaria	470023	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
235	Portales de Alicante		Villa Candelaria	412141	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
236	Portales de Alicante		Villa Candelaria	500924	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
237	Portales de Alicante		Villa Candelaria	399574	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
238	Portales de Alicante		Villa Candelaria	401638	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
239	Portales de Alicante		Villa Candelaria	400580	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
240	Portales de Alicante		Villa Candelaria	410037	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
241	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524797	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
242	Portales de Alicante		Villa Candelaria	411301	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
243	Portales de Alicante		Villa Candelaria	480396	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
244	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524472	210	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
245	Portales de Alicante		Villa Candelaria	480454	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
246	Portales de Alicante		Villa Candelaria	478135	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
247	Portales de Alicante		Villa Candelaria	472591	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
248	Portales de Alicante		Villa Candelaria	525170	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
249	Portales de Alicante		Villa Candelaria	469678	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
250	Portales de Alicante		Villa Candelaria	500820	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
251	Portales de Alicante		Villa Candelaria	399480	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
252	Portales de Alicante		Villa Candelaria	480353	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
253	Portales de Alicante		Villa Candelaria	411731	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
254	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524791	45	X				X	26/04/2025	n/a	150	SS769927
255	Portales de Alicante		Villa Candelaria	499341	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
256	Portales de Alicante		Villa Candelaria	466812	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
257	Portales de Alicante		Villa Candelaria	480456	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
258	Portales de Alicante		Villa Candelaria	501165	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
259	Portales de Alicante		Villa Candelaria	411919	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
260	Portales de Alicante		Villa Candelaria	410257	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
261	Portales de Alicante		Villa Candelaria	404159	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
262	Portales de Alicante		Villa Candelaria	411185	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
263	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524728	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
264	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524765	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
265	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524721	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
266	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524726	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
267	Portales de Alicante		Villa Candelaria	495771	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
268	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524745	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
269	Portales de Alicante		Villa Candelaria	411713	45	X				X	28/04/2025	n/a	70	SS769927
270	Portales de Alicante		Villa Candelaria	405365	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
271	Portales de Alicante		Villa Candelaria	496183	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
272	Portales de Alicante		Villa Candelaria	470397	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
273	Portales de Alicante		Villa Candelaria	472330	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
274	Portales de Alicante		Villa Candelaria	409981	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
275	Portales de Alicante		Villa Candelaria	524790	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
276	Portales de Alicante		Villa Candelaria	407651	45	X				X	30/04/2025	n/a	70	SS769927
277	Portales de Alicante		Villa Candelaria	525115	45	X				X	26/04/2025	n/a	70	SS769927
278	Portales de Alicante		Villa Candelaria	481225	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927
279	Portales de Alicante		Villa Candelaria	409988	45	X				X	29/04/2025	n/a	70	SS769927

Anexo 23. Relación de Luminarias Instaladas Pontezuela – Bayunca

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO:	Modernización	x	Reposición		Expansión	x	Abril 2025 Pontezuela Bayunca

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
1	Pontezuela	Corregimiento Normalizado		471210	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
2	Pontezuela	Corregimiento Normalizado		411375	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
3	Pontezuela	Corregimiento Normalizado		525517	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
4	Bayunca	Corregimiento Normalizado		411136	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
5	Bayunca	Corregimiento Normalizado		468012	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
6	Bayunca	Corregimiento Normalizado		411915	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
7	Bayunca	Corregimiento Normalizado		406536	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
8	Bayunca	Corregimiento Normalizado		480424	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
9	Pontezuela	Corregimiento Normalizado		525327	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576195
10	Pontezuela	Corregimiento Normalizado		412075	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576195
11	Pontezuela	Corregimiento Normalizado		479214	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576195
12	Pontezuela	Corregimiento Normalizado		479211	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576195
13	Pontezuela	Corregimiento Normalizado		525518	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576195
14	Pontezuela	Corregimiento Normalizado		525326	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576195
15	Pontezuela	Corregimiento Normalizado		397815	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576195
16	Pontezuela	Corregimiento Normalizado		467883	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576195
17	Pontezuela	Corregimiento Normalizado		411075	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576195
18	Pontezuela	Corregimiento Normalizado		480496	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576195
19	Pontezuela	Corregimiento Normalizado		480369	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576195
20	Pontezuela	Corregimiento Normalizado		525519	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576195
21	Pontezuela	Corregimiento Normalizado		398394	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576195
22	Pontezuela	Corregimiento Normalizado		402155	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576195
23	Pontezuela	Corregimiento Normalizado		480371	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576195
24	Pontezuela	Corregimiento Normalizado		479213	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576195
25	Pontezuela	Corregimiento Normalizado		480372	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576195
26	Pontezuela	Corregimiento Normalizado		399412	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576195
27	Pontezuela	Corregimiento Normalizado		399619	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576195
28	Pontezuela	Corregimiento Normalizado		500885	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576195
29	Pontezuela	Corregimiento Normalizado		397540	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576195
30	Pontezuela	Corregimiento Normalizado		406180	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576195
31	Bayunca	Corregimiento Normalizado		480444	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
32	Bayunca	Corregimiento Normalizado		480391	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
33	Bayunca	Corregimiento Normalizado		480433	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
34	Bayunca	Corregimiento Normalizado		480481	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
35	Bayunca	Corregimiento Normalizado		480344	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
36	Bayunca	Corregimiento Normalizado		480390	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
37	Bayunca	Corregimiento Normalizado		480483	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
38	Bayunca	Corregimiento Normalizado		480392	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
39	Bayunca	Corregimiento Normalizado		399106	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
40	Bayunca	Corregimiento Normalizado		480422	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
41	Bayunca	Corregimiento Normalizado		480341	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
42	Bayunca	Corregimiento Normalizado		479447	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
43	Bayunca	Corregimiento Normalizado		480435	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
44	Bayunca	Corregimiento Normalizado		480434	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
45	Bayunca	Corregimiento Normalizado		480421	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
46	Bayunca	Corregimiento Normalizado		480343	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
47	Bayunca	Corregimiento Normalizado		480484	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
48	Bayunca	Corregimiento Normalizado		480389	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
49	Bayunca	Corregimiento Normalizado		479710	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
50	Bayunca	Corregimiento Normalizado		480442	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
51	Bayunca	Corregimiento Normalizado		480436	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
52	Bayunca	Corregimiento Normalizado		480345	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
53	Bayunca	Corregimiento Normalizado		480468	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
54	Bayunca	Corregimiento Normalizado		469786	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
55	Bayunca	Corregimiento Normalizado		411817	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
56	Bayunca	Corregimiento Normalizado		480467	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
57	Bayunca	Corregimiento Normalizado		480423	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
58	Bayunca	Corregimiento Normalizado		480477	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
59	Bayunca	Corregimiento Normalizado		525328	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
60	Bayunca	Corregimiento Normalizado		405785	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
61	Bayunca	Corregimiento Normalizado		480441	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
62	Bayunca	Corregimiento Normalizado		480443	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
63	Bayunca	Corregimiento Normalizado		480347	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
64	Bayunca	Corregimiento Normalizado		410491	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
65	Bayunca	Corregimiento Normalizado		411043	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
66	Bayunca	Corregimiento Normalizado		480348	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
67	Bayunca	Corregimiento Normalizado		524531	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
68	Bayunca	Corregimiento Normalizado		480342	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
69	Bayunca	Corregimiento Normalizado		468797	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
70	Bayunca	Corregimiento Normalizado		399712	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO:	Modernización	x	Reposición		Expansión	x	Abril 2025 Pontezuela Bayunca

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
71	Bayunca	Corregimiento Normalizado		397894	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
72	Bayunca	Corregimiento Normalizado		480482	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
73	Bayunca	Corregimiento Normalizado		466678	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
74	Bayunca	Corregimiento Normalizado		498610	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
75	Bayunca	Corregimiento Normalizado		365674	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
76	Bayunca	Corregimiento Normalizado		478684	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576195
77	Bayunca	Corregimiento Normalizado		401734	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
78	Bayunca	Corregimiento Normalizado		410759	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
79	Bayunca	Corregimiento Normalizado		480346	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
80	Bayunca	Corregimiento Normalizado		479307	45	X			X		22/04/2025	n/a	70	SS576195
81	Bayunca	Corregimiento Normalizado		481223	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
82	Bayunca	Corregimiento Normalizado		499185	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
83	Bayunca	Corregimiento Normalizado		480466	45	X			X		22/04/2025	n/a	0	SS576195
84	Pontezuela	Corregimiento Normalizado		480864	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576195
85	Pontezuela	Corregimiento Normalizado		480479	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576195
86	Pontezuela	Corregimiento Normalizado		525520	45	X			X		21/04/2025	n/a	0	SS576195
87	Pontezuela	Corregimiento Normalizado		479212	45	X			X		21/04/2025	n/a	70	SS576195
88	Bayunca	Corregimiento Normalizado		495904	45	X			X		5/04/2025	n/a	70	SS576195

Anexo 24. Relación De Luminarias Instaladas Pozón: Etapas I – II Y III

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO:	Modernización	x	Reposición		Expansión	x	Abril 2025 Barrio El Pozón Etapas I - II y III

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
1	Pozón	Etapa 1		524931	45	X			X		25/04/2025	n/a	0	Pozón SS484687
2	Pozón	Etapa 1		524885	45	X			X		25/04/2025	n/a	0	Pozón SS484687
3	Pozón	Etapa 1		524887	45	X			X		25/04/2025	n/a	0	Pozón SS484687
4	Pozón	Etapa 1		524881	45	X			X		25/04/2025	n/a	0	Pozón SS484687
5	Pozón	Etapa 1		524702	45	X			X		25/04/2025	n/a	0	Pozón SS484687
6	Pozón	Etapa 1		524750	45	X			X		25/04/2025	n/a	0	Pozón SS484687
7	Pozón	Etapa 1		524751	45	X			X		25/04/2025	n/a	0	Pozón SS484687
8	Pozón	Etapa 1		524703	45	X			X		25/04/2025	n/a	0	Pozón SS484687
9	Pozón	Etapa 1		524808	45	X			X		25/04/2025	n/a	0	Pozón SS484687
10	Pozón	Etapa 1		524701	45	X			X		25/04/2025	n/a	0	Pozón SS484687
11	Pozón	Etapa 1		509560	64	X			X		25/04/2025	n/a	250	Pozón SS484687
12	Pozón	Etapa 1		407532	45	X			X		26/04/2025	n/a	70	Pozón SS484687
13	Pozón	Etapa 1		403470	45	X			X		26/04/2025	n/a	70	Pozón SS484687
14	Pozón	Etapa 1		400737	45	X			X		25/04/2025	n/a	70	Pozón SS484687
15	Pozón	Etapa 1		509423	64	X			X		25/04/2025	n/a	70	Pozón SS484687
16	Pozón	Etapa 1		502140	45	X			X		6/04/2025	n/a	70	Pozón SS484687
1	Pozón	Etapa 2		524930	45	X			X		25/04/2025	n/a	0	Pozón SS560838
2	Pozón	Etapa 2		480693	45	X			X		25/04/2025	n/a	0	Pozón SS560838
3	Pozón	Etapa 2		524926	45	X			X		25/04/2025	n/a	0	Pozón SS560838
4	Pozón	Etapa 2		524749	45	X			X		25/04/2025	n/a	0	Pozón SS560838
5	Pozón	Etapa 2		524731	45	X			X		25/04/2025	n/a	0	Pozón SS560838
6	Pozón	Etapa 2		479251	45	X			X		5/04/2025	n/a	70	Pozón SS560838
7	Pozón	Etapa 2		524704	45	X			X		25/04/2025	n/a	0	Pozón SS560838
8	Pozón	Etapa 2		524807	45	X			X		25/04/2025	n/a	0	Pozón SS560838
9	Pozón	Etapa 2		524752	45	X			X		25/04/2025	n/a	0	Pozón SS560838
10	Pozón	Etapa 2		524759	45	X			X		25/04/2025	n/a	70	Pozón SS560838
11	Pozón	Etapa 2		364084	44	X			X		26/04/2025	n/a	70	Pozón SS560838
12	Pozón	Etapa 2		479254	45	X			X		5/04/2025	n/a	70	Pozón SS560838
13	Pozón	Etapa 2		479479	45	X			X		5/04/2025	n/a	70	Pozón SS560838
1	Pozón	Etapa 3		478981	45	X			X		29/04/2025	n/a	0	Pozón SS560842
2	Pozón	Etapa 3		478969	45	X			X		29/04/2025	n/a	0	Pozón SS560842
3	Pozón	Etapa 3		524424	210	X				X	29/04/2025	n/a	0	Pozón SS560842
4	Pozón	Etapa 3		524427	210	X				X	29/04/2025	n/a	0	Pozón SS560842
5	Pozón	Etapa 3		524523	210	X				X	29/04/2025	n/a	0	Pozón SS560842
6	Pozón	Etapa 3		520289	210	X				X	29/04/2025	n/a	0	Pozón SS560842
7	Pozón	Etapa 3		480448	45	X			X		28/04/2025	n/a	0	Pozón SS560842
8	Pozón	Etapa 3		524909	45	X			X		25/04/2025	n/a	0	Pozón SS560842
9	Pozón	Etapa 3		480402	45	X			X		28/04/2025	n/a	0	Pozón SS560842
10	Pozón	Etapa 3		479311	45	X			X		26/04/2025	n/a	70	Pozón SS560842

Anexo 25. Relación de Luminarias Instaladas Otros Proyectos

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO: Modernización | Reposición | Expansión x

Abril 2025 - Otros Proryectos

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
1	Blas de Lezo	Carrera 68	Av. Kenedy	507263	64	x					5/04/2025	n/a	0	SS177793
2	Policarpa	Vía Arroz Barato Policarpa		406573	45						13/04/2025	n/a	0	SS751161
3	Policarpa	Vía Arroz Barato Policarpa		309016	50						13/04/2025	n/a	0	SS751161
4	Canapote	61	Puente Romero	384732	150						3/04/2025	n/a	0	SS888847
5	Canapote	61	Puente Romero	508032	64						3/04/2025	n/a	0	SS888847
6	Canapote	61	Puente Romero	386550	59						3/04/2025	n/a	0	SS888847
7	Canapote	61	Puente Romero	384781	150						3/04/2025	n/a	0	SS888847
8	Chiquinquira	SMI Costado Occidental Estadio Jaime Moron		295450	291						11/04/2025	n/a	0	SS1037005
9	Chiquinquira	SMI Costado Occidental Estadio Jaime Moron		297490	291						11/04/2025	n/a	0	SS1037005
10	Chiquinquira	SMI Costado Occidental Estadio Jaime Moron		295378	291						11/04/2025	n/a	0	SS1037005
11	Chiquinquira	SMI Costado Occidental Estadio Jaime Moron		287489	291						11/04/2025	n/a	0	SS1037005
12	Chiquinquira	SMI Costado Occidental Estadio Jaime Moron		295350	291						11/04/2025	n/a	0	SS1037005
13	Chiquinquira	SMI Costado Occidental Estadio Jaime Moron		287416	291						11/04/2025	n/a	0	SS1037005
14	San Francisco	Vía Perimetral	Letras Cartagena	514153	212						4/04/2025	n/a	0	SS1049697
15	Los Caracoles	Transv. 54	Puente los Gatos	402743	45						29/04/2025	n/a	0	SS1055224
16	Los Caracoles	Transv. 54	Puente los Gatos	398526	45						29/04/2025	n/a	0	SS1055224
17	Los Caracoles	Transv. 54	Puente los Gatos	403872	45						29/04/2025	n/a	0	SS1055224
18	Los Caracoles	Transv. 54	Puente los Gatos	470153	45						29/04/2025	n/a	0	SS1055224
19	Los Caracoles	Transv. 54	Puente los Gatos	479200	45						29/04/2025	n/a	0	SS1055224
20	Bocagrande	Cl. 5 #2-70	Decorcerámica	495805	45						17/04/2025	n/a	0	SS1060086
21	Manzanillo	Ingreso a Manzanillo	Estr. 134	357505	128						16/04/2025	n/a	0	SS1060293
22	Pie de la Popa	Puente Las Palmas	Calle 29	295477	291						7/04/2025	n/a	400	SS1060326
23	Lo Amador	Caño Lo Amador		514148	212						11/04/2025	n/a	0	SS10600332
24	Lo Amador	Caño Lo Amador		514149	212						11/04/2025	n/a	0	SS10600332
25	Centro	Parque de la Marina		295481	291						29/04/2025	n/a	400	SS1072826
26	Centro	Parque de la Marina		295405	291						29/04/2025	n/a	400	SS1072826
27	Centro	Parque de la Marina		295366	291						29/04/2025	n/a	250	SS1072826
28	Centro	Parque de la Marina		514454	212						29/04/2025	n/a	0	SS1072826
29	Centro	Parque de la Marina		295485	291						29/04/2025	n/a	400	SS1072826
30	Centro	Parque de la Marina		287415	291						29/04/2025	n/a	400	SS1072826
31	Centro	Parque de la Marina		514133	212						29/04/2025	n/a	400	SS1072826
32	Centro	Parque de la Marina		514136	212						29/04/2025	n/a	400	SS1072826
33	Centro	Parque de la Marina		514138	212						29/04/2025	n/a	400	SS1072826
34	Centro	Parque de la Marina		514456	212						29/04/2025	n/a	250	SS1072826
35	Centro	Parque de la Marina		514428	212						29/04/2025	n/a	250	SS1072826
36	Centro	Parque de la Marina		514290	212						29/04/2025	n/a	250	SS1072826
37	Centro	Parque de la Marina		514452	212						29/04/2025	n/a	400	SS1072826
38	Centro	Parque de la Marina		514135	212						29/04/2025	n/a	400	SS1072826

Anexo 26. Registro de Medición de Iluminación Realizada en Abril 2025

Medida #1: Portales de Alicante, Parqueaderos

MEDIDAS DE NIVELES DE ILUMINANCIA No 1
METODOS DE LOS 9 PUNTOS y/0 Cavidad Zonal dependiendo de la Zona

RESPONSABLE	LUIS MARTINEZ /LUIS MEJIA			**FECHA**	29/04/2024	HORA INICIO	7:30PM
DIRECc DEL SITIO	**PORTALES DE ALICANTE**						
TRAMOS DE VIA CON CONDIC UNIFORMES AL SITIO DE MEDIDA				Parqueadero			
LUXOMETRO	KLEIN TOOLS ET 130						
CONDICIONES ATMOSFERICA DE LA NOCHE			Cielo despejado				
LUMINARIA	celsa Coraled 64,5w			**PANEL LEDS**	64,5w		
TIPO DE APOYO	existente			**AVANCE DE LA LUMINARIA SOBRE CALZADA (m) DESTAPADA**	0,5 Y 0,72 m APROX		
ANCHO DE CALZADA	6m a 7 m aprox			**ALTURA DE MONTAJE DE LA LUM (m)**	7,8 m A 8M APROX		
SEPARADOR	SI=	NO= X	No DE SEPARADORES				
DISPOSICION DE LUMINARIAS	Normal de vehicular pequeña		0	**TENSION NOMINAL DE LA LUM (VOLT)**	120-250		
INTERDISTANCIA ENTRE LUMINARIA CONSECUTIVAS	33 M APROX		**DISTANCIA DEL FAROL A LA CALZADA (m)**		0,42m Calle de dos carriles		
ANGULO DE INCLINACION DE LA LUMINARIA	0° a 0.01° APROX		**TENSION MEDIDA DE LA RED (m)**		240		
SUCIEDAD DE EL CONJUNTO OPTICO?	La luminaria es totalmente Nueva						

PUNTOS	1	2	3	**OBSERVACIONES**
1	54	85	30	La contaminacion es leve luces de balcones de los aptos
2	36	48	25	
3	23	22	21	

Portales de Alicante - Parqueadero	**DISTRIBUCION**	Unilateral abajo

Medidas en Campo		
	VIA	**Peatonal**
E1	54	0
E2	36	0
E3	23	0
E4	85	0
E5	48	0
E6	22	0
E7	30	0
E8	25	0
E9	21	0

TIPO DE VIA M4

	1/16	(E1+E3+E7+E9)	(E2+E4+E6+E8)	E5
Eprom	0,063	128	168	48
Eprom	0,063	0	0	
UNIFORMIDAD Peatonal		**0,39**	**OK**	

Medida #2: Portales de Alicante, Cancha de arena

MEDIDAS DE NIVELES DE ILUMINANCIA No 2
METODOS DE LOS 9 PUNTOS y/0 Cavidad Zonal dependiendo de la Zona

RESPONSABLE	LUIS MARTINEZ /LUIS MEJIA			**FECHA**	29/04/2024	HORA INICIO	8:05PM
DIRECc DEL SITIO	**PORTALES DE ALICANTE cancha tierra**						
TRAMOS DE VIA CON CONDIC UNIFORMES AL SITIO DE MEDIDA				cancha			
LUXOMETRO	KLEIN TOOLS ET 130						
CONDICIONES ATMOSFERICA DE LA NOCHE			Cielo seminublado				
LUMINARIA	celsa Deltaled 210w			**PANEL LEDS**	64,5w		
TIPO DE APOYO	12m a 18 m aprox			**AVANCE DE LA LUMINARIA SOBRE CALZADA (m) DESTAPADA**	0,5 Y 0,72 m APROX		
ANCHO DE CALZADA	7m aprox			**ALTURA DE MONTAJE DE LA LUM (m)**	7,8 m A 8M APROX		
SEPARADOR	SI=	NO= X	No DE SEPARADORES				
DISPOSICION DE LUMINARIAS	en la parte esquina de la cancha		0	**TENSION NOMINAL DE LA LUM (VOLT)**	120-250		
INTERDISTANCIA ENTRE LUMINARIA CONSECUTIVAS	25 A 23 M APROX		**DISTANCIA DEL FAROL A LA CALZADA (m)**		no existe calkzada es cancha		
ANGULO DE INCLINACION DE LA LUMINARIA	0° a 0.01° APROX		**TENSION MEDIDA DE LA RED (m)**		240		
SUCIEDAD DE EL CONJUNTO OPTICO?	La luminaria es totalmente Nueva						

PUNTOS	1	2	3	**OBSERVACIONES**
1	71	65	84	cancha de tierra, con cuatro Luminarias, la reflexion es poca, pero escaso de deslumbramiento optima para practica recreativa
2	34	38	72	
3	21	28	29	

Portales de Alicante - Cancha Arena	**DISTRIBUCION**	Unilateral abajo

Medidas en Campo		
	VIA	**Peatonal**
E1	71	0
E2	34	0
E3	21	0
E4	65	0
E5	38	0
E6	28	0
E7	84	0
E8	72	0
E9	29	0

TIPO DE VIA M4

	1/16	(E1+E3+E7+E9)	(E2+E4+E6+E8)	E5
Eprom	0,063	205	199	38
Eprom	0,063	0	0	
UNIFORMIDAD Peatonal		**0,41**	OK	

Medida #3: Portales de Alicante, Parqueadero Conjunto 4

MEDIDAS DE NIVELES DE ILUMINANCIA No 3
METODOS DE LOS 9 PUNTOS y/0 Cavidad Zonal dependiendo de la Zona

RESPONSABLE	LUIS MARTINEZ /LUIS MEJIA			**FECHA**	29/04/2024	HORA INICIO	8:55PM
DIRECc DEL SITIO	**PORTALES DE ALICANTE**						
TRAMOS DE VIA CON CONDIC UNIFORMES AL SITIO DE MEDIDA			parqueadero conjunto 4				
LUXOMETRO	KLEIN TOOLS ET 130						
CONDICIONES ATMOSFERICA DE LA NOCHE			Cielo despejado				
LUMINARIA	celsa Coreled 45w			**PANEL LEDS**			
TIPO DE APOYO	existente			**AVANCE DE LA LUMINARIA SOBRE CALZADA (m) DESTAPADA**	0,5 Y 0,72 m APROX		
ANCHO DE CALZADA	5m a 4,5 m aprox			**ALTURA DE MONTAJE DE LA LUM (m)**	7,8 m A 8M APROX		
SEPARADOR	SI=	NO= X	**No DE SEPARADORES**				
DISPOSICION DE LUMINARIAS	Peatonal		0	**TENSION NOMINAL DE LA LUM (VOLT)**	120-250		
INTERDISTANCIA ENTRE LUMINARIA CONSECUTIVAS	33 M APROX		**DISTANCIA DEL FAROL A LA CALZADA (m)**		0,42m Callejon de dos carriles		
ANGULO DE INCLINACION DE LA LUMINARIA	0° a 0.01° APROX		**TENSION MEDIDA DE LA RED (m)**		240		
SUCIEDAD DE EL CONJUNTO OPTICO?	La luminaria es totalmente Nueva						

PUNTOS	1	2	3	**OBSERVACIONES**
1	40	33	27	Mucha contaminacion luces de balcones de los aptos
2	30	20	20	
3	27	19	14	

Portales de Alicante -Parqueadero Conj 4	**DISTRIBUCION**	Unilateral abajo

Medidas en Campo		
	VIA	**Peatonal**
E1	40	0
E2	30	0
E3	27	0
E4	33	0
E5	20	0
E6	19	0
E7	27	0
E8	20	0
E9	14	0

TIPO DE VIA M4

	1/16	(E1+E3+E7+E9)	(E2+E4+E6+E8)	E5
Eprom	0,063	108	102	20
Eprom	0,063	0	0	
UNIFORMIDAD via		**0,35**	OK	
UNIFORMIDAD Peatonal				

Medida #4: Portales de Alicante, Parqueadero Conjunto 5

MEDIDAS DE NIVELES DE ILUMINANCIA No 4
METODOS DE LOS 9 PUNTOS y/0 Cavidad Zonal dependiendo de la Zona

RESPONSABLE	LUIS MARTINEZ /LUIS MEJIA			**FECHA**	29/04/2024	HORA INICIO	9:37PM
DIRECc DEL SITIO	**PORTALES DE ALICANTE**						
TRAMOS DE VIA CON CONDIC UNIFORMES AL SITIO DE MEDIDA			parqueadero conjunto 5				
LUXOMETRO	KLEIN TOOLS ET 130						
CONDICIONES ATMOSFERICA DE LA NOCHE			Cielo despejado				
LUMINARIA	celsa Coreled 45w			**PANEL LEDS**			
TIPO DE APOYO	existente			**AVANCE DE LA LUMINARIA SOBRE CALZADA (m) DESTAPADA**	0,5 Y 0,72 m APROX		
ANCHO DE CALZADA	5m a4,38 m aprox			**ALTURA DE MONTAJE DE LA LUM (m)**	7,8 m A 8M APROX		
SEPARADOR	SI=	NO= X	**No DE SEPARADORES**				
DISPOSICION DE LUMINARIAS	Peatonal		0	**TENSION NOMINAL DE LA LUM (VOLT)**	120-250		
INTERDISTANCIA ENTRE LUMINARIA CONSECUTIVAS	33 M APROX		**DISTANCIA DEL FAROL A LA CALZADA (m)**		0,42m Callejon de dos carriles		
ANGULO DE INCLINACION DE LA LUMINARIA	0° a 0.01° APROX		**TENSION MEDIDA DE LA RED (m)**		240		
SUCIEDAD DE EL CONJUNTO OPTICO?	La luminaria es totalmente Nueva						

PUNTOS	1	2	3	**OBSERVACIONES**
1	67	54	45	Aun sigue la contaminacion luces de balcones de los aptos
2	61	51	40	
3	56	48	35	

Portales de Alicante -Parqueadero Conj 5	**DISTRIBUCION**	Unilateral abajo

Medidas en Campo		
	VIA	**Peatonal**
E1	67	0
E2	61	0
E3	56	0
E4	54	0
E5	51	0
E6	48	0
E7	45	0
E8	40	0
E9	35	0

TIPO DE VIA M4

	1/16	(E1+E3+E7+E9)	(E2+E4+E6+E8)	E5
Eprom	0,063	203	203	51
Eprom	0,063	0	0	

UNIFORMIDAD via **0,52** OK

UNIFORMIDAD Peatonal

Anexo 27. Comunicación AP-EPM-005-2025: Ajuste De UCAP's Ejecutadas – Marzo 2025

QBM2

Interventorías de Obras Eléctricas, Consultorías,
Asesorías, Auditorías, Outsourcing, Estudios Técnicos- Administrativos-Financieros

AP EPM-005-2025

Cartagena de Indias D. T. y C., 11 de Abril de 2025

Señores
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
Atn: Andrés Humberto Higuera Pérez
Profesional Comercial - Unidad Ofertas Gobierno
Cartagena

Asunto: Ajuste de UCAP's ejecutadas – marzo 2025

Tras la revisión y conciliación de cantidades de ucap's ejecutadas durante el mes de marzo 2025, juntamente ingenieros del área operativa de EPM e Interventoría QBM2, nos permitimos informar el valor liquidado: **735 ucap's**, correspondiente a las intervenciones desarrolladas en los barrios y corregimientos tal como se describe en detalle a continuación:

Item	Solicitud	Nombre del Proyecto	Ucap's Ejecutadas
1	329489	Urb. Bicentenario	525
2	1037006	SMI Costado Oriental Jaime Morón	86
3	1037005	SMI Costado Occidental Jaime Moró	124
Subtotal Marzo 2025			**735**

En espera de sus comentarios

Atentamente;

LUIS MIGUEL MEJIA CHAVEZ
Director de Interventoria

Copia: Dra. Gina Patricia Vélez Ortiz - Asesora de Servicios Públicos
Ing. José Adrián Rivera Pérez - Profesional Operaciones Negocios – Unidad Alumbrado
Ing. Diego Alberto Pineda Martínez - Profesional Operaciones Negocios – Unidad Alumbrado
Dra. Melissa M. Franco - Asesora Jurídica QBM2

Canapote Calle 20 de Julio N° 16-37 Cartagena
Teléfonos: 605 65 24 715 Celufijo 310-650-2676
Correo Electrónico: presidencia@qbm2.com

Anexo 28. Comunicación AP-DIS-021-2025: UCAP's Disponibles Para Ejecución Contrato Vigente.

QBM²

Interventorías de Obras Eléctricas, Consultorías,
Asesorías, Auditorías, Outsourcing, Estudios Técnicos- Administrativos-Financieros

AP DIS-021-2025

Cartagena de Indias D.T. y C., 15 de abril de 2025

Señores
SECRETARIA GENERAL
Dra. María Patricia Porras Mendoza
Secretario General
Cartagena

Señores
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
Dr. Andrés Humberto Higuera Pérez
Profesional Comercial – Unidad Ofertas Gobierno
Cartagena

Asunto: Ucap's disponibles a marzo/25 para ejecución

Cordial saludo.

Se informa que, tras la liquidación con corte a marzo 2025, efectuada y expresada oficialmente mediante comunicación AP-EPM-005-2025 (11/04/2025), el avance de ejecución va en el 35% (4.171.6 ucap's). Por lo que invitamos a agilizar las actividades de modernización.
Se cuenta con **7.593,4** ucap's disponibles para modernización hasta el 14 de julio del presente año, lo que es importante considerar en la definición de las prioridades del banco de proyecto existente, requerimientos provenientes de distrito y/o solicitudes de modificación de infraestructura (SMI), que surgen durante el ejercicio operativo.

Ucaps Contractuales 2025	11.426,00	
Remanente de 2024	339,00	
Contratctuales 2025 + remanente 2024	11.765,00	
Ejecutadas enero 2025	1.421,0	
Ejecutadas febrero 2025	**2.015,6**	
Ejecutadas marzo 2025	**735,0**	
Subtotal ucap's ejecutadas	4.171,6	**35%**
Pendintes por Ejecutar	**7.593,4**	**65%**

Promedio ejecución periodo faltante (3 meses)	**2531,1**

Canapote Calle 20 de Julio N° 16-37 Cartagena
Teléfonos: 605 65 24 715 Celufijo 310-650-2676
Correo Electrónico: presidencia@qbm2.com

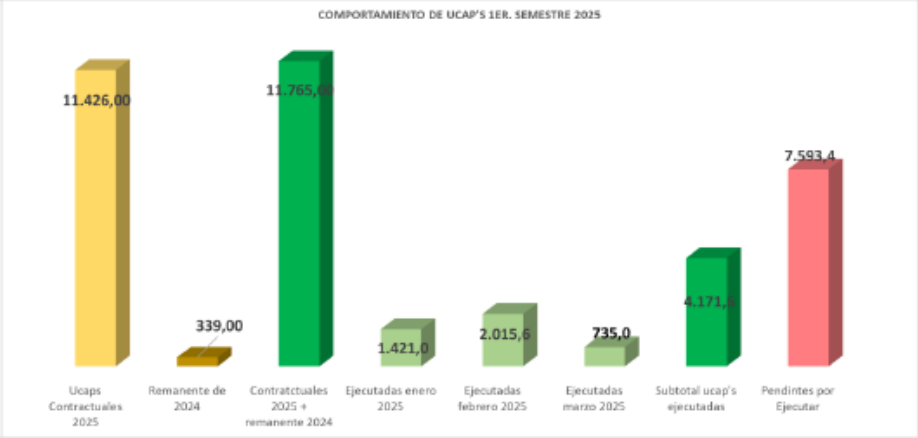


Imagen 1. Avance de ejecución de ucap's en 2.025

Atentamente;

LUIS MIGUEL MEJÍA CHÁVEZ
Director de Interventoría

Proyecto ATCR
Revisó: MFP

Copia: Dra. Gina Patricia Vélez Ortiz — Asesora de Despacho Para Servicios Públicos
Dr. Victor Elias Raad Manjarrez — Asesor Externo
Dra. Candelaria E. Vargas Torres — Asesora Jurídica Externa
Ing. Jesús Adrián Rivero Pérez — Profesional Operaciones Negocios UAP

Anexo 29. Factura FV293687 de EPM - Correspondiente al Mes de Marzo 2025

Factura Electrónica de Venta
Contrato: 12697794
Cliente: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
CC/NIT: 890480184
Dirección: Diagonal 30 30 - 78 Plaza De La Aduana Cartagena
Documento No: 144 7368670

epm 890.904.996-1

$9.350.494.353
Valor total a pagar

Pagar antes de 20 de mayo 2025
Referente de pago 1069014830-72
Ejecución marzo 2025

Valor base de liquidación $ 1.970.477.896
Forma de pago: Contado **Medio de pago:** Otro
Resolución de facturación: 18764063985285 Prefijo:FV Rango del 200.001 al 330.000 18-07-2025 Vigencia: 18 meses
CUFE: b0aab344d5c5900eb7e17145f0c56a4be6a6a9ea26d765e8d9514265588fdad3ce3fd92a6f5cc2840c717e37e7dd1af2
FECHA DE GENERACIÓN: 12/04/2025 14:46

Resumen facturación Abril/2025
Factura Nro. FV293687

Concepto de cobro	Mes anterior		Mes actual	
	Consumo	Valor	Consumo	Valor
Estampilla Años Dorados	0,00	-71.350.005,37	0,00	-39.160.140,09
Estampilla Universidad Cartage	0,00	-35.675.002,68	0,00	-19.580.070,04


Energía	$	
Cuentas vencidas	$	7.487.706..842,00
Otros cobros EPM	$	1.862.787.510,76
Ajuste al peso	$	0,24


Comportamiento histórico de consumos

Mes Consumo	Activa kWh	Exc. Reactiva Inductiva KVarh	Exc. Reactiva Capacitiva kVarth	Días Con Reactiva
Sep-24	,00	,00	,00	0
Oct-24	,00	,00	,00	0
Nov-24	,00	,00	,00	0
Dic-24	,00	,00	,00	0
Ene-25	,00	,00	,00	0
Feb-25	,00	,00	,00	0
Mar-25	,00	,00	,00	0
Activa Promedio	**,00**			

IPP mes actual: 185,65 Variación IPP con relación al mes anterior: -0,09%







Grandes Contribuyentes - Res. 000200 de 27/12/2024 Autorretenedor Renta - Res. 567 de 25/01/2002, excepto por rendimientos financieros de cuentas de ahorro y contratos de mutuo. Autorretenedor ICA Medellín - Res. 33038 de 22/12/2017

Consulta y paga tu factura en línea a través de https://aplicaciones.epm.com.co/facturaweb/#/

Puedes realizar tu aporte voluntario a través de **www.epm.com.co** - Transacciones rápidas - opción: "Aporte Voluntario Comparto mi Energía - Iniciativa Gobierno Nacional".

Contrato 12697794

$9.350.494.353

(415)7707173981008(8020)106901483072(3900)9338023461(96)20250520

Diagonal 30 30 - 78 Plaza De La A - Cartagena De Indias-Bolívar

Servicios De Ingeniería Ener servicio suscrito 130888664
2 Cuenta(s) Vencida(s) : Servicio Suspendido

Información Básica	Valores Facturados	
	Consumo	Valor
Instalación: 900130000010007080 - Diagonal 30 30 - 78 Plaza De La A - Cartagena De Indias-bolivar - Plan: Plan Unico - Categoría: Oficial - Nivel De Tensión: 1 - Genérico: Distrito Turistico Y Cultural De Cartagena De Indias - Consumo Del 01 Mar Al 31 Mar - Días De Consumo: 31	$	
Total Servicios De Ingeniería Ener servicio suscrito 130888664		**$**

Otros Cobros EPM

Descripcion	Servicio	Valor
Mantenimiento alumbrado	Energia	$ 1.053.867.367,2
Montaje	Energia	$ 916.610.529,00
Tasa pro-deporte y recr	Energia	$ -48.950.175,11
Total Otros Cobros EPM		**$ 1.921.527.721,09**



Juntos contribuimos
a la sostenibilidad del medio ambiente
Usa de forma responsable y eficiente la energía eléctrica.
Resolución CREG 123 de 2014

Empresas Públicas de Medellín E.S.P - NIT.890.904.996-1
Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente
Conmutador: (604) 3808080
Medellín- Antioquia

Entidad que nos vigila
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD Número único de registro 4-50010000-1 – www.superservicios.gov.co

Entidades que nos regulan
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA – www.cra.gov.co Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG www.creg.gov.co

Puntos de Pago
Almacenes de Cadena: Almacenes Éxito, Carulla, Surtimax, Jumbo, Metro.
Entidades Bancarias: Bancolombia - Corresponsal Bancario, BBVA, Banco de Bogotá, ScotiaBank Colpatria, Davivienda - Corresponsal Bancario, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular.
Centros de Pago: Gana, PTM, Movilred, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, Winred, Megared, Practi Red Multibanco.
Electrónico: Daviplata, Clvica Pay, Claropay, Nequi, Redeban, ATH, Servibanca.
Cooperativas: Cotrafa, Confiar, Juriscoop, CFA, CooSanluis, CoopSuiya.

Paga en Línea
https://aplicaciones.epm.com.co/facturaweb/#/
pse
App EPM

Puntos de atención
La explicación de los valores contenidos en esta factura se atiende en la línea empresarial 018000 410 115 a nivel nacional o a través de su Ejecutivo de Cuentas asignado. Para consultar un mayor detalle de los cobros facturados lo invitamos a ingresar www.epm.com.co y luego seleccionar "Clientes Corporativos".

Recuerda que puedes pagar tus facturas por medios electrónicos, con cargo a tu cuenta de ahorros o corriente. No tenemos disponible pago con tarjeta de crédito.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales

epm
NIT 890904 996

John Alberto Maya Salazar
Representante legal
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

La presente factura presta merito ejecutivo en virtud del artículo 130 de La ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

Software de facturación: Open SmartFlex Fabricante: OPEN SYSTEMS COLOMBIA S.A.S Nit: 900401714-6

Anexo 30. Certificado De QBM2 A EPM.

Interventorías de Obras Eléctricas Consultorías,
Asesorías, Auditorías, Outsourcing, Estudios Técnicos- Administrativos-Financieros

Cartagena de Indias, 24 de Abril de 2025

Doctora
MARIA PATRICIA PORRAS
Secretaria General
Alcaldía Mayor Cartagena de Indias

ASUNTO: CERTIFICADO DE INTERVENTORIA ALUMBRADO PUBLICO MES MARZO 2025

Apreciada Doctora:

En cumplimiento de nuestra misión contractual: Ejecutar "La interventoría integral del Contrato Interadministrativo 068-2022 que tiene por objeto la administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición, expansión; las actividades de iluminación ornamental y navideña en los espacios públicos y todos los elementos necesarios para la prestación del servicio de alumbrado público del distrito de Cartagena; …" me permito expedir el presente certificado que da fe del cumplimiento de las obligaciones de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. durante el mes de Marzo 2025

Se envió informe general de interventoría en su momento que da cuenta de las actividades desarrolladas por EPM durante el mes de marzo 2025 y se anexan adicionalmente el informe de Ajustes UCAP´S.

Se firma en Cartagena a los 24 días del mes de abril de 2025.

Cordialmente,

WILLIAM MURRA DIAZGRANADOS
Gerente y Representante Legal
QBM2 Ingeniería Electrica S.A.


WILLIAM ROBERTO MOURRA DIAZGRANADOS
Gerente y Representante Legal
QBM2 Ingeniería Eléctrica S.A.
Interventoría Alumbrado Público

Canapote Calle 20 de Julio N° 16-37 Cartagena
Teléfonos: 666 0174- 666 6219 Telefax: 666 0532 Celufijo 310-650-2676
Correo Electrónico: presidencia@qbm2.com

Anexo 31. Indicadores De Gestión De EPM – Marzo 2025

El presente análisis, se realiza con corte al mes de marzo 2025, dado que, para la fecha de entrega del informe, aún no se cierra el reporte del mes de marzo 2025


Contractualmente el nivel de operación del sistema de alumbrado público exigido es del 90%. La eficiencia del sistema se mantiene en un **99.1%**

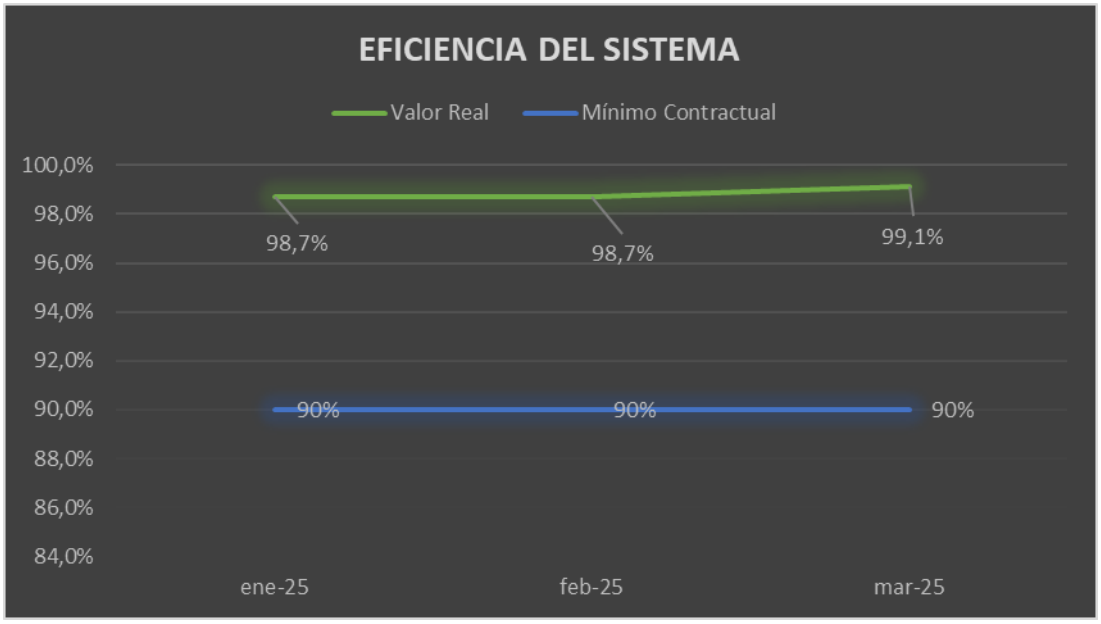

De acuerdo con el reporte de marzo 2.025 aportado por EPM, se generaron **461** órdenes de trabajo durante el mes, resultado de las solicitudes de servicio recibida por los diferentes medios, telefónicos (#376 – línea 018000), comunicaciones de los usuarios directamente a EPM y a través del Distrito.


Ordenes de Trabajo año 2025						
	ene-25	feb-25	mar-25	Promedio Mensual	Acumulado	
24 H	185	290	231	235	706	38%
48 H	179	250	154	194	583	31%
72 H	101	77	44	74	222	12%
<72H	247	92	32	124	371	20%
Acumulado	712	709	461	**627**	**1882**	100%

En marzo 2.025:
El 50% (235) de los reportes se atendieron en 24 horas
El 33.4% (194) se atendieron en 48 horas.
El 9.7% (74) de los reportes se atendieron en 72 horas
El 6.9% (322) mayor a 72 horas, por la complejidad de la intervención.

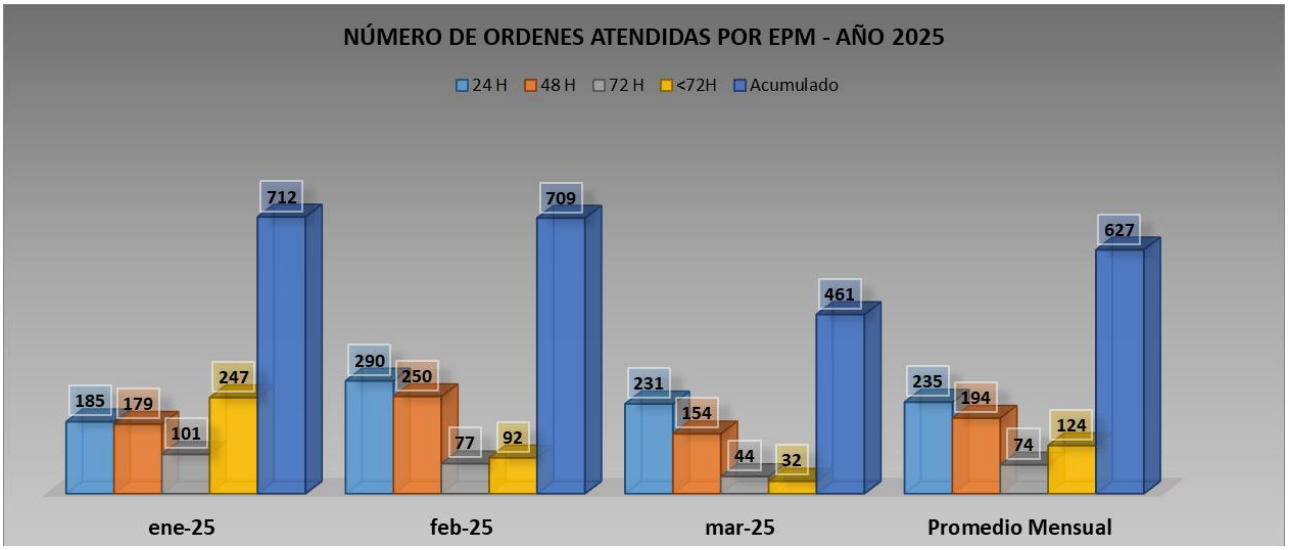


El tiempo de atención de solicitudes se incrementó de 26.1 a 34 horas, pero se disminuyeron las solicitudes en general pasando de 709 a 461 en el mes de marzo 2025.

Mes	**ene-25**	**feb-25**	**mar-25**	**Promedio mensual**
Tiempo (h)	**50**	**26,1**	34	**37**

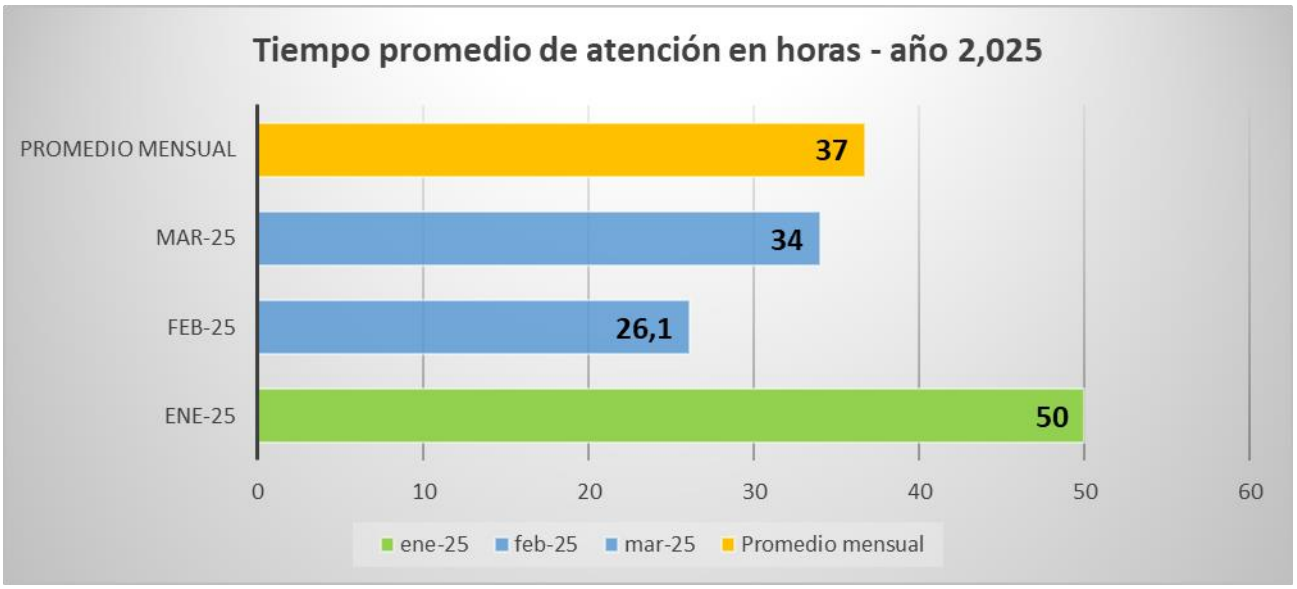

Y en general, la cobertura de atención en el primer trimestre es del 37% en atenciones dentro de las 24 horas.

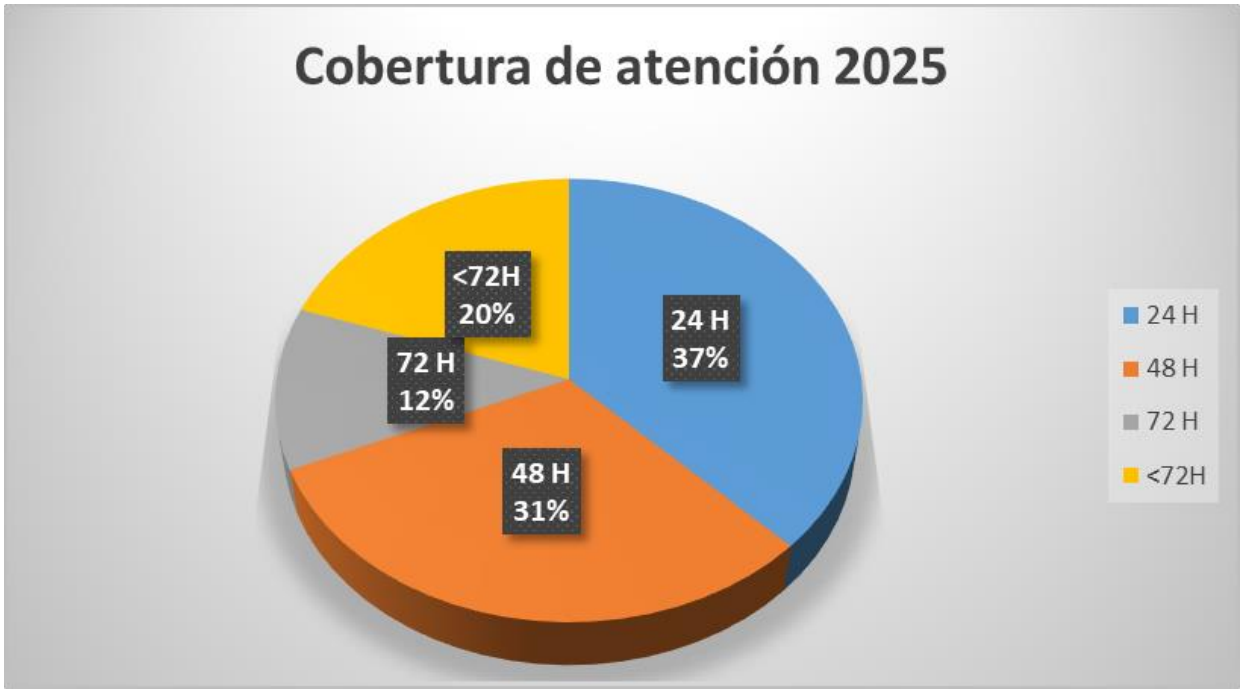
Cobertura de atención 2025
<72H
20%
24 H
37%
72 H
12%
48 H
31%
24 H
48 H
72 H
<72H

Anexo 32. Radicados de Informes Entregados a Distrito**.**

AP-DIS-018-2025

Interventorías de Obras Eléctricas, Consultorías,
Asesorías, Auditorías, Outsourcing, Estudios Técnicos- Administrativos-Financieros

AP DIS-018-2025

Cartagena de Indias D.T. y C., 14 de Abril de 2025

Señores
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA
Atn: Dra. Maria Patricia Porras
Secretaria General
Cartagena

Asunto: Envío Informe de Interventoría Marzo de 2025.

Cordial saludo

El motivo del presente es enviar por medio de la Ventana de Atención Al Cliente y adjunto al mismo, el informe de interventoría (125 Folios) correspondiente al mes de Marzo del año 2025, el cual contiene todo lo concerniente al Alumbrado Público en el Distrito de Cartagena de Indias y sus Corregimientos.

Agradeciendo su colaboración.

LUIS MIGUEL MEJIA CHAVEZ
Director De Interventoría

Copia: Archivos

Canapote Calle 20 de Julio N° 16-37 Cartagena
Teléfonos: 605 65 24 715 Celufijo 310-650-2676
Correo Electrónico: presidencia@qbm2.com

AP DIS-019-2025

Cartagena de Indias D.T. y C., 14 de Marzo de 2025

Señores
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA
Atn: Dra. Maria Patricia Porras
Secretaria General
Cartagena

Asunto: Envío Digital de Informes

Cordial saludo

Adjunto al presente se envían de manera Virtual los siguientes informes:

- Informe de Interventoría correspondientes al mes de Marzo de 2025, el cual fue radicado mediante ventanilla de Atención al usuario el día 14-03-2025 a través de comunicación AP-DIS-018-2025.
- Informe de Supervisión Institucional, Firmado por Interventoría.

Esto con el fin de que se proceda a su revisión y aprobación de los documentos entregados; así como la emisión y envío de la Certificación de Cumplimiento expedida por el supervisor del contrato; de acuerdo con lo establecido en la Cláusula séptima del Contrato de Interventoría de alumbrado Público.

Agradeciendo su colaboración.

LUIS MIGUEL MEJIA CHAVEZ
Director De Interventoría

Copia: Archivos

Anexo 33. Remisión Acta de Censo de Cargas De AP Corte A Marzo 2025

Interventorías de Obras Eléctricas, Consultorías,
Asesorías, Auditorías, Outsourcing, Estudios Técnicos- Administrativos-Financieros

Cartagena de Indias D.T. y C., 25 de abril de 2025

Señores:
CARIBE MAR - AFINIA
Atte.: Dr. Eder Buelvas Cuello
Gerente Territorial Afinia ESP

Asunto: Remisión Acta de Censo de cargas de AP corte a marzo 2025

Cordial saludo.

A continuación, se comparte oficialmente Acta de cargas y energía del sistema de alumbrado público de Cartagena firmada el 16/04/2025, resultado de las revisiones y validaciones de la información aportada por QBM2, correspondiente a la modernización ejecutada por el operador de AP –EPM- de los meses febrero y marzo 2025, acordadas en reunión entre Afinia, Interventoría AP y secretaria general; para la aplicación del nuevo valor de energía a partir de la liquidación del mes de abril 2025

En espera de sus comentarios.

Atentamente;

LUIS MIGUEL MEJÍA CHÁVEZ
Director De Interventoría

Copia: María Patricia Porras Mendoza – secretaria General del Distrito
Gina Patricia Vélez Ortiz – Asesora Servicios Públicos
Marlon Monroy – Afinia - marlon.monroy@afinia.com.co

afinia
Grupo epm

RESUMEN DE POTENCIAS Y DEMANDAS DE LUMINARIAS DE CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

ALIADO COMERCIAL	DEPARTAMENTO: BOLIVAR	FECHA: 16/04/2025
	MUNICIPIO: CARTAGENA	INFORME DE LUMINARIAS DE CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
	CORREGIMIENTO:	

TECNOLOGIA	POTENCIA (Watt)	PERDIDA EN LA REACTANCIA (W)	CANTIDAD DE LUMINARIAS	POTENCIA INSTALADA (W)	POTENCIA INSTALADA (INCLUYENDO REACTANCIA) (W)	DEMANDA PERDIDAS (KW-H-MES)	DEMANDA (SIN REACTANCIA) (KW-H-MES)	DEMANDA (CON REACTANCIA) (KW-H-MES)
MERCURIO	125	12	87	10,875	11,919	376	3,915	4,291
	250	19	0	0	0	0	0	0
	400	22	0	0	0	0	0	0
	500	22	0	0	0	0	0	0
	1000	22	0	0	0	0	0	0
SODIO	26	0	0	0	0	0	0	0
	70	11	1400	98,000	113,400	5,544	35,280	40,824
	100	11	3	300	333	12	108	120
	150	19	1276	191,400	215,644	8,728	68,904	77,632
	250	29	0	0	0	0	0	0
	400	40	0	0	0	0	0	0
	600	70	0	0	0	0	0	0
	1000	100	6	6,000	6,600	216	2,160	2,376
HALÓGENA	40	0	2	80	80	0	29	29
	125	0	0	0	0	0	0	0
	250	0	0	0	0	0	0	0
	300	0	0	0	0	0	0	0
	500	0	0	0	0	0	0	0
	1000	0	0	0	0	0	0	0
	1500	0	0	0	0	0	0	0
MIXTA	125	0	0	0	0	0	0	0
	160	0	0	0	0	0	0	0
	250	0	0	0	0	0	0	0
	400	0	0	0	0	0	0	0
	500	0	0	0	0	0	0	0
INCANDESCENTE	100	0	0	0	0	0	0	0
	150	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	0
	300	0	0	0	0	0	0	0
METAL HALIDE	70	11	15	1,050	1,215	59	378	437
	150	20	73	10,950	12,410	526	3,942	4,468
	175	58	3	525	699	63	189	252
	250	32	602	150,500	169,764	6,935	54,180	61,115
	400	44	912	364,800	404,928	14,446	131,328	145,774
	1000	80	302	302,000	326,160	8,698	108,720	117,418
	1500	0	0	0	0	0	0	0
LED	8,4	0	16	134	134	0	48	48
	20	0	52	1,040	1,040	0	374	374
	17	0	14	236	236	0	86	86
	24	0	22	528	528	0	190	190
	29	0	1	29	29	0	10	10
	30	0	79	2,370	2,370	0	853	853
	31,3	0	8	250	250	0	90	90
	32	0	66	2,112	2,112	0	760	760
	33,6	0	44	1,478	1,478	0	532	532
	36	0	59	2,124	2,124	0	765	765
	40	0	528	21,120	21,120	0	7,603	7,603
	44	0	2968	130,592	130,592	0	47,013	47,013
	45	0	27854	1,253,430	1,253,430	0	451,235	451,235
	47	0	306	14,382	14,382	0	5,178	5,178
	49	0	86	4,214	4,214	0	1,517	1,517
	50	0	8883	444,150	444,150	0	159,894	159,894
	53	0	463	24,539	24,539	0	8,834	8,834
	55	0	543	29,865	29,865	0	10,751	10,751
	56	0	122	6,832	6,832	0	2,460	2,460
	57	0	216	12,312	12,312	0	4,432	4,432
	59	0	26	1,534	1,534	0	552	552
	60	0	66	3,960	3,960	0	1,426	1,426
	64	0	2813	180,032	180,032	0	64,812	64,812
	68	0	296	20,128	20,128	0	7,246	7,246
	70	0	468	32,760	32,760	0	11,794	11,794
	72	0	10	720	720	0	259	259
	74	0	34	2,516	2,516	0	906	906
	75	0	38	2,850	2,850	0	1,026	1,026
	80	0	25	2,000	2,000	0	720	720
	84	0	4	336	336	0	121	121
	90	0	4	360	360	0	130	130
	95	0	5	475	475	0	171	171

afinia
Grupo Epm

RESUMEN DE POTENCIAS Y DEMANDAS DE LUMINARIAS DE CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

ALIADO COMERCIAL	DEPARTAMENTO: BOLIVAR	FECHA: 16/04/2025
	MUNICIPIO: CARTAGENA	INFORME DE LUMINARIAS DE CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
	CORREGIMIENTO:	

TECNOLOGÍA	POTENCIA (Watt)	PERDIDA EN LA REACTANCIA (W)	CANTIDAD DE LUMINARIAS	POTENCIA INSTALADA (W)	POTENCIA INSTALADA (INCLUYENDO REACTANCIA) (W)	DEMANDA PERDIDAS (KW-H-MES)	DEMANDA (SIN REACTANCIA) (KW-H-MES)	DEMANDA (CON REACTANCIA) (KW-H-MES)
LED	99	0	81	8.019	8.019	0	2.887	2.887
	100	0	524	52.400	52.400	0	18.864	18.864
	102	0	0	0	0	0	0	0
	107	0	352	37.664	37.664	0	13.559	13.559
	110	0	5612	617.320	617.320	0	222.235	222.235
	120	0	13	1.560	1.560	0	562	562
	123	0	2	246	246	0	89	89
	128	0	781	99.968	99.968	0	35.988	35.988
	130	0	1	130	130	0	47	47
	134	0	9	1.206	1.206	0	434	434
	140	0	1190	166.600	166.600	0	59.976	59.976
	150	0	1008	151.200	151.200	0	54.432	54.432
	153	0	1	153	153	0	55	55
	165	0	67	11.055	11.055	0	3.980	3.980
	170	0	16	2.720	2.720	0	979	979
	180	0	118	21.240	21.240	0	7.646	7.646
	194	0	387	75.078	75.078	0	27.028	27.028
	200	0	55	11.000	11.000	0	3.960	3.960
	210	0	486	102.060	102.060	0	36.742	36.742
	212	0	209	44.308	44.308	0	15.951	15.951
	217	0	196	42.532	42.532	0	15.312	15.312
	222	0	73	16.206	16.206	0	5.834	5.834
	250	0	28	7.000	7.000	0	2.520	2.520
	291	0	345	100.395	100.395	0	36.142	36.142
	400	0	81	32.400	32.400	0	11.664	11.664
	505	0	78	39.390	39.390	0	14.180	14.180
	TOTALES		62513	4.977.741	5.104.413	45.602	1.791.987	1.837.589

RESUMEN	POTENCIAS Y DEMANDAS
POTENCIA TOTAL (W)	4.977.741
POTENCIA TOTAL - INCLUYÉNDOSE LA REACTANCIA (W)	5.104.413
CONSUMO MENSUAL POR PÉRDIDAS (KW-H-MES)	45.602
PORCENTAJE QUE REPRESENTAN LAS PÉRDIDAS	2%
PORCENTAJE QUE REPRESENTA LA TECNOLOGÍA LED	93%
CONSUMO MENSUAL INCLUIDAS LAS PÉRDIDAS (KW-H-MES)	1.837.589
Consumo de Estadios + Circuitos exclusivos de A.P. Cgena	35.000
Consumo total mensual (KW/MES)	1.872.589

Días	Kwh/mes
30	1.872.589
31	1.935.008
28	1.747.750

ALCALDÍA DE CARTAGENA
NOMBRE: MARIA PATRICIA PORRAS
CARGO: Secretario General Distrito
P/P:

CARIBEMAR S.A.S E.S.P.
NOMBRE: Ing. FRANCISCO VIOLA R
CARGO: Responsable Control de Energía Territorio

Ana T. Cortina R.
INTERVENTORIA: QBM2
NOMBRE: ANA TERESA CORTINA
CARGO: Directora Operativa
Vo.Bo. 16/04/2025

Anexo 34. Trazabilidad de la Energía del Sistema de AP

El cruce de energía más reciente efectuado corresponde al 16/04/2025.


TRAZABILIDAD DE AJUSTES

ITEM	FECHA DE ACTA	Con Corte	Energía (kwh/m) Nivel 1	Por periodo	Luminarias	Conceptos Conciliados	Base de datos utilizados
0	10/06/2019	A inicio de 2021	2.564.283		48.048		
1	27/09/2021	1/09/2021	2.366.548	-8%	48.426	Cargas de Modernización de Marzo a julio 2021	Cuadro Anterior Censo viejo
2	24/06/2022	A Junio 2022	2.265.996	-4%	51.583	Cargas de Modernización de agosto 2021 a abirl 2022 Ingreso la carga de Palmas de Salamancas Descuento de luminarias de Ciudad Jardin, Paseo Peatonal de Castillogrtande, por verificación de medidas Ajustes por Findeter: Cruce de Luminarias Fuera de servicio, Luminarias Solares, Luminarias de la ANI, Ider, Turbaco, Terceros	Se aplico las cantidades del inventario de Findeter
3	25/07/2023	A Julio 2023	2.002.897	-12%	56.618	Cargas Modernizadas abril a Junio 2022 Cargas Modernizadas Junio a Dicimebre 2022 Cargas modernizadas de enero a mayo 2023	Se adicionan las nuevas cargas a cuadro proveniente de junio 2022 (findeter)
4	16/11/2023	A Octubre 2023	1.976.952	-1%	58.822	Cargas Modernizadas junio a octubre 2023	Cuadro ajustado de julio 2023
5	22/12/2023	a noviembre 2023	1.971.639	0%	59.458	Cargas Modernizadas noviembre 2023	Cuadro ajustado de Oct 2023
6	23/02/2024	a dic/2023 y ene/2024	1.936.622	-2%	59.956	Cargas Modernizadas diciembre 2023 Cargas Modernizadas enero 2024	Cuadro ajustado de Nov 2023
7	24/04/2024	a feb/2024 y marzo/2024	1.930.417	0%	60.607	Cargas Modernizadas Febrero y marzo 2024	Cuadro ajustado de feb 2024
8	24/06/2024	abril/2024 y mayo/2024	1.892.938	-2%	61.548	Cargas Modernizadas abril y mayo 2024	Cuadro ajustado de abril 2024
9	21/08/2024	junio/2024 y julio 2024	1.864.313	-1,51%	61.379	Cargas Modernizadas junio y julio 2024	Cuadro ajustado de junio 2024
10	22/10/2024	agosrto/2024 y sept/2024	1.860.412	-0,21%	61.678	Cargas Modernizadas agosto y septiembre 2024	Cuadro ajustado de agosto 2024
11	16/12/2024	oct 2024 y nov 2024	1.861.121	0,04%	61.977	Cargas Modernizadas octubre y noviembre 2024	Cuadro ajustado de octubre 2024
12	28/02/2025	dic/2024 y enero/2025	1.865.059	0,21%	62.148	Cargas Modernizadas diciembre 2024 y enero 2025: Incluida Corredor de carga 2da. Etapa y Vía Policarpa Mandela	Cuadro ajustado dediciembre 2024
13	16/04/2025	febrero/2025 y marzo/2025	1.872.589	0,40%	62513	Cargas Modernizadas febrero y marzo 2025: Incluida Corredor de carga 2da. Etapa y Vía Policarpa Arroz Barato	Cuadro ajustado febrero 2025

Ahorro Kwh/Mes	**691.694,52**
% Ahorro Global desde	**27%**


Desde el 2021, año en el que Cartagena inicio la modernización del sistema de alumbrado público, la ciudad ha incrementado su inventario de 48.048 a 62.513 luminarias, es decir un crecimiento acumulado del 30%, lo que representa un **7,25%** anual promedio

Año	Luminarias	Crecimiento Luminarias
Año 2020	48.048	**30%**
Año 2021	48.626	
Año 2022	51.583	
Año 2023	56.618	
Año 2024	61.977	
Año 2025 (marzo)	62.513	

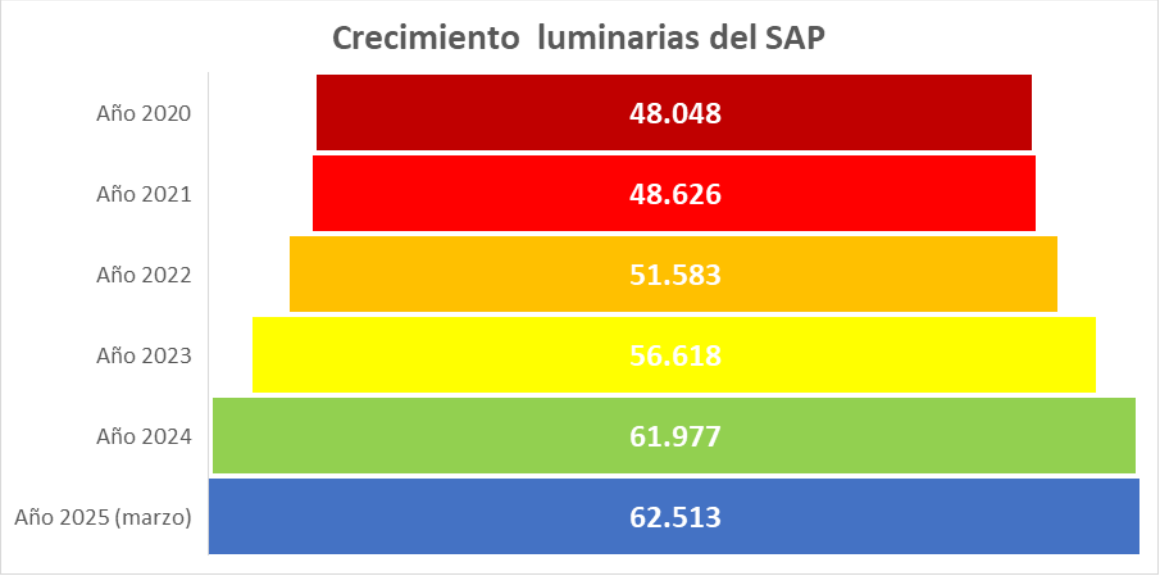


La participación de las tecnologías de luminarias, en el inventario se ha invertido, iniciando este proceso en 2021 con un 93% en sodio alta presión y un 1% en led y 6% en otras tecnologías.

Hoy día marzo 2.025 se invierte totalmente el comportamiento, se tiene que el 93% en tecnología led, un 4% en sodio alta presión y un 3% en otras tecnologías. Y con el avance de la modernización de la ciudad, el porcentaje en led se continúa incrementando.

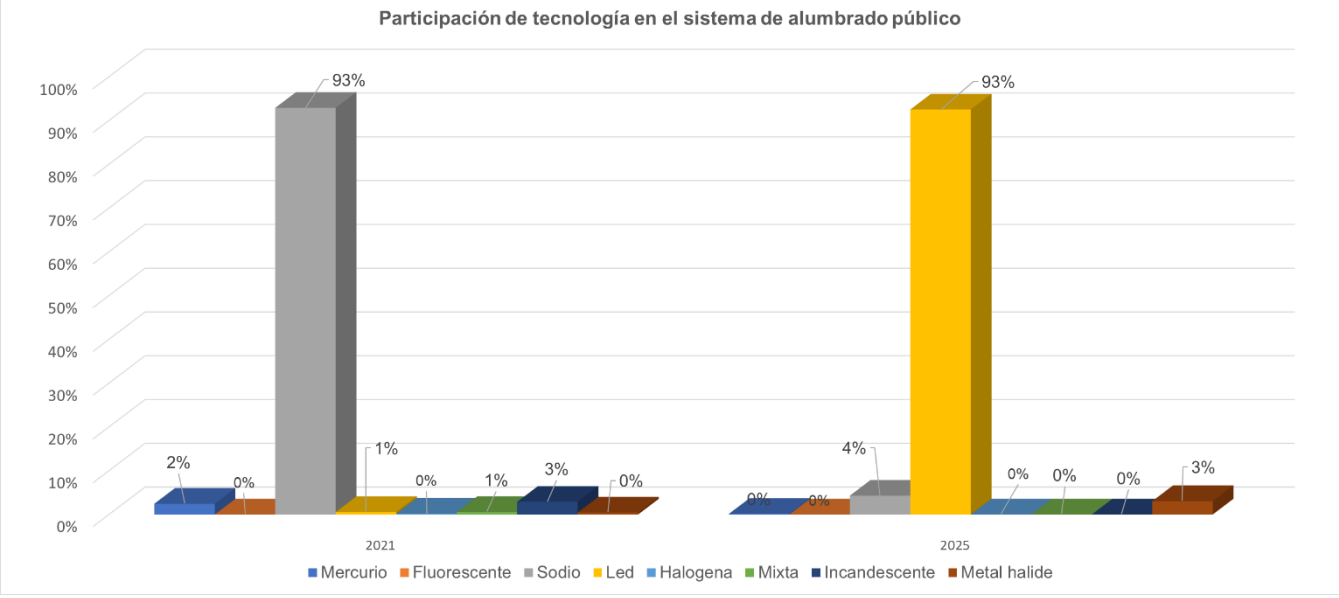

Este cambio tecnológico ha repercutido en una disminución de la energía censada en Nivel 1 del 27%. Pasando el consumo de energía del sistema de alumbrado público del 2.564.283 Kwh/mes a 1.872.589 Kwh/mes.

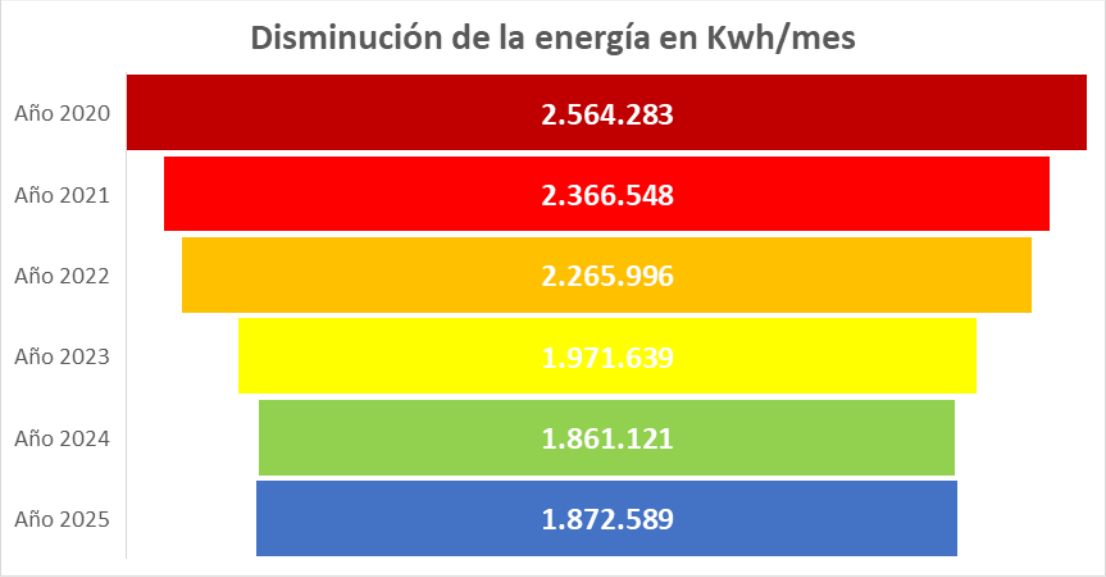

DISMINUCIÓN DE ENERGÍA		
Corte	**Energía (kwh/m) Nivel 1**	**Por periodo**
A inicio de 2021	2.564.283	
sep-21	2.366.548	-8%
A Junio 2022	2.265.996	-4%
A Julio 2023	2.002.897	-12%
A Octubre 2023	1.976.952	-1%
a noviembre 2023	1.971.639	0%
a dic/2023 y ene/2024	1.936.622	-2%
a feb/2024 y marzo/2024	1.930.417	-0,32%
abril/2024 y mayo/2024	1.892.938	-1,94%
junio/2024 y julio 2024	1.864.313	-1,51%
agosto/2024 y sept/2024	1.860.412	-0,21%
octub/2024 y noviem/2024	1.861.121	0,04%
Dicb/2024 y enero 2025	1.865.059	0,21%
febrero/2025 marzo 2025	1.872.589	0,40%
Ahorro Kwh/Mes	**691.695**	
% Ahorro Global desde 2021 a 2024	**27%**	

Todos estos datos, se encuentran sustentados por actas conciliadas con el comercializador de energía, AFINIA, que han sido compartidos en los respectivos informes previos, siendo la más recientemente firmada el 16/04/2025

Anexo 35. Seguridad Social De Interventoría - Planilla Integral – SOI 7968559782

Pago: 22/04/2025

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800008788
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			QBM INGENIERIA ELECTRICA SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	CANAPOTE CALLE 20 DE JULIO	TELÉFONO:	6660174
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7968559782		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/04/22		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1426385034

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	4	$ 2.791.400
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 2.548.100
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	$ 1.095.600
		SUBTOTAL:	11	**$ 6.435.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 385.800
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 343.900
8060083947	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1	$ 198.800
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	$ 662.000
		SUBTOTAL:	11	**$ 1.590.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8904800237	CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	11	$ 1.590.500
		SUBTOTAL:	11	**$ 1.590.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	11	$ 1.210.800
		SUBTOTAL:	11	**$ 1.210.800**

VALOR SIN MORA:	$ 10.826.900
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	$ 10.826.900

2025/04/22 11:15 AM USUARIO: SOI - CC45452595 PÁGINA 1 DE 1

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800008788
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			GBM INGENIERIA ELECTRICA SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	CANAPOTE CALLE 20 DE JULIO #16-37	TELÉFONO:	6660174
TIPO APORTANTE:	31-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		7968559782	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO 2026
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1426385034

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOS	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	23020I-PROTECCION	4	$ 2.716.400	$ 0	$ 0	$ 37.500	$ 37.500	$ 0	$ 0	$ 2.791.400	$ 0	$ 2.791.400
230301	23030I-PORVENIR	3	$ 1.095.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.095.600	$ 0	$ 1.095.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 2.548.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.548.100	$ 0	$ 2.548.100
SUBTOTALES:										**$ 6.456.100**	**$ 0**	**$ 6.456.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 343.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.900	$ 0	$ 0	$ 343.900
EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 198.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 198.800	$ 0	$ 0	$ 198.800
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 662.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 662.000	$ 0	$ 0	$ 662.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 386.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 386.800	$ 0	$ 0	$ 386.800
SUBTOTALES:													**$ 1.590.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.590.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-26	14-26-COLMENA	11		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.210.800	$ 1.210.800	$ 0	$ 0	$ 1.210.800
SUBTOTALES:									**$ 1.210.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.210.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE:		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF05	CCF05-COMFENALCO CARTAGENA	11	$ 1.590.500	$ 0	$ 1.590.500
SUBTOTALES:			**$ 1.590.500**	**$ 0**	**$ 1.590.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

Anexo 36. Informe De Facturación Y Recaudo Del Impuesto De Alumbrado Público Del Mes De Febrero 2025 – Liquidado Por AFINIA (Operador Local)

AFINIA - CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.

JEFATURA TERRITORIAL : BOLIVAR NORTE

LIQUIDACIÓN REMANENTE DE IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO A FAVOR DEL MUNICIPIO: CARTAGENA

NIT: 89048018-4

SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO ENERGÍA CON DESTINO AL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Realizada el: 21/04/2025 Con informes de facturación y recaudo del impuesto correspondientes al mes de: MARZO_2025

Valor facturación del impuesto de alumbrado público CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., del mes de: MARZO_2025	$	3.907.339.026
Ajustes Aplicables:		
Concepto Ajuste:		
TOTAL FACTURACIÓN:		$ 3.907.339.026
Valor recaudado del impuesto de alumbrado público CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., del mes de:MARZO_2025	$	3.353.211.842
Ajustes Aplicables:		
Concepto Ajuste:		
TOTAL RECAUDOS		$ 3.353.211.842
Valor facturación de energía al servicio de alumbrado público municipio de: CARTAGENA	$	1.712.233.420
Correspondiente al consumo de: MARZO_2025 NIC: 4900215		
Ajustes Aplicables:		$ 0
Cuota de convenio:		$ 0
Abono a cartera energía:		$ 0
Otros cargos y/o cuota diferimiento:	$	48.597.658
TOTAL FACTURACIÓN DE ENERGÍA Y OTROS CARGOS		$ 1.760.831.078
VALOR A CRUZAR CON EL RECAUDO DEL IMPUESTO		$ 1.760.831.078

Observacion: LOS CARGOS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y AP ZONA NORTE ASCIENDEN A:

Valor Escenarios Deportivos Cartagena	$ 36.508.020	Alumbrado Público Zona Norte de Cartagena	$ 12.089.638

VALOR A TRASLADAR AL MUNICIPIO / DISTRITO DE: CARTAGENA $ 1.592.380.764

DATOS CUENTA DE GIRO

Nombre y Apellidos: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA CARTAGENA - ALUMBRADO PÚBLICO

Banco: BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta: Ahorros - No 831-80765-6


NIT: 890.480.184-4

Nombre Autorizante: WILLIAM CORONELL NIETO

Cargo: Subgerente Mercadeo y Ventas (e)

MO.00004.EF-FO.05
Ed. 01

Anexo 37. Liquidación De Energía – Abril 2025 (Correspondiente Al Mes De Marzo 2025)

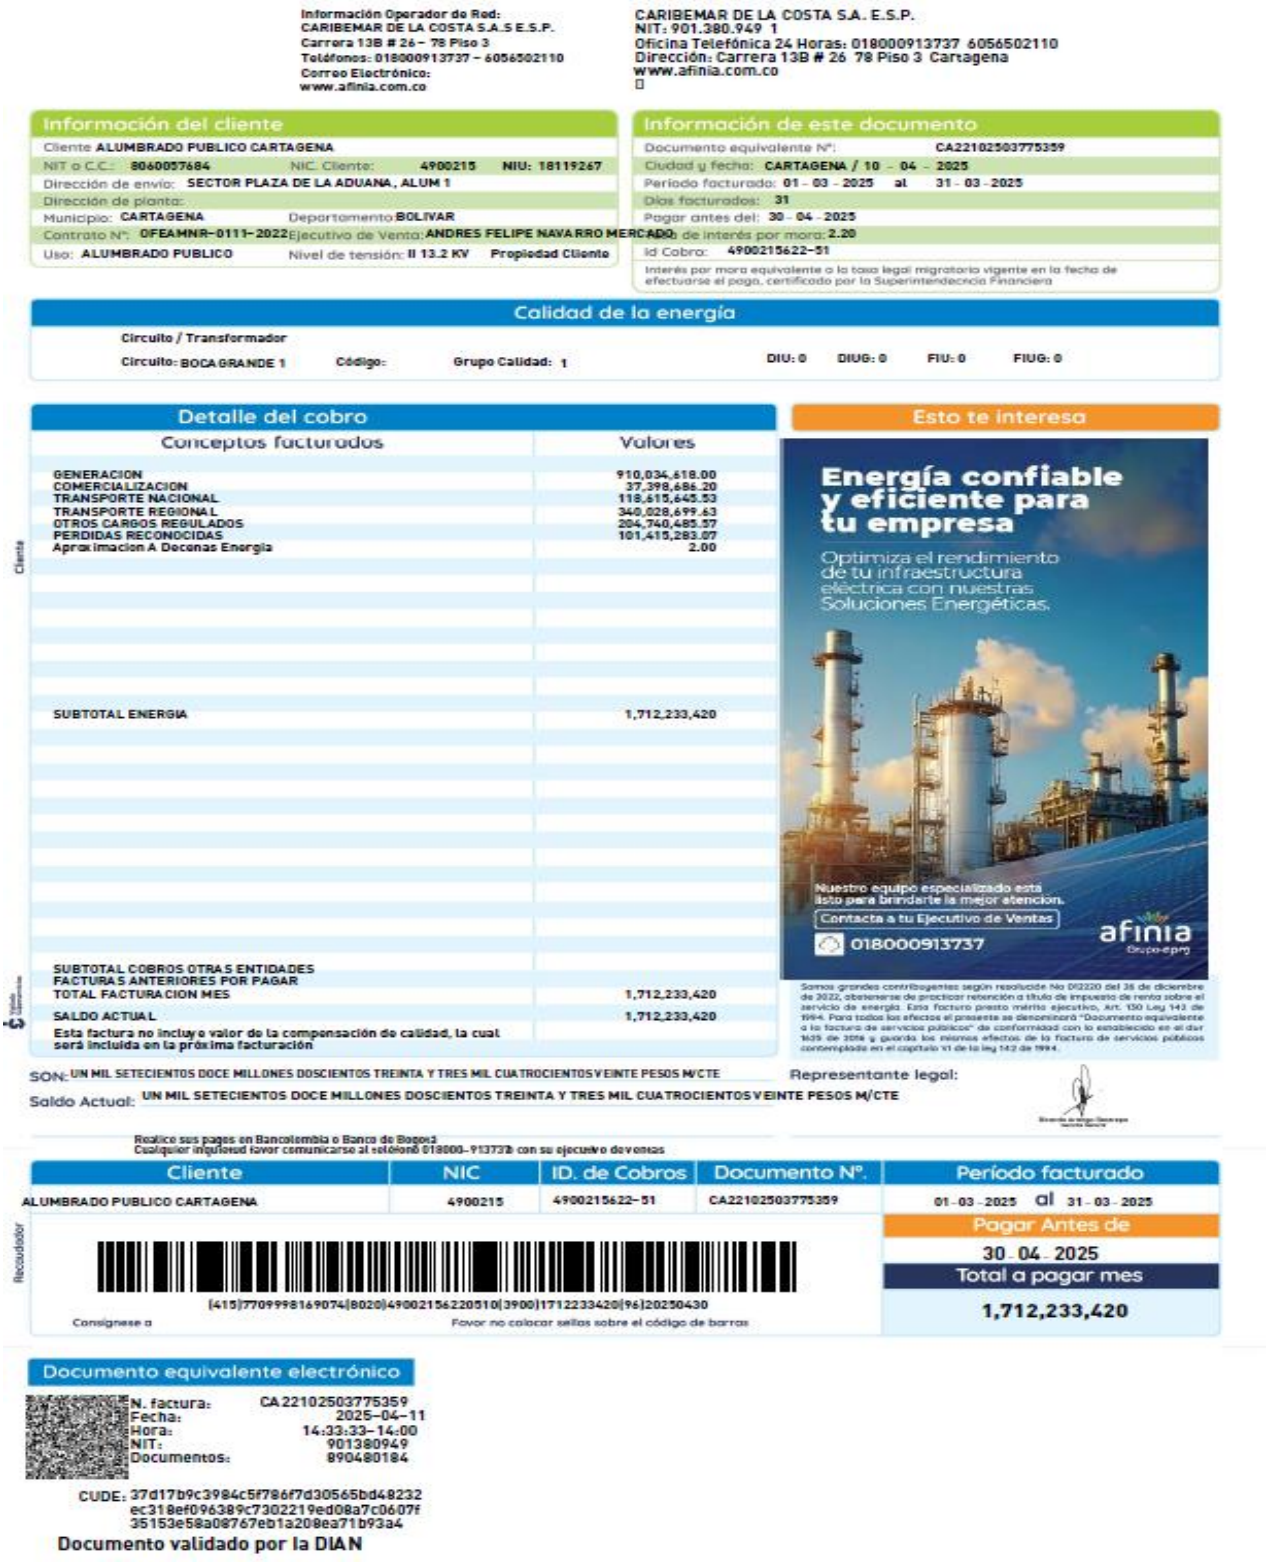

Información Operador de Red:
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.
Carrera 13B # 26 – 78 Piso 3
Teléfonos: 018000913737 – 6056502110
Correo Electrónico:
www.afinia.com.co

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A. E.S.P.
NIT: 901.380.949 1
Oficina Telefónica 24 Horas: 018000913737 6056502110
Dirección: Carrera 13B # 26 78 Piso 3 Cartagena
www.afinia.com.co

Información del cliente

Cliente ALUMBRADO PUBLICO CARTAGENA
NIT o C.C.: 8060057684 NIC Cliente: 4900215 NIU: 18119267
Dirección de envío: SECTOR PLAZA DE LA ADUANA, ALUM 1
Dirección de planta:
Municipio: CARTAGENA Departamento: BOLIVAR
Contrato N°: OFEAMNR-0111-2022 Ejecutivo de Venta: ANDRES FELIPE NAVARRO MERCADO
Uso: ALUMBRADO PUBLICO Nivel de tensión: II 13.2 KV Propiedad Cliente

Información de este documento

Documento equivalente N°: CA22102503775359
Ciudad y fecha: CARTAGENA / 10 - 04 - 2025
Período facturado: 01 - 03 - 2025 al 31 - 03 - 2025
Días facturados: 31
Pagar antes del: 30 - 04 - 2025
Tasa de interés por mora: 2.20
Id Cobro: 4900215622-51
Interés por mora equivalente a la tasa legal migratoria vigente en la fecha de efectuarse el pago, certificado por la Superintendencia Financiera

Calidad de la energía

Circuito / Transformador
Circuito: BOCA GRANDE 1 Código: Grupo Calidad: 1 DIU: 0 DIUG: 0 FIU: 0 FIUG: 0

Detalle del cobro

Conceptos facturados	Valores
GENERACION	910,034,618.00
COMERCIALIZACION	37,398,686.20
TRANSPORTE NACIONAL	118,615,645.53
TRANSPORTE REGIONAL	340,028,699.63
OTROS CARGOS REGULADOS	204,740,485.37
PERDIDAS RECONOCIDAS	101,415,283.07
Aproximacion A Decenas Energia	2.00
SUBTOTAL ENERGIA	1,712,233,420
SUBTOTAL COBROS OTRAS ENTIDADES	
FACTURAS ANTERIORES POR PAGAR	
TOTAL FACTURACION MES	1,712,233,420
SALDO ACTUAL	1,712,233,420

Esta factura no incluye valor de la compensación de calidad, la cual será incluida en la próxima facturación

Esto te interesa

Somos grandes contribuyentes según resolución No DI2220 del 26 de diciembre de 2022, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1994. Para todos los efectos el presente se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dur 1625 de 2016 y gozará los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la ley 142 de 1994.

SON: UN MIL SETECIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Saldo Actual: UN MIL SETECIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Representante legal:

Realice sus pagos en Bancolombia o Banco de Bogotá
Cualquier inquietud favor comunicarse al teléfono 018000-913737 con su ejecutivo de ventas

Cliente	NIC	ID. de Cobros	Documento N°.	Período facturado
ALUMBRADO PUBLICO CARTAGENA	4900215	4900215622-51	CA22102503775359	01-03-2025 al 31-03-2025

Pagar Antes de
30-04-2025

Total a pagar mes
1,712,233,420

(415)7709998169074(8020)4900215622051O(3900)1712233420(96)20250430

Consignese a Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Documento equivalente electrónico

N. factura: CA22102503775359
Fecha: 2025-04-11
Hora: 14:33:33-14:00
NIT: 901380949
Documentos: 890480184

CUDE: 37d17b9c3984c5f786f7d30565bd48232ec318ef096389c7302219ed08a7c0607f35153e58a08767eb1a208ea71b93a4

Documento validado por la DIAN

afinia
Grupo-epm

Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P. NIT. 901.393.949-1

Formato 1: Detalle de documento equivalente

Información del cliente

Cliente:	ALUMBRADO PUBLICO CARTAGENA
NIT o C.C.	8060057684
NIC Cliente:	4900215

Consumos	G = Generación (Liquidación de Energía)				CO = Comercialización				P = Pérdidas (Reconocidas)	
	Contratada a precio fijo				Contratada a precio fijo					
Consumo Energía Activa Nivel de Tensión II 13.2 KV	0 Energía comprada kWh-Mes	Precio contrato actualizado con IPP	Subtotal en pesos G$	Total a pagar generación (G)	Energía comprada kWh-Mes	Precio contrato actualizado con IPP	Subtotal en pesos C$	Total a pagar comercialización (CO)	Tarifa	Total
2,388,224	2,388,224	381.0	910,034,618	910,034,618	2,388,224	15.66	37,398,686	37,398,686	42.46	101,415,283

T=Transporte Nacional			
Franja horaria	Consumo kWh-Mes	Valor del peaje $/kWh	Subtotal a pagar $
Máxima	597,056	60.30	36,001,903
Media	597,056	56.23	33,570,948
Mínima	995,093	49.28	49,042,795
Total Transporte Nacional	2189,205	54.18	118,615,646

D=Transporte Regional			
Franja horaria	Consumo kWh-Mes	Valor del peaje $/kWh	Subtotal a pagar $
Máxima	597,056	142.38	85,007,175
Media	1791,168	142.38	255,021,525
Mínima			
Total Transporte Nacional	2388,224	142.37	340,028,700

O=Otros cargos regulados			
Descripción	Consumo kWh-Mes (generación kWh)	Valor $/kWh	Subtotal a pagar $
Restricciones + Cprog	2,388,224	85.72	204,740,486
Total otros cargos reg.			204,740,486

Contribución	
% de Ley	0.00
G+CO+PxT+D+O	0
Total:	0

R= Cobro Energía Reactiva Inductiva		
Energía Activa kWh	Energía Reactiva Kvarh	Penalización Kvarh Cobrado
2,388,224	0	0
Tarifa por Kvarh:		0.00
Total a pagar por Energía Reactiva Inductiva:		0

Registro Histórico

	Promedio (Últimos 6 meses)	2024 - 10	2024 - 11	2024 - 12	2025 - 01	2025 - 02	2025 - 03
Energía Activa kWh/mes	2,358,378	2,429,978	2,361,593	2,388,226	2,388,225	2,204,026	2,388,224
Energía reactiva kVArh	0	0	0	0	0	0	0
Demanda máxima kW	6,480	6,532	6,532	6,420	6,420	6,560	6,420
Factor de Potencia	1.000						
Factor de Cargo	0.000						
Tarifa promedio sin contribución	716.9						
Tarifa promedio ($/kWh)	716.9						
IPP de Referencia	185.65						

Variable M: Variable dada de acuerdo con las resoluciones CREG 015 de 2018 y CREG 199 de 2019. Podrá variar entre 1 y 12, afectando el valor a pagar por Energía reactiva inductiva y capacitiva.

M= 1

El valor de Otros Cargos Regulados (85.72 $/kWh) incluyo para el Operador de Red: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.
incluyo: RESTRICCIONES: 79,89 $/kWh CPROG: 5,84

