
Id	Item	Nombre de tarea	Duración calendario	Predecesoras	Comienzo	Fin
1		*Inicio Revisión y ajuste de diseños*	*0 días*		*lun 7/07/25*	*lun 7/07/25*
2		*Revisión y ajuste de diseños*	45 días	1	lun 7/07/25	jue 21/08/25
3		*Fin Revisión y ajuste de diseños*	*0 días*	2	*jue 21/08/25*	*jue 21/08/25*
4		**CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CALLE 44 ENTRE LA CARRERA 2DA Y 4TA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA**	**186 días**		**jue 21/08/25**	**lun 23/02/26**
5		*Inicio obra*	0 días	3	jue 21/08/25	jue 21/08/25
6	**1.00**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**7 días**		**jue 21/08/25**	**jue 28/08/25**
7		*Inicio Actividades preliminares*	*0 días*	*5*	*jue 21/08/25*	*jue 21/08/25*
8	1.01	DESMONTE DE CUBIERTA EN ZINC. INCLUYE RETIRO.	6 días	7	vie 22/08/25	jue 28/08/25
9	1.02	DESMONTE, RETIRO DE ESTRUCTURA EN METAL Y/O MADERA EXISTENTES, INCLUYE TRASLADO CARGUE Y DESCARGUE HASTA UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 10 KM.	0 días	8CC	vie 22/08/25	vie 22/08/25
10	1.03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO.	0 días	9	lun 25/08/25	lun 25/08/25
11	1.04	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO (INSTITUCION EDUCATIVA). INCLUYE RETIRO.	0,1 días	10	mar 26/08/25	mar 26/08/25
12	1.05	DESMONTE DE BARANDA EXISTENTE. INCLUYE RETIRO	0,2 días	11	mar 26/08/25	mar 26/08/25
13		*Fin Actividades preliminares*	*0 días*	*8;9;10;11;12*	*jue 28/08/25*	*jue 28/08/25*
14	**2.00**	**ADECUACIÓN DEL TERRENO**	**76 días**		**jue 28/08/25**	**vie 14/11/25**
15		*Inicio Adecuación del terreno*	*0 días*	*13*	*jue 28/08/25*	*jue 28/08/25*
16	2.01	EXCAVACIÓN A MAQUINA	19 días	15	vie 29/08/25	mié 17/09/25
17	2.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	9 días	16CC+6 días	lun 8/09/25	mié 17/09/25
18	2.03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO. INCLUYE TRANSPORTE.	50 días	20	jue 25/09/25	vie 14/11/25
19	2.04	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON PIEDRA RAJON O SIMILAR (ZONA DE JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIO BIOSALUDABLE)	1 días	17	jue 18/09/25	vie 19/09/25
20	2.05	S/I DE GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES (ZONA DE JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIO BIOSALUDABLE)	2 días	19	lun 22/09/25	mié 24/09/25
21		*Fin Adecuación del terreno*	*0 días*	*16;17;18;19;20*	*vie 14/11/25*	*vie 14/11/25*
22	**3.00**	**PLAZOLETAS Y ANDENES**	**38 días**		**vie 14/11/25**	**lun 22/12/25**
23		*Inicio Plazoletas y andenes*	*0 días*	*21*	*vie 14/11/25*	*vie 14/11/25*
24	3.01	CONSTRUCCIÓN BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITU 0.10 X 0.30 M. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, ACERO DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	34 días	23	mar 18/11/25	lun 22/12/25
25	3.02	ACABADO DE PISO CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO RECTANGULAR TRÁFICO LIVIANO DE 0,20 M X 0,10 M X 0,06 M COLOR GRIS. INCLUYE ARENA H =5 CM, JUNTAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	22 días	24CC	mar 18/11/25	mié 10/12/25
26	3.03	ACABADO DE PISO CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO RECTANGULAR TRÁFICO LIVIANO DE 0,20 M X 0,10 M X 0,06 M COLOR AMARILLO. INCLUYE ARENA H =5 CM, JUNTAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	13 días	25CC	mar 18/11/25	lun 1/12/25
27	3.04	ACABADO DE PISO EN BLOQUE PREFABRICADO EN CONCRETO RECTANGULAR (GRAMOQUIN) ESPESOR 6CM, COLOR GRIS. INCLUYE ARENA H.=5 CM. JUNTAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	6 días	26CC	mar 18/11/25	lun 24/11/25
28	3.05	S/I ADOQUIN GUÍA PREF. EN CONCRETO DE 0.20M X 0.06M COLOR AMARILLO TEXTURA RANURADA (UNA HILERA) CON MORTERO 1:3, INCLUYE ARENA H=4 CM. NIVELADO, SELECCIONADO Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA	14 días	24CC	mar 18/11/25	mar 2/12/25
29	3.06	S/I FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUIN PREF. EN CONCRETO DE 0.20M X 0.10M X 0.06M COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APANELADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:3, ARENA H=4 CM, INSTALACION, COMPACTACION Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA	16 días	28CC	mar 18/11/25	jue 4/12/25
30		*Fin Plazoletas y andenes*	*0 días*	*24;25;26;27;28;2*	lun 22/12/25	lun 22/12/25
31	**4.00**	**PAISAJISMO**	**20 días**		**mar 3/02/26**	**lun 23/02/26**
32		*Inicio Paisajismo*	*0 días*	*50*	*mar 3/02/26*	*mar 3/02/26*
33	4.01	EMPRADIZACION TAPETE GRAMA SOICIA JAPONICA - INCLUYE ADECUACIÓN TERRENO ABONO CON TIERRA NEGRA Y/O ALUVIÓN.	20 días	32	mar 3/02/26	lun 23/02/26
34		*Fin Paisajismo*	*0 días*	*33*	*lun 23/02/26*	*lun 23/02/26*
35	**5.00**	**MOBILIARIO**	**20 días**		**mié 14/01/26**	**mar 3/02/26**
36		*Inicio Mobiliario*	*0 días*	*51;66;80*	*mié 14/01/26*	*mié 14/01/26*
37	5.01	S/I CESTA PARA BASURA, CAP. 50 LTRS, FABRICADA EN POLIETILENO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD COLOREADO EN MASA Y PROTECCION UV. ALTA RESISTENCIA A GOLPES, VANDALISMO, ABRASIÓN, PERCOLADOS, LIXIVIADOS O SOLUCIONES ALCALINAS. INCLUYE CUERPO, TAPA, SOPORTE Y TO	1 días	36	mié 14/01/26	jue 15/01/26
38	5.02	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	14 días	37CC	mié 14/01/26	mié 28/01/26
39	5.03	S/I BANCA SIN ESPALDAR. ELABORADA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, EN SUPERFICIE DE GRANITO PULIDO	8 días	38CC	mié 14/01/26	jue 22/01/26
40	5.04	S/I DE AVISOS GENERALES SEGÚN DISEÑO	6 días	39CC	mié 14/01/26	mar 20/01/26
41	5.05	S/I DE AVISOS CÍVICOS SEGÚN DISEÑO	8 días	40CC	mié 14/01/26	jue 22/01/26
42	5.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE DE 5 ELEMENTOS	0,2 días	41CC	mié 14/01/26	mié 14/01/26
43	5.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO MULTIFUNCIONAL. DIMENSIONES 7x5.20x2.70M. CON CAPACIDAD PARA 14 NIÑOS. EDAD 5-12 AÑOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	2 días	42CC	mié 14/01/26	vie 16/01/26
44	5.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALADOR. DIMENSIONES 3.5x3.11x1.94M. CON CAPACIDAD PARA 8 NIÑOS. EDAD: 3-14 AÑOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	2 días	43CC	mié 14/01/26	vie 16/01/26
45	5.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMPIO NIDO MARIPOSAS. DIMENSIONES 1x2.9x1.7M CON CAPACIDAD PARA 7 NIÑOS. EDAD 3-12 AÑOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	2 días	44CC	mié 14/01/26	vie 16/01/26
46	5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALTARIN EN FORMA DE CABALLO. DIMENSIONES 0.82x0.21x0.75M CON CAPACIDAD PARA 1 NIÑO. EDAD 1-12 AÑOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	6 días	45CC	mié 14/01/26	mar 20/01/26
47	5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA CALISTENIA AL AIRE LIBRE DE 2 ELEMENTOS	2 días	46CC	mié 14/01/26	vie 16/01/26
48	5.12	S/I DE BARANDA METALICA DE PROTECCION PARA ZONA DE JUEGOS INFANTILES Y ZONA DE	20 días	47CC	mié 14/01/26	mar 3/02/26
49	5.13	S/I DE BARANDA DE PROTECCION VIAL, CONFORMADA POR COLUMNA IPE 120, ELEMENTOS METALICOS DE EMPOTRAMIENTO, PINTURA EN ESMALTE COLOR AMARILLO, SOLDADURA, TUBO HORIZONTAL DE 2 1/2" X 2 MM Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	16 días	48CC	mié 14/01/26	vie 30/01/26
50		*Fin Mobiliario*	*0 días*	*37;38;39;40;41;4*	*mar 3/02/26*	*mar 3/02/26*
51	**6.00**	**PLACA EN CONCRETO PARA JUEGOS INFANTILES**	**52 días**		**vie 14/11/25**	**lun 5/01/26**
52		*Inicio Placa en concreto para juegos infantiles*	*0 días*	*21*	*vie 14/11/25*	*vie 14/11/25*
53	6.01	PLACA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0.10MT, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, JUNTA DILATACIÓN Y	13 días	52	mar 18/11/25	lun 1/12/25
54	6.02	RECUBRIMIENTO SINTÉTICO PARA PISO EN RESINAS 100% ACRÍLICAS, INCLUYE LAVADO CON ACIDO FOSFÓRICO, CAPA IMPRIMANTE SINTÉTICA ACRILICA CON ARENILLA DE CUARZO Y CAPA DE SELLADO SINTETICA ACRILICA Y LATEX, COLOR PROTECTOR RESISTENTE A FACTORES AMBIENTALES Y AL	16 días	53	mar 2/12/25	jue 18/12/25
55	6.03	S/I DE SUPERFICIE AMORTIGUADORA DE IMPACTOS FABRICADA IN SITIO. ACABADO EN CAUCHO ACABADO EN COLOR ESPESOR 1CM Y CAPA DE RELLENO EN SDR 11 CM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	17 días	54	vie 19/12/25	lun 5/01/26
56		*Fin Placa en concreto para juegos infantiles*	*0 días*	*53;54;55*	*lun 5/01/26*	*lun 5/01/26*
57	**7.00**	**ESTRUCTURA BIOSALUDABLE**	**34 días**		**vie 14/11/25**	**jue 18/12/25**
58		*Inicio Estructura biosaludable*	*0 días*	*21*	*vie 14/11/25*	*vie 14/11/25*
59	7.01	PLACA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0.10MT, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, JUNTA DILATACIÓN Y	14 días	58	mar 18/11/25	mar 2/12/25
60	7.02	RECUBRIMIENTO SINTÉTICO PARA PISO EN RESINAS 100% ACRÍLICAS, INCLUYE LAVADO CON ACIDO FOSFÓRICO, CAPA IMPRIMANTE SINTÉTICA ACRILICA CON ARENILLA DE CUARZO Y CAPA DE SELLADO SINTETICA ACRILICA Y LATEX, COLOR PROTECTOR RESISTENTE A FACTORES AMBIENTALES Y AL	15 días	59	mié 3/12/25	jue 18/12/25
61		*Fin Estructura biosaludable*	*0 días*	*59;60*	*jue 18/12/25*	*jue 18/12/25*
62	**8.00**	**ESTRUCTURAS CALISTENIA**	**26 días**		**vie 14/11/25**	**mié 10/12/25**
63		*Inicio Estructuras calistenia*	*0 días*	*21*	*vie 14/11/25*	*vie 14/11/25*
64	8.01	PLACA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0.10MT, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, JUNTA DILATACIÓN Y	10 días	63	mar 18/11/25	vie 28/11/25
65	8.02	RECUBRIMIENTO SINTÉTICO PARA PISO EN RESINAS 100% ACRÍLICAS, INCLUYE LAVADO CON ACIDO FOSFÓRICO, CAPA IMPRIMANTE SINTÉTICA ACRILICA CON ARENILLA DE CUARZO Y CAPA DE SELLADO SINTETICA ACRILICA Y LATEX, COLOR PROTECTOR RESISTENTE A FACTORES AMBIENTALES Y AL	9 días	64	lun 1/12/25	mié 10/12/25
66		*Fin Estructuras calistenia*	*0 días*	*64;65*	*mié 10/12/25*	*mié 10/12/25*
67	**9.00**	**ESTRUCTURA POMPEYANOS**	**61 días**		**vie 14/11/25**	**mié 14/01/26**
68		*Inicio Estructura pompeyanos*	*0 días*	*21*	*vie 14/11/25*	*vie 14/11/25*
69	9.01	DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS HASTA E=0,25 M. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL NO	1 días	68	mar 18/11/25	mié 19/11/25
70	9.02	EXCAVACION A MAQUINA	1 días	69	jue 20/11/25	vie 21/11/25
71	9.03	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O	0,3 días	70	vie 21/11/25	vie 21/11/25
72	9.04	S/I DE GEOTEXTIL NT 2.500 PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	3 días	71	vie 21/11/25	lun 24/11/25
73	9.05	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG	1 días	72	lun 24/11/25	mar 25/11/25
74	9.06	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO. INCLUYE TRANSPORTE.	3 días	73CC	lun 24/11/25	jue 27/11/25
75	9.07	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 38 PARA POMPEYANO	35 días	76CC+5 días	jue 4/12/25	jue 8/01/26
76	9.08	ACERO DE REFUERZO Fy= 420 Mpa	42 días	74	jue 27/11/25	jue 8/01/26
77	9.09	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	4 días	70	vie 21/11/25	mar 25/11/25
78	9.10	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRORREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	1 días	79CC	jue 8/01/26	vie 9/01/26
79	9.11	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2 (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	6 días	75	jue 8/01/26	mié 14/01/26
80		*Fin Estructura pompeyanos*	*0 días*	*69;70;71;72;73;7*	*mié 14/01/26*	*mié 14/01/26*
81	**10.00**	**OBRAS DE DRENAJE**	**41 días**		**jue 28/08/25**	**mié 8/10/25**
82		*Inicio Obras de drenaje*	*0 días*	*13*	*jue 28/08/25*	*jue 28/08/25*
83	10.01	EXCAVACION MANUAL	14 días	82	vie 29/08/25	vie 12/09/25
84	10.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	0,3 días	83	vie 12/09/25	vie 12/09/25
85	10.03	S/I DE GEOTEXTIL NT 2.500 PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	3 días	84	vie 12/09/25	lun 15/09/25
86	10.04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO. INCLUYE TRANSPORTE.	7 días	85	lun 15/09/25	lun 22/09/25
87	10.05	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	9 días	86	lun 22/09/25	mié 1/10/25
88	10.06	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA CLASE C (MURO	4 días	89	vie 26/09/25	mar 30/09/25
89	10.07	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA CLASE C (LOSA INFERIOR)	4 días	87CC	lun 22/09/25	vie 26/09/25
90	10.08	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA CLASE C (LOSA SUPERIOR)	3 días	88	mar 30/09/25	vie 3/10/25
91	10.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS EN CONCRETO TIPO CARCAMO. DIMENSIONES	5 días	90	vie 3/10/25	mié 8/10/25
92		*Fin Obras de drenaje*	*0 días*	*83;84;85;86;87;8*	*mié 8/10/25*	*mié 8/10/25*
93	**11.00**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y PUESTA A TIERRA**	**120 días**		**jue 28/08/25**	**vie 26/12/25**
94		*Inicio Instalaciones eléctricas y puesta a tierra*	*0 días*	*13*	*jue 28/08/25*	*jue 28/08/25*
95	11.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO SUBTERRANEO 2xNo.1-1/2", INCLUYE EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	52 días	94	vie 29/08/25	lun 20/10/25
96	11.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDESTAL EN CONCRETO DE 0,30x0,30x0,60 METROS PARA POSTE METALICO DE BRAZO SENCILLO Y BRAZO DOBLE, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	19 días	95CC	vie 29/08/25	mié 17/09/25
97	11.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA COOPER WELD DE 2.4 METROS POR 5/8". INCLUYE SOLDADURA EXOTÉRMICA, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	25 días	96CC	vie 29/08/25	mar 23/09/25
98	11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO EXTERIOR PARA FIJACION EN PARED CON PROTECCIONES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	5 días	97	mié 24/09/25	lun 29/09/25
99	11.11	MEDIDOR DE ENERGIA TIPO DIRECTA A 220 V Y CAJA DE POLICARBONATO	0 días	98	mar 30/09/25	mar 30/09/25
100	11.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION PARA CIRCUITOS DE ILUMINACION PEATONAL EN CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 EN 2xNo.6F + 1xNo.6T AWG. OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	41 días	95	mar 21/10/25	lun 1/12/25
101	11.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA EN CABLE ENCAUCHETADO 4xNo.14 AWG. OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	21 días	100CC	mar 21/10/25	mar 11/11/25
102	11.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DE 0,40x0,40x0,60 METROS. OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	50 días	101CC	mar 21/10/25	mié 10/12/25



Id	Item	Nombre de tarea	Duración calendario	Predecesoras	Comienzo	Fin
103	11.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DE 0.60x0.60x0.60 METROS, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	9 días	102CC	mar 21/10/25	jue 30/10/25
104	11.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE METÁLICO DE 4.5 METROS GALVANIZADO Y PINTADO AL CALOR, CON BRAZO SENCILLO ESPACIO PARA LUMINARIA, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	22 días	96	jue 18/09/25	vie 10/10/25
105	11.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED REF MOPANELEDS, 23, IP66, IK09, Modulo led de , de 40w, 3000k, 120-277V, driver electrónico multivoltaje, 4000k, 120-277V, driver electrónico multivolta, , BFC-7PINES-Poste cónicos de 9mts galvanizado y pintado	24 días	100;101	mar 2/12/25	vie 26/12/25
106		*Fin Instalaciones eléctricas y puesta a tierra*	*0 días*	*105*	*vie 26/12/25*	*vie 26/12/25*
107		**OBRA HIDRAULICA**	**169 días**		**jue 21/08/25**	**vie 6/02/26**
108		*Inicio Obra hidraulica*	*0 días*	*SCC*	*jue 21/08/25*	*jue 21/08/25*
109	**12.00**	**PRELIMINARES**	**16 días**		**jue 21/08/25**	**lun 8/09/25**
110		*Inicio Preliminares*	*0 días*	*7*	*jue 21/08/25*	*jue 21/08/25*
111	12.01	MANEJO DE CAUCE DE AGUA CANAL	5 días	110	vie 22/08/25	mié 27/08/25
112	12.02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS. INCLUYE RETIRO	8 días	111	jue 28/08/25	vie 5/09/25
113	12.03	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO	11 días	112CC	jue 28/08/25	lun 8/09/25
114		*Fin Preliminares*	*0 días*	*111;112;113*	*lun 8/09/25*	*lun 8/09/25*
115	**13.00**	**EXCAVACIONES Y CIMIENTOS**	**99 días**		**lun 8/09/25**	**mar 16/12/25**
116		*Inicio Excavaciones y cimientos*	*0 días*	*114*	*lun 8/09/25*	*lun 8/09/25*
117	13.01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA (A MAQUINA)	9 días	116	mar 9/09/25	jue 18/09/25
118	13.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	7 días	117CC+10 días	mar 23/09/25	mar 30/09/25
119	13.03	SI DE GEOTEXTIL NT 2.500 PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	5 días	120	vie 3/10/25	mié 8/10/25
120	13.04	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	1 días	118	mié 1/10/25	jue 2/10/25
121	13.05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO. INCLUYE TRANSPORTE.	20 días	119	jue 9/10/25	mié 29/10/25
122	13.06	SOLADO CONCRETO DE 14 Mpa	14 días	121	jue 30/10/25	jue 13/11/25
123	13.07	SI DE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN MADERA)	32 días	122	vie 14/11/25	mar 16/12/25
124		*Fin Excavaciones y cimientos*	*0 días*	*123*	*mar 16/12/25*	*mar 16/12/25*
125	**14.00**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**52 días**		**mar 16/12/25**	**vie 6/02/26**
126		*Inicio Estructuras en concreto*	*0 días*	*124*	*mar 16/12/25*	*mar 16/12/25*
127	14.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	28 días	128CC	mié 17/12/25	mié 14/01/26
128	14.02	TUBERIA PVC 3/4" PARA CONTROL DE SUPRESION EN LAS PAREDES DEL CANAL	14 días	126	mié 17/12/25	mié 31/12/25
129	14.01	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA. PARA BOX COULVERT, PAREDES, FONDO Y TAPA DE CANAL	21 días	127CC+10 días;128	vie 2/01/26	vie 23/01/26
130	14.04	JUNTA CON CORTE A MAQUINA Y SELLO PLASTICO NO ADHERENTE DE POLIETILENO (9MM DE DIAMETRO +/- 1.5MM). JUNTA SELLADA CON MASILLA DE POLIURETANO MONO COMPONENTE DE BAJO MODELO DE CAPACIDAD DE ELONGACION.	5 días	129CC	vie 2/01/26	mié 7/01/26
131	14.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METALICAS PARA SUMIDEROS. SIN PLATINA DE 2" POR 1/4 PARA CONTRAMARCO Y MARCO EN PLATINA DE 2 1/2" POR 1/4.	1 días	129	lun 26/01/26	mar 27/01/26
132	14.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS METÁLICAS de 2' x 2' x 1/4", LÁMINA DE 2"X1/4" Y ÁNGULO PARA ANCLAJE DE 60mm X60mmx1/4"	10 días	131CC	lun 26/01/26	jue 5/02/26
133	14.07	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	11 días	132CC	lun 26/01/26	vie 6/02/26
134	14.08	JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	12 días	129CC	vie 2/01/26	mié 14/01/26
135		*Fin Estructuras en concreto*	*0 días*	*133*	*vie 6/02/26*	*vie 6/02/26*
136	**15.00**	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**16 días**		**lun 8/09/25**	**mié 24/09/25**
137		*Inicio Obras complementarias*	*0 días*	*114*	*lun 8/09/25*	*lun 8/09/25*
138	15.01	LIMPIEZA MANUAL DE CANAL Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL LECHO - BORDE CANAL - CAMION Y DISPOSICIÓN FINAL)	15 días	137	mar 9/09/25	mié 24/09/25
139		*Fin Obras complementarias*	*0 días*	*138*	*mié 24/09/25*	*mié 24/09/25*
140	**16.00**	**COMPONENTE FORESTAL**	**49 días**		**jue 21/08/25**	**jue 9/10/25**
141		*Inicio Componente forestal*	*0 días*	*7*	*jue 21/08/25*	*jue 21/08/25*
142	16.01	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE	0 días	141	vie 22/08/25	vie 22/08/25
143	16.02	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	7 días	142	lun 25/08/25	lun 1/09/25
144	16.03	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	3 días	143CC	lun 25/08/25	jue 28/08/25
145	16.04	SUMINISTROS Y SIEMBRA DE ÁRBOLES FRUTALES DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGÁNICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	37 días	143;144	mar 2/09/25	jue 9/10/25
146		*Fin Componente forestal*	*0 días*	*145*	*jue 9/10/25*	*jue 9/10/25*
147		*Fin Obra hidraulica*	*0 días*	*135*	*vie 6/02/26*	*vie 6/02/26*
148		*Fin Obra*	*0 días*	*13;21;30;34;50;5*	*lun 23/02/26*	*lun 23/02/26*

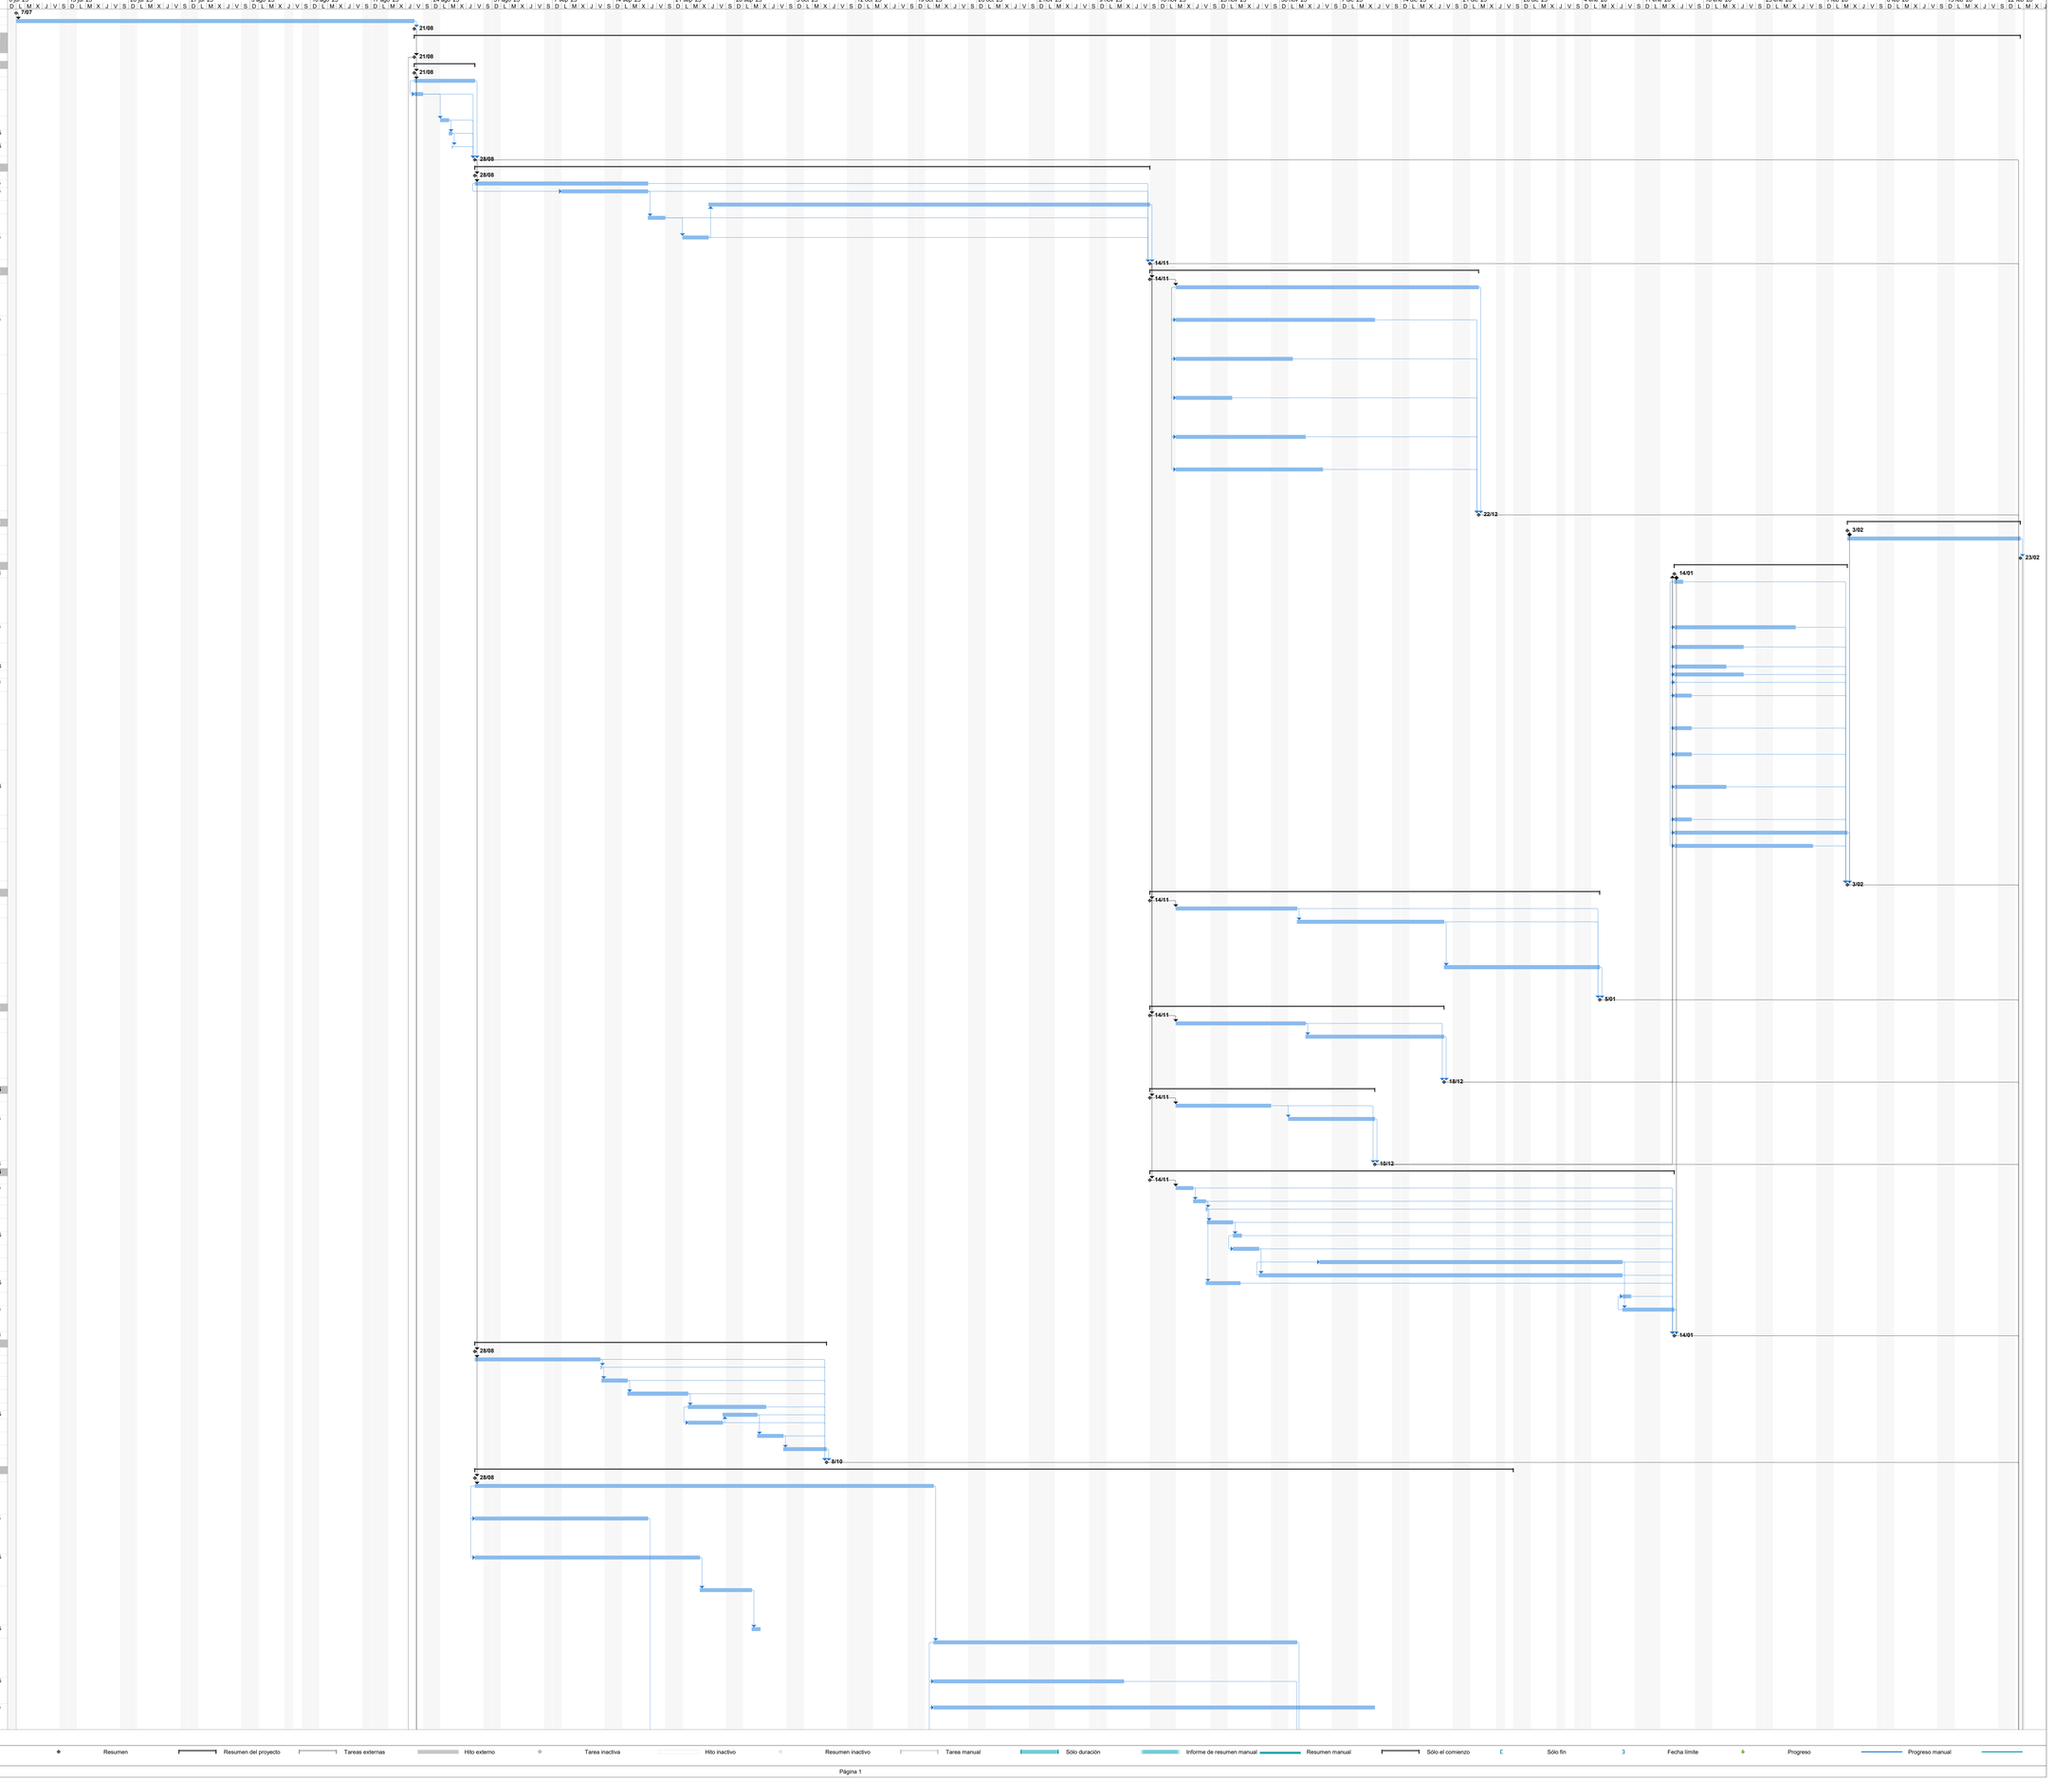
