INFORME FINAL CONTRATO 2401 DE 2024

ENTIDAD CONTRATANTE	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
CONTRATISTA	COLOMBIA CONSTRUCIONES Y DISEÑOS SAS
VALOR DEL CONTRATO	**$ 763.425.604**
FECHA DE ACTA DE INICIO	01 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DICIEMBRE 31 DE 2024
PLAZO SEGÚN PRORROGA 1 AL CONTRATO	FEBRERO 15 DE 2025
VALOR ADICION 1 AL CONTRATO	**$363.014.839**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDA ADICION	**$1.126.440.443**
PLAZO FINAL DEL CONTRATO SEGÚN ADICION Y PRORROGA	12 DE MARZO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING. JACQUELINE GUZMAN HERAZO


OBJETO DEL CONTRATO:

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR POR AGRUPACIONES” AGRUP 1

SEDES A INTERVENIR : INCLUIDA ADICON

No	REGIONAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRRECCIÓN
1	CENTRO	BOYACA	DUITAMA	Carrera 19 No. 16 – 33
2			EL COCUY	Calle 7 No. 3 - 47, Barrio Nueva Granada
3			MONIQUIRA	Calle 20 No. 5 - 57 / 4-91
4			CHIQUINQUIRA	CL 16 # 12-48-52
5	ORINOQUIA	META	ACACIAS	Calle 14 No. 15 - 17
6	CENTRO	HUILA	PITALITO	CRA 2 Y 3 # CALLE 15 Y 17
7	PACIFICO	CHOCÓ	NUQUI	BARRIO SANTANDER

CRONOGRAMA PRELIMINAR DEL CONTRATO:

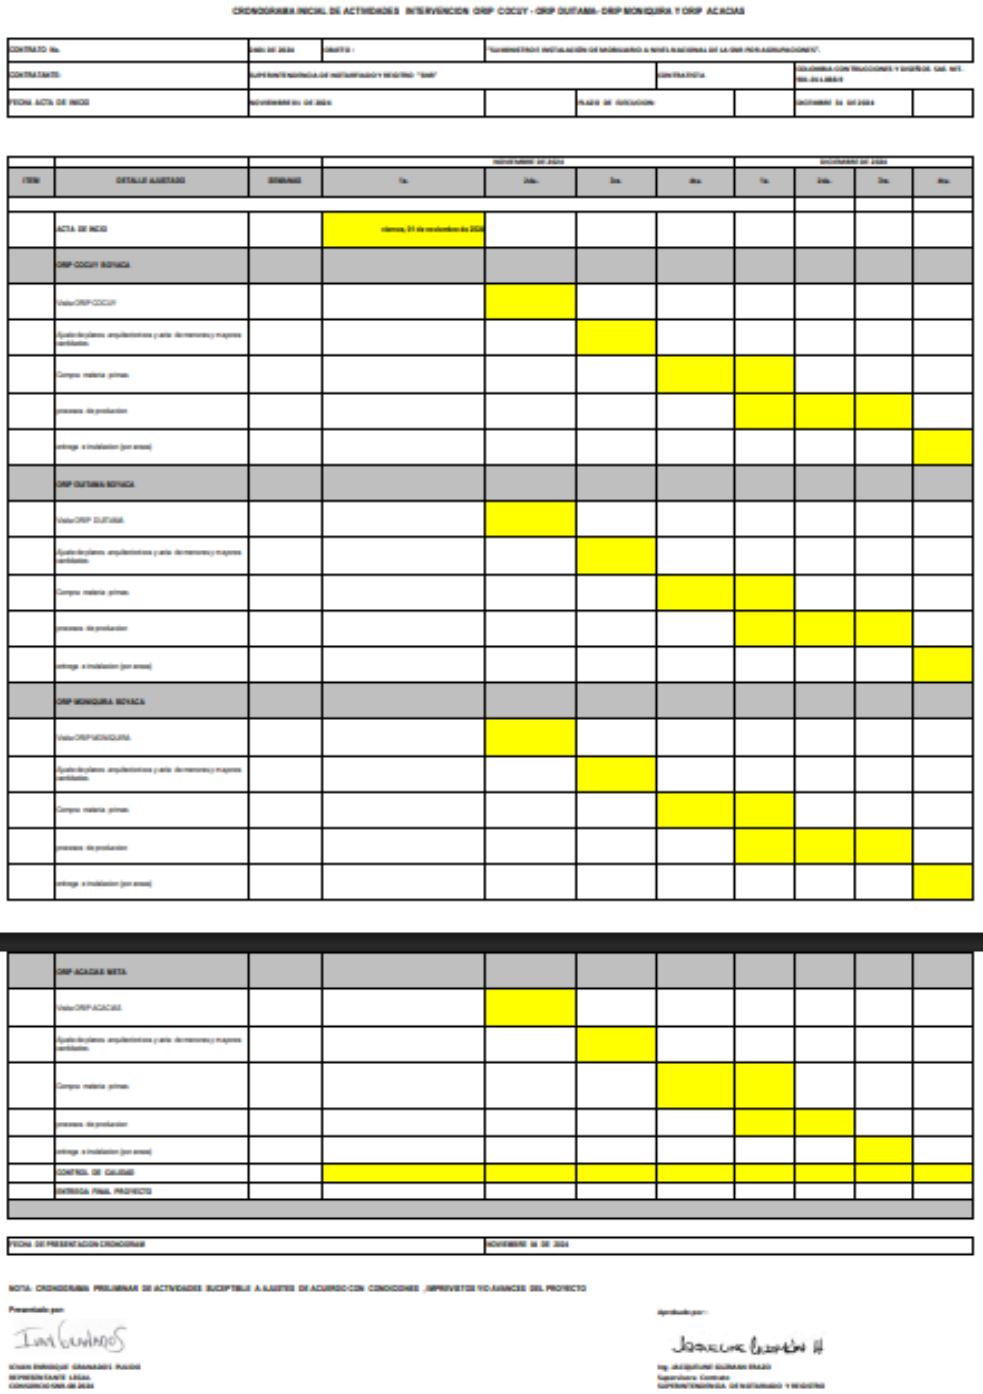

CRONOGRAMA INICIAL DE ACTIVIDADES INTERVENCION ORIP COCUY - ORIP DUITAMA- ORIP MONIQUIRA Y ORIP ACACIAS

CONTRATO No.										
CONTRATANTE:						CONTRATISTA				
FECHA ACTA DE INICIO				PLAZO DE EJECUCION						

ITEM	DETALLE AJUSTADO	SEMANAS								
	ACTA DE INICIO									
	ORIP COCUY BOYACA									
	ORIP DUITAMA BOYACA									
	ORIP MONIQUIRA BOYACA									
	ORIP ACACIAS META									
	CONTROL DE CALIDAD									
	ENTREGA FINAL PROYECTO									

FECHA DE PRESENTACION CRONOGRAMA	NOVIEMBRE 04 DE 2024

NOTA: CRONOGRAMA PRELIMINAR DE ACTIVIDADES SUCEPTIBLE A AJUSTES DE ACUERDO CON CONDICIONES IMPREVISTOS Y/O AVANCES DEL PROYECTO

Presentado por:

Aprobado por:

Inicialmente se fabrica se fabrica muestra de puesto de trabajo y paneleria, para aprobación por parte de la supervisión del contrato de los acabados y cumplimiento de especificaciones.

Se presenta muestra de Sillas para funcionario y Sillas Gerenciales , para la respectiva verificación de cumplimiento de las especificaciones.

Posteriormente se inicia proceso de Visitas a las diferentes sedes y los respectivos ajustes en planos y se realizan las actas de menores y mayores cantidades .

Se adjuntan Actas de mayores y menores cantidades de cada una de las sedes a intervenir …

Se adjuntan Actas de Menores y Mayores Cantidades aprobadas

- **ORIP ACACIAS**
- **ORIP COCUY**
- **ORIP MONIQUIRA**
- **ORIP DUITAMA**

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 01
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA	Fecha: 11 - 08 - 2021

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA N° 1

LUGAR DE EJECUCION ORIP ACACIAS META

CONTRATO DE OBRA N°	2401 de 2024	VALOR:	763.425.604
		ADICION	363.014.839
		VALOR TOTAL	1.126.440.443
CONTRATISTA	COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS NIT. 901.011.888-9	OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR POR AGRUPACIONES	
INTERVENTORIA/SUPERVISION	Ing. Jacqueline Del Carmen Guzman Erazo		

EI DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON EN LA SEDE ORIP ACACIAS DE SNR , EL SEÑOR IVAN ENRIQUE GRANADOS IDENTIFICADO CC. 1-.020.745.211 DE BOGOTA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS , Y LA INGENIERA JACQUELINE DEL CARMEN GUZMAN ERAZO SUPERVISORA DEL CONTRATO POR PARTE DEL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ,CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			RESUMEN		VALOR TOTAL CAPITULO
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL	
1	**MUEBLES**													
1,00	MUEBLES								-	-	-	-	-	92.057.429,00
1,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTO DE TRABAJO PARA DIRECTOR O REGISTRADOR, EL PUESTO TENDRA UNA FORMA DE "U", CON TRES SUPERFICIES INDEPENDENTES ESPESOR 30MM, CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS, CON DIMENSIONES DE 1,80M X 0.70M; DE 1,00 X 0.60 M Y UNA DETRÁS DE 1.80 X 0.60 M, CADA UNA CON BASES METALICAS INDEPENDIENTES, CON BORDES O CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REBORDEADAS,CAJONERA METALICA CON DOS CAJONES ESTANDAR Y UNO PARA ARCHIVO DE CARPETAS CON CERRADURA, 2 SILLAS INTERLOCUTORAS, BASURERA METALICA, PAPELERA METALICA, SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE,CABECERO, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO TIPO GERENTE , DESCANSA PIES.	un	1,00	$ 4.885.327,00	$4.885.327				-	-	-	1,00	4.885.327,00	
1,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DE 1.50 X 1.50 EN L, SUPERFICIES ESPESOR 30 MM, CON ACABADO FORMICA A DOS CARAS, EL ANCHO DE LA SUPERFICIE SERA DE 60 CM , EL CHAFLAN QUE CONFORMA LA PARTE INTERNA DE LAS SUPERFICIES DEBERÁ IR CURVO, BORDES CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REDORDEADAS. BASES METALICAS INDEPENDIENTES CON NIVELADORES, CAJONERA METALICA DE DOS CAJONES Y UNO DE ARCHIVADO PROVISTA DE CHAPA. INCLUYE SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO, BASURERA, PAPELERA Y DESCANZAPIES.	un	5,00	$ 3.486.602,00	$17.433.010	3			10.459.806,00	-	-	8,00	27.892.816,00	
1,03	DIVISION EN VIDRIO LAMINADO 3+3 SOBRE MESON DE ATENCION AL PUBLICO DE 1.10 M DE ALTURA Y ANCHO 1.50 M.,INCLUYE PASAVOZ, PASADOCUMENTOS, MONTANTE DE 20 CENTIMETROS TERMINADO EN FORMICA A DOS CARAS Y ESTRUCTURA (DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD)	m^2	5,40	$ 955.055,00	$5.157.297	1,6			1.528.088,00	-	-	7,00	6.685.385,00	

1,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERFICIE DE TRABAJO ESPESOR 30MM CON ACABADO EN FÓRMICA A DOS CARAS Y BASES METÁLICAS DE 1,50 m DE LARGO POR 0,60 m DE ANCHO, REMATE PERIMETRAL CON CANTO EN CAUCHO U OTRO MATERIAL RESISTENTE A LOS IMPACTOS, EL ACABADO DEBE SER IGUAL AL DE LAS SUPERFICIES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.	un	3,00	$ 1.141.744,00	$3.425.232		1,00		-	1.141.744,00	-	2,00	2.283.488,00	
1,09	SUMINISTRO DE TAPETE ATRAPA POLVO PARA INGRESO A LA OFICINA DE REGISTRO DE 1,70 X 0,90 NEGRO Y PERFIL DE REMATE, INLCUYE LOGO DE LA ENTIDAD	m^2	1,00	$ 904.348,00	$904.348				-	-	-	1,00	904.348,00	
1,16	CAJONERA METALICA DE DOS CAJONES Y UNO DE ARCHIVADO PROVISTA DE CHAPA CON SISITEMA DETRAMPA EN EL CAJON PRINCIPAL PARA EL BLOQUEO DEL RESTO DE LOS CAJONES.	un	3,00	$ 711.467,00	$2.134.401				-	-	-	3,00	2.134.401,00	
1,16	MUEBLE AUXILIAR BAJO DE 0.90 X 0.50 X 0.70 m DE ALTO CON PUERTAS METALICAS CON PINTURA ELECTROSTATICA, ENTREPAÑO. INCLUYE SUPERFICIE ENCHAPADA EN FORMICA Y NIVELADORES.	un	2,00	$ 1.313.401,00	$2.626.802	1			1.313.401,00	-	-	3,00	3.940.203,00	
1,23	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO DE 2 MTS DE ALTO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA	m^2	1,00	$ 2.828.252,00	$2.828.252	1			2.828.252,00	-	-	2,00	5.656.504,00	
1,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIBLIOTECA EN FORMICA ESPESOR 19MM AMBAS CARAS PARA OFICINA DOS MUEBLES INDEPENDIENTES CON DIMENSIONES: MUEBLE BAJO (1,20 DE LARGO, 0,52 DE ANCHO Y 0.94 DE ALTO INCLUIDO BASE CON ENTREPAÑO Y CUATRO CAJONES, CON ESPALDAR) MUEBLE ALTO (1,20 DE LARGO, 1,08 DE ALTO ,0.30 DE ANCHO CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES, CON ESPALDAR). C	m^2	2,00	$ 3.569.297,00	$7.138.594		1,00		-	3.569.297,00	-	1,00	3.569.297,00	
1,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE METALICO Y MECANICO FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED. CADA CUERPO CON MEDIDAS LIBRES DE 1,10 X 0,45 X 2,10-2,20 M, CON 6 ESPACIOS UTILES Y 5 ENTREPAÑOS DE 0,45 M DE FONDO LIBRES EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22. CONSTA DE PARALES EN "L" FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 CON TROQUELADO DE UÑA SOBRE SÍ MISMO PARA AJUSTAR A UNA ALTURA MODULAR DE 31 CM ENTRE CADA ENTREPAÑOS. LAS UNIDADES DE CONSULTA INCLUYEN TENSORES GRADUABLES DIAGONALES LATERALES EN PLATINA DE 3/4" X 1/8" Y DIAGONALES POSTERIORES EN PLATINA DE 3/4" X 1/4" CON TEMPLETE DE 1/4", CON EL FIN DE BRINDARLE MAYOR ESTABILIDAD Y RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA. CADA ENTREPAÑO CONTARÁ CON DOS REFUERZOS EN LÁMINA CALIBRE 16 PARA SOPORTAR UNA CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA DE 100 KG/M, ASÍ MISMO CONSTARÁ CON TAPA SUPERIOR E INFERIOR DEL MISMO CALIBRE Y REFORZADOS PARA SOPORTAR UNA CARGA DE 100 KG/M. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA, PANELERÍA CON VISOR IDENTIFICADOR. ACABADOS FRONTALES Y LATERALES EN LAMINA COLD ROLLED. LOS	un	20,00	$ 2.451.582,00	$49.031.640		10,00		-	24.515.820,00	-	10,00	24.515.820,00	
1,26	ESTANTE METÁLICO DE 2.00M ALTO POR 0.50M DE PROFUNDIDAD POR 0.90 M DE ANCHO, DE 5 ESPACIOS UTILES, PARALES EN CAL 16, ENTREPAÑOS EN CAL 20 REFORZADO PARA RESISTIR CADA UNO UN PESO DE 150 Kg	un	2,00	$ 1.157.257,00	$2.314.514	2			2.314.514,00	-	-	4,00	4.629.028,00	
1,27	ARCHIVADOR VERTICAL TRES GAVETAS: ELABORADO EN LÁMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. CUENTA CON NIVELADORES EN NYLON INYECTADO, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSION, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCIÓN CON LLAVE. ESTÁ PROVISTO DE TRES (3) GAVETAS EXTRAIBLES Y SISTEMA ANTI-VUELCO DE SEGURIDAD QUE IMPIDE LA APERTURA DE UN CAJÓN SI OTRO ESTÁ ABIERTO. ALTURA: 105 CM ANCHO: 47 CM, FONDO: 60 CM	un	3,00	$ 1.653.604,00	$4.960.812				-	-	-	3,00	4.960.812,00	
1,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO INSTITUCIONAL EN PANAFLEX IMPRESO PARA EXTERIOR, SEGÚN DISEÑO Y MEDIDA, CON CAJA EN ALUMNIO DE 0,10M DE ESPESOR SIN LUZ.	m^2	2,60	$ 1.254.809,00	$3.262.503		2,60		-	3.262.503,40	-	-	-	
2,00	**OBRAS ADICIONALES**													**4.881.617,02**
2.08	DESMONTE, TRASLADO, REUBICACIÓN DE DOCUMENTOS, INCLUYE SUMINISTRO DE CAJAS PARA SU MANIPULACION. EL VALOR UNITARIO SE ESTABLECE POR ESTANTE LLENO DE SEIS ESPACIOS UTILES	un	20,00	$ 134.608,00	$2.692.160		8,00		-	1.076.864,00	-	12,00	1.615.296,00	

2.09	DESMONTE DE ESTANTE DE ARCHIVO RODANTE O FIJO INCLUIDA PUERTAS Y ESTRUCTURA EXISTENTE, UBICANDOLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LA ORIP	un	20,00	$ 141.511,00	$2.830.220		8,00		-	1.132.088,00	-	12,00	1.698.132,00	
2.10	MANTENIMIENTO MODULO GENERAL Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ARCHIVO RODANTE, INCLUYE HERRAJES,ANCLAJES, TENSORES, CADENAS, CHAPAS, TORNILLERÍA Y DEMAS ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m^2	6,00	$ 187.866,00	$1.127.196		6,00		-	1.127.196,00	-	-	-	
2.11	DESMONTE PUESTO DE TRABAJO Y UBICACIÓN EN EL LUGAR QUE SE INDIQUE	un	6,00	$ 62.127,00	$372.762				-	-	-	6,00	372.762,00	
2.12	RETIRO Y ADECUACION DE MESON INTERNO, INCLUYE DEMOLICION, RESANE, PINTURA Y TRASCIEGO DE ESCOMBROS	un	2,70	$ 185.914,00	$501.968	3,73			693.459,22	-	-	6,43	1.195.427,02	
2.15	DEMOLICION MESON DE ATENCION AL PUBLICO. INCLUYE MURO, MESON ALTO Y BAJO, RESANE Y CERAMINCA SIMILAR A LA EXISTENTE EN PISO (Instalacion Ceramica Piezas Completas).	UN	1,50	$ 230.143,00	$345.215		1,50		-	345.214,50	-	-	-	-
2.16	RETIRO AVISO ORIP Y UBICACIÓN DONDE INDIQUE LA ENTIDAD	UN	1,00	$ 52.274,00	$52.274		1,00		-	52.274,00	-	-	-	
	NO PREVISTOS													**17.064.602,02**
NP-01	**SUPERFICIE DE 1,50 X 0.60 CON CAJONERA (PUESTO SENCILLO)**	UN		$ 2.568.700,00	$0			1,00	-	-	2.568.700,00	1,00	2.568.700,00	
NP-02	DIVION PISO TECHO	PTO		$ 915.366,00	$0			2,47	-	-	2.260.954,02	2,47	2.260.954,02	
NP-03	DIVISIONES MEDIA ALTUR<	UN		$ 669.915,00	$0			17,60	-	-	11.790.504,00	17,60	11.790.504,00	
NP-04	DESMONTE DIVISIONES VENTANILLAS SOBRE MESON	UN		$ 74.074,00	$0			6,00	-	-	444.444,00	6,00	444.444,00	
	SALDO POR AJUSTAR				**$114.024.527**									**114.003.648**

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

$20.879

IVAN ENRIQUE GRANADOS PULIDO
REPRSENTANTE LEGAL CONOSRCIO SNR-08 2024
CONTRATISTA

ING. JACQUELINE DEL CARMEN GUZMAN ERAZO
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 01
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA	Fecha: 11 - 08 - 2021

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA N° X

LUGAR DE EJECUCION ORIP EL COCUY (BOYACA)

CONTRATO DE OBRA N°	2401 DE 2024	VALOR:	763.425.604
		ADICION	363.014.839
		VALOR TOTAL	1.126.440.443
CONTRATISTA	COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS AS	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR POR AGRUPACIONES"	
INTERVENTORIA/SUPERVISION	Ing. Jacqueline Del Carmen Guzman Erazo		

EI DIA SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON EN LA SEDE CENTRAL SNR , EL SEÑOR IVAN ENRIQUE GRANADOS IDENTIFICADO CC. 1-.020.745.211 DE BOGOTA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS Y LA INGENIERA JACQUELINE DEL CARMEN GUZMAN HERAZO SUPERVISORA DEL CONTRATO POR PARTE DEL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ,CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			RESUMEN		VALOR TOTAL CAPITULO
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL	
1	**MUEBLES**													
1,00	**MUEBLES**								-	-	-	-	-	113.264.685,90
1,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTO DE TRABAJO PARA DIRECTOR O REGISTRADOR, EL PUESTO TENDRA UNA FORMA DE "U", CON TRES SUPERFICIES INDEPENDENTES ESPESOR 30MM, CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS, CON DIMENSIONES DE 1,80M X 0.70M; DE 1,00 X 0.60 M Y UNA DETRÁS DE 1.80 X 0.60 M, CADA UNA CON BASES METALICAS INDEPENDIENTES, CON BORDES O CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REBORDEADAS,CAJONERA METALICA CON DOS CAJONES ESTANDAR Y UNO PARA ARCHIVO DE CARPETAS CON CERRADURA, 2 SILLAS INTERLOCUTORAS, BASURERA METALICA, PAPELERA METALICA, SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE,CABECERO, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO TIPO GERENTE , DESCANSA PIES.	un	1,00	4.885.327,00 $	$4.885.327				-	-	-	1,00	4.885.327,00	
1,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DE 1.50 X 1.50 EN L, SUPERFICIES ESPESOR 30 MM, CON ACABADO FORMICA A DOS CARAS, EL ANCHO DE LA SUPERFICIE SERA DE 60 CM , EL CHAFLAN QUE CONFORMA LA PARTE INTERNA DE LAS SUPERFICIES DEBERÁ IR CURVO, BORDES CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REDORDEADAS. BASES METALICAS INDEPENDIENTES CON NIVELADORES, CAJONERA METALICA DE DOS CAJONES Y UNO DE ARCHIVADO PROVISTA DE CHAPA. INCLUYE SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO, BASURERA, PAPELERA Y DESCANZAPIES.	un	4,00	3.486.602,00 $	$13.946.408				-	-	-	4,00	13.946.408,00	
1,03	DIVISION EN VIDRIO LAMINADO 3+3 SOBRE MESON DE ATENCION AL PUBLICO DE 1.10 M DE ALTURA Y ANCHO 1.50 M.,INCLUYE PASAVOZ, PASADOCUMENTOS, MONTANTE DE 20 CENTIMETROS TERMINADO EN FORMICA A DOS CARAS Y ESTRUCTURA (DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD)	m^2	3,30	955.055,00 $	$3.151.682				-	-	-	3,30	3.151.681,50	

1,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERFICIE DE TRABAJO ESPESOR 30MM CON ACABADO EN FÓRMICA A DOS CARAS Y BASES METÁLICAS DE 1,50 m DE LARGO POR 0,60 m DE ANCHO, REMATE PERIMETRAL CON CANTO EN CAUCHO U OTRO MATERIAL RESISTENTE A LOS IMPACTOS, EL ACABADO DEBE SER IGUAL AL DE LAS SUPERFICIES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.	un	3,00	1.141.744,00 $	$3.425.232				-	-	-	3,00	3.425.232,00	
1,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERFICIE DE TRABAJO ESPESOR 30MM, CON ACABADO EN FÓRMICA A DOS CARAS Y BASES METÁLICAS DE 0,8 m DE LARGO POR 0,60 m DE ANCHO, CON ENTREPAÑO. REMATE PERIMETRAL CON CANTO EN CAUCHO U OTRO MATERIAL RESISTENTE A LOS IMPACTOS, EL ACABADO DEBE SER IGUAL AL DE LAS SUPERFICIES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO	un	1,00	958.420,00 $	$958.420				-	-	-	1,00	958.420,00	
1,09	SUMINISTRO DE TAPETE ATRAPA POLVO PARA INGRESO A LA OFICINA DE REGISTRO DE 1,70 X 0,90 NEGRO Y PERFIL DE REMATE, INLCUYE LOGO DE LA ENTIDAD	un	1,00	904.348,00 $	$904.348				-	-	-	1,00	904.348,00	
1,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS TIPO SHERT O SIMILAR	m^2	15,00	413.848,00 $	$6.207.720		10,20		-	4.221.249,60	-	4,80	1.986.470,40	
1,16	CAJONERA METALICA DE DOS CAJONES Y UNO DE ARCHIVADO PROVISTA DE CHAPA CON SISITEMA DETRAMPA EN EL CAJON PRINCIPAL PARA EL BLOQUEO DEL RESTO DE LOS CAJONES.	un	4,00	711.467,00 $	$2.845.868				-	-	-	4,00	2.845.868,00	
1,16	MUEBLE AUXILIAR BAJO DE 0,90 X 0.50 X 0.70 m DE ALTO CON PUERTAS METALICAS CON PINTURA ELECTROSTATICA, ENTREPAÑO. INCLUYE SUPERFICIE ENCHAPADA EN FORMICA Y NIVELADORES.	un	2,00	1.313.401,00 $	$2.626.802	2			2.626.802,00	-	-	4,00	5.253.604,00	
1,21	SUMINISTRO E INSTALACION MESA DE JUNTAS REDONDA EPESOR 30MM, DE 1,10 m DE DIAMETRO, ACABADO EN FÓRMICA A DOS CARAS Y BASE METÁLICA, REMATE PERIMETRAL CON CANTO EN CAUCHO U OTRO MATERIAL RESISTENTE A LOS IMPACTOS, EL ACABADO DEBE SER IGUAL AL DE LAS SUPERFICIES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, INCLUYE 4 SILLAS INTERLOCUTORAS	un	1,00	2.016.768,00 $	$2.016.768				-	-	-	1,00	2.016.768,00	
1,23	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO DE 2 MTS DE ALTO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA	un	2,00	2.828.252,00 $	$5.656.504	2			5.656.504,00	-	-	4,00	11.313.008,00	
1,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIBLIOTECA EN FORMICA ESPESOR 19MM AMBAS CARAS PARA OFICINA DOS MUEBLES INDEPENDIENTES CON DIMENSIONES: MUEBLE BAJO (1,20 DE LARGO, 0,52 DE ANCHO Y 0.94 DE ALTO INCLUIDO BASE CON ENTREPAÑO Y CUATRO CAJONES, CON ESPALDAR) MUEBLE ALTO (1,20 DE LARGO, 1,08 DE ALTO ,0.30 DE ANCHO CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES, CON ESPALDAR). C	un	1,00	3.569.297,00 $	$3.569.297				-	-	-	1,00	3.569.297,00	
1,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE METÁLICO Y MECÁNICO FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED. CADA CUERPO CON MEDIDAS LIBRES DE 1,10 X 0,45 X 2,10-2,20 M, CON 6 ESPACIOS UTILES Y 5 ENTREPAÑOS DE 0,45 M DE FONDO LIBRES EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22. CONSTA DE PARALES EN "L" FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 CON TROQUELADO DE UÑA SOBRE SÍ MISMO PARA AJUSTAR A UNA ALTURA MODULAR DE 31 CM ENTRE CADA ENTREPAÑOS. LAS UNIDADES DE CONSULTA INCLUYEN TENSORES GRADUABLES DIAGONALES LATERALES EN PLATINA DE 3/4" X 1/8" Y DIAGONALES POSTERIORES EN PLATINA DE 3/4" X 1/4" CON TEMPLETE DE 1/4", CON EL FIN DE BRINDARLE MAYOR ESTABILIDAD Y RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA. CADA ENTREPAÑO CONTARÁ CON DOS REFUERZOS EN LÁMINA CALIBRE 16 PARA SOPORTAR UNA CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA DE 100 KG/M, ASÍ MISMO CONSTARÁ CON TAPA SUPERIOR E INFERIOR DEL MISMO CALIBRE Y REFORZADOS PARA SOPORTAR UNA CARGA DE 100 KG/M. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA,	un	24,00	2.451.582,00 $	$58.837.968		6,00		-	14.709.492,00	-	18,00	44.128.476,00	
1,26	ESTANTE METÁLICO DE 2.00M ALTO POR 0.50M DE PROFUNDIDAD POR 0.90 M DE ANCHO, DE 5 ESPACIOS UTILES, PARALES EN CAL 16, ENTREPAÑOS EN CAL 20 REFORZADO PARA RESISTIR CADA UNO UN PESO DE 150 Kg	un	3,00	1.157.257,00 $	$3.471.771	7			8.100.799,00	-	-	10,00	11.572.570,00	
1,27	ARCHIVADOR VERTICAL TRES GAVETAS: ELABORADO EN LÁMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. CUENTA CON NIVELADORES EN NYLON INYECTADO, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSION, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCIÓN CON LLAVE. ESTÁ PROVISTO DE TRES (3) GAVETAS EXTRAÍBLES Y SISTEMA ANTI-VUELCO DE SEGURIDAD QUE IMPIDE LA APERTURA DE UN CAJÓN SI OTRO ESTÁ ABIERTO. ALTURA: 105 CM ANCHO: 47 CM, FONDO: 60 CM	un	2,00	1.653.604,00 $	$3.307.208				-	-	-	2,00	3.307.208,00	
1,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO INSTITUCIONAL EN PANAFLEX IMPRESO PARA EXTERIOR, SEGÚN DISEÑO Y MEDIDA, CON CAJA EN ALUMNIO DE 0,10M DE ESPESOR SIN LUZ.	m2	2,60	1.254.809,00 $	$3.262.503		2,60		-	3.262.503,40	-	-	-	
2,00	**OBRAS ADICIONALES**													**7.274.831,60**

2,02	DESMONTE Y REINSTALACION EN NUEVA UBICACION DE PUESTOS DE TRABAJO, INCLUYE DIVISION EN DONDE EXISTA	un	2,00	72.850,00 $	$145.700	1			72.850,00	-	-	3,00	218.550,00	
2.06	DESMONTE Y REINSTALACION DE CANALETA DE RED REGULADA Y LOGICA	ML	3,00	18.912,00 $	$56.736				-	-	-	3,00	56.736,00	
2.07	TRASLADO DE PUNTO DE RED LOGICA,NORMAL Y REGULADA. (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	UN	2,00	153.313,00 $	$306.626				-	-	-	2,00	306.626,00	
2.08	DESMONTE, TRASLADO, REUBICACIÓN DE DOCUMENTOS, INCLUYE SUMINISTRO DE CAJAS PARA SU MANIPULACION. EL VALOR UNITARIO SE ESTABLECE POR ESTANTE LLENO DE SEIS ESPACIOS UTILES	UN	24,00	134.608,00 $	$3.230.592				-	-	-	24,00	3.230.592,00	
2.09	DESMONTE DE ESTANTE DE ARCHIVO RODANTE O FIJO INCLUIDA PUERTAS Y ESTRUCTURA EXISTENTE, UBICANDOLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LA ORIP	UN	24,00	141.511,00 $	$3.396.264		4,00		-	566.044,00	-	20,00	2.830.220,00	
2.11	DESMONTE PUESTO DE TRABAJO Y UBICACIÓN EN EL LUGAR QUE SE INDIQUE	UN	5,00	62.127,00 $	$310.635		5,00		-	310.635,00	-	-	-	
2.12	RETIRO Y ADECUACION DE MESON INTERNO, INCLUYE DEMOLICION, RESANE, PINTURA Y TRASCIEGO DE ESCOMBROS	M2	1,50	185.914,00 $	$278.871	1,9			353.236,60	-	-	3,40	632.107,60	
2.14	ADECUACION DE MESON PRIORITARIO, INCLUYE DESMONETE Y REINSTALACION DE MESON EN MATERIAL EXISTENTE, CORTE EN CONCRETO, DEMOLICION MURO A LA ALTURA DE ATENCION PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE MOVILIDADL, RESANE DE PARED CON PINTURA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS.	ML	1,50	185.005,00 $	$277.508		1,50		-	277.507,50	-	-	-	
2.16	RETIRO AVISO ORIP Y UBICACIÓN DONDE INDIQUE LA ENTIDAD	UN	1,00	52.274,00 $	$52.274		1,00		-	52.274,00	-	-	-	
	ADICIONALES NO P´REVISTOS													**6.581.508,00**
1,07	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO, ALTO 2,20 m, ESTRUCTURA EN LÁMINA, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA, PANELES EN MADERA CON ACABADO EN FÓRMICA, INCLUYE VIDRIO CON SANBLASTING , MONTANTE DE 0,20 MTS Y EMPAQUES, EL MATERIAL Y ACABADO SERÁ EL UTILIZADO INSTITUCIONALMENTE POR LA ENTIDAD. INCLUYE PUERTAS EN VIDRIO DE 6 MM CON ESTRUCTURA	m^2		915.366,00 $	$0			1,80	-	-	1.647.658,80	1,80	1.647.658,80	
1,22	DIVISION A MEDIA ALTURA ENTRE 1,05 Y 1.10 m, ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS Y VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 mm SAMBLASTIADO, (DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD) ESTRUCTURA EN ALUMINIO O METALICA CON PINTURA ELECTROESTATICA, INCLUYE NIVELADORES.	m^2		669.915,00 $	$0			7,00	-	-	4.689.405,00	7,00	4.689.405,00	
2,01	DESMONTE DE DIVISION PISO TECHO, DIVISIONES A MEDIA ALTURA, MESON, DIVISIONES EN VIDRIO SOBRE MESON. INCLUYE RETIRO Y DISPISICIÓN FINAL.	m^2		74.074,00 $	$0			3,30	-	-	244.444,20	3,30	244.444,20	
					$0	0			-	-	-	-	-	
	SALDO POR AJUSTAR				**$127.129.031**									**127.121.026**

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

$8.006

IVAN ENRIQUE GRANADOS PULIDO
REPRSENTANTE LEGAL CONOSRCIO SNR-08 2024
CONTRATISTA

ING. JACQUELINE DEL CARMEN GUZMAN HERAZO
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 01
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA	Fecha: 11 - 08 - 2021

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA N° 1

LUGAR DE EJECUCION ORIP MONIQUIRA (BOYACA)

CONTRATO DE OBRA N°	2401 DE 2024	VALOR:	763.425.604
		ADICION	363.014.839
		VALOR TOTAL	1.126.440.443
CONTRATISTA	COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS AS	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR POR AGRUPACIONES"	
INTERVENTORIA/SUPERVISION	Ing. Jacqueline Del Carmen Guzman Erazo		

EI DIA SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON EN LA SEDE CENTRAL SNR , EL SEÑOR IVAN ENRIQUE GRANADOS IDENTIFICADO CC. 1-.020.745.211 DE BOGOTA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS Y LA INGENIERA JACQUELINE DEL CARMEN GUZMAN HERAZO SUPERVISORA DEL CONTRATO POR PARTE DEL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ,CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			RESUMEN		VALOR TOTAL CAPITULO
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL	
1	MUEBLES													
1,00	MUEBLES								-	-	-	-	-	168.535.021,90
1,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DE 1.50 X 1.50 EN L, SUPERFICIES ESPESOR 30 MM, CON ACABADO FORMICA A DOS CARAS, EL ANCHO DE LA SUPERFICIE SERA DE 60 CM , EL CHAFLAN QUE CONFORMA LA PARTE INTERNA DE LAS SUPERFICIES DEBERÁ IR CURVO, BORDES CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REDORDEADAS. BASES METALICAS INDEPENDIENTES CON NIVELADORES, CAJONERA METALICA DE DOS CAJONES Y UNO DE ARCHIVADO PROVISTA DE CHAPA. INCLUYE SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO, BASURERA, PAPELERA Y DESCANZAPIES.	un	3,00	$ 3.486.602,00	$10.459.806	2			-	-	-	5,00	17.433.010,00	
1,16	MUEBLE AUXILIAR BAJO DE 0.90 X 0.50 X 0.70 m DE ALTO CON PUERTAS METALICAS CON PINTURA ELECTROSTATICA, ENTREPAÑO. INCLUYE SUPERFICIE ENCHAPADA EN FORMICA Y NIVELADORES.	un	2,00	$ 1.313.401,00	$2.626.802				-	-	-	2,00	2.626.802,00	
1,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE METÁLICO Y MECÁNICO FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED. CADA CUERPO CON MEDIDAS LIBRES DE 1,10 X 0,45 X 2,10-2,20 M, CON 6 ESPACIOS UTILES Y 5 ENTREPAÑOS DE 0,45 M DE FONDO LIBRES EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22. CONSTA DE PARALES EN "L" FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 CON TROQUELADO DE UÑA SOBRE SÍ MISMO PARA AJUSTAR A UNA ALTURA MODULAR DE 31 CM ENTRE CADA ENTREPAÑOS. LAS UNIDADES DE CONSULTA INCLUYEN TENSORES GRADUABLES DIAGONALES LATERALES EN PLATINA DE 3/4" X 1/8" Y DIAGONALES POSTERIORES EN PLATINA DE 3/4" X 1/4" CON TEMPLETE DE 1/4", CON EL FIN DE BRINDARLE MAYOR ESTABILIDAD Y RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA. CADA ENTREPAÑO CONTARÁ CON DOS REFUERZOS EN LÁMINA CALIBRE 16 PARA SOPORTAR UNA CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA DE 100 KG/M, ASÍ MISMO CONSTARÁ CON TAPA SUPERIOR E INFERIOR DEL MISMO CALIBRE Y REFORZADOS PARA SOPORTAR UNA CARGA DE 100 KG/M. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA, PANELERÍA CON VISOR IDENTIFICADOR, ACABADOS FRONTALES Y LATERALES EN LÁMINA COLD ROLLED, LOS CUALES DEBEN CONTAR CON LA TOLERANCIA NECESARIA PARA QUE LOS ESTANTES NO QUEDEN PEGADOS AL ESTAR CERRADOS, QUE GARANTICE UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. DEBE CONTAR CON SISTEMA ANTIVUELCO QUE GARANTICE LA INTEGRIDAD DEL MISMO, INCLUYE ELEMENTOS METÁLICOS PARA QUE LAS CARPETAS NO SE CAIGAN HACIA LOS LADOS DE CADA UNO DE LOS ENTREPAÑOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE, INCLUYE MANIJAS PARA MOVERLO	un	66,00	$ 2.451.582,00	$161.804.412		6,00		-	14.709.492,00	-	60,00	147.094.920,00	
1,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO INSTITUCIONAL EN PANAFLEX IMPRESO PARA EXTERIOR, SEGÚN DISEÑO Y MEDIDA, CON CAJA EN ALUMNIO DE 0,10M DE ESPESOR SIN LUZ.	m2	2,60	$ 1.254.809,00	$3.262.503		1,50		-	1.882.213,50	-	1,10	1.380.289,90	
2,00	OBRAS ADICIONALES													16.371.307,00

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 01
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA	Fecha: 11 - 08 - 2021

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA N° X

LUGAR DE EJECUCION ORIP DUITAMA (BOYACA)

CONTRATO DE OBRA N°	2401 DE 2024	VALOR:	763.425.604
		ADICION	363.014.839
		VALOR TOTAL	1.126.440.443
CONTRATISTA	COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS AS	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR POR AGRUPACIONES"	
INTERVENTORIA/SUPERVISION	Ing. Jacqueline Del Carmen Guzman Erazo		

EI DIA SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON EN LA SEDE CENTRAL SNR , EL SEÑOR IVAN ENRIQUE GRANADOS IDENTIFICADO CC. 1-.020.745.211 DE BOGOTA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS , Y LA INGENIERA JACQUELINE DEL CARMEN GUZMAN HERAZO SUPERVISORA DEL CONTRATO POR PARTE DEL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ,CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			RESUMEN		VALOR TOTAL CAPITULO
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL	
1	MUEBLES													
1,00	MUEBLES								-	-	-	-	-	277.319.870,16
1,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTO DE TRABAJO PARA DIRECTOR O REGISTRADOR, EL PUESTO TENDRA UNA FORMA DE "U", CON TRES SUPERFICIES INDEPENDIENTES ESPESOR 30MM, CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS, CON DIMENSIONES DE 1,80M X 0.70M; DE 1.00 X 0.60 M Y UNA DETRÁS DE 1.80 X 0.60 M, CADA UNA CON BASES METALICAS INDEPENDIENTES, CON BORDES O CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REBORDEADAS,CAJONERA METALICA CON DOS CAJONES ESTANDAR Y UNO PARA ARCHIVO DE CARPETAS CON CERRADURA, 2 SILLAS INTERLOCUTORAS, BASURERA METALICA, PAPELERA METALICA, SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE,CABECERO, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO TIPO GERENTE , DESCANSA PIES.	un	1,00	4.885.327,00 $	$4.885.327				-	-	-	1,00	4.885.327,00	
1,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DE 1,50 X 1.50 EN L, SUPERFICIES ESPESOR 30 MM, CON ACABADO FORMICA A DOS CARAS, EL ANCHO DE LA SUPERFICIE SERA DE 60 CM , EL CHAFLAN QUE CONFORMA LA PARTE INTERNA DE LAS SUPERFICIES DEBERÁ IR CURVO, BORDES CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REDORDEADAS. BASES METALICAS INDEPENDIENTES CON NIVELADORES, CAJONERA METALICA DE DOS CAJONES Y UNO DE ARCHIVADO PROVISTA DE CHAPA. INCLUYE SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO, BASURERA, PAPELERA Y DESCANZAPIES.	un	14,00	3.486.602,00 $	$48.812.428		4,00		-	13.946.408,00	-	10,00	34.866.020,00	
1,03	DIVISION EN VIDRIO LAMINADO 3+3 SOBRE MESON DE ATENCION AL PUBLICO DE 1.10 M DE ALTURA Y ANCHO 1.50 M.,INCLUYE PASAVOZ, PASADOCUMENTOS, MONTANTE DE 20 CENTIMETROS TERMINADO EN FORMICA A DOS CARAS Y ESTRUCTURA (DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD)	m^2	9,00	955.055,00 $	$8.595.495		9,00		-	8.595.495,00	-	-	-	
1,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPERFICIE DE TRABAJO ESPESOR 30MM CON ACABADO EN FÓRMICA A DOS CARAS Y BASES METÁLICAS DE 1,50 m DE LARGO POR 0,60 m DE ANCHO, REMATE PERIMETRAL CON CANTO EN CAUCHO U OTRO MATERIAL RESISTENTE A LOS IMPACTOS, EL ACABADO DEBE SER IGUAL AL DE LAS SUPERFICIES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.	un	3,00	1.141.744,00 $	$3.425.232				-	-	-	3,00	3.425.232,00	

1,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERFICIE DE TRABAJO ESPESOR 30MM, CON ACABADO EN FÓRMICA A DOS CARAS Y BASES METÁLICAS DE 0,8 m DE LARGO POR 0,60 m DE ANCHO, CON ENTREPAÑO. REMATE PERIMETRAL CON CANTO EN CAUCHO U OTRO MATERIAL RESISTENTE A LOS IMPACTOS, EL ACABADO DEBE SER IGUAL AL DE LAS SUPERFICIES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO	un	2,00	958.420,00 $	$1.916.840	1			958.420,00	-	-	3,00	2.875.260,00	
1,07	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO, ALTO 2,20 m, ESTRUCTURA EN LÁMINA, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA, PANELES EN MADERA CON ACABADO EN FÓRMICA, INCLUYE VIDRIO CON SANBLASTING , MONTANTE DE 0,20 MTS Y EMPAQUES, EL MATERIAL Y ACABADO SERÁ EL UTILIZADO INSTITUCIONALMENTE POR LA ENTIDAD. INCLUYE PUERTAS EN VIDRIO DE 6 MM CON ESTRUCTURA METALICA O ALUMINIO, CERRADURA, BISAGRAS, EN LOS SITIOS QUE SE REQUIERA.	m^2	75,00	915.366,00 $	$68.652.450	38,86			35.571.122,76	-	-	113,86	104.223.572,76	
1,09	SUMINISTRO DE TAPETE ATRAPA POLVO PARA INGRESO A LA OFICINA DE REGISTRO DE 1,70 X 0,90 NEGRO Y PERFIL DE REMATE, INLCUYE LOGO DE LA ENTIDAD	un	1,00	904.348,00 $	$904.348				-	-	-	1,00	904.348,00	
1,16	CAJONERA METALICA DE DOS CAJONES Y UNO DE ARCHIVADO PROVISTA DE CHAPA CON SISITEMA DETRAMPA EN EL CAJON PRINCIPAL PARA EL BLOQUEO DEL RESTO DE LOS CAJONES.	un	5,00	711.467,00 $	$3.557.335				-	-	-	5,00	3.557.335,00	
1,16	MUEBLE AUXILIAR BAJO DE 0.90 X 0.50 X 0.70 m DE ALTO CON PUERTAS METALICAS CON PINTURA ELECTROSTATICA, ENTREPAÑO. INCLUYE SUPERFICIE ENCHAPADA EN FORMICA Y NIVELADORES.	un	3,00	1.313.401,00 $	$3.940.203	2			2.626.802,00	-	-	5,00	6.567.005,00	
1,21	SUMINISTRO E INSTALACION MESA DE JUNTAS REDONDA EPESOR 30MM, DE 1,10 m DE DIAMETRO, ACABADO EN FÓRMICA A DOS CARAS Y BASE METÁLICA, REMATE PERIMETRAL CON CANTO EN CAUCHO U OTRO MATERIAL RESISTENTE A LOS IMPACTOS, EL ACABADO DEBE SER IGUAL AL DE LAS SUPERFICIES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, INCLUYE 4 SILLAS INTERLOCUTORAS	un	1,00	2.016.768,00 $	$2.016.768				-	-	-	1,00	2.016.768,00	
1,22	DIVISION A MEDIA ALTURA ENTRE 1,05 Y 1.10 m, ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS Y VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 mm SAMBLASTIADO, (DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD) ESTRUCTURA EN ALUMINIO O METALICA CON PINTURA ELECTROESTATICA, INCLUYE NIVELADORES.	m^2	29,40	669.915,00 $	$19.695.501		9,00		-	6.029.235,00	-	20,40	13.666.266,00	
1,23	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO DE 2 MTS DE ALTO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA	un	2,00	2.828.252,00 $	$5.656.504	1			2.828.252,00	-	-	3,00	8.484.756,00	
1,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIBLIOTECA EN FORMICA ESPESOR 19MM AMBAS CARAS PARA OFICINA DOS MUEBLES INDEPENDIENTES CON DIMENSIONES: MUEBLE BAJO (1,20 DE LARGO, 0,52 DE ANCHO Y 0,94 DE ALTO INCLUIDO BASE CON ENTREPAÑO Y CUATRO CAJONES, CON ESPALDAR) MUEBLE ALTO (1,20 DE LARGO, 1,08 DE ALTO ,0.30 DE ANCHO CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES, CON ESPALDAR). C	un	1,00	3.569.297,00 $	$3.569.297				-	-	-	1,00	3.569.297,00	
1,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE METÁLICO Y MECÁNICO FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED. CADA CUERPO CON MEDIDAS LIBRES DE 1,10 X 0,45 X 2,10-2,20 M, CON 6 ESPACIOS UTILES Y 5 ENTREPAÑOS DE 0,45 M DE FONDO LIBRES EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22. CONSTA DE PARALES EN "L" FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 CON TROQUELADO DE UÑA SOBRE SÍ MISMO PARA AJUSTAR A UNA ALTURA MODULAR DE 31 CM ENTRE CADA ENTREPAÑOS. LAS UNIDADES DE CONSULTA INCLUYEN TENSORES GRADUABLES DIAGONALES LATERALES EN PLATINA DE 3/4" X 1/8" Y DIAGONALES POSTERIORES EN PLATINA DE 3/4" X 1/4" CON TEMPLETE DE 1/4", CON EL FIN DE BRINDARLE MAYOR ESTABILIDAD Y RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA. CADA ENTREPAÑO CONTARÁ CON DOS REFUERZOS EN LÁMINA CALIBRE 16 PARA SOPORTAR UNA CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA DE 100 KG/M, ASÍ MISMO CONSTARÁ CON TAPA SUPERIOR E INFERIOR DEL MISMO CALIBRE Y REFORZADOS PARA SOPORTAR UNA CARGA DE 100 KG/M. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA, PANELERÍA CON VISOR IDENTIFICADOR, ACABADOS FRONTALES Y LATERALES EN LÁMINA COLD ROLLED, LOS CUALES DEBEN CONTAR CON LA TOLERANCIA NECESARIA PARA QUE LOS ESTANTES NO QUEDEN PEGADOS AL ESTAR CERRADOS, QUE GARANTICE UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. DEBE CONTAR CON SISTEMA ANTIVUELCO QUE GARANTICE LA INTEGRIDAD DEL MISMO, INCLUYE ELEMENTOS METÁLICOS PARA QUE LAS CARPETAS NO SE CAIGAN HACIA LOS LADOS DE CADA UNO DE LOS ENTREPAÑOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE, INCLUYE MANIJAS PARA MOVERLO	un	42,00	2.451.582,00 $	$102.966.444		20,00		-	49.031.640,00	-	22,00	53.934.804,00	
1,26	ESTANTE METÁLICO DE 2.00M ALTO POR 0.50M DE PROFUNDIDAD POR 0.90 M DE ANCHO, DE 5 ESPACIOS UTILES, PARALES EN CAL 16, ENTREPAÑOS EN CAL 20 REFORZADO PARA RESISTIR CADA UNO UN PESO DE 150 Kg	un	24,00	1.157.257,00 $	$27.774.168				-	-	-	24,00	27.774.168,00	
1,27	ARCHIVADOR VERTICAL TRES GAVETAS: ELABORADO EN LÁMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. CUENTA CON NIVELADORES EN NYLON INYECTADO, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSION, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCIÓN CON LLAVE. ESTÁ PROVISTO DE TRES (3) GAVETAS EXTRAÍBLES Y SISTEMA ANTI-VUELCO DE SEGURIDAD QUE IMPIDE LA APERTURA DE UN CAJÓN SI OTRO ESTÁ ABIERTO, ALTURA: 105 CM ANCHO: 47 CM, FONDO: 60 CM	un	1,00	1.653.604,00 $	$1.653.604	1			1.653.604,00	-	-	2,00	3.307.208,00	
1,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO INSTITUCIONAL EN PANAFLEX IMPRESO PARA EXTERIOR, SEGÚN DISEÑO Y MEDIDA, CON CAJA EN ALUMNIO DE 0,10M DE ESPESOR SIN LUZ.	m2	2,60	1.254.809,00 $	$3.262.503				-	-	-	2,60	3.262.503,40	
2,00	**OBRAS ADICIONALES**													**21.791.812,36**

2,01	DESMONTE DE DIVISION PISO TECHO, DIVISIONES A MEDIA ALTURA, MESON, DIVISIONES EN VIDRIO SOBRE MESON. INCLUYE RETIRO Y DISPISICIÓN FINAL.	m^2	80,00	74.074,00 $	$5.925.920	22,64			1.677.035,36	-	-	102,64	7.602.955,36	
2,02	DESMONTE Y REINSTALACION EN NUEVA UBICACION DE PUESTOS DE TRABAJO, INCLUYE DIVISION EN DONDE EXISTA	un	5,00	72.850,00 $	$364.250				-	-	-	5,00	364.250,00	
2.06	DESMONTE Y REINSTALACION DE CANALETA DE RED REGULADA Y LOGICA	ML	28,50	18.912,00 $	$538.992				-	-	-	28,50	538.992,00	
2.07	TRASLADO DE PUNTO DE RED LOGICA,NORMAL Y REGULADA. (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	UN	3,00	153.313,00 $	$459.939	2			306.626,00	-	-	5,00	766.565,00	
2.08	DESMONTE, TRASLADO, REUBICACIÓN DE DOCUMENTOS, INCLUYE SUMINISTRO DE CAJAS PARA SU MANIPULACION. EL VALOR UNITARIO SE ESTABLECE POR ESTANTE LLENO DE SEIS ESPACIOS UTILES	UN	42,00	134.608,00 $	$5.653.536				-	-	-	42,00	5.653.536,00	
2.09	DESMONTE DE ESTANTE DE ARCHIVO RODANTE O FIJO INCLUIDA PUERTAS Y ESTRUCTURA EXISTENTE, UBICANDOLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LA ORIP	UN	42,00	141.511,00 $	$5.943.462				-	-	-	42,00	5.943.462,00	
2.11	DESMONTE PUESTO DE TRABAJO Y UBICACIÓN EN EL LUGAR QUE SE INDIQUE	UN	14,00	62.127,00 $	$869.778				-	-	-	14,00	869.778,00	
2.16	+	UN	1,00	52.274,00 $	$52.274				-	-	-	1,00	52.274,00	
	q-														12.269.487,00
NP-01	SUMINISTRO E INSTALACION SILLAS TANDEM 3 PUESTOS, ACABADO EN PLASTICO REFORZADO COLOR NEGRO EN ASIENTO Y ESPALDAR.ESTRUCTURA METALICA TUBO REDONDO MINIMO 22 MM CALIBRE 16CC O SIMILAR, PINTURA ELECTROSTATICA.	un		949.629,00 $	$0			3,00			2.848.887,00	3,00	2.848.887,00	
NP-02	SILLAS INTERLOCUTORAS EN PAÑO • ACABADO DEL ASIENTO Y EL ESPALDAR TAPIZADO EN PAÑO COLOR NEGRO, LAS CUBIERTAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL ESPALDAR Y DEL ASIENTO SE CONSTRUIRÁN EN POLIPROPILENO INYECTADO, ALTURA ASIENTO MÍNIMO 42.5 CM, ALTURA SILLA MÍNIMO 84 CM. ESTRUCTURA METÁLICA TUBO REDONDO MÍNIMO DE 22 MM CALIBRE 16 O SIMILAR, PINTURA ELECTROSTÁTICA, EL CONTRATISTA PUEDE PRESENTAR ALTERNATIVAS PARA APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD.	un		345.100,00 $	$0			6,00			2.070.600,00	6,00	2.070.600,00	
NP-03	SOFA DOBLE DOS PUESTOS	un		$ 2.850.000,00	$0			1,00			2.850.000,00	1,00	2.850.000,00	
NP-04	POLTRONA DE UN PUESTO CON BRAZOS , TAPIZADO EN PRANAHA BASE CROMADA , SUAVISADO CON CAUCHO ESPUMA DE ALTA DENSIDAD , COJINES REMOVIBLES.	un		2.250.000,00 $	$0			2,00			4.500.000,00	2,00	4.500.000,00	
	SALDO POR AJUSTAR				**$331.092.598**										**311.381.170**

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:


IVAN ENRIQUE GRANADOS PULIDO
REPRSENTANTE LEGAL CONOSRCIO SNR-08 2024
CONTRATISTA

ING. JACQUELINE DEL CARMEN GUZMAN HERAZO
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

2.06	DESMONTE Y REINSTALACION DE CANALETA DE RED REGULADA Y LOGICA	ML	3,00	$ 18.912,00	$56.736				-	-	-	3,00	56.736,00	
2.07	TRASLADO DE PUNTO DE RED LOGICA,NORMAL Y REGULADA. (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	UN	1,00	$ 153.313,00	$153.313	3			459.939,00	-	-	4,00	613.252,00	
2.08	DESMONTE, TRASLADO, REUBICACIÓN DE DOCUMENTOS, INCLUYE SUMINISTRO DE CAJAS PARA SU MANIPULACION. EL VALOR UNITARIO SE ESTABLECE POR ESTANTE LLENO DE SEIS ESPACIOS UTILES	UN	46,00	$ 134.608,00	$6.191.968	10			1.346.080,00	-	-	56,00	7.538.048,00	
2.09	DESMONTE DE ESTANTE DE ARCHIVO RODANTE O FIJO INCLUIDA PUERTAS Y ESTRUCTURA EXISTENTE, UBICANDOLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LA ORIP	UN	46,00	$ 141.511,00	$6.509.506	10			1.415.110,00	-	-	56,00	7.924.616,00	
2.11	DESMONTE PUESTO DE TRABAJO Y UBICACIÓN EN EL LUGAR QUE SE INDIQUE	UN	1,00	$ 62.127,00	$62.127	2			124.254,00	-	-	3,00	186.381,00	
2.16	RETIRO AVISO ORIP Y UBICACIÓN DONDE INDIQUE LA ENTIDAD	UN	1,00	$ 52.274,00	$52.274				-	-	-	1,00	52.274,00	
	ADICIONALES NO PREVISTOS													**26.012.816,75**
NP-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTO DE TRABAJO PARA DIRECTOR O REGISTRADOR, EL PUESTO TENDRA UNA FORMA DE "U", CON TRES SUPERFICIES INDEPENDENTES ESPESOR 30MM, CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS, CON DIMENSIONES DE 1,80M X 0.70M; DE 1,00 X 0.60 M Y UNA DETRÁS DE 1.80 X 0.60 M, CADA UNA CON BASES METALICAS INDEPENDIENTES, CON BORDES O CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REBORDEADAS,CAJONERA METALICA CON DOS CAJONES ESTANDAR Y UNO PARA ARCHIVO DE CARPETAS CON CERRADURA, 2 SILLAS INTERLOCUTORAS, BASURERA METALICA, PAPELERA METALICA, SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE,CABECERO, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO TIPO GERENTE , DESCANSA PIES.	un		$ 4.885.327,00	$0			1,00	-	-	4.885.327,00	1,00	4.885.327,00	
NP-02	SUMINISTRO E INSTALACION MESA DE JUNTAS REDONDA EPESOR 30MM, DE 1,10 m DE DIAMETRO, ACABADO EN FÓRMICA A DOS CARAS Y BASE METÁLICA, REMATE PERIMETRAL CON CANTO EN CAUCHO U OTRO MATERIAL RESISTENTE A LOS IMPACTOS, EL ACABADO DEBE SER IGUAL AL DE LAS SUPERFICIES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, INCLUYE 4 SILLAS INTERLOCUTORAS	un		$ 2.016.768,00	$0			1,00	-	-	2.016.768,00	1,00	2.016.768,00	
NP-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIBLIOTECA EN FORMICA ESPESOR 19MM AMBAS CARAS PARA OFICINA DOS MUEBLES INDEPENDIENTES CON DIMENSIONES: MUEBLE BAJO (1,20 DE LARGO, 0,52 DE ANCHO Y 0.94 DE ALTO INCLUIDO BASE CON ENTREPAÑO Y CUATRO CAJONES, CON ESPALDAR) MUEBLE ALTO (1,20 DE LARGO, 1,08 DE ALTO ,0.30 DE ANCHO CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES, CON ESPALDAR). C	un		3.569.297,00 $	$0			1,00	-	-	3.569.297,00	1,00	3.569.297,00	
NP-04	SOFA DOBOLE DOS PUESTOS	UN		$ 2.850.000,00	$0			1,00	-	-	2.850.000,00	1,00	2.850.000,00	
NP-05	SUMINISTRO E INSTALACION SILLAS TANDEM 3 PUESTOS, ACABADO EN PLASTICO REFORZADO COLOR NEGRO EN ASIENTO Y ESPALDAR.ESTRUCTURA METALICA TUBO REDONDO MINIMO 22 MM CALIBRE 16CC O SIMILAR, PINTURA ELECTROSTATICA.	un		949.629,00 $	$0			2,00			1.899.258,00	2,00	1.899.258,00	
NP-06	DIVISION A MEDIA ALTURA ENTRE 1,05 Y 1.10 m, ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS Y VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 mm SAMBLASTIADO, (DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD) ESTRUCTURA EN ALUMINIO O METALICA CON PINTURA ELECTROESTATICA, INCLUYE NIVELADORES.	m^2		$ 669.915,00	$0			2,83	-	-	1.895.859,45	2,83	1.895.859,45	
NP-07	DIVISION EN VIDRIO LAMINADO 3+3 SOBRE MESON DE ATENCION AL PUBLICO DE 1.10 M DE ALTURA Y ANCHO 1.50 M.,INCLUYE PASAVOZ, PASADOCUMENTOS, MONTANTE DE 20 CENTIMETROS TERMINADO EN FORMICA A DOS CARAS Y ESTRUCTURA (DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD)	m^2		$ 955.055,00	$0			3,70	-	-	3.533.703,50	3,70	3.533.703,50	
NP-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON TIPO MOSTRADOR DE ATENCION AL PUBLICO DE ALTURA ENTRE 0.90 A 1.10 m, ANCHO 1,50 m. INCLUYE MESON SUPERIOR DE 30 cm POSFORMADO EN FORMICA ESPERSOR 30MM A DOS CARAS Y FRONTAL SEGÚN DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD.	un		$ 1.300.540,00	$0			2,00	-	-	2.601.080,00	2,00	2.601.080,00	
NP-09	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO, ALTO 2,20 m, ESTRUCTURA EN LÁMNA, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA, PANELES EN MADERA CON ACABADO EN FÓRMICA, INCLUYE VIDRIO CON SANBLASTING , MONTANTE DE 0,20 MTS Y EMPAQUES, EL MATERIAL Y ACABADO SERÁ EL UTILIZADO INSTITUCIONALMENTE POR LA ENTIDAD. INCLUYE PUERTAS EN VIDRIO DE 6 MM CON ESTRUCTURA METALICA O ALUMINIO, CERRADURA, BISAGRAS, EN LOS SITIOS QUE SE REQUIERA.	m^2		915.366,00 $	$0			1,96	-	-	1.794.117,36	1,96	1.794.117,36	
NP-10	DESMONTES DE DIVISONES PISO TECHO, MEDIA ALTURA Y VENTANILLAS	M2		74.074,00 $	$0			13,06	-	-	967.406,44	13,06	967.406,44	
	SALDO POR AJUSTAR				**$191.179.447**									**210.919.146**

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

-$19.739.698



IVAN ENRIQUE GRANADOS PULIDO
REPRSENTANTE LEGAL CONOSRCIO SNR-08 2024
CONTRATISTA

ING. JACQUELINE DEL CARMEN GUZMAN HERAZO
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

PROCESO DE PRODUCCION:

Se realiza consolidado de cantidades de elementos correspondientes a las diferentes sedes a intervenir

Se realizan las diferentes ordenes de producción, identificándolas por sedes a intervenir

Se realiza proceso de compras de materias primas e insumos

Proceso de recepción y verificación de materiales por parte del almacenista

Proceso de distribución de materiales e insumos a las diferentes áreas de producción

PROCESO DE METALMECANICA :

Corte de Lamina con cortadora CNC
Punzonado y/o troquelado de lamina
Doblado de lamina
Soldadura de punto
Soldadura MIG
Desengrase y lavado de piezas
Proceso de pintura electrostática
Ensamble
Control de Calidad
Empaque

PROCESO MADERA:

Corte de laminas de aglomerado
Corte de laminado decorativo
Enchape de superficies
fijación de Canto rígido
Ensamble
Limpieza
Empaque

SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRÁFICO DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN:

3.- Se incia proceso de producción con las siguientes actividades:

Planos de producción
Requerimiento de materias primas
Gestión de compras
Recibo de materiales en planta
Proceso de metalmecánica:

METALMECANICA



METALMECANICA



CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

PROCESOS CARPINTERIA MNADERA:

PLANTA DE FABRICACIÓN
COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS

CARPINTERIA



CARPINTERIA




CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

ALISTAMIENTO DE MATERIALES :





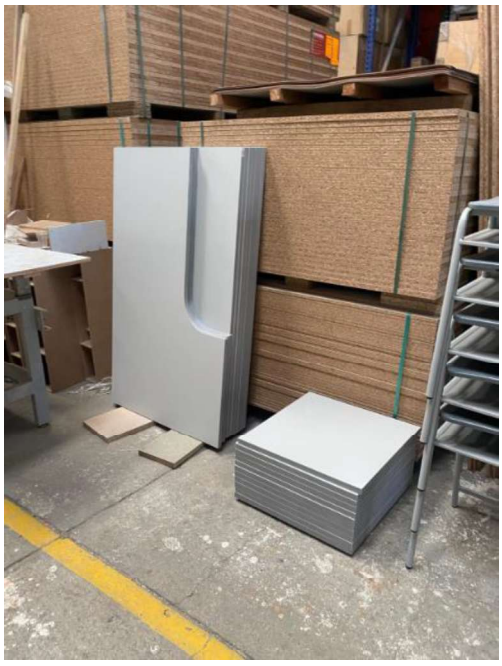

CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

De acuerdo con priorización de intervenciones, en los meses de noviembre a diciembre se realiza intervenciones en las siguientes sedes:

ORIP ACACIAS META:

Se realiza la respectiva entrega e instalación del mobiliario entrega respectivo.

PRORROGA DEL CONTRATO:

Teniendo en cuenta los factores que afectaron el normal desarrollo y ejecución del contrato, especialmente aquellos relacionados con el desabastecimiento y la escasez de materiales, el día 21 de diciembre se solicitó formalmente una prórroga al contrato. Esta solicitud tuvo como finalidad garantizar la culminación satisfactoria de las actividades pactadas

En atención a nuestra solicitud, la entidad contratante aprobó la prórroga del contrato, extendiendo su plazo de ejecución hasta el día 15 de febrero de 2025. Esta ampliación permitirá culminar de manera adecuada las labores restantes, asegurando el cumplimiento de los objetivos contractuales establecidos

Se anexa cronograma ajustado de acuerdo con la prórroga:

CRONOGRAMA							FECHA ENTREGA E INSTALACION																									
	DICIEMBRE						ENERO												FEBRERO													
							1	19	#	21	#	#	#	#	#	#	#	#	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SEDES AINTERVENIR	21	#	#				MI	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S
ACACIAS	ENTREGA E INTALA																																	
COCUY									RECIBO MATERILES PENDIETES					PROCESO DE PRODUCCION PENDITE								DESÁCHO E INTALACION													
DUITAMA									RECIBO MATERILES PENDIETES								PROCESO DE PRODUCCION PENDIENTE											DESPACHO E INSTALACION						
MONIQUIRA									RECIBO MATERILES PENDIETES								PROCESO DE PRODUCCION PENDIENTE											DESPACHO E INSTALACION						
					TOTAL																														

Dando cumplimiento al cronograma ajustado se continua la intervención de las sedes pendientes, y a solicitud de la entidad se firmó adición y prórroga del contrato, adición que contemplo la intervención de ORIP CHIQUINQUIRA, ORIP NUQUI Y ORIP PITALITO, y ala vez el contrato se prorrogo hasta el día 12 de marzo de 2025.

De acuerdo con lo anterior se ajusta el respectivo cronograma incluidas sedes de la adcion

CRONOGRAMA AJUSTADO CON ADICION SEDES A INTERVENIR

CRONOGRAMA	FECHA ENTREGA E INSTALACION									
	enero de 2025				febrero de 2025				marzo de 2025	
	SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS	
SEDES AINTERVENIR	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
ACACIAS	ENTREGADO E INSTALADO									
COCUY										
DUITAMA										
MONIQUIRA										
NUQUI										
PITALITO										
CHIQUINQUIRA										

Se realizan intervenciones e instalaciones de la totalidad de las sedes y cumplimiento 100% se adjuntan actas de recibo y registros fotográficos, copias de facturas y certificación de cumplimiento ..

ACTA DE RECIBO (PARCIAL No.1)
LUGAR DE EJECUCION : ORIP ACACIAS

PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)	viernes 1 de noviembre de 2024	HASTA (dd-mm-aa)	jueves 6 de febrero de 2025

CONTRATO Nº	2401 DE 2024	VALOR:	$ 763.425.604,00
		ADICION	$ 363.014.839,00
		VALOR TOTAL	$ 1.126.440.443,00
CONTRATISTA	COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS NI. 901.011.888-9	OBJETO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR POR AGRUPACIONES"	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	JACQUELINE GUZMAN ERAZO		

A LOS SEIS (6) DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2025 , SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: IVAN ENRIQUE GRANADOS PULIDO CON CC. 1.020.745.211 DE BOGOTA, REPRSENTANTE LEGAL DE COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS , CONTRATISTA, Y JACQUELINE GUZMAN ERAZO , SUPERVISORA DEL CONTRATO POR PARTE DE LA SNR , CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
	MUEBLES (SI APLICA)							
								$ 77.359.184
1,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTO DE TRABAJO PARA DIRECTOR O REGISTRADOR, EL PUESTO TENDRA UNA FORMA DE "U", CON TRES SUPERFICIES INDEPENDENTES ESPESOR 30MM, CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS, CON DIMENSIONES DE 1,80M X 0.70M; DE 1,00 X 0.60 M Y UNA DETRÁS DE 1.80 X 0.60 M, CADA UNA CON BASES METALICAS INDEPENDIENTES, CON BORDES O CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REBORDEADAS,CAJONERA METALICA CON DOS CAJONES ESTANDAR Y UNO PARA ARCHIVO DE CARPETAS CON CERRADURA, 2 SILLAS INTERLOCUTORAS, BASURERA METALICA, PAPELERA METALICA, SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE,CABECERO, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO TIPO GERENTE , DESCANSA PIES.	un	1,00	1	1	$ 4.105.316,81	$ 4.105.317	
1,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DE 1.50 X 1.50 EN L, SUPERFICIES ESPESOR 30 MM, CON ACABADO FORMICA A DOS CARAS, EL ANCHO DE LA SUPERFICIE SERA DE 60 CM , EL CHAFLAN QUE CONFORMA LA PARTE INTERNA DE LAS SUPERFICIES DEBERÁ IR CURVO, BORDES CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REDORDEADAS. BASES METALICAS INDEPENDIENTES CON NIVELADORES, CAJONERA METALICA DE DOS CAJONES Y UNO DE ARCHIVADO PROVISTA DE CHAPA. INCLUYE SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO, BASURERA, PAPELERA Y DESCANZAPIES.	un	5,00	8	8	$ 2.929.917,65	$ 23.439.341	
1,03	DIVISION EN VIDRIO LAMINADO 3+3 SOBRE MESON DE ATENCION AL PUBLICO DE 1.10 M DE ALTURA Y ANCHO 1.50 M.,INCLUYE PASAVOZ, PASADOCUMENTOS, MONTANTE DE 20 CENTIMETROS TERMINADO EN FORMICA A DOS CARAS Y ESTRUCTURA (DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD)	m2	5,40	7	7	$ 802.567,23	$ 5.617.971	
1,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERFICIE DE TRABAJO ESPESOR 30MM CON ACABADO EN FÓRMICA A DOS CARAS Y BASES METÁLICAS DE 1,50 m DE LARGO POR 0,60 m DE ANCHO, REMATE PERIMETRAL CON CANTO EN CAUCHO U OTRO MATERIAL RESISTENTE A LOS IMPACTOS, EL ACABADO DEBE SER IGUAL AL DE LAS SUPERFICIES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.	un	3,00	2	2	$ 959.448,74	$ 1.918.897	
1,09	SUMINISTRO DE TAPETE ATRAPA POLVO PARA INGRESO A LA OFICINA DE REGISTRO DE 1,70 X 0,90 NEGRO Y PERFIL DE REMATE, INLCUYE LOGO DE LA ENTIDAD	m2	1,00	1	1	$ 759.956,30	$ 759.956	
1,16	CAJONERA METALICA DE DOS CAJONES Y UNO DE ARCHIVADO PROVISTA DE CHAPA CON SISITEMA DETRAMPA EN EL CAJON PRINCIPAL PARA EL BLOQUEO DEL RESTO DE LOS CAJONES.	un	3,00	3	3	$ 597.871,43	$ 1.793.614	
1,16	MUEBLE AUXILIAR BAJO DE 0.90 X 0.50 X 0.70 m DE ALTO CON PUERTAS METALICAS CON PINTURA ELECTROSTATICA, ENTREPAÑO. INCLUYE SUPERFICIE ENCHAPADA EN FORMICA Y NIVELADORES.	un	2,00	3	3	$ 1.103.698,32	$ 3.311.095	
1,23	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO DE 2 MTS DE ALTO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA	m2	1,00	2	2	$ 2.376.682,35	$ 4.753.365	
1,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIBLIOTECA EN FORMICA ESPESOR 19MM AMBAS CARAS PARA OFICINA DOS MUEBLES INDEPENDIENTES CON DIMENSIONES: MUEBLE BAJO (1,20 DE LARGO, 0,52 DE ANCHO Y 0.94 DE ALTO INCLUIDO BASE CON ENTREPAÑO Y CUATRO CAJONES, CON ESPALDAR) MUEBLE ALTO (1,20 DE LARGO, 1,08 DE ALTO ,0.30 DE ANCHO CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES, CON ESPALDAR). C	m2	2,00	1	1	$ 2.999.409,24	$ 2.999.409	
1,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE METALICO Y MECANICO FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED. CADA CUERPO CON MEDIDAS LIBRES DE 1,10 X 0,45 X 2,10-2,20 M, CON 6 ESPACIOS UTILES Y 5 ENTREPAÑOS DE 0,45 M DE FONDO LIBRES EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22. CONSTA DE PARALES EN "L" FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 CON TROQUELADO DE UÑA SOBRE SÍ MISMO PARA AJUSTAR A UNA ALTURA MODULAR DE 31 CM ENTRE CADA ENTREPAÑOS. LAS UNIDADES DE CONSULTA INCLUYEN TENSORES GRADUABLES	un	20,00	10	10	$ 2.060.152,94	$ 20.601.529	
1,26	ESTANTE METÁLICO DE 2.00M ALTO POR 0.50M DE PROFUNDIDAD POR 0.90 M DE ANCHO, DE 5 ESPACIOS UTILES, PARALES EN CAL 16, ENTREPAÑOS EN CAL 20 REFORZADO PARA RESISTIR CADA UNO UN PESO DE 150 Kg	un	2,00	4	4	$ 972.484,87	$ 3.889.939	
1,27	ARCHIVADOR VERTICAL TRES GAVETAS: ELABORADO EN LÁMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. CUENTA CON NIVELADORES EN NYLON INYECTADO, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSION, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCIÓN CON LLAVE. ESTÁ PROVISTO DE TRES (3) GAVETAS EXTRAÍBLES Y SISTEMA ANTI-VUELCO DE SEGURIDAD QUE IMPIDE LA APERTURA DE UN CAJÓN SI OTRO ESTÁ ABIERTO. ALTURA: 105 CM ANCHO: 47 CM, FONDO: 60 CM	un	3,00	3	3	$ 1.389.583,19	$ 4.168.750	

1,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO INSTITUCIONAL EN PANAFLEX IMPRESO PARA EXTERIOR, SEGÚN DISEÑO Y MEDIDA, CON CAJA EN ALUMNIO DE 0,10M DE ESPESOR SIN LUZ.	m2	2,60	0	0	$ 1.054.461,34	$ -	
2,00	OBRAS ADICIONALES							**$ 4.102.199,18**
2.08	DESMONTE, TRASLADO, REUBICACIÓN DE DOCUMENTOS, INCLUYE SUMINISTRO DE CAJAS PARA SU MANIPULACION. EL VALOR UNITARIO SE ESTABLECE POR ESTANTE LLENO DE SEIS ESPACIOS UTILES	un	20,00	12	12	$ 113.115,97	**$ 1.357.392**	
2.09	DESMONTE DE ESTANTE DE ARCHIVO RODANTE O FIJO INCLUIDA PUERTAS Y ESTRUCTURA EXISTENTE, UBICANDOLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LA ORIP	un	20,00	12	12	$ 118.916,81	**$ 1.427.002**	
2.10	MANTENIMIENTO MODULO GENERAL Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ARCHIVO RODANTE, INCLUYE HERRAJES,ANCLAJES, TENSORES, CADENAS, CHAPAS, TORNILLERÍA Y DEMAS ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m2	6,00	0	0	$ 157.870,59	$ -	
2.11	DESMONTE PUESTO DE TRABAJO Y UBICACIÓN EN EL LUGAR QUE SE INDIQUE	un	6,00	6	6	$ 52.207,56	**$ 313.245**	
2.12	RETIRO Y ADECUACION DE MESON INTERNO, INCLUYE DEMOLICION, RESANE, PINTURA Y TRASCIEGO DE ESCOMBROS	un	2,70	6,43	6,43	$ 156.230,25	**$ 1.004.561**	
2.15	DEMOLICION MESON DE ATENCION AL PUBLICO. INCLUYE MURO, MESON ALTO Y BAJO, RESANE Y CERAMINCA SIMILAR A LA EXISTENTE EN PISO (Instalacion Ceramica Piezas Completas).	UN	1,50	0	0	$ 193.397,48	$ -	
2.16	RETIRO AVISO ORIP Y UBICACIÓN DONDE INDIQUE LA ENTIDAD	UN	1,00	0	0	$ 43.927,73	$ -	
	NO PREVISTOS							**$ 14.340.001,70**
NP-01	SUPERFICIE DE 1,50 X 0.60 CON CAJONERA (PUESTO SENCILLO)	UN	0,00	1	1	$ 2.158.571,43	**$ 2.158.571**	
NP-02	DIVION PISO TECHO	UN	0,00	2,47	2,47	$ 769.215,13	**$ 1.899.961**	
NP-03	DIVISIONES MEDIA ALTUR<	UN	0,00	17,6	17,6	$ 562.953,78	**$ 9.907.987**	
NP-04	DESMONTE DIVISIONES VENTANILLAS SOBRE MESON	UN	0,00	6	6	$ 62.247,06	**$ 373.482**	
	TOTAL COSTO DIRECTO							**$ 95.801.384,91**
	COSTOS INDIRECTOS							
	IVA	%	19%					**$ 18.202.263,13**

VALOR TOTAL MUEBLES	**$ 114.003.648,04**

VALOR TOTAL ORIP ACACIAS	**$ 114.003.648,04**

BALANCE PRESUPUESTAL


VALOR INICIAL CONTRATO	**$ 763.425.604,00**
VALOR ADICIÓN N°1	**$ 363.014.839,00**
VALOR ACTUAL CONTRATO	**$ 1.126.440.443,00**

VALOR ANTICIPO	
PORCENTAJE DE ANTICIPO	

ACTA No	VALOR DEL ACTA	% EJECUTADO DEL CONTRATO	% A PAGAR	VALOR ACTA A PAGAR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	VALOR A PAGAR DEL CONTRATO AMORTIZANDO ANTIICPO	SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO
1	$114.003.648,04	10,1%	10%	**$114.003.648,04**			**$114.003.648,04**	**$ 1.012.436.794,96**
2								
3								
4								
5								
TOTALES								

NOTA: EL CONTRATISTA REALIZA EL COBRO DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGO CONTRACTUAL, EN LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA.

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:



IVAN ENRIQUE GRANADOS PULIDO
Representante Legal
CONSORCIO SNR-08 2024
CONTRATISTA

JACQUELINE GUZMAN ERAZO
SUPERVISORA DEL CONTRATO
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

REGISTRO FOTOGRAFICO ORIP ACACIAS META





CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com





CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

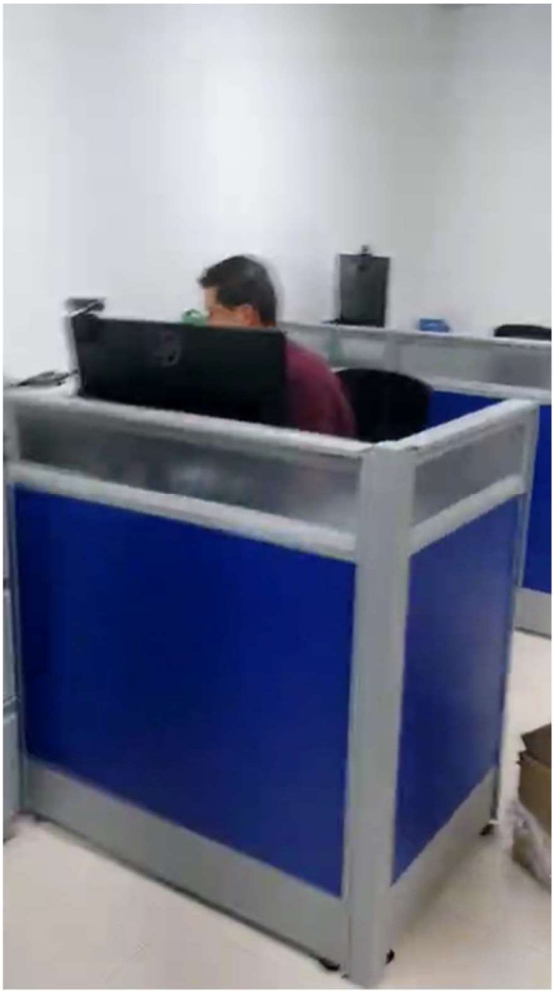

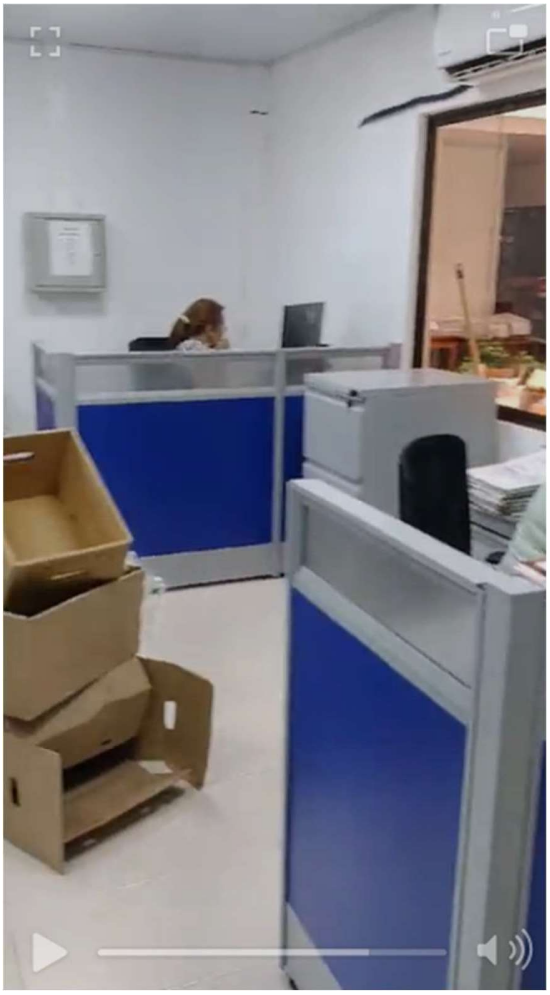

CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com



CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com





CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

ACTA DE RECIBO FINAL
LUGAR DE EJECUCION : ORIP COCUY

PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)	viernes 1 de noviembre de 2024	HASTA (dd-mm-aa)	domingo 11 de febrero de 2024

CONTRATO Nº	2401 DE 2024	VALOR:	$ 763.425.604,00
		ADICION	$ 363.014.839,00
		VALOR TOTAL	$ 1.126.440.443,00
CONTRATISTA	COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS NI. 901.011.888-9	OBJETO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR POR AGRUPACIONES"	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	JACQUELINE GUZMAN ERAZO		

A LOS doce (12) DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2025 , SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: IVAN ENRIQUE GRANADOS PULIDO CON CC. 1.020.745.211 DE BOGOTA, REPRSENTANTE LEGAL DE COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS , Y JACQUELINE GUZMAN HERAZO , SUPERVISORA DEL CONTRATO POR PARTE DE LA SNR , CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
	MUEBLES (SI APLICA)							
								$ 95.180.408
1,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTO DE TRABAJO PARA DIRECTOR O REGISTRADOR, EL PUESTO TENDRA UNA FORMA DE "U", CON TRES SUPERFICIES INDEPENDENTES ESPESOR 30MM, CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS, CON DIMENSIONES DE 1,80M X 0.70M; DE 1,00 X 0.60 M Y UNA DETRÁS DE 1.80 X 0.60 M, CADA UNA CON BASES METÁLICAS INDEPENDIENTES, CON BORDES O CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REBORDEADAS,CAJONERA METALICA CON DOS CAJONES ESTANDAR Y UNO PARA ARCHIVO DE CARPETAS CON CERRADURA, 2 SILLAS INTERLOCUTORAS, BASURERA METALICA, PAPELERA METALICA, SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE,CABECERO, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO TIPO GERENTE , DESCANSA PIES.	un	1,00	1	1	$ 4.105.316,81	$ 4.105.317	
1,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DE 1.50 X 1.50 EN L, SUPERFICIES ESPESOR 30 MM, CON ACABADO FORMICA A DOS CARAS, EL ANCHO DE LA SUPERFICIE SERA DE 60 CM , EL CHAFLAN QUE CONFORMA LA PARTE INTERNA DE LAS SUPERFICIES DEBERÁ IR CURVO, BORDES CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REDORDEADAS. BASES METALICAS INDEPENDIENTES CON NIVELADORES, CAJONERA METALICA DE DOS CAJONES Y UNO DE ARCHIVADO PROVISTA DE CHAPA. INCLUYE SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO, BASURERA, PAPELERA Y DESCANZAPIES.	un	4,00	4	4	$ 2.929.917,65	$ 11.719.671	
1,03	DIVISION EN VIDRIO LAMINADO 3+3 SOBRE MESON DE ATENCION AL PUBLICO DE 1.10 M DE ALTURA Y ANCHO 1.50 M.,INCLUYE PASAVOZ, PASADOCUMENTOS, MONTANTE DE 20 CENTIMETROS TERMINADO EN FORMICA A DOS CARAS Y ESTRUCTURA (DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD)	m2	3,30	3,3	3,3	$ 802.567,23	$ 2.648.472	
1,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERFICIE DE TRABAJO ESPESOR 30MM CON ACABADO EN FÓRMICA A DOS CARAS Y BASES METÁLICAS DE 1,50 m DE LARGO POR 0,60 m DE ANCHO, REMATE PERIMETRAL CON CANTO EN CAUCHO U OTRO MATERIAL RESISTENTE A LOS IMPACTOS, EL ACABADO DEBE SER IGUAL AL DE LAS SUPERFICIES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.	un	3,00	3	3	$ 959.448,74	$ 2.878.346	
1,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERFICIE DE TRABAJO ESPESOR 30MM, CON ACABADO EN FÓRMICA A DOS CARAS Y BASES METÁLICAS DE 0,8 m DE LARGO POR 0,60 m DE ANCHO, CON ENTREPAÑO. REMATE PERIMETRAL CON CANTO EN CAUCHO U OTRO MATERIAL RESISTENTE A LOS IMPACTOS, EL ACABADO DEBE SER IGUAL AL DE LAS SUPERFICIES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO	un	1,00	1	1	$ 805.394,96	$ 805.395	
1,09	SUMINISTRO DE TAPETE ATRAPA POLVO PARA INGRESO A LA OFICINA DE REGISTRO DE 1,70 X 0,90 NEGRO Y PERFIL DE REMATE, INLCUYE LOGO DE LA ENTIDAD	un	1,00	1	1	$ 759.956,30	$ 759.956	
1,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS TIPO SHERT O SIMILAR	m2	15,00	4,8	4,8	$ 347.771,43	$ 1.669.303	
1,16	CAJONERA METALICA DE DOS CAJONES Y UNO DE ARCHIVADO PROVISTA DE CHAPA CON SISITEMA DETRAMPA EN EL CAJON PRINCIPAL PARA EL BLOQUEO DEL RESTO DE LOS CAJONES.	un	4,00	4	4	$ 597.871,43	$ 2.391.486	
1,16	MUEBLE AUXILIAR BAJO DE 0.90 X 0.50 X 0.70 m DE ALTO CON PUERTAS METALICAS CON PINTURA ELECTROSTATICA, ENTREPAÑO. INCLUYE SUPERFICIE ENCHAPADA EN FORMICA Y NIVELADORES.	un	2,00	4	4	$ 1.103.698,32	$ 4.414.793	
1,21	SUMINISTRO E INSTALACION MESA DE JUNTAS REDONDA EPESOR 30MM, DE 1,10 m DE DIAMETRO, ACABADO EN FÓRMICA A DOS CARAS Y BASE METÁLICA, REMATE PERIMETRAL CON CANTO EN CAUCHO U OTRO MATERIAL RESISTENTE A LOS IMPACTOS, EL ACABADO DEBE SER IGUAL AL DE LAS SUPERFICIES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, INCLUYE 4 SILLAS INTERLOCUTORAS	un	1,00	1	1	$ 1.694.763,03	$ 1.694.763	
1,23	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO DE 2 MTS DE ALTO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA	un	2,00	4	4	$ 2.376.682,35	$ 9.506.729	
1,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIBLIOTECA EN FORMICA ESPESOR 19MM AMBAS CARAS PARA OFICINA DOS MUEBLES INDEPENDIENTES CON DIMENSIONES: MUEBLE BAJO (1,20 DE LARGO, 0,52 DE ANCHO Y 0.94 DE ALTO INCLUIDO BASE CON ENTREPAÑO Y CUATRO CAJONES, CON ESPALDAR) MUEBLE ALTO (1,20 DE LARGO, 1,08 DE ALTO ,0.30 DE ANCHO CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES, CON ESPALDAR). C	un	1,00	1	1	$ 2.999.409,24	$ 2.999.409	

1,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE METALICO Y MECANICO FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED. CADA CUERPO CON MEDIDAS LIBRES DE 1,10 X 0,45 X 2,10-2,20 M, CON 6 ESPACIOS UTILES Y 5 ENTREPAÑOS DE 0,45 M DE FONDO LIBRES EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22. CONSTA DE PARALES EN "L" FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 CON TROQUELADO DE UÑA SOBRE SÍ MISMO PARA AJUSTAR A UNA ALTURA MODULAR DE 31 CM ENTRE CADA ENTREPAÑOS. LAS UNIDADES DE CONSULTA INCLUYEN TENSORES GRADUABLES DIAGONALES LATERALES EN PLATINA DE 3/4" X 1/8" Y DIAGONALES POSTERIORES EN PLATINA DE 3/4" X 1/4" CON TEMPLETE DE 1/4", CON EL FIN DE BRINDARLE MAYOR ESTABILIDAD Y RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA. CADA ENTREPAÑO CONTARÁ CON DOS REFUERZOS EN LÁMINA CALIBRE 16 PARA SOPORTAR UNA CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA DE 100 KG/M.	un	24,00	18	18	$ 2.060.152,94	$ 37.082.753	
1,26	ESTANTE METÁLICO DE 2.00M ALTO POR 0.50M DE PROFUNDIDAD POR 0.90 M DE ANCHO, DE 5 ESPACIOS UTILES, PARALES EN CAL 16, ENTREPAÑOS EN CAL 20 REFORZADO PARA RESISTIR CADA UNO UN PESO DE 150 Kg	un	3,00	10	10	$ 972.484,87	$ 9.724.849	
1,27	ARCHIVADOR VERTICAL TRES GAVETAS: ELABORADO EN LÁMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. CUENTA CON NIVELADORES EN NYLON INYECTADO, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSION, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCIÓN CON LLAVE. ESTÁ PROVISTO DE TRES (3) GAVETAS EXTRAÍBLES Y SISTEMA ANTI-VUELCO DE SEGURIDAD QUE IMPIDE LA APERTURA DE UN CAJÓN SI OTRO ESTÁ ABIERTO. ALTURA: 105 CM ANCHO: 47 CM, FONDO: 60 CM	un	2,00	2	2	$ 1.389.583,19	$ 2.779.166	
1,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO INSTITUCIONAL EN PANAFLEX IMPRESO PARA EXTERIOR, SEGÚN DISEÑO Y MEDIDA, CON CAJA EN ALUMNIO DE 0,10M DE ESPESOR SIN LUZ.	m2	2,60	0	0	$ 1.054.461,34	$ -	
2,00	OBRAS ADICIONALES							**$ 6.113.303,87**
2,02	DESMONTE Y REINSTALACION EN NUEVA UBICACION DE PUESTOS DE TRABAJO, INCLUYE DIVISION EN DONDE EXISTA	un	2,00	3	3	$ 61.218,49	$ 183.655	
2.06	DESMONTE Y REINSTALACION DE CANALETA DE RED REGULADA Y LOGICA	ML	3,00	3	3	$ 15.892,44	$ 47.677	
2.07	TRASLADO DE PUNTO DE RED LOGICA,NORMAL Y REGULADA. (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	UN	2,00	2	2	$ 128.834,45	$ 257.669	
2.08	DESMONTE, TRASLADO, REUBICACIÓN DE DOCUMENTOS, INCLUYE SUMINISTRO DE CAJAS PARA SU MANIPULACION. EL VALOR UNITARIO SE ESTABLECE POR ESTANTE LLENO DE SEIS ESPACIOS UTILES	UN	24,00	24	24	$ 113.115,97	$ 2.714.783	
2.09	DESMONTE DE ESTANTE DE ARCHIVO RODANTE O FIJO INCLUIDA PUERTAS Y ESTRUCTURA EXISTENTE, UBICANDOLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LA ORIP	UN	24,00	20	20	$ 118.916,81	$ 2.378.336	
2.11	DESMONTE PUESTO DE TRABAJO Y UBICACIÓN EN EL LUGAR QUE SE INDIQUE	UN	5,00	0	0	$ 52.207,56	$ -	
2.12	RETIRO Y ADECUACION DE MESON INTERNO, INCLUYE DEMOLICION, RESANE, PINTURA Y TRASCIEGO DE ESCOMBROS	M2	1,50	3,4	3,4	$ 156.230,25	$ 531.183	
2.14	ADECUACION DE MESON PRIORITARIO, INCLUYE DESMONETE Y REINSTALACION DE MESON EN MATERIAL EXISTENTE, CORTE EN CONCRETO, DEMOLICION MURO A LA ALTURA DE ATENCION PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE MOVILIDADL, RESANE DE PARED CON PINTURA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS.	ML	1,50	0	0	$ 155.466,39	$ -	
2.16	RETIRO AVISO ORIP Y UBICACIÓN DONDE INDIQUE LA ENTIDAD	UN	1,00	0	0	$ 43.927,73	$ -	
	ADICIONALES NO P´REVISTOS							**$ 5.530.678,99**
1,07	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO, ALTO 2,20 m, ESTRUCTURA EN LÁMINA, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA, PANELES EN MADERA CON ACABADO EN FÓRMICA, INCLUYE VIDRIO CON SANBLASTING , MONTANTE DE 0,20 MTS Y EMPAQUES, EL MATERIAL Y ACABADO SERÁ EL UTILIZADO INSTITUCIONALMENTE POR LA ENTIDAD. INCLUYE PUERTAS EN VIDRIO DE 6 MM CON ESTRUCTURA METALICA O ALUMINIO, CERRADURA, BISAGRAS, EN LOS SITIOS QUE SE REQUIERA.	m2	-	1,8	1,8	$ 769.215,13	$ 1.384.587	
1,22	DIVISION A MEDIA ALTURA ENTRE 1,05 Y 1.10 m, ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS Y VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 mm SAMBLASTIADO, (DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD) ESTRUCTURA EN ALUMINIO O METALICA CON PINTURA ELECTROESTATICA, INCLUYE NIVELADORES.	m2	-	7	7	$ 562.953,78	$ 3.940.676	
2,01	DESMONTE DE DIVISION PISO TECHO, DIVISIONES A MEDIA ALTURA, MESON, DIVISIONES EN VIDRIO SOBRE MESON. INCLUYE RETIRO Y DISPISICIÓN FINAL.	m2	-	3,3	3,3	$ 62.247,06	$ 205.415	
	TOTAL COSTO DIRECTO							**$ 106.824.391,18**
	COSTOS INDIRECTOS							
	IVA	%	19%					**$ 20.296.634,32**

VALOR TOTAL MUEBLES	**$ 127.121.025,50**

VALOR TOTAL ORIP COCUY	**$ 127.121.025,50**

BALANCE PRESUPUESTAL


VALOR INICIAL CONTRATO	**$ 763.425.604,00**
VALOR ADICIÓN N°1	**$ 363.014.839,00**
VALOR ACTUAL CONTRATO	**$ 1.126.440.443,00**

VALOR ANTICIPO	
PORCENTAJE DE ANTICIPO	

ACTA No	VALOR DEL ACTA	% EJECUTADO DEL CONTRATO	% A PAGAR	VALOR ACTA A PAGAR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	VALOR A PAGAR DEL CONTRATO AMORTIZANDO ANTIICPO	SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO
1	$114.003.648,04	10,1%	10%	**$114.003.648,04**			**$114.003.648,04**	**$ 1.012.436.794,96**
2	$210.919.145,65	28,8%	19%	**$210.919.145,65**			**$210.919.145,65**	**$ 801.517.649,31**
3	$141.061.113,00	41,4%	13%	**$141.061.113,00**			**$141.061.113,00**	**$ 660.456.536,31**
4	$311.381.169,52	69,0%	28%	**$311.381.169,52**			**$311.381.169,52**	**$ 349.075.366,79**
5	$127.121.025,50	80,3%	11%	**$127.121.025,50**			**$127.121.025,50**	**$ 221.954.341,29**
6								
TOTALES			**80%**	**$904.486.101,71**			**$904.486.101,71**	

NOTA: EL CONTRATISTA REALIZA EL COBRO DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGO CONTRACTUAL, EN LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA.

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:



IVAN ENRIQUE GRANADOS PULIDO
Representante Legal
CONSORCIO SNR-08 2024
CONTRATISTA

JACQUELINE GUZMAN HERAZO
SUPERVISORA DEL CONTRATO
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

COLCONDI
colcondi.com todo para tu hogar y oficina

REGISTRO FOTOGRAFICO ORIP COCUY





CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com





CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com





CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

ACTA DE RECIBO FINAL
LUGAR DE EJECUCION : ORIP MONIQUIRA

PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)	viernes 1 de noviembre de 2024	HASTA (dd-mm-aa)	martes 12 de marzo de 2024

CONTRATO Nº	2401 DE 2024	VALOR:	$ 763.425.604,00
		ADICION	$ 363.014.839,00
		VALOR TOTAL	$ 1.126.440.443,00
CONTRATISTA	COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS NI. 901.011.888-9	OBJETO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR POR AGRUPACIONES"	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	JACQUELINE GUZMAN ERAZO		

A LOS doce (12) DIAS DEL MES DE MARZO DE 2025 , SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: IVAN ENRIQUE GRANADOS PULIDO CON CC. 1.020.745.211 DE BOGOTA, REPRSENTANTE LEGAL DE COLOMBIA CONSTRUCCIOONES Y DISEÑOS SAS , CONTRATISTA, Y JACQUELINE GUZMAN HERAZO , SUPERVISORA DEL CONTRATO POR PARTE DE LA SNR , CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
	MUEBLES (SI APLICA)							
								$ 141.626.069
1,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DE 1.50 X 1.50 EN L, SUPERFICIES ESPESOR 30 MM, CON ACABADO FORMICA A DOS CARAS, EL ANCHO DE LA SUPERFICIE SERA DE 60 CM , EL CHAFLAN QUE CONFORMA LA PARTE INTERNA DE LAS SUPERFICIES DEBERÁ IR CURVO, BORDES CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REDORDEADAS. BASES METALICAS INDEPENDIENTES CON NIVELADORES, CAJONERA METALICA DE DOS CAJONES Y UNO DE ARCHIVADO PROVISTA DE CHAPA. INCLUYE SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO, BASURERA, PAPELERA Y DESCANZAPIES.	un	3,00	5	5	$ 2.929.917,65	$ 14.649.588	
1,16	MUEBLE AUXILIAR BAJO DE 0.90 X 0.50 X 0.70 m DE ALTO CON PUERTAS METALICAS CON PINTURA ELECTROSTATICA, ENTREPAÑO. INCLUYE SUPERFICIE ENCHAPADA EN FORMICA Y NIVELADORES.	un	2,00	2	2	$ 1.103.698,32	$ 2.207.397	
1,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE METÁLICO Y MECÁNICO FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED. CADA CUERPO CON MEDIDAS LIBRES DE 1,10 X 0,45 X 2,10-2,20 M, CON 6 ESPACIOS UTILES Y 5 ENTREPAÑOS DE 0,45 M DE FONDO LIBRES EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22. CONSTA DE PARALES EN "L" FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 CON TROQUELADO DE UÑA SOBRE SÍ MISMO PARA AJUSTAR A UNA ALTURA MODULAR DE 31 CM ENTRE CADA ENTREPAÑOS. LAS UNIDADES DE CONSULTA INCLUYEN TENSORES GRADUABLES DIAGONALES LATERALES EN PLATINA DE 3/4" X 1/8" Y DIAGONALES POSTERIORES EN PLATINA DE 3/4" X 1/4" CON TEMPLETE DE 1/4", CON EL FIN DE BRINDARLE MAYOR ESTABILIDAD Y RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA. CADA ENTREPAÑO CONTARÁ CON DOS REFUERZOS EN LÁMINA CALIBRE 16 PARA SOPORTAR UNA CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA DE 100 KG/M. ASÍ MISMO CONSTARÁ CON TAPA SUPERIOR E INFERIOR DEL MISMO CALIBRE Y REFORZADOS PARA SOPORTAR UNA CARGA DE 100 KG/M. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA, PANELERÍA CON VISOR IDENTIFICADOR, ACABADOS FRONTALES Y LATERALES EN LÁMINA COLD ROLLED, LOS CUALES DEBEN CONTAR CON LA TOLERANCIA NECESARIA PARA QUE LOS ESTANTES NO QUEDEN PEGADOS AL ESTAR CERRADOS, QUE GARANTICE UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. DEBE CONTAR CON SISTEMA ANTIVUELCO QUE GARANTICE LA INTEGRIDAD DEL MISMO, INCLUYE ELEMENTOS METÁLICOS PARA QUE LAS CARPETAS NO SE CAIGAN HACIA LOS LADOS DE CADA UNO DE LOS ENTREPAÑOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE, INCLUYE MANIJAS PARA MOVERLO	un	66,00	60	60	$ 2.060.152,94	$ 123.609.176	
1,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO INSTITUCIONAL EN PANAFLEX IMPRESO PARA EXTERIOR, SEGÚN DISEÑO Y MEDIDA, CON CAJA EN ALUMNIO DE 0,10M DE ESPESOR SIN LUZ.	m2	2,60	1,1	1,1	$ 1.054.461,34	$ 1.159.907	
2,00	OBRAS ADICIONALES							**$ 13.757.400,84**
2.06	DESMONTE Y REINSTALACION DE CANALETA DE RED REGULADA Y LOGICA	ML	3,00	3	3	$ 15.892,44	$ 47.677	
2.07	TRASLADO DE PUNTO DE RED LOGICA,NORMAL Y REGULADA. (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	UN	1,00	4	4	$ 128.834,45	$ 515.338	
2.08	DESMONTE, TRASLADO, REUBICACIÓN DE DOCUMENTOS, INCLUYE SUMINISTRO DE CAJAS PARA SU MANIPULACION. EL VALOR UNITARIO SE ESTABLECE POR ESTANTE LLENO DE SEIS ESPACIOS UTILES	UN	46,00	56	56	$ 113.115,97	$ 6.334.494	
2.09	DESMONTE DE ESTANTE DE ARCHIVO RODANTE O FIJO INCLUIDA PUERTAS Y ESTRUCTURA EXISTENTE, UBICANDOLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LA ORIP	UN	46,00	56	56	$ 118.916,81	$ 6.659.341	
2.11	DESMONTE PUESTO DE TRABAJO Y UBICACIÓN EN EL LUGAR QUE SE INDIQUE	UN	1,00	3	3	$ 52.207,56	$ 156.623	
2.16	RETIRO AVISO ORIP Y UBICACIÓN DONDE INDIQUE LA ENTIDAD	UN	1,00	1	1	$ 43.927,73	$ 43.928	
	ADICIONALES NO PREVISTOS							$ 21.859.509,87

NP-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTO DE TRABAJO PARA DIRECTOR O REGISTRADOR, EL PUESTO TENDRA UNA FORMA DE "U", CON TRES SUPERFICIES INDEPENDENTES ESPESOR 30MM, CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS, CON DIMENSIONES DE 1,80M X 0.70M; DE 1,00 X 0.60 M Y UNA DETRÁS DE 1.80 X 0.60 M, CADA UNA CON BASES METALICAS INDEPENDIENTES, CON BORDES O CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REBORDEADAS,CAJONERA METALICA CON DOS CAJONES ESTANDAR Y UNO PARA ARCHIVO DE CARPETAS CON CERRADURA, 2 SILLAS INTERLOCUTORAS, BASURERA METÁLICA, PAPELERA METALICA, SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE,CABECERO, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO TIPO GERENTE , DESCANSA PIES.	un	-	1	1	$ 4.105.316,81	**$ 4.105.317**	
NP-02	SUMINISTRO E INSTALACION MESA DE JUNTAS REDONDA EPESOR 30MM, DE 1,10 m DE DIAMETRO, ACABADO EN FÓRMICA A DOS CARAS Y BASE METÁLICA, REMATE PERIMETRAL CON CANTO EN CAUCHO U OTRO MATERIAL RESISTENTE A LOS IMPACTOS, EL ACABADO DEBE SER IGUAL AL DE LAS SUPERFICIES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, INCLUYE 4 SILLAS INTERLOCUTORAS	un	-	1	1	$ 1.694.763,03	**$ 1.694.763**	
NP-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIBLIOTECA EN FORMICA ESPESOR 19MM AMBAS CARAS PARA OFICINA DOS MUEBLES INDEPENDIENTES CON DIMENSIONES: MUEBLE BAJO (1,20 DE LARGO, 0,52 DE ANCHO Y 0.94 DE ALTO INCLUIDO BASE CON ENTREPAÑO Y CUATRO CAJONES, CON ESPALDAR) MUEBLE ALTO (1,20 DE LARGO, 1,08 DE ALTO ,0.30 DE ANCHO CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES, CON ESPALDAR). C	un	-	1	1	$ 2.999.409,24	**$ 2.999.409**	
NP-04	SOFA DOBOLE DOS PUESTOS	UN	-	1	1	$ 2.394.957,98	**$ 2.394.958**	
NP-05	SUMINISTRO E INSTALACION SILLAS TANDEM 3 PUESTOS, ACABADO EN PLASTICO REFORZADO COLOR NEGRO EN ASIENTO Y ESPALDAR.ESTRUCTURA METALICA TUBO REDONDO MINIMO 22 MM CALIBRE 16CC O SIMILAR, PINTURA ELECTROSTATICA.	un	-	2	2	$ 798.007,56	**$ 1.596.015**	
NP-06	DIVISION A MEDIA ALTURA ENTRE 1,05 Y 1,10 m, ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS Y VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 mm SAMBLASTIADO, (DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD) ESTRUCTURA EN ALUMINIO O METALICA CON PINTURA ELECTROESTATICA, INCLUYE NIVELADORES.	m2	-	2,83	2,83	$ 562.953,78	**$ 1.593.159**	
NP-07	DIVISION EN VIDRIO LAMINADO 3+3 SOBRE MESON DE ATENCION AL PUBLICO DE 1.10 M DE ALTURA Y ANCHO 1.50 M.,INCLUYE PASAVOZ, PASADOCUMENTOS, MONTANTE DE 20 CENTIMETROS TERMINADO EN FORMICA A DOS CARAS Y ESTRUCTURA (DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD)	m2	-	3,7	3,7	$ 802.567,23	**$ 2.969.499**	
NP-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON TIPO MOSTRADOR DE ATENCION AL PUBLICO DE ALTURA ENTRE 0.90 A 1.10 m, ANCHO 1,50 m. INCLUYE MESON SUPERIOR DE 30 cm POSFORMADO EN FORMICA ESPERSOR 30MM A DOS CARAS Y FRONTAL SEGÚN DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD.	un	-	2	2	$ 1.092.890,76	**$ 2.185.782**	
NP-09	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO, ALTO 2,20 m, ESTRUCTURA EN LÁMINA, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA, PANELES EN MADERA CON ACABADO EN FÓRMICA, INCLUYE VIDRIO CON SANBLASTING , MONTANTE DE 0,20 MTS Y EMPAQUES, EL MATERIAL Y ACABADO SERÁ EL UTILIZADO INSTITUCIONALMENTE POR LA ENTIDAD. INCLUYE PUERTAS EN VIDRIO DE 6 MM CON ESTRUCTURA METALICA O ALUMINIO, CERRADURA, BISAGRAS, EN LOS SITIOS QUE SE REQUIERA.	m2	-	1,96	1,96	$ 769.215,13	**$ 1.507.662**	
NP-10	DESMONTES DE DIVISONES PISO TECHO, MEDIA ALTURA Y VENTANILLAS	M2	-	13,06	13,06	$ 62.247,06	**$ 812.947**	
	TOTAL COSTO DIRECTO							**$ 177.242.979,54**
	COSTOS INDIRECTOS							
	IVA	%	19%					**$ 33.676.166,11**

VALOR TOTAL MUEBLES	**$ 210.919.145,65**

VALOR TOTAL ORIP MONIQUIRA	**$ 210.919.145,65**

BALANCE PRESUPUESTAL


VALOR INICIAL CONTRATO	**$ 763.425.604,00**
VALOR ADICIÓN N°1	**$ 363.014.839,00**
VALOR ACTUAL CONTRATO	**$ 1.126.440.443,00**

VALOR ANTICIPO	
PORCENTAJE DE ANTICIPO	

ACTA No	VALOR DEL ACTA	% EJECUTADO DEL CONTRATO	% A PAGAR	VALOR ACTA A PAGAR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	VALOR A PAGAR DEL CONTRATO AMORTIZANDO ANTIICPO	SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO
1	$114.003.648,04	10,1%	10,1%	**$114.003.648,04**			**$114.003.648,04**	**$ 1.012.436.794,96**
2	$210.919.145,65	28,8%	18,7%	**$210.919.145,65**			**$210.919.145,65**	**$ 801.517.649,31**
TOTALES				**$324.922.793,69**			**$324.922.793,69**	**$ 801.517.649,31**

NOTA: EL CONTRATISTA REALIZA EL COBRO DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGO CONTRACTUAL, EN LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA.

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:



IVAN ENRIQUE GRANADOS PULIDO
Representante Legal
CONSORCIO SNR-08 2024
CONTRATISTA

JACQUELINE GUZMAN HERAZO
SUPERVISORA DEL CONTRATO
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

REGISTRO FOTOGRAFICO ORIP MONIQUIRA



CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com






CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com





CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

COLCONDI
colcondi.com todo para tu hogar y oficina

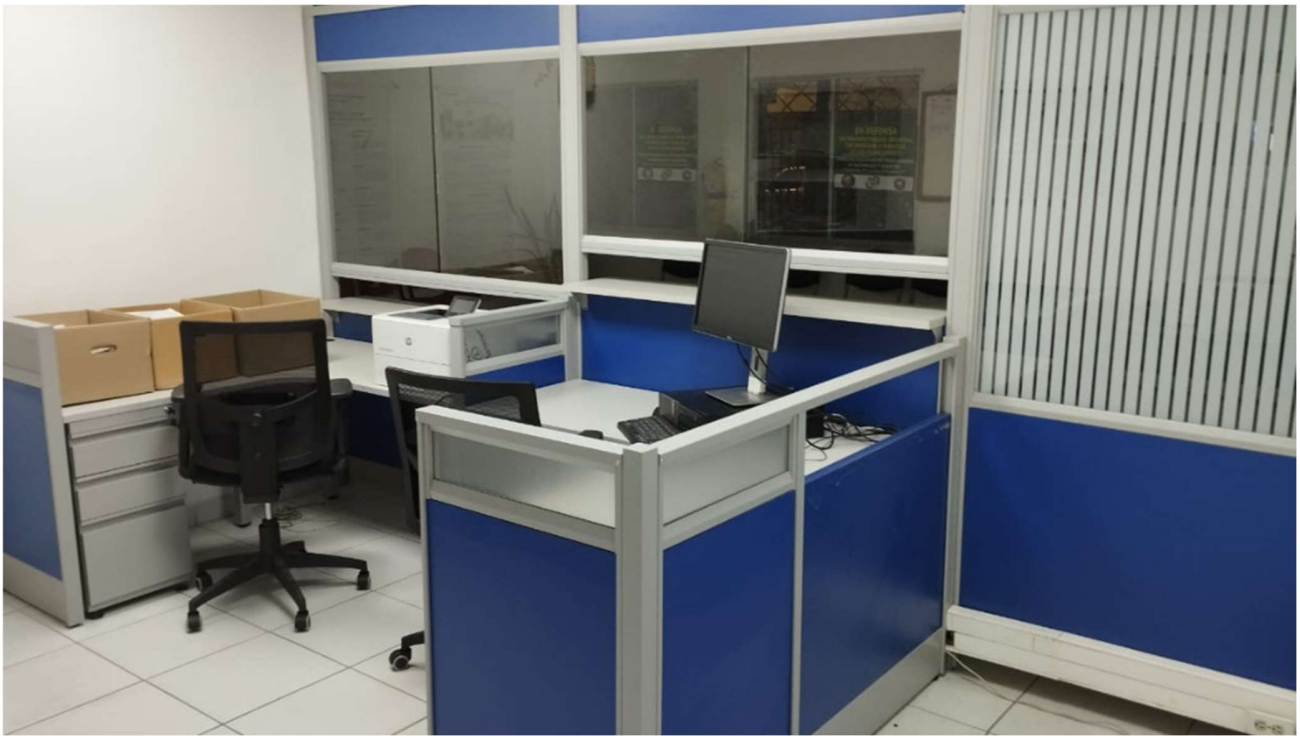



CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com



CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

COLCONDI
colcondi.com todo para tu hogar y oficina






CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com





CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com



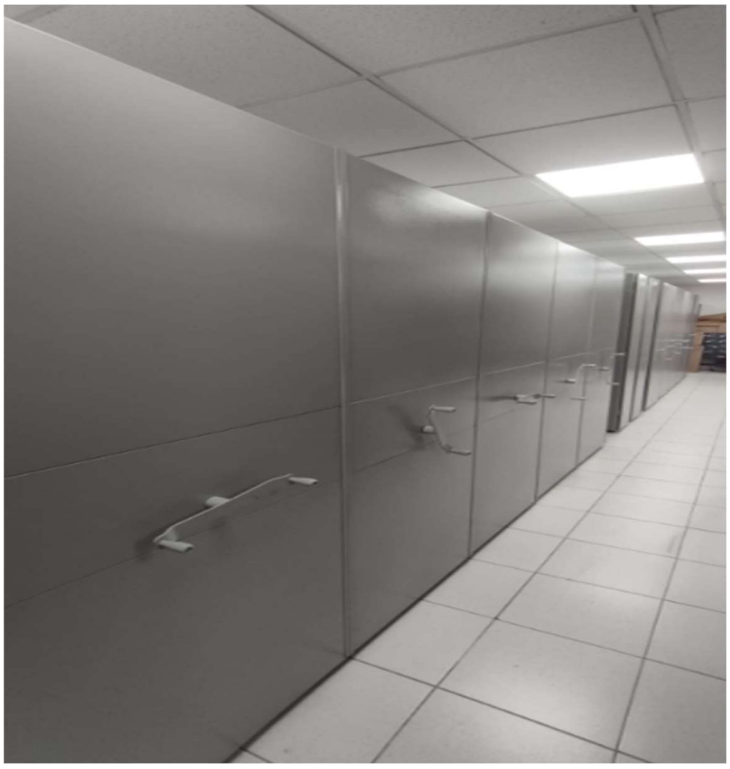

CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

ACTA DE RECIBO FINAL
LUGAR DE EJECUCION : ORIP DUITAMA

PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)	viernes 1 de noviembre de 2024	HASTA (dd-mm-aa)	domingo 11 de febrero de 2024

CONTRATO Nº	2401 DE 2024	VALOR:	$ 763.425.604,00
		ADICION	$ 363.014.839,00
		VALOR TOTAL	$ 1.126.440.443,00
CONTRATISTA	COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS NI. 901.011.888-9	OBJETO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR POR AGRUPACIONES"	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	JACQUELINE GUZMAN ERAZO		

A LOS DIEZ (10) DIAS DEL MES DE MARZO DE 2025 , SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: IVAN ENRIQUE GRANADOS PULIDO CON CC. 1.020.745.211 DE BOGOTA, REPRSENTANTE LEGAL DE COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS , CONTRATISTA, Y JACQUELINE GUZMAN HERAZO , SUPERVISORA DEL CONTRATO POR PARTE DE LA SNR , CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
	MUEBLES (SI APLICA)							
								$ 233.041.908
1,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTO DE TRABAJO PARA DIRECTOR O REGISTRADOR, EL PUESTO TENDRA UNA FORMA DE "U", CON TRES SUPERFICIES INDEPENDENTES ESPESOR 30MM, CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS, CON DIMENSIONES DE 1,80M X 0.70M; DE 1,00 X 0.60 M Y UNA DETRÁS DE 1.80 X 0.60 M, CADA UNA CON BASES METALICAS INDEPENDIENTES, CON BORDES O CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REBORDEADAS,CAJONERA METALICA CON DOS CAJONES ESTANDAR Y UNO PARA ARCHIVO DE CARPETAS CON CERRADURA, 2 SILLAS INTERLOCUTORAS, BASURERA METALICA, PAPELERA METALICA, SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE,CABECERO, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO TIPO GERENTE , DESCANSA PIES.	un	1,00	1	1	$ 4.105.316,81	$ 4.105.317	
1,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DE 1.50 X 1.50 EN L, SUPERFICIES ESPESOR 30 MM, CON ACABADO FORMICA A DOS CARAS, EL ANCHO DE LA SUPERFICIE SERA DE 60 CM , EL CHAFLAN QUE CONFORMA LA PARTE INTERNA DE LAS SUPERFICIES DEBERÁ IR CURVO, BORDES CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REDORDEADAS. BASES METALICAS INDEPENDIENTES CON NIVELADORES, CAJONERA METALICA DE DOS CAJONES Y UNO DE ARCHIVADO PROVISTA DE CHAPA. INCLUYE SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO, BASURERA, PAPELERA Y DESCANZAPIES.	un	14,00	10	10	$ 2.929.917,65	$ 29.299.176	
1,03	DIVISION EN VIDRIO LAMINADO 3+3 SOBRE MESON DE ATENCION AL PUBLICO DE 1.10 M DE ALTURA Y ANCHO 1.50 M.,INCLUYE PASAVOZ, PASADOCUMENTOS, MONTANTE DE 20 CENTIMETROS TERMINADO EN FORMICA A DOS CARAS Y ESTRUCTURA (DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD)	m2	9,00	0	0	$ 802.567,23	$ -	
1,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERFICIE DE TRABAJO ESPESOR 30MM CON ACABADO EN FÓRMICA A DOS CARAS Y BASES METÁLICAS DE 1,50 m DE LARGO POR 0,60 m DE ANCHO, REMATE PERIMETRAL CON CANTO EN CAUCHO U OTRO MATERIAL RESISTENTE A LOS IMPACTOS, EL ACABADO DEBE SER IGUAL AL DE LAS SUPERFICIES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.	un	3,00	3	3	$ 959.448,74	$ 2.878.346	
1,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERFICIE DE TRABAJO ESPESOR 30MM, CON ACABADO EN FÓRMICA A DOS CARAS Y BASES METÁLICAS DE 0,8 m DE LARGO POR 0,60 m DE ANCHO, CON ENTREPAÑO. REMATE PERIMETRAL CON CANTO EN CAUCHO U OTRO MATERIAL RESISTENTE A LOS IMPACTOS, EL ACABADO DEBE SER IGUAL AL DE LAS SUPERFICIES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO	un	2,00	3	3	$ 805.394,96	$ 2.416.185	
1,07	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO, ALTO 2,20 m, ESTRUCTURA EN LÁMINA, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA, PANELES EN MADERA CON ACABADO EN FÓRMICA, INCLUYE VIDRIO CON SANBLASTING , MONTANTE DE 0,20 MTS Y EMPAQUES, EL MATERIAL Y ACABADO SERÁ EL UTILIZADO INSTITUCIONALMENTE POR LA ENTIDAD. INCLUYE PUERTAS EN VIDRIO DE 6 MM CON ESTRUCTURA METALICA O ALUMINIO, CERRADURA, BISAGRAS, EN LOS SITIOS QUE SE REQUIERA.	m2	75,00	113,86	113,86	$ 769.215,13	$ 87.582.834	
1,09	SUMINISTRO DE TAPETE ATRAPA POLVO PARA INGRESO A LA OFICINA DE REGISTRO DE 1,70 X 0,90 NEGRO Y PERFIL DE REMATE, INLCUYE LOGO DE LA ENTIDAD	un	1,00	1	1	$ 759.956,30	$ 759.956	
1,16	CAJONERA METALICA DE DOS CAJONES Y UNO DE ARCHIVADO PROVISTA DE CHAPA CON SISITEMA DETRAMPA EN EL CAJON PRINCIPAL PARA EL BLOQUEO DEL RESTO DE LOS CAJONES.	un	5,00	5	5	$ 597.871,43	$ 2.989.357	
1,16	MUEBLE AUXILIAR BAJO DE 0.90 X 0.50 X 0.70 m DE ALTO CON PUERTAS METALICAS CON PINTURA ELECTROSTATICA, ENTREPAÑO. INCLUYE SUPERFICIE ENCHAPADA EN FORMICA Y NIVELADORES.	un	3,00	5	5	$ 1.103.698,32	$ 5.518.492	

1,21	SUMINISTRO E INSTALACION MESA DE JUNTAS REDONDA EPESOR 30MM, DE 1,10 m DE DIAMETRO, ACABADO EN FÓRMICA A DOS CARAS Y BASE METÁLICA, REMATE PERIMETRAL CON CANTO EN CAUCHO U OTRO MATERIAL RESISTENTE A LOS IMPACTOS, EL ACABADO DEBE SER IGUAL AL DE LAS SUPERFICIES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, INCLUYE 4 SILLAS INTERLOCUTORAS	un	1,00	1	1	$ 1.694.763,03	$ 1.694.763	
1,22	DIVISION A MEDIA ALTURA ENTRE 1,05 Y 1.10 m, ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS Y VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 mm SAMBLASTIADO, (DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD) ESTRUCTURA EN ALUMINIO O METALICA CON PINTURA ELECTROESTATICA, INCLUYE NIVELADORES.	m2	29,40	20,4	20,4	$ 562.953,78	$ 11.484.257	
1,23	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO DE 2 MTS DE ALTO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA	un	2,00	3	3	$ 2.376.682,35	$ 7.130.047	
1,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIBLIOTECA EN FORMICA ESPESOR 19MM AMBAS CARAS PARA OFICINA DOS MUEBLES INDEPENDIENTES CON DIMENSIONES: MUEBLE BAJO (1,20 DE LARGO, 0,52 DE ANCHO Y 0.94 DE ALTO INCLUIDO BASE CON ENTREPAÑO Y CUATRO CAJONES, CON ESPALDAR) MUEBLE ALTO (1,20 DE LARGO, 1,08 DE ALTO ,0.30 DE ANCHO CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES, CON ESPALDAR). C	un	1,00	1	1	$ 2.999.409,24	$ 2.999.409	
1,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE METALICO Y MECANICO FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED. CADA CUERPO CON MEDIDAS LIBRES DE 1,10 X 0,45 X 2,10-2,20 M, CON 6 ESPACIOS UTILES Y 5 ENTREPAÑOS DE 0,45 M DE FONDO LIBRES EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22. CONSTA DE PARALES EN "L" FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 CON TROQUELADO DE UÑA SOBRE SÍ MISMO PARA AJUSTAR A UNA ALTURA MODULAR DE 31 CM ENTRE CADA ENTREPAÑOS. LAS UNIDADES DE CONSULTA INCLUYEN TENSORES GRADUABLES DIAGONALES LATERALES EN PLATINA DE 3/4" X 1/8" Y DIAGONALES POSTERIORES EN PLATINA DE 3/4" X 1/4" CON TEMPLETE DE 1/4", CON EL FIN DE BRINDARLE MAYOR	un	42,00	22	22	$ 2.060.152,94	$ 45.323.365	
1,26	ESTANTE METÁLICO DE 2.00M ALTO POR 0.50M DE PROFUNDIDAD POR 0.90 M DE ANCHO, DE 5 ESPACIOS UTILES. PARALES EN CAL 16, ENTREPAÑOS EN CAL 20 REFORZADO PARA RESISTIR CADA UNO UN PESO DE 150 Kg	un	24,00	24	24	$ 972.484,87	$ 23.339.637	
1,27	ARCHIVADOR VERTICAL TRES GAVETAS: ELABORADO EN LÁMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. CUENTA CON NIVELADORES EN NYLON INYECTADO, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSION, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCIÓN CON LLAVE. ESTÁ PROVISTO DE TRES (3) GAVETAS EXTRAÍBLES Y SISTEMA ANTI-VUELCO DE SEGURIDAD QUE IMPIDE LA APERTURA DE UN CAJÓN SI OTRO ESTÁ ABIERTO. ALTURA: 105 CM ANCHO: 47 CM, FONDO: 60 CM	un	1,00	2	2	$ 1.389.583,19	$ 2.779.166	
1,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO INSTITUCIONAL EN PANAFLEX IMPRESO PARA EXTERIOR, SEGÚN DISEÑO Y MEDIDA, CON CAJA EN ALUMNIO DE 0,10M DE ESPESOR SIN LUZ.	m2	2,60	2,6	2,6	$ 1.054.461,34	$ 2.741.599	
2,00	OBRAS ADICIONALES							**$ 18.312.447,36**
2.01	DESMONTE DE DIVISION PISO TECHO, DIVISIONES A MEDIA ALTURA, MESON, DIVISIONES EN VIDRIO SOBRE MESON. INCLUYE RETIRO Y DISPISICIÓN FINAL.	m2	80,00	102,64	102,64	$ 62.247,06	$ 6.389.038	
2.02	DESMONTE Y REINSTALACION EN NUEVA UBICACION DE PUESTOS DE TRABAJO, INCLUYE DIVISION EN DONDE EXISTA	un	5,00	5	5	$ 61.218,49	$ 306.092	
2.06	DESMONTE Y REINSTALACION DE CANALETA DE RED REGULADA Y LOGICA	ML	28,50	28,5	28,5	$ 15.892,44	$ 452.934	
2.07	TRASLADO DE PUNTO DE RED LOGICA,NORMAL Y REGULADA. (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	UN	3,00	5	5	$ 128.834,45	$ 644.172	
2.08	DESMONTE, TRASLADO, REUBICACIÓN DE DOCUMENTOS, INCLUYE SUMINISTRO DE CAJAS PARA SU MANIPULACION. EL VALOR UNITARIO SE ESTABLECE POR ESTANTE LLENO DE SEIS ESPACIOS UTILES	UN	42,00	42	42	$ 113.115,97	$ 4.750.871	
2.09	DESMONTE DE ESTANTE DE ARCHIVO RODANTE O FIJO INCLUIDA PUERTAS Y ESTRUCTURA EXISTENTE, UBICANDOLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LA ORIP	UN	42,00	42	42	$ 118.916,81	$ 4.994.506	
2.11	DESMONTE PUESTO DE TRABAJO Y UBICACIÓN EN EL LUGAR QUE SE INDIQUE	UN	14,00	14	14	$ 52.207,56	$ 730.906	
2.16	RETIRO AVISO ORIP Y UBICACIÓN DONDE INDIQUE LA ENTIDAD	UN	1,00	1	1	$ 43.927,73	$ 43.928	
	ADICIONALES NO P´REVISTOS							**$ 10.310.493,28**
NP-01	SUMINISTRO E INSTALACION SILLAS TANDEM 3 PUESTOS, ACABADO EN PLASTICO REFORZADO COLOR NEGRO EN ASIENTO Y ESPALDAR.ESTRUCTURA METALICA TUBO REDONDO MINIMO 22 MM CALIBRE 16CC O SIMILAR, PINTURA ELECTROSTATICA.	un	-	3	3	$ 798.007,56	$ 2.394.023	

NP-02	SILLAS INTERLOCUTORAS EN PAÑO • ACABADO DEL ASIENTO Y EL ESPALDAR TAPIZADO EN PAÑO COLOR NEGRO, LAS CUBIERTAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL ESPALDAR Y DEL ASIENTO SE CONSTRUIRÁN EN POLIPROPILENO INYECTADO, ALTURA ASIENTO MÍNIMO 42,5 CM, ALTURA SILLA MÍNIMO 84 CM. ESTRUCTURA METÁLICA TUBO REDONDO MÍNIMO DE 22 MM CALIBRE 16 O SIMILAR, PINTURA ELECTROSTÁTICA, EL CONTRATISTA PUEDE PRESENTAR ALTERNATIVAS PARA APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD.	un	-	6	6	$ 290.000,00	$ 1.740.000	
NP-03	SOFA DOBLE DOS PUESTOS	un	-	1	1	$ 2.394.957,98	$ 2.394.958	
NP-04	POLTRONA DE UN PUESTO CON BRAZOS , TAPIZADO EN PRANAHA BASE CROMADA , SUAVISADO CON CAUCHO ESPUMA DE ALTA DENSIDAD , COJINES REMOVIBLES.	un	-	2	2	$ 1.890.756,30	$ 3.781.513	
	TOTAL COSTO DIRECTO							$ 261.664.848,34
	COSTOS INDIRECTOS							
	IVA	%	19%					$ 49.716.321,18

VALOR TOTAL MUEBLES	$ 311.381.169,52

VALOR TOTAL ORIP DUITAMA	$ 311.381.169,52

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL CONTRATO	**$ 763.425.604,00**
VALOR ADICIÓN N°1	**$ 363.014.839,00**
VALOR ACTUAL CONTRATO	**$ 1.126.440.443,00**

VALOR ANTICIPO	
PORCENTAJE DE ANTICIPO	

ACTA No	VALOR DEL ACTA	% EJECUTADO DEL CONTRATO	% A PAGAR	VALOR ACTA A PAGAR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	VALOR A PAGAR DEL CONTRATO AMORTIZANDO ANTIICPO	SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO
1	$114.003.648,04	10,1%	10%	**$114.003.648,04**			**$114.003.648,04**	**$ 1.012.436.794,96**
2	$210.919.145,65	31,6%	19%	**$210.919.145,65**			**$210.919.145,65**	**$ 801.517.649,31**
3	$141.061.113,00	12,5%	13%	**$141.061.113,00**			**$141.061.113,00**	**$ 660.456.536,31**
4	$311.381.169,52	69,0%	28%	**$311.381.169,52**			**$311.381.169,52**	**$ 349.075.366,79**
TOTALES								

NOTA: EL CONTRATISTA REALIZA EL COBRO DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGO CONTRACTUAL, EN LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA.

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:


IVAN ENRIQUE GRANADOS PULIDO
Representante Legal
CONSORCIO SNR-08 2024
CONTRATISTA


JACQUELINE GUZMAN HERAZO
SUPERVISORA DEL CONTRATO
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

REGISTRO FOTOGRAFICO ORIP DUITAMA




CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

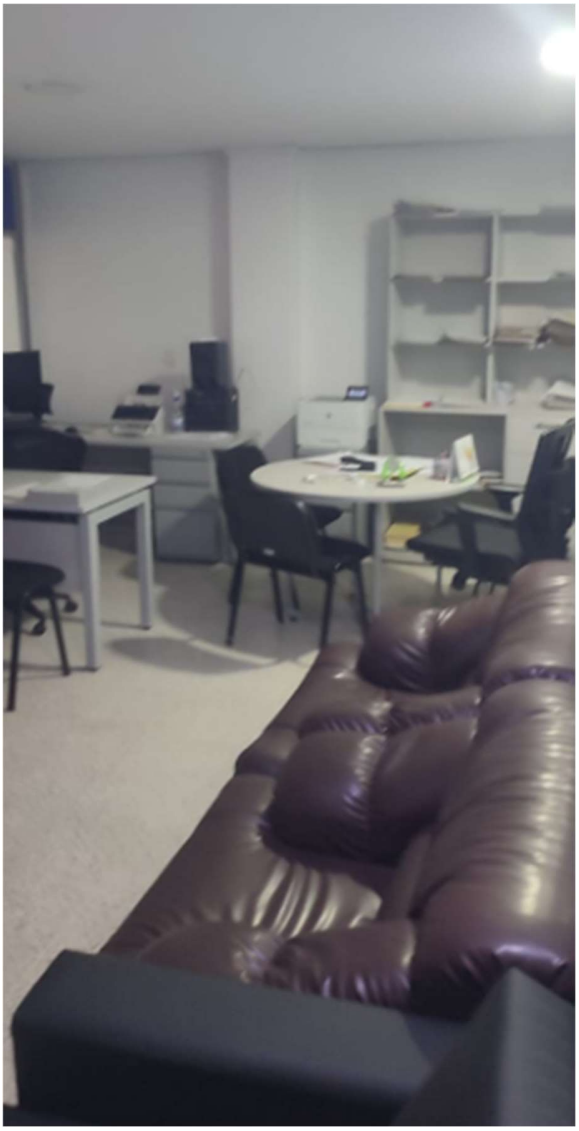


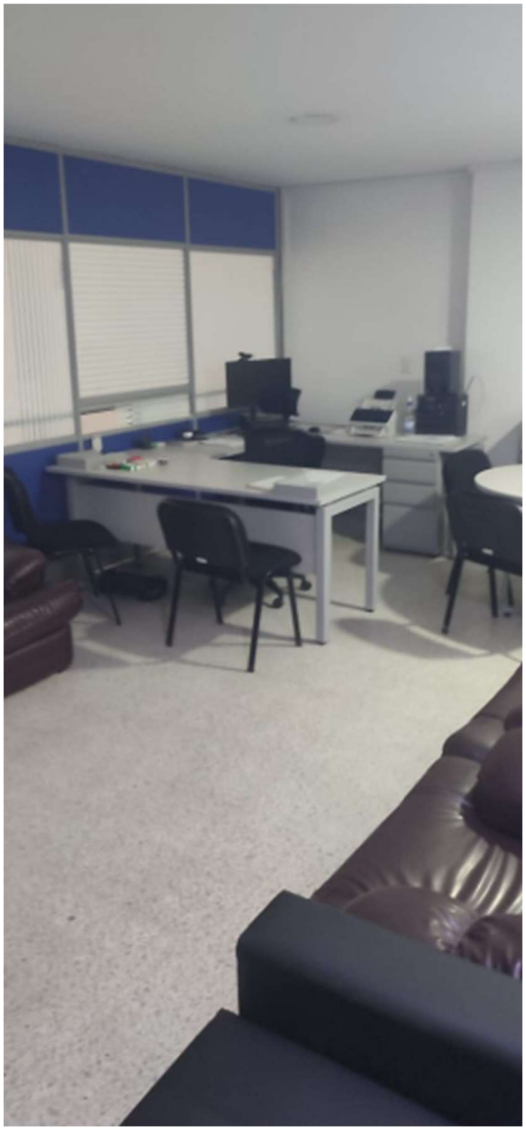

CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

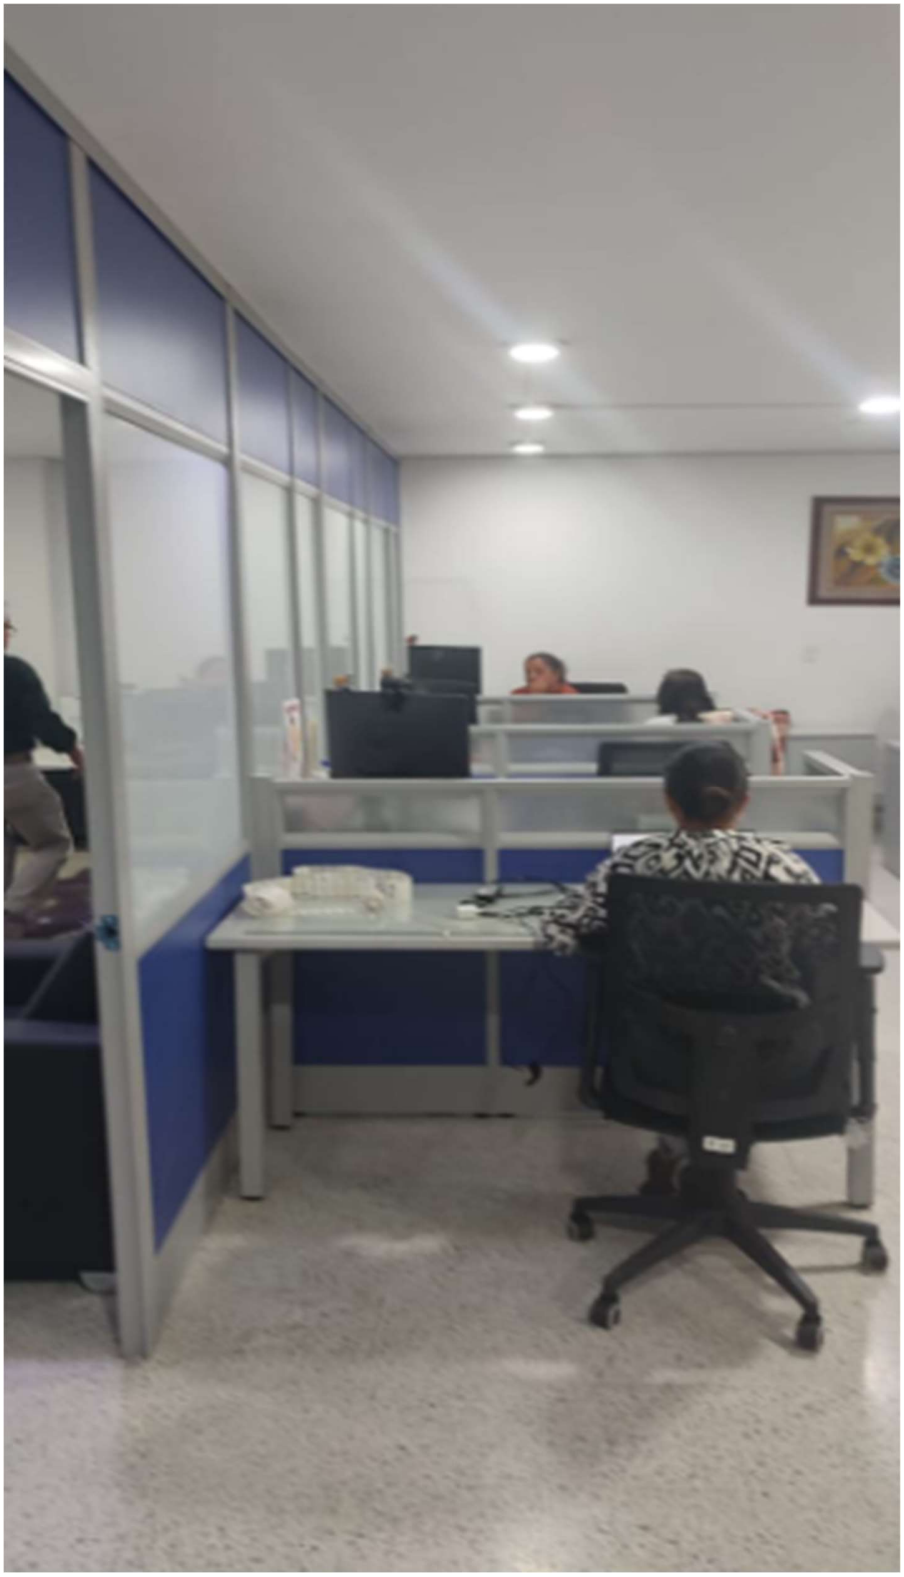

CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

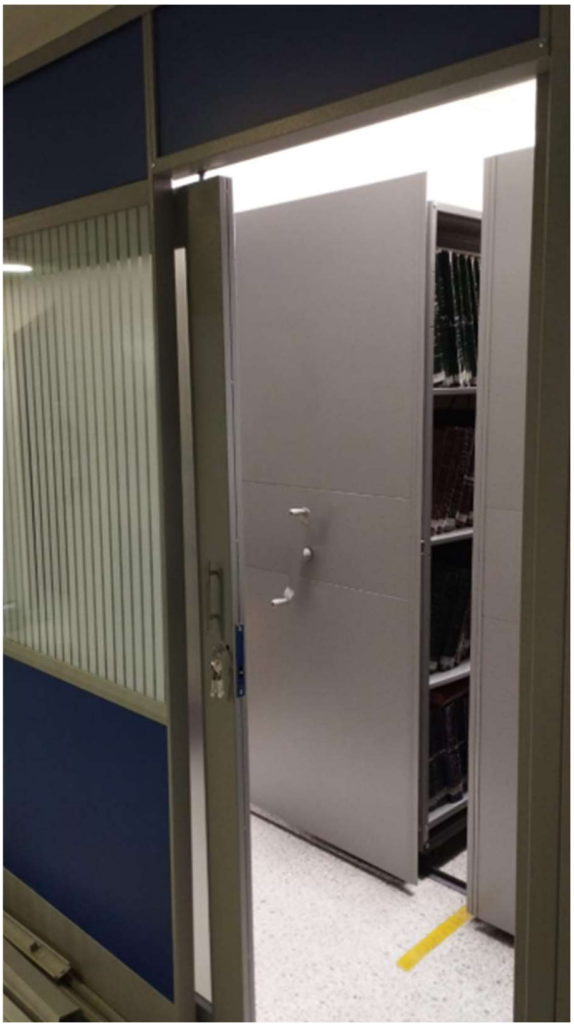




CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com






CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

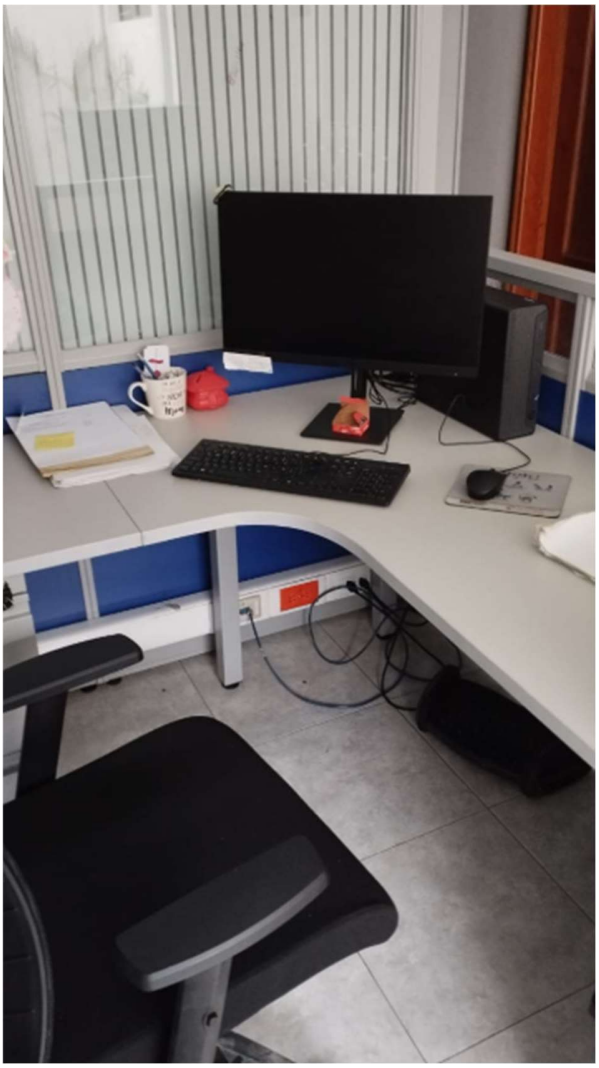



CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com



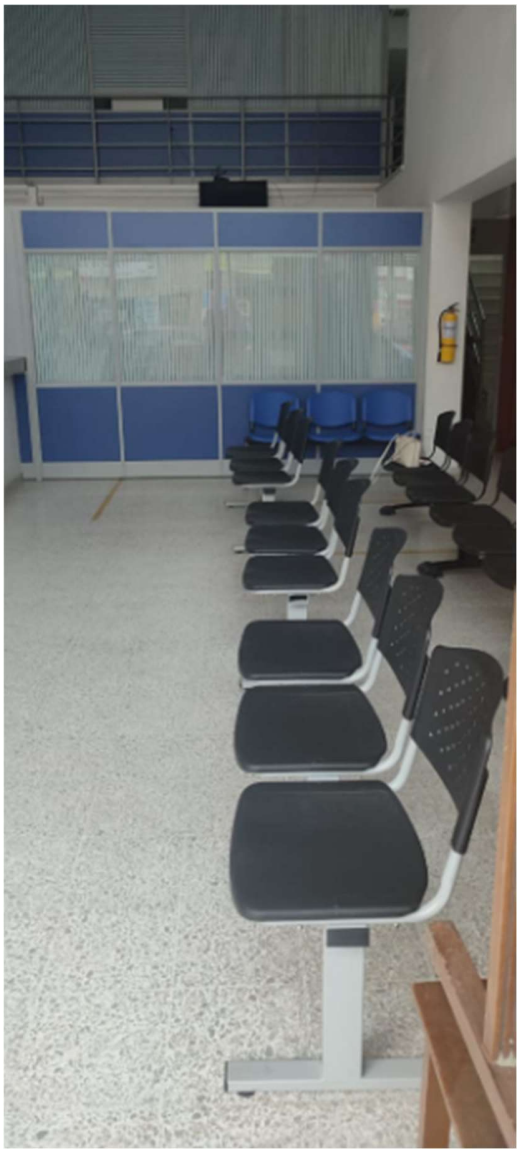

IVAN ENRIQUE GRANDOS PULIDO
CC. 1.020.745.211 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL
COLOMB IA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS
NIT. 901.011.888-9

CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

ACTA DE RECIBO FINAL
LUGAR DE EJECUCION : ORIP NUQUI

PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)	viernes 1 de noviembre de 2024	HASTA (dd-mm-aa)	domingo 11 de febrero de 2024

CONTRATO Nº	2401 DE 2024	VALOR:	$ 763.425.604,00
		ADICION	$ 363.014.839,00
		VALOR TOTAL	$ 1.126.440.443,00
CONTRATISTA	COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS NI. 901.011.888-9	OBJETO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR POR AGRUPACIONES"	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	JACQUELINE GUZMAN ERAZO		

A LOS doce (12) DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2025 , SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: IVAN ENRIQUE GRANADOS PULIDO CON CC. 1.020.745.211 DE BOGOTA, REPRSENTANTE LEGAL DE COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS , Y JACQUELINE GUZMAN HERAZO , SUPERVISORA DEL CONTRATO POR PARTE DE LA SNR , CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
MUEBLES (SI APLICA)								
								$ 72.827.139
1,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTO DE TRABAJO PARA DIRECTOR O REGISTRADOR, EL PUESTO TENDRA UNA FORMA DE "U", CON TRES SUPERFICIES INDEPENDENTES ESPESOR 30MM, CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS, CON DIMENSIONES DE 1,80M X 0.70M; DE 1,00 X 0.60 M Y UNA DETRÁS DE 1.80 X 0.60 M, CADA UNA CON BASES METALICAS INDEPENDIENTES, CON BORDES O CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REBORDEADAS,CAJONERA METALICA CON DOS CAJONES ESTANDAR Y UNO PARA ARCHIVO DE CARPETAS CON CERRADURA, 2 SILLAS INTERLOCUTORAS, BASURERA METALICA, PAPELERA METALICA, SILLA GIRATORIA ERGONÒMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE,CABECERO, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO TIPO GERENTE , DESCANSA PIES.	un	1,00	1,00	1,00	$ 4.389.000,00	$ 4.389.000	
1,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DE 1.50 X 1.50 EN L, SUPERFICIES ESPESOR 30 MM, CON ACABADO FORMICA A DOS CARAS, EL ANCHO DE LA SUPERFICIE SERA DE 60 CM , EL CHAFLAN QUE CONFORMA LA PARTE INTERNA DE LAS SUPERFICIES DEBERÁ IR CURVO, BORDES CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REDORDEADAS. BASES METALICAS INDEPENDIENTES CON NIVELADORES, CAJONERA METALICA DE DOS CAJONES Y UNO DE ARCHIVADO PROVISTA DE CHAPA. INCLUYE , BASURERA, PAPELERA Y DESCANZAPIES. (NO INCLUYE SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO)	un	4,00	4,00	4,00	$ 2.757.248,74	$ 11.028.995	
1,03	DIVISION EN VIDRIO LAMINADO 3+3 SOBRE MESON DE ATENCION AL PUBLICO DE 1.10 M DE ALTURA Y ANCHO 1.50 M.,INCLUYE PASAVOZ, PASADOCUMENTOS, MONTANTE DE 20 CENTIMETROS TERMINADO EN FORMICA A DOS CARAS Y ESTRUCTURA (DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD)	m2	6,00	6,00	6,00	$ 778.500,00	$ 4.671.000	
1,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON TIPO MOSTRADOR DE ATENCION AL PUBLICO DE ALTURA ENTRE 0.90 A 1.10 m, ANCHO 1,50 m. INCLUYE MESON SUPERIOR DE 30 cm POSFORMADO EN FORMICA ESPERSOR 30MM A DOS CARAS Y FRONTAL SEGÚN DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD.	un	2,00	2,00	2,00	$ 1.359.582,35	$ 2.719.165	
1,07	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO, ALTO 2,20 m, ESTRUCTURA EN LÁMINA, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA, PANELES EN MADERA CON ACABADO EN FÓRMICA, INCLUYE VIDRIO CON SANBLASTING , MONTANTE DE 0,20 MTS Y EMPAQUES, EL MATERIAL Y ACABADO SERÁ EL UTILIZADO INSTITUCIONALMENTE POR LA ENTIDAD. INCLUYE PUERTAS EN VIDRIO DE 6 MM CON ESTRUCTURA METALICA O ALUMINIO, CERRADURA, BISAGRAS, EN LOS SITIOS QUE SE REQUIERA.	m2	23,00	23,00	23,00	$ 748.696,64	$ 17.220.023	
1,08	SUMINISTRO E INSTALACION SILLAS TANDEM 3 PUESTOS , ACABADO EN PLASTICO REFORZADO COLOR NEGRO EN ASIENTO Y ESPALDAR.ESTRUCTURA METALICA TUBO REDONDO MINIMO 22 MM CALIBRE 16CC O SIMILAR, PINTURA ELECTROSTATICA.	un	1,00	1,00	1,00	$ 749.500,00	$ 749.500	
1,16	MUEBLE AUXILIAR BAJO DE 0.90 X 0.50 X 0.70 m DE ALTO CON PUERTAS METALICAS CON PINTURA ELECTROSTATICA, ENTREPAÑO. INCLUYE SUPERFICIE ENCHAPADA EN FORMICA Y NIVELADORES.	un	2,00	2,00	2,00	$ 1.050.000,00	$ 2.100.000	
1,22	DIVISION A MEDIA ALTURA ENTRE 1,05 Y 1.10 m, ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS Y VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 mm SAMBLASTIADO, (DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD) ESTRUCTURA EN ALUMINIO O METALICA CON PINTURA ELECTROESTATICA, INCLUYE NIVELADORES.	m2	20,50	20,50	20,50	$ 560.500,00	$ 11.490.250	

1,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE METALICO Y MECANICO FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED. CADA CUERPO CON MEDIDAS LIBRES DE 1,10 X 0,45 X 2,10-2,20 M, CON 6 ESPACIOS UTILES Y 5 ENTREPAÑOS DE 0,45 M DE FONDO LIBRES EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22. CONSTA DE PARALES EN "L" FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 CON TROQUELADO DE UÑA SOBRE SÍ MISMO PARA AJUSTAR A UNA ALTURA MODULAR DE 31 CM ENTRE CADA ENTREPAÑOS. LAS UNIDADES DE CONSULTA INCLUYEN TENSORES GRADUABLES DIAGONALES LATERALES EN PLATINA DE 3/4" X 1/8" Y DIAGONALES POSTERIORES EN PLATINA DE 3/4" X 1/4" CON TEMPLETE DE 1/4", CON EL FIN DE BRINDARLE MAYOR ESTABILIDAD Y RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA. CADA ENTREPAÑO CONTARÁ CON DOS REFUERZOS EN LÁMINA CALIBRE 16 PARA SOPORTAR UNA CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA DE 100 KG/M, ASÍ MISMO CONSTARÁ CON TAPA SUPERIOR E INFERIOR DEL MISMO CALIBRE Y REFORZADOS PARA SOPORTAR UNA CARGA DE 100 KG/M. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA, PANELERÍA CON VISOR IDENTIFICADOR, ACABADOS FRONTALES Y LATERALES EN LÁMINA COLD ROLLED, LOS CUALES DEBEN CONTAR CON LA TOLERANCIA NECESARIA PARA QUE LOS ESTANTES NO QUEDEN PEGADOS AL ESTAR CERRADOS, QUE GARANTICE UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. DEBE CONTAR CON SISTEMA	un	3,00	3,00	3,00	$ 1.920.000,00	$ 5.760.000	
1,26	ESTANTE METÁLICO DE 2.00M ALTO POR 0.50M DE PROFUNDIDAD POR 0.90 M DE ANCHO, DE 5 ESPACIOS UTILES, PARALES EN CAL 16, ENTREPAÑOS EN CAL 20 REFORZADO PARA RESISTIR CADA UNO UN PESO DE 150 Kg	un	10,00	10,00	10,00	$ 835.000,00	$ 8.350.000	
1,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO INSTITUCIONAL EN PANAFLEX IMPRESO PARA EXTERIOR, SEGÚN DISEÑO Y MEDIDA, CON CAJA EN ALUMNIO DE 0,10M DE ESPESOR SIN LUZ.	m2	1,00	1,00	1,00	$ 995.057,00	$ 995.057	
	OBRAS ADICIONALES							
2,06	DESMONTE Y REINSTALACION DE CANALETA DE RED REGULADA Y LOGICA	ML	85,00	85,00	85,00	$ 22.990,00	$ 1.954.150,00	
2.07	TRASLADO DE PUNTO DE RED LOGICA,NORMAL Y REGULADA. (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	UN	7,00	7,00	7,00	$ 200.000,00	$ 1.400.000	
	TOTAL COSTO DIRECTO							$ 72.827.139,35
	COSTOS INDIRECTOS							
	IVA	%	19%					$ 13.837.156,48

VALOR TOTAL MUEBLES	**$ 86.664.295,83**

VALOR TOTAL ORIP NUQUI	**$ 86.664.295,83**

BALANCE PRESUPUESTAL


VALOR INICIAL CONTRATO	**$ 763.425.604,00**
VALOR ADICIÓN N°1	**$ 363.014.839,00**
VALOR ACTUAL CONTRATO	**$ 1.126.440.443,00**

VALOR ANTICIPO	
PORCENTAJE DE ANTICIPO	

ACTA No	VALOR DEL ACTA	% EJECUTADO DEL CONTRATO	% A PAGAR	VALOR ACTA A PAGAR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	VALOR A PAGAR DEL CONTRATO AMORTIZANDO ANTIICPO	SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO
1	$114.003.648,04	10,1%	10%	**$114.003.648,04**			**$114.003.648,04**	**$ 1.012.436.794,96**
2	$210.919.145,65	28,8%	19%	**$210.919.145,65**			**$210.919.145,65**	**$ 801.517.649,31**
3	$141.061.113,00	41,4%	13%	**$141.061.113,00**			**$141.061.113,00**	**$ 660.456.536,31**
4	$311.381.169,52	69,0%	28%	**$311.381.169,52**			**$311.381.169,52**	**$ 349.075.366,79**
5	$127.121.025,50	80,3%	11%	**$127.121.025,50**			**$127.121.025,50**	**$ 221.954.341,29**
5	$86.664.295,83	88,0%	8%	**$86.664.295,83**			**$86.664.295,83**	**$ 135.290.045,46**
	TOTALES							

NOTA: EL CONTRATISTA REALIZA EL COBRO DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGO CONTRACTUAL, EN LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA.

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:



IVAN ENRIQUE GRANADOS PULIDO
Representante Legal
CONSORCIO SNR-08 2024
CONTRATISTA

JACQUELINE GUZMAN HERAZO
SUPERVISORA DEL CONTRATO
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

REGISTRO FOTOGRAFICO NUQUI





CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com



CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

:



CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

COLCONDI
colcondi.com todo para tu hogar y oficina







CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com







CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com





CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

ACTA DE RECIBO FINAL
LUGAR DE EJECUCION : ORIP CHIQUINQUIRA

PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)	viernes 1 de noviembre de 2024	HASTA (dd-mm-aa)	miércoles 12 de marzo de 2025

CONTRATO Nº	2401 DE 2024	VALOR:	$ 763.425.604,00
		ADICION	$ 363.014.839,00
		VALOR TOTAL	$ 1.126.440.443,00
CONTRATISTA	COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS NI. 901.011.888-9	OBJETO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR POR AGRUPACIONES"	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	JACQUELINE GUZMAN ERAZO		

A LOS doce (12) DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2025 , SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: IVAN ENRIQUE GRANADOS PULIDO CON CC. 1.020.745.211 DE BOGOTA, REPRSENTANTE LEGAL DE COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS , Y JACQUELINE GUZMAN HERAZO , SUPERVISORA DEL CONTRATO POR PARTE DE LA SNR , CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
	MUEBLES (SI APLICA)							
								$ 110.372.911
1,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTO DE TRABAJO PARA DIRECTOR O REGISTRADOR, EL PUESTO TENDRA UNA FORMA DE "U", CON TRES SUPERFICIES INDEPENDENTES ESPESOR 30MM, CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS, CON DIMENSIONES DE 1,80M X 0.70M; DE 1,00 X 0.60 M Y UNA DETRÁS DE 1.80 X 0.60 M, CADA UNA CON BASES METALICAS INDEPENDIENTES, CON BORDES O CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REBORDEADAS,CAJONERA METALICA CON DOS CAJONES ESTANDAR Y UNO PARA ARCHIVO DE CARPETAS CON CERRADURA, 2 SILLAS INTERLOCUTORAS, BASURERA METÁLICA, PAPELERA METALICA, SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE,CABECERO, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO TIPO GERENTE , DESCANSA PIES.	un	3,00	3,00	3	$ 4.389.000,00	$ 13.167.000	
1,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DE 1.50 X 1.50 EN L, SUPERFICIES ESPESOR 30 MM, CON ACABADO FORMICA A DOS CARAS, EL ANCHO DE LA SUPERFICIE SERA DE 60 CM , EL CHAFLAN QUE CONFORMA LA PARTE INTERNA DE LAS SUPERFICIES DEBERÁ IR CURVO, BORDES CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REDORDEADAS. BASES METALICAS INDEPENDIENTES CON NIVELADORES, CAJONERA METALICA DE DOS CAJONES Y UNO DE ARCHIVADO PROVISTA DE CHAPA. INCLUYE , BASURERA, PAPELERA Y DESCANZAPIES. (NO INCLUYE SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO)	un	8,00	8,00	8	$ 2.757.248,00	$ 22.057.984	
1,03	DIVISION EN VIDRIO LAMINADO 3+3 SOBRE MESON DE ATENCION AL PUBLICO DE 1.10 M DE ALTURA Y ANCHO 1.50 M.,INCLUYE PASAVOZ, PASADOCUMENTOS, MONTANTE DE 20 CENTIMETROS TERMINADO EN FORMICA A DOS CARAS Y ESTRUCTURA (DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD)	m2	4,00	4,00	4	$ 778.500,00	$ 3.114.000	
1,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON TIPO MOSTRADOR DE ATENCION AL PUBLICO DE ALTURA ENTRE 0.90 A 1.10 m, ANCHO 1,50 m. INCLUYE MESON SUPERIOR DE 30 cm POSFORMADO EN FORMICA ESPERSOR 30MM A DOS CARAS Y FRONTAL SEGÚN DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD.	un	2,00	2,00	2	$ 1.359.582,00	$ 2.719.164	
1,07	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO, ALTO 2,20 m, ESTRUCTURA EN LÁMINA, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA, PANELES EN MADERA CON ACABADO EN FÓRMICA, INCLUYE VIDRIO CON SANBLASTING , MONTANTE DE 0,20 MTS Y EMPAQUES, EL MATERIAL Y ACABADO SERÁ EL UTILIZADO INSTITUCIONALMENTE POR LA ENTIDAD. INCLUYE PUERTAS EN VIDRIO DE 6 MM CON ESTRUCTURA METALICA O ALUMINIO, CERRADURA, BISAGRAS, EN LOS SITIOS QUE SE REQUIERA.	m2	50,00	50,00	50	$ 748.696,00	$ 37.434.800	
1,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPCIÓN, INCLUYE PANELERIA FRONTAL, SUPERFICE DE MOSTRADOR TERMOFORMADA ENCHAPADA EN FORMICA ESPESOR 3MM..	un	1,00	1,00	1	$ 4.250.000,00	$ 4.250.000	
1,28	DIVISION A MEDIA ALTURA ENTRE 1,05 Y 1.10 m, ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS Y VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 mm SAMBLASTIADO, (DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD) ESTRUCTURA EN ALUMINIO O METALICA CON PINTURA ELECTROESTATICA, INCLUYE NIVELADORES.	un	47,52	47,52	47,52	$ 560.500,00	$ 26.634.960	
1,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO INSTITUCIONAL EN PANAFLEX IMPRESO PARA EXTERIOR, SEGÚN DISEÑO Y MEDIDA, CON CAJA EN ALUMNIO DE 0,10M DE ESPESOR SIN LUZ.	m2	1,00	1,00	1	$ 995.002,50	$ 995.003	
	OBRAS ADICIONALES							$ 8.165.840,00
2,06	DESMONTE Y REINSTALACION DE CANALETA DE RED REGULADA Y LOGICA	un	216,00	216,00	216	$ 22.990,00	$ 4.965.840	
2.07	TRASLADO DE PUNTO DE RED LOGICA,NORMAL Y REGULADA. (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	un	16,00	16,00	16	$ 200.000,00	$ 3.200.000	
	TOTAL COSTO DIRECTO							$ 118.538.750,50
	COSTOS INDIRECTOS							
	IVA	%	19%					$ 22.522.363
	VALOR TOTAL MUEBLES							$ 141.061.113

VALOR TOTAL ORIP CHIQUINQUIRA	$ 141.061.113

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 763.425.604,00
VALOR ADICIÓN N°1	$ 363.014.839,00
VALOR ACTUAL CONTRATO	$ 1.126.440.443,00

VALOR ANTICIPO	
PORCENTAJE DE ANTICIPO	

ACTA No	VALOR DEL ACTA	% EJECUTADO DEL CONTRATO	% A PAGAR	VALOR ACTA A PAGAR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	VALOR A PAGAR DEL CONTRATO AMORTIZANDO ANTIICPO	SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO
1	$114.003.648,04	10,1%	10%	**$114.003.648**			**$114.003.648**	**$ 1.012.436.794,96**
2	$210.919.145,65	28,8%	19%	**$210.919.146**			**$210.919.146**	**$ 801.517.649,31**
3	$141.061.113,00	41,4%	13%	**$141.061.113**			**$141.061.113**	**$ 660.456.536,31**
TOTALES			41%	$465.983.906,69			$465.983.906,69	$ 660.456.536,31

NOTA: EL CONTRATISTA REALIZA EL COBRO DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGO CONTRACTUAL, EN LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA.

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

IVAN ENRIQUE GRANADOS PULIDO
Representante Legal
CONSORCIO SNR-08 2024
CONTRATISTA

JACQUELINE GUZMAN HERAZO
SUPERVISORA DEL CONTRATO
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

REGISTRO FOTOGRAFICO ORIP CHIQUINQUIRA



CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com






CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com





CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com



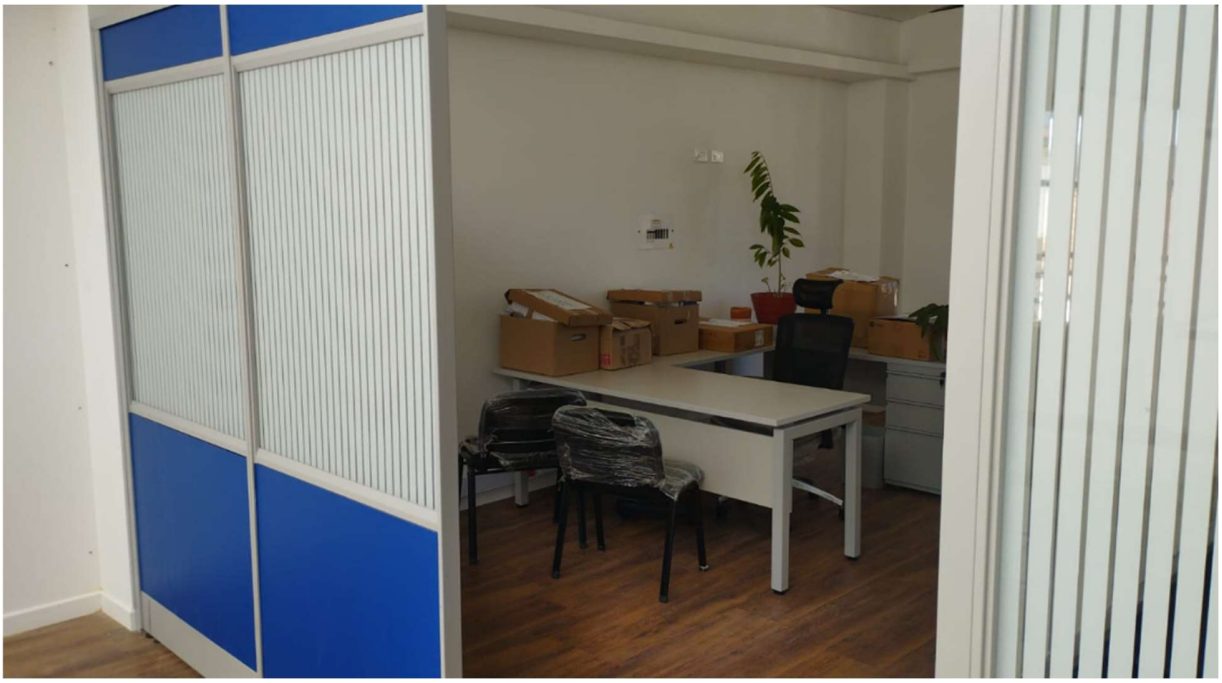

CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com







CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com






CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

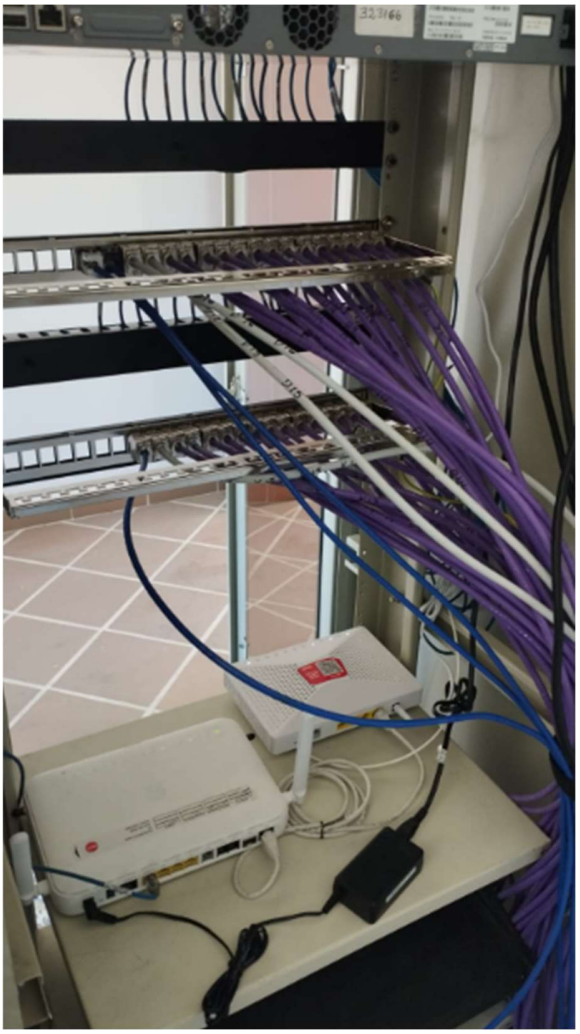

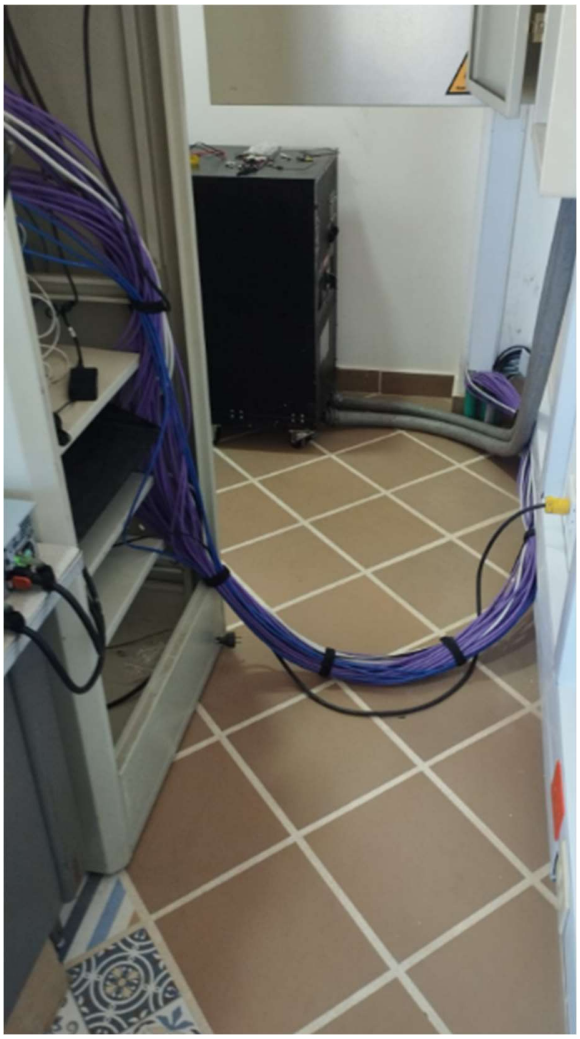

CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com



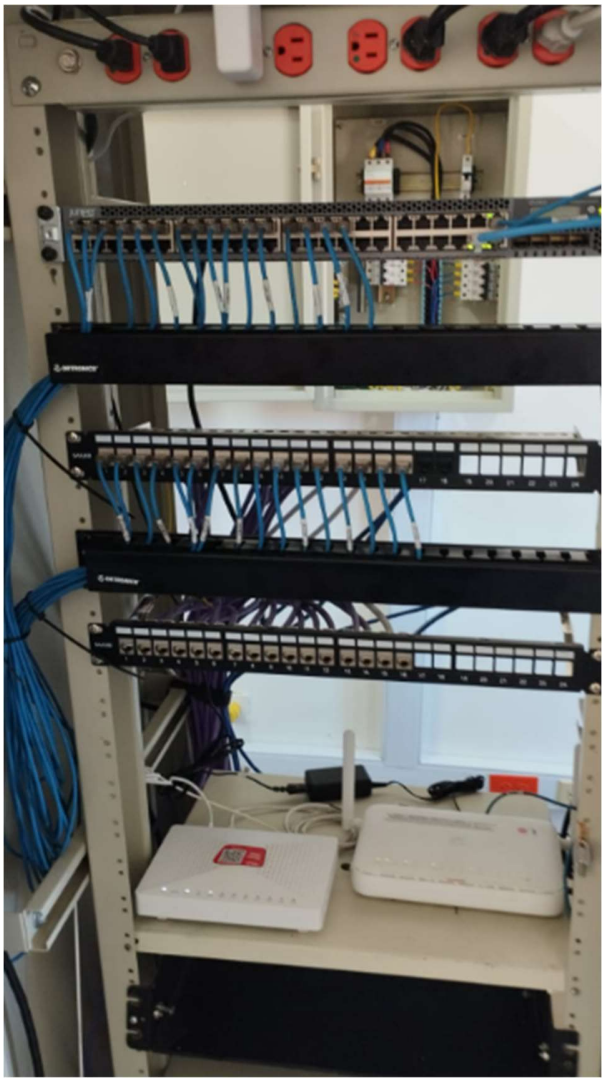

IVAN ENRIQUE GRANDOS PULIDO
CC. 1.020.745.211 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL
COLOMB IA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS
NIT. 901.011.888-9

CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 09
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE RECIBO	Fecha: 11 - 08 - 2021

ACTA DE RECIBO FINAL
LUGAR DE EJECUCION : ORIP PITALITO

PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)	viernes 1 de noviembre de 2024	HASTA (dd-mm-aa)	domingo 11 de febrero de 2024

CONTRATO Nº	2401 DE 2024	VALOR:	$ 763.425.604,00
		ADICION	$ 363.014.839,00
		VALOR TOTAL	$ 1.126.440.443,00
CONTRATISTA	COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS NI. 901.011.888-9	OBJETO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR POR AGRUPACIONES"	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	JACQUELINE GUZMAN ERAZO		

A LOS doce (12) DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2025 , SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: IVAN ENRIQUE GRANADOS PULIDO CON CC. 1.020.745.211 DE BOGOTA, REPRSENTANTE LEGAL DE COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS , Y JACQUELINE DEL CARMEN GUZMAN HERAZO , SUPERVISORA DEL CONTRATO POR PARTE DE LA SNR , CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
	MUEBLES (SI APLICA)							
								$ 113.688.596
1,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTO DE TRABAJO PARA DIRECTOR O REGISTRADOR, EL PUESTO TENDRA UNA FORMA DE "U", CON TRES SUPERFICIES INDEPENDENTES ESPESOR 30MM, CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS, CON DIMENSIONES DE 1,80M X 0.70M; DE 1,00 X 0.60 M Y UNA DETRÁS DE 1.80 X 0.60 M, CADA UNA CON BASES METALICAS INDEPENDIENTES, CON BORDES O CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REBORDEADAS,CAJONERA METALICA CON DOS CAJONES ESTANDAR Y UNO PARA ARCHIVO DE CARPETAS CON CERRADURA, 2 SILLAS INTERLOCUTORAS, BASURERA METÁLICA, PAPELERA METALICA, SILLA GIRATORIA ERGONÒMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE,CABECERO, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO TIPO GERENTE , DESCANSA PIES.	un	1,00	1,00	1	$ 4.389.000,00	$ 4.389.000	
1,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DE 1.50 X 1.50 EN L, SUPERFICIES ESPESOR 30 MM, CON ACABADO FORMICA A DOS CARAS, EL ANCHO DE LA SUPERFICIE SERA DE 60 CM , EL CHAFLAN QUE CONFORMA LA PARTE INTERNA DE LAS SUPERFICIES DEBERÁ IR CURVO, BORDES CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REDORDEADAS. BASES METALICAS INDEPENDIENTES CON NIVELADORES, CAJONERA METALICA DE DOS CAJONES Y UNO DE ARCHIVADO PROVISTA DE CHAPA. INCLUYE , BASURERA, PAPELERA Y DESCANZAPIES. (NO INCLUYE SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO)	un	4,00	4,00	4	$ 2.757.248,00	$ 11.028.992	
1,03	DIVISION EN VIDRIO LAMINADO 3+3 SOBRE MESON DE ATENCION AL PUBLICO DE 1.10 M DE ALTURA Y ANCHO 1.50 M.,INCLUYE PASAVOZ, PASADOCUMENTOS, MONTANTE DE 20 CENTIMETROS TERMINADO EN FORMICA A DOS CARAS Y ESTRUCTURA (DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD)	m2	4,00	4,00	4	$ 778.500,00	$ 3.114.000	
1,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON TIPO MOSTRADOR DE ATENCION AL PUBLICO DE ALTURA ENTRE 0.90 A 1.10 m, ANCHO 1,50 m. INCLUYE MESON SUPERIOR DE 30 cm POSFORMADO EN FORMICA ESPERSOR 30MM A DOS CARAS Y FRONTAL SEGÚN DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD.	un	2,00	2,00	2	$ 1.359.582,00	$ 2.719.164	
1,07	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO, ALTO 2,20 m, ESTRUCTURA EN LÁMINA, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA, PANELES EN MADERA CON ACABADO EN FÓRMICA, INCLUYE VIDRIO CON SANBLASTING , MONTANTE DE 0,20 MTS Y EMPAQUES, EL MATERIAL Y ACABADO SERÁ EL UTILIZADO INSTITUCIONALMENTE POR LA ENTIDAD. INCLUYE PUERTAS EN VIDRIO DE 6 MM CON ESTRUCTURA METALICA O ALUMINIO, CERRADURA, BISAGRAS, EN LOS SITIOS QUE SE REQUIERA.	m2	70,00	70,00	70	$ 748.696,00	$ 52.408.720	
1,22	DIVISION A MEDIA ALTURA ENTRE 1,05 Y 1.10 m, ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS Y VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 mm SAMBLASTIADO, (DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD) ESTRUCTURA EN ALUMINIO O METALICA CON PINTURA ELECTROESTATICA, INCLUYE NIVELADORES.	un	51,84	51,84	51,84	$ 560.500,00	$ 29.056.320	
1,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO INSTITUCIONAL EN PANAFLEX IMPRESO PARA EXTERIOR, SEGÚN DISEÑO Y MEDIDA, CON CAJA EN ALUMNIO DE 0,10M DE ESPESOR SIN LUZ.	un	1,00	1,00	1	$ 995.000,00	$ 995.000	
	OBRAS ADICIONALES							
2,06	DESMONTE Y REINSTALACION DE CANALETA DE RED REGULADA Y LOGICA	un	260,00	260,00	260	$ 22.990,00	$ 5.977.400	
2.07	TRASLADO DE PUNTO DE RED LOGICA,NORMAL Y REGULADA. (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	un	20,00	20,00	20	$ 200.000,00	$ 4.000.000	
	TOTAL COSTO DIRECTO							$ 113.688.596,00
	COSTOS INDIRECTOS							
	IVA	%	19%					$ 21.600.833
	VALOR TOTAL MUEBLES							$ 135.289.429

VALOR TOTAL ORIP PITALITO	$ 135.289.429

BALANCE PRESUPUESTAL


VALOR INICIAL CONTRATO	$ 763.425.604,00
VALOR ADICIÓN N°1	$ 363.014.839,00
VALOR ACTUAL CONTRATO	$ 1.126.440.443,00

VALOR ANTICIPO	
PORCENTAJE DE ANTICIPO	

ACTA No	VALOR DEL ACTA	% EJECUTADO DEL CONTRATO	% A PAGAR	VALOR ACTA A PAGAR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	VALOR A PAGAR DEL CONTRATO AMORTIZANDO ANTIICPO	SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO
1	$114.003.648,04	10,1%	10%	**$114.003.648**			**$114.003.648**	**$ 1.012.436.794,96**
2	$210.919.145,65	28,8%	19%	**$210.919.146**			**$210.919.146**	**$ 801.517.649,31**
3	$141.061.113,00	41,4%	13%	**$141.061.113**			**$141.061.113**	**$ 660.456.536,31**
4	$311.381.169,52	69,0%	28%	**$311.381.170**			**$311.381.170**	**$ 349.075.366,79**
5	$86.664.295,83	76,7%	8%	**$86.664.296**			**$86.664.296**	**$ 262.411.070,96**
6	$127.121.025,50	88,0%	11%	**$127.121.026**			**$127.121.026**	**$ 135.290.045,46**
7	$135.289.429,24	100,0%	12%	**$135.289.429**			**$135.289.429**	**$ 616,22**
TOTALES								

NOTA: EL CONTRATISTA REALIZA EL COBRO DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGO CONTRACTUAL, EN LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA.


PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:




IVAN ENRIQUE GRANADOS PULIDO
Representante Legal
CONSORCIO SNR-08 2024
CONTRATISTA

JACQUELINE DEL CARMEN GUZMAN HERAZO
SUPERVISORA DEL CONTRATO
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

REGISTRO FOTOGRAFICO PITALITO

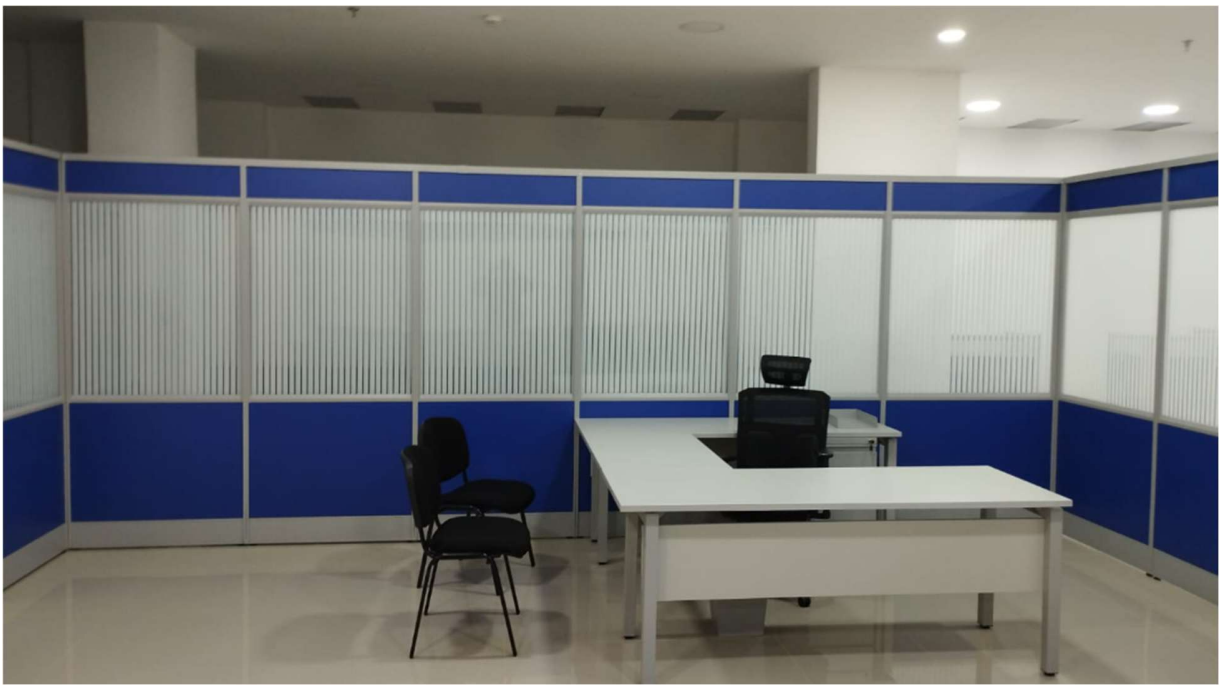

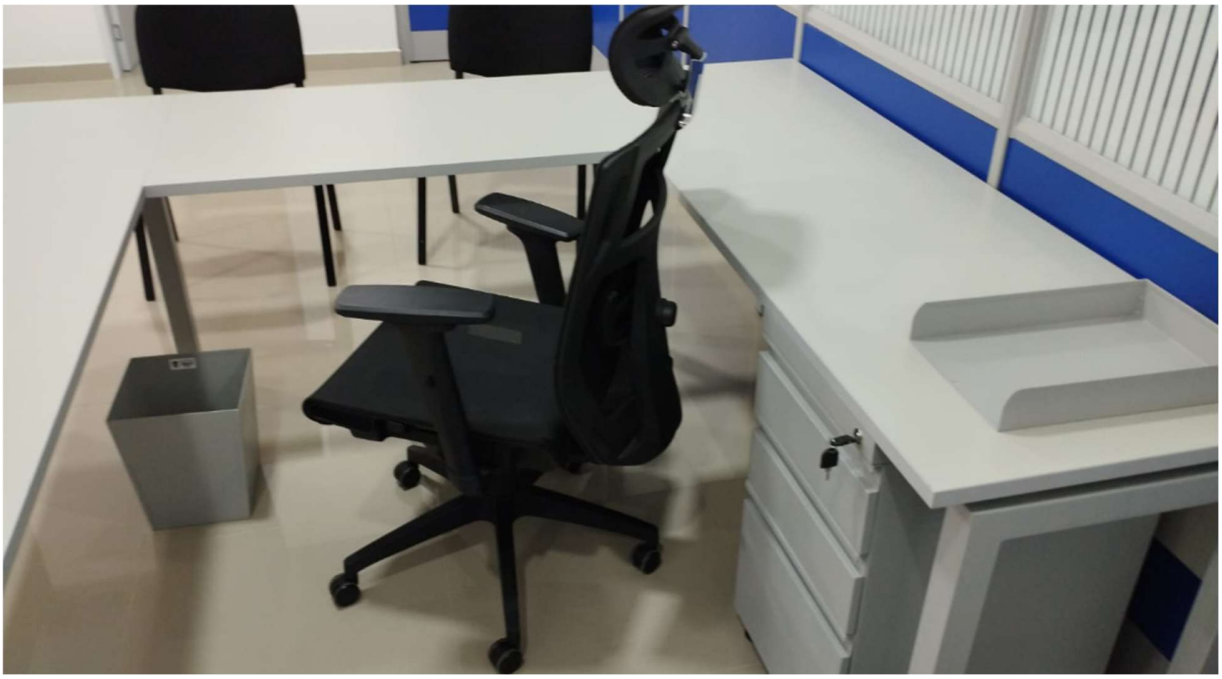

CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com





CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com





CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com





CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com


Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
PITALITO
Huila

FACTURACION

CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

FCOL No. 185

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764082626041 que habilita desde FCOL 165 hasta FCOL 10000. Vence 2025-10-31

COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS

Nit 901011888

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4745 11040.00 X 1000

CLIENTE	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
NIT	899999007 0

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 26 13 49	Bogota D.C.	3282121

POR CONCEPTO DE
$#12-04-00-000;CTO2401de2024;jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co#$ INCLUYE INSTALACION Y ADECUACIONES

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
02/04/2025	02/04/2025	LEYDI CAROLINA SERRANO WALTEROS	Credito

Item	**Código**	**Descripción**	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor IVA**	**Total**
1	CNTR	VALOR CORRESPONDIENTE A MOBILIARIO ENTREGADO E INSTALADO EN LA ORIP ACACIAS - META , DEL CONTRAO 2401 DE 2024 , SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL ADJUNTA	1	Und.	95.801.384,91	19%	.202.263,13	95.801.384,91

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

SUBTOTAL	**95.801.384,91**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**18.202.263,13**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**114.003.648,04**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/04/2025 11:51:13

CARRERA 116 N 19 A 50 Teléfono 3142548503

Correo Electrónico colcondi01@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fd41834d9014be97a60efede149e8d3f84534bfccab49d88b71ce58b078ee8574d27b26f769546c469598cf0af392722 --Fecha y Hora de Expedición : 02/04/2025 4:00:53 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FCOL No. 194

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764082626041 que habilita desde FCOL 165 hasta FCOL 10000. Vence 2025-10-31

COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS

Nit 901011888

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4745 11040.00 X 1000

CLIENTE	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
NIT	899999007 0

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 26 13 49	Bogota D.C.	3282121

POR CONCEPTO DE
$#12-04-00-000;CTO2401de2024;jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
05/05/2025	04/06/2025	LEYDI CAROLINA SERRANO WALTEROS	Credito

Item	**Código**	**Descripción**	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor IVA**	**Total**
1	CNTR	VALOR CORRESPONDIENTE A MOBILIARIO ENTREGADO E INSTALADO EN LA ORIP COCUY - BOYACA , DEL CONTRATO 2401 DE 2024 , SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL ADJUNTA	1	Und.	106.824.391,18	19%	20.296.634,32	106.824.391,18

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

SUBTOTAL	**106.824.391,18**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**20.296.634,32**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**127.121.025,50**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/05/2025 11:11:06

CARRERA 116 N 19 A 50 Teléfono 3142548503

Correo Electrónico colcondi01@gmail.com

CUFE: 25f8e8d95fd14fbe7326bd9b6175111f9e78001b592cbb8a494f890a73ba52aafcedd571e6675110ee6ae1a3be905b9c --Expedición: 05/05/2025 05:40 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FCOL No. 186

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764082626041 que habilita desde FCOL 165 hasta FCOL 10000. Vence 2025-10-31

COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS

Nit 901011888

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4745 11040.00 X 1000

CLIENTE	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
NIT	899999007 0

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 26 13 49	Bogota D.C.	3282121

POR CONCEPTO DE
$#12-04-00-000;CTO2401de2024;jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
09/04/2025	08/04/2025	LEYDI CAROLINA SERRANO WALTEROS	Credito

Item	**Código**	**Descripción**	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor IVA**	**Total**
1	CNTR	VALOR CORRESPONDIENTE A MOBILIARIO ENTREGADO E INSTALADO EN LA ORIP MONIQUIRA - BOYACA , DEL CONTRATO 2401 DE 2024 , SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL ADJUNTA	1	Und.	.77.242.979,54	19%	.676.166,11	177.242.979,54

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

SUBTOTAL	**177.242.979,54**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**33.676.166,11**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**210.919.145,65**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/04/2025 13:49:11

CARRERA 116 N 19 A 50 Teléfono 3142548503

Correo Electrónico colcondi01@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 78ffed79b817709ad4b7585d26e67a32fe2d82e227d26273250594af2a596e043ad4d6506fe26198886286ba4e290bca --Fecha y Hora de Expedición : 09/04/2025 7:59:38 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FCOL No. 192

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764082626041 que habilita desde FCOL 165 hasta FCOL 10000. Vence 2025-10-31

COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS

Nit 901011888

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4745 11040.00 X 1000

CLIENTE	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
NIT	899999007 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 26 13 49	Bogota D.C.	3282121

POR CONCEPTO DE
$#12-04-00-000;CTO2401de2024;jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
02/05/2025	01/06/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
LEYDI CAROLINA SERRANO WALTEROS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CNTR	VALOR CORRESPONDIENTE A MOBILIARIO ENTREGADO E INSTALADO EN LA ORIP DUITAMA - BOYACA , DEL CONTRATO 2401 DE 2024 , SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL ADJUNTA	1	Und.	261.664.848,34	19%	49.716.321,18	261.664.848,34

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

SUBTOTAL	**261.664.848,34**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**49.716.321,18**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**311.381.169,52**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/04/2025 12:25:53

CARRERA 116 N 19 A 50 Teléfono 3142548503

Correo Electrónico colcondi01@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 9a8e1d25bc3e65e246fbbecb4b34398df1efcef7c70fa9b7734cabdeef8585518d12588d3ffc84a5f2f6963a376e28fd --Fecha y Hora de Expedición : 02/05/2025 10:30:27 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FCOL No. 195

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764082626041 que habilita desde FCOL 165 hasta FCOL 10000. Vence 2025-10-31

COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS

Nit 901011888

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4745 11040.00 X 1000

CLIENTE	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
NIT	899999007 0

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 26 13 49	Bogota D.C.	3282121

POR CONCEPTO DE
$#12-04-00-000;CTO2401de2024;jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
05/05/2025	04/06/2025	LEYDI CAROLINA SERRANO WALTEROS	Credito

Item	**Código**	**Descripción**	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor IVA**	**Total**
1	CNTR	VALOR CORRESPONDIENTE A MOBILIARIO ENTREGADO E INSTALADO EN LA ORIP NUQUI .CHOCO , DEL CONTRAO 2401 DE 2024 , SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL ADJUNTA	1	Und.	72.827.139,35	19%	13.837.156,48	72.827.139,35

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

SUBTOTAL	**72.827.139,35**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**13.837.156,48**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**86.664.295,83**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/05/2025 16:09:13

CARRERA 116 N 19 A 50 Teléfono 3142548503

Correo Electrónico colcondi01@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

FCOL No. 188

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764082626041 que habilita desde FCOL 165 hasta FCOL 10000. Vence 2025-10-31

COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS

Nit 901011888

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4745 11040.00 X 1000

CLIENTE	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

NIT	899999007 0	**POR CONCEPTO D**
	$#12-04-00-000;CTO2401de2024;jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co#$	

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 26 13 49	Bogota D.C.	3282121

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/04/2025	14/05/2025	LEYDI CAROLINA SERRANO WALTEROS	Credito

Item	**Código**	**Descripción**	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor IVA**	**Total**
1	CNTR	VALOR CORRESPONDIENTE A MOBILIARIO ENTREGADO E INSTALADO EN LA ORIP CHIQUINQUIRA - BOYACA , DEL CONTRATO 2401 DE 2024 , SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL ADJUNTA	1	Und.	118.538.751	19%	22.522.363	118.538.751

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SESENTA Y UN MIL CIENTO TRECE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**118.538.751**
DESCUENTO	**0**
IVA	**22.522.363**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**141.061.113**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**141.061.113**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/04/2025 16:57:52

CARRERA 116 N 19 A 50 Teléfono 3142548503

Correo Electrónico colcondi01@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4dc81ba5ea482a5060d25abd694f68b5d6b0c3f20b81efefa3ed6f561b1097f43f0935ba23d3911ab88b43ce27379b6d --Fecha y Hora de Expedición : 15/04/2025 10:53:16 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FCOL No. 197

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764082626041 que habilita desde FCOL 165 hasta FCOL 10000. Vence 2025-10-31

COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS

Nit 901011888

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4745 11040.00 X 1000

CLIENTE	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
NIT	899999007 0

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 26 13 49	Bogota D.C.	3282121

POR CONCEPTO DE
$#12-04-00-000;CTO2401de2024;jacqueline.guzman@supernotariado.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/05/2025	13/06/2025	LEYDI CAROLINA SERRANO WALTEROS	Credito

Item	**Código**	**Descripción**	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor IVA**	**Total**
1	CNTR	VALOR CORRESPONDIENTE A MOBILIARIO ENTREGADO E INSTALADO EN LA ORIP PITALITO HUILA, DEL CONTRATO 2401 DE 2024 , SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL ADJUNTA	1	Und.	113.688.596,00	19%	21.600.833,24	113.688.596,00

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

SUBTOTAL	**113.688.596,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**21.600.833,24**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**135.289.429,24**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/05/2025 17:01:45

CARRERA 116 N 19 A 50 Teléfono 3142548503

Correo Electrónico colcondi01@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 13cd0f8e65c715026aecb6561506aec83fa76d808343177ca134952fa4e60ca62ab6a0feddfd0449946c2764cb39097d --Fecha y Hora de Expedición : 15/05/2025 9:54:14 a. m.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES	Código: GA-DMIF-PR-01-FR-08
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES	Versión: 04
		Fecha: 10/10/2018
		Hoja 1 de 1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO						
CONTRATO Nº	2401 DE 2024	CONTRATISTA	COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS		NIT / C.C.	901.011.888-9
PLAZO	CUATRO (4) MESES Y DOCE (12) DIAS	FECHA ACTA DE INICIO DD-MM-AA	1/11/2024	FECHA DE TERMINACIÓN DD-MM-AA		12/03/2025
CRP	594524 DEL	31/10/2024				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 763.425.604,00	TOTAL ADICIONES	$ 363.014.839,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	1.126.440.443,00
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR POR AGRUPACIONES" AGRUPACION 1						

EJECUCIÓN DEL CONTRATO						
FACTURA / CUENTA DE COBRO						% TOTAL DE EJECUCION
FECHA DD-MM-AA	FACTURA	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	NETO A PAGAR	
2-abr-25	FCOL No. 185	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE ENTREGA E INSTALACION DE MOBILIARIO ORIP ACACIAS META - COBRO DE ACUERDO CON MODIFICACION CLUSULA 4 DEL CONTRTATO .	**$ 114.003.648,04**	NA	$ 114.003.648,04	10,12%
9-abr-25	FCOL No. 186	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE ENTREGA E INSTALACION DE MOBILIARIO ORIP MONIQUIRA BOYACA - COBRO DE ACUERDO CON MODIFICACION CLUSULA 4 DEL CONTRTATO .	**$ 210.919.145,65**	NA	$ 210.919.145,65	18,72%
15-abr-25	FCOL No. 188	TERCER PAGO CORRESPONDIENTE ENTREGA E INSTALACION DE MOBILIARIO ORIP CHIQUINQUIRA BOYACA - COBRO DE ACUERDO CON MODIFICACION CLUSULA 4 DEL CONTRTATO .	**$ 141.061.113,00**	NA	$ 141.061.113,00	12,52%
2-may-25	FCOL No. 192	CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE ENTREGA E INSTALACION DE MOBILIARIO ORIP DUITAMA BOYACA - COBRO DE ACUERDO CON MODIFICACION CLUSULA 4 DEL CONTRTATO .	**$ 311.381.169,52**	NA	$ 311.381.169,52	27,64%
5-may-25	FCOL No. 194	QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE ENTREGA E INSTALACION DE MOBILIARIO ORIP COCUY BOYACA - COBRO DE ACUERDO CON MODIFICACION CLUSULA 4 DEL CONTRTATO .	**$ 127.121.025,50**	NA	$ 127.121.025,50	11,29%
5-may-25	FCOL No. 195	SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE ENTREGA E INSTALACION DE MOBILIARIO ORIP NUQUI CHOCO - COBRO DE ACUERDO CON MODIFICACION CLUSULA 4 DEL CONTRTATO .	**$ 86.664.295,83**	NA	$ 86.664.295,83	7,69%
5-may-25		SEPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE ENTREGA E INSTALACION DE MOBILIARIO ORIP PITALITO HUILA - COBRO DE ACUERDO CON MODIFICACION CLUSULA 4 DEL CONTRTATO .	**$ 135.289.429,24**	NA	$ 135.289.429,24	12,01%
TOTALES			$ 1.126.439.826,78		$ 1.126.439.826,78	100,00%


CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO 2401 DE 2024 DEJO CONSTANCIA QUE REALIZADAS LAS VERIFICACIONES DEL CASO, CONSTATÉ QUE EL CONTRATISTA ACREDITÓ EN DEBIDA FORMA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUMPLIÓ CON LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, POR ELLO AUTORIZO EL PAGO DE LA PRESENTE CUENTA DE ACUERDO A LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO -FORMA DE PAGO LITERAL 1.
DOCUMENTOS ANEXOS QUE AMPARAN ESTA CERTIFICACIÓN	**1-FACTURA. 2-ACTA DE RECIBO PARCIAL , 3 ACTA DE MENORES Y MAYORS CANTIDADES, COPIA DEL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES 4-CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO. 5-RUT. 6-COPIA ACTA DE INICIO. 7-CERTIFICADO DE PAGOS SG Y PARAFISCALES. 8-PLANILLAS DE SS. 9-CERTIFICACIÓN BANCARIA.**

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE FIRMA A LOS TRECE (13) DIAS DEL MES DE MAYO DE 2025

JACQUELINE DEL CARMEN GUZMAN HERAZO
Supervisor del contrato
Superintendencia de Notariado y Registro

SRPG

Se deja constancia que los elementos entregados e instalados dentro de la ejecución del contrato cuneta con póliza de cumplimiento que ampara la calidad y garantía de los mismos, póliza expedí por Seguros Mundial (se adjunta copia)

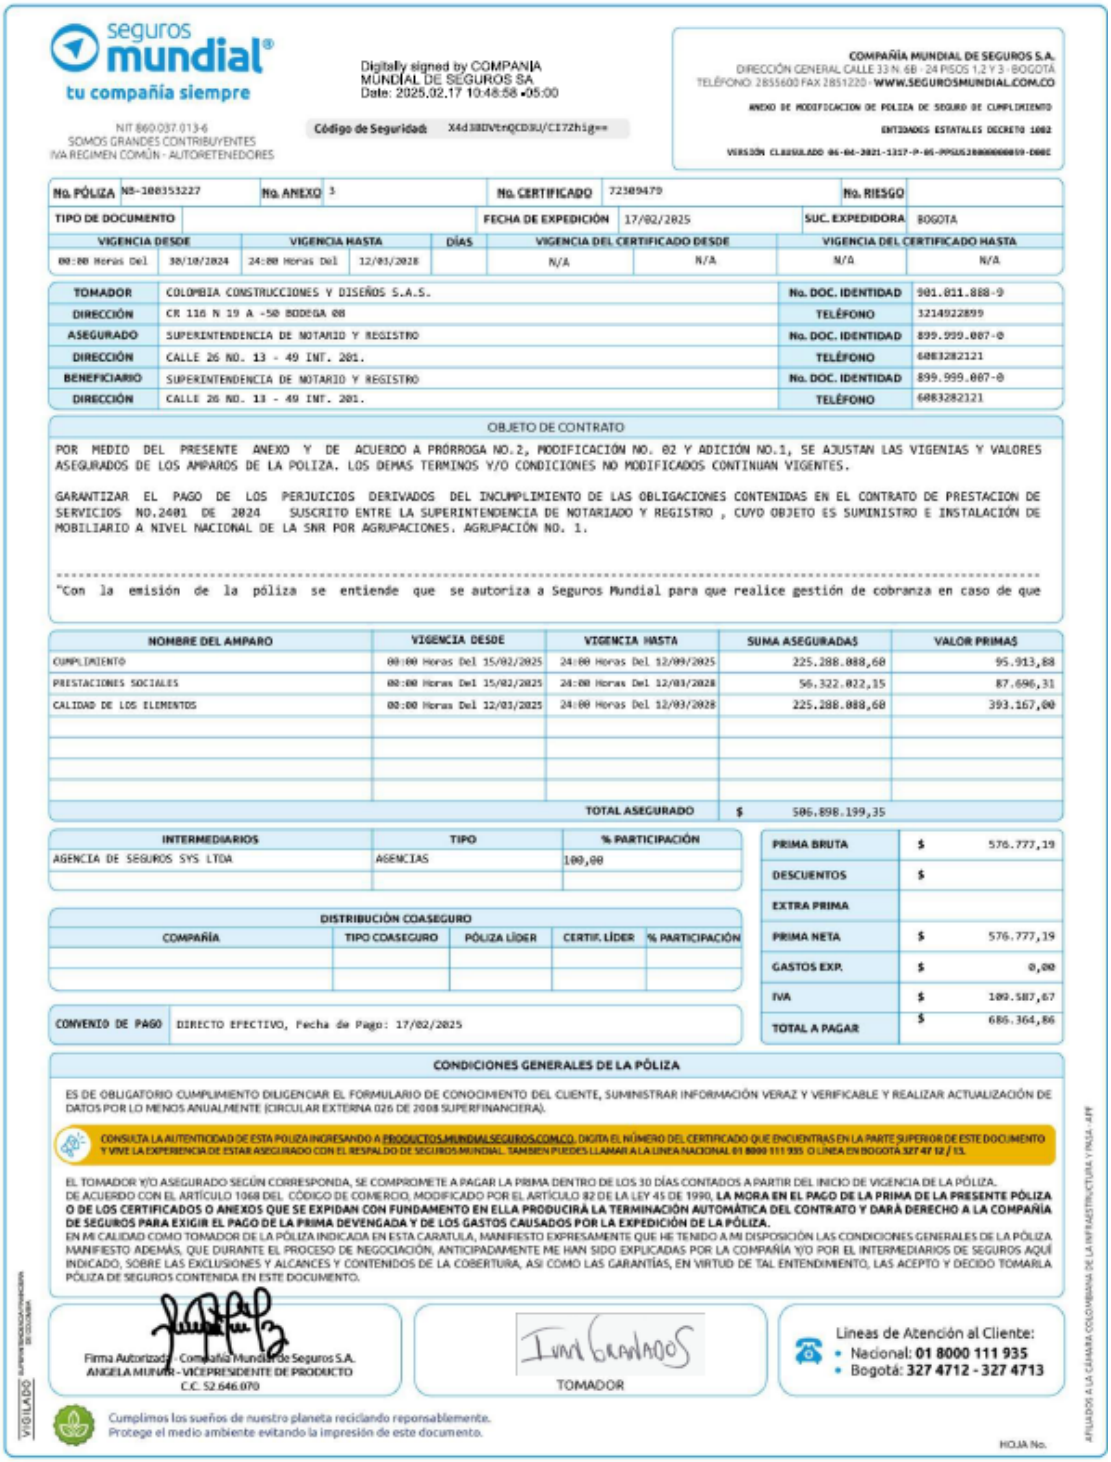

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.02.17 10:48:58 -05:00

Código de Seguridad: X4d3BDVtnQCD3U/CI72hig==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSU52000000059-D00C

No. PÓLIZA	NB-100353227	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	72389479	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	30/10/2024	24:00 Horas Del	12/03/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.	No. DOC. IDENTIDAD	901.011.888-9
DIRECCIÓN	CR 116 N 19 A -50 BODEGA 08	TELÉFONO	3214922899
ASEGURADO	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO	No. DOC. IDENTIDAD	899.999.007-0
DIRECCIÓN	CALLE 26 NO. 13 - 49 INT. 201.	TELÉFONO	6083282121
BENEFICIARIO	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO	No. DOC. IDENTIDAD	899.999.007-0
DIRECCIÓN	CALLE 26 NO. 13 - 49 INT. 201.	TELÉFONO	6083282121

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A PRÓRROGA NO.2, MODIFICACIÓN NO. 02 Y ADICIÓN NO.1, SE AJUSTAN LAS VIGENIAS Y VALORES ASEGURADOS DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.2401 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO , CUYO OBJETO ES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR POR AGRUPACIONES. AGRUPACIÓN NO. 1.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 15/02/2025	24:00 Horas Del 12/03/2025	225.288.088,60	95.913,88
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 15/02/2025	24:00 Horas Del 12/03/2028	56.322.022,15	87.696,31
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas Del 12/03/2025	24:00 Horas Del 12/03/2028	225.288.088,60	393.167,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 506.898.199,35	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA DE SEGUROS SYS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	576.777,19
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	576.777,19
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	109.587,67
TOTAL A PAGAR	$	686.364,86

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 17/02/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.


HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - AFP

CRA 116 # 19A -50 BODEGA 8
Tel. 3178345540 Bogotá Colombia
Correo electrónico: colcondi01@gmail.com

En constancia de la información consignada en este informe se firma en Bogotá a los 29 días del mes de mayo de 2025



_____

IVAN ENRIQUE GRANADOS PULIDO
CC. 1,020.745.211 de Bogotá
COLCONDI SAS
Nit: 901.011.888-9
