Bogotá - Carrera 45 # 108 A – 50 PISO 6
+57 (601) 6582569
info@frisson.net.co
www.grupoverytel.com

Señores:
MUNICIPIO DE COTA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
26 de marzo de 2025.

Asunto: Afectaciones y novedades al cronograma de ejecución del contrato SGM-LP-1796-2024.

OBJETO: IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4) Y LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CIUDADANA MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y VISUALIZACION - MUNICIPIO DE COTA – CUNDINAMARCA.

Estimados señores:

La **Unión Temporal FORTALECIMIENTO COTA 2024**, en calidad de contratista del contrato SGM-LP-1796-2024, y considerando las notificaciones previamente expuestas ante la supervisión del contrato, como consta en oficio con radicado No.CE20250881 de fecha 03-Marzo-2025, se permite manifestar el estado actual del cronograma de ejecución del proyecto establecido para el cumplimiento del objeto contractual, que consiste en la implementación y adecuación del **Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4)**, así como la **ampliación del Sistema de Videovigilancia Ciudadana** en el municipio de **Cota, Cundinamarca**.; ratificando novedades y afectaciones ajenas al contratista por motivos fortuitos de fuerza mayor, que a la fecha nos impiden finalizar la totalidad de los entregables del objeto contractual acorde el plazo vigente de ejecución.

A pesar de los esfuerzos desplegados por nuestra parte para cumplir con los plazos establecidos, se han presentado situaciones imprevistas, ajenas a nuestro control y supeditadas a terceros, siendo de principal relevancia las dificultades en la obtención de los permisos relacionados con el uso de la infraestructura y la cartera de postes de ENEL COLOMBIA, EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA - CODENSA, frente a condiciones y exigencias técnicas, significando demoras en la obtención de contrato con el Municipio de Cota. Estas circunstancias generan la necesidad de considerar una prórroga en el tiempo, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y entregables conforme a las especificaciones del contrato.

Bogotá - Carrera 45 # 108 A – 50 PISO 6
+57 (601) 6582569
info@frisson.net.co
www.grupoverytel.com


A continuación presentamos la desviación del 40% en la curva S del cronograma V2 a la fecha 3 de marzo de 2025:

UT Fortalecimiento COTA 2024

C4-VVC-CCTV-COTA

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin
1		**IMPLEMENTACION Y ADECUACION C4 - CCTV - COTA**	**70 días?**	**mar 24/12/24**	**lun 31/03/25**
2		**FASE 1: INICIO DEL PROYECTO**	**10 días**	**mar 31/12/24**	**lun 13/01/25**
3		Acta de Inicio	1 día	mar 31/12/24	mar 31/12/24
4		Kick Off	1 día	lun 13/01/25	lun 13/01/25
5		**FASE 2: PLANEACIÓN**	**24 días**	**mar 14/01/25**	**vie 14/02/25**
6		Site Survey	4 días	mar 14/01/25	vie 17/01/25
7		Entrega Documentacion, estudios y diseños	1 día	lun 10/02/25	lun 10/02/25
8		Aprobación diseños (Interventoria)	3 días	mié 12/02/25	vie 14/02/25
9		Tramite de permisos y PMT	5 días	lun 3/02/25	vie 7/02/25
10		Plan de adquiciciones (Aprobación Fichas Técnicas)	3 días	mié 15/01/25	vie 17/01/25
11		**FASE 3: EJECUCIÓN**	**46 días?**	**lun 20/01/25**	**lun 24/03/25**
12		**Ingreso de equipos a almacén**	5 días	vie 7/02/25	jue 13/02/25
29		**FACTURACION 1**	3 días	lun 24/02/25	mié 26/02/25
30		**Adecuaciones sala C4**	26 días	vie 7/02/25	vie 14/03/25
31		**Instalación Gabinetes; Brazos para VVC**	5 días	lun 10/02/25	vie 14/02/25
32		**Tendido y Despliegue Fibra Optica**	9 días	vie 14/02/25	mié 26/02/25
33		**Instalación equipos VVC (Cámaras)**	5 días	lun 24/02/25	vie 28/02/25
34		**Instalación Coronas Antiescalatorias**	5 días	lun 24/02/25	vie 28/02/25
35		**Instalación Rack y Equipos Almacenamiento C4**	5 días	mié 26/02/25	mar 4/03/25
36		**Instalación Mobiliario**	4 días	mié 5/03/25	lun 10/03/25
37		**Instalacion Equipos CCTV y Visualización C4**	6 días	lun 10/03/25	lun 17/03/25
38		**Pruebas funcionales y ajuste de equipos perimetrales**	5 días	mar 18/03/25	lun 24/03/25
39		**FASE 4:ESTABILIZACION Y CIERRE**	**6 días**	**lun 24/03/25**	**lun 31/03/25**


C4-VVC-CCTV-COTA

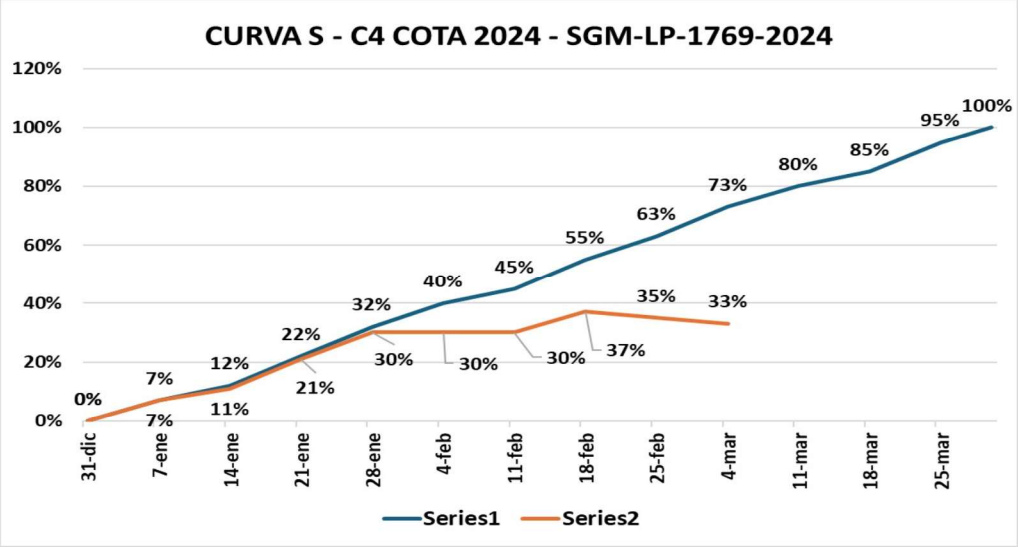

Bogotá - Carrera 45 # 108 A – 50 PISO 6
+57 (601) 6582569
info@frisson.net.co
www.grupoverytel.com

A continuación presentamos la proyección de desviación del en la curva S del cronograma V2 con el retraso por el trámite de ENEL:

Desvió a 26 de marzo = 30%

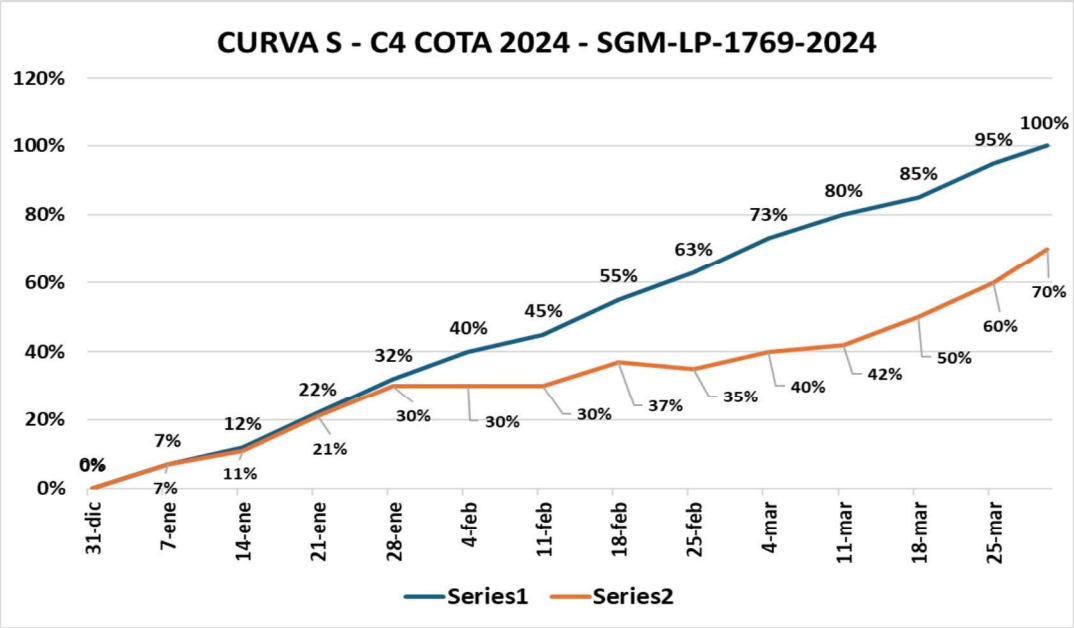

De acuerdo con lo anterior el avance del 70% se logro con lo pertinente a las adecuaciones y puesta en funcionamiento de la Sala C4.

El 30% restante, que de acuerdo a cronograma se representan en 21 días de actividades para llegar al 100% específicamente en la ampliación del Sistema de Videovigilancia Ciudadana en el municipio, por lo que en efecto se debería contemplar mínimo este tiempo de ampliación en la prórroga anteriormente mencionada.

En concordancia a las consideraciones expuestas, muy respetuosamente se solicito ante la supervisión del contrato, la evaluación para viabilizar una ampliación en tiempo, o en su defecto, generar suspensión temporal sobre el plazo de ejecución actual, con el fin de poder ajustar el cronograma y cumplir con las condiciones pactadas, permitiendo por un lado al Municipio de Cota, finalizar su proceso de contratación con ENEL COLOMBIA, EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA – CODENSA, y por otra parte, asegurar al contratista la finalización de sus actividades dependientes a las consideraciones expuestas, sin que esto afecte la calidad y los estándares de los trabajos de despliegue de

Bogotá - Carrera 45 # 108 A – 50 PISO 6
+57 (601) 6582569
info@frisson.net.co
www.grupoverytel.com

Fibra Óptica, conectividad en postes de Video Vigilancia Ciudadana, instalación de equipos y pruebas de conectividad para la posterior puesta a punto de la visualización en sala C4, ratificando nuestro compromiso de dar una culminación al proyecto a total satisfacción de los interesados.

En atención a las consideraciones y acciones anteriores, el municipio realizo la suspensión temporal por 60 días con terminación el 28 de mayo de 2025, y dada la necesidad de asegurar el cumplimiento cabal de las actividades del contrato, solicitamos respetuosamente a la supervisión del contrato considerar la extensión de la suspensión temporal actual por un periodo adicional de máximo de treinta (30) días, es decir hasta el 28 de junio de 2025.

Esta ampliación permitirá ajustar el cronograma de manera adecuada, garantizando que el Municipio de Cota finalice satisfactoriamente su proceso de contratación con ENEL COLOMBIA, EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA – CODENSA, y que el contratista pueda concluir sus actividades conforme a los estándares de calidad y requerimientos pactados, sin afectar la integridad del proyecto.

Reiteramos nuestro compromiso con la culminación exitosa del proyecto y la plena satisfacción de todas las partes interesadas.

Atentamente,

Sandra Layton Torres
Representante Legal
Gerencia De Operaciones

Alejandro Bello Rojas
Gerente De Proyecto
Gerencia De Operaciones

Cesar Eduardo Pajoy
Director De Proyecto
Gerencia De Operaciones
