ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01

FECHA PRESENTE ACTA:	25 DE NOVIEMBRE 2024		
CONTRATO No.:	No.COP-022-2024	**FECHA:**	17 DE ENERO DE 2024
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	**PROCESO No.:**	SAMC-14- 2023
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHÍCULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"		
VALOR CONTRATADO:	TRESCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS M/CTE ($302.424.034,26)		
CONTRATISTA:	LAGOVAL INGENIERÍA SAS R/L DIEGO FABIAN RODRIQUEZ TOVAR Nit: 900612042-0		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS R/L SANDRA YANIRA REYES PÁEZ Nit: 901820348-4		
SUPERVISOR:	CARLOS ANDRES GARCIA PEDRAZA		
FECHA DE INICIACIÓN	23 DE JULIO DE 2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	TRES (3) MESES		
FECHA DE SUSPENCION:	9 DE AGOSTO DE 2024		
FECHA DE REINICIO:	3 DE OCTUBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE ENERO DE 2025		

ANTECEDENTES DEL CONTRATO:

PRORROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO (mes)
Prorroga N°1: (03 de octubre 2024)	1

ADICIONALES

ADICIONAL No.	VALOR
1	$ 107,729,842.46

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA	TIEMPO (dias)
Acta suspensión N°1. (del 09 de agosto de 2024 al 03 de octubre de 2024)	53

VALOR TOTAL CONTRATADO:	$ 410,153,876.72
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN:	10 DE ENERO DE 2025

En el Municipio de Nuevo Colón, el VEINTICINCO (25) día del mes de NOVIEMBRE del año 2024 se reunieron LAGOVAL INGENIERÍA SAS R/L DIEGO FABIAN RODRIQUEZ TOVAR en representación propia como CONTRATISTA DE OBRA y CONSORCIO INTERVIAS R/L SANDRA YANIRA REYES PÁEZ en representación como CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y CARLOS ANDRES GARCIA PEDRAZA como supervisor del Municipio de Nuevo Colón con el fin de suscribir el Acta de Pago Parcial No. 01, del Contrato anteriormente citado, de acuerdo a lo consagrado en el informe de actividades presentado por el contratista, el cual hace parte integral de la presente acta y se dejan las siguientes consideraciones:

1. Mediante la suscripción de la presente acta de pago parcial, el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.

2. Que en la minuta del contrato de prestación de servicios en su clausula octava se estableció la siguiente forma de pago: La cancelación del valor total del contrato se hará mediante la presentación de actas parciales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el Interventor y el Supervisor del Contrato delegado por el municipio, acompañadas del programa de Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. Para el pago de la última acta de obra se debe presentar el Acta de Liquidación del Contrato. la primera acta parcial deberá corresponder como mínimo a la ejecución de un cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato, la segunda acta parcial por el treinta por ciento (30%), hasta completar el setenta por ciento (70%) de avance de ejecución y el treinta por ciento (30%) restante se pagará a la respectiva Acta de Liquidación del Contrato, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el Supervisor del Contrato delegado por el municipio, acompañadas del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. Se entiende que el presente contrato estará a precios unitarios fijos.

3. Que el contratista presentó el informe de avance de ejecución de actividades entre el periodo del 23 de julio al 9 de agosto y del 03 octubre al 31 de octubre de 2024.

4. Que el contratista presentó los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social, correspondiente al 23 de julio al 31 de octubre de 2024.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
	Versión 1	Código F-CP-18	1/06/2020
	ACTAS		Página 1 de 1

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01

1. BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 302,424,034.26		
VALOR ADICIONES	$ 107,729,842.46		
VALOR ANTICIPO INICIAL		$ -	$ -
VALOR ACTAS PARCIAIES			$ -
VALOR NO EJECUTADO			$ -
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL 1		$ 286,817,870.25	$ 286,817,870.25
VALOR POR EJECUTAR		$ 123,336,006.49	$ 123,336,006.49
TOTALES	**$ 410,153,876.72**	**$ 410,153,876.74**	**$ 410,153,876.74**
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA			**$ 286,817,870.25**

Nota: El valor a pagar en el acta parcial No. 01 es la suma de: DOCIENTOS OCHENTA SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON 25/100 CENTAVOS M/CTE ($286.817.870,25).

2. ORDENES DE PAGO

El valor pagado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro.

ACTA No.	PERIODO DE EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
ACTA PARCIAL N°1	Del 23 de julio al 9 de agosto y del 03 octubre al 31 de octubre de 2024.	1	25/11/2024	$ 286,817,870.25
TOTALES				-

3. ACTAS GENERADAS

ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	23/07/2024
Acta de pago parcial 1 (Presente acta)	25/11/2024

4. DOCUMENTOS ENTREGADOS

ÍTEM	DOCUMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD	CANTIDAD
1	INFORME DE ACTIVIDADES No. 1 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23/07/2024 HASTA EL 31/10/2024.	UND	1.00
2	RETENCIÓN EN LA FUENTE	UND	1.00
3	CUENTA DE COBRO	UND	1.00
4	PAGO DE PLANILLAS	UND	1.00

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

LAGOVAL INGENIERÍA SAS
R/L DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR
Contratista

CARLOS ANDRES GARCIA PEDRAZA
Secretario de Planeación y Obras Publicas
Supervisor

CONSORCIO INTERVIAS
CONSORCIO INTERVIAS R/L SANDRA YANIRA REYES PÁEZ
INTERVENTOR

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION		
APOYO Version 1	CONTRATACION PUBLICA Codigo F-CP-18		FORMATO 1/06/2020 Página 1 de 1
ACTAS			

ACTA DE PAGO PARCIAL DE CANTIDADES DE OBRA No. 01

CONTRATO:	COP-22-2024	**FECHA:**	17 DE ENERO DE 2024	**FECHA DE INICIACIÓN**		**FECHA ACTA ANTERIOR**
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			23 DE JULIO DEL 2024		-
CONTRATISTA:	LAGOVAL INGENIERIA SAS R.L. DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR			**FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1**		**FECHA PRESENTE ACTA**
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS R/L. SANDRA YANIRA REYES PAEZ			09 DE AGOSTO DE 2024 **FECHA DE REINICIO N° 1**		25 DE NOVIEMBRE DEL 2024
SUPERVISOR:	CARLOS ANDRES GARCIA PEDRAZA			09 DE AGOSTO DE 2024		
VALOR INICIAL:	$ 332,424,034.26	**% EJECUTADO**	70%	**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:**		**ACTA**
VALOR ADICIONAL:	$ 137,729,842.46	**% TIEMPO**	49.0%	10 DE ENERO DE 2025		ACTA DE PAGO PARCIAL DE CANTIDADES DE OBRA N° 01
VALOR TOTAL:	$410,153,876.72	**CDP**		**RP**		
		CDP / ADICIÓN	N/A	**RP / ADICIÓN**		

							CONTRATO INICIAL CONDICIONES ORIGINALES		CONDICION ACTULIZADA EN MOFIF. N°1		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	**ITEM GOBER**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
					TIPO:	OBRA PUBLICA								
1		CAP. 1: PRELIMINARES												
1.10	3.01.04	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	Kilómetro	0.12	$ 3,707,692.31	444,923.08	$ 0.12	$ 444,923.08	0.12	$ 444,923.08	0.12	$ 444,923.08		
1.20	1.01.11	DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO)	Metro Lineal	235.00	$ 6,153.85	1,446,154.75	$ 224.95	$ 1,384,308.56	224.95	$ 1,384,308.56	224.95	$ 1,384,308.56		
					COSTO DIRECTO GRUPO	$ 1,891,077.83	COSTO DIRECTO	$ 1,829,231.64	COSTO DIRECTO	$ 1,829,231.64	COSTO DIRECTO	$ 1,829,231.64		
					A	$ 415,037.12	A	$ 402,430.96	A	$ 402,430.96	A	$ 402,430.96		
					I	$ 56,737.33	I	$ 54,876.95	I	$ 54,876.95	I	$ 54,876.95		
					U	$ 94,553.89	U	$ 91,461.58	U	$ 91,461.58	U	$ 91,461.58		
					SUB TOTAL DIRECTO +AIU	$ 2,458,401.13	SUB-TOTAL	$ 2,378,001.13	SUB-TOTAL	$ 2,378,001.13	SUB-TOTAL	$ 2,378,001.13		
ITEM	**ITEM GOBER**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
2		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO			TIPO:	OBRA PUBLICA								
2.10	3.02.07	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	Metro Cúbico	326.70	$ 16,153.85	5,277,462.80	439.76	$ 7,103,817.08	439.76	$ 7,103,817.08	439.76	$ 7,103,817.08		
2.20	3.03.10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	46.37	$ 63,846.15	2,960,545.98	68	$ 4,341,538.20	63.63	$ 4,062,530.52	63.63	$ 4,062,530.52		
2.30	3.04.05	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)	Metro Cúbico	7.63	$ 87,692.31	669,092.33	0	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -		
2.40	Precio ref	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR ESTABILIZADO CON CEMENTO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	Metro Cúbico	24.00	$ 212,307.69	5,095,384.56	0	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -		
2.50	3.08.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	Metro Lineal	235.00	$ 53,846.15	12,653,845.25	228	$ 12,276,922.20	228.00	$ 12,276,922.20	228.00	$ 12,276,922.20		
2.60	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 Mpa	kilogramo	976.83	$ 7,230.77	7,063,233.06	962.68	$ 6,960,917.66	0.00	$ -	0.00	$ -		
2.70	3.05.04	CONCRETO MR 3.9 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 39 NORMAL)	Metro Cúbico	168.65	$ 837,692.31	141,276,868.08	151.28	$ 127,144,938.81	90.16	$ 75,526,338.67	90.16	$ 75,526,338.67		
2.80	1.02.13.	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	Metro Cúbico	1.81	$ 861,538.46	1,559,384.61	1.35	$ 1,163,076.92	0.00	$ -	0.00	$ -		
2.90	2.01.05	RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	Metro Cúbico	2.48	$ 129,230.77	320,492.31	0	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -		
2.10	3.12.02	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	Metro Cúbico - Kilómetro	2,100.35	$ 1,884.62	3,958,361.62	0	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -		
2.11	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 km (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	Metro Cúbico - Kilómetro	1,262.07	$ 2,384.62	3,009,557.36	0	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -		
NP-0	1.01.02.	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	Metro Cúbico - Kilómetro		$ 2,405.00	-	10808.45	$ 25,994,322.25	9683.43	$ 23,288,649.15	9683.43	$ 23,288,649.15		
NP-1	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	Metro Cúbico		$ 102,476.51	-	134.4	$ 13,772,842.94	134.40	$ 13,772,842.94	134.40	$ 13,772,842.94		
					COSTO DIRECTO GRUPO	$ 183,844,167.95	COSTO DIRECTO	$ 198,758,376.06	COSTO DIRECTO	$ 136,031,100.56	COSTO DIRECTO	$ 136,031,100.56		
					A	$ 40,445,716.95	A	$ 43,726,842.73	A	$ 29,926,842.12	A	$ 29,926,842.12		
					I	$ 5,515,325.04	I	$ 5,962,751.28	I	$ 4,060,933.02	I	$ 4,060,933.02		
					U	$ 9,192,208.40	U	$ 9,937,918.80	U	$ 6,801,555.03	U	$ 6,801,555.03		
					SUB TOTAL DIRECTO +AIU	$ 238,997,418.33	SUB-TOTAL	$ 258,385,888.88	SUB-TOTAL	$ 176,840,430.73	SUB-TOTAL	$ 176,840,430.73		
ITEM	**ITEM GOBER**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**		

1029

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0			
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION			
APOYO Version 1	CONTRATACION PUBLICA Código F-CP-18		FORMATO 1/06/2020	
ACTAS			Página 1 de 1	

ACTA DE PAGO PARCIAL DE CANTIDADES DE OBRA No. 01

CONTRATO:	COP-22-2024	**FECHA:**	17 DE ENERO DE 2024	**FECHA DE INICIACIÓN**		**FECHA ACTA ANTERIOR**
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			23 DE JULIO DEL 2024		-
CONTRATISTA:	LAGOVAL INGENIERIA SAS R.L. DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR			**FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1**		**FECHA PRESENTE ACTA**
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS R/L. SANDRA YANIRA REYES PAEZ			09 DE AGOSTO DE 2024 **FECHA DE REINICIO N° 1**		25 DE NOVIEMBRE DEL 2024
SUPERVISOR:	CARLOS ANDRES GARCIA PEDRAZA			09 DE AGOSTO DE 2024		
VALOR INICIAL:	$ 302,424,034.26	**% EJECUTADO**	70%	**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:**		**ACTA**
VALOR ADICIONAL:	$ 107,729,842.46	**% TIEMPO**	49.0%	10 DE ENERO DE 2025		
VALOR TOTAL:	$410,153,876.72	**CDP**		**RP**		ACTA DE PAGO PARCIAL DE CANTIDADES DE OBRA Nº 01
		CDP / ADICIÓN	N/A	**RP / ADICIÓN**		

CONTRATO INICIAL							**CONDICION ACTULIZADA EN MOFIF. N°1**		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**	
CONDICIONES ORIGINALES												
ITEM	**ITEM GOBER**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
					TIPO:	OBRA PUBLICA						
3		**CAP. 3: OBRAS PLUVIALES**			TIPO:	OBRA PUBLICA						
3.10	2.06.21	SUMIDERO EN LADRILLO SI 100	Unidad	3.00	$ 1,138,461.54	3,415,384.62	9	$ 10,246,153.86	9.00	$ 10,246,153.86	9.00	$ 10,246,153.86
3.20	2.05.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	Metro Lineal	16.50	$ 86,923.08	1,434,230.82	58	$ 5,041,538.64	58.00	$ 5,041,538.64	58.00	$ 5,041,538.64
3.30	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REALCE DE POZO DE INSPECCION DIAMETRO 1.2M	Unidad	2.00	$ 1,407,692.31	2,815,384.62	5	$ 7,038,461.55	3.00	$ 4,223,076.93	3.00	$ 4,223,076.93
3.40	2.05.05	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00	Unidad	1.00	$ 2,569,230.77	2,569,230.77	0	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
NP-2	2.05.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	Metro Lineal		$ 142,594.25	-	135.5	$ 19,321,520.88	135.50	$ 19,321,520.88	135.50	$ 19,321,520.88
NP-3	2.05.06	POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2m, 1.0< H <1.5m	Unidad		$ 1,661,730.63	-	5	$ 8,258,653.15	4.00	$ 6,606,922.52	4.00	$ 6,606,922.52
NP-4	1.02.04	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	Unidad		$ 320,962.00	-	6	$ 1,925,772.00	0.00	$ -	0.00	$ -
NP-5	1.02.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	Metro Lineal		$ 57,132.37	-	165.02	$ 9,427,983.70	165.02	$ 9,427,983.70	165.02	$ 9,427,983.70
NP-6	1.02.38	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	Metro Lineal		$ 32,342.16	-	48	$ 1,552,423.68	48.00	$ 1,552,423.68	48.00	$ 1,552,423.68
NP-7	2.05.69	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=4"	Unidad		$ 38,765.92	-	15	$ 581,788.80	15.00	$ 581,788.80	15.00	$ 581,788.80
					COSTO DIRECTO GRUPO	$ 10,254,230.83	COSTO DIRECTO	$ 63,394,296.26	COSTO DIRECTO	$ 57,001,409.00	COSTO DIRECTO	$ 57,001,409.01
					A	$ 2,251,550.28	A	$ 13,946,745.18	A	$ 12,540,309.98	A	$ 12,540,309.98
					I	$ 307,026.92	I	$ 1,901,828.89	I	$ 1,710,042.27	I	$ 1,710,042.27
					U	$ 511,711.54	U	$ 3,169,714.81	U	$ 2,850,070.45	U	$ 2,850,070.45
					SUB TOTAL DIRECTO +AIU	$ 13,304,500.08	SUB-TOTAL	$ 82,412,585.14	SUB-TOTAL	$ 74,101,831.70	SUB-TOTAL	$ 74,101,831.71
ITEM	**ITEM GOBER**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
		CAP. 4: ANDENES			TIPO:	OBRA PÚBLICA						
4.10	3.13.18	DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO	Metro cuadrado	235.00	$ 17,849.15	4,193,845.25	214.95	$ 3,836,029.94	214.95	$ 3,836,029.94	214.95	$ 3,836,029.94
4.20	1.18.05	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0,13 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	Metro cuadrado	235.00	$ 70,769.23	16,630,769.05	273.6	$ 19,362,461.33	43.55	$ 3,081,999.97	43.55	$ 3,081,999.97
4.30	3.03.10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	58.75	$ 63,846.15	3,750,961.31	99.18	$ 6,332,261.16	99.18	$ 6,332,261.16	99.18	$ 6,332,261.16
4.40	3.04.05	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)	Metro Cúbico	47.00	$ 87,692.31	4,121,538.57	0	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
NP-8	1.11.06.	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico		$ 73,747.12	-	169.73	$ 12,517,098.68	169.73	$ 12,517,098.68	169.73	$ 12,517,098.68
					COSTO DIRECTO GRUPO	$ 28,697,114.18	COSTO DIRECTO	$ 42,047,851.11	COSTO DIRECTO	$ 25,767,389.74	COSTO DIRECTO	$ 25,767,389.75
					A	$ 6,313,365.12	A	$ 9,250,527.24	A	$ 5,668,825.74	A	$ 5,668,825.75
					I	$ 860,917.43	I	$ 1,261,435.53	I	$ 773,021.69	I	$ 773,021.69
					U	$ 1,434,855.71	U	$ 2,102,392.56	U	$ 1,288,369.49	U	$ 1,288,369.49
					SUB TOTAL DIRECTO +AIU	$ 37,306,248.44	SUB-TOTAL	$ 54,662,206.44	SUB-TOTAL	$ 33,497,606.67	SUB-TOTAL	$ 33,497,606.68
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 224,666,590.79		$ 306,029,755.02		$ 220,629,130.94		$ 220,629,130.96
ADMINISTRACION 20%						$ 44,933,318.16		$ 61,205,951.01		$ 44,125,826.19		$ 44,125,826.19
IMPREVISTOS 3%						$ 6,739,997.72		$ 9,180,892.65		$ 6,618,873.93		$ 6,618,873.93

1020

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	
APOYO Version 1	CONTRATACIÓN PÚBLICA Código F-CP-18	FORMATO 1/06/2020
ACTAS		Página 1 de 1

ACTA DE PAGO PARCIAL DE CANTIDADES DE OBRA No. 01

CONTRATO:	COP-22-2024	FECHA:	17 DE ENERO DE 2024	FECHA DE INICIACIÓN		FECHA ACTA ANTERIOR
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			23 DE JULIO DEL 2024		-
CONTRATISTA:	LAGOVAL INGENIERIA SAS R.L. DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR			FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1		FECHA PRESENTE ACTA
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS R/L. SANDRA YANIRA REYES PAEZ			09 DE AGOSTO DE 2024 FECHA DE REINICIO N° 1		25 DE NOVIEMBRE DEL 2024
SUPERVISOR:	CARLOS ANDRES GARCIA PEDRAZA			09 DE AGOSTO DE 2024		
VALOR INICIAL:	$ 302,424,034.26	% EJECUTADO	70%	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:		ACTA
VALOR ADICIONAL:	$ 107,729,842.46	% TIEMPO	49.0%	10 DE ENERO DE 2025		
VALOR TOTAL:	$410,153,876.72	CDP		RP		ACTA DE PAGO PARCIAL DE CANTIDADES DE OBRA N° 01
		CDP / ADICIÓN	N/A	RP / ADICIÓN		

CONTRATO INICIAL CONDICIONES ORIGINALES							CONDICION ACTULIZADA EN MOFIF. N°1		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
ITEM	ITEM COBER	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
					TIPO:	OBRA PUBLICA							
		UTILIDAD 7%				$ 15,726,661.26		$ 21,472,002.55		$ 15,444,039.17		$ 15,444,039.17	
		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$ 5,357,487.26		$ 6,572,136.12					
		PLAN DE MANEJO DE TRANSITO				$ 5,000,000		$ 5,743,050.00					
		VALOR TOTAL CONTRATADO				$ 302,424,034.26		$ 410,153,876.72		$ 286,817,870.25		$ 286,817,870.25	
										25%			

CUADRO DE PAGOS

No.		DESCRIPCION	FECHA	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACION DE ANTICIPO			SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1		ACTA PARCIAL DE OBRA N°1	25/11/2024	$ 286,817,870.25	70%	0			$ 123,336,006.47	70%
		TOTAL		$ 286,817,870.25	70%	$ -			$ -	70%

LAGOVAL INGENIERIA SAS
DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR
NIT:900.[illegible]-0
CONTRATISTA

CONSORCIO INTERVIAS
R/L SANDRA YANIRA REYES PAEZ
NIT: 901820.346-4
INTERVENTORIA

CARLOS ANDRES GARCIA PEDRAZA
SECRETARIA DE PLANEACION
SUPERVISION

1031

1034

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
	Versión 1	Código F-GC-18	1/06/2020
	ACTAS		Página 1 de 1

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

INFORME No	1	**FECHA**	25	de	11	de	2024
PERIODO DEL	23	de	Julio	de			2024
AL	9	de	Agosto	de			2024
Y DEL	3	de	Octubre	de			2024
AL	31	de	Octubre	de			2024

INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
OBJETO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION VIAS VEHICULARES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACA				
No. Contrato	COP-022-2024	**Fecha Inicio**	19 de Junio de 2024	**Fecha Terminación**	18 de Octubre de 2024
No. CDP	DIS-2023000691	**Fecha CDP**		27 de Diciembre de 2023	
No. CDP adicional	DIS-2024000296	**Fecha CDP adicional**		16 de Septiembre de 2024	
No. CDP adicional	DIR-2024000005	**Fecha CDP adicional**		25 de Septiembre de 2024.	
No. RP	RES-2024000002	**Fecha RP**		18 de Abril de 2024	
No. RP adicional	RES-202400080	**Fecha RP adicional**		10 de Octubre de 2024	
No. RP adicional	RER-2024000008	**Fecha RP adicional**		3 de Octubre de 2024	

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA				
Nombre del Contratista	LAGOVAL INGENIERIA SAS		**Identificación**	900.612.042-0
Representante Legal	DIEGO FABIAN RODRIGEZ TOVAR		**Identificación**	61.049.631.574
Cuenta Bancaria	#	616592689	**Banco**	Banco de Bogota

INFORMACION DE INTERVENTORIA			
Nombre	CONSORCIO INTERVIAS	**Identificación**	901820348-4
Representante Legal	SANDRA YANIRA REYES PAEZ	**Identificación**	40.036.494

INFORMACION DEL SUPERVISOR			
Nombre	CARLOS ANDRES GARCIA PEDRAZA	**Identificación**	74.417.485

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
	Versión 1	Código F-GC-18	1/06/2020
	ACTAS		Página 1 de 1

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRAS


CRONOLOGIA DEL CONTRATO			
ACTAS SUSCRITAS	**FECHAS**	**DURACION Y/O VALOR**	**OBSERVACIONES**
Acta de inicio	19/07/2024	Tres (3) Meses	
Acta de suspension No.1	9/08/2024	Cincuenta y cuatro (54) dias	
Adicion y prorroga	3/10/2024	Un (1) mes y $107.133.876,52	
.cta de reinicio No.1	3/10/2024		

LOCALIZACION

El proyecto se desarrolla en el departamento de Boyaca, Municipio de Nuevo Colon, especificamente en el barrio los girasoles con coordenadas (5°21'14,16"N - 73°27'38.06"O)

POLIZAS					
POLIZAS	POLIZA No	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	39-44101159212 Anexo 10	$ 82.030.775,34	23/07/2024	6/08/2025	SEGUROS DEL ESTADO SA
SALARIOS		$ 82.030.775,34	23/07/2024	4/02/2028	
ESTABILIDAD		$ 123.046.163,02	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y UN DIA		
RCE	39-44101041773 Anexo 9	$ 260.000.000,00	23/07/2024	3/05/2025	

AVANCE DE EJECUCION			
% DE AVANCE	70,00%	**TIEMPO TRANSCURRIDO**	49%



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
	Versión 1	Código F-GC-18	1/06/2020
	ACTAS		Página 1 de 1

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VR UNITARIO	VALOR
	PRELIMINARES			
1,10	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	0,12	$ 3.707.692,31	$ 444.923,08
1,20	DEMOLICION SARDINEL INCLUYE RETIRO	235,00	$ 6.153,85	$ 1.384.308,56
			COSTO DIRECTO	$ 1.829.231,63
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO			
2.10	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	326,70	$ 16.153,85	$ 7.103.817,08
2,20	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	46,37	$ 63.846,15	$ 4.062.530,52
2,50	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	235,00	$ 53.846,15	$ 12.276.922,20
2,70	CONCRETO MR 3.9 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 39 NORMAL)	168,65	$ 837.692,31	$ 75.526.338,67
NP-0	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS		$ 2.405,00	$ 23.288.649,15
NP-1	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)		$ 102.476,51	$ 13.772.842,94
			COSTO DIRECTO	**$ 136.031.100,56**
	OBRAS PLUVIALES			
3,10	SUMIDERO EN LADRILLO SL 100	3,00	$ 1.138.461,54	$ 10.246.153,86
3,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	16,50	$ 86.923,08	$ 5.041.538,64
3,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REALCE DE POZO DE INSPECCION DIAMETRO 1.2M	2,00	$ 1.407.692,31	$ 4.223.076,93
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"		$ 142.594,25	$ 19.321.520,88
NP-3	POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR 1.2m, 1.0< H <1.5m		$ 1.651.730,63	$ 6.606.922,52
NP-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"		$ 57.132,37	$ 9.427.983,70

1035

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
	Versión 1	Código F-GC-18	1/06/2020
	ACTAS		Página 1 de 1

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

NP-6	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"		$ 32.342,16	$	1.552.423,68
NP-7	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=4"		$ 38.785,92	$	581.788,80
			COSTO DIRECTO	**$**	**57.001.409,00**
	ANDENES				
4,10	DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO	235,00	$ 17.846,15	$	3.836.029,94
4,20	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	235,00	$ 70.769,23	$	3.081.999,97
4,30	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	58,75	$ 63.846,15	$	6.332.261,16
NP-8	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO		$ 73.747,12	$	12.517.098,68
			COSTO DIRECTO	$	25.767.389,74
			VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS	$	220.629.130,94
			ADMINISTRACION 20%	$	44.125.826,19
			IMPREVISTOS 3%	$	6.618.873,93
			UTILIDAD 7%	$	15.444.039,17
			VALOR TOTAL CONTRATADO	**$**	**286.817.870,25**

ACTIVIDADES REALIZADAS

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO

DEMOLICION SARDINEL INCLUYE RETIRO

EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN

SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109

CONCRETO MR 3.9 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 39 NORMAL)

ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)

SUMIDERO EN LADRILLO SL 100

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REALCE DE POZO DE INSPECCION DIAMETRO 1.2M

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"

POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2m, 1.0< H <1.5m

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
	Versión 1	Código F-GC-18	1/06/2020
	ACTAS		Página 1 de 1

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=4"

DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO

CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN

BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO

DESCRIPCION DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra activo y en ejecucion con un avance del 69.93% hasta el dia 31 de Octubre del año 2024, según lo reportado y supervisado por interventoria externa y lo constatado en el sitio de obra

REGISTRO FOTOGRAFICO





	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
	Versión 1	Código F-GC-18	1/06/2020
	ACTAS		Página 1 de 1

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRAS





OBSERVACIONES

FIRMA

VoBo Secretario de Planeacion y Obras Publicas

NOMBRE **CARLOS ANDRES GARCIA PEDRAZA**

Documentos o Folios Anexos

Cuenta de Cobro ó Factura, Planillas de pago de Seguridad Social, Certificado de Parafiscales, Sabana y Memorias de Cantidades, Informe de Actividades, Bitacora, Certifiacion de Aval y Resgistro de Cantidades por parte de Interventoria

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR y JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA identificado C.C. 1.049.631.574 DE TUNJA y C.C. 23.434.187 DE CIENEGA en mi condición de representante legal y contador de LAGOVAL INGENIERIA S.A.S identificada con NIT 900.612.042-0 bajo la gravedad de juramento, conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en **BOYACÁ**, a los **25** días del mes de **NOVIEMBRE** de 20**24**.

LAGOVAL INGENIERIA S.A.S
NIT: 900.612.042-0
R/L: DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR
C.C. 1.049.631.574 DE TUNJA

JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA
C.C. 23.434.187 DE CIENEGA
T.P. 165295-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

DE2101550597E6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 23434187 de CIENEGA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 165295-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

7040

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

165295-T



JENNY MARIBEL
ESPINOSA CEPEDA
C.C. 23434187
RESOLUCION INSCRIPCION 012 **FECHA 16/02/2012**
UNIVERSIDAD U. P. T. C.

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS **176893**

FIRMA DEL TITULAR **92183**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 23434187

ESPINOSA CEPEDA
APELLIDOS

JENNY MARIBEL
NOMBRES

Jenny Espinosa
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-FEB-1984
CIENEGA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

15-MAR-2002 CIENEGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-0704600-33103741-F-0023434187-20020627 02122 02178O 02 107599424

1042

LAGOVAL INGENIERIA SAS
900.612.042-0
CR 64 24 47 IN 5 AP 519
Bogotá - Colombia
(031) 7353541
lagoval.ingenieria@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: LAG 46

Cliente: MUNICIPIO DE NUEVO COLON
Nit: 800.033.062-0
Teléfono: (601) 3115231750 - Ext. 000
Dirección: CL 4 4 60
Correo: alcaldia@nuevocolon_boyaca.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	27/11/2024, 08:49
Expedición	27/11/2024, 10:35
Vencimiento	27/11/2024
Vendedor	LAGOVAL INGENIERÍA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCAIL N 1 CONTRATO DE OBRA COP-22-2024 OBJETO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION VIAS VEHICULARES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON.	1.00	220,629,130.96

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos ochenta y seis millones ochocientos diecisiete mil ochocientos setenta pesos m/cte con veinticinco cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 286,817,870.25

Total Bruto	220,629,130.96
Administración 20.00%	44,125,826.19
Imprevistos 3.00%	6,618,873.93
Utilidad 7.00%	15,444,039.17
Total a Pagar	286,817,870.25

Observaciones:
PAGO ACTA PARCIAL N 1 CONTRATO DE OBRA COP-22-2024 OBJETO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION VIAS VEHICULARES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON.

Elaborado por

Firma recibido

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: versión 1

104

Tunja, 25 de noviembre de 2024

Señores
Alcaldía
MUNICIPIO DE NUEVO COLON
TESORERIA MUNICIPAL

REF: Factura de venta LAG 46 contrato de obra COP 22-2024

Cordial saludo.

Respetados señores, solicitamos **NO** efectuar **RETENCION EN LA FUENTE E ICA LAGOVAL INGENIERIA SAS** con NIT 9006120420-0 ya que se encuentran en **RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION.** De la Factura de venta según referencia.

Art. 911. (Estatuto Tributario)

Retenciones y autorretenciones en la fuente en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE.

Nota 1. Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE no estarán sujetos a retención en la fuente y tampoco estarán obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente con excepción de las correspondientes a pagos laborales. En los pagos por compras de bienes o servicios realizados por los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE, el tercero receptor del pago, contribuyente del régimen ordinario y agente retenedor del impuesto sobre la renta, deberá actuar como agente autorretenedor del impuesto. Lo anterior sin perjuicio de la retención en la fuente a título del impuesto sobre las ventas -IVA, regulado en el numeral 9 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario.

Con lo anterior agradecemos su atención prestada

Cordialmente

DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR
C.C. 61.049.631.574
R/L LAGOVAL INGENIERIA SAS
NIT 900612042-0

Adjunto, Registro Único Tributario.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141002690364

(415)7707212489984(8020) 000014100269036 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 6 1 2 0 4 2	0	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
LAGOVAL INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0

41. Dirección principal
CR 12 18 33 OF 309

42. Correo electrónico lagoval.ingenieria@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 3 5 3 5 4 1	3 1 2 5 2 3 7 8 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 3 0 4 0 8	7 1 1 2	2 0 1 3 0 4 0 8	4 2 1 0	4 2 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	9	1	4	2	4	7	4	8	5	2	5	5													

07- Retención en la fuente a título de rent 55 - Informante de Beneficiarios Finales
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 03 - 26 / 11 : 36: 39

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ TOVAR DIEGO FABIAN

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141002690364

(415)7707212489984(8020) 000014100269036 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 6 1 2 0 4 2	0	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	1	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 1 3 0 4 1 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 3 0 4 2 4	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 2 2 5 1 1	
78. Departamento	1 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 3 0 4 1 7	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0
87. Extranjero privado	0 . 0

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	1 0 1	2 0 1 9 0 1 0 1		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. D

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141002690364

(415)7707212489984(8020) 000014100269036 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 1 2 0 4 2	0	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 1 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 4 9 6 3 1 5 7 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	TOVAR	DIEGO	FABIAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141002690364

(415)7707212489984(8020) 000014100269036 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
		Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 3 0 4 2 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141002690364

(415)7707212489984(8020) 000014100269036 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 1 2 0 4 2	0	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal su

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 3 4 3 4 1 8 7		1 6 5 2 9 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ESPINOSA	CEPEDA	JENNY	MARIBEL

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

1049

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa LAGOVAL INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT 9006120420 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 616592689 desde el 29 de abril de 2013, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 20 de Noviembre del 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero
Gerencia de Soluciones para el Cliente
Banco de Bogota

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900612042	0	LAGOVAL INGENIERIA SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	TUNJA	CRA 12 18 33 OF 309	TUNJA-BOYACA	7454126	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1031768009	9476942065	E	2024/11/13	2024/11/06	BANCO DE BOGOTA		$4,025,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$260,000						$260,000						$452,500				$0		$0		$0		$0	
	$260,000						$260,000						$452,500				$0		$0		$0		$0	
	$260,000						$260,000						$452,500				$0		$0		$0		$0	
$0	$52,000		COMFABOY	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,000		COMFABOY	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,000		COMFABOY	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,000		COMFABOY	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,000		COMFABOY	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$260,000						$260,000						$452,500				$0		$0		$0		$0	

2024/11/06 09:29 a.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6765918		GORDILLO VALDERRAMA LUIS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 12 No 18 33	TUNJA-BOYACA	7454126	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	972889178	9475289703	I	2024/11/07	2024/10/10	BANCO DE BOGOTA	0	$1,916,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$798,000						$0						$33,400				$0		$0		$0		$0	
	$798,000						$0						$33,400				$0		$0		$0		$0	
	$798,000						$0						$33,400				$0		$0		$0		$0	
$0	$798,000			0	$0	0%	$0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$6,384,000	0.522%	1	$33,400	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$798,000						$0						$33,400				$0		$0		$0		$0	

2024/10/10 12:02 p.m.

2024

ACTA PARCIAL #1



LAGOVAL INGENIERIA S.A.S

CONTRATISTA

NUEVO COLON

25 de Noviembre del 2024

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 4
2.1. Localización 4
2.2. Descripción del proyecto 4
2.3. Presupuesto de obra 5
2.4. Antecedentes 7
3. CONDICIONES CONTRACTUALES 10
4. AVANCE FÍSCO DE OBRA 10
5. Avance financiero por capítulo 51
6. CONTROL OPERACIONAL 51
6.1. Recurso humano 52
6.2. Maquinaria empleada en la ejecución de la obra 53
7. CONTROL DE CALIDAD 53
8. CONTROL ADMINISTRATIVO 54

Dirección Cra 12#18-33 of. 309, Centro de Negocios El Señorial
Correo electrónico: lagoval.ingeneieria@gmail.com
Telefax 7454126
Ciudad Tunja

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.1. Localización

El contrato de obra pública No. COP-022-2024, cuyo objeto corresponde a **"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ",** se encuentra ubicado en el municipio de Nuevo Colón, departamento de Boyacá; cuya obra se realizará en el sector urbano, cuya ubicación se muestra a continuación:

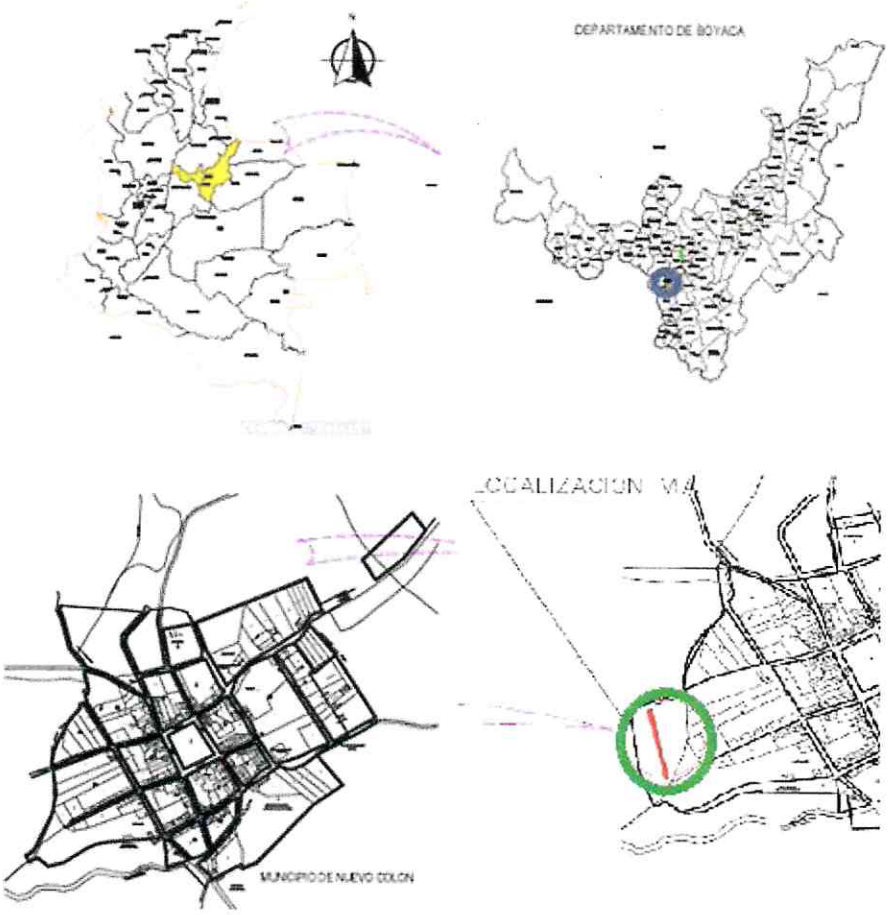


Ilustración 1. Ubicación via, Municipio de Nuevo Colón, Boyacá, Fuente: Propia

2.2. Descripción del proyecto


El Departamento de Boyacá está situado en el centro del país, en la cordillera oriental de los Andes; localizado entre los 04°39'10" y los 07°03'17" de latitud norte y los 71°57'49" y los 74°41'35" de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 23 189 km², lo que representa el 2,03 % del territorio nacional. Limita por el norte con los departamentos de Santander y norte de Santander, por el este con los departamentos de Arauca, Casanare y con el país vecino de Venezuela, por el sur con Cundinamarca, y por el oeste con Cundinamarca, Caldas y Antioquia.

LAGOVAL INGENIERIA S.A.S
NIT: 900.612.042-0

No.	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	3.01.04	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	KM	0,120	$ 4.820.000,00	$ 578.400,00
1.2	1.01.11	DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO)	ML	235,00	$ 8.000,00	$ 1.880.000,00
Subtot:						**$ 2.458.400,00**
2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO					
2.1	3.02.07	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	M3	326,70	$ 21.000,00	$ 6.860.700,00
2.2	3.03.10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	46,37	$ 83.000,00	$ 3.848.710,00
2.3	3.04.05	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)	M3	7,63	$ 114.000,00	$ 869.820,00
2.4	Precio ref	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR ESTABILIZADO CON CEMENTO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	M3	24,00	$ 276.000,00	$ 6.624.000,00
2.5	3.08.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	M3	235,00	$ 70.000,00	$ 16.450.000,00
2.6	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 Mpa	Kg	976,83	$ 9.400,00	$ 9.182.202,00
2.7	3.05.04	CONCRETO MR 3.9 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 39 NORMAL)	M3	168,65	$ 1.089.000,00	$ 183.659.850,00
2.8	41306	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	1,81	$ 1.120.000,00	$ 2.027.200,00
2.9	2.01.06	RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	2,48	$ 168.000,00	$ 416.640,00
2.10	3.12.02	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	m3-km	2.100,35	$ 2.450,00	$ 5.145.857,50


Dirección Cra 12#18-33 of. 309, Centro de Negocios El Señorial
Correo electrónico: lagoval.ingeneieria@gmail.com
Telefax 7454126
Ciudad Tunja

LAGOVAL INGENIERIA S.A.S
NIT: 900.612.042-0

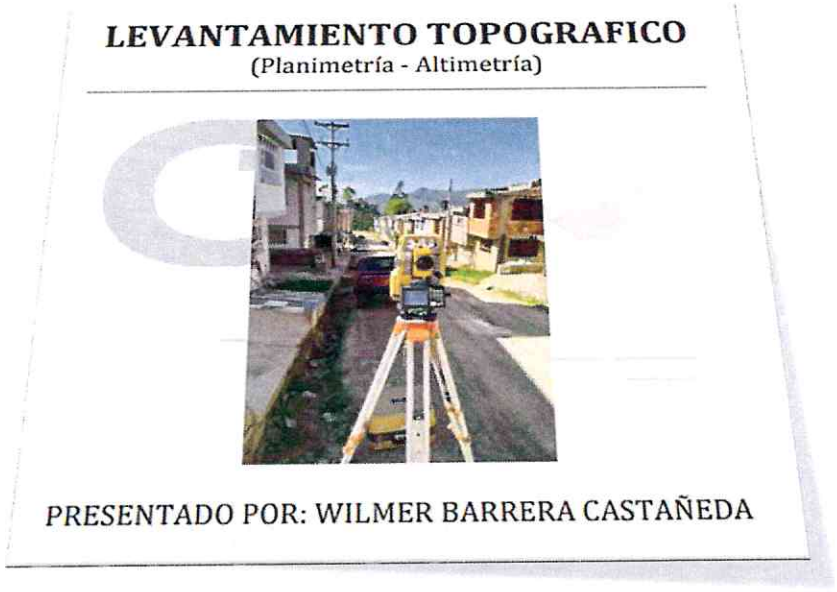

✓

2. Geología y estudio de suelos.
   - ✓ Estudio de suelos
   - ✓ Plano de localización de sondeos.

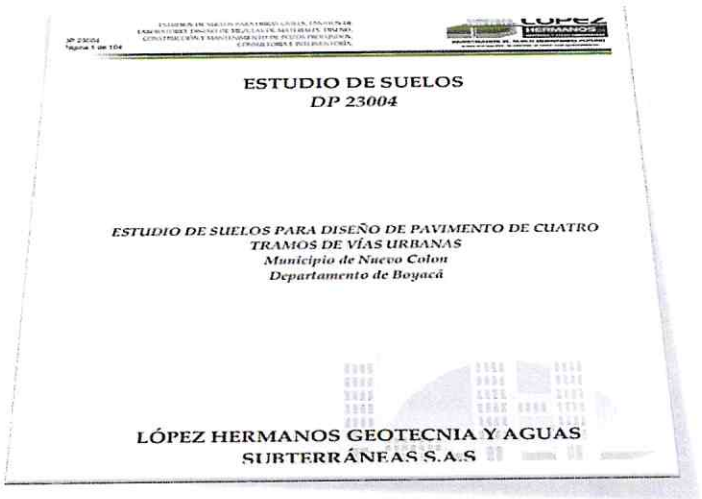

Dirección Cra 12#18-33 of. 309, Centro de Negocios El Señorial
Correo electrónico: lagoval.ingeneieria@gmail.com
Telefax 7454126
Ciudad Tunja

5. Presupuesto
   - ✓ Presupuesto oficial
   - ✓ Memoria de cantidades
   - ✓ Anexos del presupuesto



6. Otros documentos integrales al diseño
   - ✓ Especificaciones técnicas
   - ✓ Proceso constructivo
   - ✓ Diseño hidráulico.
   - ✓ Plan de manejo de tránsito.
   - ✓ Plan de manejo ambiental.
   - ✓ Estudio de transito
   - ✓ Cronograma y flujo de fondos.

3. CONDICIONES CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA No.	COP-022-2024
FECHA.	17 DE ENERO DE 2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN (BOYACÁ)
IDENTIFICACIÓN No.	N.I.T. No. 800.033.062-0
CONTRATISTA	LAGOVAL INGENIERIA SAS
NIT No.	900612042-0
REPRESENTANTE LEGAL.	DIEGO FABIAN RODRÍGUEZ TOVAR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD.	1.049.631.574 expedida en Tunja
OBJETO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VALOR	TRESCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS M/CTE. ($302.424.034,26)
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES

4. AVANCE FÍSCO DE OBRA

A continuación, relaciona el avance físico de obra comprendido entre el periodo del 03 de octubre al 31 de octubre del 2024.

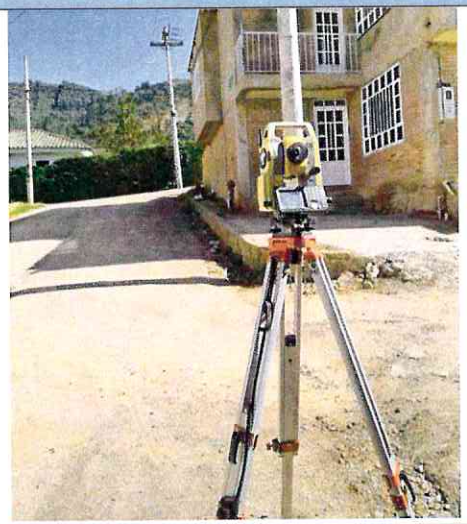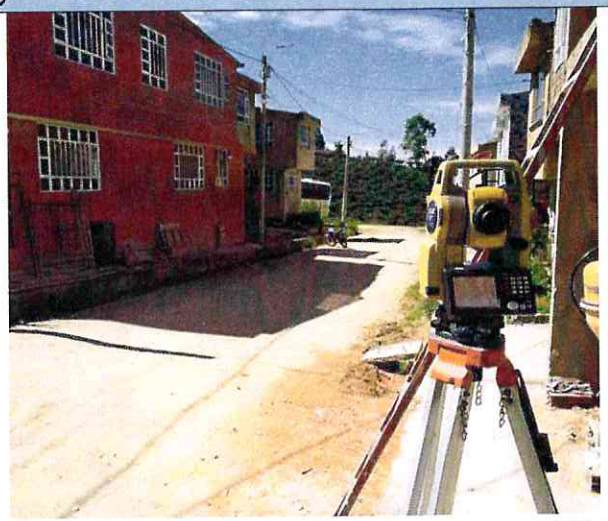REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	

Dirección Cra 12#18-33 of. 309, Centro de Negocios El Señorial
Correo electrónico: lagoval.ingeneieria@gmail.com
Telefax 7454126
Ciudad Tunja

LAGOVAL INGENIERIA S.A.S
NIT: 900.612.042-0

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	

Dirección Cra 12#18-33 of. 309, Centro de Negocios El Señorial
Correo electrónico: lagoval.ingeneieria@gmail.com
Telefax 7454126
Ciudad Tunja

LAGOVAL INGENIERIA S.A.S
NIT: 900.612.042-0

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	

Dirección Cra 12#18-33 of. 309, Centro de Negocios El Señorial
Correo electrónico: lagoval.ingeneieria@gmail.com
Telefax 7454126
Ciudad Tunja

LAGOVAL INGENIERIA S.A.S
NIT: 900.612.042-0

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	

Dirección Cra 12#18-33 of. 309, Centro de Negocios El Señorial
Correo electrónico: lagoval.ingeneieria@gmail.com
Telefax 7454126
Ciudad Tunja

1084

LAGOVAL INGENIERIA S.A.S
NIT: 900.612.042-0

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	

Dirección Cra 12#18-33 of. 309, Centro de Negocios El Señorial
Correo electrónico: lagoval.ingeneieria@gmail.com
Telefax 7454126
Ciudad Tunja

LAGOVAL INGENIERIA S.A.S
NIT: 900.612.042-0

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Dirección Cra 12#18-33 of. 309, Centro de Negocios El Señorial
Correo electrónico: lagoval.ingeneieria@gmail.com
Telefax 7454126
Ciudad Tunja

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	

Dirección Cra 12#18-33 of. 309, Centro de Negocios El Señorial
Correo electrónico: lagoval.ingeneieria@gmail.com
Telefax 7454126
Ciudad Tunja

LAGOVAL INGENIERIA S.A.S
NIT: 900.612.042-0

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Dirección Cra 12#18-33 of. 309, Centro de Negocios El Señorial
Correo electrónico: lagoval.ingeneieria@gmail.com
Telefax 7454126
Ciudad Tunja

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	

Dirección Cra 12#18-33 of. 309, Centro de Negocios El Señorial
Correo electrónico: lagoval.ingeneieria@gmail.com
Telefax 7454126
Ciudad Tunja

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Dirección Cra 12#18-33 of. 309, Centro de Negocios El Señorial
Correo electrónico: lagoval.ingeneieria@gmail.com
Telefax 7454126
Ciudad Tunja

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	

Dirección Cra 12#18-33 of. 309, Centro de Negocios El Señorial
Correo electrónico: lagoval.ingeneieria@gmail.com
Telefax 7454126
Ciudad Tunja

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Dirección Cra 12#18-33 of. 309, Centro de Negocios El Señorial
Correo electrónico: lagoval.ingeneieria@gmail.com
Telefax 7454126
Ciudad Tunja

LAGOVAL INGENIERIA S.A.S
NIT: 900.612.042-0

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	

Dirección Cra 12#18-33 of. 309, Centro de Negocios El Señorial
Correo electrónico: lagoval.ingeneieria@gmail.com
Telefax 7454126
Ciudad Tunja

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	

Dirección Cra 12#18-33 of. 309, Centro de Negocios El Señorial
Correo electrónico: lagoval.ingeneieria@gmail.com
Telefax 7454126
Ciudad Tunja

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	

Dirección Cra 12#18-33 of. 309, Centro de Negocios El Señorial
Correo electrónico: lagoval.ingeneieria@gmail.com
Telefax 7454126
Ciudad Tunja

LAGOVAL INGENIERIA S.A.S
NIT: 900.612.042-0


REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	

Dirección Cra 12#18-33 of. 309, Centro de Negocios El Señorial
Correo electrónico: lagoval.ingeneieria@gmail.com
Telefax 7454126
Ciudad Tunja

CAPITULO: 4. ANDENES


ÍTEM	UND	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
4.2 CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	CANTIDAD ACTUALIZADA EN MODIFICACION #1	ACUMULADO TOTAL 20/11/2024
		273.6	43.55
		% EJECUTADO	38%

ESQUEMA

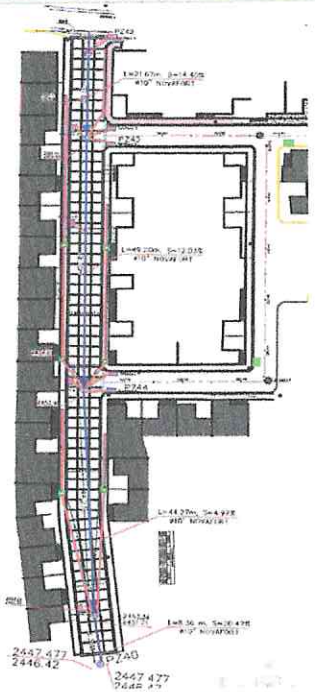

REGISTRO FOTOGRÁFICO



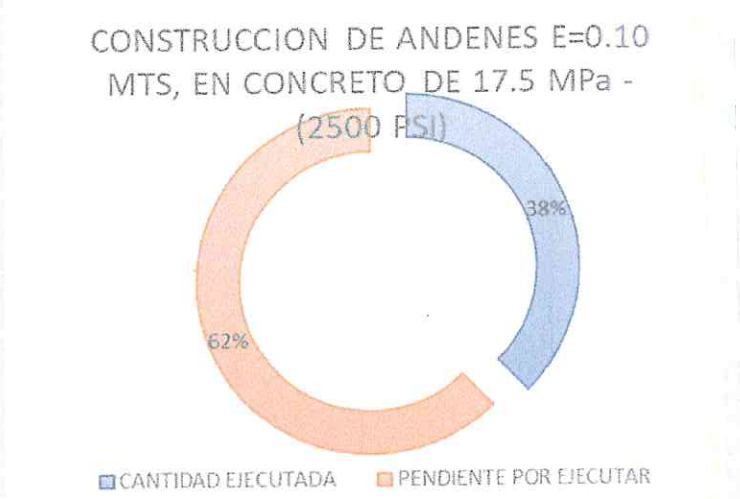

VALOR TOTAL ACUMULADO	43.55 m2
DESCRIPCIÓN	Corresponde a la actividade de fundir andenes en concreto de acuerdo a las caracteristicas tecnicas de los dos costado de via el el perimetro de viviendas

Dirección Cra 12#18-33 of. 309, Centro de Negocios El Señorial
Correo electrónico: lagoval.ingeneieria@gmail.com
Telefax 7454126
Ciudad Tunja

REGISTRO FOTOGRÁFICO










Dirección Cra 12#18-33 of. 309, Centro de Negocios El Señorial
Correo electrónico: lagoval.ingeneieria@gmail.com
Telefax 7454126
Ciudad Tunja

1080

LAGOVAL INGENIERIA S.A.S
NIT: 900.612.042-0

1. **Avance financiero por capítulo**

A continuación, se relaciona el porcentaje de avance de obra ejecutada para el periodo entre el 23 de Julio y el 31 de Octubre del 2024, correspondiente al Acta parcial 1 con fecha 20 de Noviembre de 2024(COSTO TOTAL POR ITEM)

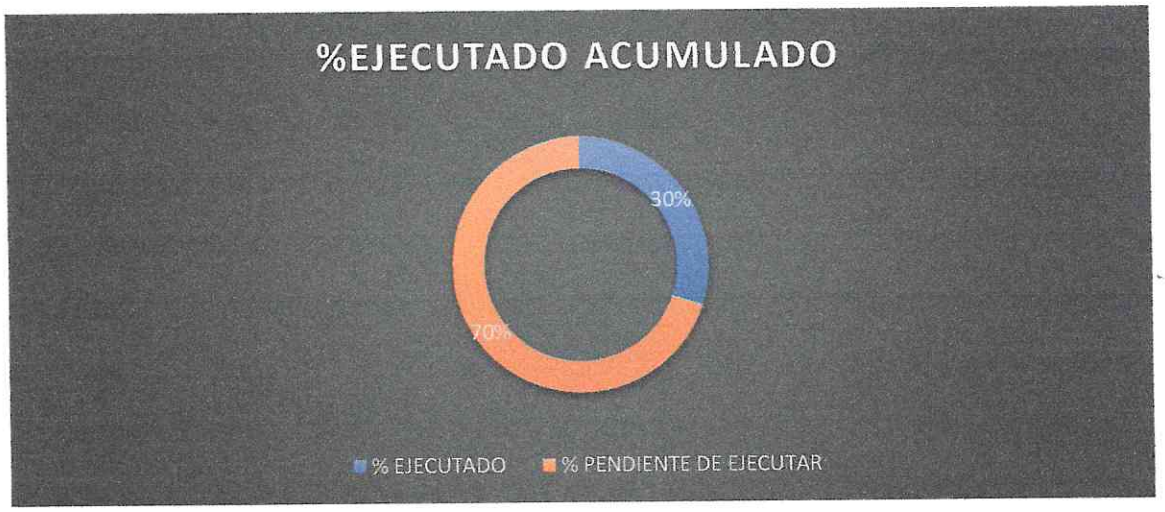

Nota: El valor a pagar en el acta parcial No. 01 es la suma de: DOCIENTOS OCHENTA SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON 23/100 CENTAVOS M/CTE ($286.817.870,23).

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 302,424,034.26		
VALOR ADICIONES	$ 107,729,842.46		
VALOR ANTICIPO INICIAL		$ -	$ -
VALOR ACTAS PARCIAIES			$ -
VALOR NO EJECUTADO			$ -
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL 1		$ 286,817,870.23	$ 286,817,870.23
VALOR POR EJECUTAR		$ 123,336,006.49	$ 123,336,006.49
TOTALES	**$ 410,153,876.72**	**$ 410,153,876.72**	**$ 410,153,876.72**
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA			**$ 286,817,870.23**

Dirección Cra 12#18-33 of. 309, Centro de Negocios El Señorial
Correo electrónico: lagoval.ingeneieria@gmail.com
Telefax 7454126
Ciudad Tunja

LAGOVAL INGENIERIA S.A.S
NIT: 900.612.042-0

2. CONTROL OPERACIONAL

2.1. Recurso humano

Para la ejecución del proyecto denominado "**MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**" se tiene el siguiente personal:

PERSONAL PROFESIONAL MES DE JULIO 2024				
NOMBRE	***CARGO***	***DEDICACIÓN***	***INGRESO***	***MES: JULIO***
				N° DE PLANILLA
LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA	DIRECTOR DE OBRA	50%	23/07/2024	9469582589
DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR	RESIDENTE DE OBRA	100%	23/07/2024	9471132278

PERSONAL PROFESIONAL MES DE AGOSTO 2024				
NOMBRE	***CARGO***	***DEDICACIÓN***	***INGRESO***	***MES: AGOSTO***
				N° DE PLANILLA
LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA	DIRECTOR DE OBRA	50%	23/07/2024	9471133042
DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR	RESIDENTE DE OBRA	100%	23/07/2024	9472716787

PERSONAL PROFESIONAL MES DE OCTUBRE 2024				
NOMBRE	***CARGO***	***DEDICACIÓN***	***INGRESO***	***MES: OCTUBRE***
				N° DE PLANILLA
LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA	DIRECTOR DE OBRA	50%	23/07/2024	9475289703
DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR	RESIDENTE DE OBRA	100%	23/07/2024	9476942065

PERSONAL DE OBRA MES DE JULIO 2024		
NOMBRES Y APELLIDOS	***CÉDULA***	***MES: JULIO***
		N° DE PLANILLA
MEDINA OCHOA JOSE EXPEDICTO	4118884	9471132278
PULIDO GARAY LUIS ALEJANDRO	74150197	9471132278
RESTREPO GOMEZ DANIEL ALEXANDER	1054708101	9471132278
RODRIGUEZ SANCHEZ MARSEDONIO	4183394	9471132278

MES	CILINDRO No	NÚMERO DE ENSAYO	Edad (Días)	Esfuerzo (PSI)	f 'c (%)
Noviembre	1-132835 (1)	132835 (1)	7	3320	93%

3.2. Ensayos de flexión

MES	VIGA No	NÚMERO DE ENSAYO	Edad (Días)	Esfuerzo (MPa)	Esfuerzo (PSI)	MR (%)
Noviembre	1-132838 (1)	1328 (1)	7	4.15	600	112%

4. CONTROL ADMINISTRATIVO

A continuación, se relacionan los siguientes anexos:

- Minuta del contrato
- Acta de inicio
- Pólizas
- Memoria de cantidades para el periodo de ejecución correspondiente al 23 de Julio al 31 de octubre del 2024
- Seguridad social correspondiente al mes de septiembre
- Ensayos de laboratorio correspondientes al mes de septiembre.
- Actas de comité de obra.

LAGOVAL INGENIERIA S.A.S
NIT: 900,612,042-0

ANEXO
ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD

Dirección Cra 12#18-33 of. 309, Centro de Negocios El Señorial
Correo electrónico: lagoval.ingeneieria@gmail.com
Telefax 7454126
Ciudad Tunja

LÓPEZ HERMANOS S.A.S GEOTECNIA Y AGUAS SUBTERRÁNEAS INVESTIGAMOS EL SUELO CIMENTANDO FUTURO	Formato del Sistema de Gestión de Calidad	Este documento es propiedad intelectual de López Hermanos Geotecnia y Aguas Subterráneas S.A.S	
	EJECUCIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO		
	INFORME DE ENSAYO: COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS	Versión No. 2	28/04/2023
		EL-INF-09	NTC 673

Número de ensayo: ***132835 (1)***

Cliente: LAGOVAL INGENIERÍA SAS
Dirección: Cra 12 # 18-33 Oficina 309
NIT./C.C.: 900612042-0
Tel.: 3125237862


Obra: Pavimentación barrio los girasoles Nuevo Colón.

Orden: 40468
Finalidad: Determinar calidad de especímenes cilíndricos
Muestra tomada por: El cliente
Norma de ensayo: NTC 673
Máquina de ensayo: SOILTEST
Certificado de calibración REM-LF-632

Ref: N/A
Fecha de ingreso muestra: 14/11/2024
Fecha de moldeo: 7/11/2024
Fecha de rotura : 14/11/2024 16:48
Edad (días): 7 día(s)
f'c (MPa): 24,5
Asentamiento (cm): No reportado
Estructura: N/A
Frente y Localización: Barrio los girasoles Nuevo Colón
Fecha Informe: 18/11/2024 10:58

Cilindro No.	Masa (kg)	H/D	FC	Diámetro promedio (mm)	Área (mm²)	Resistencia a Compresión					Tipo de falla	Peso Unitario (kg/m³)	Información adicional
						Carga		Esfuerzo		f 'c (%)			Tipo de Refrentado
						kgf	lbf	MPa	psi				
1-132835 (1)	12,83	2,05	1,00	151	17967	42000	92593	22,9	3320	93%	T4	2301	Neopreno

TIPO DE FALLA



DEFECTOS DEL CILINDRO: Ningún defecto observado

OBSERVACIONES : No hay observaciones adicionales

REVISÓ Y APROBÓ:
MIGUEL ÁNGEL CORTÉS ORDOÑEZ
041037-0612528 BYC


- Este folio no se debe reproducir de forma parcial sin la aprobación por escrito de López Hermanos Geotecnia y Aguas subterráneas S.A.S
- Los resultados mostrados en este informe corresponden unicamente a la(s) muestra(s) ensayada(s) tal como fueron recibida(s) del cliente.
- Los resultados de este informe corresponde al instante y las condiciones en que se realizo el ensayo. El laboratorio no se hace responsable del uso inadecuado de la información.
- El laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente.

LÓPEZ HERMANOS GEOTECNIA Y AGUAS SUBTERRÁNEAS S.A.S — INVESTIGAMOS EL SUELO CIMENTANDO FUTURO	Formato del Sistema de Gestión de Calidad	Este documento es propiedad intelectual de López Hermanos Geotecnia y Aguas Subterráneas S.A.S	
	EJECUCIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO		
	INFORME DE ENSAYO: COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS	Versión No. 2	28/04/2023
		EL-INF-09	NTC 673

Número de ensayo:	***132835 (1)***	***Ref:***	N/A
Cliente:	LAGOVAL INGENIERÍA SAS	***Fecha de ingreso muestra:***	14/11/2024
Dirección:	Cra 12 # 18-33 Oficina 309	***Fecha de moldeo:***	7/11/2024
NIT./C.C.:	900612042-0	***Fecha de rotura :***	14/11/2024 16:48
Tel.:	3125237862	**Edad (días):**	7 día(s)
Obra:	Pavimentación barrio los girasoles Nuevo Colón.	***f'c (MPa):***	24,5
Orden:	40468	***Asentamiento (cm):***	No reportado
Finalidad:	Determinar calidad de especímenes cilíndricos	***Estructura:***	N/A
Muestra tomada por:	El cliente	***Frente y Localización:***	Barrio los girasoles Nuevo Colón
Norma de ensayo:	NTC 673	***Fecha Informe:***	18/11/2024 10:58
Máquina de ensayo:	SOILTEST		
Certificado de calibración	REM-LF-632		



FOTOGRAFÍA 1

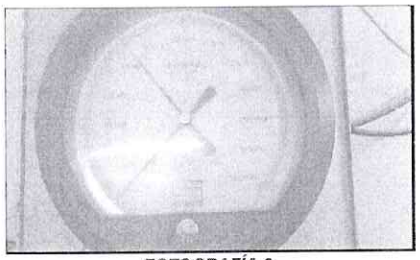

FOTOGRAFÍA 2



FOTOGRAFÍA 3

REVISÓ Y APROBÓ
MIGUEL ÁNGEL CORTÉS ORDOÑEZ
041037-0612528 BYC

Fin de informe

LÓPEZ HERMANOS S.A.S. GEOTECNIA Y AGUAS SUBTERRÁNEAS — INVESTIGAMOS EL SUELO CIMENTANDO FUTURO	Formato del Sistema de Gestión de Calidad EJECUCIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO	Este documento es propiedad intelectual de López Hermanos Geotecnia y Aguas Subterráneas S.A.S
	INFORME DE ENSAYO: MÓDULO DE ROTURA DE VIGAS	Versión No. 2 — 26/01/2024 EL-INF-34 — INV 414

Número de ensayo:	***132838 (4)***			
Solicitado por:	LAGOVAL INGENIERÍA SAS	*Ref:*	Viga	
Dirección:	Cra 12 # 18-33 Oficina 309	*Fecha de moldeo:*	8/11/2024	
NIT./C.C.:	900612042-0	*Fecha de rotura :*	15/11/2024	8:44
Tel.:	3125237862	Edad (dias):	7 día(s)	9 hora(s)
Obra:	Pavimentación barrio los girasoles Nuevo Colón.	*MR (MPa):*	3,9	
Orden:	40468	*Asentamiento (cm):*	No reportado	
Finalidad:	Determinar calidad de especímenes prismáticos	*Estructura:*	N/A	
Muestra tomada por:	El cliente			
Norma de ensayo:	INV 414	*Frente y Localización:*	Barrio los girasoles Nuevo Colón	
Máquina de ensayo:	SOILTEST ELE	*Fecha Informe:*	16/11/2024 8:46	
Certificado de calibración:	REM LF-622			

Viga No.	Longitud de la viga (mm)	Ancho promedio *b* (mm)	Altura promedio *d* (mm)	a* (mm)	Longitud de la luz libre (mm)	Módulo de rotura						Tercio de falla
						Carga		Esfuerzo			MR (%)	
						kN	lbf	kg/cm^2	MPa	psi		
1-132838 (4)	500	150	161	0	450	35,712	8028	42,3	4,15	600	112%	MEDIO

a: Distancia promedio entre la línea de fractura y el soporte soporte más cercano, medida sobre la superficie de tensión de la viga (Para fallas fuera del tercio medio)*

DEFECTOS DE LA VIGA: Ninguno

OBSERVACIONES: Ninguna

Laura Gómez R.

REVISÓ Y APROBÓ
LAURA CRISTINA GÓMEZ RAMÍREZ
041037-0629529 BYC

Nota: Este folio no se deberá reproducir de forma parcial o total sin la aprobación por escrito de López Hermanos Geotécnia y Aguas subterraneas S.A.S
- Los resultados mostrados en este informe corresponden unicamente a la(s) muestra(s) ensayada(s) tal como fueron recibida(s) del cliente.
- Los resultados de este informe corresponde al instante y las condiciones en que se realizo el ensayo. el laboratorio no se hace responsable del uso inadecuado de la información
- El laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente.

SOPORTE FINACIERO ACUMULADO ACTA PARCIAL 1

PEDIODO: (DEL 23 NOVIEMBRE AL 31 OCTUBRE 2024)

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-065
	ACTA PARCIAL 1	FECHA: 25/NOVIEMBRE/2024

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (ACTA PARCIAL N#1 DEL 23 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE)

OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MEMORIA DE CANTIDADES ACUMULADA

CAPÍTULO: CAP. 1: PRELIMINARES — UNIDAD: KM

ITEM: 1.10 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO — CANTIDAD: 0.12

AREA O LUGAR	DIMENSIONES LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO BARRIO GIRASOLES								
Red vial Barrio Girasoles -	0.12				0.12	1.00	KM	0.12

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-065
ACTA PARCIAL 1		FECHA: 25/NOVIEMBRE/2024

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (ACTA PARCIAL N#1 DEL 23 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE)

OBRA:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MEMORIA DE CANTIDADES ACUMULADA

CAPÍTULO: CAP. 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO
ITEM: 2.10 EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO

UNIDAD: M3
CANTIDAD: 439.76


AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
Excavación mecánica vía								
Vía principal barrio Girasoles	120.00	6.00	0.45		324.00	1.00	M3	324.00
Excavación mecánica vía								
Excavación Red Pluvial								
Tramo 1	21.67	0.70	1.00		15.17	1.00	M3	15.17
Tramo 2	49.20	0.70	1.02		35.13	1.00	M3	35.13
Tramo 3	44.27	0.70	1.18		36.57	1.00	M3	36.57
Tramo 4	8.36	0.70	1.08		6.32	1.00	M3	6.32
Prolongación de Tubería para vía	12.00	0.70	1.08		9.07	1.00	M3	9.07
Pozos de inspección	1.50	1.50	1.20		2.70	5.00	M3	13.50

%EJECUTADO ACUMULADO




ESQUEMA GRAFICO

Esquema general



PROLONGACIÓN DE TUBERÍA

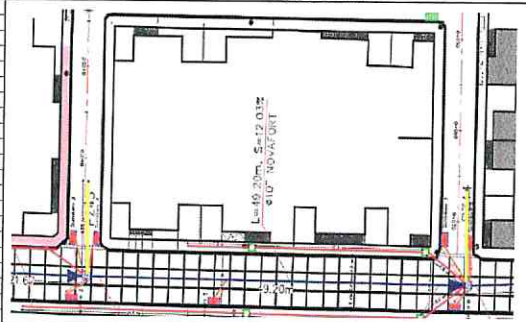

Tramo 1








Pozos de inspección (POZOS NUEVOS)




Excavación de conexión red de sumideros




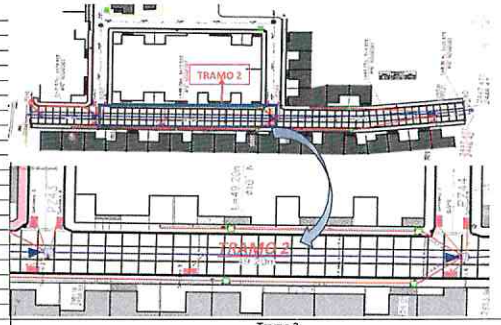

Tramo 3

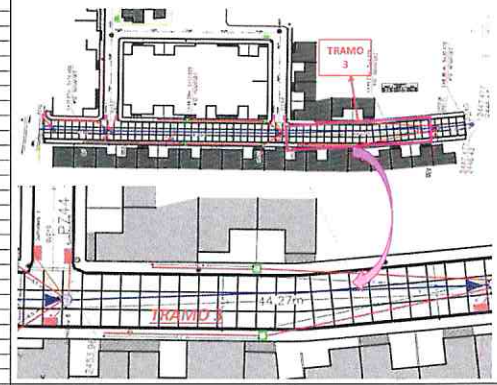

Tramo 4

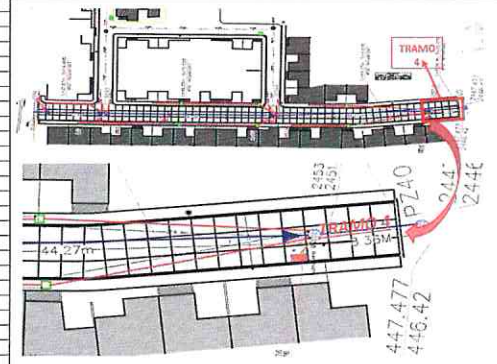

Excavación bajantes para conexión de cajasde cajas

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-065
ACTA PARCIAL 1		FECHA: 25/NOVIEMBRE/2024

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (ACTA PARCIAL N#1 DEL 23 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE)

OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


MEMORIA DE CANTIDADES ACUMULADA

CAPÍTULO: CAP. 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO — UNIDAD: ML

ITEM: 2.50 SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109 — CANTIDAD: 228.00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Vía principal barrio Girasoles (Lateral Izquierdo)	120.00				120.00	1.00	ML	120.00
Vía principal barrio Girasoles (Lateral Derecho)	18.00				18.00	1.00	ML	18.00
	46.40				46.40	1.00	ML	46.40
	43.60				43.60	1.00	ML	43.60
Aproxima Resultado a :			2 Decimales				TOTAL	228.00

ESQUEMA GRAFICO





% EJECUTADO MES 2

CONTRATISTA
LAGOVAL INGENIERIA S.A.S
NIT 900.612.042-0
R/L DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR
C.C. 1.049.631.574

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAS
NIT 901.820.348-4
R/L SANDRA YANIRA REYES PAEZ
C.C. 40.036.494

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-065
ACTA PARCIAL 1		FECHA: 25/NOVIEMBRE/2024

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (ACTA PARCIAL N#1 DEL 23 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE)

OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


MEMORIA DE CANTIDADES ACUMULADA

CAPÍTULO: CAP. 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO — UNIDAD: M3-KM

ITEM: NP-0 ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS — CANTIDAD: 9,683.43

AREA O LUGAR		DIMENSIONES VOLUMEN	ANCHO	ALTO	KM	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES									
	TRANSPORTE DE EXCAVACIÓN MANUAL (MEMORIA 2.02)	63.63			5.00	63.63	1.00	M3-KM	63.63
	TRANSPORTE DE EXCAVACIÓN ANDENES (MEMORIA 4.03)	99.18			5.00	495.90	1.00	M3-KM	495.90
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y SUBBSASE									
	TRANSPORTE DE AFIRMADO (MEMORIA NP-8)	169.73			30.00	5,091.90	1.00	M3-KM	5,091.90
	TRANSPORTE DE SUB-BASE (NP-1)	134.40			30.00	4,032.00	1.00	M3-KM	4,032.00
									-
									-
									-
Aproxima Resultado a :				2 Decimales				TOTAL	9,683.43

%EJECUTADO ACUMULADO



ESQUEMA GRAFICO

TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES



TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y SUBBSASE



CONTRATISTA
LAGOVA INGENIERIA S.A.S
NIT 900.612.042-0
R/L DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR
C.C. 1.049.631.574

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAS
NIT 901.820.348-4
R/L SANDRA YANIRA REYES PAEZ
C.C. 40.036.494

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-065
ACTA PARCIAL 1		FECHA: 25/NOVIEMBRE/2024

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (ACTA PARCIAL N#1 DEL 23 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE)


OBRA:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MEMORIA DE CANTIDADES ACUMULADA

CAPÍTULO	CAP. 3: OBRAS PLUVIALES	UNIDAD:	UND
ITEM:	3.10 SUMIDERO EN LADRILLO SL 100	CANTIDAD:	9.00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
SUMIDEROS								
SUMIDEROS 1						1.00	UND	1.00
SUMIDEROS 2						1.00	UND	1.00
SUMIDEROS 3						1.00	UND	1.00
SUMIDEROS 4						1.00	UND	1.00
SUMIDEROS 5						1.00	UND	1.00
SUMIDEROS 6						1.00	UND	1.00
SUMIDEROS 7						1.00	UND	1.00
SUMIDEROS 8						1.00	UND	1.00
SUMIDEROS 9						1.00	UND	1.00


%EJECUTADO ACUMULADO

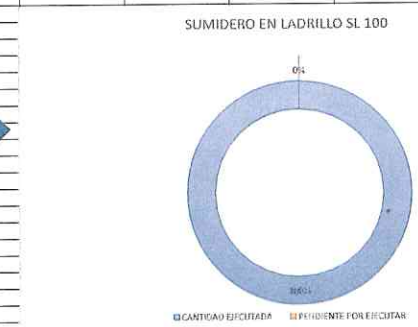

ESQUEMA GRAFICO

Esquema general

Excavación de sumideros





	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-065
	ACTA PARCIAL 1	FECHA: 25/NOVIEMBRE/2024

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (ACTA PARCIAL N#1 DEL 23 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE)

OBRA:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


MEMORIA DE CANTIDADES ACUMULADA

CAPÍTULO: CAP. 3: OBRAS PLUVIALES — UNIDAD: ML

ITEM: 3.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8" — CANTIDAD: 58.00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
TUBERÍA DE CONEXIÓN CAJAS A POZOS								
TUBERIA DE 8"	6.00				6.00	4.00	ML	24.00
Tuberia red de sumideros								
Sumidero 1	3.00				3.00	1.00	ML	3.00
Sumidero 2	5.00				5.00	1.00	ML	5.00
Sumidero 3	3.00				3.00	1.00	ML	3.00
Sumidero 4	2.00				2.00	1.00	ML	2.00
Sumidero 5	5.00				5.00	1.00	ML	5.00
Sumidero 6	5.00				5.00	1.00	ML	5.00
Sumidero 7	3.00				3.00	1.00	ML	3.00
Sumidero 8	3.00				3.00	1.00	ML	3.00
Sumidero 9	5.00				5.00	1.00	ML	5.00


%EJECUTADO ACUMULADO

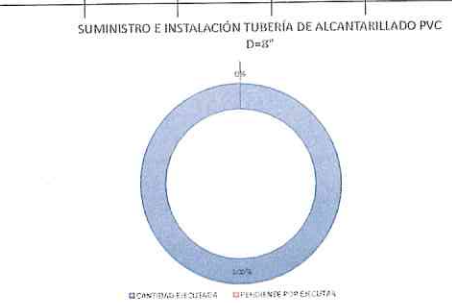


ESQUEMA GRAFICO

Esquema general

Excavación de sumideros



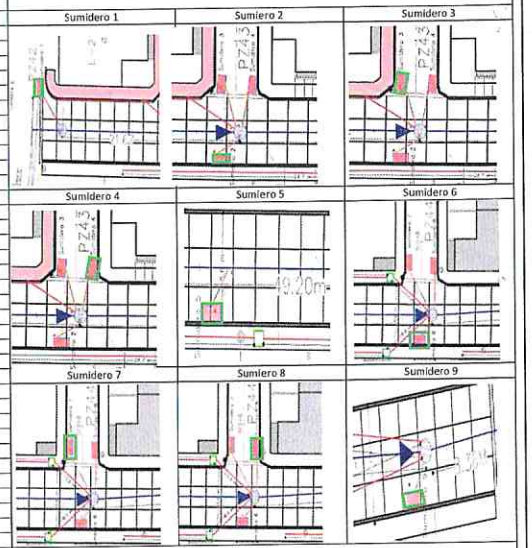

Tubería de cajas a pozos

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-065
ACTA PARCIAL 1		FECHA: 25/NOVIEMBRE/2024

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (ACTA PARCIAL N#1 DEL 23 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE)


OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MEMORIA DE CANTIDADES ACUMULADA


CAPÍTULO: CAP. 3: OBRAS PLUVIALES — UNIDAD: UND

ITEM: 3.30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REALCE DE POZO DE INSPECCION DIAMETRO 1.2M — CANTIDAD: 3.00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
Pozos de inspección								
Pozos red de alcantarillado existente						3.00	UND	3.00

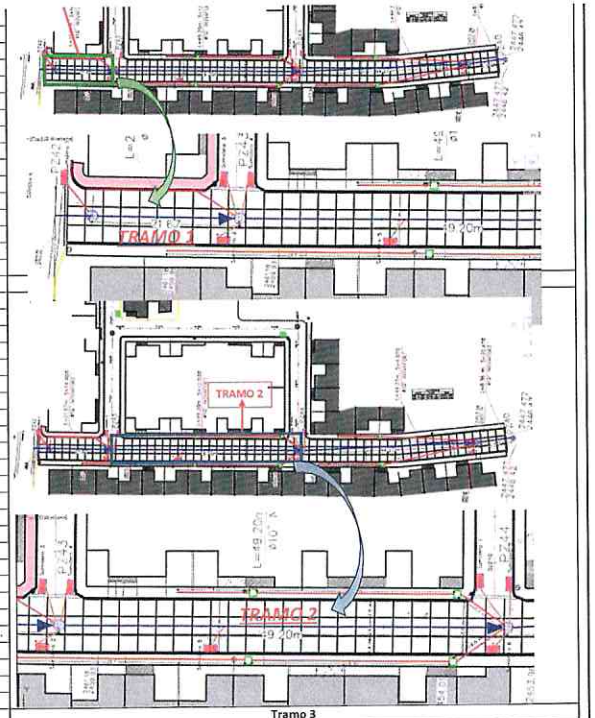

Tramo 3

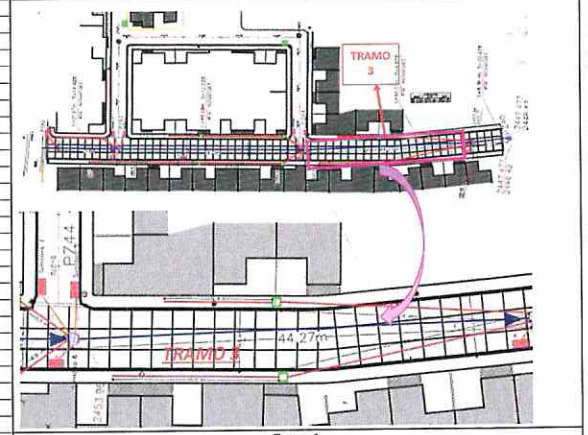

Tramo 4

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-065
	ACTA PARCIAL 1	FECHA: 25/NOVIEMBRE/2024

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (ACTA PARCIAL N#1 DEL 23 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE)

OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MEMORIA DE CANTIDADES ACUMULADA


CAPÍTULO: CAP. 3: OBRAS PLUVIALES — UNIDAD: UND

ITEM: NP-3 POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2m, 1.0< H <1.5m — CANTIDAD: 4.00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA GRAFICO
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO					Esquema general
Pozos de inspección									
Pozos red de alcantarillado existente						4.00	UND	4.00	Pozos de inspección (realce de pozos existentes)
Aproxima Resultado a :				2 Decimales			TOTAL	4.00	

%EJECUTADO ACUMULADO





CONTRATISTA
LAGOVAL INGENIERIA S.A.S
NIT 900.632.042-0
R/L DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR
C.C. 1.049.631.574

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAS
NIT 901.820.348-4
R/L SANDRA YANIRA REYES PAEZ
C.C. 40.036.494

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-065
ACTA PARCIAL 1		FECHA: 25/NOVIEMBRE/2024

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (ACTA PARCIAL N#1 DEL 23 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE)

OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


MEMORIA DE CANTIDADES ACUMULADA

CAPÍTULO: CAP. 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO — UNIDAD: UND

ITEM: NP-7 SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=4" — CANTIDAD: 15.00


AREA O LUGAR	DIMENSIONES LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
YEE D=4"								
YEE COSTADO DERECHO					-	9.00	UND	9.00
YEE COSTADO IZQUIERDO					-	6.00	UND	6.00
Aproxima Resultado a : 2 Decimales							TOTAL	15.00

%EJECUTADO ACUMULADO



ESQUEMA GRAFICO

YEE D=4"



CONTRATISTA
LAGOVAL INGENIERIA S.A.S
NIT 900.612.042-0
R/L DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR
C.C. 1.049.631.574

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAS
NIT 901.820.348-4
R/L SANDRA YANIRA REYES PAEZ
C.C. 40.036.494

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-065
ACTA PARCIAL 1		FECHA: 25/NOVIEMBRE/2024

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (ACTA PARCIAL N#1 DEL 23 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE)

OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


MEMORIA DE CANTIDADES ACUMULADA

CAPÍTULO CAP. 4: ANDENES — **UNIDAD:** M2

ITEM: 4.20 CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) — **CANTIDAD:** 43.55


AREA O LUGAR	DIMENSIONES LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
CONSTRUCCIÓN DE ANDENES								
SECCIÓN IZQUIERDA, BARRIO GIRASOLES								
PR + 0. 000 A PR + 0.030	30.00	1.00			30.00	1.00	M2	30.00
PR + 0. 030 A PR + 0.044	14.00	0.97			13.55	1.00	M2	13.55
Aproxima Resultado a :			2 Decimales				TOTAL	43.55

%EJECUTADO ACUMULADO

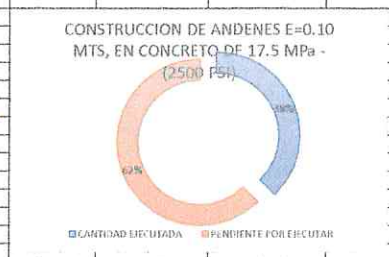

ESQUEMA GRAFICO

CONSTRUCCIÓN DE ANDENES



CONTRATISTA
LAGOVAL INGENIERIA S.A.S
NIT 900.612.042-0
R/L DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR
C.C. 1.049.631.574

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAS
NIT 901.820.348-4
R/L SANDRA YANIRA REYES PAEZ
C.C. 40.036.494
