	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
	Versión 1	Código F-CP-18	1/06/2020
	ACTAS		Página 1 de 1

ACTA DE TERMINACION CONTRATO

FECHA PRESENTE ACTA	20 de Diciembre de 2024		
CONTRATO	COP-022-2024	**FECHA**	17 de Enero de 2024
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	**PROCESO No.:**	SAMC-14-2023
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y REAHILITACION VIAS VEHICULARES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON DEPARTAMETNO DE BOYACA		
VALOR CONTRATADO:	TRESCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 302.424.034,26) M/CTE		
CONTRATISTA:	LAGOVAL INGENIERIA SAS		
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS		
SUPERVISOR:	JUAN DAVID REYES VARGAS		
FECHA DE INICIACIÓN:	23 de Julio de 2024		
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	22 de Octubre de 2024		

PRORROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
1	UN (01) MES

ADICIONALES

ADICIONAL No.	VALOR
1	$ 107.729.841,46

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA	TIEMPO
SUSPENSION N° 01	09 de Agosto de 2024
REINICIO N° 01	03 de Octubre de 2024

VALOR TOTAL CONTRATADO:	CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS ($410.153.876,22) M/CTE
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN:	15 de Enero de 2024

En Nuevo Colón, a los VEINTE (20) DIAS días del mes de DICIEMBRE del año 2024 se reunieron DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR como representante legal de LAGOVAL INGENIERIA SAS como contratista y el ingeniero SANDRA YANNIRA REYES PAEZ como representante legal de COSORCIO INTERVIAS como interventor y JUAN DAVID REYES VARGAS como supervisor del Municipio de Nuevo Colón con el fin de suscribir acta de TERMINACION del contrato dse obra anteriormente citado satisfacción por parte del supervisor las obras ejecutadas.

A. TRABAJO EJECUTADO

1/4

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
	Versión 1	Código F-CP-18	1/06/2020
	ACTAS		Página 1 de 1

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

No hace falta la ejecución de cantidades de obra

La terminación de los trabajos, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR
R/L LAGOVAL INGENIERIA SAS
Contratista

JUAN DAVID REYES VARGAS
Secretario de Planeación y Obras Publicas
Supervisor

SANDRA YANIRA REYES
INTERVENTORA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVO COLON NIT. 800.033.062-0		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
	Versión 1	Código F-CP-18	1/06/2020
	ACTAS		Página 1 de 1

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02

FECHA PRESENTE ACTA:	20 DE DICIEMBRE 2024
CONTRATO No.:	No.COP-022-2024 — **FECHA:** 17 DE ENERO DE 2024
TIPO DE CONTRATO:	OBRA — **PROCESO No.:** SAMC-14- 2023
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHÍCULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
VALOR INICIAL DEL CONTRATADO:	TRESCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS M/CTE ($302.424.034,26)
VALOR INICIAL CONTRATADO	TRESCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 302.424.034,26) M/CTE
VALOR ADICIONAL	CIENTO SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($107.729.841,96) M/CTE
VALOR TOTAL	CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON VEINTI DOS CENTAVOS ($410.153.876,22) M/CTE.
CONTRATISTA:	LAGOVAL INGENIERÍA SAS R/L DIEGO FABIAN RODRIQUEZ TOVAR Nit: 900612042-0
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS R/L SANDRA YANIRA REYES PÁEZ Nit: 901820348-4
SUPERVISOR:	JUAN DAVID REYES VARGAS
FECHA DE INICIACIÓN	23 DE JULIO DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	TRES (3) MESES
FECHA DE SUSPENCION:	9 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO:	3 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE ENERO DE 2025

ANTECEDENTES DEL CONTRATO:

PRORROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO (mes)
Prorroga N°1: (03 de octubre 2024)	1

ADICIONALES

ADICIONAL No.	VALOR
1	$ 107,729,841.96

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA	TIEMPO (dias)
Acta suspensión N°1. (del 09 de agosto de 2024 al 03 de octubre de 2024)	53

VALOR TOTAL CONTRATADO:	$ 410,153,876.22
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN:	15 DE ENERO DE 2025

En el Municipio de Nuevo Colón, el VEINTE (20) día del mes de DICIEMBRE del año 2024 se reunieron LAGOVAL INGENIERÍA SAS R/L DIEGO FABIAN RODRIQUEZ TOVAR en representación propia como CONTRATISTA DE OBRA y CONSORCIO INTERVIAS R/L SANDRA YANIRA REYES PÁEZ en representación como CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y JUAN DAVID REYES VARGAS como supervisor del Municipio de Nuevo Colón con el fin de suscribir el Acta de Pago Parcial No. 01, del Contrato anteriormente citado, de acuerdo a lo consagrado en el informe de actividades presentado por el contratista, el cual hace parte integral de la presente acta y se dejan las siguientes consideraciones:

1. Mediante la suscripción de la presente acta de pago parcial, el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.

2. Que en la minuta del contrato de prestación de servicios en su clausula octava se estableció la siguiente forma de pago: La cancelación del valor total del contrato se hará mediante la presentación de actas parciales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el Interventor y el Supervisor del Contrato delegado por el municipio, acompañadas del programa de Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. Para el pago de la última acta de obra se debe presentar el Acta de Liquidación del Contrato. la primera acta parcial deberá corresponder como mínimo a la ejecución de un cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato, la segunda acta parcial por el treinta por ciento (30%), hasta completar el setenta por ciento (70%) de avance de ejecución y el treinta por ciento (30%) restante se pagará a la respectiva Acta de Liquidación del Contrato, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el Supervisor del Contrato delegado por el municipio, acompañadas del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. Se entiende que el presente contrato estará a precios unitarios fijos.

3. Que el contratista presentó el informe de avance de ejecución de actividades entre el periodo del 23 de julio al 9 de agosto y del 03 octubre al 31 de octubre de 2024.

4. Que el contratista presentó los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social, correspondiente al 23 de julio al 31 de octubre de 2024.

1386

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
	Versión 1	Código F-CP-18	1/06/2020
	ACTAS		Página 1 de 1

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02

1. BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 302,424,034.26		
VALOR ADICIONES	$ 107,729,841.96		
VALOR ANTICIPO INICIAL		$ -	$ -
VALOR ACTAS PARCIALES		$ 286,817,870.25	$ 286,817,870.25
VALOR NO EJECUTADO		$ 3,134,386.34	$ 3,134,386.34
VALOR PRESENTE DE RECIBO		$ 120,201,619.63	$ 120,201,619.63
VALOR POR EJECUTAR		$ -	$ -
TOTALES	**$ 410,153,876.22**	**$ 410,153,876.22**	**$ 410,153,876.22**
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA			**$ 120,201,619.63**

Nota: El valor a pagar en el acta parcial No. 01 es la suma de: CIENTO VEINTE MILLONES DOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS DIESINUEVE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($120.201.619.63).

2. ORDENES DE PAGO

El valor pagado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro.

ACTA No.	PERIODO DE EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
ACTA PARCIAL 1	Del del 23 julio al 09 de agosto y del 03 de octubre al 31 de octubre	2,024,000,009	02/12/2024	$ 286,817,870.25
TOTALES				$ 286,817,870.25

3. ACTAS GENERADAS

ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	23/07/2024
Acta de pago parcial 1	24/11/2024
Acta de pago parcial 2 (Presente acta)	20/12/2024

4. DOCUMENTOS ENTREGADOS

ÍTEM	DOCUMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD	CANTIDAD
1	INFORME DE ACTIVIDADES No. 1 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL Del Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre y del 01 diciembre al 20 de diciembre de 2024.	UND	1.00
2	RETENCIÓN EN LA FUENTE	UND	1.00
3	FACTURA	UND	1.00
4	PAGO DE PLANILLAS	UND	1.00

5. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	RECURSOS	VALOR	CONTRACRÉDITO
2.3.24.2402.0600.2402114.360	PROPIOS	$ 23.365.613,66	$ 3.134.386,34
2.3.40.4003.1400.4003018.290	PROPIOS	$ 80.633.876,52	
RP-00IL-2402-0602-2023154940014-445	REGALÍAS	$ 595.965,44	
RP-00IL-2402-0602-202315490014-445	REGALÍAS	$ 15.606.164,01	

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

LAGOVAL INGENIERÍA SAS
R/L DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR
Contratista

JUAN DAVID REYES VARGAS
Secretario de Planeación y Obras Publicas
Supervisor

CONSORCIO INTERVIAS
CONSORCIO INTERVIAS R/L SANDRA YANIRA REYES PÁEZ
INTERVENTOR

1394

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0		
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
Versión 1	Código F-CP-18	1/06/2020
ACTAS		Página 1 de 1

ACTA - RECIBO FINAL

FECHA PRESENTE ACTA	20 de Diciembre de 2024		
CONTRATO	COP-022-2024	**FECHA**	17 de Enero de 2024
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	**PROCESO No.:**	SAMC-14-2023
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y REAHILITACION VIAS VEHICULARES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON DEPARTAMETNO DE BOYACA		
VALOR CONTRATADO:	TRESCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 302.424.034,26) M/CTE		
CONTRATISTA:	LAGOVAL INGENIERIA SAS		
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS		
SUPERVISOR:	JUAN DAVID REYES VARGAS		
FECHA DE INICIACIÓN:	23 de Julio de 2024		
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	22 de Octubre de 2024		

PRORROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
1	UN (01) MES

ADICIONALES

ADICIONAL No.	VALOR
1	$ 107.729.841,46

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA	TIEMPO
SUSPENSION N° 01	09 de Agosto de 2024
REINICIO N° 01	03 de Octubre de 2024

VALOR TOTAL CONTRATADO:	CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS ($410.153.876,22) M/CTE
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN:	15 de Enero de 2024

En Nuevo Colón, a los VEINTE (20) DIAS días del mes de DICIEMBRE del año 2024 se reunieron DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR como representante legal de LAGOVAL INGENIERIA SAS como contratista y el ingeniero SANDRA YANNIRA REYES PAEZ como representante legal de COSORCIO INTERVIAS como interventor y JUAN DAVID REYES VARGAS como supervisor del Municipio de Nuevo Colón con el fin de constatar el estado de las obras objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte del supervisor las obras ejecutadas.

Dichas obras fueron terminadas el día VEINTE (20) días del mes de DICIEMBRE de 2024

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
	Versión 1	Código F-CP-18	1/06/2020
	ACTAS		Página 1 de 1

ACTA - RECIBO FINAL

A. OBRA EJECUTADA

Se anexa sabana de cantidades donde se avala cada una de las actividades de obra ejecutadas, por parte de la INTERVENTORIA y en cumplimiento de la funcion de supervision designada.

B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL

El contratista presentó y fueron tramitadas UN (01) acta de pago parcial de obra correspondientes a la ejecución de obra por por un valor total y en el periodo comprendido como se muestra a continuacion:

ACTA No.	PERIODO DE EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
1	23 /JUL/2024 - 09/AGU/2024 y del 03/OCT/ 2024 - 31/10/2024	COR2024000009	2 de DICIEMBRE de 2024	$ 286.817.870,25
TOTALES				$ 286.817.870,25

. ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS

Una vez realizada la inspección total dela obra, se constató que a la fecha VEINTE (20) de DICIEMBRE de 2024 los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada al supervisor y este la recibe.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR
R/L LAGOVAL INGENIERIA SAS
Contratista

JUAN DAVID REYES VARGAS
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
Supervisor

SANDRA YANNIRA REYES PAEZ
R/L COSORCIO INTERVIAS
Interventoria

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.013.692-0		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION		
APOYO Version 1	CONTRATACION PUBLICA Codigo F-CP-10		FORMATO 1/06/2020 Página 1 de 1
	ACTAS		

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO:	COP-22-2024	**FECHA:**	17 DE ENERO DE 2024	**FECHA DE INICIACIÓN**	**FECHA ACTA ANTERIOR**
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			23 DE JULIO DEL 2024	11 DE DICIEMBRE DEL 2024
CONTRATISTA:	LAGOVAL INGENIERIA SAS R.L. DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR			**FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1**	**FECHA PRESENTE ACTA**
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS R/L. SANDRA YANIRA REYES PAEZ			09 DE AGOSTO DE 2024 **FECHA DE REINICIO N° 1**	20 DE DICIEMBRE DEL 2024
SUPERVISOR:	JUAN DAVID REYES VARGAS			03 DE OCTUBRE DE 2024	
VALOR INICIAL:	$ 309,424,034.26	**% EJECUTADO**	100%	**FECHA DE TERMINACION FINAL:**	**ACTA**
VALOR ADICIONAL:	$ 107,729,841.96	**% TIEMPO**	100.0%	20 DE DICIEMBRE DE 2025	ACTA DE RECIBO FINAL
VALOR TOTAL:	$416,153,876.22	**CDP**		**RP**	
		CDP / ADICIÓN	N/A	**RP / ADICIÓN**	

		CONTRATO INICIAL					**CONDICION ACTULIZADA EN MODIF. N°2**		**ACUMULADO ANTERIOR**		**PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL**		**ACUMULADO TOTAL**	
		CONDICIONES ORIGINALES												
ITEM	**ITEM GOBER**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
					TIPO:	OBRA PUBLICA								
1		**CAP. 1: PRELIMINARES**												
1.10	1.01.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	Kilómetro	0.12	$ 3,707,692.31	444,923.08	$ 0.12	$ 444,923.08	0.12	$ 444,923.08	0.00	$ -	0.12	$ 444,923.08
1.20	1.01.11	DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO)	Metro Lineal	275.00	$ 6,153.85	1,146,153.85	$ 224.95	$ 1,384,307.69	224.95	$ 1,384,307.69	0.00	$ -	224.95	$ 1,384,307.69
					COSTO DIRECTO GRUPO	$ 1,591,076.92	COSTO DIRECTO	$ 1,829,230.77	COSTO DIRECTO	$ 1,829,230.77	COSTO DIRECTO	$ -	COSTO DIRECTO	$ 1,829,230.77
					A	$ 328,215.38	A	$ 365,846.15	A	$ 365,846.15	A	$ -	A	$ 365,846.15
					I	$ 56,730.31	I	$ 51,826.92	I	$ 51,826.92	I	$ -	I	$ 51,826.92
					U	$ 132,375.38	U	$ 128,046.15	U	$ 128,046.15	U	$ -	U	$ 128,046.15
					SUB TOTAL DIRECTO +AIU	$ 2,458,300.00	SUB-TOTAL	$ 2,378,000.00	SUB-TOTAL	$ 2,378,000.00	SUB-TOTAL	$ -	SUB-TOTAL	$ 2,378,000.00
ITEM	**ITEM GOBER**	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
2		**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO**			TIPO:	OBRA PUBLICA								
2.10	3.02.07	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	Metro Cúbico	376.70	$ 16,153.85	5,227,461.54	459.76	$ 7,103,815.38	459.76	$ 7,103,815.38	0.00	$ -	459.76	$ 7,103,815.38
2.20	3.03.10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	46.37	$ 63,846.15	2,960,546.15	68	$ 4,341,538.46	63.63	$ 4,062,530.77	4.37	$ 279,007.69	68.00	$ 4,341,538.46
2.30	3.04.05	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)	Metro Cúbico	7.63	$ 87,692.31	669,092.31	0	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.40	Proch-01	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR ESTABILIZADO CON CEMENTO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	Metro Cúbico	24.60	$ 212,307.69	5,223,384.62	0	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.50	3.08.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	Metro Lineal	275.00	$ 53,846.15	12,653,846.15	2.81	$ 12,276,923.08	229.00	$ 12,276,923.08	0.00	$ -	229.00	$ 12,276,923.08
2.60	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 Mpa	Kilogramo	976.53	$ 7,230.77	7,063,232.31	1061.1023313	$ 7,138,891.72	0.00	$ -	1011.01	$ 7,311,981.54	1011.01	$ 7,311,981.54
2.70	3.05.01	CONCRETO MR 3.0 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 39 NORMAL)	Metro Cúbico	169.65	$ 837,692.31	141,276,807.69	151.38	$ 127,111,938.46	90.16	$ 75,526,338.46	61.62	$ 51,585,600.00	151.78	$ 127,111,938.46
2.80	3.02.13	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	Metro Cúbico	1.81	$ 861,538.46	1,559,384.62	2.61	$ 2,248,615.38	0.00	$ -	1.79	$ 1,542,153.85	1.79	$ 1,542,153.85
2.90	2.01.06	RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	Metro Cúbico	2.48	$ 129,230.77	320,492.31	0	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.10	3.12.02	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	Metro Cúbico-Kilómetro	2,100.35	$ 1,384.62	3,908,184.92	0	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.11	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y O GRANULAR DESPUÉS DE 5 km (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	Metro Cúbico-Kilómetro	1,767.07	$ 2,384.62	3,009,551.54	0	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
N° 0	1.01.02.	ACARREO MATERIALES PETREOS- TIERRA VARIOS	Metro Cúbico-Kilómetro		$ 2,405.00	-	10808.45	$ 25,994,322.25	9683.43	$ 23,288,849.15	1125.02	$ 2,705,673.10	10808.45	$ 25,994,322.25
N°-1	1.01.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	Metro Cúbico		$ 102,476.54	-	134.4	$ 13,772,842.94	134.40	$ 13,772,842.94	0.00	$ -	134.40	$ 13,772,842.94
					COSTO DIRECTO GRUPO	$ 183,844,134.15	COSTO DIRECTO	$ 200,721,899.67	COSTO DIRECTO	$ 136,031,099.39	COSTO DIRECTO	$ 63,687,416.48	COSTO DIRECTO	$ 199,718,515.86
					A	$ 36,768,830.23	A	$ 40,144,377.93	A	$ 27,206,219.95	A	$ 12,737,883.24	A	$ 39,943,703.19
					I	$ 5,515,324.53	I	$ 6,021,656.69	I	$ 4,080,932.99	I	$ 1,910,723.49	I	$ 5,991,656.48
					U	$ 12,360,090.58	U	$ 14,050,532.28	U	$ 9,522,176.99	U	$ 4,459,119.13	U	$ 13,981,296.12
					SUB TOTAL DIRECTO +AIU	$ 238,488,379.50	SUB-TOTAL	$ 260,938,456.57	SUB-TOTAL	$ 176,840,429.32	SUB-TOTAL	$ 82,795,141.03	SUB-TOTAL	$ 259,634,870.25
ITEM	**ITEM GOBER**	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
3		**CAP. 3: OBRAS PLUVIALES**			TIPO:	OBRA PUBLICA								
3.10	2.05.21	SUMIDERO EN LADRILLO SL 100	Unidad	3.00	$ 1,138,461.54	3,415,384.62	9	$ 10,246,153.85	9.00	$ 10,246,153.85	0.00	$ -	9.00	$ 10,246,153.85
3.20	2.05.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	Metro Lineal	16.50	$ 86,923.08	1,434,230.77	58	$ 5,041,538.46	58.00	$ 5,041,538.46	0.00	$ -	58.00	$ 5,041,538.46
3.30	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REALCE DE POZO DE INSPECCION DIAMETRO 1.2M	Unidad	2.00	$ 1,407,692.31	2,815,384.62	5	$ 7,038,461.54	3.00	$ 4,223,076.92	1.00	$ 1,407,692.31	4.00	$ 5,630,769.23
3.40	2.05.05	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2M, 1.50 < H < 2.00	Unidad	1.00	$ 2,569,230.77	2,569,230.77	1	$ 2,569,230.77	0.00	$ -	1.00	$ 2,569,230.77	1.00	$ 2,569,230.77
N°-2	2.05.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	Metro Lineal		$ 142,594.25	-	135.5	$ 19,321,570.88	135.50	$ 19,321,570.88	0.00	$ -	135.50	$ 19,321,570.88
N°-3	2.05.06	POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2m, 1.0 < H < 1.5m	Unidad	-	$ 1,651,730.63	-	4	$ 6,606,922.52	4.00	$ 6,606,922.52	0.00	$ -	4.00	$ 6,606,922.52
N°-4	1.02.01	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	Unidad		$ 320,962.00	-	6	$ 1,925,772.00	0.00	$ -	6.00	$ 1,925,772.00	6.00	$ 1,925,772.00
N°-5	1.02.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	Metro Lineal		$ 57,132.37	-	165.02	$ 9,427,983.70	165.02	$ 9,427,983.70	0.00	$ -	165.02	$ 9,427,983.70
N°-6	1.02.31	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	Metro Lineal		$ 32,342.16	-	48	$ 1,552,423.68	48.00	$ 1,552,423.68	0.00	$ -	48.00	$ 1,552,423.69

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.093.092-0		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
APOYO Versión 1	CONTRATACIÓN PUBLICA Código F-CP-18		FORMATO 1/06/2020 Página 1 de 1
	ACTAS		

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO:	COP-22-2024	FECHA:	17 DE ENERO DE 2024	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA ACTA ANTERIOR
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			23 DE JULIO DEL 2024	11 DE DICIEMBRE DEL 2024
CONTRATISTA:	LAGOVAL INGENIERIA SAS R.L. DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR			FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1	FECHA PRESENTE ACTA
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS R/L. SANDRA YANIRA REYES PAEZ			09 DE AGOSTO DE 2024 FECHA DE REINICIO N° 1	20 DE DICIEMBRE DEL 2024
SUPERVISOR:	JUAN DAVID REYES VARGAS			03 DE OCTUBRE DE 2024	
VALOR INICIAL:	$ 302,424,033.26	% EJECUTADO	100%	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	ACTA
VALOR ADICIONAL:	$ 107,729,841.96	% TIEMPO	100.00%	20 DE DICIEMBRE DE 2025	
VALOR TOTAL:	$410,153,876.22	CDP CDP / ADICIÓN	N/A	RP RP / ADICIÓN	ACTA DE RECIBO FINAL

		CONTRAYO INICIAL CONDICIONES ORIGINALES					CONDICION ACTULIZADA EN MODIF. N°2		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADO TOTAL	
ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO TIPO:	VR TOTAL OBRA PUBLICA	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
6A-7	2.05.69	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=4"	Unidad		$ 38,765.92	-	15	$ 581,738.80	15.00	$ 581,738.80	0.00	$ -	15.00	$ 581,738.80
					COSTO DIRECTO GRUPO	$ 10,234,230.77	COSTO DIRECTO	$ 64,311,295.20	COSTO DIRECTO	$ 57,891,408.81	COSTO DIRECTO	$ 5,992,695.08	COSTO DIRECTO	$ 62,904,103.89
					A	$ 2,016,816.15	A	$ 12,862,153.24	A	$ 11,180,281.76	A	$ 1,810,589.02	A	$ 12,990,870.78
					I	$ 307,026.92	I	$ 1,929,353.89	I	$ 1,710,042.26	I	$ 177,060.85	I	$ 1,887,127.19
					U	$ 716,896.15	U	$ 4,501,825.73	U	$ 3,990,098.62	U	$ 413,088.66	U	$ 4,403,887.27
					SUB TOTAL DIRECTO +AIU	$ 13,274,970.00	SUB TOTAL	$ 83,605,325.06	SUB TOTAL	$ 74,101,831.45	SUB TOTAL	$ 7,673,503.60	SUB TOTAL	$ 81,775,335.06
ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN CAP. 4: ANDENES	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO TIPO:	VR TOTAL OBRA PUBLICA	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
4.10	3.13.18	DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E = 12 CM INCLUYE RETIRO	Metro cuadrado	215.00	$ 17,846.15	4,193,846.15	214.95	$ 3,836,030.77	214.95	$ 3,836,030.77	0.00	$ -	214.95	$ 3,836,030.77
4.20	3.13.05	CONSTRUCCION DE ANDENES E= 0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	Metro cuadrado	215.00	$ 70,769.23	16,630,769.23	232.89	$ 16,491,446.15	43.55	$ 3,092,000.00	189.34	$ 13,399,446.15	232.89	$ 16,491,446.15
4.30	3.03.10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	59.75	$ 63,846.15	3,759,961.54	99.18	$ 6,332,261.54	99.18	$ 6,332,261.54	0.00	$ -	99.18	$ 6,332,261.54
4.40	3.04.05	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO ENTRE 0 Y IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)	Metro Cúbico	47.00	$ 87,692.31	4,121,538.46	0	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6A-8	3.11.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico		$ 73,747.12	-	169.73	$ 12,517,098.68	169.73	$ 12,517,098.68	0.00	$ -	169.73	$ 12,517,098.68
					COSTO DIRECTO GRUPO	$ 28,697,115.38	COSTO DIRECTO	$ 39,166,837.14	COSTO DIRECTO	$ 25,267,330.99	COSTO DIRECTO	$ 13,799,446.15	COSTO DIRECTO	$ 39,066,837.14
					A	$ 5,779,423.08	A	$ 7,831,367.43	A	$ 5,151,978.20	A	$ 2,679,389.23	A	$ 7,831,367.43
					I	$ 860,913.46	I	$ 1,175,005.11	I	$ 773,021.73	I	$ 401,983.38	I	$ 1,175,005.11
					U	$ 2,009,798.08	U	$ 2,741,678.60	U	$ 1,803,717.37	U	$ 937,961.23	U	$ 2,741,678.60
					SUB TOTAL DIRECTO +AIU	$ 37,346,250.00	SUB TOTAL	$ 50,916,888.28	SUB TOTAL	$ 33,497,048.28	SUB TOTAL	$ 17,819,280.00	SUB TOTAL	$ 50,916,888.28
		VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 224,666,571.23		$ 306,829,253.77		$ 280,629,130.96		$ 92,989,556.39		$ 303,618,687.36
		ADMINISTRACIÓN 20%				$ 44,933,314.25		$ 61,365,950.75		$ 56,125,826.19		$ 16,597,911.28		$ 60,723,737.47
		IMPREVISTOS 3%				$ 6,739,997.13		$ 9,180,892.61		$ 6,618,873.03		$ 2,089,699.62		$ 9,108,569.62
		UTILIDAD 7%				$ 15,726,660.20		$ 21,422,082.76		$ 15,444,037.47		$ 5,809,268.05		$ 21,253,305.12
		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$ 5,357,897.76		$ 6,522,136.32				$ 6,522,136.32		$ 6,522,136.32
		PLAN DE MANEJO DE TRANSITO				$ 5,000,000		$ 5,733,050.00				$ 5,733,050		$ 5,733,050.00
		VALOR TOTAL CONTRATADO				$ 302,424,033.76		$ 410,153,876.22		$ 286,817,870.25		$ 120,201,819.63		$ 407,019,489.89

CUADRO DE PAGOS

No.	DESCRIPCION	FECHA	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACION DE ANTICIPO			SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL DE OBRA N°1	25/11/2024	$ 286,817,870.25	70%	0			$ 123,136,005.92	70%
2	ACTA DE RECIBO FINAL	20/12/2024	$ 120,201,819.63	30%	0			$ 3,134,186.34	30%
	TOTAL		$ 407,019,489.88	100%	$ -			$ 3,134,186.34	100%

LAGOVAL INGENIERIA SAS
DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR
NIT:900.612.042-0
CONTRATISTA

CONSORCIO INTERVIAS
R/L SANDRA YANIRA REYES PAEZ
NIT: 901820.340-4
INTERVENTORIA

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-065
PRESUPUESTO PROYECTOS SGR		FECHA: 02/12/2024

MEMORIA DE CANTIDADES FINALES OBRA

OBRA:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CAP. 1: PRELIMINARES		**UNIDAD:**	KM
ITEM:	1.10	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	**CANTIDAD:**	0.12

AREA O LUGAR		DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO BARRIO GIRASOLES									
	Red vial Barrio Girasoles	0.12				0.12	1.00	KM	0.12

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-065
	PRESUPUESTO PROYECTOS SGR	FECHA: 02/12/2024

MEMORIA DE CANTIDADES FINALES OBRA


OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CAP. 1: PRELIMINARES	**UNIDAD:**	ML
ITEM:	1.20 DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO)	**CANTIDAD:**	224.95

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
Vía principal barrio Girasoles (Lateral Izquierdo)	118.55				118.55	1.00	ML	118.55
Vía principal barrio Girasoles (Lateral Derecho)	18.00				18.00	1.00	ML	18.00
	46.40				46.40	1.00	ML	46.40
								-
	42.00				42.00	1.00	ML	42.00
								-
Aproxima Resultado a :				2 Decimales			TOTAL	224.95

ESQUEMA GRAFICO

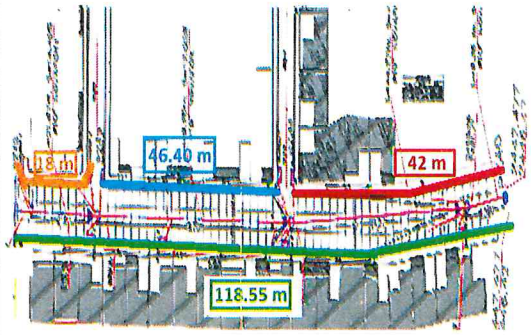

CONTRATISTA
LAGOVAL INGENIERIA S.A.S
NIT 900.612.042-0
R/L DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR
C.C. 1.049.631.574

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAS
NIT 901.820.348-4
R/L SANDRA YANIRA REYES PAEZ
C.C. 40.036.494

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-065
PRESUPUESTO PROYECTOS SGR		FECHA: 02/12/2024

MEMORIA DE CANTIDADES FINALES OBRA

OBRA:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CAP. 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO	UNIDAD:	M3
ITEM:	2.10 EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	CANTIDAD:	439.76


AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
Excavación mecánica vía								
Vía principal barrio Girasoles	120.00	6.00	0.45		324.00	1.00	M3	324.00
Excavación Red Pluvial								
Tramo 1	21.67	0.70	1.00		15.17	1.00	M3	15.17
Tramo 2	49.20	0.70	1.02		35.13	1.00	M3	35.13
Tramo 3	44.27	0.70	1.18		36.57	1.00	M3	36.57
Tramo 4	8.36	0.70	1.08		6.32	1.00	M3	6.32
Prolongación de Tubería para vía	12.00	0.70	1.08		9.07	1.00	M3	9.07
Pozos de inspección	1.50	1.50	1.20		2.70	5.00	M3	13.50

ESQUEMA GRAFICO

Esquema general




PROLONGACIÓN DE TUBERÍA

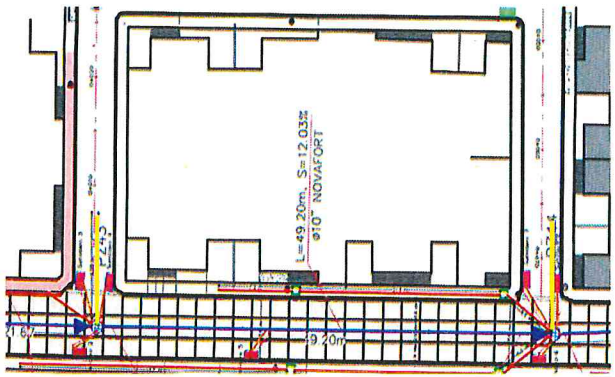


Tramo 1






Tramo 2

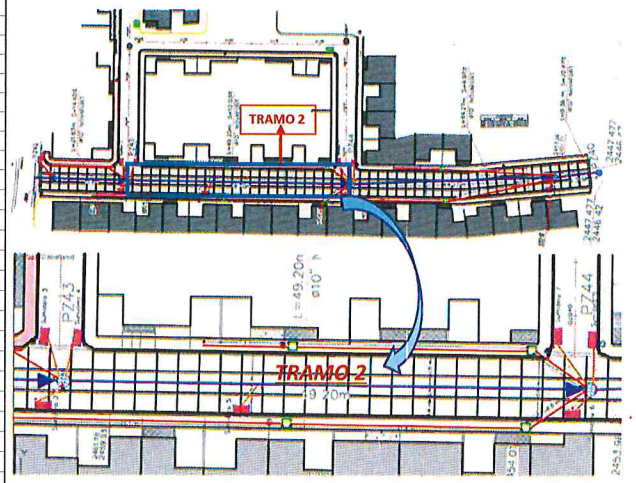

Tramo 3

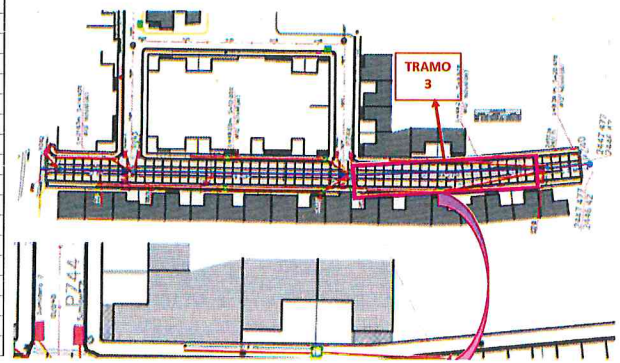

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-065
	PRESUPUESTO PROYECTOS SGR	FECHA: 02/12/2024

MEMORIA DE CANTIDADES FINALES OBRA

OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CAPÍTULO: CAP. 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO — UNIDAD: M3

ITEM: 2.20 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN — CANTIDAD: 68.00


AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
Excavación manual red de alcantarillado existente								
Excavación para Pozos (realce)	1.50	1.50	0.40		0.90	5.00	M3	4.50
Excavación Red Pluvial								
Excavación de sumideros	1.20	0.70	1.20		1.01	9.00	M3	9.07
Pozos de inspección (construcción nueva)	1.50	1.50	0.60		1.35	5.00	M3	6.75
Tramo 1	21.67	0.70	0.20		3.03	1.00	M3	3.03
Tramo 2	49.20	0.70	0.20		6.89	1.00	M3	6.89
Tramo 3	44.27	0.70	0.20		6.20	1.00	M3	6.20
Tramo 4	8.36	0.70	0.20		1.17	1.00	M3	1.17
Prolongación de Tubería para vía	12.00	0.70	0.20		1.68	1.00	M3	1.68
Excavación red de sumdieros								
Sumidero 1	3.00	0.45	0.62		0.84	1.00	M3	0.84
Sumidero 2	5.00	0.45	0.62		1.40	1.00	M3	1.40
Sumidero 3	3.00	0.45	0.62		0.84	1.00	M3	0.84
Sumidero 4	2.00	0.45	0.62		0.56	1.00	M3	0.56
Sumidero 5	5.00	0.45	0.62		1.40	1.00	M3	1.40
Sumidero 6	5.00	0.45	0.62		1.40	1.00	M3	1.40
Sumidero 7	3.00	0.45	0.62		0.84	1.00	M3	0.84
Sumidero 8	3.00	0.45	0.62		0.84	1.00	M3	0.84
Sumidero 9	5.00	0.45	0.62		1.40	1.00	M3	1.40
Excavación de cajas								
Excavación de cajas de inspección	0.90	0.90	0.90		0.73	6.00	M3	4.37
Tuberías de conexión a bajantes para cajas de inspección								
Tubería de conexión a bajantes Tramo 1	28.70	0.30	0.30		2.58	1.00	M3	2.58
Tubería de conexión a bajantes Tramo 2	21.40	0.30	0.30		1.93	1.00	M3	1.93
Tubería de conexión a bajantes Tramo 3	6.00	0.30	0.30		0.54	1.00	M3	0.54
Tubería de conexión a bajantes Tramo 4	6.00	0.30	0.30		0.54	1.00	M3	0.54
Tubería de conexión a bajantes Tramo 5	21.40	0.30	0.30		1.93	1.00	M3	1.93
Tubería de conexión a bajantes Tramo 6	7.90	0.30	0.30		0.71	1.00	M3	0.71
Tubería de conexión a bajantes Tramo 7	40.70	0.30	0.30		3.66	1.00	M3	3.66
Tubería de conexión a bajantes Tramo 8	32.92	0.30	0.30		2.96	1.00	M3	2.96

ESQUEMA GRAFICO


Pozos de inspección (realce de pozos existentes)

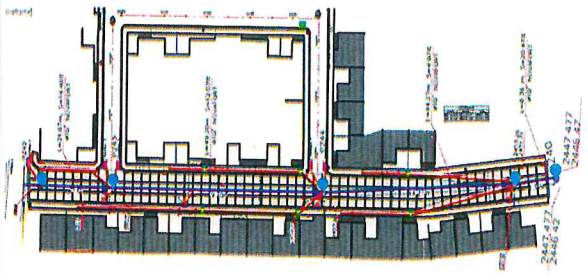


Excavación de sumideros

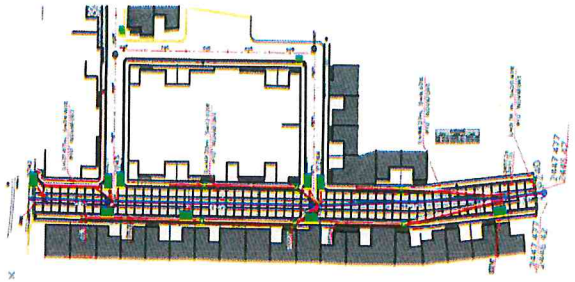


Sumidero 1 | Sumiero 2 | Sumidero 3







Sumidero 4




Sumiero 5




Sumidero 6




Sumidero 7




Sumiero 8




Sumidero 9




Pozos de inspección (POZOS NUEVOS)




Excavación de conexión red de sumideros



Sumidero 1





Sumiero 2




Sumidero 3












Sumidero 4

Sumiero 5

Sumidero 6










Sumidero 7

Sumiero 8


Sumidero 9








Excavación de cajas

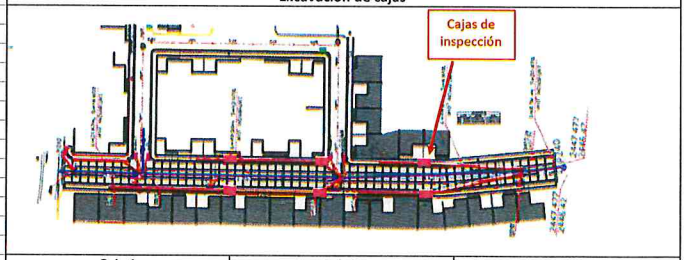



Caja 1

Caja 2

Caja 3










Caja 4

Caja 5


Caja 6









Tramo 1

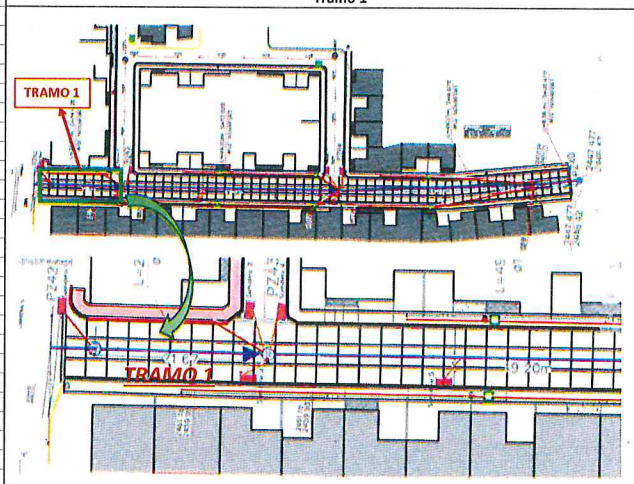


Tramo 2

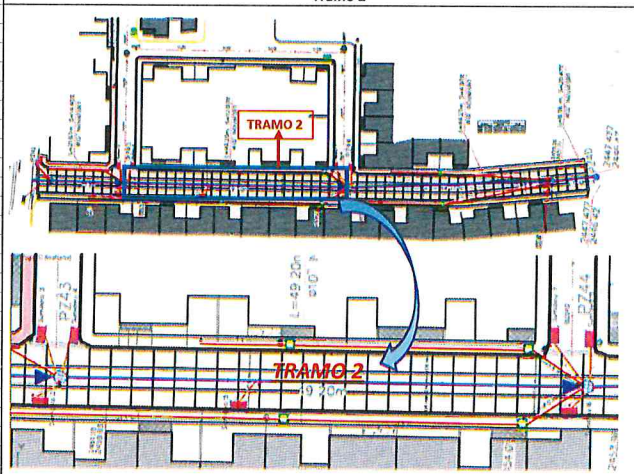


Tramo 3




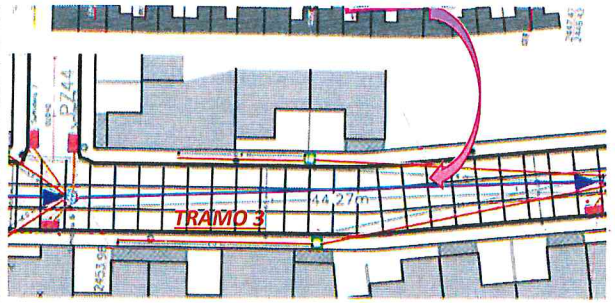


Tramo 4

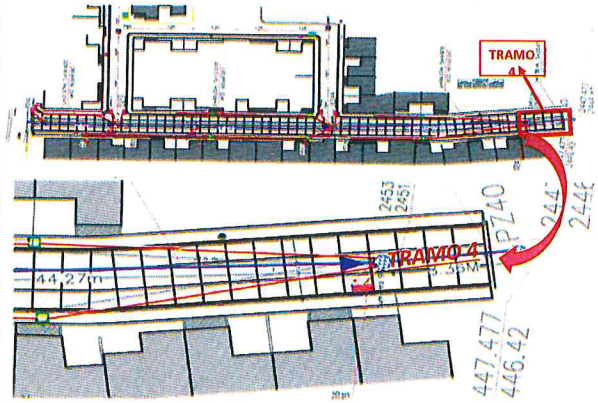

Excavación bajantes para conexión de cajasde cajas



Tramo 1



Tramo 2



Tramo 3



	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-065
PRESUPUESTO PROYECTOS SGR		FECHA: 02/12/2024

MEMORIA DE CANTIDADES FINALES OBRA


OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CAP. 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO	UNIDAD:	ML
ITEM:	2.50 SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	CANTIDAD:	228.00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
Vía principal barrio Girasoles (Lateral Izquierdo)	120.00				120.00	1.00	ML	120.00
Vía principal barrio Girasoles (Lateral Derecho)	18.00				18.00	1.00	ML	18.00
	46.40				46.40	1.00	ML	46.40
	43.60				43.60	1.00	ML	43.60
Aproxima Resultado a :				2 Decimales			TOTAL	228.00

ESQUEMA GRAFICO



CONTRATISTA
LACOVAL INGENIERIA S.A.S
NIT 900.612.042-0
R/L DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR
C.C. 1.049.631.574

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAS
NIT 901.820.348-4
R/L SANDRA YANIRA REYES PAEZ
C.C. 40.036.494

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-065
PRESUPUESTO PROYECTOS SGR		FECHA: 02/12/2024

MEMORIA DE CANTIDADES FINALES OBRA

OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO: CAP. 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO

ITEM: 2.60 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 Mpa


UNIDAD: M3

CANTIDAD: 1,043.04


AREA O LUGAR	DIMENSIONES LONG (A)	LONG (B)	LONG (C)	#BARILLA	V. PARCIAL PESO	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
REFUERZO								
REFUERZO VIGA CM-104 (ABS+0.00)	6.60			3	1.00	4.00	KG	79.20
FLEJES	1.08			3	0.56	44.00	KG	79.83
REFUERZO VIGA CM-101 (ABS+120.0)	5.60			4	1.00	4.00	KG	89.60
FLEJES	1.08			3	0.56	37.00	KG	67.13
REFUERZO VIGA CM-102 (ABS+0. 67)	5.30			4	1.00	4.00	KG	84.80
FLEJES	1.08			3	0.56	35.00	KG	63.50
REFUERZO VIGA CM-103 (ABS+0. 185)	4.90			4	1.00	4.00	KG	78.40
FLEJES	1.08			3	0.56	33.00	KG	59.88
REFUERZO POZOS RED DE ALCANTARILLADO Y RED PLUVIAL	1.80			4	0.56	9.00		36.29
	0.70			4	0.56	9.00		14.11
	0.41			4	0.56	9.00		8.27
	0.30			4	0.56	9.00		6.05
	0.27			4	0.56	9.00		5.44
	0.30			4	0.56	9.00		6.05
	0.41			4	0.56	9.00		8.27
	0.70			4	0.56	9.00		14.11
	0.80			4	0.56	9.00		16.13
	0.70			4	0.56	9.00		14.11
	0.41			4	0.56	9.00		8.27
	0.30			4	0.56	9.00		6.05
	0.27			4	0.56	9.00		5.44
	0.30			4	0.56	9.00		6.05
	0.41			4	0.56	9.00		8.27
	0.70			4	0.56	9.00		14.11
				4	0.56	9.00		-
	1.80			4	0.56	9.00		36.29
	0.66			4	0.56	9.00		13.31
	0.40			4	0.56	9.00		8.06
	0.29			4	0.56	9.00		5.85
	0.27			4	0.56	9.00		5.44
	0.29			4	0.56	9.00		5.85
	0.40			4	0.56	9.00		8.06
	0.66			4	0.56	9.00		13.31
	1.80			4	0.56	9.00		36.29
	0.66			4	0.56	9.00		13.31
	0.40			4	0.56	9.00		8.06
	0.29			4	0.56	9.00		5.85
	0.27			4	0.56	9.00		5.44
	0.29			4	0.56	9.00		5.85
	0.40			4	0.56	9.00		8.06
	0.66			4	0.56	9.00		13.31
								-
REFUERZO ENTRADA DE PARQUEADEROS	6.00			1	1.00	6.00		36.00
	1.00			1	1.00	50.00		50.00

ESQUEMA GRAFICO


VIGA CM-.104

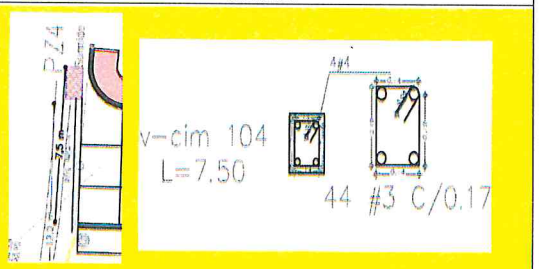

VIGA CM-.101

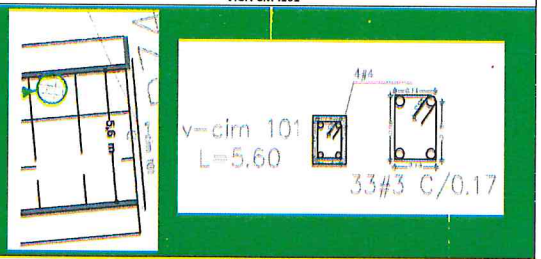

VIGA CM-.102

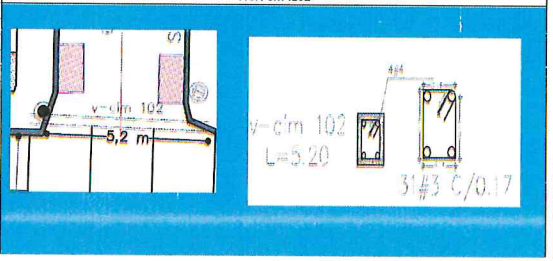

	ANDEN	1.00			1	1.00	2.00	- 14.64

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-065
	PRESUPUESTO PROYECTOS SGR	FECHA: 02/12/2024

MEMORIA DE CANTIDADES FINALES OBRA

OBRA:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO: CAP. 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO

ITEM: 2.70 CONCRETO MR 3.9 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 39 NORMAL)


UNIDAD: M3

CANTIDAD: 151.78


AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	RADIO				
CONCRETO								
Vía principal barrio Girasoles	120.00	5.60	0.23		154.56	1.00	M3	154.56
SUMIDEROS	1.20	0.70	0.23		0.19	- 9.00	M3	- 1.74
POZOS DE INSPECCIÓN (DIMETRO DE 0.4)			0.23	0.40	0.12	- 9.00	M3	- 1.04

ESQUEMA GRAFICO


Esquema general

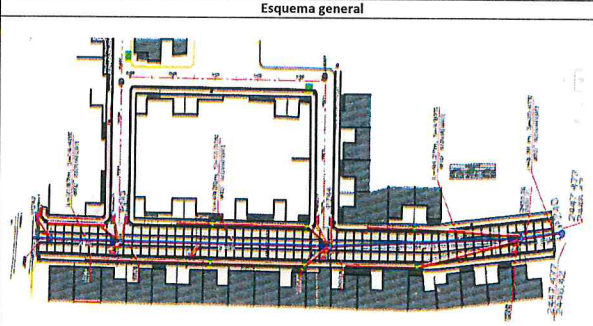

SUMIDEROS



Pozos de inspección (realce de pozos existentes)



	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-065
	PRESUPUESTO PROYECTOS SGR	FECHA: 02/12/2024

MEMORIA DE CANTIDADES FINALES OBRA

OBRA:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CAP. 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO		UNIDAD:	M3
ITEM:	2.80	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	CANTIDAD:	1.79

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
CONCRETO VIGA RIOSTRA (VIGA DE AMARRE)								
VIGA ENTRADA BARRIO GIRASOLES 104	6.60	0.20	0.40		0.53	1.00	M3	0.53
VIGA SALIDA BARRIO GIRASOLES 101	5.60	0.20	0.40		0.45	1.00	M3	0.45
VIGA CALLES DE CONEXIÓN BARRIO GIRASOLES 102	5.30	0.20	0.40		0.42	1.00	M3	0.42
VIGA CALLES DE CONEXIÓN BARRIO GIRASOLES 103	4.90	0.20	0.40		0.39	1.00	M3	0.39
								-
								-
								-
								-
								-


ESQUEMA GRAFICO

Esquema general

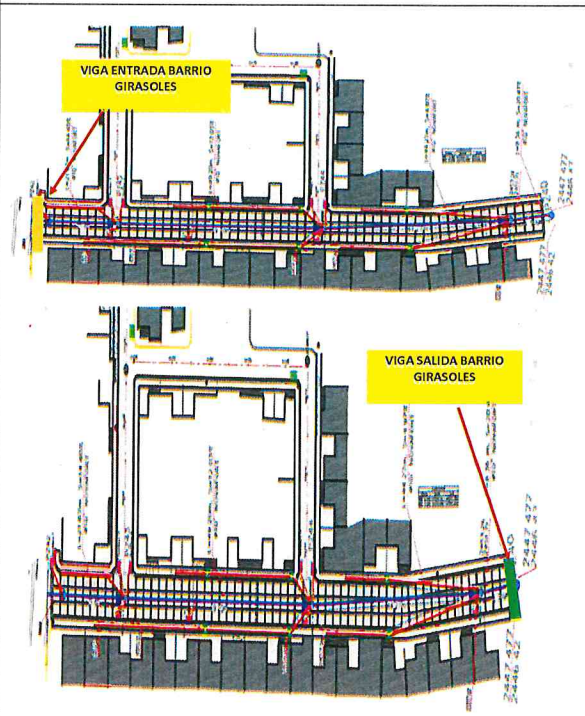

Pozos de inspección (realce de pozos existentes)

Aproxima Resultado a : 2 Decimales **TOTAL** **1.79**

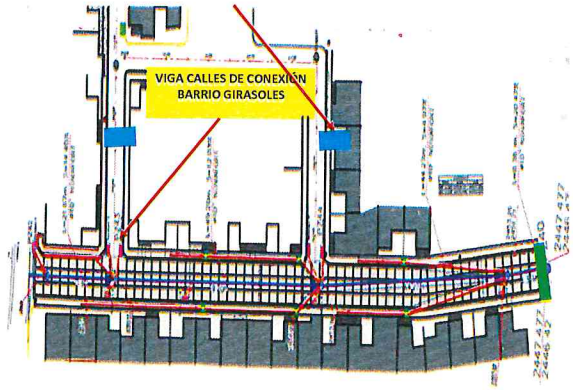

CONTRATISTA
LAGOVAL INGENIERIA S.A.S
NIT 900.612.042-0
R/L DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR
C.C. 1.049.631.574

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAS
NIT 901.820.348-4
R/L SANDRA YANIRA REYES PAEZ
C.C. 40.036.494

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-065
PRESUPUESTO PROYECTOS SGR		FECHA: 02/12/2024

MEMORIA DE CANTIDADES FINALES OBRA

OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO: CAP. 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO

ITEM: NP-0 ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS

UNIDAD: M3-KM

CANTIDAD: 10,808.45

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	VOLUMEN	ANCHO	ALTO	KM				
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES								
TRANSPORTE DE EXCAVACIÓN MANUAL (MEMORIA 2.02)	68.00			5.00	340.00	1.00	M3-KM	340.00
TRANSPORTE DE EXCAVACIÓN ANDENES (MEMORIA 4.03)	99.18			5.00	495.90	1.00	M3-KM	495.90
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y SUBBSASE								
TRANSPORTE DE AFIRMADO (MEMORIA NP-	169.73			35.00	5,940.55	1.00	M3-KM	5,940.55
TRANSPORTE DE SUB-BASE (NP-1)	134.40			30.00	4,032.00	1.00	M3-KM	4,032.00
								-
								-
								-
Aproxima Resultado a :				2 Decimales			TOTAL	10,808.45

ESQUEMA GRAFICO

TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES



TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y SUBBSASE



CONTRATISTA
LAGOVAL INGENIERIA S.A.S
NIT 900.612.042-0
R/L DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR
C.C. 1.049.631.574

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAS
NIT 901.820.348-4
R/L SANDRA YANIRA REYES PAEZ
C.C. 40.036.494


	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-065
PRESUPUESTO PROYECTOS SGR		FECHA: 02/12/2024

MEMORIA DE CANTIDADES FINALES OBRA

OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CAP. 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO	**UNIDAD:**	M3
ITEM:	NP-1 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	**CANTIDAD:**	134.40

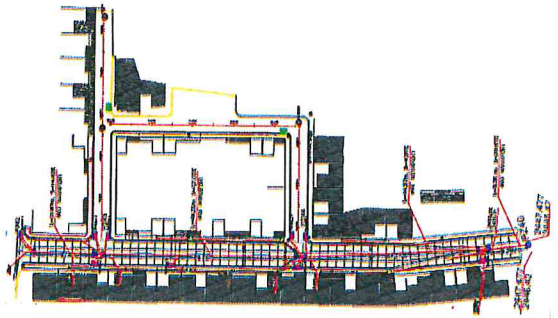AREA O LUGAR		DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA GRAFICO
		LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO					
MATERIAL DE SUBBASE										Esquema general
	SUBBASE PARA MEJORAMIENTO DE VÍA BARRIO GIRASOLES	120.00	5.60	0.20		134.40	1.00	M3	134.40	
									-	
									-	
									-	
Aproxima Resultado a :						2 Decimales		TOTAL	134.40	

CONTRATISTA
LAGOVAL INGENIERIA S.A.S
NIT 900.612.042-0
R/L DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR
C.C. 1.049.631.574

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAS
NIT 901.820.348-4
R/L SANDRA YANIRA REYES PAEZ
C.C. 40.036.494

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-065
PRESUPUESTO PROYECTOS SGR		FECHA: 02/12/2024

MEMORIA DE CANTIDADES FINALES OBRA

OBRA:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CAPÍTULO	CAP. 3: OBRAS PLUVIALES			UNIDAD:	UND
ITEM:	3.10	SUMIDERO EN LADRILLO SL 100		CANTIDAD:	9.00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
SUMIDEROS								
SUMIDEROS						9.00	UND	9.00

ESQUEMA GRAFICO

Esquema general


Excavación de sumideros



Sumidero 1




Sumiero 2




Sumidero 3




Sumidero 4



Sumiero 5



Sumidero 6



Sumidero 7





Sumiero 8





Sumidero 9









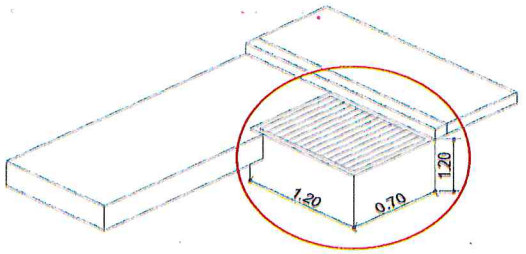

Aproxima Resultado a :	2 Decimales	TOTAL	9.00

CONTRATISTA
LAGOVAL INGENIERIA S.A.S
NIT 900.612.042-0
R/L DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR
C.C. 1.049.631.574

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAS
NIT 901.820.348-4
R/L SANDRA YANIRA REYES PAEZ
C.C. 40.036.494

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-065
PRESUPUESTO PROYECTOS SGR		FECHA: 02/12/2024

MEMORIA DE CANTIDADES FINALES OBRA

OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CAPÍTULO	CAP. 3: OBRAS PLUVIALES	UNIDAD:	ML
ITEM:	3.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	CANTIDAD:	58.00

AREA O LUGAR		DIMENSIONES LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
TUBERÍA DE CONEXIÓN CAJAS A POZOS									
	TUBERIA DE 8"	6.00				6.00	4.00	ML	24.00
Tubería red de sumideros									
	Sumidero 1	3.00				3.00	1.00	ML	3.00
	Sumidero 2	5.00				5.00	1.00	ML	5.00
	Sumidero 3	3.00				3.00	1.00	ML	3.00
	Sumidero 4	2.00				2.00	1.00	ML	2.00
	Sumidero 5	5.00				5.00	1.00	ML	5.00
	Sumidero 6	5.00				5.00	1.00	ML	5.00
	Sumidero 7	3.00				3.00	1.00	ML	3.00
	Sumidero 8	3.00				3.00	1.00	ML	3.00
	Sumidero 9	5.00				5.00	1.00	ML	5.00

ESQUEMA GRAFICO

Esquema general


Excavación de sumideros



Sumidero 1




Sumiero 2



Sumidero 3



Sumidero 4



Sumiero 5




Sumidero 6



Sumidero 7



Sumiero 8



Sumidero 9



Tubería de cajas a pozos

| | | |

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-065
	PRESUPUESTO PROYECTOS SGR	FECHA: 02/12/2024

MEMORIA DE CANTIDADES FINALES OBRA

OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO: CAP. 3: OBRAS PLUVIALES — UNIDAD: UND

ITEM: 3.30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REALCE DE POZO DE INSPECCION DIAMETRO 1.2M — CANTIDAD: 4.00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
os de inspección								
Pozos red de alcantarillado existente						4.00	UND	4.00


	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-065
PRESUPUESTO PROYECTOS SGR		FECHA: 02/12/2024

MEMORIA DE CANTIDADES FINALES OBRA

OBRA:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CAP. 3: OBRAS PLUVIALES		UNIDAD:	UND
ITEM:	3.04	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00	CANTIDAD:	1.00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA GRAFICO
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO					
Pozos de inspección									Esquema general
Pozos red de alcantarillado existente						1.00	UND	1.00	Pozos de inspección (realce de pozos existentes)
									
Aproxima Resultado a :				2 Decimales			TOTAL	1.00	

CONTRATISTA
LAGOVAL INGENIERIA S.A.S
NIT 900.612.042-0
R/L DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR
C.C. 1.049.631.574

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAS
NIT 901.820.348-4
R/L SANDRA YANIRA REYES PAEZ
C.C. 40.036.494

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-065
PRESUPUESTO PROYECTOS SGR		FECHA: 02/12/2024

MEMORIA DE CANTIDADES FINALES OBRA

OBRA:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CAP. 3: OBRAS PLUVIALES		UNIDAD:	ML
ITEM:	NP-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DEALCANTARILLADO PVC D=10"	CANTIDAD:	135.50


AREA O LUGAR		DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
TUBERÍA DE 10"									
	Tramo 1	21.67				21.67	1.00	ML	21.67
	Tramo 2	49.20				49.20	1.00	ML	49.20
	Tramo 3	44.27				44.27	1.00	ML	44.27
	Tramo 4	8.36				8.36	1.00	ML	8.36
	Prolongación de Tubería para vía	12.00				12.00	1.00	ML	12.00

ESQUEMA GRAFICO


Esquema general




PROLONGACIÓN DE TUBERÍA

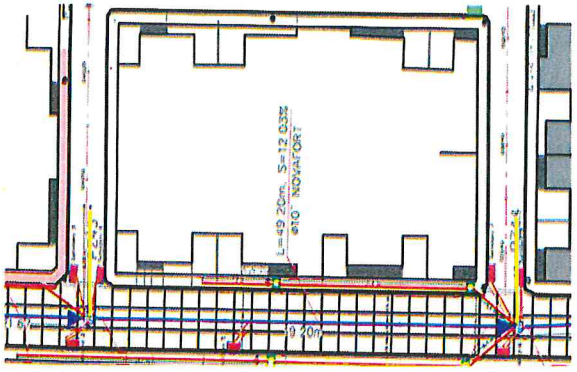


Tramo 1




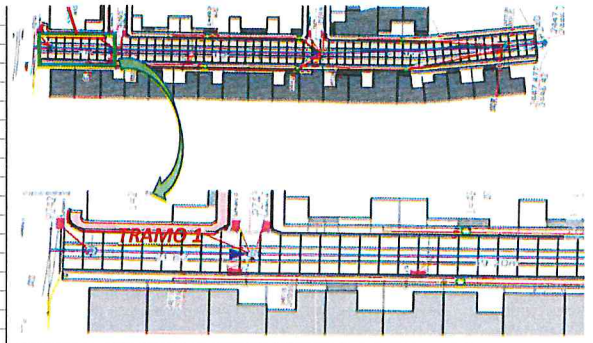

Tramo 2

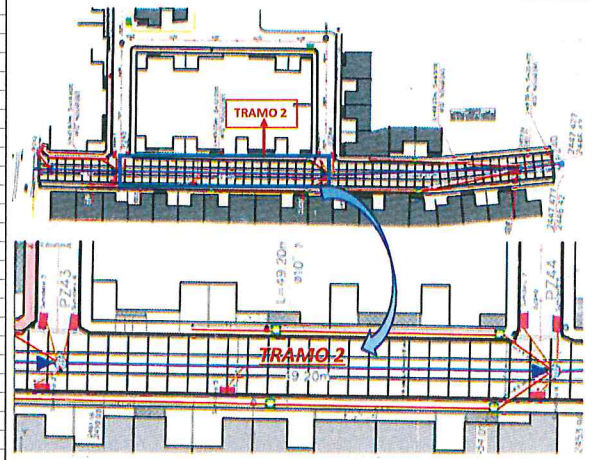

Tramo 3

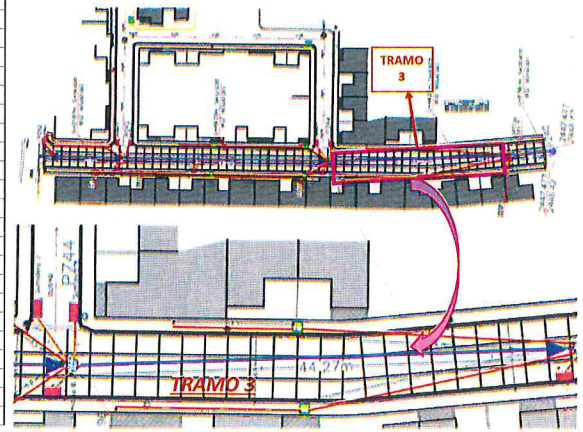


	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-065
PRESUPUESTO PROYECTOS SGR		FECHA: 02/12/2024

MEMORIA DE CANTIDADES FINALES OBRA

OBRA:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CAP. 3: OBRAS PLUVIALES		UNIDAD:	UND
ITEM:	NP-3	POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2m, 1.0< H <1.5m	CANTIDAD:	4.00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA GRAFICO
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO					
Pozos de inspección									Esquema general
Pozos red de alcantarillado existente						4.00	UND	4.00	Pozos de inspección (realce de pozos existentes)
									
Aproxima Resultado a :				2 Decimales			TOTAL	4.00	

CONTRATISTA
FAGOVAL INGENIERIA S.A.S
NIT 900.612.042-0
R/L DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR
C.C. 1.049.631.574

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAS
NIT 901.820.348-4
R/L SANDRA YANIRA REYES PAEZ
C.C. 40.036.494

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-065
PRESUPUESTO PROYECTOS SGR		FECHA: 02/12/2024

MEMORIAS ACTA DE RECIBO FINAL (19 DE DICIMBRE 2024)

OBRA:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO:	CAP. 2: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	UNIDAD:	UND
ITEM:	NP-4 CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	CANTIDAD:	6.00

AREA O LUGAR		DIMENSIONES LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
CAJAS DE INSPECCIÓN									
	CAJAS					-	6.00	UND	6.00

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-065
PRESUPUESTO PROYECTOS SGR		FECHA: 02/12/2024

MEMORIAS ACTA DE RECIBO FINAL (19 DE DICIMBRE 2024)

OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CAP. 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO	UNIDAD:	ML
ITEM:	NP-5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	CANTIDAD:	165.02


AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
Tuberías de conexión a bajantes para cajas de inspección								
Tubería de conexión a bajantes Tramo 1	28.70				28.70	1.00	ML	28.70
Tubería de conexión a bajantes Tramo 2	21.40				21.40	1.00	ML	21.40
Tubería de conexión a bajantes Tramo 3	6.00				6.00	1.00	ML	6.00
Tubería de conexión a bajantes Tramo 4	6.00				6.00	1.00	ML	6.00
Tubería de conexión a bajantes Tramo 5	21.40				21.40	1.00	ML	21.40
Tubería de conexión a bajantes Tramo 6	7.90				7.90	1.00	ML	7.90
Tubería de conexión a bajantes Tramo 7	40.70				40.70	1.00	ML	40.70
Tubería de conexión a bajantes Tramo 8	32.92				32.92	1.00	ML	32.92

ESQUEMA GRAFICO


CAJAS DE INSPECCIÓN




CONEXIÓN DE BAJANTES PARA CAJAS DE INSPECCIÓN




Tramo 1




Tramo 2




Tramo 3




Tramo 4



Tramo 5



Tramo 6



	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-065
PRESUPUESTO PROYECTOS SGR		FECHA: 02/12/2024

MEMORIAS ACTA DE RECIBO FINAL (19 DE DICIMBRE 2024)

OBRA:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CAP. 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO	UNIDAD:	ML
ITEM:	NP-6 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	CANTIDAD:	48.00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
TUBERÍA DE PVC SANITARIA D=3"								
BAJANTES VIVIENDA COSTADO DERECHO	1.50				1.50	19.00	ML	28.50
BAJANTES VIVIENDA COSTADO IZQUIERDO	1.50				1.50	13.00	ML	19.50
Aproxima Resultado a :				2 Decimales			TOTAL	48.00

ESQUEMA GRAFICO

TUBERÍA PVC D=3"



CONTRATISTA
LAGOVA INGENIERIA S.A.S
NIT 900.612.042-0
R/L DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR
C.C. 1.049.631.574

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAS
NIT 901.820.348-4
R/L SANDRA YANIRA REYES PAEZ
C.C. 40.036.494

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-065
PRESUPUESTO PROYECTOS SGR		FECHA: 02/12/2024

MEMORIAS ACTA DE RECIBO FINAL (19 DE DICIMBRE 2024)

OBRA:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CAP. 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO	UNIDAD:	UND
ITEM:	NP-7 SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=4"	CANTIDAD:	15.00

AREA O LUGAR		DIMENSIONES LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
YEE D=4"									
	YEE COSTADO DERECHO					-	9.00	UND	9.00
	YEE COSTADO IZQUIERDO					-	6.00	UND	6.00

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-065
PRESUPUESTO PROYECTOS SGR		FECHA: 02/12/2024

MEMORIAS ACTA DE RECIBO FINAL (19 DE DICIMBRE 2024)

OBRA:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO:	CAP. 4: ANDENES	UNIDAD:	M2
ITEM:	4.10 DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO	CANTIDAD:	214.95

AREA O LUGAR		DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
DEMOLICIÓN DE PISOS									
	SECCIÓN IZQUIERDA, BARRIO GIRASOLES	118.55	1.00			118.55	1.00	M2	118.55
	SECCIÓN DERECHA, BARRIO GIRASOLES	96.40	1.00			96.40	1.00	M2	96.40

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-065
PRESUPUESTO PROYECTOS SGR		FECHA: 02/12/2024

MEMORIAS ACTA DE RECIBO FINAL (19 DE DICIMBRE 2024)

OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO: CAP. 4: ANDENES

ITEM: 4.30 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN

UNIDAD: M3

CANTIDAD: 99.18

AREA O LUGAR		DIMENSIONES LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
EXCAVACIÓN MANUAL ANDENES									
	SECCIÓN IZQUIERDA, BARRIO GIRASOLES	120.00	1.20	0.30		43.20	1.00	M3	43.20
	SECCIÓN DERECHA, BARRIO GIRASOLES	108.00	1.20	0.30		38.88	1.00	M3	38.88
EXCAVACIÓN MANUAL SARDINEL									
	SECCIÓN IZQUIERDA, BARRIO GIRASOLES	120.00	0.25	0.30		9.00	1.00	M3	9.00
	SECCIÓN DERECHA, BARRIO GIRASOLES	108.00	0.25	0.30		8.10	1.00	M3	8.10

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-065
PRESUPUESTO PROYECTOS SGR		FECHA: 02/12/2024
MEMORIA DE CANTIDADES FINALES OBRA		

OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CAPÍTULO CAP. 4: ANDENES — **UNIDAD:** M3

ITEM: NP-8 BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO — **CANTIDAD:** 169.73


AREA O LUGAR	DIMENSIONES LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Excavación manual red de alcantarillado existente								
Mejoramiento para Pozos (realce)	1.50	1.50	0.25		0.56	5.00	M3	2.81
Excavación Red Pluvial								
Mejoramiento base de sumideros	3.60	0.25	0.40		0.36	9.00	M3	3.24
Mejoramiento Pozos de inspección	1.50	1.50	0.50		1.13	5.00	M3	5.63
Tramo 1	21.67	0.70	0.75		11.32	1.00	M3	11.32
Tramo 2	49.20	0.70	0.77		26.38	1.00	M3	26.38
Tramo 3	44.27	0.70	0.93		28.70	1.00	M3	28.70
Tramo 4	8.36	0.70	0.83		4.83	1.00	M3	4.83
Prolongación de Tubería para vía	12.00	0.70	0.83		6.94	1.00	M3	6.94
Excavación red de sumdieros								
Sumidero 1	3.00	0.45	0.90		1.22	1.00	M3	1.22
Sumidero 2	5.00	0.45	0.90		2.03	1.00	M3	2.03
Sumidero 3	3.00	0.45	0.90		1.22	1.00	M3	1.22
Sumidero 4	2.00	0.45	0.90		0.81	1.00	M3	0.81
Sumidero 5	5.00	0.45	0.90		2.03	1.00	M3	2.03
Sumidero 6	5.00	0.45	0.90		2.03	1.00	M3	2.03
Sumidero 7	3.00	0.45	0.90		1.22	1.00	M3	1.22
Sumidero 8	3.00	0.45	0.90		1.22	1.00	M3	1.22
Sumidero 9	5.00	0.45	0.90		2.03	1.00	M3	2.03
AFIRMADO ZONA DE ANDENES								
SECCIÓN IZQUIERDA, BARRIO GIRASOLES	120.00	1.03	0.24		29.65	1.00	M2	29.65
SECCIÓN DERECHA, BARRIO GIRASOLES	108.00	0.97	0.24		25.06	1.00	M2	25.06
AFIRMADO ZONA DE SARDINEL								
SECCIÓN IZQUIERDA, BARRIO GIRASOLES	120.00	0.25	0.20		6.00	1.00	M3	6.00
SECCIÓN DERECHA, BARRIO GIRASOLES	108.00	0.25	0.20		5.40	1.00	M3	5.40

ESQUEMA GRAFICO

Pozos de inspección (realce de pozos existentes)




Excavación de sumideros



Sumidero 1



Sumidero 2




Sumidero 3




Sumidero 4

Sumidero 5


Sumidero 6




Sumidero 7 | Sumidero 8 | Sumidero 9



Pozos de inspección (POZOS NUEVOS)




Excavación de conexión red de sumideros




Sumidero 1 | Sumidero 2 | Sumidero 3




Sumidero 4 | Sumidero 5 | Sumidero 6




Sumidero 7 | Sumidero 8 | Sumidero 9







Tramo 1

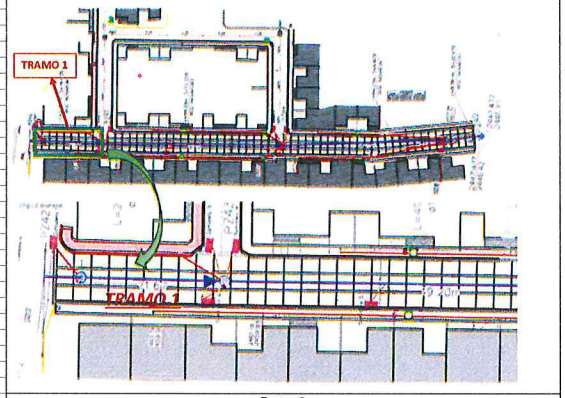


Tramo 2

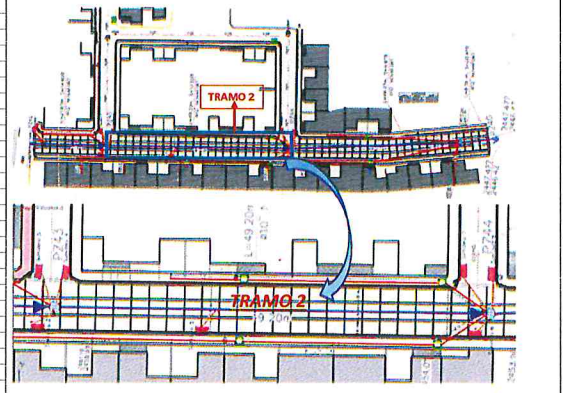


Tramo 3

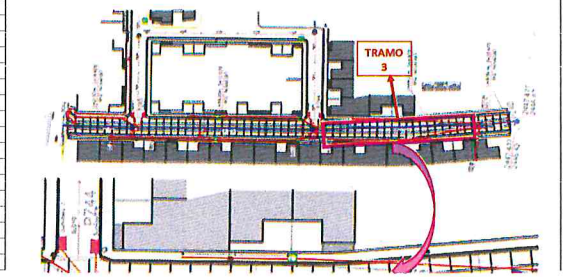


			Aproxima Resultado a :	2 Decimales	TOTAL	169.73



Tramo 4

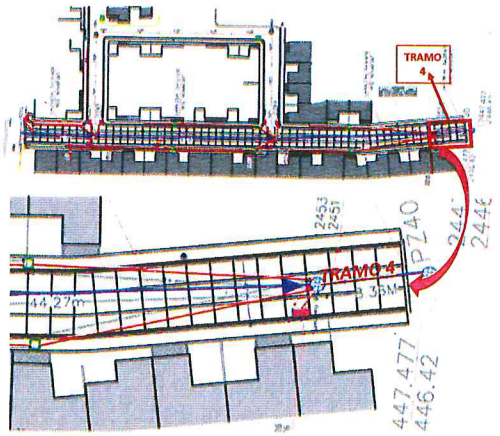

MATERIAL DE AFIRMADO ANDENES



CONTRATISTA
LAGOVAL INGENIERIA S.A.S
NIT 900.612.042-0
R/L DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR
C.C. 1.049.631.574

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAS
NIT 901.820.348-4
R/L SANDRA YANIRA REYES PAEZ
C.C. 40.036.494

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.174-4

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101159212	12

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	12	2024	23	07	2024	00:00	20	12	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
LAGOVAL INGENIERIA SAS	NIT: 900.612.042-0	KR 12 NRO 18 - 98	TUNJA, BOYACA	7406944

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
MUNICIPIO DE NUEVO COLON	NIT: 800.033.062-0	CALLE 4 NO. 4-60	NUEVO COLON, BOYACA	7353035

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION VIAS VEHICULARES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON DEPARTAMENTO DE BOYACA CONTRATO No COP-022-2024

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/07/2024	06/08/2025	$82,030,775.34	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/07/2024	04/02/2028	$82,030,775.34	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$123,046,163.02	$123,046,163.02

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2024 SE ACLAR LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD ASI

DESDE 20/12/2024 HASTA 20/12/2029

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******287,107,713.70	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA SIERRA C Y CIA LIMITA	4715	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

Ma. EUGENIA SIERRA C
ASESOR
CALLE 20 [illegible]
TEL. 742 65 37 - 743 07
CEL. 315 [illegible] 2649 - 315

39-44-101159212

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.174-4

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101159212	12

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	12	2024	23	07	2024	00:00	20	12	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	LAGOVAL INGENIERIA SAS		NIT: 900.612.042-0
DIRECCIÓN: KR 12 NRO 18 - 98	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	7406944

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE NUEVO COLON		NIT: 800.033.062-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 NO. 4-60	**CIUDAD:** NUEVO COLON, BOYACA	**TELÉFONO:**	7353035

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA

Ma. EUGENIA SIERRA C. &
ASESORES
CALLE 20
TEL. 742 65 57 - 743 07 2
CEL. 315 263 549 - 315

39-44-101159212

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101159212	11

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	12	2024	23	07	2024	00:00	24	07	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
LAGOVAL INGENIERIA SAS	NIT: 900.612.042-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 12 NRO 18 - 98	TUNJA, BOYACA	7406944

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE NUEVO COLON	NIT: 800.033.062-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 4 NO. 4-60	NUEVO COLON, BOYACA	7353035

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION VIAS VEHICULARES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON DEPARTAMENTO DE BOYACA CONTRATO No COP-022-2024

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/07/2024	06/08/2025	$82,030,775.34	$82,030,775.34
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/07/2024	04/02/2028	$82,030,775.34	$82,030,775.34
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 4 AÑOS, 7 MESES Y 4 DÍAS *		$123,046,163.02	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2024 SE ACLAR ALAVIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******287,107,713.70	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA SIERRA C Y CIA LIMITA	4715	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO: (608) 7409488 - TUNJA

39-44-101159212

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101159212	11

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	12	2024	23	07	2024	00:00	24	07	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	LAGOVAL INGENIERIA SAS		NIT: 900.612.042-0
DIRECCION: KR 12 NRO 18 - 98	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELEFONO:**	7406944

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE NUEVO COLON		NIT: 800.033.062-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 NO. 4-60	**CIUDAD:** NUEVO COLON, BOYACA	**TELÉFONO:**	7353035

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO: (608) 7409488 - TUNJA

39-44-101159212

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

De conformidad con lo estipulado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.2.3.1.7 y art 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto Nacional No. 1082 de 2015, la Alcaldesa Municipal (E) aprueba el Anexo No. 11 y Anexo No. 12 de la Póliza No. 39-44-101159212 (PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL) expedida el día 20 DE DICIEMBRE DE 2024 por la aseguradora "SEGUROS DEL ESTADO S.A." NIT: 860.009.578-6, por medio de la cual se garantiza la aceptación de los tipos de amparos: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, del contrato No. COP-022-2024 objeto "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHICULARES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" celebrado entre LAGOVAL INGENIERIA SAS NIT. 900.612.042-0 y EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/07/2024	06/08/2025	$82.030.775,34
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/07/2024	04/02/2028	$82.030.775,34
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20/12/2024	20/12/2029	$123.046.163,02

LINA SOFIA CASTELBLANCO CASALLAS
Alcaldesa municipal (E)

Elaboró: Juan David Reyes Vargas – Secretario de Planeación y Obras públicas
Revisó: Lina Sofia Castelblanco Casallas– Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
	Versión 1	Código F-GC-18	1/06/2020
	ACTAS		Página 1 de 1

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

INFORME No	FINAL	FECHA	23	de	12	de	2024
PERIODO DEL	1	de	NOVIEMBRE	de	2024		
AL	20	de	DICEMBRE	de	2024		

INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
OBJETO	MEJORAMIENTO Y REAHILITACION VIAS VEHICULARES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON DEPARTAMETNO DE BOYACA				
No. Contrato	COP-022-2024	Fecha Inicio	23 de Julio de 2024	Fecha Terminación	20 de Diciembre
No. CDP	DIS-2023000691		Fecha CDP		27 de diciembre de 2023
No. CDP adicional	DIS-2024000296		Fecha CDP adicional		16 de septiembre de 2024
No. CDP adicional	DIR-2024000005		Fecha CDP adicional		25 de septiembre de 2024
No. RP	RES-2024000002		Fecha RP		18 de Abril de 2024
No. RP adicional	RES-202400080		Fecha RP adicional		10 de Octubre de 2024
No. RP adicional	RER-2024000008		Fecha RP adicional		3 de Octubre de 2024

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA				
Nombre del Contratista	LAGOVAL INGENIERIA SAS		Identificación	900.612.042-0
Representante Legal	DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR		Identificación	61.049.631.574
Cuenta Bancaría	#	616592689	Banco	Banco de Bogota

INFORMACION DE INTERVENTORIA			
Nombre	CONSORCIO INTERVIAS	Identificación	901.820.348-4
Representante Legal	SANDRA YANIRA REYES	Identificación	40.036.492

INFORMACION DEL SUPERVISOR			
Nombre	JUAN DAVID REYES VARGAS	Identificación	1.049.344.125

CRONOLOGIA DEL CONTRATO			
ACTAS SUSCRITAS	FECHAS	DURACION Y/O VALOR	OBSERVACIONES
Acta de inicio	23/07/2024	Tres (03) Meses	
Acta de suspension No. 001	9/08/2024	Indefinido	
Acta de reinicio No. 001	3/10/2024		
Acta de Modificacion No. 001	3/10/2024		Modificacion por Mayores y Menores Cantidades de Ejecucion de Obra- Items no previstos
Adicion y Prorroga No. 001	3/10/2024	Un (01) Mes y $107.729.841,46	
Parcial Nº1	25/11/2024	$286.817.870,25	
Acta de Modificacion No. 002	11/12/2024		Modificacion por Mayores y Menores Cantidades de Ejecucion de Obra

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
	Versión 1	Código F-GC-18	1/06/2020
	ACTAS		Página 1 de 1

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

Acta de terminacion	20/12/2024		
Acta de recibo final	20/12/2024		
Acta de liquidacion	23/12/2024		

LOCALIZACION


El proyecto se desarrolla en el departamento de Boyaca, Municipio de Nuevo Colon, especificamente en el barrio los Girasoles con coordenadas (5°21'14.16"N - 73°27'38.06"O)

POLIZAS

POLIZAS	POLIZA No	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	39-44-101159212 Anexo No. 12	$ 82.030.775.34	23/07/2024	6/08/2025	SEGUROS DEL ESTADO SAS
SALARIOS		$ 82.030.775.34	23/07/2024	4/02/2028	
ESTABILIDAD		$ 123.046.163.02	SI AMPARA 5 AÑOS		
RCE	20977 Anexo No. 7	$ 650.000.000.00	10/01/2024	18/11/2024	

AVANCE DE EJECUCION

% DE AVANCE	100.00%	TIEMPO TRANSCURRIDO	100%



ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2.20	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	$ 63.846.15	4.37	$ 279.007.69
2.60	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 Mpa	$ 7.230.77	1043.04	$ 7.541.981.54
2.70	CONCRETO MR 3.9 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 39 NORMAL)	$ 837.692.31	61.62	$ 51.618.600.00
2.80	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	$ 861.538.46	1.79	$ 1.542.153.85
NP-0	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	$ 2.405.00	1125.02	$ 2.705.673.10
			COSTO DIRECTO	$ 63.687.416.18

1398

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
	Versión 1	Código F-GC-18	1/06/2020
	ACTAS		Página 1 de 1

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
3.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REALCE DE POZO DE INSPECCION DIAMETRO 1.2M	$ 1.407.692.31	1.00	$ 1.407.692.31
3.40	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00	$ 2.569.230.77	1.00	$ 2.569.230.77
NP-4	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	$ 320.962.00	6.00	$ 1.925.772.00
			COSTO DIRECTO	$ 5.902.695.08

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
4.20	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	$ 79.769.23	169.34	$ 13.399.446.15
			COSTO DIRECTO	$ 13.399.446.15

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 82.989.556.39
ADMINISTRACION 20%		$ 16.597.911.28
IMPREVISTOS 3%		$ 2.489.686.69
UTILIDAD 7%		$ 5.809.268.95
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		$ 6.572.136.32
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO		$ 5.743.060.00
VALOR TOTAL CONTRATADO		$ 120.201.619.63

ACTIVIDADES REALIZADAS

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 Mpa

CONCRETO MR 3.9 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 39 NORMAL)

CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR

ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REALCE DE POZO DE INSPECCION DIAMETRO 1.2M

POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00

CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO

CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)

DESCRIPCION DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra ejecutado en su totalidad con un avance fisico del 100%, según lo reportado y supervisado por interventoria externa y lo constatado en el sitio de obra

AM

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

REGISTRO FOTOGRAFICO





INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



OBSERVACIONES

FIRMA		Secretario de Planeacion y Obras Publicas
	VoBo	
NOMBRE		**JUAN DAVID REYES VARGAS**

Documentos o Folios Anexos

Cuenta de Cobro ó Factura, Planillas de pago de Seguridad Social, Certificado de Parafiscales, Sabana y Memorias de Cantidades, Informe de Actividades, Bitacora, Certifiacion de Aval y Resgistro de Cantidades por parte de Interventoria

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR y JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA identificado C.C. 1.049.631.574 DE TUNJA y C.C. 23.434.187 DE CIENEGA en mi condición de representante legal y contador de LAGOVAL INGENIERIA S.A.S identificada con NIT 900.612.042-0 bajo la gravedad de juramento, conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Tunja, a los **23** días del mes de **DICIEMBRE** de 20**24**.

LAGOVAL INGENIERIA S.A.S
NIT: 900.612.042-0
R/L: DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR
C.C. 1.049.631.574 DE TUNJA

JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA
C.C. 23.434.187 DE CIENEGA
T.P. 165295-T

1483

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

165295-T



JENNY MARIBEL
ESPINOSA CEPEDA
C.C. 23434187
RESOLUCION INSCRIPCION 012 FECHA 16/02/2012
UNIVERSIDAD U. P. T. C.

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 176893

FIRMA DEL TITULAR 92183

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

1404

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 23434187

ESPINOSA CEPEDA
APELLIDOS

JENNY MARIBEL
NOMBRES

Jenny Espinosa
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-FEB-1984
CIENEGA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

15-MAR-2002 CIENEGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-0704600-33103741-F-0023434187-20020627 02122 02178O 02 107599424

1405

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

4 D 5 A B C 3 9 8 5 C F 2 7 A 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 23434187 de CIENEGA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 165295-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

406

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7652209

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

REFERENCIA
No. 122349976

BANCOLOMBIA
COMPROBANTE DE PAGO

FECHA DE EXPEDICION		
20	12	2024

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es hasta el máximo hasta el quinto día de haberlo generado, de lo caso contrario debe volver a realizar la operación y generar un nuevo cupón.

CONVENIO: 29232 - SENA RECAUDO CODIGO DE BARRAS
CANT. FACTURAS: 25 SECUENCIA: 12 2024
TOTAL EFE: $ 1,032,250.00
TOTAL CHQ: $ 0.00
TOTAL: $ 1,032,250.00

Nombre Pagador Lagoval Ingenieria SAS — NIT o C.C. 900612042

Dirección Carrera 68 B 76 — **Teléfono** +57,7353541

NRO. FACTURA 7652209 — VALOR FACTURA $1,032,250.00

DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Boyaca		
UN MILLON TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS PESOS.	**SUBTOTAL**	$ 1,032,250.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 1,032,250.00

BANCOLOMBIA TUNJA - TUNJA 2024 DIC. 20 RECIBIDO No 0043

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100010(8020)7652209(3900)000001032250(96)20241225

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 122349976

Ciudad | NIT 900612042 | Teléfono

Nombre del Pagador / Cliente: Lagoval Ingenieria SAS

Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior. Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL	

AREA PARA SELLO

1267

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

SENA

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social LAGOVAL INGENIERIA SAS identificado con el NIT 900612042, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
COP-022-2024	MEJ Y REHAB VIAS VEHI AREA URB	NUEVO COLON	1,032,250	2024-11	20-DIC-2024	122349976
		Total	1,032,250			

Expedido por el SENA, a los veinte (20) dias del mes de Diciembre de 2024

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2024-12-20

Generado por : CLAUDIA CONSTANZA NUÃ'EZ ARAQUE

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 647151517 - 352566

SENA, MÁS TRABAJO

comfaboy
unidos para crecer

EL SUSCRITO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO DE LA
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY
NIT 891800213 - 8
C E R T I F I C A

1. Que los aportes recibidos por la Caja de Compensación Familiar de Boyacá - COMFABOY, se originaron de una relación laboral, por tanto, todo pago de aportes parafiscales que aquí se certifican, se tomaron únicamente de la autoliquidación que efectuó la empresa aportante a través de Planilla PILA.

2. Que los aportes recibidos correspondieron a la autoliquidación de la empresa aportante, quien es la que relaciona trabajadores en la planilla PILA de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la entidad contratante es quien tiene la obligación de validar y certificar que todos los trabajadores vinculados en la ejecución de la obra debieron estar afiliados a la seguridad social y pago de parafiscales.

3. Que la Caja de compensación al no poder establecer que todos los trabajadores que ejecutaron el contrato están relacionados en esta autoliquidación, se reserva el derecho a realizar las auditorias que correspondan, tanto a la entidad contratante como al contratista sobre los pagos que se debieron cancelar a la seguridad social y parafiscales.

4. Que esta certificación expedida por COMFABOY no tiene efectos de paz y salvo sobre los valores que debería cancelar el contratista respecto de la ejecución del contrato, ni tiene efectos para la afiliación a otra Caja de Compensación Familiar.

5. Que los pagos de aportes mensuales efectuados por la empresa LAGOVAL INGENIERIA SAS con nit 900612042 en la vigencia solicitada, se relacionan a continuación:

Fecha	Planilla	# Trab	Val Tot Consig	Mes Pago	Valor 4% Pagado	Valor Nomina	Valor Nomina Con Subs. Transp. paplceap
06/02/2024	849462690087	11	494,100	202401	494,100	$12,350,001	$12,350,001
06/03/2024	849464079817	6	208,000	202402	208,000	$5,200,000	$5,200,000
07/03/2024	849464121938	5	260,000	202402	260,000	$6,500,000	$6,500,000
03/04/2024	849465321384	7	274,000	202403	274,000	$6,846,668	$6,846,668
03/05/2024	849466152197	5	260,000	202404	260,000	$6,500,000	$6,500,000
04/06/2024	849468229140	6	263,500	202405	263,500	$6,586,667	$6,586,667
03/07/2024	849469018436	5	260,000	202406	260,000	$6,500,000	$6,500,000
08/08/2024	849471132278	9	367,600	202407	367,600	$9,186,668	$9,186,668
04/09/2024	849472716787	9	315,600	202408	315,600	$7,886,668	$7,886,668
04/10/2024	849474782705	6	140,400	202409	140,400	$3,510,000	$3,510,000
04/10/2024	849474781836	10	386,600	202409	386,600	$9,663,334	$9,663,334
06/11/2024	849476942065	10	520,000	202410	520,000	$13,000,000	$13,000,000
13/11/2024	849477251085	6	244,600	202410	244,600	$6,110,002	$6,110,002
04/12/2024	849478471245	17	634,600	202411	634,600	$15,860,002	$15,860,002
16/12/2024	849478949841	3	41,700	202412	41,700	$1,040,001	$1,040,001
TOTALES:			$4,670,700		$4,670,700	$116,740,011	$116,740,011

FECHA DE EXPEDICION: 23/12/2024

Cordialmente;

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VALIDO: LUIS ARIEL RODRIGUEZ - subapo15
DPTO. APORTES Y SUBSIDIO

1089

LAGOVAL INGENIERIA SAS
900.612.042-0
CR 64 24 47 IN 5 AP 519
Bogotá - Colombia
(031) 7353541
lagoval.ingenieria@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: LAG 48

Cliente: MUNICIPIO DE NUEVO COLON
Nit: 800.033.062-0
Teléfono: (601) 3115231750 - Ext. 000
Dirección: CL 4 4 60
Correo: alcaldia@nuevocolon_boyaca.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	23/12/2024, 09:52
Expedición	23/12/2024, 10:14
Vencimiento	23/12/2024
Vendedor	LAGOVAL INGENIERÍA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA COP-22-2024 OBJETO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION VIAS VEHICULARES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON.	1.00	82,989,556.39
2	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	1.00	6,572,136.32
3	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	1.00	5,743,060.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Ciento veinte millones doscientos un mil seiscientos diecinueve pesos m/cte con sesenta y tres cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 120,201,619.63

Total Bruto	95,304,752.71
Administración 20.00%	16,597,911.28
Imprevistos 3.00%	2,489,686.69
Utilidad 7.00%	5,809,268.95
Total a Pagar	120,201,619.63

Observaciones:
ACTA RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA COP-22-2024 OBJETO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION VIAS VEHICULARES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON.

Elaborado por

Firma recibido

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

1410

Tunja, 23 de Diciembre de 2024

Señores
Alcaldía
MUNICIPIO DE NUEVO COLON
TESORERIA MUNICIPAL

REF: Factura de venta LAG 48 contrato de obra COP 22-2024

Cordial saludo.

Respetados señores, solicitamos **NO** efectuar **RETENCION EN LA FUENTE E ICA LAGOVAL INGENIERIA SAS** con NIT 9006120420-0 ya que se encuentran en **RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION.** De la Factura de venta según referencia.

Art. 911. (Estatuto Tributario)

Retenciones y autorretenciones en la fuente en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE.

Nota 1. Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE no estarán sujetos a retención en la fuente y tampoco estarán obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente con excepción de las correspondientes a pagos laborales. En los pagos por compras de bienes o servicios realizados por los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE, el tercero receptor del pago, contribuyente del régimen ordinario y agente retenedor del impuesto sobre la renta, deberá actuar como agente autorretenedor del impuesto. Lo anterior sin perjuicio de la retención en la fuente a título del impuesto sobre las ventas -IVA, regulado en el numeral 9 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario.

Con lo anterior agradecemos su atención prestada

Cordialmente

DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR
C.C. 61.049.631.574
R/L LAGOVAL INGENIERIA SAS
NIT 900612042-0

Adjunto, Registro Único Tributario.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141002690364

(415)7707212489984(8020) 000014100269036 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 6 1 2 0 4 2	0	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
LAGOVAL INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal
CR 12 18 33 OF 309

42. Correo electrónico lagoval.ingenieria@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 3 5 3 5 4 1	3 1 2 5 2 3 7 8 6 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 3 0 4 0 8	7 1 1 2	2 0 1 3 0 4 0 8	4 2 1 0 / 4 2 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	9	1	4	4	2	4	7	4	8	5	2	5	5												

07- Retención en la fuente a título de rent 55 - Informante de Beneficiarios Finales
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ TOVAR DIEGO FABIAN
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

1412

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 5 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141002690364

(415)7707212489984(8020) 000014100269036 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 6 1 2 0 4 2	0	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	1	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 1 3 0 4 1 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 3 0 4 2 4	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 2 2 5 1 1	
78. Departamento	1 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 3 0 4 1 7	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	1 0 1	2 0 1 9 0 1 0 1		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

1413

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141002690364

(415)7707212489984(8020) 000014100269036 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 1 2 0 4 2	0	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 1 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 4 9 6 3 1 5 7 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	TOVAR	DIEGO	FABIAN

108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141002690364

(415)7707212489984(8020) 000014100269036 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 6 1 2 0 4 2	0	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 3 4 3 4 1 8 7		1 6 5 2 9 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ESPINOSA	CEPEDA	JENNY	MARIBEL

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

1415

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Página 5 de 5 Hoja 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141002690364

(415)7707212489984(8020) 000014100269036 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
		Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 3 0 4 2 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900612042	0	LAGOVAL INGENIERIA SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	TUNJA	CRA 12 18 33 OF 309	TUNJA-BOYACA	7454126	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1099317698	9478471245	E	2024/12/10	2024/12/04	BANCO DE BOGOTA		$4,911,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$1,241,200						$310,400	
																				$1,241,200						$310,400	
																				$1,241,200						$310,400	
						$1,300,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		NUEVA E.P.S.	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	4	$173,334	16%	SIN RIESGO	$27,800	$0	$0	$0	$0	$0	$27,800		FAMISANAR	4	$173,334	4%	$7,000	
						$1,300,000	No	Fijo	COLFONDOS	13	$563,334	16%	SIN RIESGO	$90,200	$0	$0	$0	$0	$0	$90,200		NUEVA EPS MOVILIDAD	13	$563,334	4%	$22,600	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	3	$130,000	16%	SIN RIESGO	$20,800	$0	$0	$0	$0	$0	$20,800		SANITAS	3	$130,000	4%	$5,200	
						$1,300,000	No	Fijo	PROTECCION	9	$390,000	16%	SIN RIESGO	$62,400	$0	$0	$0	$0	$0	$62,400		NUEVA EPS MOVILIDAD	9	$390,000	4%	$15,600	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		NUEVA E.P.S.	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		NUEVA E.P.S.	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		NUEVA E.P.S.	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$1,300,000	4%	$52,000	
																				$1,241,200						$310,400	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$310,400						$310,400						$540,200				$0		$0		$0		$0	
	$310,400						$310,400						$540,200				$0		$0		$0		$0	
	$310,400						$310,400						$540,200				$0		$0		$0		$0	
$0	$52,000		COMFABOY	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$7,000		COMFABOY	4	$173,334	4%	$7,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	4	$173,334	6.96%	5	$12,100	4	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$22,600		COMFABOY	13	$563,334	4%	$22,600	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	13	$563,334	6.96%	5	$39,300	13	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$5,200		COMFABOY	3	$130,000	4%	$5,200	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	3	$130,000	6.96%	5	$9,100	3	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$15,600		COMFABOY	9	$390,000	4%	$15,600	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	9	$390,000	6.96%	5	$27,200	9	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,000		COMFABOY	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,000		COMFABOY	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,000		COMFABOY	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,000		COMFABOY	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$310,400						$310,400						$540,200				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900612042	0	LAGOVAL INGENIERIA SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	TUNJA	CRA 12 18 33 OF 309	TUNJA-BOYACA	7454126	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1099317698	9478471245	E	2024/12/10	2024/12/04	BANCO DE BOGOTA	0	$4,911,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$310,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	9	$310,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$310,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$7,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$208,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$90,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$5,200
TOTAL				9	$2,402,200

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900612042	0	LAGOVAL INGENIERIA SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	TUNJA	CRA 12 18 33 OF 309	TUNJA-BOYACA	7454126	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1099317698	9478471245	E	2024/12/10	2024/12/04	BANCO DE BOGOTA		$4,911,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$1,241,200						$310,400	
																				$1,241,200						$310,400	
																				$1,241,200						$310,400	
						$1,300,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		NUEVA E.P.S.	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	4	$173,334	16%	SIN RIESGO	$27,800	$0	$0	$0	$0	$0	$27,800		FAMISANAR	4	$173,334	4%	$7,000	
						$1,300,000	No	Fijo	COLFONDOS	13	$563,334	16%	SIN RIESGO	$90,200	$0	$0	$0	$0	$0	$90,200		NUEVA EPS MOVILIDAD	13	$563,334	4%	$22,600	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	3	$130,000	16%	SIN RIESGO	$20,800	$0	$0	$0	$0	$0	$20,800		SANITAS	3	$130,000	4%	$5,200	
						$1,300,000	No	Fijo	PROTECCION	9	$390,000	16%	SIN RIESGO	$62,400	$0	$0	$0	$0	$0	$62,400		NUEVA EPS MOVILIDAD	9	$390,000	4%	$15,600	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		NUEVA E.P.S.	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		NUEVA E.P.S.	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		NUEVA E.P.S.	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$1,300,000	4%	$52,000	
																				$1,241,200						$310,400	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$310,400						$310,400						$540,200				$0		$0		$0		$0	
	$310,400						$310,400						$540,200				$0		$0		$0		$0	
	$310,400						$310,400						$540,200				$0		$0		$0		$0	
$0	$52,000		COMFABOY	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$7,000		COMFABOY	4	$173,334	4%	$7,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	4	$173,334	6.96%	5	$12,100	4	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$22,600		COMFABOY	13	$563,334	4%	$22,600	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	13	$563,334	6.96%	5	$39,300	13	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$5,200		COMFABOY	3	$130,000	4%	$5,200	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	3	$130,000	6.96%	5	$9,100	3	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$15,600		COMFABOY	9	$390,000	4%	$15,600	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	9	$390,000	6.96%	5	$27,200	9	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,000		COMFABOY	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,000		COMFABOY	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,000		COMFABOY	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,000		COMFABOY	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$310,400						$310,400						$540,200				$0		$0		$0		$0	

2024/12/04 09:10 a.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900612042	0	LAGOVAL INGENIERIA SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	TUNJA	CRA 12 18 33 OF 309	TUNJA-BOYACA	7454126	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1099317698	9478471245	E	2024/12/10	2024/12/04	BANCO DE BOGOTA	0	$4,911,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$310,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	9	$310,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$310,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$7,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$208,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$90,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$5,200
TOTAL				9	$2,402,200

2024/12/04 09:10 a.m.

4 de 4

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900612042	0	LAGOVAL INGENIERIA SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	TUNJA	CRA 12 18 33 OF 309	TUNJA-BOYACA	7454126	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1099317698	9478471245	E	2024/12/10	2024/12/04	BANCO DE BOGOTA		$4,911,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$1,040,000						$260,000	
																				$1,040,000						$260,000	
																				$1,040,000						$260,000	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		FAMISANAR	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		FAMISANAR	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		FAMISANAR	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		FAMISANAR	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		SANITAS	30	$1,300,000	4%	$52,000	
																				$1,040,000						$260,000	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$260,000						$260,000						$452,500				$0		$0		$0		$0	
	$260,000						$260,000						$452,500				$0		$0		$0		$0	
	$260,000						$260,000						$452,500				$0		$0		$0		$0	
$0	$52,000		COMFABOY	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,000		COMFABOY	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,000		COMFABOY	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,000		COMFABOY	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,000		COMFABOY	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$260,000						$260,000						$452,500				$0		$0		$0		$0	

2024/12/04 09:08 a.m.

1428
