sellador polimérico ; Cuatro (4) varillas roscadas 1/2".

Santana

9-01-25 **Nota 132**: Jueves 09 Enero 2024
Clima: Mañana y tarde soleadas
Personal: Un (1) Director obra, un (1) residente obra, un (1) maestro, un (1) contramaestro, tres (3) oficiales, siete (7) ayudantes y un (1) soldador

Santana

Nota 133: Se realizan actividades de Demolición de placas contrapiso y cintas en adoquín en zona de acceso costado oriental (Rotonda Francisco Orellana); Desmonte de canecas H-120 en costado Sur; Bordillo en hilada vertical de ladrillo; Pulida de piso en patinodromo; Remates de pintura e instalación de pernos faltantes en baranda M83 zona medaluna; Corte con pulidora en placas de contrapiso; Demolición de sección de columna de luminaria en zona de nichos Cll 36.

Rondón Santana

Nota 134: Se realiza suministro y acopio de material: Un (1) M3 de arena de peña.

Norma

Powered by CamScanner

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2025.04.28 15:22:07 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

Santana

10-01-25 **Nota 135:** Viernes 10 de Enero 2025
Clima: Mañana y tarde soleadas
Personal: Un(1) residente obra, un(1) maestro, un(1) contramaestre, tres (3) oficiales y siete (7) ayudantes.

Santana

Nota 136: Se realizan actividades de bordillo en ladrillo en senderos contiguos a Torre del Reloj; Excavación manual en terreno natural en zona de acceso costado oriental (Rotonda Francisco de Orellana); Demolición de placa de contrapiso en sendero Monumento Fuente del León; Pulida de piso en patinodromo.

Ronald Lorenzo Santana

11-01-25 **Nota 137:** Sábado 11 de Enero 2025
Clima: Mañana soleada
Personal: Un(1) residente obra, un(1) maestro, un (1) contramaestre, tres (3) oficiales y siete (7) ayudantes.

Santana

Norma

Powered by CamScanner

Nota 138: Se realizan actividades de excavación manual en terreno natural en zona de acceso rotonda Francisco de orellana ; Pulida de piso en Patinodromo. CFE Pavda bravo Santana

12-01-25 **Nota 139**: Domingo 12 de Enero 2025
eNo se realizan actividades.
Santana

13-01-25 **Nota 140**: Lunes 13 de Enero 2025
Clima: Mañana y tarde soleadas
Personal · Un(1) director obra, un(1) residente obra, un(1) maestro, un(1) contramaestro, tres (3) Oficiales, siete (7) ayudantes.
Santana


Nota 141: Se realizan actividades de excavación manual en terreno natural en acceso rotonda Francisco de Orellana y en sendero Monumento Fuente de León ; Pulida de piso en Patinodromo
CFE Pavda bravo Santana

Nota 142: En base al capítulo 5 Andenes, senderos y plazoletas de las especificaciones técnicas de IDRD se establece la estructura de

Norma

Powered by CamScanner

pavimento para las placas de contrapiso en el acceso frente a la rotonda Francisco de Orellana. Tomando como base la Tabla 4,3 : "Espesores de la estructura de pavimento para losetas de concreto con tráfico vehicular liviano"
Al evidenciarse material proveniente de excavación con alto porcentaje de materia orgánica se asume tipología de suelo 1, para la cual se establecen espesores de SBG-1 de 20 cm y BG-1 o BG-2 de 20 cm.
Se establece una placa de contrapiso de 10 cm de espesor en concreto de 3000 PSI con refuerzo en malla electrosoldada de 15x15 cm de 6 mm.

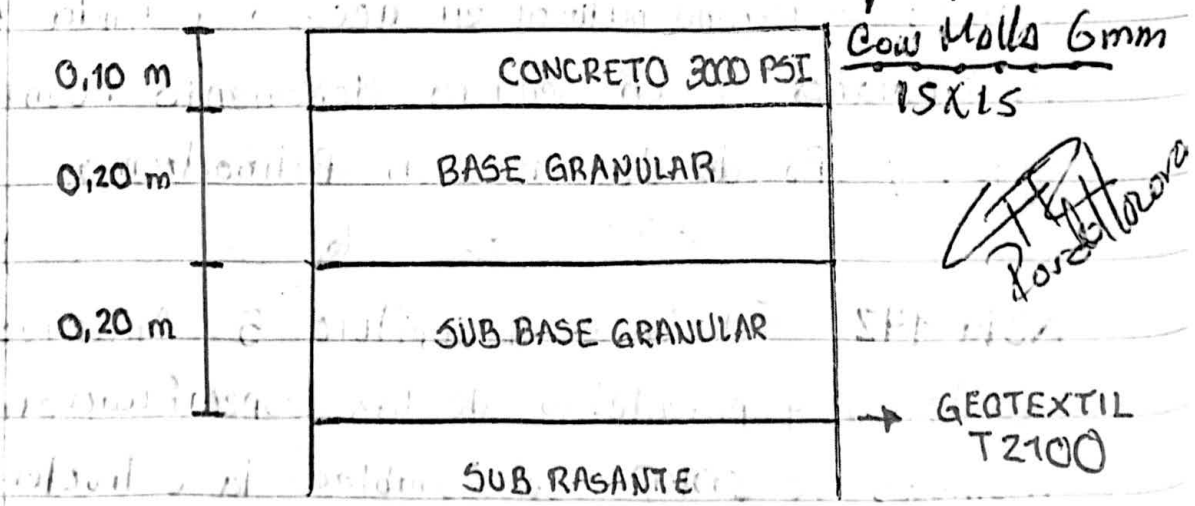

Norma

Powered by CamScanner

14-01-25 **Nota 143** : Martes 14 de Enero 2025
Clima : Mañana y tarde soleadas
Personal : Un(1) Director obra , un(1) residente obra, un(1) contramaestro, cuatro (4) oficiales y siete (7) ayudantes.

Santana

Nota 144 : Se realizan actividades de demolición de placas de contrapiso en senderos zona monumento Fuente de León y Monumento la Virgen ; Trasiego y acopio de RCD ; Excavación manual en zona de acceso Rotonda Francisco Orellana ; Excavacion manual para instalación de canecas. Pulida piso Palmodromo.

Santana

15-01-25 **Nota 145** : Miércoles 15 de Enero 2025
Clima : Mañana y tarde soleadas
Personal : Un(1) director obra , un (1) residente obra , un (1) contramaestro, cuatro (4) oficiales y siete (7) ayudantes.

Santana

Nota 146 : Se realizan actividades de excavación manual y trasiego de material en zona de

Norma

Powered by CamScanner

senderos Monumento La Virgen y Fuente de León ; Excavación manual para instalación de canecas ; Pulida de piso en patinodromo.

Nota 147 : Se realiza visita técnica con especialista ambiental y se coordina procedimiento para el desmonte de poste y translado de abejas a lugar autorizado. Para esta actividad se debe desmontar dos módulos de cerramiento en la cancha de fútbol y realizar cerramiento en lona verde en sendero ubicado entre pista de Hockey y cancha fútbol. Se realizará desmonte del poste y acopio del mismo en la zona demarcada durante el periodo de tiempo necesario para que las abejas vuelvan al panal y posteriormente se retiraran de forma controlada.

16-01-25 Nota 148 : Jueves 16 de Enero 2025
Clima: Mañana y tarde soleada
Personal : Un(1) director obra, tres(3) oficiales y cinco(5) ayudantes.

Norma

Powered by CamScanner

Santana

Nota 149 : Se realizan actividades de excavación manual, trasiego y acopio de material en zona de senderos monumentos Fuente León y La Virgen ; Pulida de piso en patinodromo ; Excavación para instalación de canecas.

Ronald Lozano Santana

17-01-25 **Nota 150** : Viernes 17 de Enero 2025
Clima : Mañana y tarde nubladas
Personal : Un (1) director obra, un (1) contramaestro, Un (1) oficiales y tres (3) ayudantes.

Santana

Nota 151 : Viernes 17 de enero 2025
Clima: Soleado
Personal obra: (1) Maestro, (1) oficial, (3) ayudante)
Personal Interventoria: 1 Residente, 1 Inspector
- Se solicita al contratista que retire los escombros y que se avance con los senderos de la virgen.
- Se suministra de parte del contratista enchape de la pista de patinaje.
- Se solicita que tengan personal y

Norma

Powered by CamScanner

material para la baranda de la pista de patinaje y cerramiento de tanque de acueducto.

Santana INSP INTERVENTOR

Bordallaou

18-01-25 **Nota 152** Sábado 18 de enero 2025

Clima Soleado

Personal de obra: 1 Maestro, 1 Oficial, 3 Ayudantes

Personal de interventoria: 1 Residente, 1 Inspector

Se solicital al contratista retirar los escombros y avance en el sendero de la virgen, se reitera la solicitud de personal y material para la baranda de la pista de patinaje y cerramiento de tanque de acueducto. Bordallaou

Santana INS INTERVENTORIA

20-01-25 **Nota 153** lunes 20 de enero 2025

Clima Soleado

Personal de obra: 1 Maestro, 2 oficiales, 6 ayudantes

Personal de Interventoria: 1 Residente, 1 Inspector

Norma

Powered by CamScanner

Actividades de obra: Se continua con la excavación de senderos de la virgen, se solicita verificar Niveles para la estructura y niveles de terminado.

Se solicita señalizar acopios de escombros. En la zona de pista se cuenta con el personal, pero no se continúa con las actividades por falta de una extensión.

En zona de picnic se contina con la pintura de ductos e instalación de listones.
Poste panal, se inicia con la instalación de cemamiento
Zona rotonda, no cuenta con personal, se recomienda no dejar la excavación abierta ya que puede ser afectadad por posibles lluvias y dañar la subrasante, donde se aclara que cualquier afectación que pueda

Norma

Powered by CamScanner

06

llegar a presentar por dicha exposicion será asumida por el contratista CFR Bonaldo...

Santana INSP INTERVENTORIA

21-01-25 **NOTA 154** Martes 21 de enero

Clima soleado

Personal de obra: 3 Inspector, 1 oficial, 2 ayudante

Personal de interventoria: 1 residente, 1 Inspector

Actividades de obra.: Se continua con la excavación del sendero, se solicita verificar niveles para la estructura y niveles de terminado.

Se solicita senalizar acopios de escombro, en la zona de pista de patinaje no se cuenta con personal

En la zona de picnic, se instalan listones de madera

Zona rotenda, no cuenta con personal se recomenda no dejar excavación abierta ya que puede ocurrir cualquier imprevisto

Norma Santana INSP INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

22-01-25 NOTA 155 MIERCOLES 22. ENERO

CON RELACION A LAS NOTAS DE LA INTERVENTORIA No - 151 — SE ACLARA QUE LOS RESIDUOS ACOPIADOS EN LOS PUNTOS DESTINADOS PARA TAL FIN SE VAN A RETIRAR DE ESOS ESPACIOS EL DIA LUNES 27 - ENERO / 25 QUE ASI LO EXIGEN LOS VALES DE BOTADERO CRATIFICADO COMPRADOS POR EL CONSORCIO BELZON IDRO 7.

- EL ENCHAPE DE LA PISTA DE PATINAJE LLEGO HOY AL PARQUE RECREACIONAL Y YA SE VA A PROCEDER A SU INSTALACION

- LA BARANDA DE LA PISTA YA SE ESTA ELABORANDO EN TALLER LOS ELEMENTOS FALTANTES CON SON LA PUERTA DE INGRESO A PISTA Y SE VA INICIAR MAÑANA EL DIA LUNES 27. ENERO / 25

- EN LOS SENDEROS AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION DEL IDRD, SE ESTA TRABAJANDO EN ACTIVIDADES DE PERFILADO - NIVELACION Y ALISTAMIENTO PARA APLICAR LA B-600.

Pedro Rodriguez — Santana — Norma

Powered by CamScanner

68

Nota 156 · El día 21 / Enero / 2025 se realizaron actividades de desmonte de señal IDG-S y dos modulos de cerramiento en malla eslabonada en zona de cancha de fútbol para permitir ingreso de camión grua a proximidad de Poste metálico en donde se situaba colmena de abejas.
Se realiza desmonte y translado de poste siguiendo protocolo y acompañamiento del área ambiental, SST, social, técnica, eléctrica, bomberos, administración del parque y subcontratista debidamente calificado para realizar la actividad, el cual garantizó la supervivencia de los individuos animales. La actividad se realizó en el periodo comprendido entre las 17:50 y las 20:00 pm.

Nota 157: El día 22 enero 2025 se realiza atención a emergencia eléctrica en zona de baños calle 39, en donde se determina la no continuidad de energia eléctrica en el tablero de distribución principal en cuarto de bombas; Se realiza seguimiento de la acometida al exterior de los baños y se observa cableado cortado en caja de inspección ubicada

Norma

Powered by CamScanner

en zona de senderos frente a Torre del Reloj, se comunica a la Entidad y se espera autorización para realizar la respectiva reparación.

C. Rondón Lozano Santana

Nota 158: Miércoles 22 de enero 2025
Clima: Mañana y tarde soleada.
Personal: Un (1) director de obra, Un (1) maestro, dos (2) oficiales y un (1) ayudante.

Santana

Nota 159: Se realiza suministro y acopio de material: 24 m^2 de baldosa grano marmol 33x33; 5 bultos de cemento x 50 kg.

Santana

Nota 160: Se realizan actividades de re instalación de señal IDG-5 en zona de cancha de fútbol y relleno de concreto en perforación de poste extraido; Desmonte de cerramiento provisional en sendero pista Hockey

C. Rondón Lozano Santana

23-01-25 **Nota 161**: Jueves 23 de Enero 2025
Clima: Mañana y tarde soleada
Personal: Un (1) director obra, Dos (2) oficiales y

Norma

Powered by CamScanner

tres (3) ayudante.

Santana

Nota 162: Se realizan actividades de demolición de alistado de piso, instalación de malla gallinero, y enchape de piso en granito en patinodromo; Orden y aseo.

Ronald Bravo Santana

Nota 163: Se realiza suministro y acopio de material: Tres (3) m^3 de arena peña; 15 m^2 de malla de gallinero.

Santana

24-01-25 **Nota 164**: Viernes 24 de Enero 2025
Clima: Mañana y tarde nublados
Personal: Un(1) residente obra, Dos(2) oficiales y dos (2) ayudantes.

Santana

Nota 165: Se realizan actividades de instalación de enchape de piso en granito en patinodromo; Lijado de baranda (tubo 2") en patinodromo.

Ronald Bravo Santana

Nota 166: Se realiza suministro y acopio de material: 7 m de malla de gallinero;

Norma

Powered by CamScanner

Cinco (5) bultos de cemento.

Santana

25-01-25 **Nota 167**: Sábado 25 de Enero 2025
Clima: Mañana nublada
Personal: Un(1) residente obra, Un(1) maestro, Un(1) contramaestro, tres (3) oficiales y dos (2) ayudantes. Rodolfo

Santana

Nota 168: Se realizan actividades de enchape en piso de Patinodromo; Lijado de baranta (tubo 2") en contorno de patinodromo; Cerramiento con lona negra en árboles aledaños a zona de acceso rotonda Francisco de Orellana.

Rodolfo Santana

26-01-2025 **Nota 169**: Domingo 26 de Enero 2025
No se realizan actividades.

Santana

27-01-25 **Nota 170**: Lunes 27 de Enero 2025
Clima: Mañana lluviosa y tarde nublada
Personal: Un(1) residente obra, un(1) contramaestro, tres (3) oficiales y dos (2) ayudantes

Santana

Norma

Powered by CamScanner

72

Nota 171 : Se realizan actividades de emboquillado en enchape de piso y lijado de baranda en patinodromo, Cerramiento en lona verde en acopios de RCD zona monumentos La Virgen.

Ronald Alvarez Santana

28-01-25 **Nota 172**: Martes 28 de enero 2025

Clima: Soleado.

Personal de obra: 1 oficial, 5 ayudantes

Personal interventoria: 1 Residente, 1 Inspector

Actividades de obra: Excavación en el sector de la Virgen y mantenimiento del cerramento pista.

Se solicita al contratista que ingrese personal para actividades de la rotonda, sobre carrera quinta.

Se reitera solicitud de señalización de las excavaciones abiertas en el sendero peatonal, en el cual no se evidencia

Norma

Powered by CamScanner

Avances de la intervención.

se le recuerda al contratista que estas excavaciones abiertas deben ser atendidas en el menor tiempo posible para evitar afectaciones y posibles retrasos por lluvias y o daños en la subrasante.

29-01-25 **Nota 133**: Miércoles 29 de enero de 2025

Clima: soleado

Personal de obra: 1 oficial, 5 ayudantes

Personal de interventoria: 1 Residente, 1 Inspector Randy Lozano

Actividades de obra: Continuan con excavación en el sector de la virgen y mantenmento del cerramento de pista

Se solicita al contratista que ingrese personal para actividades de la rotonda sobre carrera quinta.

Se reitera solicitud de señalización de

Norma

Powered by CamScanner

de las excavaciones abiertas en el sendero peatonal, en el cual no se evidencia avances de la intervención

Se le recuerda al contratista que estas excavaciones abiertas deben ser atendidas en el menor tiempo posible para evitar afectaciones y posibles retrasos por lluvias y/o daños a la subrasante.

Ronald Moreno.

30-01-25 **NOTA 174:** Jueves 30- Enero /25

Clima: Soleado

PERSONAL DE OBRA: 1. RESIDENTE T/ INGENIERO + 4 OFICIALES + 3 AYUDANTES + BOBCAT + 1 Operario + 1 Supervisor + PALETERO.

SE REINA ESCOMBRO CON BOBCAT y VOLQUETAS DE 15M3 DE LA ZONA DE INGRESO VEHICULAR A LA ROTONDA.

SE CONTINUA CON EL RETIRO DE ESCOMBRO DE LA ZONA DE LA CALLE 39 CON 7a. ALOPIO LA VIRGEN.

Norma

Powered by CamScanner

SE INICIO CORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL EN LA EXCAVACION DEL INGRESO VEHICULAR A LA ZONA DE ROTONDAS.

~~CR~~ Rondo bravo.

Nota 175: la anteventoria observando el avance de las obras le requiere y recuerda al Contratista cumplir las obligaciones especificas del Contrato en cuestion, tal como lo especifica la N° 15, donde establece " suministrar, disponer, operar y mantener al frente de los trabajos, todos los recursos necesarios (equipo, elementos, herramientas, maquinaria, insumos y personal profesional y operativo, de manera simultanea en cada uno de los frentes, para el normal desarrollo del objeto Contratado" anotando que no se observa personal en la pista de patinaje, baranda del tanque del acueducto, mantenimiento del pisa de loseria sanitaria, material para senderos de la virgen y rotonda Santo domingo, placa en sendero frente

Norma

Powered by CamScanner

superior del rio orzobaspo, se requiere se tomen las medidas necesarias para interrogar todas las hora de obra y colmino todas las actividades pendientes. Ronald Lozano.

Nota 176: Se realiza retiro y disposicón final de (6) seis viajes (de 15 m^3 cada uno) de RCD ; Trasiego de un viaje (15 m^3) de base granular B600 desde punto de acopio Cll 39 - Cra7 hasta zona acceso rotonda Francisco Orellana.

Ronald Lozano Santana

31-01-25 **Nota 177**: Viernes 31 Enero 2025
Clima: Mañana y tarde nubladas
Personal: Un (1) residente obra, Dos (2) oficiales y dos (2) ayudantes.

Santana

Nota 178: Se realizan actividades de extendido de material granular B-600 en zona de acceso rotonda Francisco de Orellana ; Pulida de piso en granito zona patinodromo.

Ronald Lozano Santana

Norma

Powered by CamScanner

01-02-25 **Nota 179** : Sábado 01 de Febrero 2025
Clima: Mañana soleada
Personal : Un (1) residente Obra , Un (1) oficial y tres (3) ayudantes.

Santana

Nota 180 : Se realizan actividades de pulida en piso de patinodromo ; Extendido de material granular SB-G B400 en zona de acceso rotonda Francisco Orellana.

Pardo bruno. Santana

02-02-25 **Nota 181** : Domingo 02 Febrero 2025
No se realizan actividades.

Santana

03-02-25 **Nota 182**: Lunes 03 Febrero 2025
Clima: Mañana y tarde soleadas
Personal : Un (1) residente obra, un (1) oficial y dos (2) ayudantes.

Santana

Nota 183: Se realiza instalacion de Señal (perdon) " Discolpe las incomodidades, estamos interviniendo este parque en pro del bienestar de la comunidad." ; Se continua pulida de

Norma

Powered by CamScanner

Piso de granito en zona de patinodromo ; Se inicia compactacion mecánica con canguro en SB-G de zona de acceso, rotondas Francisco Orellana.

Paulo Bravo Santana

04-02-25 **Nota 184** : 04 de Febrero de 2025

Clima : Mañana y tarde soleadas

Personal: Un (1) director obra, un (1) residente obra, un (1) maestro, un (1) contra maestro, dos (2) oficiales y tres (3) ayudantes.

Santana

Nota 185 : Se realizan actividades de pulido en Piso granito zona patinodromo, la ~~inspectora~~ observando el avance de los obras recomienda al Contratista seguir bien la capa de recebo en la glorieta a carrera 5ª ; para evitar que la compactacion no cumpla, ya que el material se observa saturado, se recomienda compactar con otra maquina para garantizar una mejor compactacion se requiere se ingrese mas personal para intervenir los sardineles de origen, placa del puente, mantenimiento vial

Norma

Powered by CamScanner

piso de bateria sanitaria, retiro de escombros, demarcacion pista de patinodromo, suministro e instalacion barando torque del escenario.

Ronald Lozano Santana

05-02-25 **Nota 186** : Miercoles 05 Febrero 2025
Clima : Mañana y tarde soleadas
Personal : Un(1) residente obra, Dos(2) oficiales y tres (3) ayudantes.

Santana

Nota 187 : Se realizan actividades de pulida en piso de granilo zona patinodromo; Trasiego y acopio de RCD en zona de senderos monumento Fuente de Leon.

Ronald Lozano Santana

06-02-25 **Nota 188** : Jueves 06 Febrero 2025
Clima : Mañana soleada y tarde lluviosa
Personal : Un(1) residente obra, dos (2) oficiales y dos (2) ayudantes.

Santana

Nota 189 : Se realizan actividades de compactacion de material granular con canguro en zona de

Norma

Powered by CamScanner

BD

acceso rotonda ; Pulida de piso en granito de Patinodromo ; Trasiego manual y acopio de RCD en zona senderos Fuente León.

Pardo Bravo Santana

07-02-25 **Nota 190**: Viernes 07 Febrero 2025

Clima: Soleado

Personal: Un(1) director obra, Dos(2) oficiales y tres (3) ayudantes.

Santana

Nota 191: Se realizan actividades de pulida en paso de Patinodromo ; Trasiego manual y acopio de RCD en zona senderos Fuente León ; Compactación mecánica con canguro en SB-G de zona rotonda Francisco de Orellana.

Pardo Bravo Santana

8-02-25 **Nota 192**: Sábado 08 Febrero 2025

Clima: Nublado

Personal: Un(1) residente obra ; Dos(2) oficiales y dos (2) ayudantes

Santana

Nota 193: Se realiza suministro de material: Cinco (5) Kg resina.

Norma

Powered by CamScanner

Santana

Nota 194: Se realizan actividades de re emboquillado de enchape en piso de patinódromo con resina

Pardo Lora Santana

09-02-25 **Nota 195**: Domingo 09 Febrero 2025
No se realizan actividades

Santana

10-02-25 **Nota 196**: Lunes 10 Febrero 2025
Clima: Mañana nublada y tarde lluviosa
Personal: (2) oficiales, (3) ayudantes
Personal interventoria: (1) Residente, (1) Inspector

Actividades: No se evidencia avance en sendero peatonal costado oriental, se encuentra húmedo se recomienda realizar limpieza retirar material organico y basura realizar una compactación a esta capa y terminar la intervención de este sendero para que no llege a presentarse una posible afectación por lluvias.

Norma

Powered by CamScanner

B2

Pista de patinaje: se continuan con las actividades de polida de piso y emboquilla de ~~de~~ pista.
Se solicita al contratista el uso de EPP al personal operativo.

Sendero de la virgen: No se evidencian avance. en las actividades de este sendero, se cuenta con el sendero expuesto a lluvias lo cual puede afectar la subrasante del sendero.
Se recomienda tapar los acopios de materiales granulares y para evitar la proliferación de partículas de proliferación de partículas en el ambiente.

No se evidencian avance en el area de la rotonda, el material se encuentra saturado.
Se solicita al contratista contar con personal técnico en obra, Residente y/o ~~Fiscal~~ Inspector

Ronald Lozano
INSP INTERVENTORIA

Norma

Powered by CamScanner

11-02-25 **Nota 197**: Martes 11 Febrero 2025
Clima: Mañana y tarde lluviosas
Personal: Un (1) residente obra, tres (3) oficiales y dos (2) ayudantes.

Santana

Nota 198: Se continuan actividades de pulida de enchape en piso de patinodromo; Demolicion de enchape de muros, corte de regatas, desmonte de válvulas push en sanitarios de baños calle 39 (hombres y mujeres).

Santana

12-02-25 **Nota 199**: Miércoles 12 Febrero 2025
Clima: Mañana y tarde nubladas
Personal: Un (1) residente obra, cuatro (4) oficiales y tres (3) ayudantes.

Santana

Nota 200: Se continuan actividades de re-emboquillado de enchape en piso de patinodromo; Demolicion de enchape de muros, corte de regatas y desmonte de push en sanitarios de baños (hombres y mujeres) calle 39; se realiza atencion a emergencia en afectacion

Powered by CamScanner

8.4

de acometida de agua potable en zona de sendero monumento Fuente angel.

Santana

Nota 201. La interventoria realiza visita al parque y no se conoce en el sendero contado oriental, no se observa conoce en la rotonda de la carrera 5, no se observa conoce en los senderos de la origen, la interventoria requiere nuevamente personal y material de obra para culminar las obras que al dia de hoy no se han culminado.

Ronald bromo Santana

13-02-2025 **NOTA 202**: Jueves 13 Febrero 2025

Clima: Mañana nublada y tarde lluviosa

Personal: Un (1) residente obra, Tres (3) oficiales y cuatro (4) ayudantes.

Santana

Nota 203: Se realizan actividades de atención a emergencia: Reparación de acometida de agua potable 3/4" en sendero Fuente

Norma

Powered by CamScanner

El Angel ; Re emboquillado y pulida de enchape en piso de Patinodromo ; Demolición de enchape de muros en baños calle 39.

Santana

14-02-25 **Nota 204**: Viernes 14 Febrero 2025
Clima: Mañana nublada y tarde lluviosa
Personal: Tres (3) oficiales y cuatro (4) ayudantes

Santana

Nota 205: Se realizan actividades de desmonte de sanitarios, Demolición de muros (regatas) en baños calle 39 ; Enlonado y acopio de RCD ; Pulida de enchape en piso de Patinodromo.

Santana

15-02-25 **Nota 206**: Sábado 15 Febrero 2025
Clima: Mañana nublada
Personal: Dos (2) oficiales y cuatro (4) ayudantes

Santana

Nota 207: Se realizan actividades de pulida en piso de patinodromo ; Enlonado y acopio de RCD en baños calle 39.

Santana

Norma

Powered by CamScanner

16-02-25 **Nota 208**: Domingo 16 Febrero 2025
No se realizan actividades.

Santana

17-02-25 **Nota 209**: Lunes 17 Febrero 2025
Clima: Mañana nublada y tarde lluviosa
Personal: Un (1) residente obra, un (1) inspector obra, Dos (2) oficiales y cuatro (4) ayudantes.

Santana

Nota 210: Se realizan actividades de pulida y limpieza y aplicación de ácido oxálico en piso de granito zona patinódromo.

Santana

Nota211 Durante el recorrido de obra se evidencia que no se presentan actividades ni avance en el sendero de la virgen ni en el area de la rotonda, ni en el sendero peatonal y el baño de la carre 7 (mapa) esta cerrado, sin persona ya que no cuentan con el material para avanzar con las actividades

Powered by CamScanner

02-25 Nota 212 Se recomienda al contratista continuar con las actividades que cuentan con excavaciones abiertas para que no sean afectadas por lluvias

Nota 213: Se realiza suministro y acopio de material: sesenta (60) bultos de cemento gris x 50 kg; Doce (12) mallas electrosoldadas 15x15 cm - 4x4 mm; Un (1) cuñete pintura tipo Koraza color blanco.

Santana

02-25 Nota 214: Martes 18 Febrero 2025
Clima: Mañana y tarde nubladas
Personal: Un(1) residente obra, Dos (2) oficiales y cuatro (4) ayudantes.

Santana

Nota 215: Se realizan actividades de pulida en enchape de piso de patinodromo.

Santana

02-25 Nota 216: Miercoles 19 Febrero 2025
Clima: Nublado
Personal: Un(1) residente obra, dos (2) oficiales

Norma

Powered by CamScanner

cuatro (4) ayudantes, un(1) soldador.

Santana

Nota 217: Se realizan actividades de pulida y sello (aplicación de sellador polimerico) de enchape en piso de patinódromo; Instalación de puerta de acceso a patinodromo; pantos de soldadura en baranda contorno patinodromo.

Santana

Nota 218 No se evidencia avance en las actividades del sendero de la virgen, esta area de sendero se encuentra expuesto a la interpene y a lluvias desde el 16 de diciembre, esta interventoria solicita la verificación de niveles y del estado de la subrasante la cual se obsena saturada por esta exposición, de la misma forma se recomienda realizar la protección de los acopios granulares para evitar la saturación del material por lluvias

Nota 219 Se solicita al contratista contener la salida de materiales o evitar las salida

Norma

Powered by CamScanner

de estos a las bajantes y canales de aguas lluvias y evitar asi posibles afectaciones a corrientes hidricas o daños en zonas verdes

Obs 220 No se evidencia avance en el area de la rotonda, desde el 31 de enero con la instalación del material granular, el cual se encuentra saturado por la exposicion a lluvias, se solicita al contratista suministrar personal materiales y equipos para continuar con las actividades de esta area y evitar asi posibles atrasos en la programación

Obs 221 Se le reitera al contratista la entrega de la caracterización del material granular que se usara en las diferentes estructuras que lo requieren

Obs 222 No se cuenta con los materiales para terminar las intervenciones del baño de la carrera 7 (mapa) el cual se encuentra cerrado

Norma

Powered by CamScanner

Nota 223 En el sendero costado oriental no se evidencia avance, se encuentra señalizado pero el material de la estructura se encuentra humedo por la exposición de la excavación abierta, Se recomienda realizar la limpieza y retirar las basuras y el material organico, se debe verificar el estado de esta capa granular. Andrés C interventor

Nota 224 Se le recuerda al contratista que las afectaciones causadas por la falta de avances e intervención por parte del contratista, en las diferentes actividades presupuestadas y que generen un sobre costo ~~s/o~~ actividades adicionales, estas seran asumidas por el contratista. Andrés C interventor

Nota 225. Se realiza suministro y acopio de material Cinco (5) galones de pintura tipo tráfico color amarillo ; Dos (2) galones de pintura tipo esmalte color verde esmeralda ; Dos (2) galones de pintura anticorrosivo color gris ; Un (1) cuñete de estuco plástico para exteriores. Andrés C interventor Santana

Powered by CamScanner

Nota 226: Jueves 20 Febrero 2025

Clima: Nublado

Personal: Un (1) residente obra, un (1) inspector obra, un (1) soldador, dos (2) oficiales y cinco (5) ayudantes.

Santana

Nota 227: Se realizan actividades de aplicación de sellador polimerico en enchape de piso patinódromo; sello de fisuras con mortero y estuco acrílico para exteriores y retiro de pintura suelta en muros zona patinodromo; Mantenimiento (soldadura) de baranda patinodromo e instalación de parales faltantes; Soldadura de cerramiento en malla eslabonada desmontado en zona cancha fútbol.

Santana

Nota 228: Viernes 21 Febrero 2025

Clima: Mañana nublada y tarde lluviosa

Personal: Un (1) residente obra, un (1) inspector SST, dos (2) oficiales y tres (3) ayudantes.

Santana

Nota 229: Se realizan actividades de resane

Norma

Powered by CamScanner

de muros ; pintura (anticorrosivo) en baranda zona patinodromo ; Resane de fisuras en viga de baranda; Pintura Koraza en muro

Santana

Nota 230: Se realiza suministro de material: Cuatro (4) galones de estuco acrilico para exteriores, masilla hueso duro.

Santana

Nota 231 No se evidencia avance el las areas de: Sendero de la virgen, baños carrera 7 (mapa), zona rotonda, sendero peatonal costado oriental

Andres C
Inter

22-02-25 **Nota 232**: Sábado 22 de Febrero 2025
Clima: Mañana lluviosa
Personal: Uno(1) residente obra, dos(2) oficiales y tres (3) ayudantes.

Santana

Nota 233: Se continua actividad de pintura tipo Koraza color blanco en muros zona patinodromo ; actividad que debe ser

Norma

Powered by CamScanner

suspendida debido a condiciones climáticas de lluvia.

Andres C inter

Santana

23-02-25 **Nota 234** : Domingo 23 Febrero 2025

No se realizan actividades

Santana

24-02-25 **Nota 235** : Lunes 24 de Febrero 2025

Clima : Mañana nublada y tarde lluviosa

Personal : Un (1) residente obra , Dos (2) oficiales y tres (3) ayudantes , un (1) inspector SST

Santana

Nota 236 : Se realizan actividades de pintura tipo koraza color blanco en muros de zona patinodromo ; Pintura tipo esmalte color verde esmeralda en baranda zona ratinodromo ; Pintura tipo tràfico color amarillo en viga zona patinodromo.

Andres C inter

Santana

25-02-25 **Nota 237** : Martes 25 de Febrero 2025

Clima : Mañana nublada y tarde lluvasa

Personal : Un (1) inspector SST , un (1) maestro, dos (2) oficiales y dos (2) ayudantes.

Santana

Powered by CamScanner

Nota 238 : Se realizan actividades de pintura tipo tráfico color amarillo en viga de cimentación baranda zona patinodromo ; Orden y aseo

Inte

Santana

26-02-25 **Nota 239** : Miércoles 26 Febrero 2025
Clima: Mañana nublada y tarde lluviosa
Personal : Un(1) residente Obra, Un(1) inspector obra, Un(1) inspector SST, Un(1) maestro , un(1) operario minicargador , tres(3) oficiales, dos (2) ayudantes

Santana

Nota 240 : Se realizan actividades de cargue, retiro y disposición final de RCD zona asaderos y senderos Fuente León y La Virgen ; Trasiego mecánico y extendido de material granular B-600 en sendero zona rio Arzobispo - dll s.

Trasiego

Santana

Nota 241 : Se realiza suministro y acopio de material : 3000 und de ladrillo tolete macizo.

Inte

Santana

Norma

Powered by CamScanner

27-02-25 **Nota 242**: Jueves 27 Febrero 2025

Clima: Mañana nublada y tarde lluviosa

Personal: Un(1) Residente obra, Un (1) inspector obra, Un(1) oficial, un (1) ayudante, Un (1) operario mini-cargador.

Santana

Nota 243: Se realizan actividades de cargue, retiro y disposición final de RCD (15 m^3); Trasiego de dados de cimentación canecas desmontadas en costado sur del parque hasta punto de acopio RCD en Calle 39 - Carrera 7; Trasiego y extendido de Base granular - B-600 en zona senderos fuente de León; Extendido de geotextil TZ100 en zona sendero fuente León; Orden y aseo.

Santana

Nota 244: Se realiza suministro y acopio de material granular B-600 (15 m^3) en zona rotonda Francisco Orellana y se protege con plástico.

Santana

Norma

Powered by CamScanner

28-02-25 **Nota 245**: Viernes 28 Febrero 2025
Clima: Mañana y tarde nubladas
Personal: Un (1) residente obra, Un (1) maestro, un (1) oficial, dos (2) ayudantes, un (1) operario minicargador.

Santana

Nota 246: Se realiza suministro y acopio de material granular B-600 (45 m³).

Santana

Nota 247: Se realizan actividades de cargue, retiro y disposición final de RCD (15 m³); Trasiego mecánico con minicargador y extendido de material granular B-600 en zona senderos Fuente de Leon y La Virgen; Compactación mecánica con canguro en zona acceso Francisco de orellana y sendero Rio Arzobispo.

Santana

01-03-25 **Nota 248**: Sábado 01 Marzo 2025
Clima: Mañana soleada
Personal: Un (1) residente obra, un (1) maestro, ( ) oficiales, ( ) ayudantes, Un (1) operario minicargador

Santana

Norma

Powered by CamScanner

Nota 249 : Se realiza suministro y acopio de material : Seis (6) mallas electrosoldadas 15x15 cm , 6x6 mm ; Un (1) rollo de geotextil T2100 x 418 m.. Fredesvinter Santana

Nota 250 : Se realizan actividades de trasiego mecánico de materiales desde punto de acopio Kra 7 hasta sendero Kra 5 ; Bordillo en ladrillo y vaciado de concreto en placas de contrapiso sendero Rio Arzobispo carrera 5. Santana

Norma

Powered by CamScanner

Nota 23 actividades de obra : se continua con excavacion y perfilado para el nuevo cerramiento costado sur occidental Jean Reyes
Inse interventoria

Nota 24 Sabado 4 de febrero
clima nublado
Personal de obra: (4) oficial - (2) ayudantes - 1 inspector
Persona interventoria: (1) Residente - 1 inspector

actividades de obra: se continua con excavacion y perfilado para nuevo cerramiento costado sur-occidental el dia de hoy se termina la excavacion en este costado Jean Reyes
Inse interventoria

Nota 25 lunes 3 de febrero
Clima: nublado
Personal de obra: (4) oficial - (3) ayudantes - (1) inspector
Personal interventoria: (1) Residente - (1) inspector

actividades de obra: se inicia excavacion costado nor occidental para nuevo cerramiento Jean Reyes
Inse interventoria

Powered by CamScanner

Nota 26 Martes 4 de febrero
Clima soleado
Personal de obra: sin personal
Personal interventoria: (1) Residente - (1) Inspector

no se ejecutan actividades por que no se presenta personal decbra ni personal tecnico del contratista Jean Reyes
Insp interventoria

Nota 27 Miercoles 5 de febrero
Clima nublado
Personal de obra: sin personal
Personal interventoria: (1) Residente - (1) Inspector

no se ejecutan actividades de obra por que no se presenta personal operativo ni tecnico la interventoria solicita se reanuden actividades en obra para que no se presenten atrasos en la programacion Jean Reyes
Insp interventoria

Nota 28 los dias 6 y 7 de febrero no se ejecutan actividades de obra por falta

Powered by CamScanner

de personal operativo, la interventoria reitera que se reanuden actividades de obra para que no se presenten atrazos en obra Jean Reyes
Inse interventoria

Nota 29 Sabado 8 de febrero

Clima nublado

Personal de obra: (1) oficial (2) ayudantes - (1) Inspector

Personal interventoria: (1) Residente - (1) Inspector

Nota 30 actividades de obra: se realiza acopio de material de excavacion para continuar con excavacion Jean Reyes
Inse interven

Nota 31 lunes 10 de febrero

Clima: soleado

Personal de obra: (1) oficial (2) ayudantes

Personal interventoria: (1) Residente - (1) Inspector

Nota 32 actividades de obra: se continua con excavacion y acopio de material en el costado noroccidental la interventoria recomienda retirar el material de excavacion y que se delimite con

Powered by CamScanner

cintas de seguridad el acopio para seguridad de las personas ajenas a la obra Jean Reyes
Inse interventoria

Nota 33 Martes 12 de febrero de 2025
Clima: Nublado
Personal de obra: (1) oficial - (2) ayudantes - (1) inspector
Personal interventoria (1) Residente - (1) inspector

Nota 34 actividades de obra: se continua con excavacion y acopio de material del costado noroccidental Jean Reyes
Inse interventoria

Nota 35 Miercoles 12 de febrero de 2025
Clima: Nublado
Personal de obra: (1) oficial - (2) ayudantes - (1) inspector
Personal de interventoria: (1) Residente - (1) inspector

Nota 36 actividades de obra: se terminan actividades de excavaciones, se continua con perfilado del bordillo y acopio Jean Reyes
Inse interventoria

Norma

Powered by CamScanner

Nota 37 (actividade) Jueves 13 de febrero de 2025
Clima: nublado lluvias intermitentes.
Personal de obra: (1) oficial - (3) ayudantes - (1) inspector
Personal interventoria: (1) Residente - (1) inspector

Nota 38 actividades de obra: se inician actividades de relleno con material granular SBG reciclada en el costado suroccidental Jean Reyes
Inse interventoria

Nota 39 la interventoria solicita al contratista remitir resultados de laboratorio de la SBG reciclada que cumplan con lo establecido en el manual del IDRD para este tipo de material Jean Reyes
Inse interventoria

Nota 40 Viernes 14 de febrero de 2025
Clima: nublado
Personal: 3 trabajadores
Personal interventoria: 1 Residente - 1 inspector
Nota 41 actividades de obra: se continua con rellenos en SBG reciclada en el costado suroccidental Jean Reyes
Inse interventoria

Norma

Powered by CamScanner

Nota 42 Sabado 15 de febrero de 2025

Clima: nublado

Personal obra: 3 trabajadores

Personal interventoria: (1) Residente (1) inspector

Nota 43 actividades de obra: llega a obra bordillo para confinamiento de SBG y placa de concreto y se da inicia a excavacion e instalacion del mismo Jean Paul Reyes
Inspector interventoria

Nota 44 lunes 17 de febrero de 2025

Clima: Soleado

Personal de obra: (3) trabajadores

Personal interventoria: (1) Residente - (1) inspector

Nota 45 actividades de obra: se continua con instalacion de bordillo en el costado suroccidental, En el costado Noroccidental se continua con primera capa de material granular y extendido de geotextil, se realizo el retiro de material de excavacion acopiado Jean Reyes
Insp interventoria

Powered by CamScanner

Nota 46 Martes 18 de febrero de 2025

Personal de obra: (4) trabajadores - (1) inspectos

Personal interventoria: (1) Residente - (1) inspectos

Clima : Soleado

Nota 47 actividades de obra: se inicia con retiro de cerramiento existente, continuan con excavacion y instalacion de bordillo Jean Reyes
Inse interventoria

Nota 48 La interventoria requiere al contratista que se instale una adecuada proteccion a la grama segu acta levanta de puesta en servicio cada que retiren cerramiento o se encuentren ejecutando actividades Jean Reyes
Insp interventoria

Nota 49 Miercoles 19 de febrero de 2025

Clima : nublado lluvias intermitentes

Personal obra: (1) SST - (1) oficial - (3) ayudantes

Personal interventoria: (1) residente - (1) inspectos

Nota 50 se continua con instalacion de bordillo y emboquillado del mismo se inicia con retiro de cerramiento costado noroccidental Jean Rey
Inse interv

Powered by CamScanner

Nota 51 Jueves 20 de febrero de 2025

Clima: lluvias intermitentes

Personal de obra: (4) trabajadores

Personal interventoria: (1) Residente - (1) Inspector

Nota 52 actividades de obra: se continua con excavacion e instalacion de Bordillo en los costados sur y noroccidental, se continua con relleno en SBG reciclada Jean Reyes
Insp interventoria

Nota 53 Viernes 21 de febrero de 2025

Clima: nublado lluvias intermitentes

Personal de obra: (4) trabajadores

Personal interventoria: (1) residente - (1) Inspector

Nota 54 actividades de obra: se termina la instalacion de bordillo, la interventoria solicita se corrija la linea de estos ya que se observan varios fuera de la misma, se continua con relleno en subbase reciclada Jean Reyes
Insp interventoria

Powered by CamScanner

Nota 55 Sabado 22 de febrero de 2025

Clima: lluvias fuertes en la mañana

Personal de obra: (4) trabajadores

Personal interventoria: (1) residente - (1) inspector

Nota 56 actividades de obra: se inicia con excavacion para pilotines de cerramiento

Nota 57 la interventoria solicita al contratista remitir el detalle de los pilotines que se van a utilizar asi mismo cumpla con los detalles establecidos en el manual del IDRD para este tipo de cerramientos

Jean Reyes
inspe interventoria

Nota 58 lunes 24 de febrero de 2025

clima soleado

Personal de obra: (3) trabajadores

Personal interventoria: (1) residente - (1) inspector

Nota 59 actividades de obra: se continua con rellenos de ~~blog~~ recalada Jean Reyes
inspe interventoria

Norma

Powered by CamScanner

Nota 60 la Interventoria reitera sea corregido el alineamiento de los bordillos en el costado noroccidental Jean Reyes
Insp interventoria

Nota 61 la interventoria solicita al contratista disponga del material necesario como el acero para los pilotines del cerramiento el cual no ha llegado a obra y ya se empezo con excavación para esta actividad Jean Reyes
Insp interventoria

Nota 62 Martes 25 de febrero de 2025
Clima: nublado - lluvias intermitentes
Personal: (3) trabajadores - (1) Inspector
Personal interventoria : (1) Residente - (1) inspector

Nota 63 actividades de obra: se realiza llenos de SBG reciclada y se continua con excavacion para Pilotines en costado sur y noroccidental
Jean Reyes
Insp interventoria

Powered by CamScanner

Nota 64 Miercoles 26 de febrero de 2025
Clima: Nublado
Personal de obra: (4) trabajadores - 1 inspector
Personal interventoria: (1) Residente - (1) inspector

Nota 65 se continua con instalacion de bordillo en costado suroccidental y con excavaciones para pilotines en el costado noroccidental Jean Reyes
insp interven

Nota 66 la interventoria recomiendo al contratista haga llegar el acero para los pilotines ya que la excavacion de estos ya termino y aun no se empieza el armado del acero por falta de mismo Jean Reyes
Insp interventoria

Nota 67 El dia de hoy el contratista realiza la toma de densidades en la primera y segunda capa de la SB6 reciclado obteniendo los siguientes resultados:

Capa 1
costado noroccidental = 80.9 %
costado suroccidental = 80.6 %

Capa 2
Costado suroccidental = 80.3 %
costado noroccidental = 79.8 %

Powered by CamScanner

con los resultados obtenidos no es posible liberar la SB6 ya que se encuentro por debajo del porcentaje de aceptacion se recomiendo por parte de interventoria descarificar el material y recompactar con un equipo mas pesado Jean Reyes
inse interventoria

nota 68 Jueves 27 de febrero de 2025
Clima: nublado
Personal de obra: (3) trabajadores - 1 inspector
Personal de obra: (1) Residente - (1) inspector

nota 69 actividades de obra: se continua con instalacion de bordillo y se corrige el alineamiento en la parte noroccidental Jean Reyes
inse interventoria

nota 70 viernes 28 de febrero de 2025
Clima: soleado - tarde lluvias intermitentes
Personal de obra: (3) trabajadores (1) inspector
Personal interventoria: (1) Residente - (1) inspector

Forma

Powered by CamScanner

Nota 71 actividades de obra: se termina la instalación de bordillo, el dia de hoy llega a la obra el acero para los pilotines y la malla electrosoldada para placa de cerramiento
Jean Reyes
Inse interventoria

Sabado 1 de Marzo de 2025
Clima: nublado
Personal de obra: (2) ayudantes - (1) Inspector
Personal de interventoria: (1) Residente - (1) Inspector

Nota 72 actividades de obra se inicia con figurado de hierro para pilotines Jean Reyes
Inse interventoria

Nota 73 lunes 3 de marzo de 2025
Clima: nublado
Personal de obra: (2) ayudantes - (1) Inspectos
Personal interventoria: (1) Residente - (1) Inspectos

Norma

Powered by CamScanner

Contrato de obra #4060 de 2024

Contratista: Consorcio Belzcon IDRD 1.

Objeto: "Contrato mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD"

Parque: Timiza cod:

Contrato de interventoria # 4080 de 2024

Interventoria: Consorcio Santa Teresa 028

Norma

Powered by CamScanner

818

Nota 1. 31 de enero de 2025, Viernes
Clima: Soleado
Personal obra: 1 Inspector de obra, 1 oficial, 2 ayudantes
Personal interventoria: 1 Residente, 1 Inspector

Actividades: Suministro e instalación de 20 postes de madera, 1 rollo de polisombra para hacer cerramiento en contorno del sendero del lago.
De parte de interventoria se solicita, que allegue el concepto de geotecnia. para realizar actividades.

Santana INSP INTERVENTORIA

Nota 2 01 de febrero de 2025, Sábado
Clima: Soleado
Personal de obra: 1 Inspector de obra, 1 oficial, 2 ayudantes
Personal de interventoria: 1 Residente, 1 Inspector

Actividades: Desmonte y acopio de adoquín existente, Desmonte de baranda, instalación de pancarta informativa "Disculpa las incomodidades"

Norma

Powered by CamScanner

cerramiento y protección de individuos arboreos en zona de sendero del lago.

Santana INSP INTERVENTORIA

Nota 3

3 de febrero de 2025, lunes.

Clima soleado

Personal de obra: 1 oficial, 1 ayudante.

Personal de interventoria: 1 Residente, 1 Inspector

Actividades: Desmonte y acopio de adoquin, desmonte de baranda.

Se recomienda al contratista entregar el informe de geotecnia.

Santana INSP INTERVENTORIA

Nota 4

4 de febrero de 2025, Martes

Clima: Soleado

Personal de obra: 1 oficial, 1 ayudank, 1 Inspector

Personal de interventoria: 1 Residente, 1 Inspector

Actividades: Desmonte y acopio de adoquin y baranda en la zona del sendero de lago.

Norma

Powered by CamScanner

Se recomienda al contratista la entrega del informe de geotecnia.

Santana INSP INTERVENTORIA.

Nota 5 5 de febrero de 2025, Miercoles

Clima: soleado.

Personal de obra: 1 oficial, 1 ayudante

Personal interventoria: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente Ambiental, (1) Residente SST

Actividades: Excavacion y acopio de arena en zona de sendero del lago.

Se reitera al contratista la implementación de medidas de mitigación que se iban a complementar en el parque timiza, se solicito registro fotografico de las mismas, en el frente de obra, se encuentran bordillos en el lago, se solicita que de manera inmediata se implementen las acciones correspondientes.

Santana INSPECTOR TECNICO

Nota 6 6 de febrero de 2025, Jueves

Norma

Powered by CamScanner

Clima soleado
Personal de obra: 1 oficial, 1 ayudante, 1 Inspector
Personal interventoria: 1 Residente, 1 Inspector

Actividades excavacion, trasiego y acopio de arena, retiro de sardineles y RCD del lago, implementanto medidas de mitigacion ambiental, se solicita al contratista al entregar informe de geotecnia Santana INSP INTERVENTORIA

Nota 7. 7 de febrero de 2025, Viernes
clima soleado
Personal de interventoria: 1 Residente 1 Inspecto
Personal de obra: 1 oficial, 1 ayudante, 1 Inspecto

Actividades: Descapote, trasiego y acopio de material vegetal en zona de sendero del lago.
Santana INSP INTERVENTORIA

Nota 8 8 de febrero de 2025, Sábado.
Clima: Soleado
Personal de obra sin personal
Personal de interventoria: 1 Residente, 1 Inspector

Norma

Powered by CamScanner

Se solicita al contratista a realizar las actividades programadas, llevar al personal operativo para realizar dichas actividades.

Santana INSP INTERVENTORIA

Nota 9. 10 de febrero de 2025, Lunes

Clima: soleado

Personal obra: 1 oficial, 1 ayudante, 1 inspector, 1 residente Amb.

Personal interventoria: 1 residente, 1 inspetor.

Actividades: Excavación manual, trasiego, y acopio de material granular en zona sendero lago.

Se solicita al contratista, ~~In~~ tener en cuenta e implementar las medidas de mitigación ambiental, durante toda la ejecución de la obra.

Santana INSP INTERVENTORIA

Nota 10 11 febrero de 2025, Martes.

Clima soleado

Personal de obra: 1 oficial, 1 residente, 1 Inspector

Personal de interventoria: 1 Residente, 1 Inspetor

Norma

Powered by CamScanner

Actividades: Excavación manual, trasiego y acopio de material granular.

Santana INSP INTERVENTORIA

Nota 11 12 de febrero de 2025, Miercoles

Clima soleado

Personal obra: Sin personal

Personal interventoria: 1 Residente ~~obrero~~, 1 Inspector

Actividades: No se realizan actividades de obra, se solicita al contratista que lleve personal operativo para no parar actividades, se recuerda que tiene material granular descubierto, en caso de lluvias o deterioro del mismo, el contratista se hara responsable de las consecuencias.

Santana INSP INTERVENTORIA

Nota 12 13 de febrero de 2025, Jueves

Personal de obra: Sin personal

Personal de interventoria: (1) Residente, (1) Inspector.

Clima: Soleado., lluvia moderada en la tarde.

Powered by CamScanner

Actividades: No se realizan actividades de obra.
Se le solicita al contratista que lleve personal operativo, para no suspender los trabajos ya que tienen material granular expuesto sin cubrir, lo que puede presentar un deterioro del mismo, el contratista se hará responsable de las consecuencias en tal caso que el material se deñe.
Se reitera al contratista para que entregue el informe de parte del especialista de geotecnia, donde se establezca el proceso constructivo a realizar, esto con el fin de revisarlo, según compromiso de comites de seguimiento anteriores y comite del 12/02/2025.

Santana INSPECTOR INTERVENTORIA

Nota 13 14 de febrero de 2025, Viernes
Personal de obra: Sin Personal
Personal interventoria: 1 Residente, 1 inspector
Clima: Soleado
Actividades: Sin actividades de obra
Se le solicita al contratista que lleve personal operativo, para no parar actividades de obra

Norma

Powered by CamScanner

ya que realizaron levantamiento de adoquin existente y dejaron expuesto material granular, que se puede deteriorar, si esto pasa será responsabilidad del contratista de obra
Se reitera al contratista entregar informe de parte del especialista de geotecnica, donde se establezca el proceso constructivo a realizar, para poder revisarlo de parte de interventoria, esto según compromisos de comite de seguimento anteriores.

Santana
INSP INTERVENTORIA

Nota 14 | 15 de febrero de 2025, sabado
Personal de obra: sin personal
Personal de interventoria: 1 Residente, 1 Inspector
Clima Soleado
Actividades de obra: Sin actividades de obra,
Se le solicita al contratista que lleve personal operativo para continuar con las actividades de obra, ya que realizaron levantamiento de adoquin existente y lo dejaron expuesto el material granular, el cual se puede deterio

Norma

Powered by CamScanner

rar, si esto pasa será responsabilidad del contratista de obra.

Se reitera al contratista entregar informe de parte del especialista de geotecnia, donde se establezca el proceso constructivo a realizar para poder revisarlo de parte de interventoría esto según compromisos de comité de seguimiento anteriores.

Santiago INGE INTERVENTORIA

Nota 15 17 de febrero de 2025, lunes

Personal de obra: Sin personal

Personal de interventoría: 1 Residente, 1 Inspector

clima: soleado

Actividades de obra: Sin actividades de obra se le solicita al contratista que lleve personal operativo para continuar con las actividades de obra, ya que realizaron levantamiento de adoquín y dejaron expuesto material granular, el cual se puede deteriorar si esto pasa será responsabilidad del contratista de obra.

Se reitera al contratista entregar informe

Norma

Powered by CamScanner

de parte del especialista de geotecnia, donde se establezca el proceso constructivo a realizar para poder revisarlo de parte de interventoría, esto según compromiso adquirido en comites de seguimento pasados. Interventoría Santana INSP INTERVENTOR

Nota 16 18 de febrero de 2025, Martes

Personal de obra: sin Personal

Personal de interventoria: 1 Residente, 1 Inspector

Clima: Soleado

Actividades: Sin actividades de obra.

Se le solicita al contratista que lleve personal operativo para continuar con las actividades de obra; ya que se realizaron levantamento de adoquin existentes y dejaron expuesto material granular, el cual se puede deteriorar, si esto pasa será responsabilidad del contratista de obra.

Se reitera al contratista que entregue informe de parte del especialista de geotecnia, donde se establezca el proceso constructivo a realizar para poder revisarlo de parte

Norma

Powered by CamScanner

de interventoria, esto según compromiso adquirido en comites de seguimiento anteriores

Santana
INSP INTERVENTORIA

Nota 12 | 19 de febrero de 2025, Miércoles

Personal de obra: Sin personal

Personal de interventoria: 1 Residente, 1 Inspector

Clima: Soleado

Actividades: Sin actividades de obra

Se solicita al contratista que lleve, personal operativo para continuar con las actividades de obra, ya que se realizaron levantamiento de adoquin existente y dejaron material expuesto, el cual se puede deteriorar, si esto pasa será responsabilidad del contratista de obra.

se refiera al contratista de obra que entregue el informe de parte del especialista de geotecnia donde se establece el proceso constructivo, esto es compromiso de comites anteriores

Santana
INSP. INTERVENTORIA

Norma

Powered by CamScanner

Nota 18 20 de Febrero de 2025, Jueves
Personal de obra: Sin Personal
Personal de interventoria: 1 Residente, 1 Inspector
Clima: Soleado
Actividades sin actividades de obra, se solicita al contratista que lleve personal operativo para continuar con las actividades de obra, ya que se realizo levantamento de adoquin existente y dejaron material expuesto, el cual se puede deteriorar si esto pasa sera responsabilidad del contratista de obra.
Se reitera al contratista que entregue informe de parte del especialista de geotecnia donde se establece el proceso constructivo, esto es compromiso de comites anteriores

Antonio Insp Interventoria

Nota 19 21 de Febrero de 2025, Viernes
Personal de obra: Sin personal
Personal de interventoria: 1 Residente, 1 Inspector
Clima: Soleado

Norma

Powered by CamScanner

Actividades: sin actividades de obra, se solicita al contratista llevar personal operativo, para continuar con las actividades de obra, ya que se realizo levantamiento de adoquin existente y dejaran material granular expuesto, el cual será responsabilidad del contratista de obra.
Se reitera al contratista que entregue informe de geotecnia donde se establece el proceso constructivo, esto es compromiso de comites anteriores.

Santana Inp Interventoria

Nota 19 22 de febrero de 2025, sábado
Personal de obra: sin personal
Personal de interventoria: (1) Residente, (1) Inspector
Clima: Soleado
Actividades: sin actividades de obra, se solicita al contratista llevar personal operativo, para continuar con las actividades de obra, ya que se realizo levantamiento de adoquin existente, y dejaran material granular expuesto, el cual se puede

Norma

Powered by CamScanner

deberer y serd responsabilidad del contratista.
se le solicita de manera reiterada al contratista que entregue el informe de geotechica con el procedimento constructivo esto es compromiso de comites anteriores

Santana
INSP INTERVENTORIA

Nota 20 24 de febrero de 2025, lunes
Personal de obra : sin Personal
Personal de interventora : 1 Residente, 1 Inspector
Clima: Soleado
Actividades: sin actividades de obra
Se solicita al contratsta que lleve personal operativo para continuar con las actividades de obra, ya que realizaron levantamiento de adoquin existente y dejaron expuesto material granular, que se puede deteriorar y ser responsabilidad del contratista.
se lo solicita al contratista de manera reiterado que entregue el informe de geotecnia con el procedimiento constructivo

Norma

Powered by CamScanner

esto es compromiso de comites anteri
ores

INSP INTERVENTORIA

Santana

Nota 21 25 de febrero de 2025 Martes

Personal de obra: Sin Personal

Personal de interventoria: 1 Residente, 1 Inspector

Clima: soleado

Actividades Sin actividades de obra

Se solicita al contratista que lleve personal operativo para continuar con las actividades de obra, ya que realizaron levantamiento de adoquin existente y dejaron expuesto material granular, que se puede deteriorar y será responsalidad del contratista.

Se le solicita al contratista de manera reiterada que entregue el informe de geotecnia con el procedimento constructivo

Santana INSP INTERVENTORIA

Nota 22 Miercoles 26 Febrero 2025

Personal obra: Sin Personal

I.

Norma

Powered by CamScanner

Personal interventoría : Sin Personal

Clima: Mañana y tarde nubladas

Actividades : No se realizan actividades.

INSP INTERVENTORIA Santana

Nota

Nota 23 Jueves 27 Febrero 2025

Personal Obra : Un (1) inspector , un (1) oficial y un (1) ayudante

Clima : Mañana nublada y tarde lluviosa

Actividades : Se realiza ajuste y mantenimiento en cerramiento provisional ; Protección de material granular suelto.

INSP INTERVENTORIA Santana

Nota 24 Viernes 28 Febrero 2025

Personal Obra: Sin Personal

Personal interventoría : Sin Personal

Clima : Mañana y tarde nubladas

Actividades : No se realizan actividades; Contratista se encuentra realizando diseño y Propuesta de actividades a realizar en el sendero las cuales se emitiran a interventoría y la entidad para su revisión y aprobación.

Nota 26

INSP INTERVENTORIA Santana

Powered by CamScanner

Contrato de obra # 4060 de 2024

Contratista: Consorcio Belzcon IDRD 1

Objeto: "Contrato mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD"

Parque: Patio Bonito Cod

Contrato de interventoría # 4080 de 2024

Interventoría: Consorcio Santa Teresa 028
Arq. Ronald Lozoro: [signature]

Powered by CamScanner

Nota 32: Se realizan actividades de resane en pasamuros y escaleras en contorno de tubería instalada para inyectores de piscinas ; Orden y aseo.

Ronald Bono. Santana

Nota 33: La interventoria observando el avance de las obras requiere y recomienda nuevamente al contratista inicial con las actividades de amboquillado de las piscinas y sus respectivas islas, se requiere iniciar con la impermeabilización del tanque de almacenamiento, igualmente retiro escombros.

Ronald Bono. Santana

01-02-25 **Nota 34**: Sábado 01 de Febrero 2025
Clima: Soleado
Personal Obra: Un (1) inspector y dos(2) oficiales
Personal interventoría: Un (1) Inspector.

INSP INTERVENTORIA Santana

Nota 35: Se realizan actividades de resane en contorno de inyectores ; Franjas en granito blanco lavado en zona de escaleras; Orden y aseo.

INSP INTERVENTORIA Santana

Powered by CamScanner

02-02-25 **Nota 36**: Domingo 02 Febrero 2025
Clima: Soleado
No se realizan actividades

INSP INTERVENTORIA Santana

03-02-25 **Nota 37**: Lunes 03 Febrero 2025
Clima: Mañana y tarde soleadas
Personal obra: Un(1) inspector y dos (2) oficiales
Personal interventoría: Un(1) residente

INSP INTERVENTORIA Santana

Nota 38: Se continuan actividades de franjas en granito blanco lavado en zona de escaleras piscina grande; Corte con pulidora y demolición de enchape de muros en contorno de inyectores de piscinas.

INSP INTERVENTORIA Santana

04-02-25 **Nota 39**: Martes 04 Febrero de 2025
Clima: soleado.
La interventoria observa con preocupacion la ausencia de personal para intervenir los daños priorizados, la interventoria requiere ingrese personal y material de obra para culminar la instalacion de los inyectores

Norma

Powered by CamScanner

impermeabilización del tanque, enboquillado de piscinas.

Ronald Bravo

05-02-25 **Nota 40**: Miercoles 05 Febrero 2025

Clima: Soleado

No se ejecutan actividades en el parque, se está a la espera de suministro de material enchape de muros y boquilla

INSP INTERVENTORIA Santana

06-02-25 **Nota 41**: Jueves 06 Febrero 2025

Clima: Soleado

Personal de obra: No hay

Personal de interventoria: (1) Residente, (1) Inspector

Actividades: No se realizan actividades se esta a la espera de suministro de material de enchape de muros y boquilla se solicita al contratista que lleve personal operativo para terminar las actividades de los inyectores, emboquillar la piscina, labores del tanque,

INSP INTERVENTORIA RESIDENTE INTERVENTORIA

Norma

Powered by CamScanner

Nota 42

17-02-25 Viernes 07 de febrero de 2025

Clima: Soleado

Personal obra: No hay

Personal interventoria: (1) Residente, (1) Inspector

Actividades No se realizan actividades de obra se esta a la espera de suministro de material de enchape de muros y boquilla se solicita al contratista que lleve personal operativo para terminar las actividades de los inyectores, emboquillar piscina, lafres de impermeabilizacion de tanque

Insp Interventoria

18-02-25 Nota 43, Sabado 08 de febrero de 2025

Clima: Soleado

Personal de obra: Sin personal

Personal de interventoria: (1) Residente (1) Inspector

Actividades: No se realizan actividades de obra, se esta a la espera de suministro de material de enchape.

Se solicita al contratista que lleve personal operativo para terminar las actividades de los inyectores, emboquillar la piscina, la

Norma

Powered by CamScanner

impermeabilizacion del tanque. INSP. INTERVENTORIA

Santana

10-02-2025 Nota 44 Lunes 10 de febrero de 2025
Clima: Soleado
Personal obra: Sin personal de obra
Personal interventoria: (1) Residente, (1) Inspector
Actividades: No se realizan actividades de obra, se esta a la espera de suministro de material refiere el contratista.
Se solicita al contratista que lleve personal operativo para terminar las actividades de los inyectores, emboquillar la piscina y la impermeabilizacion del tanque.

INSP INTERVENTORA

Santana

11-02-2025 Nota 45, martes 11 de febrero de 2025
Clima: Soleado
Personal de obra: Sin personal de obra
Personal de interventoria: 1 Residente, 1 Inspector
Actividades: No se realizan actividades de obra, se esta a la espera de suministro de material refiere el contratu

Norma

Powered by CamScanner

fa.
se solicita al contratista que lleve personal operativo para terminar las actividades de los inyectores, emboquillar la piscina y la impermeabilización del tanque.

Santana INSP INTERVENTORIA

12-02-25 Nota 46, miercoles 12 de febrero de 2025
Clima: Soleado
Personal de obra: Sin personal de obra
Personal de interventoria: 1 Residente, 1 Inspector
Actividades: No se realizan actividades de obra, se esta a la espera de suministro de material refiere el contratista.
Se solicita al contratista que lleve personal operativo para terminar las actividades de los inyectores, emboquillar la piscina y la impermeabilizacion del tanque.

Santana INSP INTERVENTORIA

13-02-25 Nota 47, Jueves,
Clima: soleado
Personal de obra: Sinpersonal de obra
Personal de interventoria: 1 Residente, 1 Inspector
Actividades: No se realizan actividades de

Norma

Powered by CamScanner

de obra.
Se solicita al contratista que lleve personal operativo para terminar actividades de los inyectores, emboquillar la piscina, y la impermeabilización del tanque.

INSP INTERVENTORIA

Santana

14-02-2025 Nota 48, Viernes
Clima: Soleado
Personal de Obra: Sin personal de obra
Personal de interventoria: 1 Residente, 1 Inspector
Actividades: Sin actividades de obra.
Se solicita al contratista que lleve personal operativo para terminar las actividades de los inyectores, emboquillar la piscina y la impermeabilización del tanque

Santana

INSP INTERVENTORIA

15-02-2025 Nota 49, sábado
Clima: Soleado
Personal de obra: Sin personal de Obra
Personal de interventoría: 1 Residente, 1 Inspector

Norma

Powered by CamScanner

Actividades: Sin actividades de obra.
se solicita al contratista que lleve personal operativo para terminar las actividades de los inspectores, emboquillar la pisana, y la impermeabilizacion del tanque.

Santana, Mauricio INSP INTERVENTORIA

7-02-25 Nota 50, Lunes
Clima: soleado
Personal de obra: Sin personal
Personal de interventoria: 1 Residente, 1 Inspector
Actividades de obra: Sin personal de obra, se solicita al contratista que lleve personal operativo para terminar las actividades de los inspectores, emboquillar la pisana y la impermeabilizacion del tanque.

Santana, Mauricio INSP INTERVENTORIA

8-02-25 Nota 51, Martes
Personal de obra: Sin personal
Personal de interventoria: 1 Residente, 1 Inspector
Actividades de obra: sin personal de obra
Clima: soleada.
Actividades: Sin actividades, sin personal

Norma

Powered by CamScanner

Se solicita al contratista que lleve personal operativo para terminar actividades de los inyectores, emboquillar la pisana y la impermeabilización del tanque.

Santana INSP INTERVENTORIA

19-02-2025 Nota 52, Miercoles

Clima: Soleado

Personal de obra: Sin personal

Personal de interventoria: 1 Residente, 1 Inspector

Actividades: Sin actividades

se solicita al contratistas que lleve personal operativo para terminar actividades de los inyectores, emboquillar la pisana y la impermeabilizacin del tanque

Santana INSP INTERVENTORIA

20-02-2025 Nota 53, Jueves

Clima: Soleado

Personal de obra: Sin personal

Personal de interventoria: 1 Residente, 1 Inspector

Actividades: Sin actividades, sin personal

Se solicita al contratista que lleve

Norma

Powered by CamScanner

personal operativo para terminar actividades de los inyectores, emboquillar la pisana y la impermeabilización del tanque

INSP INTERVENTORIA

Santana

4-02-25 Nota 54, Viernes

Clima: Soleado

Personal obra: Sin personal

Personal interventoria: 1 Residente, 1 inspector

Clima: Soleado

Actividades: Sin actividades.

Se solicita al contratista que lleve personal operativo para terminar actividades de los inyectores emboquillar la pisana y la impermeabilización del tanque

INSP INTERVENTORIA

Santana

22-02-25 Nota 55, Sábado

Clima: Soleado

Personal obra: Sin personal

Personal interventoria: 1 Residente, 1 Inspector

Clima: Soleado

Actividades: Sin actividades

Se solicita al contratista que lleve personal

Norma

Powered by CamScanner

operativo para terminar las actividades de los inyectores, emboquillar la piscina y la impemeabilizacion del tanque

Santana
INSP INTERVENTORIA

24-02-25 Nota 56, Lunes.
Clima Soleado
Personal obra: Sin personal
Personal interventoria: 1 Residente, 1 Inspector
Actividades: Sin actividades de obra
Se solicita al contratista que lleve personal operativo para terminar las actividades de inyectores, emboquillar la piscina y la impemeabilizacion del tanque

INSP INTERVENTORIA
Santana

-5-02-25 Nota 57, Martes
Clima: Soleado
Personal obra: Sin personal
Personal interventoria; 1 Residente, 1 Inspector
Actividades: Sin actividades de obra
Se solicita al contratista que lleve

Norma

personal oper
actividades de
piscina y l

26-02-25 **Nota 58**: Miérc
Clima: Mañana
Personal obra: S
Personal intervento
Actividades: N

INSP. INTERVENTOR

27-02-25 **Nota 59**: Juev
Clima: Mañana
Personal obra: L
Personal intervento
Actividades: Se
en muros de pisc

28-02-25 **Nota 60**: Vierr
Clima: Mañana y tc
Personal obra: L
Persona' interventi

Powered by CamScanner

personal operativo para terminar las actividades de los inyectores, emboquillar la piscina y la impermeabilización del tanque

Santana INSP INTERVENTORIA

26-02-25 **Nota 58**: Miércoles 26 Febrero 2025

Clima: Mañana nublada y tarde lluviosa

Personal obra: Sin personal

Personal interventoría: Sin personal

Actividades: No se realizan actividades.

INSP. INTERVENTORIA Santana Santana

27-02-25 **Nota 59**: Jueves 27 Febrero 2025

Clima: Mañana y tarde nubladas

Personal obra: Un (1) inspector, tres (3) oficiales

Personal interventoría: Un (1) inspector

Actividades: Se realiza retiro de boquilla existente en muros de piscina grande con uso de pulidora.

INSP INTERVENTORIA Santana

28-02-25 **Nota 60**: Viernes 28 Febrero 2025

Clima: Mañana y tarde soleadas

Personal obra: Un (1) inspector y tres (3) oficiales

Persona' interventoría: Un (1) inspector

Norma

Powered by CamScanner

Actividades: Se realiza retiro de boquilla en enchape de piso y muros de piscina grande con uso de pulidora; orden y aseo.

INSP INTERVENTORIA Santana

01-03-25 **Nota 61**: Sábado 01 Marzo 2025

Clima: Mañana soleada

24

Personal Obra: Sin personal

Personal interventoría: Sin personal

Actividades: No se realizan actividades

INSP INTERVENTORIA Santana

02-03-25 **Nota 62**: Domingo 02 Marzo 2025

No se realizan actividades

INSP INTERVENTORIA Santana

03-03-25 **Nota 63**: Lunes 03 Marzo 2025

Clima: Mañana nublada y tarde lluviosa

Personal obra: Un(1) inspector y tres (3) oficiales

Personal interventoría: Un(1) inspector

2

Actividades: Se realiza retiro de boquilla existente con pulidora en enchape de piso piscina grande.

INSP Interventoría Santana

Powered by CamScanner

ANEXO 4
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	Codigo	FO-MC-01
		Versión	01
		Fecha	30/11/2024

PROYECTO: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD"
GRUPO 2. "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA	FUENTE
N/E	NTC ISO 9001	2015	23/09/2015	ICONTEC
N/E	CONTROL DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA	10	N/E	IDRD
N/E	ACTA DE COMITÉ REUNIÓN	2	N/E	IDRD
N/E	INVENTARIO DE ELEMENTOS EXISTENTES	2	N/E	IDRD
N/E	ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO	1	N/E	IDRD
N/E	FORMATO DE CUANTIFICACION	1	N/E	IDRD
N/E	REGISTRO Y CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME	1	N/E	IDRD
N/E	FORMATO ACTA RECIBO PARCIAL	61	N/E	IDRD
N/E	ACTA_DE_APROBACION_ACTIVIDADES_NO_PREVISTAS_	81	N/E	IDRD
N/E	LISTA DE CHEQUEO ALMACENAMIENTO EN OBRA	1	N/E	IDRD
N/E	ACTA_DE_CANTIDADES_DE_OBRA_	V2	N/E	IDRD
N/E	ACTA_DE_INICIO_DEL_CONTRATO_v82	V82	N/E	IDRD
N/E	ACTA_DE_REUNIN-COMUNIDAD_v2	V2	N/E	IDRD
N/E	LISTADOASISTENCIAEQUIPOSOCIAL_V1	V1	N/E	IDRD
N/E	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO	V40	N/E	IDRD
N/E	ACTA VECINDAD	1	N/E	IDRD
N/E	ACTA_DE_CIERRE_DE_LA_INVERSIN_DEL_ANTICIPO_v2	V2	N/E	IDRD
N/E	ACTA_DE_CIERRE_DEL_EXPEDIENTE_CONTRACTUAL_v4	V40	N/E	IDRD
N/E	ACTA_ENTREGA_PARA_PUESTA_EN_SERVICIO_V1	V1	N/E	IDRD
N/E	CONTRATO 4060 DE 2024	N/E	9/09/2024	IDRD
N/E	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES	N/E	N/E	IDRD
N/E	ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1	9/09/2024	IDRD
N/E	PRESUPUESTO	5	22/02/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 0
N/E	PROGRAMA DE OBRA	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
N/E	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
N/E	PLAN DE GESTION DE RCD	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
N/E	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
N/E	SG-SST	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
PL-GES-01	PLAN DE CALIDAD	02	12/01/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
PL-GCO-01	PLAN DE ADQUISICIONES	01	29/11/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
FO-GC-01	CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
FO-GC-02	CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
MT - GES-01	MATRIZ LEGAL	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
MT - GES-02	MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
MT- GCM -01	MATRIZ DE PRESERVACIÓN DE MATERIALES	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
MT-MC-01	MATRIZ DE SALIDAS NO CONFORMES	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1

850

	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	Codigo	FO-MC-01
		Versión	01
		Fecha	30/11/2024

PROYECTO: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD"
GRUPO 2. "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA	FUENTE
MT-GT-01	METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
MT-GT-02	MODIFICACIONES, AJUSTES Y COMPLEMENTOS A LOS DISEÑOS "MATRIZ DE CONTROL DE CAMBIOS"	01	12/01/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 2
PR-MC-02	PROCEDIMIENTO TRATAMIENTO DE LAS SALIDAS NO CONFORMES	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
PR-MC-03	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
PL-GT-01	PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS	02	12/01/2025	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
PL-GT-02	SEGUIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS	01	29/11/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
PR-GCM-01	PROCEDIMIENTO DE COMPRAS "PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS CONTRATADOS EXTERNAMENTE"	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
FO-GCM-01	ORDEN DE PEDIDO	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
FO-GCM-03	TRAZABILIDAD Y UBICACIÓN DE MATERIALES	01	29/11/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
FO-GCM-04	CONTROL DE MATERIALES	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 2
FO-MC-01	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
FO-MC-02	ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAMIENTO	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
FO-MC-03	PROGRAMACIÓN DE AUDITORIAS	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
FO-MC-04	PLAN DE AUDITORIA	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
FO-MC-05	INFORME DE AUDITORÍA	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
FO-MC-06	CALIFICACIÓN DE AUDITORES	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
FO-GES-01	SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 2
FO-MC-01	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
MT-MC-02	SEGUIMIENTO A LAS SALIDAS NO CONFORMES DEL CONTRATISTA EJECUTOR	01	23/12/2024	CONSORCIO BELZCON IDRD 1

Nota: CONSORCIO BELZCON IDRD 1 UTILIZA LOS FORMATOS DISPUESTOS POR EL IDRD APLICABLES AL PROYECTO

851

ANEXO 5

PLAN ADQUISICIONES

	PLAN DE ADQUISICIONES	Código:	PL-GCO-01
		Versión:	01
		Fecha:	29/11/2024

OBJETO: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 2 - PARQUES

CONTRATISTA: CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO: 4060 DE 2024

PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO
	PARQUES EN INTERVENTORIA PRIMERA ETAPA														
1	NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO	01-031	Vecinal	6	PARQUE NACIONAL	03-035	Zonal	11	EL PORVENIR	07-391	Zonal	16	MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO	16-099	Metropolitano
2	URBANIZACION EL TOBERIN	01-079	Vecinal	7	URBANIZACION MIRAVALLE	05-042	Zonal	12	VILLEMAR	09-013	Zonal	17	EL JAZMIN	16-204	Vecinal
3	DESARROLLO VERBENAL II SECTOR	01-110	Vecinal	8	CIUDADELA NUEVO USME	05-459	Vecinal	13	PLANTA DE TRATAMIENTO SALITRE	10-531	Zonal	18	PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS)	16-416	Vecinal
4	URB CALLE 170	10-540	Vecinal	9	CIUDAD NUEVO MILENIO	05-476	Zonal	14	ALCAZARES	12-015	Escenario Deportivo	19	DESARROLLO PALERMO SUR	18-035	Metropolitano
5	EL COUNTRY	01-1003	Zonal	10	GRAN COLOMBIANO	07-049	Zonal	15	EL RENACIMIENTO	14-036	Metropolitano	20	PUAOS JORGE E.CABALIER	18-090	Zonal

ITEM	PRODUCTO O SERVICIO A ADQUIRIR	UND	CANT	FRENTE DONDE SE USARA	Proceso de cotización y selección proveedor	Proveedor seleccionado	Legalizacion contrato, orden de servicio u orden de compra	Fecha programada de llegada a obra	Fecha de llegada a obra	Cumple SI/NO	OBSERVACIONES			
											nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
1.0	PRELIMINARES													
1.1	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	ml	600	NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO-URBANIZACION EL TOBERIN-DESARROLLO VERBENAL II SECTOR-JUB CALLE 170-EL COUNTRY-PARQUE NACIONAL-URBANIZACION MIRAVALLE -CIUDADELA NUEVO USME-CIUDAD NUEVO MILENIO-GRAN COLOMBIANO-EL PORVENIR-VILLEMAR-PLANTA DE TRATAMIENTO SALITRE -ALCAZARES-EL RENACIMIENTO-MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO-EL JAZMIN-PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS) -DESARROLLO PALERMO SUR-PUAOS JORGE E CABALIER	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	HOMECENTER	ORDEN DE SERVICIO	ENERO	21/01/2025	NA	NA	NA	CM 005	NA
2.0	ADOBRADOS													
2.1	Relleno Recebo Subbase granular (Compactrama)**	m3	120	EL RENACIMIENTO-ALCAZARES-PLANTA DE TRATAMIENTO SALITRE -EL PORVENIR-PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	FORZA	ORDEN DE SERVICIO	ENERO	22/01/2025	NA	NA	NA	Llegaron 2,00 MS el 22/01/2025.	NA
	a. mm	e	41	PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	DROMOS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO	22/01/2025	NA	NA	NA	op 34 del 27 de enero de 2025, se compraron 41 m3	NA
					REUNION DE COMPRAS SEMANAL	FORZA	ORDEN DE SERVICIO	NOVIEMBRE,DICIEMBRE	29/11/2024 y 17/12/2024	NA	op 5 de 28 de noviembre de 2024 compra de 37 m3	op 18 17/12/2024, se compraron 22 m3	NA	NA
	B-400	m3		PLANTA EL SALITRE - PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	DROMOS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO,FEBRERO	27/01/2025 y 25/02/2025	NA	NA	NA	op 34 del 27 de enero de 2025, se compraron 19 m3	op 24 20/02/2025, se compraron 60 m3
2.2	Geotextil T-2400 Suministro e instalacion	m2	200	EL RENACIMIENTO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SURTIMAYORISTA	ORDEN DE SERVICIO	NOVIEMBRE	29/11/2024	NA	OP 06 DE 29 de nov de 2024	NA	NA	NA
	Geotextil T-2100 Suministro e instalacion	m2		PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ALIATUBOS	ORDEN DE SERVICIO	NOVIEMBRE A ENERO	2/12/2024	NA	OP 06 DE 29 de nov de 2024, se compra 1 rollo	NA	OP 47 27/01/2025, se compra 1 rollo de geotextil tejigo T2100 X418 mts	NA
2.3	ARENA PELDAR (Sumin+Instal.) Para Playa	m3	220	Country, Ciudad Hunza	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	FORZA	ORDEN DE SERVICIO	MARZO	29/03/2025	NA	NA	NA	NA	NA
	ARENA DE PEÑA	m3		PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	FERREDEPOSITO GYG SAS	ORDEN DE SERVICIO	DICIEMBRE Y ENERO	24/12/2024 - 27/12/2024	NA	NA	op 25 25/12/2024, se compraron 5 m3 El 24/12/2024 llegó 1 m3. El 27/12/2024 llegó 5 m3	El 09/01/2025 llegaron 1m3, 17/01/2025 llegaron 5 m3 y el 23/01/2025 3 m3	NA
2.4	Geotextil NT-1600** - Suministro e instalacion	m2	150	EL RENACIMIENTO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SURTIMAYORISTA	ORDEN DE SERVICIO	ABRIL	19/4/2025	NA	NA	NA	NA	NA
2.5	Capa Filtrante en Triturado 3/4"-1" + Compacion	m3	110	EL RENACIMIENTO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SURTIMAYORISTA	ORDEN DE SERVICIO	ABRIL	19/4/2025	NA	NA	NA	NA	NA
2.6	Filtro geodren planar tubería 100 mm h=1.0 **	ml	80	EL RENACIMIENTO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SURTIMAYORISTA	ORDEN DE SERVICIO	ABRIL	19/4/2025	NA	NA	NA	NA	NA
2.7	RELLENO EN RAJON SUM+INST	m3	65	PTAR SALITRE	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	FORZA	ORDEN DE SERVICIO	DICIEMBRE	24/12/2024	NA	NA	Op 024 del 24/12/2024 llegó 34 m3	NA	NA
3.0	CONCRETOS													
3.1	concreto de 3000 psi	m3	15	PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	CEMENTOS DEL ORIENTE	ORDEN DE SERVICIO	NOVIEMBRE A FEBRERO	07/11/2024 y 27/01/2025	NA	op 07 de 29 de nov de 2024	NA	op 37 del 27/01/2025, se compraron 24 m3	NA
	Cemento gris x 50 kg	Und	50	PARQUE PRGRADOS	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	HOMECENTER	ORDEN DE SERVICIO	NOVIEMBRE	29/11/2024	NA	op 01 de 20 de nov de 2024, se compran 50 bultos	NA	NA	NA
			20	PARQUE NACIONAL		FERREDEPOSITO GYG SAS		DICIEMBRE	26/12/2024	NA	NA	op 25 de 26/12/2024, se compraron 20 bultos	NA	NA
				PARQUES CEDRITOS, TOBERIN, VERBENAL, 170		EASY		NOVIEMBRE A ENERO	30/01/2025	NA	op 03 25/11/2024, se compraron 20 bultos (Argos)	op 11 4/12/2024, se compraron 40 bultos (Argos)	op 46 30/01/2025, se compraron 14 bultos	NA
	Mixto	m3		PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	FERREDEPOSITO GYG SAS	ORDEN DE SERVICIO	DICIEMBRE	4/12/2024	NA	NA	op 12 del 4/12/2024 se compran 5 m3	NA	NA
				PARQUE NACIONAL				DICIEMBRE	12/12/2024	NA	NA	op 15 del 12/12/2024 se compran 3 m3	NA	NA
				PARQUES CEDRITOS, TOBERIN, VERBENAL, 170		EASY		ENERO	30/01/2025	NA	NA	NA	op 46 del 30/01/2025 se compran 50 bultos (de 40 kg	NA
4.0	ACEROS													
4.1	malla electrosoldada 4 mm 20*20	m2	150	EL RENACIMIENTO-PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	EASY	ORDEN DE SERVICIO	DICIEMBRE	2/12/2024	NA	NA	Op 09 Se compran 12 und el 02/12/2024	NA	NA
4.1				PARQUE NACIONAL, ENRIQUE OLAYA HERRERA	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ALIATUBOS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO	21/01/2025	NA	NA	NA	OP 47 27/01/2025, se compra 6 mallas	NA
5.0	SEÑALIZACION													
5.1	SEÑAL IDG-S 1 CARA	UND	50	NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO-URBANIZACION EL TOBERIN-DESARROLLO VERBENAL II SECTOR-JUB CALLE 170-EL COUNTRY-PARQUE NACIONAL-URBANIZACION MIRAVALLE -CIUDADELA NUEVO USME-CIUDAD NUEVO MILENIO-GRAN COLOMBIANO-EL PORVENIR-VILLEMAR-PLANTA DE TRATAMIENTO SALITRE -ALCAZARES-EL RENACIMIENTO-MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO-EL JAZMIN-PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS) -DESARROLLO PALERMO SUR-PUAOS JORGE E CABALIER	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	METALICAS Y ESTRUCTURAS SAS	ORDEN DE SERVICIO	MARZO,ABRIL	SIN DEFINIR	NA	NA	NA	NA	NA
5.2	SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm^2 caras (Sum + inst)	UND	35	NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO-URBANIZACION EL TOBERIN-DESARROLLO VERBENAL II SECTOR-JUB CALLE 170-EL COUNTRY-PARQUE NACIONAL-URBANIZACION MIRAVALLE -CIUDADELA NUEVO USME-CIUDAD NUEVO MILENIO-GRAN COLOMBIANO-EL PORVENIR-VILLEMAR-PLANTA DE TRATAMIENTO SALITRE -ALCAZARES-EL RENACIMIENTO-MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO-EL JAZMIN-PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS) -DESARROLLO PALERMO SUR-PUAOS JORGE E CABALIER	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	METALICAS Y ESTRUCTURAS SAS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO	31/01/2025	NA	LLEGARON EN ENERO A OBRA PARQUES CEDRITOS, TOBERIN, VERBENAL, CALLE 170, SERVITA, FLORENCIA	NA	NA	NA
5.3	SEÑAL SC-120 2 CARAS	UND	40	NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO-URBANIZACION EL TOBERIN-DESARROLLO VERBENAL II SECTOR-JUB CALLE 170-EL COUNTRY-PARQUE NACIONAL-URBANIZACION MIRAVALLE -CIUDADELA NUEVO USME-CIUDAD NUEVO MILENIO-GRAN COLOMBIANO-EL PORVENIR-VILLEMAR-PLANTA DE TRATAMIENTO SALITRE -ALCAZARES-EL RENACIMIENTO-MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO-EL JAZMIN-PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS) -DESARROLLO PALERMO SUR-PUAOS JORGE E CABALIER	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	METALICAS Y ESTRUCTURAS SAS	ORDEN DE SERVICIO	NOVIEMBRE-DICIEMBRE	31/01/2025	NA	Llegaron Señales SC 120	NA	NA	NA

CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO	4060 DE 2024

PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	
5.4	SEÑAL SC-80 2 CARA				UND	40	NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO- URBANIZACION EL TOBERIN-DESARROLLO VEREDAL II SECTOR-JRB CALLE 170-EL COUNTRY-PARQUE NACIONAL-URBANIZACION-MIRAVALLE -CIUDADELA NUEVO USME-CIUDAD NUEVO MILENIO-GRAN COLOMBIA-MOL. PORVENIR-VILLEMAR-PLANTA DE TRATAMIENTO SALITRE -ALCAZARES-EL RENACIMIENTO-ABLENTA TEJAR SAN EUSEBIO-EL JAZMIN-PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS) -DESARROLLO PALERMO SUMUPLIOS JORGE E CABALIER	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	METALICAS Y ESTRUCTURAS SAS	ORDEN DE SERVICIO	MARZO, ABRIL	SIN DEFINIR	NA	NA	NA	NA	NA
5.5	Señal Informativa 1 Cara				UND	25	NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO- URBANIZACION EL TOBERIN-DESARROLLO VEREDAL II SECTOR-JRB CALLE 170-EL COUNTRY-PARQUE NACIONAL-URBANIZACION-MIRAVALLE -CIUDADELA NUEVO USME-CIUDAD NUEVO MILENIO-GRAN COLOMBIA-MOL. PORVENIR-VILLEMAR-PLANTA DE TRATAMIENTO SALITRE -ALCAZARES-EL RENACIMIENTO-ABLENTA TEJAR SAN EUSEBIO-EL JAZMIN-PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS) -DESARROLLO PALERMO SUMUPLIOS JORGE E CABALIER	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	METALICAS Y ESTRUCTURAS SAS	ORDEN DE SERVICIO	MARZO, ABRIL	SIN DEFINIR	NA	NA	NA	NA	NA
5.6	LAMINA SEÑAL IDC-5				UND	18	NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO- URBANIZACION EL TOBERIN-DESARROLLO VEREDAL II SECTOR-JRB CALLE 170-EL COUNTRY-PARQUE NACIONAL-URBANIZACION-MIRAVALLE -CIUDADELA NUEVO USME-CIUDAD NUEVO MILENIO-GRAN COLOMBIA-MOL. PORVENIR-VILLEMAR-PLANTA DE TRATAMIENTO SALITRE -ALCAZARES-EL RENACIMIENTO-ABLENTA TEJAR SAN EUSEBIO-EL JAZMIN-PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS) -DESARROLLO PALERMO SUMUPLIOS JORGE E CABALIER	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	METALICAS Y ESTRUCTURAS SAS	ORDEN DE SERVICIO	MARZO, ABRIL	SIN DEFINIR	NA	NA	NA	NA	NA
5.7	AvisoMultidirecc(Tub+veletas)+Dado				UND	15	NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO- URBANIZACION EL TOBERIN-DESARROLLO VEREDAL II SECTOR-JRB CALLE 170-EL COUNTRY-PARQUE NACIONAL-URBANIZACION-MIRAVALLE -CIUDADELA NUEVO USME-CIUDAD NUEVO MILENIO-GRAN COLOMBIA-MOL. PORVENIR-VILLEMAR-PLANTA DE TRATAMIENTO SALITRE -ALCAZARES-EL RENACIMIENTO-ABLENTA TEJAR SAN EUSEBIO-EL JAZMIN-PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS) -DESARROLLO PALERMO SUMUPLIOS JORGE E CABALIER	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	METALICAS Y ESTRUCTURAS SAS	ORDEN DE SERVICIO	MARZO, ABRIL	SIN DEFINIR	NA	NA	NA	NA	NA
6	**MOBILIARIO**															
6.1	CANECAS ACERO INOXIDABLE				UND	25	PARQUE NACIONAL - SIMON BOLIVAR, FLORIDA	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	METALICAS Y ESTRUCTURAS SAS	ORDEN DE SERVICIO	MARZO, ABRIL	12/04/2025	NA	NA	NA	NA	NA
6.2	Bebedero M-110 Inc.Dado 3000psi(Sum+ Instal) **				UND	8	EL COUNTRY	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	METALICAS Y ESTRUCTURAS SAS	ORDEN DE SERVICIO	MARZO, ABRIL	MARZO, ABRIL	NA	NA	NA	NA	NA
6.3	TEJA ETERNIT No. 6+tornillos+Silicñes				UND	1	PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	HOMECENTER	ORDEN DE SERVICIO	MARZO, ABRIL	MARZO, ABRIL	NA	NA	NA	NA	NA
6.4	BANCA EN MADERA M-50				UND	65	PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	METALICAS Y ESTRUCTURAS SAS	ORDEN DE SERVICIO	NOVIEMBRE - DICIEMBRE	23/11/2024 - 5/12/24 - 5/12/24	NA	op 4 de 26 del 27 nov de 2024 se compraron 30 bancas	El 03/12/2024, llegaron 4 und y el 6/12/2024 llegaron 10 und	NA	NA
6.5	ESTRUCTURA VOLEIBOL (SUM + INST)				UND	4	EL PORVENIR	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SALERCO	ORDEN DE SERVICIO	MARZO, ABRIL	21/02/2025	NA	NA	NA	NA	NA
6.6	RED DE VOLEIBOL (SUM + INST)				UND	4	EL PORVENIR	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SALERCO	ORDEN DE SERVICIO	MARZO, ABRIL	21/02/2025	NA	NA	NA	NA	NA
	Baranda Cerramiento M-83 ES				ML	230	PARQUE NACIONAL, COMPLEJO ACUATICO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ABACO	ORDEN DE SERVICIO	MARZO	6/03/2025	NA	NA	NA	NA	Factura proformas
7	**JUEGOS INFANTILES**															
7.1	Juego Muelle Balancin sextuple 5-12 años				UND	2	no aprobado	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SALERCO	NA	MARZO, ABRIL	NA	NA	NA	NA	NA
7.2	Juegocuerdas piramidal 2-6 años Cap: 22				UND	1	EL COUNTRY(unico aprobado)	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SALERCO	Factura proforma 2025-01 del 21/01/2025	FEBRERO - MARZO	17/03/2025	NA	NA	NA	Llego a obra	NA
7.3	Juego Torre deslizadero muro escalar tubo y red (suministro+instalacion) 3-12 años Cap:20 niños				UND	2	no aprobado	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SALERCO	N/A	FEBRERO - MARZO	N/A	NA	NA	NA	NA	NA
7.4	Juego Musical Inclusivo Xilofono (suministro+instalacion) Desde 2 años Cap:max 2 niños				UND	2	no aprobado	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SALERCO	N/A	FEBRERO - MARZO	N/A	NA	NA	NA	NA	NA
7.5	Juego Musical Inclusivo Tambores (suministro+instalacion) Desde 2 años Cap:max 2 niños				UND	1	EL COUNTRY(unico aprobado)	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SALERCO	Factura proforma 2025-01 del 21/01/2025	FEBRERO - MARZO	17/03/2025	NA	NA	NA	Llego a obra	NA
7.6	Juego de balanceo y rotación 6-12 años				UND	2	no aprobado	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SALERCO	N/A	MARZO	N/A	NA	NA	NA	NA	NA
7.7	Juego Muelle 2 + años Capacidad 6 niños				UND	2	PARQUE LOS NIÑOS	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SALERCO	ORDEN DE SERVICIO	MARZO	N/A	NA	NA	NA	NA	Apoyado 26 de febrero de 2025
7.8	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni				UND	1	EL COUNTRY(unico aprobado)	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SALERCO	Factura proforma 2025-01 del 21/01/2025	FEBRERO - MARZO	17/03/2025	NA	NA	NA	Llego a obra	NA
7.9	Juego Muelle Balancin sextuple 5-12 años				UND	2	no aprobado	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SALERCO	N/A	MARZO, ABRIL	N/A	NA	NA	NA	NA	NA
7.10	JUEGO COLUMPIO MULTIPLE 9U 1 +añoCap:9 niños P.N				UND	1	EL COUNTRY(unico aprobado)	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SALERCO	Factura proforma 2025-01 del 21/01/2025	FEBRERO - MARZO	17/03/2025	NA	NA	NA	Llego a obra	NA
7.11	JUEGO EXCAVADORA ARENA 2 + AÑOS CAP1 NIÑO				UND	2	PARQUE LOS NIÑOS	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SALERCO	ORDEN DE SERVICIO	MARZO, ABRIL	7/03/2025	NA	NA	NA	NA	Apoyado 26 de febrero de 2025
7.12	Juego Animal 3D (EPDM) Forme mariquita 2 a 8 años				UND	1	EL COUNTRY(unico aprobado)	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SALERCO	Factura proforma 2025-01 del 21/01/2025	FEBRERO - MARZO	17/03/2025	NA	NA	NA	Llego a obra	NA
	102. JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni				UND	1	SIMON BOLIVAR CENTRAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SALERCO	ORDEN DE SERVICIO	MAYO	30/09/2025	NA	NA	NA	NA	Apoyado 26 de febrero de 2025
	12. Juego Muelle Balancin sextuple 5-12 años				UND	1	SIMON BOLIVAR CENTRAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SALERCO	ORDEN DE SERVICIO	MAYO	30/09/2025	NA	NA	NA	NA	Apoyado 26 de febrero de 2025
	40. Modulo cronometro didactico (suministro+instalacion)				UND	1	SIMON BOLIVAR CENTRAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SALERCO	ORDEN DE SERVICIO	MAYO	30/09/2025	NA	NA	NA	NA	Apoyado 26 de febrero de 2025
	41. Juego Panel de Escalada Inclinado +años Cap:2 (suministro+instalacion)				UND	1	SIMON BOLIVAR CENTRAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SALERCO	ORDEN DE SERVICIO	MAYO	30/09/2025	NA	NA	NA	NA	Apoyado 26 de febrero de 2025
	43. Juego Paneles de Salto mas Baños Cap: 1 (suministro+instalacion)				UND	1	SIMON BOLIVAR CENTRAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SALERCO	ORDEN DE SERVICIO	MAYO	30/09/2025	NA	NA	NA	NA	Apoyado 26 de febrero de 2025
	46. Juego Torre con Rampa de escalar mas Baños Cap: 4 (suministro+instalacion)				UND	1	SIMON BOLIVAR CENTRAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SALERCO	ORDEN DE SERVICIO	MAYO	30/09/2025	NA	NA	NA	NA	Apoyado 26 de febrero de 2025
	47. Juego de Obstáculo en Tunel mas Baños Cap: 1 (suministro+instalacion)				UND	1	SIMON BOLIVAR CENTRAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SALERCO	ORDEN DE SERVICIO	MAYO	30/09/2025	NA	NA	NA	NA	Apoyado 26 de febrero de 2025
	48. Juego Pasarela Tambaleante mas Baños Cap: 1 (suministro+instalacion)				UND	1	SIMON BOLIVAR CENTRAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SALERCO	ORDEN DE SERVICIO	MAYO	30/09/2025	NA	NA	NA	NA	Apoyado 26 de febrero de 2025
	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero2-12añoCap:25N				UND	1	SIMON BOLIVAR CENTRAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SALERCO	ORDEN DE SERVICIO	MAYO	30/09/2025	NA	NA	NA	NA	Apoyado 26 de febrero de 2025
	49. Juego Ondas de Equilibrio mas Baños Cap: 4 (suministro+instalacion)				UND	1	SIMON BOLIVAR CENTRAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SALERCO	ORDEN DE SERVICIO	MAYO	30/09/2025	NA	NA	NA	NA	Apoyado 26 de febrero de 2025
8	**ELECTRICOS**															
8.1	BOMBILLA METAL HALIDE 1000W (Sum+Inst)				UND	40	PLIAGS JORGE E CABALIER-PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS)-EL JAZMIN-ABLENTA TEJAR SAN-CIUDADELA NUEVO USME EUSEBIO-VILLEMAR-CIUDAD NUEVO MILENIO-URBANIZACION MIRAVALLE – URBANIZACION EL TOBERIN-NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILLUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO,FEBRERO, MARZO,ABRIL	7/02/2025	NA	NA	NA	NA	GC 005 07/02/2025 (Verificar cantidades en la Orden de compra arriba)
8.2	Sum+Inst Kit Luminaria1000W,armanced,cordens,rea				UND	40	PLIAGS JORGE E CABALIER-PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS)-EL JAZMIN-ABLENTA TEJAR SAN-CIUDADELA NUEVO USME EUSEBIO-VILLEMAR-CIUDAD NUEVO MILENIO-URBANIZACION MIRAVALLE – URBANIZACION EL TOBERIN-NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILLUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO,FEBRERO, MARZO,ABRIL	7/02/2025	NA	NA	NA	NA	GC 005 07/02/2025 (Verificar cantidades en la Orden de compra arriba)
8.3	BOMBILLO AHORRADOR DE 32W (SUM+INST) **				UND	40	PLIAGS JORGE E CABALIER-PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS)-EL JAZMIN-ABLENTA TEJAR SAN-CIUDADELA NUEVO USME EUSEBIO-VILLEMAR-CIUDAD NUEVO MILENIO-URBANIZACION MIRAVALLE – URBANIZACION EL TOBERIN-NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILLUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO,FEBRERO, MARZO,ABRIL	7/02/2025	NA	NA	NA	NA	GC 005 07/02/2025 (Verificar cantidades en la Orden de compra arriba)
8.4	Cable Encauchetado 3 x12 (Sum e Instalación).				ml	100	PLIAGS JORGE E CABALIER-PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS)-EL JAZMIN-ABLENTA TEJAR SAN-CIUDADELA NUEVO USME EUSEBIO-VILLEMAR-CIUDAD NUEVO MILENIO-URBANIZACION MIRAVALLE – URBANIZACION EL TOBERIN-NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILLUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO,FEBRERO, MARZO,ABRIL	7/02/2025	NA	NA	NA	NA	GC 005 07/02/2025 (Verificar cantidades en la Orden de compra arriba)
8.5	Cable Aluminio N°6 (Sum + Instalacion)				ml	100	PLIAGS JORGE E CABALIER-PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS)-EL JAZMIN-ABLENTA TEJAR SAN-CIUDADELA NUEVO USME EUSEBIO-VILLEMAR-CIUDAD NUEVO MILENIO-URBANIZACION MIRAVALLE – URBANIZACION EL TOBERIN-NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILLUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO,FEBRERO, MARZO,ABRIL	7/02/2025	NA	NA	NA	GC 004 31/01/2025, se compraron 2427 ml.	GC 005 07/02/2025 (Verificar cantidades en la Orden de compra arriba)
8.6	Tablero General Distrib.1 barraje 300 AMP CofreT-5				UND	40	PLIAGS JORGE E CABALIER-PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS)-EL JAZMIN-ABLENTA TEJAR SAN-CIUDADELA NUEVO USME EUSEBIO-VILLEMAR-CIUDAD NUEVO MILENIO-URBANIZACION MIRAVALLE – URBANIZACION EL TOBERIN-NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILLUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO,FEBRERO, MARZO,ABRIL	7/02/2025	NA	NA	NA	NA	GC 005 07/02/2025 (Verificar cantidades en la Orden de compra arriba)
8.7	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VARILLA 5/8" X 2.4 m				UND	40	PLIAGS JORGE E CABALIER-PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS)-EL JAZMIN-ABLENTA TEJAR SAN-CIUDADELA NUEVO USME EUSEBIO-VILLEMAR-CIUDAD NUEVO MILENIO-URBANIZACION MIRAVALLE – URBANIZACION EL TOBERIN-NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILLUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO,FEBRERO, MARZO,ABRIL	7/02/2025	NA	NA	NA	NA	GC 005 07/02/2025 (Verificar cantidades en la Orden de compra arriba)
8.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE COFRE PROYECTOR DE 1000 HASTA 1500W PARA KIT METALAR				UND	40	PLIAGS JORGE E CABALIER-PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS)-EL JAZMIN-ABLENTA TEJAR SAN-CIUDADELA NUEVO USME EUSEBIO-VILLEMAR-CIUDAD NUEVO MILENIO-URBANIZACION MIRAVALLE – URBANIZACION EL TOBERIN-NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILLUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO,FEBRERO, MARZO,ABRIL	7/02/2025	NA	NA	NA	NA	GC 005 07/02/2025 (Verificar cantidades en la Orden de compra arriba)
8.9	Cable Encauchetado 3 x12 (Sum e Instalación).				ml	100	PLIAGS JORGE E CABALIER-PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS)-EL JAZMIN-ABLENTA TEJAR SAN-CIUDADELA NUEVO USME EUSEBIO-VILLEMAR-CIUDAD NUEVO MILENIO-URBANIZACION MIRAVALLE – URBANIZACION EL TOBERIN-NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILLUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO,FEBRERO, MARZO,ABRIL	7/02/2025	NA	NA	NA	NA	GC 005 07/02/2025 (Verificar cantidades en la Orden de compra arriba)
8.10	Cable Aluminio 4/0 - AYG- 600V-75°C				ml	100	PLIAGS JORGE E CABALIER-PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS)-EL JAZMIN-ABLENTA TEJAR SAN-CIUDADELA NUEVO USME EUSEBIO-VILLEMAR-CIUDAD NUEVO MILENIO-URBANIZACION MIRAVALLE – URBANIZACION EL TOBERIN-NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILLUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO,FEBRERO, MARZO,ABRIL	7/02/2025	NA	NA	NA	NA	GC 005 07/02/2025 (Verificar cantidades en la Orden de compra arriba)
8.11	Cable Aluminio Aislado 1/0 THW (Sum+Instalac)				ml	100	PLIAGS JORGE E CABALIER-PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS)-EL JAZMIN-ABLENTA TEJAR SAN-CIUDADELA NUEVO USME EUSEBIO-VILLEMAR-CIUDAD NUEVO MILENIO-URBANIZACION MIRAVALLE – URBANIZACION EL TOBERIN-NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ILLUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO,FEBRERO, MARZO,ABRIL	7/02/2025	N/A	NA	NA	OC 004 31/01/2025, se compraron 2427 ml.	GC 005 07/02/2025 (Verificar cantidades en la Orden de compra arriba)

RSA

CONTRATISTA: CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO: 4060 DE 2024

PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE		CODIGO	TIPO	
8,12	LUMINARIA LED 820W (SUM) 5700K - 117,000LM - IP66 - IK08 (SUM+INS)				UND	40	PUNOS JORGE E CABALLER-PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS+EL JAZMIN+VILLENTA TEJAR SAN CUDADELA NUEVO JOSE EUSTASIO+LEVIAN+CIUDAD NUEVO 80, PADA+URBANIZACION VISTA ALLE – URBANIZACION EL TOBERIN+NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ELLUMINARC SAS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO,FEBRERO, MARZO,ABRIL	7/02/2025	N/A	N/A	N/A	OC 004 31/01/2025, se compraron 36 luminarias.	OC 005 07/02/2025 (Vertical cantidades en la Orden de compra anexa)
9.0	***INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS***																
9,1	CAJA INSPECCION 40x40x40				UND	6	EL RENACIMIENTO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SURTIMAYORISTA	ORDEN DE SERVICIO	ENERO,FEBRERO, MARZO,ABRIL	18/4/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9,20	Tuberia PVC,S dn6"-Accesorios **				ml	100	EL RENACIMIENTO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SURTIMAYORISTA	ORDEN DE SERVICIO	DICIEMBRE - FEBRERO- MARZO-ABRIL	18/4/2025	N/A	N/A	CM 003 del 20 12'2024, se compraron accesorios. CM 005 del 27.12'2024, se compran varios accesorios. CM 004 del 31.12'2024, se compran varios accesorios.	CM 004 del 03/01/2025, se compraron varios accesorios. CM 004 del 07/01/2025, se compraron flotadores mecánicos. CM 005 del 14/01/2025, se compraron codos y tubos. CM 005 del 17/01/2025, se compraron varios accesorios. CM 005 del 18/01 2025, se compraron sifón botella y desague sencillo. CM 005 del 21/01/2025, se compraron varios accesorios. CM 005 del 22/01/2025, se compraron varios accesorios. El 27/01/2025, se compraron varios accesorios.	Op 36 del 03/02/2025, se compraron varios accesorios. Op 051 y 062 del 18/12/2025, se compran varios accesorios.
	Accesorios PVC S (2") **				UND	4	PALACIO DE LOS DEPORTES, SAUZALITO, GILMA JIMENEZ, LEIS	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPOGRIFOS	ORDEN DE SERVICIO	FEBRERO	4/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	op 38 03/02/2025, se compraron 1 und
	REGISTRO 2"(Cortina) RED WITE O SIMILAR				UND	4	PALACIO DE LOS DEPORTES, SAUZALITO, GILMA JIMENEZ, LEIS	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPOGRIFOS	ORDEN DE SERVICIO	FEBRERO	4/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	op 38 03/02/2025, se compraron 1 und
	04, Accesorios CPVC (agua caliente) * **				UND	30	SAUZALITO,	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPOGRIFOS	ORDEN DE SERVICIO	FEBRERO	19/02/2025, 24/02/25	N/A	N/A	N/A	N/A	op 62 18/02/2025, se compraron 28 und, OP 70 24/02/25 , SE COMPRAN 10 UND
	22, Accesorios PVC,P Ø1 1/2"(Sum + Instalación)				UND	9	SAUZALITO,	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPOGRIFOS	ORDEN DE SERVICIO	FEBRERO	19/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	op 62 18/02/2025, se compraron 10 und
	24. Accesorios PVC,P 3/4 " **				UND	20	PORVENIR	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPOGRIFOS	ORDEN DE SERVICIO	MARZO	5/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	op 72 25/02/2025, se compraron 10 und,
	25. Accesorios PVC,P 1/2 " **				UND	10	PORVENIR	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPOGRIFOS	ORDEN DE SERVICIO	MARZO	5/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	op 72 25/02/2025, se compraron 10 und,
9,30	TUBO PVC SANITARIO 4" XEML S/NORMA				ml	100	EL RENACIMIENTO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SURTIMAYORISTA	ORDEN DE SERVICIO	NOVIEMBRE	18/4/2025	N/A	Op 003 EL 27/11/2024, se compró 1 tubo sanitario 6"	N/A	N/A	N/A
10.0	***MAMPOSTERIA***																
10,1	Muro ladrillo recocido Mort,1:4 **				m2	25	EL RENACIMIENTO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SURTIMAYORISTA	ORDEN DE SERVICIO	MARZO - ABRIL	18/4/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10,2	Muro bloque No 5 Tablaje peñeter				m2	25	EL RENACIMIENTO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	EASY	ORDEN DE SERVICIO	NOVIEMBRE	26/11/2024	N/A	op 3 26/11/2024, se compraron 110 und	N/A	N/A	N/A
11.0	***PISOS Y ACABADOS***																
11,1	Piso Baldosa Gran Marmol 33x33sin pulir, sin				m2	18	PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	BALDOSINES DELTA	ORDEN DE SERVICIO	DICIEMBRE A ABRIL	26/12/2024	N/A	N/A	op 23 20/12/2024, se compraron 24 m2	N/A	N/A
11,2	GRAVELLA MONA LAVADA - Acabado - Incluye dilatacion en bronce				m2	12	PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SURTIMAYORISTA	ORDEN DE SERVICIO	MARZO ABRIL	28/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11,3	GRANITO BLANCO NEIVA LAVADO ancho max 0,15 **				m2	12	PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SURTIMAYORISTA	ORDEN DE SERVICIO	MARZO ABRIL	28/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11,4	PISO DECK PLASTICO 40%MADER-60%PLAST-TAB,14CM				m2	5,18	PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	SD GREENARO SAS	ORDEN DE SERVICIO	FEBRERO - MARZO	10/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	op 49 13/02/2025, se compraron 5,18 m2 Deck Ecodeck WPC 275 X 14 CM y 2 CM de espesor trafico comercial TEKA o CHOCOLATE.
11,5	LOSETA TIPO CONCRETO TIPO IDU A-20 (20x20x6) COLOR**				m2	20	PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	ARKA	ORDEN DE SERVICIO	MARZO ABRIL	28/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11,6	Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm SUM+INST)				m2	60	EL PORVENIR-PARQUE SIMON BOLIVAR	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	BALERCO	ORDEN DE SERVICIO	MARZO ABRIL	28/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11,7	Piso Caucho reciclado 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm				m2	60	EL PORVENIR-PARQUE SIMON BOLIVAR	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	BALERCO	ORDEN DE SERVICIO	MARZO ABRIL	28/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11,8	Piso Caucho reciclado 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)				m2	60	EL PORVENIR-PARQUE SIMON BOLIVAR	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	BALERCO	ORDEN DE SERVICIO	MARZO ABRIL	28/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Piso pared ceramico oasis blanco 20x20 cm				m2	2	PARQUE CIUDAD MONTES	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	EASY	ORDEN DE SERVICIO	FEBRERO - MARZO	19/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	op 50 19/02/2025, se compraron 2 m2 de piso.
12.0	***ADOQUINES Y PREFABRICADOS***																
12,1	Bordillo en ladrillo Nilos parada h=0,25 m				ml	1500	PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	LADRILLERA SAN JOAQUIN	ORDEN DE SERVICIO	NOVIEMBRE A ENERO	29/11/24 - 12/12/24 - 7/01/25	N/A	op 8 29/11/2024, se compraron 3000 und	op 14 12/12/2024, se compraron 3000 und	op 26 07/01/2025, se compraron 3000 und	N/A
13.0	***ESTUCOS, VINILOS Y ESMALTES***																
13,1	Koraza sobre pañete (3 MANOS) **				m2	450	PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	HOMECENTER	ORDEN DE SERVICIO	NOVIEMBRE	26/11/2024	N/A	op 2 de 20 de nov de 2024	N/A	N/A	N/A
	Koraza sobre pañete (3 MANOS) **						PARQUE NACIONAL - CIUDAD MONTES - SAN CARLOS	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	EASY	ORDEN DE SERVICIO	DICIEMBRE A FEBRERO	09/12/2024 - 8/02/2025	N/A	N/A	op 13 5/12/2024, se compraron 1 cuñete de 5 galones de Koraza gris	N/A	op 44 4/02/2025, se compraron 4 canecas de 5 galones de Koraza roji colonial para el parque San Cristobal. Op 50 19/02/2025, se compraron 2 cuñetes de 5 galones de Koraza blanco.
13,2	PINTURA ANTICORROSIVO+ESMALTE TUBERIA 4", INCLUYE PISTOLA PARA PINTURA Y COMPRESOR DE AIRE 1HP				m2	200	PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	HOMECENTER	ORDEN DE SERVICIO	MARZO	28/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13,3	Demarcacion cancha pintura trafico a=0,1 sin mdr				ml	150	PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	TONO COLOR SAS	ORDEN DE SERVICIO	DICIEMBRE	2/12/2024	N/A	N/A	op 10 02/12/2024, se compraron 8 galones	N/A	N/A
13,4	Pintura Berenda M-80 (2 MANOS)				ml	150	PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	HOMECENTER	ORDEN DE SERVICIO	MARZO - ABRIL	28/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Esmalte sintetico verde esmeralda x galon				Galon	2	PARQUE SAN CARLOS	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	EASY	ORDEN DE SERVICIO	FEBRERO A ABRIL	19/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	op 44 4/02/2025, se compraron 2 galones de esmalte verde esmeralda para el parque San Carlos
	Estuco acrilico x 6 kilos				und	2	PARQUE SAN CARLOS	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	EASY	ORDEN DE SERVICIO	FEBRERO A ABRIL	19/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	op 44 4/02/2025, llegaron 2 und de 6 kilos.
14.0	***CARPINTERIA MADERA***																
14,1	Listones de Madera Choba de 6 x 4 cm				UND	8	PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	GMR SAS	ORDEN DE SERVICIO	FEBRERO A ABRIL	19/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15.0	***MALLAS Y CERRAMIENTOS***																
15,1	Malla eslabonada cal10+anticorrosión (Instalacion)				m2	250	PUNOS JORGE E CABALLER-DESARROLLO PALERMO SURARIS CALLE 170-DESARROLLO YERSONAL II SECTOR-URBANIZACION EL TOBERIN	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	METALICAS Y ESTRUCTURAS SAS	ORDEN DE SERVICIO	MARZO	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15,2	BARANDAS CERRAMIENTO M-80				ml	320	PUNOS JORGE E CABALLER-DESARROLLO PALERMO SURARIS CALLE 170-DESARROLLO YERSONAL II SECTOR-URBANIZACION EL TOBERIN	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	METALICAS Y ESTRUCTURAS SAS	ORDEN DE SERVICIO	MARZO	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15,3	CerramientoContraImpacto h=2,5 + MallaNylon-Piloto				ml	200	PUNOS JORGE E CABALLER-DESARROLLO PALERMO SURARIS CALLE 170-DESARROLLO YERSONAL II SECTOR-URBANIZACION EL TOBERIN	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	METALICAS Y ESTRUCTURAS SAS	ORDEN DE SERVICIO	MARZO	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16.0	***JARDINERIA***																
16,1	Empradizacion zonas verdes				m2	150	PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	GMR SAS	ORDEN DE SERVICIO	MARZO ABRIL	5/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17.0	***APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS***																
17,1	TAZA DE SANITARIO INST. DE FLUXOMETRO **				UND	20	PUNOS JORGE E CABALLEROUDS, SERVITA, OLAYA, FRAGUA, PALESTINA, ALCAZARES,	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPOGRIFOS	ORDEN DE SERVICIO	MARZO ABRIL	5/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17,2	FLUXOMETRO SLOAN - Mantenimiento.				UND	20	PUNOS JORGE E CABALLEROUDS, SERVITA, OLAYA, FRAGUA, PALESTINA, ALCAZARES, SAUZALITO	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPOGRIFOS	ORDEN DE SERVICIO	FEBRERO	31/03/25 - 28/2/25	N/A	N/A	N/A	N/A	op 58 24/02/2025, SE COMPRARON 5 UND SE INSTALARON 2 UNIDADES 1 EN PARQUE SAN CRISTOBAL 31/01/25, 1 EN ARBORIZADORA ALTA. 4 UND EN SAUZALITO 24/2/2025
17,3	Valvula Instl.. Onnal Antivandalica (sum+inst)				UND	20	PUNOS JORGE E CABALLEROUDS, SERVITA, OLAYA, FRAGUA, PALESTINA, ALCAZARES,	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	IMPOGRIFOS	ORDEN DE SERVICIO	DICIEMBRE A MARZO	21/02/2025	N/A	N/A	op 32 21/12/2024, se compraron 4 und	N/A	N/A

CONTRATISTA: CONSORCIO BELZCON IDRD 1
INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 28
CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
No CONTRATO: 4060 DE 2024

PLAN DE ADQUISICIÓN DE COMPRAS INICIAL

ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM	PARQUE	CODIGO	TIPO	ITEM *	PARQUE		CODIGO	TIPO	
	Valvula Antivandalica para sanitario tipo push				UND	1	PARQUE GILMA JIMENEZ - CEFE SAN CRISTOBAL - ARBOLIZADORA ALTA	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	HYDGRIFOS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO A MARZO	20/01/2025 - 31/01/2025 - 5/03/2025	N/A	N/A	N/A	op 31 29/01/2025, se compraron 1 und para el CEFE San Cristobal Op 55 31/01/2025, se compraron 2 und para el parque Gilma Jimenez. Op 56 29/01/2025, se compraron 2 und para el parque Arbolizadora Alta	N/A
	Griferia institucional de mesa tipo Push para lavamanos				UND	6	PARQUE ARBOLIZADORA ALTA - GILMA JIMENEZ	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	HYDGRIFOS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO - MARZO	20/01/2025 - 31/01/2025 - 5/03/2025	N/A	N/A	N/A	op 41 29/01/2025, se compraron 6 und. Op 55 31/01/2025, se compraron 5 und para el parque Gilma Jimenez.	N/A
	Griferia para lavaplatos monocontrol				UND	1	PARQUE ARBOLIZADORA ALTA	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	HYDGRIFOS	ORDEN DE SERVICIO	ENERO - MARZO	28/01/2025 - 1/03/2025	N/A	N/A	N/A	op 41 29/01/2025, se compraron 1 und	N/A
	Griferia Gricol (Conjunto valvula push lavamanos)				UND	2	PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	HYDGRIFOS	ORDEN DE SERVICIO	FEBRERO - MARZO	11/02/2025 - 8/03/2025	N/A	N/A	N/A	- N/A	op 53 11/02/2025, se compraron 2 und.
	Griferia Gricol valvula push sanitario				UND	10	PARQUE NACIONAL	REUNION DE COMPRAS SEMANAL	HYDGRIFOS	ORDEN DE SERVICIO	FEBRERO - MARZO	11/02/2025 - 8/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	op 53 11/02/2025, se compraron 10 und.

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/11/2024

FECHA DE SEGUIMIENTO: 28/02/2025

Director de Obra
LUIS ENRIQUE GUZMAN CONCHA

Elaboró: Patricia Serrano Espinel		Revisó: Enrique Guzman		Aprobó: Wilv Patricia Beltran Salazar	
Cargo:	Fecha:	Cargo:	Fecha:	Cargo:	Fecha:
Profesional de Calidad	29/11/2024	Director de Obra	29/11/2024	Representante Legal.	30/12/2024

ANEXO 5

SOPORTES PLAN ADQUISICIONES

Copia para Cliente

GUIA DE DESPACHO Nº 1329131

Datos de la Guia de Despachos

Nº Orden de Entrega	1329131	**Fecha de Entrega**	17/02/2025
Estado	Orden Ent. Pagada		
Tienda	EASY NORTE		
Tipo Entrega	Despacho Domicilio (Fact. Inmed.)		

Datos Cliente

Razón Social	BELZCON SAS	**CC/NIT/RUT**	901252860
Actividad Económica	0 Actividad sin Clas		
Nombre de Contacto	BELZCON SAS	**Teléfono Contacto**	8052552
Dirección de Servicio	CALLE 36 NO 6 - 41 COSTADO SUR PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA (LOCALIDAD SANTA FE)|||IDRD PARQUES	**Departamento**	BOGOTA
Ciudad	BOGOTA	**Barrio**	EL PARAISO-CHAPINERO
Teléfono de Servicio	3203889087	**Indicaciones**	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD COMPRADA	CANTIDAD ENTREGADA
1051138	KORAZA BASE ACCENT CANECA 5 GL	1.00	1.00
1035302	CEMENTO GRIS TP1CEMEX SUPERRESISTENTE50K	60.00	60.00
1095760	MALLA ELECTR 4X4MM 15X15CM 2.35X6M DIACO	12.00	12.00

PERSONA QUE DESPACHO: _____

PERSONA DE SEGURIDAD: _____

CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Nit 900.155.107-1
Tienda Easy Norte

17 FEB 2025

FIRMA DEL CLIENTE: _____

PERSONA QUE RECIBE: _____

ENTREGA A DOMICILIO

DETALLE DE QUIEN RECIBE:

OBSERVACIONES DE ENTREGA:

Vendedor Default Cliente Juridico

Powered by CamScanner

858

VENTA MAYORISTA A EMPRESAS Y CONSTRUCTORAS
Orden De Entrega Nº 1330155

2 280113 301555

Datos Cotización

No. Cotización	2115861398	**Fecha de Cotización**	18/02/2025
Estado	Orden Ent Autorizada	**Tienda**	EASY NORTE
Atendido Por	NATALIA ANDREA RUBIO FANDINO	**Fecha de Entrega**	19/02/2025
Válido Desde		**Válido Hasta**	19/02/2025
Tipo de Pago	Crédito dentro de los 30 días	**Orden de Compra**	064
Observaciones			

Datos Cliente

Razón Social	BELZCON SAS	**CC/NIT/RUT**	901252860-7
Actividad Económica	0 Actividad sin Clas	**Teléfono Contacto**	8052552
Dirección	CL 1 0 5 # 4 6 - 2 6	**Departamento**	BOGOTA
Ciudad	BOGOTA	**Barrio**	PASADENA-SUBA

Dirección de Servicio (Despachos e Instalaciones)

Teléfono	8052552		
Dirección	CL 1 0 5 # 4 6 - 2 6	**Departamento**	BOGOTA
Ciudad	BOGOTA	**Barrio**	PASADENA-SUBA
Comentarios			

Codigo	Tipo	Descripciï¿½n	Tipo Despacho	Unimed	Instalaciï¿½n	Peso	Cantidad	Descuento	Precio Con IVA	Total Con IVA
1134041	PS	PINTURA TRAFICO 1GL AMARILLO TITO PABON	Retira Inmediato	un	NO	5.62	5	250,000	100,990	504,950

Sub-Total	**504,950**
Total Descuentos	**250,000**
Valor IVA	**80,622**
Total A Pagar	**504,950**

RETIRA INMEDIATO

Santana
John Carlos Santana
CC 1024208871
Recibido

Powered by CamScanner

959

LADRILLERA SAN JOAQUÍN SAS

NIT 832.009.008-8

Oficina: Carrera 1A No. 11-130 - T2 Of. 429 - Ofichía
Planta: Km. 12 Vía Zipaquira -Ubaté
Cel: 3118995677 - 3108563477

REMISION 37718

Fecha: 26/02/2025

Señor (es):	Belzcon Sas	**Contacto:**		**Transportador:**	CESAR CELY,
Ciudad:	BOGOTA	**Celular:**		**Conductor:**	CESAR CELY,
Dirección:	Calle 36 No 6 - 41 costado sur Parque Nacional Enrique Olaya (localidad Santa fe)			**Placa:**	SUA897

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD
LTM624	Ladrillo tolete macizo	3000

Despachado por: VIVIANA CAMELO	Vale:	El material de arcilla se descarga a borde de planchón, despues de recibido en obra no se aceptan reclamos ni devoluciones	
	Factura:		
Observaciones	Transportador: CESAR CELY, Firma	Recibido a satisfacción: Nombre, firma y sello John Santanca	

Powered by CamScanner

860

VENTA MAYORISTA A EMPRESAS Y CONSTRUCTORAS
Orden De Entrega Nº 1330156

2280113301562

Datos Cotización

No. Cotización	2115861143	**Fecha de Cotización**	17/02/2025
Estado	Orden Ent Autorizada	**Tienda**	EASY NORTE
Atendido Por	NATALIA ANDREA RUBIO FANDINO	**Fecha de Entrega**	19/02/2025
Válido Desde		**Válido Hasta**	21/02/2025
Tipo de Pago	Crédito dentro de los 30 dias	**Orden de Compra**	064
Observaciones			
Nombre Obra:	IDRD PARQUES		

Datos Cliente

Razón Social	BELZCON SAS	**CC/NIT/RUT**	901252860-7
Actividad Económica	0 Actividad sin Clas	**Teléfono Contacto**	8052552
Dirección	CL 105#46-26	**Departamento**	BOGOTA
Ciudad	BOGOTA	**Barrio**	PASADENA-SUBA

Direccion de Servicio (Despachos e Instalaciones)

Teléfono	3203889087		
Dirección	CALLE 36 NO 6 - 41 COSTADO SUR PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA (LOCALIDAD SANTA FE)	**Departamento**	BOGOTA
Ciudad	BOGOTA	**Barrio**	EL PARAISO-CHAPINERO
Comentarios			

Codigo	Tipo	Descripciï¿½n	Tipo Despacho	Unimed	Instalaciï¿½n	Peso	Cantidad	Descuento	Precio Con IVA	Total Con IVA
2202431006	PS	ESMALTE T2 1GL DOMESTICO VERDE ESMERALDA	Retira Inmediato	un	NO	3.77	2	0	88,490	176,980
2192239	PS	ANTICORROSIVO 1GL PINTUCO GRIS	Retira Inmediato	un	NO	4.66	2	0	70,490	140,980

Sub-Total	**317,960**
Total Descuentos	**-**
Valor IVA	**50,766**
Total A Pagar	**317,960**

RETIRA INMEDIATO

Powered by CamScanner

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 20 dias del mes de Febrero de 25, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 19-188

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: Arborizadora Alta

DIRECCIÓN: Calle 72 B sur # 42 LOCALIDAD: 19 - Ciudad Bolivar

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD.

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 (Día)	DE	Noviembre (Mes)	DE	2024 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)

CONTRATISTA: Consorcio Belzcon IDRD 1 (Escriba el nombre o razón social del contratista) CONTRATO No 4060 (Número Contrato) DE 2024 (Año)

INTERVENTOR: Consorcio Santa Teresa 28 (Escriba el nombre o razón social del contratista) CONTRATO No 4080 (Número de Contrato) DE 2024 (Año)

PROFESIONAL QUIEN ENTREGA: Consorcio Belzcon IDRD 1 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. Se realizan actividades de reparación de puntos hidraulicos en zona de baños
2. hombres piso 1 (4 und valvula push en orinales) 1 und push en sanitario) y
3. baño mujeres piso 2 (1 und push en sanitario)
4. Se realiza reparación de punto hidraulico en acometida Principal de agua
5. potable al exterior del coliseo en tubería PVC-P 2"
6. Se realizó entrega de valvulas desmontadas al administrador del parque.
7.
8.

La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.


2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

Powered by CamScanner

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2.2.1. PLANTA ARQUITECTÓNICA

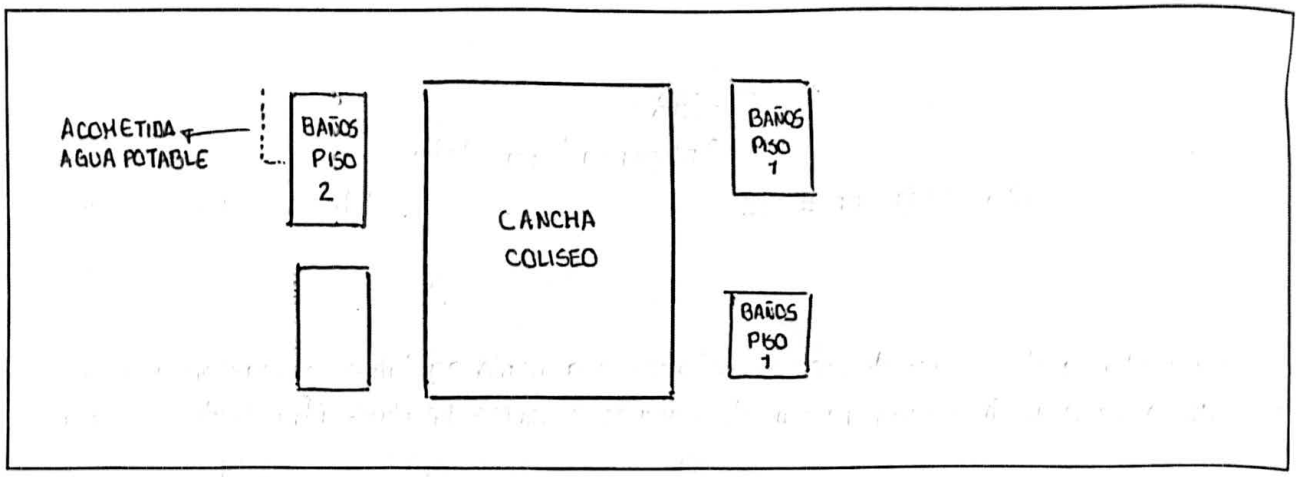

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	0,00 m2	0,00%

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA
14462	Valvula institu. Orinal antivandalica (sum+inst)	UN	4	
14033	Valvula antivand sanitario tipo push (sum+inst)	UN	2	

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

☐ INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios: _____

Comentarios: _____

☐ ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B _____ ENEL _____ VANTI _____

UAESP ALUMBRADO _____ UAESP PODA CESPED _____

Comentarios: _____

☐ MANUAL DE MANTENIMIENTO: POLIZAS Y GARANTIAS

Comentarios: _____

☐ OTROS (indicar cuales)

Comentarios: _____

Powered by CamScanner

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
John Santana	Consorcio Belzcon UPD 1	3222280448	
Diana León	Solun SAS.	3192588154	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

Veinte (*día en letras*) 20 (*día en números*) días del mes de Febrero (*mes en letras*) de 2025 (*Año*)

Entrega:

(Firma)
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

Recibe:

(Firma)
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

Powered by CamScanner

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 24 días del mes de Febrero de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 03-035

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA

DIRECCIÓN: CARRERA 7 # 37-04 LOCALIDAD: SANTAFÉ

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 (Día)	DE	Noviembre (Mes)	DE	2024 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)

CONTRATISTA: Consorcio Belzcon IDRD 1 (Escriba el nombre o razón social del contratista) CONTRATO No 4060 (Número Contrato) DE 2024 (Año)

INTERVENTOR: Consorcio Santa Teresa 28 (Escriba el nombre o razón social del contratista) CONTRATO No 4080 (Número de Contrato) DE 2024 (Año)

PROFESIONAL QUIEN ENTREGA: Consorcio Belzcon IDRD 1 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. Se realizan actividades de pulida, destronque y sello en piso de granito;
2. Mantenimiento (soldadura, reposición de secciones, anticorrosivo, pintura tipo esmalte)
3. en baranda existente; Suministro e instalación de puerta en cerramiento;
4. Raspado, resane de fisuras y pintura tipo Koraza color blanco en muros;
5. Pintura tipo esmalte en ductos de ventilación tanques acueducto;
6. Suministro e instalación de listones de madera en bancas Picnic; Pintura
7. tipo tráfico color amarillo en viga de baranda
8.


La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2.2.1. PLANTA ARQUITECTÓNICA

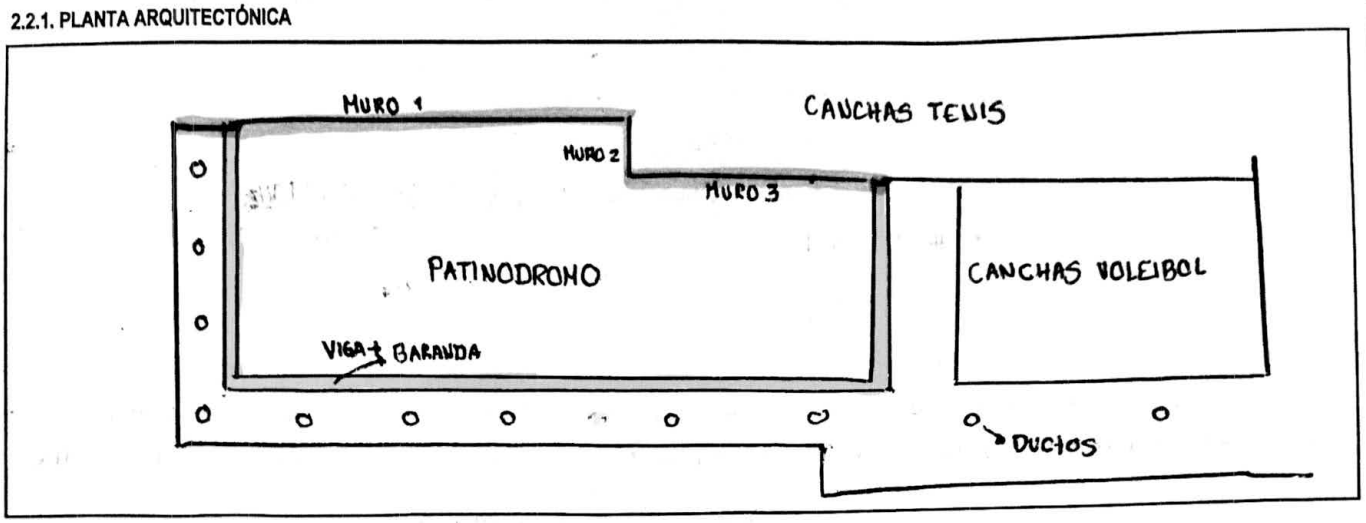

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	AREA	%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	0,00 m2	0,00%

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA
16688	Pintura Koraza - Muros Patinodromo	M2	151,64	
12198	Pintura Baranda - Patinodromo	ML	97,82	
14625	Baranda H-80 - Patinodromo	ML	10,78	
20803	Pulida piso granito - Patinodromo	M2	1542,03	
13848	Pintura Tipo Tráfico - Viga Patinodromo	M2	72,83	
12638	Demolicion de enchape Aso y Enchape piso	M2	22,88	

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

☐ INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios: _____

Comentarios: _____

☐ ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B _____ ENEL _____ VANTI _____

UAESP ALUMBRADO _____ UAESP PODA CESPED _____

Comentarios: _____

☐ MANUAL DE MANTENIMIENTO: POLIZAS Y GARANTIAS

Comentarios: _____

☐ OTROS (indicar cuales)

Comentarios: _____

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
John Carlos Santana	Consorcio Bdzcon IDRD 1	322280448	Santana
Ronald Lozano	C.S.T. 28.	3104000075	CFR

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

Veinticuatro (*día en letras*) 24 (*día en números*) días del mes de Febrero (*mes en letras*) de 2025 (*Año*)

Entrega:

(Firma)
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

Recibe:

(Firma)
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los 20 días del mes de Febrero de 2025, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por Instituto Distrital de Recreación y Deporte-IDRD, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 07-391

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: El Porvenir

DIRECCIÓN: Avenida Calle 54 sur # 97-37 LOCALIDAD: 07 - Bosa

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD.

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 (Día)	DE	Noviembre (Mes)	DE	2024 (Año)	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	Julio (Mes)	DE	2025 (Año)	
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)	
CONTRATISTA	Consorcio Belzcon IDRD 1 (Escriba el nombre o razón social del contratista)		CONTRATO No 4060 (Número Contrato)	DE	2024 (Año)	
INTERVENTOR	Consorcio Santa Teresa 28 (Escriba el nombre o razón social del contratista)		CONTRATO No 4080 (Número de Contrato)	DE	2024 (Año)	
PROFESIONAL QUIEN ENTREGA	Consorcio Belzcon IDRD 1 (Escriba el nombre o razón social del contratista)					

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. Se realizan actividades de descapote, excavación manual, retiro y disposición
2. final de RCD, instalación de acero de refuerzo y vaciado de concreto en
3. pilotines con dimensiones 0,45 x 0,45 x 1,30 m.
4. Suministro e instalación de 6 und de postes metálicos H: 12 m
5. Suministro e instalación de 330 m² de cerramiento en malla nylon
6.
7.
8.

La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA

2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

Powered by CamScanner


BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

3. ASISTENTES

NOMBRE
John

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2.2.1. PLANTA ARQUITECTÓNICA

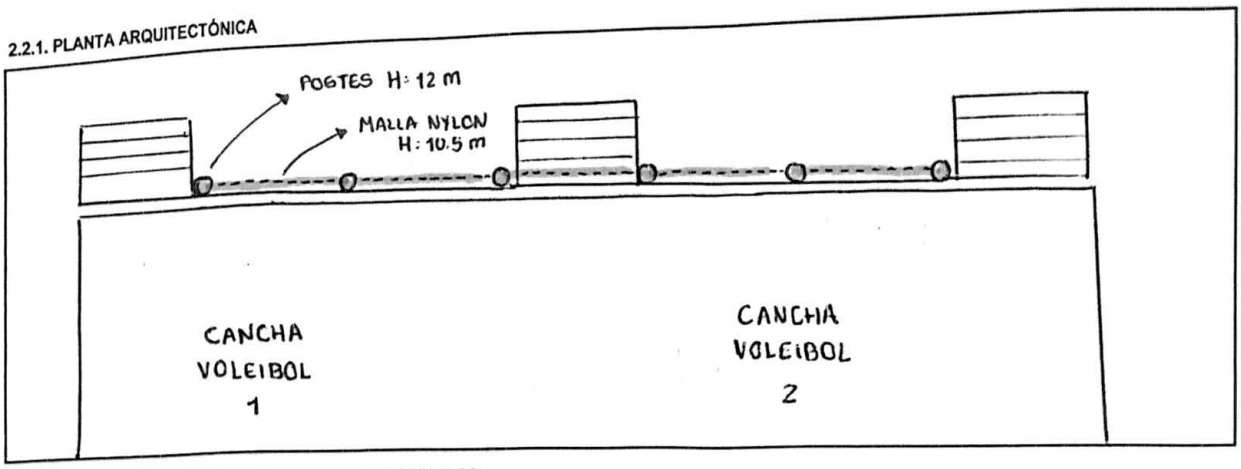

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	0,00 m2	0,00%

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA
15745	Poste metal H: 12m tipo AP+Base - Cancha Voleibol	UN	6	
13793	Malla Proteccion cerramiento nylon imperm. H: 8,5 m (sum + inst) - Cancha voleibol	m2	330	

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

☐ INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios: _____

Comentarios: _____

☐ ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B _____ ENEL _____ VANTI _____

UAESP ALUMBRADO _____ UAESP PODA CESPED _____

Comentarios: _____

☐ MANUAL DE MANTENIMIENTO: POLIZAS Y GARANTIAS

Comentarios: _____

☐ OTROS (indicar cuales)

Comentarios: _____

Powered by CamScanner

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
John Santana	Consorcio Belzcon IDRD	3222280448	
Johnny Quevedo	IDRD	80833505	
Diana León	Soliun SAS	3192588154	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los: Veinte *(día en letras)* 20 *(día en números)* días del mes de Febrero *(mes en letras)* de 2025 *(Año)*

Entrega:

(Firma) _____
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

Recibe:

(Firma) _____
(Nombre)
CARGO
Area
Entidad

Powered by CamScanner

	ORDEN DE PEDIDO NO. 045	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 4 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA: Santana

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CARPA DE 4X4 METROS TIPO PIRÁMIDE, TECHO Y ESTRUCTURA - ELABORADA EN TUBO CUADRADO DE 1' PULGADA EN CALIBRE 18, PARALES EN 1 1/2 C -18/, FLANCHES DE 12CM DE DIÁMETRO X 3/16. PINTURA ELECTROSTÁTICA - LONA REFRENCIA VERANO COLOR A ELECCIÓN, 100% IMPERMEABLE, TOTALMENTE SELLADA PARA GARANTIZAR MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA	UND	1	$ 1.892.100	$ 1.892.100
KIT DE EMERGENCIAS (CAMILA REGLAMENTARIA + BOTIQUIN TIPO B + EXTINTOR ABX DE 20 LIBRAS)	UND	3	$ 685.000	$ 2.055.000
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
TOTAL				$ 3.947.100,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: KDMA SOLUCIONES INTEGRALES

FORMA DE PAGO: CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 17700003090

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requieren elementos de acuerdo a solicitudes realizadas por la interventoria con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 49	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 10 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. ENRIQUE GUZMAN

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA: _____

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE NACIONAL)

FECHA DE ENTREGA: _____ (DÍA) _____ (MES) _____ (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Suministro piso deck ecodeck WPC importado estructurado de 2,75 X .14 cm Y 2 cm de espesor, trafico comercial TEKA o CHOCOLTE. (100 listones)	M2	5,18	$ 160.000	$ 828.800
Suministro clip y tornillo para clip o grapa de fijacion para deck.	M2	5,18	$ 9.900	$ 51.282
Suministro clip y tornillo para clip o grapa de fijacion para deck.	Global	1	$ 120.000	$ 120.000
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		IVA	19%	$ 190.016
TOTAL				$ 1.190.097,58

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: SD GREENARQ SAS

FORMA DE PAGO: CUENTA DE AHORROS BANCO DE BOGOTA No. 274300185

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para mantenimiento de pisos en el Parque Nacional

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 50	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 10 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Ing. David Patiño

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE CIUDAD MONTES)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Canecas de 5 GL de pintura (koraza) color blanco - Cod Easy: 1437991	UN	2	$ 573.990	$ 1.147.980
Rodilla de 9" - Cod Easy: 2191245	UN	2	$ 13.100	$ 26.200
Rodillo de 4" - Cod Easy: 1128441	UN	2	$ 9.990	$ 19.980
Brocha de 4" - Cod Easy: 1153353	UN	2	$ 18.490	$ 36.980
Brocha de 2" - Cod Easy: 1153349	UN	2	$ 7.900	$ 15.800
Lija 180 por pliego - Cod Easy: 2185004	UN	4	$ 1.990	$ 7.960
Piso pared cerámico Oasis blanco 20x20cm	M2	2	$ 55.900	$ 111.800
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
TOTAL				$ 1.366.700,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: Cencosud Colombia S.A. (EASY)

FORMA DE PAGO: CREDITO

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para subsanar emergencia en el Parque Ciudad Montes en Shut de basuras y Enfermeria.
Se solicito 1m2 de piso pared ceramico oasis blanco 20x20cm pero se compran 2m2 debido al desperdicio (es lo mimino que vende el proveedor)

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 51	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 7 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE SAUZALITO)

FECHA DE ENTREGA: ( ) DÍA ( ) MES ( ) AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
RED AGUA FRIA				
UNIÓN PVC-P ø = 1-1/2"	UN	2	$ 2.993,28	$ 4.190,59
CODO 90° PVC-P ø = 1-1/2"	UN	4	$ 8.133,61	$ 22.774,11
REGISTRO ø = 1"-1/2"	UN	1	$ 49.327,74	$ 49.327,74
ADAPTADORES MACHO PVC-P ø = 1-1/2"	UN	2	$ 4.660,50	$ 6.524,70
TUBO PVC-P ø = 1-1/2"	M	1	$ 12.762,88	$ 12.762,88
RED AGUA CALIENTE				
REGISTRO ø = 1"-1/2"	UN	1	$ 109.201,69	$ 103.741,61
CODO 90° CPVC ø = 1-1/2"	UN	5	$ 33.694,96	$ 143.203,58
UNIÓN CPVC ø = 1-1/2"	UN	2	$ 29.390,76	$ 49.964,29
REDUCTOR CPVC DE ø = 1-1/2" A ø = 3/4"	UN	1	$ 12.369,75	$ 10.514,29
ADAPTADORES MACHO CPVC ø = 1-1/2"	UN	2	$ 29.964,12	$ 47.942,59
TUBO CPVC ø = 1-1/2" X 6 METROS	UND	1	$ 391.297,48	$ 332.602,86
UNIÓN CPVC ø = 3/4"	UN	10	$ 1.904,20	$ 13.329,40
TEE CPVC ø = 3/4"	UN	10	$ 3.731,09	$ 26.117,63
CODO 90° CPVC ø = 3/4"	UN	10	$ 3.210,00	$ 22.470,56
TUBO CPVC ø = 3/4" x3m	UND	7	$ 39.183,19	$ 191.997,63
SOLDADURA CPVC 1/8 GAL	UN	1	$ 68.657,98	$ 48.060,59
LIMPIADOR CPVC 1/8 GAL	UN	1	$ 30.102,52	$ 21.071,76
HOJA SEGUETA	UN	1	$ 4.621,85	$ 4.621,85
		IVA	19%	$ 211.131,55
TOTAL				$ 1.322.350,21

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: IMPOFGRIFOS

FORMA DE PAGO: CREDITO

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para atención de emergencia hidráulica en Parque Sauzalito

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 53	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 11 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA: Santana

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE NACIONAL)

FECHA DE ENTREGA: ( ) DÍA ( ) MES ( ) AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
GRICOL (CONJUNTO VALVULA PUSH LVM)	UN	2	$ 268.907,56	$ 537.815,12
GRICOL (VALVULA PUSH SANITARIO)	UN	10	$ 184.033,61	$ 1.840.336,10
CORONA (BULTO DE PEGANTE CERAMICA x 25kg	UND	1	$ 30.252,10	$ 30.252,10
BOQUILLA BLANCA X2 KG	UND	1	$ 13.613,44	$ 13.613,44
TUBO PRESION 1.1/4" X METRO	UND	3	$ 9.774,65	$ 29.323,95
UNION PRESION 1.1/4"	UN	10	$ 1.775,19	$ 17.751,90
CINTA TEFLON 3/4 MAESTRO	UN	1	$ 6.555,00	$ 6.555,00
SOLDADURA PVC 1/16	UN	1	$ 25.684,70	$ 25.684,70
LIMPIADOR PVC 1/8	UN	1	$ 21.071,76	$ 21.071,76
		IVA	19%	$ 479.256,77
TOTAL				$ 3.001.660,84

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: IMPOGRIFOS SAS

FORMA DE PAGO: CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N° 108900144719

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para subsanar emergencia hidraulica en baños Parque Nacional Enrique Olaya Herrera

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 57	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 13 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Ing. David Patiño

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE PIJAOS)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
FLETE ADICIONAL X 10.000 PESOS	UN	6	$ 10.290	$ 61.740
TUBO PVC PRESION 1.1/2PG X3M	UND	2	$ 37.490	$ 74.980
PEGACOR CERAMICO GRIS X 25 KG	UND	2	$ 36.990	$ 73.980
ARENA DE PEÑA CONCREX 40KG	UND	2	$ 11.890	$ 23.780
CEMENTO GRIS TP1CEMEX SUPERRESISTENTE50K	UND	1	$ 34.000	$ 34.000
ESTUCO INT PROFESIONAL 1/4GL PINTUCO	UND	1	$ 11.590	$ 11.590
VINILO T2 2.5GL VINILUX BLANCO	UN	1	$ 118.990	$ 118.990
REJILLA CON SOSCO 3X2 SILVER SILPLAS	UN	1	$ 8.490	$ 8.490
				$ -
			$ -	$ -
TOTAL				$ 407.550,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: Cencosud Colombia S.A. (EASY) **FORMA DEPAGO:** CREDITO

CENTRO DE COSTOS: Costo directo de obra

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para subsanar emergencia hidráulica en el Parque Pijaos en las baterias de baños hombres y mujeres de edificio de administración, acabados trabajos en cuarto electrico.

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 58	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 13 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Ing. David Patiño

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE PIJAOS)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
VALVULA SANITARIO PUSH ANTIVANDALICA	UN	4	$ 382.352,95	$ 1.529.411,80
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		IVA	19%	$ 290.588,24
TOTAL				$ 1.820.000,04

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: IMPOGRIFOS SAS **FORMA DE PAGO:** CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N° 108900144719

CENTRO DE COSTOS: Costo directo de obra

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para subsanar emergencia hidráulica en el Parque Pijaos en las baterias de baños hombres y mujeres de edificio de administración, acabados trabajos en cuarto electrico.

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 59	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 19 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. DAVID PATIÑO

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE PIJAOS)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Densidad y contenido de agua del suelo y suelo-agregado en el terreno empleando medidores nucleares	UN	1	$ 37.950	$ 37.950
Desplazamiento para toma de muestras	UN	1	$ 31.650	$ 31.650
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
		IVA	19%	$ 13.224
TOTAL				$ 82.824

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: CONCRELAB SAS **FORMA DE PAGO:** CREDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requieren ensayos de laboratorio a andenes en sub base granular en el Parque Pijaos

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 60	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 14 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA: Santana

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ESMALTE T2 1GL DOMESTICO VERDE ESMERALDA	UND	2	$ 88.490	$ 176.980
ANTICORROSIVO 1GL PINTUCO GRIS	UND	2	$ 70.490	$ 140.980
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
TOTAL				$ 317.960,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: Cencosud Colombia S.A. (EASY) **FORMA DE PAGO:** CREDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para mezcla de mortero para pega de bordillos en acceso rotonda Francisco de Orellana, senderos monumentos Fuente de León y La Virgen en en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera.

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 61	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 14 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE SAUZALITO)

FECHA DE ENTREGA: ( ) DÍA ( ) MES ( ) AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CIELORASOLISOBLANCONEV300X25CMX4UN	UND	20	$ 183.090	$ 3.661.800
TLLO CAB E/PLPTA BRO ZINC 8X1/2 X100 UD	UND	2	$ 8.390	$ 16.780
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
TOTAL				$ 3.678.580,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: Cencosud Colombia S.A. (EASY) **FORMA DE PAGO:** CREDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para atención de emergencia hidráulica en Parque Sauzalito

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 62	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 14 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE SAUZALITO)

FECHA DE ENTREGA: ( ) DÍA ( ) MES ( ) AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
RED AGUA FRIA				
UNION DE 1 1/2" PRESION	UN	2	$ 2.394,62	$ 4.789,24
CODO 1 1/2" PRESION	UN	4	$ 7.506,88	$ 30.027,52
VALVULA PCP 1.1/2 PVC PESADA	UN	1	$ 49.327,74	$ 49.327,74
ADAPTADOR MACHO PRESION 1.1/2"	UN	2	$ 3.728,40	$ 7.456,80
TUBO PRESION 1 1/2" X M	UND	1	$ 12.762,88	$ 12.762,88
RED AGUA CALIENTE				
CPVC CODO 1.1/2	UN	5	$ 10.325,46	$ 51.627,30
CPVC UNION 1.1/2	UN	2	$ 26.451,68	$ 52.903,36
CPVC BUJE SOLDADO 1.1/2 X 3/4	UN	1	$ 11.157,07	$ 11.157,07
CPVC UNION 3/4	UN	10	$ 1.823,36	$ 18.233,60
TEE CPVC ø = 3/4"	UN	10	$ 2.587,89	$ 25.878,90
CPVC CODO 3/4	UN	10	$ 2.868,06	$ 28.680,60
CPVC TUBO 3/4 *3m	UND	7	$ 31.346,55	$ 219.425,85
SOLDADURA LIQUIDA PARA AGUA CALIENTE 1/8	UND	1	$ 54.926,38	$ 54.926,38
LIMPIADOR REMOVEDOR 1/8	UND	1	$ 24.082,01	$ 24.082,01
CPVC ADAPTADOR MACHO 1.1/2	UND	2	$ 26.967,71	$ 53.935,42
VALVULA NAPOLI 1.1/2	UND	1	$ 109.201,69	$ 109.201,69
			$ -	$ -
		IVA	$ 0,19	$ 143.339,11
TOTAL				$ 897.755,47

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: IMPOGRIFOS SAS

FORMA DE PAGO: CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N° 108900144719

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para atención de emergencia hidráulica en Parque Sauzalito (baño hombres zona piscinas)

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

881

	ORDEN DE PEDIDO NO. 63	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 18 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA: santana

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA)

FECHA DE ENTREGA: 18 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ALQUILER MINI CARGADOR PARUQE NACIONAL	UND	15	$ 466.667	$ 7.000.005
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
TOTAL				$ 7.000.005,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: ASOCIADOS MELO OREJUELA **FORMA DE PAGO:** ANTIPADO DE CONTADO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Diferentes trabajos del parque nacional de movimientos de tierra y materiales

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

Grupo Bancolombia Clasificación - Interna

La confianza y la credibilidad

que ha depositado en nosotros nuestros
de ahorro y con nuestra asesoría
acompañándolo en el desarrollo de sus

2023

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **ASOCIADOS MELO OREJUELA SAS**, identificada con Nit **901748373-1**, a la fecha de expedición tiene los siguientes productos con el

NOMBRE PRODUCTO	No. PRODUCTO	FECHA DE APERTURA	ESTADO
CUENTA AHORROS	100-000100-96	2023/10/24	ACTIVA

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,

BANCOLOMBIA
Bogota - Of. 100 Bosa
Asesor de servicios Nº 159
Sucursal BOSA

Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8888 y en el resto del país al 01 800 09 12345

Bancolombia
le estamos poniendo el ahí

Powered by CamScanner

883

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

4. Número de formulario: 14944226186

(415)7707212489984(8020) 000001494226186

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 8 3 7 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: ASOCIADOS MELO OREJUELA SAS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CALLE 47 A BIS SUR 78 C 28

42. Correo electrónico: ASOCIADOSMELOOREJUELA@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 5 3 7 5 8 3 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 9 0	2 0 2 3 0 8 2 9	7 7 1 0	2 0 2 3 0 8 2 9	4 9 2 3			0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MELO ARANGO JHONATAN ALVEIRO

985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 15-01-2025 11:22:14AM

COPIA NO CONTROLADA

889

	ORDEN DE PEDIDO NO. 64	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 18 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA: Santana

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE NACIONAL)

FECHA DE ENTREGA: ____ (DÍA) ____ (MES) ____ (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
PINTURA TRAFICO 1GL AMARILLO TITO PABON	UN	5	$ 150.990	33,115%	$ 504.950
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
			$ -		$ -
TOTAL					$ 504.950,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: Cencosud Colombia S.A. (EASY) **FORMA DE PAGO:** CREDITO

FORMA DE PAGO: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para pintura en viga de baranda zona patinodormo del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 65	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 18 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA: Santana

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE NACIONAL)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1 METRO ARENA PEÑA	M	4	$ 120.000	$ 480.000
METRO MIXTO CON GRAVILLA GRUESA	M	6	$ 170.000	$ 1.020.000
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
TOTAL				$ 1.500.000,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR:	FERREDEPOSITO G Y G S.A.S	**FORMA DE PAGO:**	CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTÁ N°052416211
CENTRO DE COSTOS:	COSTO DIRECTO DE OBRA		

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para mezclar mortero de pega en actividad de bordillos en ladrillo zona senderos del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 66	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 19 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
SERVICIO DE GEOFONO	UND	1	$ 800.000	$ 672.269
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		IVA	19%	$ 127.731
TOTAL				$ 800.000

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: DIEGO CRUZ **FORMA DE PAGO:** CONTADO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere este estudio del geofono con el fin de determinar las posibles fugas de agua en las tuberias del parque estadio Olaya Herrera

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 67	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 20 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE SAUZALITO)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CPVC BUJE DE 1.1/2 X 3/4	UND	1	$ 12.368,00	$ 12.368,00
CPVC BUJE DE 1.1/2 X 1	UND	1	$ 15.378,00	$ 15.378,00
BULTO DE PEGACOR CERAMICA	UND	1	$ 30.252,10	$ 30.252,10
BOQUILLA 2KG BLANCO	UND	1	$ 22.208,88	$ 22.208,88
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		IVA	19%	$ 15.239,33
TOTAL				$ 95.446,31

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: IMPOGRIFOS SAS **FORMA DE PAGO:** CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°108900144719

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para atención de emergencia hidráulica en Parque Sauzalito

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 68	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 22 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE SAUZALITO)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
VALVULA ANTIVANDALICA PUSH PARA DUCHA B. PRESION LINEA PRESSMATIC	UN	5	$ 312.857,14	$ 1.564.285,70
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		IVA	19%	$ 297.214
TOTAL				$ 1.861.499,98

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: IMPOGRIFOS SAS **FORMA DE PAGO:** CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°108900144719

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECT DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para atención de emergencia hidráulica en baños hombres y baños mujeres del Parque Sauzalito

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 69	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 24 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. ENRIQUE GUZMAN

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE METROPOLITANO PORVENIR)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" Y 36". INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, INFORME ESCRITO DE DIAGNÓSTICO Y DVD CON VIDEO.TARIFAMINIMA 100M	ML	100	$ 10.000	$ 1.000.000
LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 8" Y 16" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE, NO INCLUYE SUMINISTRO DE AGUA. TARIFA MINIMA 100M	ML	100	$ 15.000	$ 1.500.000
AGUA EN EQUIPOCARROTANQUE DE 10 A 12M3	VIAJE	1	$ 350.000	$ 350.000
CARRO TANQUE IRRIGADOR DE AGUA- HORA STAND BY	HR	3	$ 70.000	$ 210.000
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			A=3%	$ 91.800,00
			I=3%	$ 91.800,00
			U=4%	$ 122.400,00
		IVA EN LA U	19%	$ 23.256
TOTAL				$ 3.389.256

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: Ditraing JyF S.A.S **FORMA DE PAGO:**

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECT DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere para intervencion sobre CRA 95A POR CALLE 54 SUR. Pozo inicial: ø 12" concreto sin refuerzo a Pozo ø14" concreto sin refuerzo. Al frente de modulo de baños (metalicos)

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 70	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 24 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE SAUZALITO)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CONEXION SUPERIOR PARA SANITARIO COMPLETA	UN	1	$ 113.445,38	$ 113.445,38
CPVC ADAPTADOR MACHO 3/4	UN	10	$ 2.376,00	$ 23.760,00
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		IVA	19%	$ 26.069
TOTAL				$ 163.274,40

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR:	IMPOGRIFOS SAS	**FORMA DE PAGO:**	CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°108900144719
CENTRO DE COSTOS:	COSTO DIRECTO DE OBRA		

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para atención de emergencia hidráulica en baños hombres y baños mujeres del Parque Sauzalito

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 71	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 24 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE SAUZALITO)

FECHA DE ENTREGA: ( ) DÍA ( ) MES ( ) AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LLAVE MANTENIMIENTO PARA VALVULA DE DESCARGA SANITARIO	UN	1	$ 163.865,55	$ 163.865,55
LLAVE MANTENIMIENTO PARA LAVAMANOS, ORINAl Y DUCHA	UN	1	$ 210.084,04	$ 210.084,04
LLAVE MANTENIEMIENTO PARA PUSH ANTIVANDALICO SANITARIO CORONA	UN	1	$ 126.050,43	$ 126.050,43
LLAVE MANTENIMIENTO PARA PUSH ANTIVANDALICO LAVAMANOS ORINAL CORONA	UN	1	$ 126.050,42	$ 126.050,42
CARTUCHO PUSH ANTIVANDALICO DOCOL PARA SANITARIO	UN	1	$ 168.067,23	$ 168.067,23
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		IVA	19%	$ 150.882,36
TOTAL				$ 945.000,03

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: IMPOGRIFOS SAS **FORMA DE PAGO:** CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°108900144719

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para atención de emergencia hidráulica en baños hombres y baños mujeres del Parque Sauzalito

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 52	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 10 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. ENRIQUE GUZMAN

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (CEFE TUNAL)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Mantenimiento preventivo para 3 equipos por seis meses	EQUIPOS	18	$ 336.210	$ 6.051.780
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		IVA	19%	$ 1.149.838
TOTAL				$ 7.201.618,20

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: OTIS

FORMA DE PAGO: CREDITO

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere mantenimiento ascensores

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 71	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 24 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE SAUZALITO)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LLAVE MANTENIMIENTO PARA VALVULA DE DESCARGA SANITARIO	UN	1	$ 163.865,55	$ 163.865,55
LLAVE MANTENIMIENTO PARA LAVAMANOS, ORINAI Y DUCHA	UN	1	$ 210.084,04	$ 210.084,04
LLAVE MANTENIEMIENTO PARA PUSH ANTIVANDALICO SANITARIO CORONA	UN	1	$ 126.050,43	$ 126.050,43
LLAVE MANTENIMIENTO PARA PUSH ANTIVANDALICO LAVAMANOS ORINAL CORONA	UN	1	$ 126.050,42	$ 126.050,42
CARTUCHO PUSH ANTIVANDALICO DOCOL PARA SANITARIO	UN	1	$ 168.067,23	$ 168.067,23
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		IVA	19%	$ 150.882,36
TOTAL				$ 945.000,03

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: IMPOGRIFOS SAS **FORMA DE PAGO:** CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°108900144719

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para atención de emergencia hidráulica en baños hombres y baños mujeres del Parque Sauzalito

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 72	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 25 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA: Santana

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE EL PORVENIR)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) | ( ) (MES) | ( ) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
TUBO PVC PRESION 3/4	UN	2	$ 24.458,24	$ 48.916,48
TUBO PVC PRESION 1/2	UN	4	$ 18.404,70	$ 73.618,80
BUJE PVC SOLDADO 1 X 3/4	UN	2	$ 977,04	$ 1.954,08
ADPATADOR MACHO PVC 3/4	UN	5	$ 633,52	$ 3.167,60
VALVULA PCP ROSCADO 3/4	UN	2	$ 20.420,17	$ 40.840,34
CODO PRESION 3/4"	UN	3	$ 812,35	$ 2.437,05
TEE PRESION 3/4	UN	1	$ 1.930,59	$ 1.930,59
BUJE SOLDADO PRESION 3/4" X 1/2"	UN	1	$ 701,68	$ 701,68
CODO PRESION 1/2"	UN	6	$ 507,64	$ 3.045,84
VALVULA PCP ROSCADA DE 1/2	UN	1	$ 16.470,59	$ 16.470,59
ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2"	UN	3	$ 349,91	$ 1.049,73
CINTA TEFLON 3/4 MAESTRO	UN	1	$ 6.555,00	$ 6.555,00
SOLDADURA PVC EN 1/8	UN	1	$ 41.550,58	$ 41.550,58
LIMPIADOR REMOVEDOR 1/8	UN	1	$ 21.072,00	$ 21.072,00
			$ -	$ -
		IVA	19%	$ 50.028,97
TOTAL				$ 313.339,33

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: IMPOGRIFOS SAS **FORMA DE PAGO:** CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA N°108900144719

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para atención de emergencia **hidráulica en baños hombres y baños** mujeres del Parque El Porvenir

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 73	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 25 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA: Santana

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE EL PORVENIR)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
SV FLETE ADICIONAL X 10.000 PESOS	UN	9	$ 10.290	$ 92.610
ARENA DE PEÑA CONCREX 40KG	UN	20	$ 11.890	$ 237.800
CEMENTO GRIS TP1CEMEX SUPERRESISTENTE50K	UN	5	$ 34.000	$ 170.000
ANTICORROSIVO 1GL GRIS BLER	UN	2	$ 69.990	$ 139.980
ANTICORROSIVO+ESM.BTE 1GL GRIS BLER	UN	2	$ 81.990	$ 163.980
LIJA AGUA 120 PLIEGO ABRACOL	UN	10	$ 1.990	$ 19.900
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
TOTAL				$ 824.270,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: Cencosud Colombia S.A. (EASY) **FORMA DE PAGO:** CREDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para atención de emergencia hidráulica en baños hombres y baños mujeres del Parque El Porvenir

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 74	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 26 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JOHN CUELLAR

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE SAUZALITO)

FECHA DE ENTREGA: ( ) (DÍA) ( ) (MES) ( ) (AÑO)

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
PERFIL ANGU ESCUALIZABLE UNIONBLANX3.0M	UN	4	$ 23.490,00	$ 93.960,00
				$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
TOTAL				$ 93.960,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: Cencosud Colombia S.A. (EASY) **FORMA DE PAGO:** CREDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para atención de emergencia hidráulica en baños hombres y baños mujeres del Parque Sauzalito

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 75	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 25 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. ENRIQUE GUZMAN

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE EL PORVENIR)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Red perimetral de 34m de alto por 10m de ancho grosor de 3 milímetros color negro, cuadros de 13cm por 13cm en nylon impermeabilizado color negro	UND	340	$ 8.700	$ 2.958.000
Servicio de instalación red perimetral con guaya, tensores, andamios básicos, mano de obra y materiales de instalación	UND	1	$ 1.360.000	$ 1.360.000
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		ANTICIPO		$ 1.818.000
TOTAL				$ 2.500.000,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: Mallas Deportivas GYO **FORMA DE PAGO:** ANTICIPO , PAGAR SALDO PENDIENTE

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para atención de emergencia solicitud derecho de peticion por parte del IDRD a comunidad del Parque Porvenir

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 76	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 26 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. ENRIQUE GUZMAN

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE SAUZALITO)

FECHA DE ENTREGA: ( ) DÍA ( ) MES ( ) AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Suministro e instalación de motobomba de turbina TH 500 marca IHM con motor de 5 HP para caldera. Con una eficiencia de 45 galones por minuto y 200 PSI	GLOBAL	1	$ 9.500.000	$ 9.500.000
				$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		ANTICIPO 50%		-$ 4.750.000
TOTAL				$ 4.750.000,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR:	OSCAR GARZON CASTRO	**FORMA DE PAGO:**	ANTICIPO 50% , PAGAR SALDO PENDIENTE
CENTRO DE COSTOS:	COSTO DIRECTO DE OBRA		

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para atención de emergencia hidráulica cuarto de maquinas piscinas del Parque Sauzalito

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 77	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 26 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. ENRIQUE GUZMAN

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE COMETAS)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO LAMINADO TEMPLADO INCOLORO 6+6 PULIDO PLANO	UND	1	$ 4.950.000	$ 4.950.000
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
TOTAL				$ 4.950.000,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR:	TOCETOS Y FACHADAS S.A.S	**FORMA DE PAGO:**	CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 689-000041-90
CENTRO DE COSTOS:	COSTO DIRECTO DE OBRA		

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para atención de emergencia piscinas del Parque Cometas

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

900

	ORDEN DE PEDIDO NO. 78	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 27 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. JOHN SANTANA

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA: Santana

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE NACIONAL)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
PINTURA TRAFICO 1GL AMARILLO TITO PABON	UND	2	$ 150.990	$ 301.980
SV FLETE ADICIONAL X 10.000 PESOS	UND	5	$ 10.290	$ 51.450
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
TOTAL				$ 353.430,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: Cencosud Colombia S.A. (EASY) **FORMA DE PAGO:** CREDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para pintura en bordillo en baranda zona patinodromo del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 79	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 27 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. DAVID ORTIZ

AREA QUE SOLICITA: COMPRAS FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
mesa plegable polietileno 180x75x74 cm blanco	UN	5	$ 189.832	$ 949.160
vd sillon pc resp bajo ng	UN	9	$ 159.900	$ 1.439.100
horno microondas whirlpool 0.7pc silver wm1807d	UN	1	$ 349.900	$ 349.900
mesa plegable polietileno 80x60x67 cm blanco	UN	2	$ 94.690	$ 189.380
silla plastica con brazos cipres wengue	UN	4	$ 31.900	$ 127.600
Flete	UN	1	$ 49.700	$ 49.700
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
TOTAL				$ 3.104.840

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: SODIMAC COLOMBIA S.A (HOMECENTER) **FORMA DE PAGO:** CREDITO

CENTRO DE COSTOS: ADMINISTRACIÓN

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requiere material en referencia para oficina del contrato IDRD 4060 - 2024

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 080	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 28 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. DAVID PATIÑO

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE PIJAOS)

FECHA DE ENTREGA: ( ) DÍA ( ) MES ( ) AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Determinación del límite líquido - límite plástico e índice de plasticidad de los suelos	UN	1	$ 51.700	$ 51.700
Análisis granulométrico de los agregados grueso y fino	UN	1	$ 64.900	$ 64.900
Relaciones de humedad - peso unitario seco en los suelos (ensayo modificado de compactación)(Gs)	UN	1	$ 125.000	$ 125.000
CBR de suelos compactados en el laboratorio (incluye proctor modificado)	UN	1	$ 244.950	$ 244.950
Resistencia del agregado grueso a la degradación por abrasión utilizando el aparato micro-deval	UN	1	$ 140.000	$ 140.000
Resistencia a la degradación de los agregados de tamaños mayores de 3/4" máquina de los ángeles	UN	1	$ 115.000	$ 115.000
Desplazamiento para recolección de muestras	UN	1	$ 31.650	$ 31.650
				$ -
				$ -
				$ -
		IVA	19%	$ 146.908
TOTAL				$ 920.108,00

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: CONCRELAB SAS **FORMA DE PAGO:** CREDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requieren ensayos de laboratorio a andenes en sub base granular en el Parque Pijaos

Firma Solicitante Director de Obra

Aprobación Director de compras

Aprobación Gerente de proyectos

	ORDEN DE PEDIDO NO. 81	CÓD	BZC-FO-4-13-A
		VERSIÓN	2

FECHA: 28 (DÍA) | 2 (MES) | 2025 (AÑO)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. DAVID PATIÑO

AREA QUE SOLICITA: TÉCNICA FIRMA:

PROYECTO SOLICITANTE: IDRD CONTRATO 4060 - 2024 (PARQUE PIJAOS)

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DETALLADA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Densidad y peso unitario del suelo en el terreno por el método del cono y arena	UN	1	$ 45.000	$ 45.000
Desplazamiento para toma de muestras	UN	1	$ 31.650	$ 31.650
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
		IVA	19%	$ 14.564
TOTAL				$ 91.214

OBSERVACIONES ADICIONALES:

PROVEEDOR: CONCRELAB SAS **FORMA DE PAGO:** CREDITO

CENTRO DE COSTOS: COSTO DIRECTO DE OBRA

2. APROBACIÓN DE LA COMPRA

Justificación: Se requieren ensayos de laboratorio a andenes en sub base granular en el Parque Pijaos

Firma Solicitante Director de Obra	Aprobación Director de compras	Aprobación Gerente de proyectos

ANEXO 6

SEGUIMIENTO A LOS ENSAYOS

SEGUIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS

Código	FOI-CI-062
Versión	1
Fecha	14/08/2025

PROYECTO: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD"
GRUPO 2: "Mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

CONTRATISTA: CONSORCIO SECTOR IDRD 1

INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 24

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MATERIAL A INSPECCIONAR	ENSAYOS O PRUEBAS	NORMA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	REGISTRO	FRECUENCIA	SEGUIMIENTO A CANTIDADES: FRENTE DE OBRA	SEGUIMIENTO A CANTIDADES: ACUMULADO AL MES	SEGUIMIENTO A CANTIDADES: UNID	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO: CUMPLE: SI	CUMPLE: NO	CUMPLE: N/A	EVIDENCIA: CERTIFICADO/DOCUMENTO	EVIDENCIA: ENSAYO	MATERIAL INGRESADO AL PROYECTO: 25 AL 30 NOV DE 2024: CANT.	UND.	PROVEEDOR	PARQUE / FRENTE	OBSERVACIÓN	1 AL 31 DE DIC DE 2024: CANT.	UND.	PROVEEDOR	PARQUE / FRENTE	OBSERVACIÓN	1 AL 31 DE ENE DE 2025: CANT.	UND.	PROVEEDOR	PARQUE / FRENTE	OBSERVACIÓN	1 AL 28 DE FEB DE 2025: CANT.	UND.	PROVEEDOR	PARQUE / FRENTE	OBSERVACIÓN
RELLENOS	Ing. Residente y Profesional de la Calidad	Rellenos SUBG o similares	**Humedad**			Registros de laboratorio	Una (1) cada 5000 m³ o fracción	N/A	N/A	N/A																											
			Desgaste de Angeles (in los angeles (Graduación A), maximo(%)	E-218	50																															
			LOD rendidores																																	
			Degradación para abrasivos e equipo Micro Deval, máximo (%)	E-238	-	30	30																													
			Plasticidad																																	
			Partículas en arrenjo de pilticas en solidos, maximo (%)	E-220	12	12	12																													
			Sulfato de solido		18	18	18																													
			Sulfato de magnesio																																	
			Plasticidad																																	
			Limite Liquido, maximo (%)	E-125	25	25	25																													
			Indice de Plasticidad, maximo (%)	E-125 / E-126	6	6	6																													
			Equivalente de arena, minimo (%)	E-133	25	25	25																													
			Cubierta de terrones de arcilla y particulas deleznables, maximo (%)	E-211	2	2	2																													
			Durabilidad																																	
			Perdidas en ensayo de sulfato, maximo (%)	E-220	18	18	18																													
			Caras fracturadas, minimo (%)	E-227	90	75	50	100	75																											
			Angularidad de la fracción fina, minimo (%)	E-239	-	30																															
			ICBR (%) Previamiss ejecutar el ajuste de compactación, hasta alcanzar humedad (OCC.2.2.2.), el ICBR se medirá sobre las muestras compactadas previamente a cuatro días de inmersión.	E-148	80	80	> 100																													
			Granulometría	ART 211 de las especificaciones de IDRD	Dentro de los límites de la curva granulométrica de las especificaciones																																	
			Densidad en campo																																	
			Humedad

| | | |

| | | |

ANEXO 6

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ANEXO 6

CERTIFICADOS DE CALIDAD MALLA ELECTROSOLDADA

AM FERRETERÍA
ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S.

NIT. 900,034,102

calle 7 # 37A-05

NTC 5806
Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil

Resolución 0277 de 2015
Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil


REPORTE DE CALIDAD
Informe de Ensayos Mecánicos de Malla Electrosoldada

FQ1201 | Fecha Rev:18-12-17 | Version: 1

Fecha de Emision : 27/02/2025
Cliente:

Descripcion de la muestra	
N° de Ensayo	3345-1
Referencia de Malla	XX-188
Diámetro de Grafil Long:	6,0
Diamentro de Grafil Transv:	6,0
Fecha de Producción de la Malla	22/02/2025
Fecha de recepcion de muestra	22/02/2025
Fecha de Ensayo	22/02/2025

ENSAYO DE RESISTENCIA AL CORTE EN LA SOLDADURA		
N° ENSAYO	CARGA (N)	LUGAR DE FALLA
1	14.899	Grafil
2	13.097	Soldadura
3	8.528	Grafil
4	15.305	Soldadura
5		
Promedio	12.957	
Requisito de Norma NTC 5806 N° 8.2	6.814	U (Kg-f)
CUMPLE (SI/NO)	SI	3

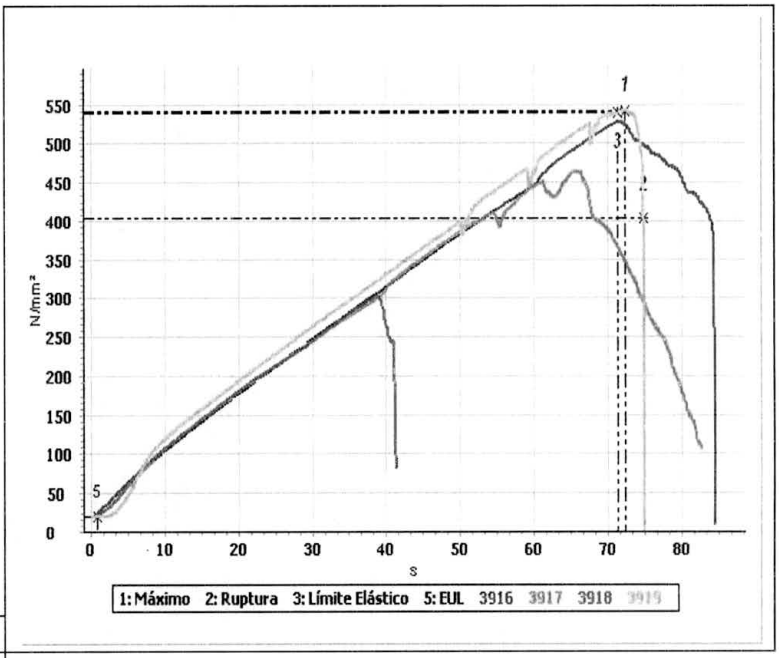

ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

N° DE BARRAS (Requisito Norma NTC 5806-2019 N°10.7)			
TIPO	OBTENIDO	REQUISITO	CUMPLE (SI/NO)
Longitudinales	16	16	SI
Transversales	40	40	SI

LONGITUD TOTAL DEL GRAFIL (Requisito Norma NTC 5806-2019 N° 10)			
TIPO	OBTENIDO (mm)	REQUISITO (±25mm)	CUMPLE (SI/NO)
Longitudinales	5.975	**6.000**	SI
Tranversales	2.340	**2.350**	SI

SEPARACION DE LOS GRAFILES (Requsito Norma NTC 5806-2019 N°11)			
	OBTENIDO (mm)	REQUISITO (mm)	CUMPLE (SI/NO)
Longitudinales	150	150	SI
Transversales	150	150	SI

MEDICION DE PELOS (Requsito Norma NTC 5806-2019 N°10.3)				
TIPO	PROMEDIO OBTENIDO (mm)	REQUISITO (mm)	CUMPLE (SI/NO)	METODO DE ENSAYO
Longitudinales	79	75	SI	(NTC 5806-2019 N° 10.3) (±13mm)
Tranversales	40	50	SI	(NTC 5806-2019 N° 10.3) (±13mm)

Condiciones Ambientales			
Temperatura promedio °C	22.2	Humedad Relativa promedio (%HR)	50,0

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas grafil y 7000 m2 para Malla.

AM FERRETERÍA ANDRÉS MARTINEZ S. A. S. NIT. 900 034 102 Aprueba:

Realizó: Juliana Cuervo Soler
LABORATORISTA
Juliana Cuervo Soler

Revisa:
CALIDAD
Ing. Sebastian Olave

JEFE DE CALIDAD
Ing. Sebastian Olave

911

AMFERRETERÍA
ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S.
UNA EMPRESA DE ÉXITO Y EXCELENCIA

NIT. 900,034,102
calle 7 # 37A-05

REPORTE DE CALIDAD

Informe de Ensayos Mecánicos Grafil

NTC-5806 Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil.

Resolución 0277 de 2015 Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil.

FQ1201 | Fecha Rev: 18-12-17 | Versión 1


Fecha Emisión Certificado 11/02/2025

Cliente:

Características de la Muestra Ensayada

DESCRIPCION	MUESTRA GRAFIL
Informe N°	4412
Diametro de Grafil (mm)	6,0
Lote	2629
Fecha de Fabricación	5/02/2025
Fecha de recepcion de la muestra	5/02/2025
Fecha de Ensayo	5/02/2025
Longitud de la Muestra (mm)	400

GRAFICA DE ENSAYO DE TENSIÓN

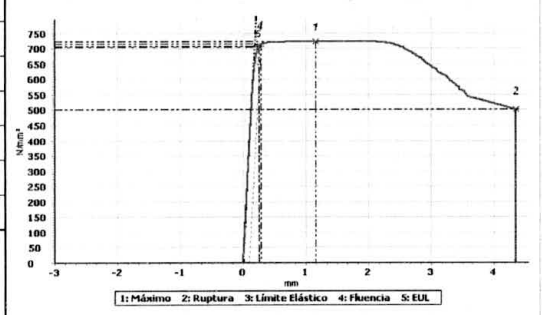

Condiciones ambientales de los ensayos

Temperatura promedio °C	22,1			Humedad relativa (HR%)		43,0	
DESCRIPCION	UNIDAD	UND	U	MUESTRA GRAFIL		REQUISITOS	
				Nominal	6	NTC 5806-2019	CUMPLE (SI/NO)
Diámetro	mm	U (mm)	0,0003	6,0	6,0	Tabla N° 6	SI
Peso	g/m	U (g)	0,0422	222	211,40	7.2.7.1	SI
Promedio altura resaltes	mm	U (mm).	0,031	0,27	0,37	7.2.4.4	SI
Espaciamiento entre resaltes	mm	U (mm.).	0,058	4,62 a 7,24	6,30	7.2.4.6	SI
Espaciamiento longitudinal por pulgada de resaltes	N/A	U (mm.).	0,058	3,5 a 5,5	4,00	7.2.4.3	SI
Ángulo resaltes	°	U (°)	0,00092	Min 45°	55	7.2.4.5	SI
Resaltes en direccion inversa	N/A	N/A	#N/D	N/A	N/A	7.2.4.5	SI
Area superficial grafilada	%	U (mm)	0,058	Min 25%	28	7.2.4.1	SI
Lineas de resaltes	Unidad	U (mm)	0,058	Min 2	3	7.2.4.2	SI

CALIDAD, ACABADO Y APARIENCIA		
Libre de Imperfecciones perjudiciales y buen acabado superficial	7.4.1	SI
Libre de óxido.	7.4.2- 7.4.3	SI

PROPIEDADES MECANICAS DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DE LA PRUEBA		UNIDAD	UND	U	VALORES		REQUISITOS	
					Especificado	Obtenido	METODO DE ENSAYO	CUMPLE (SI/NO)
TRACCION	Esfuerzo Máximo de Tracción	Mpa	U (Kg-f)	3	550	722	NTC 5806- Tabla 9 NTC 3353	SI
FLUENCIA	Resistencia a la Fluencia	Mpa	U (Kg-f)	3	485	702	NTC 5806- Tabla 9 NTC 3353	SI
DOBLADO	Grados	°			90	90	NTC 3353	SI

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas.

AM FERRETERÍA NIT. 900.034.102-1

Realiza:
LABORATORISTA
Juliana Cuervo Soler

Revisa:
CALIDAD
Ing.Sebastian Olave

Aprueba:
JEFE DE CALIDAD
Ing.Sebastian Olave

912

AMFERRETERÍA
ANDRES MARTINEZ S. A S.
UNA EMPRESA DE EXITO Y EXCELENCIA

NIT. 900,034,102
calle 7 # 37A-05

REPORTE DE CALIDAD

Informe de Ensayos Mecánicos Grafil

NTC-5806 Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil .

Resolución 0277 de 2015 Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil .

FQ1201 | Fecha Rev: 18-12-17 | Versión 1


Fecha Emisión Certificado 5/02/2025

Cliente:

Caracteristicas de la Muestra Ensayada

DESCRIPCION	MUESTRA GRAFIL
Informe N°	4411
Diametro de Grafil (mm)	6,0
Lote	2628
Fecha de Fabricación	4/02/2025
Fecha de recepcion de la muestra	4/02/2025
Fecha de Ensayo	4/02/2025
Longitud de la Muestra (mm)	400

GRAFICA DE ENSAYO DE TENSIÓN

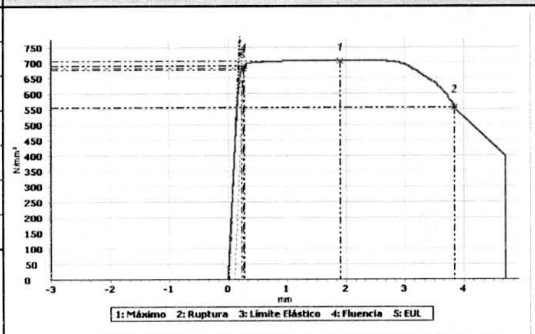

Condiciones ambientales de los ensayos

Temperatura promedio °C	22.1			Humedad relativa (HR%)		41,0	
DESCRIPCION	UNIDAD	UND	U	MUESTRA GRAFIL		REQUISITOS	
				Nominal	6	NTC 5806-2019	CUMPLE (SI/NO)
Diámetro	mm	U (mm)	0,0003	6,0	6,0	Tabla N° 6	SI
Peso	g/m	U (g)	0,0422	222	210,47	7.2.7.1	SI
Promedio altura resaltes	mm	U (mm).	0,031	0,27	0,38	7.2.4.4	SI
Espaciamiento entre resaltes	mm	U (mm.).	0,058	4,62 a 7,24	6,30	7.2.4.6	SI
Espaciamiento longitudinal por pulgada de resaltes	N/A	U (mm.).	0,058	3,5 a 5,5	4,00	7.2.4.3	SI
Angulo resaltes	°	U (°)	0,00092	Mín 45°	55	7.2.4.5	SI
Resaltes en direccion Inversa	N/A	N/A	#N/D	N/A	N/A	7.2.4.5	SI
Area superficial grafilada	%	U (mm)	0,058	Mín 25%	28	7.2.4.1	SI
Lineas de resaltes	Unidad	U (mm)	0,058	Mín 2	3	7.2.4.2	SI

CALIDAD, ACABADO Y APARIENCIA		
Libre de Imperfecciones perjudiciales y buen acabado superficial	7.4.1	SI
Libre de óxido.	7.4.2- 7.4.3	SI

PROPIEDADES MECANICAS DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DE LA PRUEBA		UNIDAD	UND	U	VALORES		REQUISITOS	
					Especificado	Obtenido	METODO DE ENSAYO	CUMPLE (SI/NO)
TRACCION	Esfuerzo Máximo de Tracción	Mpa	U (Kg-f)	3	550	706	NTC 5806- Tabla 9 NTC 3353	SI
FLUENCIA	Resistencia a la Fluencia	Mpa	U (Kg-f)	3	485	682	NTC 5806- Tabla 9 NTC 3353	SI
DOBLADO	Grados	°			90	90	NTC 3353	SI

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas.

AM FERRETERÍA ANDRES MARTINEZ S.A.S. NIT. 900.034.102-1

Realiza:
Juliana Cuervo Soler
LABORATORISTA
Juliana Cuervo Soler

Revisa:
CALIDAD
Ing.Sebastian Olave

Aprueba:
JEFE DE CALIDAD
Ing.Sebastian Olave

DIACO

REMISION/REMISSION
1001-29462

FACDIAN
3V-102613

FECHA/DATE
22 ENE 2025

RAZON SOCIAL DIACO S.A. NIT 8918001115
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 364 DE MARZO 18 DE 1986 DE 1996
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION No. 000076 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016

INFORMACION DEL CLIENTE/ INFORMATION OF THE CLIENT

RAZON SOCIAL / SOCIAL REASON: CENCOSUD NORTE

NIT / IDENTIFICATION: 900155107-1 — TELEFONO / TELEPHONE: 7448235 EXT 7

DIRECCION / ADDRESS: CLL 175 22 13

INFORMACION DEL DESTINATARIO / INFORMATION OF THE ADDRESSEE

NOMBRE / NAME: CENCOSUD NORTE

CODIGO CLIENTE / CUSTNUMBER: 200000513 — TELEFONO / TELEPHONE: 7448235 EXT 7

DIRECCION / ADDRESS: CLL 175 22 13

VENDEDOR/SALER CODE	LUGAR DE DESPACHO/SHIP FROM	ENTREGA/DELIVERY AT	SEGURO/INSURANCE	FLETE/FREIGHT
051	CO-ML-Muña	BOGOTÁ D.C.	DIACO S.A.	

ORDEN/BUY ORDER	PEDIDO No/ORDER NUMBER	FECHA/DATE	CONDICIONES DEPAGO/PAYMENT	MONEDA/CURRENCY	COD. INTERNO/CODE
6508230311	0011004057	17.01.2025	15 día, fecha factura	COP	8131525097

CANTIDAD / QUANTITY	U.MEDIDA / U.MEASURE	DESCRIPCION / DESCRIPTION
420,00	UN	119000036 MALLA STD NTC 5806 XX084 (M084)

Señor conductor debe tener en cuenta: no pernoctar en carretera. Movilizarse únicamente de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.
KG:. 7896.00

ESTA TRANSACCION SE ENTIENDE PERFECCIONADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA EN:CO-ML-Muña

RECIBE	IDENTIFICACION	PLACA VEHICULO	AUTORIZADO POR
ALIRIO MENDOZA	100001421	CDP980	TRANSPORTE MINERIA Y CONSTRUCCION

OBSERVACIONES

COLADAS: 1726580504

TRANSPORTE: 0014845423 (1 de 1)
6508230311

Declaro haber recibido el cargamento descrito en la presente factura para ser entregado según las instrucciones, con el mismo peso y estado en que se encuentran.

Autorizo a la EMPRESA o a quien ella designe, para hacer registros fotográficos, filmaciones, grabaciones o inspecciones, durante el tránsito de las mercancías desde su origen hasta su destino, con el fin de ejercer mayor control por parte del área de Logística.

FIRMA TRANSPORTADOR
RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL MATERIAL CON SU RESPECTIVA ETIQUETA

FIRMA DE QUIEN ELABORA
IT SIGNS OF WHO ELABORATES

FIRMA DE QUIEN AUTORIZA
IT SIGNS OF WHO AUTHORIZES

FIRMA DE QUIEN RECIBE
IT SIGNS AND STAMP OF THE RECEIVER
RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL MATERIAL CON SU RESPECTIVA ETIQUETA Y REPORTE DE ENSAYOS DE CALIDAD

91A

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Autopista Sur Km 25 Via Bogota, Sibate, Colombia.
C.P - 250058 Tel/Fax: 3118760266

N°: 10018131525097

CLIENTE	FACTURA	N° PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
CENCOSUD NORTE	**9007623818/10**	**6508230311**	**11004057/000010**	**NTC 5806**	**7.896**

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo			
119000036	MALLA STD NTC 5806 XX084 (M084)	1726580504	NA	0,09	0,52	0,011	0,028	0,14	0,21	0,07	0,12	0,02			
Rangos de referencia según norma															

PROPIEDADES MECÁNICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R. Corte	Doblado	Masa Lineal		Espaci	Altura			
119000036	MALLA STD NTC 5806 XX084 (M084)	1726580504	XX084	672	649	5400	BUENO	0,095		5,20	0,47			
Rangos de referencia según norma				mín 485,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1.528 N								

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

SIBATÉ, 23.01.2025

IVAN ANDRES PORTILLO CUADROS

915

DIACO

REMISION/REMISSION
1001-29461

FACDIAN
3V-102612

FECHA/DATE
22 ENE 2025

RAZON SOCIAL DIACO S.A. NIT 8918001115
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 364 DE MARZO 18 DE 1986 DE 1996
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION No. 000076 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016

INFORMACION DEL CLIENTE/ INFORMATION OF THE CLIENT

RAZON SOCIAL / SOCIAL REASON: CENCOSUD NORTE

NIT / IDENTIFICATION: 900155107-1 — TELEFONO / TELEPHONE: 7448235 EXT 7

DIRECCION / ADDRESS: CLL 175 22 13

INFORMACION DEL DESTINATARIO / INFORMATION OF THE ADDRESSEE

NOMBRE / NAME: CENCOSUD NORTE

CODIGO CLIENTE / CUSTNUMBER: 200000513 — TELEFONO / TELEPHONE: 7448235 EXT 7

DIRECCION / ADDRESS: CLL 175 22 13

VENDEDOR/SALER CODE	LUGAR DE DESPACHO/SHIP FROM	ENTREGA/DELIVERY AT	SEGURO/INSURANCE	FLETE/FREIGHT
051	CO-ML-Muña	BOGOTÁ D.C.	DIACO S.A.	

ORDEN/BUY ORDER	PEDIDO No/ORDER NUMBER	FECHA/DATE	CONDICIONES DEPAGO/PAYMENT	MONEDA/CURRENCY	COD. INTERNO/CODE
6508230308	0011004061	17.01.2025	15 día, fecha factura	COP	8131525098

CANTIDAD / QUANTITY	U.MEDIDA / U.MEASURE	DESCRIPCION / DESCRIPTION
420,00	UN	119000036 MALLA STD NTC 5806 XX084 (M084)

Señor conductor debe tener en cuenta: no pernoctar en carretera. Movilizarse únicamente de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.
KG:. 7896.00

ESTA TRANSACCION SE ENTIENDE PERFECCIONADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA EN:CO-ML-Muña

RECIBE	IDENTIFICACION	PLACA VEHICULO	AUTORIZADO POR
JAIRO MENDOZA	100001421	BYB920	TRANSPORTE MINERIA Y CONSTRUCCION

OBSERVACIONES

COLADAS: 1726580504

TRANSPORTE: 0014845422 (1 de 1)
6508230308

Declaro haber recibido el cargamento descrito en la presente factura para ser entregado según las instrucciones, con el mismo peso y estado en que se encuentran.

Autorizo a la EMPRESA o a quien ella designe, para hacer registros fotográficos, filmaciones, grabaciones o inspecciones, durante el tránsito de las mercancías desde su origen hasta su destino, con el fin de ejercer mayor control por parte del área de Logística.

FIRMA TRANSPORTADOR
RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL MATERIAL CON SU RESPECTIVA ETIQUETA

FIRMA DE QUIEN ELABORA
IT SIGNS OF WHO ELABORATES

FIRMA DE QUIEN AUTORIZA
IT SIGNS OF WHO AUTHORIZES

FIRMA DE QUIEN RECIBE
IT SIGNS AND STAMP OF THE RECEIVER
RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL MATERIAL CON SU RESPECTIVA ETIQUETA Y REPORTE DE ENSAYOS DE CALIDAD

916

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Autopista Sur Km 25 Via Bogota, Sibate, Colombia.
C.P - 250058 Tel/Fax: 3118760266

N°: 10018131525098

CLIENTE	FACTURA	N° PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
CENCOSUD NORTE	**9007623812/10**	**6508230308**	**11004061/000010**	**NTC 5806**	**7.896**

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo			
119000036	MALLA STD NTC 5806 XX084 (M084)	1726580504	NA	0,09	0,52	0,011	0,028	0,14	0,21	0,07	0,12	0,02			
	Rangos de referencia según norma														

PROPIEDADES MECÁNICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R. Corte	Doblado	Masa Lineal		Espaci	Altura			
119000036	MALLA STD NTC 5806 XX084 (M084)	1726580504	XX084	672	649	5400	BUENO	0,095		5,20	0,47			
	Rangos de referencia según norma			mín 485,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1.528 N								

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

SIBATÉ, 23.01.2025

IVAN ANDRES PORTILLO CUADROS

DIACO

ANEXO 6

CERTIFICADOS DE CALIDAD TUBERIA SANITARIA, VENTILACIÓN, GRIFERÍA Y ACCESORIOS

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBERÍA PRESIÓN AGUA POTABLE

Fabricado por **P.V.C. GERFOR S.A.**, en la **Autopista Medellín kilómetro 2, 600 m, vía Parcelas, Cota, Cundinamarca, Colombia**

Manufactured by **P.V.C. GERFOR S.A.**, in the **Autopista Medellín kilómetro 2, 600 m, vía Parcelas, Cota, Cundinamarca, Colombia**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 382 (2018)

Plásticos. Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) clasificados según la presión (serie RDE)

Plastics. Poly (vinyl chloride) (PVC) pressure rated pipes (SDR series).

SECTOR ICS: 23.040.20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the " R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC-0034-1

Certificate

Fecha de Aprobación:	1992-05-06	**Fecha Última Modificación:**	
Approval Date:		Last Modification Date:	
Fecha de Renovación:	2023-08-15	**Fecha de Vencimiento:**	2029-08-16
Renewal Date:		Expiration Date:	

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ID # 0677

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

F-PS-628
Versión 00

919

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

ACCESORIOS PARA TUBERÍA SANITARIA Y VENTILACIÓN

Fabricado por **P.V.C. GERFOR S.A.**, en la **Autopista Medellín kilómetro 2, 600 m, vía Parcelas, Cota, Cundinamarca, Colombia**

Manufactured by **P.V.C. GERFOR S.A.**, in the **Autopista Medellín kilómetro 2, 600 m, vía Parcelas, Cota, Cundinamarca, Colombia**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 1341 (2006)

Accesorios de poli (cloruro de vinilo) (PVC) rígido para tubería sanitaria-aguas lluvias y ventilación

Poly (vinyl chloride) (PVC) waste and vent fittings.

SECTOR ICS: 23.040.20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the " R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC-0034-6
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	1997-12-17	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2023-08-15	**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2029-08-16

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ID # 0677

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

920

Sello con Reglamento Técnico

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

GRIFERÍA, VÁLVULAS Y ACCESORIOS

Fabricado por **GRICOL S.A.**, en la **Carrera 34 No. 8A-15 Bogotá D.C, Colombia,**

identificada con **número de NIT 830.092.830-1**

Manufactured by **GRICOL S.A.**, in the **Carrera 34 No. 8A-15 Bogotá D.C, Colombia,**

identified with **NIT number 830.092.830-1**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Reglamento técnico de tuberías y accesorios
Technical regulation about pipes and accessories

SECTOR ICS 91.140.70

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the " R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2022-10-07	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	2023-12-26
Fecha de Renovación: Renewal Date:		**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2028-10-06

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17065 PRODUCT CERTIFICATION BODY ID # 0677

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC, Calle 26 # 69-79, Torre 4 "Agua", "Centro Empresarial Elemento". Bogotá D.C., Colombia

921

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-2103-11SD Monomando lavamanos bajo Vivaldi	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-2106-11SD Monomando lavamanos alto Vivaldi	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-2203-11 Monomando lavamanos bajo Tiffany	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-2603-11 Monomando lavamanos bajo Sion	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-2606-11 Monomando lavamanos alto Sion	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

422

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-3303-11 Monomando lavamanos bajo Kurven	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 6 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-3306-11 Monomando lavamanos alto Kurven	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 6 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-3403-11 Monomando lavamanos bajo Vicctor	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 6 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	GS-2103-11 Monomando lavamanos bajo Vivaldi	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-2103-11BC Monomando Lavamanos Bajo Vivaldi Bajo Consumo	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-2103-11SDE Monomando lavamanos bajo Vivaldi	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	GS-2106-11 Monomando lavamanos alto Vivaldi con complementos	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-2106-11BC Monomando Lavamanos alto Vivaldi Bajo Consumo	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-2106-11SDE Monomando lavamanos alto Vivaldi	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	GS-2203-11 Monomando lavamanos bajo Tiffany	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	GS-2603-11 Monomando lavamanos bajo Sion	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-2603-11BC Monomando Lavamanos bajo Sion Bajo Consumo	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-2603-11E Monomando lavamanos bajo Sion	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	GS-2606-11 Monomando lavamanos alto Sion	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-2606-11E Monomando lavamanos alto Sion	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-2606-11P Monomando lavamanos alto Sion	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-2606-11M Monomando lavamanos alto Sion	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-2603-11P Monomando lavamanos bajo Sion	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-2603-11M Monomando lavamanos bajo Sion	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-3403-11M Monomando lavamanos bajo Vicctor	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 6 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

926

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-3706-11 Monomando lavamanos alto Voga	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-3706-11BC Monomando Lavamanos alto Voga Bajo Consumo	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-3706-11E Monomando lavamanos alto Voga	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-3703-11 Monomando lavamanos bajo Voga	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-3703-11E Monomando lavamanos bajo Voga	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-3703-11BC. Monomando Lavamanos bajo Voga Bajo Consumo	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-2115-11 Monomando lavaplatos Vivaldi	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-2209-11 Monomando lavaplatos Tiffany	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-2209-11E Monomando lavaplatos Tiffany	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-2615-11 Monomando lavaplatos Sion	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-3315-11 Monomando lavaplatos Kurven	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 6 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-3415-11 Monomando lavaplatos Vicctor	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 6 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	GS-2115-11 Monomando lavaplatos Vivaldi	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-2115-11BC Monomando Lavaplatos Vivaldi Bajo Consumo	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-2115-11E Monomando lavaplatos Vivaldi	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

GRICOL S.A.

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	GS-2209-11 Monomando lavaplatos Tiffany	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-2209-11BC Monomando lavaplatos Tiffany Bajo Consumo	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	GS-2615-11 Monomando lavaplatos Sion	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-2615-11P Monomando lavaplatos Sion	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-2615-11M Monomando lavaplatos Sion	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-2615-11BC Monomando lavaplatos Sion Bajo Consumo	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-3415-11M Monomando lavaplatos Vicctor	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 6 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-3808-11 Monomando lavaplatos Maira	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 6 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-3808-11E Monomando lavaplatos Maira	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 6 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-4107-11 Monomando lavaplatos Garda	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 6 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

931

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-4107-11BC Monomando lavaplatos Garda Bajo Consumo	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 6 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-4107-11E Monomando lavaplatos Garda	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 6 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-3908-07 Monomando lavaplatos Tirso Negro	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-3908-15 Monomando lavaplatos Tirso Blanco	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-3908-02 Monomando lavaplatos Tirso Azul	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-3908-18 Monomando lavaplatos Tirso Morado	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-3908-01 Monomando lavaplatos Tirso Rojo	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-3908-17 Monomando lavaplatos Tirso Naranja	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-0811-11 Mezclador lavamanos 4" Calima	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-0902-11 Mezclador lavamanos 4" Helvetia	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

433

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-0902-11BC Mezclador Lavamanos 4" Helvetia Bajo Consumo	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1102-00 Mezclador lavamanos 4" Kristhal	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1302-11 Mezclador lavamanos 4" Atlántico	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1402-11 Mezclador lavamanos 4" Toscana	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1462-11 Mezclador lavamanos 4" Toscana	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1502-11 Mezclador lavamanos 4" Piana	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1602-11 Mezclador lavamanos 4" Helix Cruz	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1702-11 Mezclador lavamanos 4" Helix Pala	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1702-11BC Mezclador Lavamanos 4" Helix Pala Bajo Consumo	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1702-11E Mezclador lavamanos 4" Helix Pala	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1802-11 Mezclador lavamanos 4" Tedesca	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1808-11 Mezclador lavamanos 4" bar Tedesca	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-2802-11 Mezclador lavamanos 4" Pristina	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	ES-1502-11 Mezclador lavamanos 4" Prima	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	GS-0902-11 Mezclador lavamanos 4" Helvetia	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

936

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-0902-11E Mezclador lavamanos 4" Helvetia	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	GS-1402-11 Mezclador lavamanos 4" Toscana	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1402-11E Mezclador lavamanos 4" Toscana	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	GS-1462-11 Mezclador lavamanos 4" Toscana	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	GS-1502-11 Mezclador lavamanos 4" Piana	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	GS-1602-11 Mezclador lavamanos 4" Helix Cruz	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	GS-1802-11 Mezclador lavamanos 4" Tedesca	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	GS-1808-11 Mezclador lavamanos 4" bar Tedesca	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1502-11P Mezclador lavamanos 4" Piana	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-0611-11P Mezclador lavamanos 4" Platino	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

437

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1111-00P Mezclador lavamanos 4" Kristhal	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1462-11P Mezclador lavamanos 4" Toscana	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-0902-11M Mezclador lavamanos 4" Helvetia	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1402-11M Mezclador lavamanos 4" Toscana	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1462-11M Mezclador lavamanos 4" Toscana	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1802-11M Mezclador lavamanos 4" Tedesca	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1808-11M Mezclador lavamanos 4" bar Tedesca	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-2802-11M Mezclador lavamanos 4" Pristina	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-2811-11M Mezclador lavamanos 4" Pristina (cuerpo metálico)	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-0203-11 Mezclador lavamanos 8" Portobello	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 14,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-0812-11Mezclador lavamanos 8" Calima	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 14,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-0903-11Mezclador lavamanos 8" Helvetia	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1103-00 Mezclador lavamanos 8" Kristhal	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1303-11 Mezclador lavamanos 8" Atlántico	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1403-11 Mezclador lavamanos 8" Toscana	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1503-11 Mezclador lavamanos 8" Piana	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1703-11 Mezclador lavamanos 8" Helix Pala	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1803-11 Mezclador lavamanos 8" Tedesca	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-2803-11 Mezclador lavamanos 8" Pristina	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-3503-11 Mezclador lavamanos 8" Firenze Cruz	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 14,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-3603-11 Mezclador lavamanos 8" Firenze Pala	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 14,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	ES-1503-11 Mezclador lavamanos 8" Piana	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	GS-0812-11 Mezclador lavamanos 8" Calima	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 14,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	GS-0903-11 Mezclador lavamanos 8" Helvetia	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	GS-1403-11 Mezclador lavamanos 8" Toscana	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	GS-1503-11 Mezclador lavamanos 8" Piana	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	GS-1603-11 Mezclador lavamanos 8" Helix Cruz	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-0208-11 Mezclador lavamanos 8" pared Portobello	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 12.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-2826-11 Mezclador lavamanos 8" pared Pristina	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 12.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-2826-11BC Mezclador Lavamanos 8" pared Pristina Bajo Consumo	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 12.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-3516-11 Mezclador lavamanos 8" pared Firenze Cruz	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 12,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-3616-11 Mezclador lavamanos 8" pared Firenze Pala	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 12,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	GS-1816-11 Mezclador lavamanos 8" pared Tedesca	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 12,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-0208-11M Mezclador lavamanos 8" pared Portobello	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 12,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-2826-11M Mezclador lavamanos 8" pared Pristina	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 12,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-0801-11 Mezclador lavaplatos 8" Calima	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-0841-11 Mezclador mesa 8" cuerpo expuesto Calima	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 12,4 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-0928-11 Mezclador lavaplatos 8" arco Helvetia	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-0928-11BC Mezclador lavaplatos 8" arco Helvetia Bajo Consumo	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1138-00 Mezclador lavaplatos 8" Kristhal	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1338-11 Mezclador lavaplatos 8" Atlántico	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1466-11 Mezclador lavaplatos 8" Toscana	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1528-11 Mezclador lavaplatos 8" Piana	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1628-11 Mezclador lavaplatos 8" Helix Cruz	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1728-11 Mezclador lavaplatos 8" cisne Helix Pala	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1728-11BC Mezclador Lavaplatos 8" Helix Pala Bajo Consumo	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1828-11 Mezclador lavaplatos 8" Tedesca	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-2828-11 Mezclador lavaplatos 8" Pristina	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-2841-11 Mezclador mesa 8" cuerpo expuesto Pristina	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 12,4 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-3528-11 Mezclador lavaplatos 8" Firenze Cruz	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-3628-11 Mezclador lavaplatos 8" Firenze Pala	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	ES-1528-11 Mezclador lavaplatos 8" Piana	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	G1-0928-11 Mezclador lavaplatos 8" Helvetia	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-0928-11BC Mezclador lavaplatos 8" arco Helvetia Bajo Consumo	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-0928-11E Mezclador lavaplatos 8" Helvetia	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	GS-0801-11 Mezclador lavaplatos 8" Calima	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	GS-0928-11 Mezclador lavaplatos 8" Helvetia	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	GS-1466-11 Mezclador lavaplatos 8" Toscana	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	GS-1528-11 Mezclador lavaplatos 8" Piana	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	GS-1628-11 Mezclador lavaplatos 8" Helix Cruz	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	GS-1728-11 Mezclador lavaplatos 8" Helix Pala	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1728-11BC Mezclador lavaplatos 8" Helix Pala Bajo Consumo	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1728-11E Mezclador lavaplatos 8" Helix Pala	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	GS-1828-11 Mezclador lavaplatos 8" Tedesca	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-0928-11M Mezclador lavaplatos 8" arco Helvetia	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1466-11M Mezclador lavaplatos 8" Toscana	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1828-11M Mezclador lavaplatos 8" Tedesca	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-2806-11M Mezclador lavaplatos 8" Pristina (cuerpo metálico)	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-2828-11M Mezclador lavaplatos 8" Pristina	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-0832-11 Mezclador pared 8" cuerpo expuesto Calima	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 14 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-2832-11 Mezclador pared 8" cuerpo expuesto Pristina	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 14 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-1132-00P Mezclador pared 8" cuerpo expuesto Kristhal	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 14 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-1132-00E Mezclador pared 8" cuerpo expuesto Kristhal	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 14 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-0632-11P Mezclador pared 8" cuerpo expuesto Platino	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 14 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-1492-11P Mezclador pared 8" cuerpo expuesto Tedesca	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 14 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-0815-211 Llave individual lavamanos metálica Calima	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-0900-11. Llave individual lavamanos Helvetia	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-0900-11BC Llave Individual lavamanos Helvetia Bajo Consumo	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1100-00 Llave individual lavamanos Kristhal	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1300-11 Llave individual lavamanos Atlántico	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1400-11 Llave individual lavamanos Toscana	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1500-11 Llave individual lavamanos Piana	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1600-11 Llave individual lavamanos Helix Cruz	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1700-11 Llave individual lavamanos Helix Pala	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1700-11BC Llave Individual lavamanos Helix Pala Bajo Consumo	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1800-11 Llave individual lavamanos Tedesca	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-2815-211 Llave individual lavamanos metálica Pristina	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	ES-1500-11 Llave Individual lavamanos Prima	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	GS-0900-11 Llave individual lavamanos Helvetia	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	GS-1400-11 Llave individual lavamanos Toscana	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

956

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	GS-1500-11 Llave individual lavamanos Piana	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	GS-1600-11 Llave individual lavamanos Helix Cruz	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	GS-1800-11 Llave individual lavamanos Tedesca	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1100-00P Llave individual lavamanos Kristhal	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-1106-200P Llave individual lavamanos metálica Kristhal	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

454

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-0600-11P Llave individual lavamanos Platino	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1800-11P Llave individual lavamanos Tedesca	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-0900-11P Llave individual lavamanos Helvetia	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1400-11P Llave individual lavamanos Toscana	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1500-11P Llave individual lavamanos Piana	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-2815-211P Llave individual lavamanos metálica Pristina	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-0606-211P Llave individual lavamanos metálica Platino	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-1815-211P Llave individual lavamanos metálica Tedesca	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-0837-11 Llave móvil mesa Calima	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-0943-11 Llave móvil mesa Helvetia	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-0943-11BC Llave móvil de mesa Helvetia Bajo Consumo	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1174-00 Llave móvil de mesa Kristhal	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1360-11 Llave móvil mesa Atlántico	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1450-11 Llave móvil mesa Toscana	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1550-11 Llave móvil mesa Piana	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13.5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1650-11 Llave móvil mesa Helix Cruz	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1750-11 Llave móvil mesa Helix Pala	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1750-11BC Llave móvil de mesa Helix Pala Bajo Consumo	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1850-11 Llave móvil mesa Tedesca	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-2837-11 Llave móvil mesa Pristina	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	ES-1531-11 Llave móvil mesa Piana	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	GS-0943-11 Llave móvil mesa Helvetia	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	GS-1450-11 Llave móvil mesa Toscana	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	GS-1550-11 Llave móvil mesa Piana	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	GS-1650-11 Llave móvil mesa Helix Cruz	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia

GRICOL S.A.

Resolución 0501 del 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Anexo Certificado CSR -CER958351
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-07
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2023-12-26
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-06
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	GS-1837-11 Llave móvil mesa Tedesca	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-1450-11P Llave móvil mesa Toscana	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 13,5 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-0834-11 Llave móvil pared C Calima	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 18 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Metálico	01-0835-11 Llave móvil pared S Calima	Material de fabricación: Latón Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 18 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
Gricol	Griferia, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas y sanitarias.	Plástico	01-0944-11 Llave móvil pared C Helvetia	Material de fabricación: ABS Presión de trabajo: Entre 20 y 125 psi Diámetro Nominal: 17,8 mm Tipo de recubrimiento: Cromo	GRICOL S.A. Carrera 34 # 8A-15, Bogotá D.C, Colombia
